8.3 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el desarrollo del proyecto el contratista de obra llevo a cabo su cronograma de capacitaciones dando cumplimiento al 100%, las capacitaciones fueron impartidas al personal que se encontraba con una dedicación del 100%, razón por la cual profesionales especialistas o trabajadores itinerantes no se contaron como personal de la empresa proyectada a capacitar, teniendo en cuenta esto, se relaciona la meta de asistencia programada y la meta lograda por capacitación, ver **Anexo 6D Cronograma, Inducciones y capacitaciones contratista de obra**, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 79 Relación de Inducciones y Capacitaciones teme SST contratista de obra.

No.	Tema	Fecha	No. Asistentes	Meta de asistencia programada	Meta lograda por capacitación
1	Inducción del SG-SST	Desde el 17/02/ 2023 al 29/03/ 2024	137	137	100%
2	Divulgación de medidas de bioseguridad	Desde el 17/02/ 2023 al 29/03/ 2024	137	137	100%
3	Uso de Elementos de protección personal	26/05/2023	7	5	140%
4	Cuidado de manos, ojos y oidos	9/06/2023	5	5	100%
5	Manejo de estrés	9/06/2023	5	5	100%
6	Riesgo químico	23/06/2023	4	17	23,5%
7	Riesgo asociado a maquinaria, equipos y vehiculos en movimiento)	12/07/2023	16	17	94,11%
8	Capacitación Higiene postural y manejo de cargas	15/08/2023	18	26	69,23%
9	Generalidades brigadas de emergencias -Primeros auxilios	1/08/2023	20	26	76,92%
10	Riesgo Locativo	7/09/2023	19	34	55,88%
11	Riesgo Físico	11/09/2023	19	34	55,88%
12	Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo	13/09/2023	20	34	58,82%
13	Primeros auxilios, manejo de extintores, traslado de pacientes	25/09/2023	18	27	66,66%
14	Cumplimiento normas SST durante la jornada laboral	05/10/2023	22	27	81,48%

No.	Tema	Fecha	No. Asistentes	Meta de asistencia programada	Meta lograda por capacitación
15	Pausas activas, importancia de usar nuestros EPP para realizar actividades	02/10/2023	23	27	85,18%
16	Riesgos consecuencias y controles asociadas al desarrollo de las actividades que se ejecutan en obra	9/10/2023	24	27	88,88%
17	Fomento de estilos de vida y entornos saludables	13/10/2023	21	27	77,77%
18	Uso de equipos de protección contra caídas (Trabajo en alturas)	19/10/2023	26	60	43,33%
19	Cuidado de la piel y pausas activas	24/10/2023	25	60	41,66%
20	Importancia del buen uso de los elementos de protección personal y pausas activas	26/10/2023	26	60	43,33%
21	Actividades de alto riesgo y la importancia de firmar permiso de trabajo y ATS	31/10/2023	23	60	38,33%
22	Condiciones de trabajo: Manejo de maquinaria, riesgos expuesto consecuencia y controles	7/11/2023	23	60	38,33%
23	Autocuidado, respeto entre compañeros para un buen ambiente laboral	9/11/2023	33	60	55%
24	Autocuidado, armado de andamios y pausas activas	14/11/2023	52	60	86,66%
25	Riesgo Mecánico consecuencias y control	27/11/2023	27	79	34,17%
26	Riesgo Biomecanico	28/11/2023	20	79	25,31%
27	No consumo de alcohol drogas y tabaco	28/11/2023	59	79	74,68%
28	Resolución 4272 del 2021	6/12/2023	40	50	80%
29	Curva de la seguridad importancia del autocuidado	11/12/2023	39	50	78%
30	Riesgo locativo, orden y aseo y pausas activas	19/12/2023	34	50	68%
31	Manejo y control del estrés en el entorno laboral	29/12/2023	30	50	60%
32	Autocuidado y pausas activas	2/01/2024	24	40	60%
33	Condiciones inseguras, importancia de trabajar	16/01/2024	34	40	85%

No.	Tema	Fecha	No. Asistentes	Meta de asistencia programada	Meta lograda por capacitación
	concentrado y mantener la señalización en las áreas de peligro				
34	La importancia de usar los EPP	13/02/2024	25	28	89,28%
35	Autocuidado	20/02/2024	18	28	64,28%
36	Riesgo Químico (Hojas de seguridad de los productos químicos)	28/02/2024	20	28	71,42%

Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Adicionalmente, la interventoría verificó las charlas de socialización de los accidentes de trabajo que hacen parte de las capacitaciones, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla 80. Socialización accidentes de trabajo consorcio VAPA

Charlas accidentes de trabajo				
Socialización accidente de trabajo	Fecha	No. Asistentes	Meta de asistencia programada	Meta lograda por capacitación
Luis Durango	18/09/2023	22	34	64,70%
Miguel Parrao	12/01/2024	34	40	85%
Carlos Beltrán	28/02/2024	20	28	71,42%

Fuente Mapo Ingeniería SAS, 2024.

Ilustración 84. Registro fotográfico de las actividades de inducción, capacitación y charlas de SST, contratista de obra.





Las evidencias de las actividades realizadas se encuentran en **Anexo SST 6D Cronograma, inducciones y capacitaciones Contratista de obra.**

Durante el desarrollo del proyecto interventoria llevó a cabo su cronograma de capacitaciones, ***Ver anexo 6.E Cronograma, inducciones y capacitaciones interventoria,*** cómo se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 81. Consolidado capacitaciones interventoria componente SST

No.	TEMA	FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	INDUCCION PERSONAL NUEVO - Inducción SST y Ambiental- Se socializa al personal las políticas (HSE, alcohol drogas y tabaco), objetivos del SG-SST, roles y responsabilidades en el SG-SST, peligros, riesgos y controles, atención de emergencias, reporte de AL y EL, protocolo de bioseguridad por COVID-19. (Según Ingreso de Personal), aspectos e impactos ambientales, adecuada segregación de residuos sólidos.	20/02/2023 20/04/2023 17/06/2023 1/07/2023 11/09/2023 23/11/2023 16/01/2024	
2	Charla sobre reporte de accidentes e incidentes.	15/03/2023	
3	Boletin sobre Prevención de COVID19.	27/03/2023 19/01/2024	
4	Charla sobre diferencia entre peligro y riesgo	26/04/2023	
5	Limites de velocidad y uso de cinturón de seguridad	29/07/2023	

No.	TEMA	FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
6	Política prevención alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia.	11/05/2023 25/08/2023	
7	Taller de identificación de peligros y riesgos en oficina y para la obra.	07/07/2023 26/04/2023	
8	Boletín sobre uso y cuidado de elementos de protección personal y manejo de casos de acoso laboral resolución 652 de 2012.	26/05/2023	
9	Divulgación de MEDEVAC y unidades de apoyo en caso de una emergencia, lineamientos de cómo actuar ante emergencias en la oficina y campo.	9/06/2023	
10	Boletín en cuidado de la piel.	28/07/2023	
11	Capacitación funciones comité de convivencia.	30/08/2023	
12	Boletín pausas activas.	25/09/2023	
13	Prevención riesgo ofidico	9/10/2023	
14	Estilos de vida saludable	15/11/2023	
15	Pausas activas/ pausas visuales	15/12/2023	
16	Riesgo psico laboral / manejo del estrés	22/12/2023	
17	Nueva variante COVID 19 OMICRON	19/01/2024	
18	Uso de elementos de protección personal EPP	26/02/2024	

Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

8.4 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El programa de medicina preventiva y del Trabajo, es un conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los trabajadores tendientes a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

El contratista de obra ejecutó actividades tales como, medicina preventiva y del trabajo, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, seguimiento a las recomendaciones en salud, reporte de ausentismo laboral por enfermedad común y/o laboral, indicadores SST, atención de emergencias, administración y control de elementos de protección personal, Inspecciones de equipos de emergencia, hoja de vida de maquinarias y equipos, seguimiento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y COPASST.

8.5 RELACIÓN DEL PERSONAL CON ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL (INCLUYE REPORTE DE INSPECCIONES Y CAMBIO)

Durante la ejecución del contrato interventoria verificó que el contratista de obra cumpliera con el suministro los elementos de protección personal correspondientes a casco, botas de seguridad, gafas, tapabocas, guantes de vaqueta, botas de material con puntera y dotación concerniente a camisa y pantalón identificados con el número del contrato y logos de la entidad a las personas que ingresaron, además el contratista de obra realizó el cambio de suministro teniendo en cuenta el desgaste que iban presentado los elementos entregados al personal.

La interventoria también realizó la verificación durante la ejecución del contrato del suministro de EPP, a través de la visualización del uso de los elementos de protección personal dejando como evidencia el registro fotográfico en cada visita realizada y a su vez plasmo este seguimiento en el reporte de los informes semanales y mensuales entregado al ente supervisor, adicionalmente interventoria verifico el diligenciamiento del acta de entrega de dotación, EPPS, materiales equipo y herramienta menor que el contratista de obra diligenciaba y procedia a solicitar la firma del trabajador al cual le era entregado este suministro, estos formatos se pueden evidenciar en los informes mensuales. Ver **Anexo 6F Registro entrega de dotación, EPP contratista de obra.**

Ilustración 85. Entrega de dotación personal ingreso Contratista de obra.



Para el personal de interventoria se realizó la entrega de dotación y se procedió a diligenciar el formato de compromiso de uso de EPPS para trabajadores independientes, el cual fue anexado en cada informe mensual entregado a la entidad supervisora, ver **Anexo 6G Compromiso uso EPP interventoria.**

Ilustración 86. Entrega dotación personal ingreso interventoria



Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

8.5.1 Exámenes médicos ocupacionales

MAPO INGENIERIA SAS como interventoria de contratista **CONSORCIO VAPA** verificó los exámenes medico ocupacionales de ingreso y egreso a todo el personal que participó en el proyecto. Ver **Anexo SST 6H Exámenes médicos ocupacionales de ingreso contratista de obra, Anexo SST 6I Exámenes de egreso contratista de obra.**

Adicionalmente la interventoria presento en los informes mensuales los exámenes medico ocupacionales de ingreso y egreso del personal que participo a lo largo del desarrollo del proyecto, **ver Anexo SST 6J Exámenes médicos ocupacionales de ingreso interventoria y Anexo SST 6K Exámenes egreso interventoria.**

Tabla 82 **Cuadro de control de exámenes médicos personal interventoria.**

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso
1	Director de Interventoria	Maria del Carmen Posada Ardila	41.511.424	24/04/2023
2	Ingeniera Residente de Interventoria	Maryuri Yasmine Ayala Estrada.	1.093.738.431	17/02/2023
3	Arquitecto Residente de Interventoria	Nelson Mauricio Castro Galeano	80.721.546	28/04/2023
4	Especialista en Geotecnia	Fernando Alberto Nieto Castañeda	79.339.749	24/11/2021
5	Especialista Hidráulico	Diego Fernando García Borrero	79.723.595	14/06/2022

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso
6	Profesional en Gestión Ambiental y SST	Nila Yadira Contreras Santiago	52.702.962	5/07/2022
7	Profesional del Área Social	María de los Ángeles Serrano Lota	52.918.989	24/02/2022
8	Especialista tránsito y transporte de interventoria	Daniel Orlando Cruz Rodríguez	1.016.027.868	10/08/2022
9	Profesional Legal	Andrea Isabel Acevedo Giraldo	35.478.429	7/02/2023
10	Topógrafo	Jeisson Fabian Peña Quiroga	1.012.438.849	13/04/2023
11	Cadenero	Ángel Iván cuy Báez	1.018.472.296	4/02/2023
12	Conductor	David Andrés Maldonado Méndez	1.020.730.818	23/04/2022
13	Ingeniero Residente de Interventoria	Antonio Morales	11.378.614	28/06/2023
14	Profesional en Gestión Ambiental y SST	Carlos Arturo Soto Rubiano	80.063.917	11/06/2021
15	Profesional del Área Social	Sandra Janeth Rodríguez Álvarez	52.077.469	1/03/2023
16	Director de Interventoria	Maria Alexandra Posada Peña	51.856.486	22/02/2023
17	Ingeniera Residente de Interventoria	Adriana Esther Romero Kehan	51.919.024	21/11/2023
18	Estructural	Raúl Enrique Lozano Mora	80.411.279	8/10/2022
19	Ingeniero Residente de Interventoría	Geovanni Franco Parra	79.263.036	15/05/2023
20	Cadenero	Nicolas Poveda Posada	1.018.454.737	1/03/2023

Fuente Mapo ingenieria SAS, 2024.

Tabla 83 Exámenes médicos ocupacionales del personal de contratista de obra.

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso	Examen Egreso
1	Director de Obra	Freddy Suarez Luna	74.732.857	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
2	Especialista en Geotecnia	Juan Ricardo Troncoso Rivera	80.026.555	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
3	Residente ambiental	Yenny Yulisa Cuesta Palacios	1.077.435.248	23/02/2023	Desistimiento 15/04/2024
4	Profesional Forestal	Wilson Alexander Arévalo Venegas	80.100.629	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
5	Ingeniero Eléctrico	Marcelo López Hernández	75.077.372	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
6	Ingeniero Hidráulico	Omar Johanny Archila Mendoza	7.227.618	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
7	Profesional Paisajismo	Natalia Margarita Rincón Alvarado	46.379.618	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
8	Profesional SISO	Jaime Alexander Murcia Pamplona	79.788.632	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024

427

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen Ingreso	Examen Egreso
9	Residente social	Diana Milena Castillo Guerra	1.015.428.185	24/02/2023	Desistimiento 15/04/2024
10	Especialista en tránsito y transporte	José Misael Angarita Duran	4.207.582	20/02/2023	Desistimiento 23/04/2024
11	Topógrafo Inspector	Camilo Andrés Beltrán Cortes	80.771.975	26/04/2021	Acta de desistimiento examen medico
12	Arquitecta Auxiliar	Hesbleidy Paola Moreno Castro	1.052.396.753	21/03/2023	Desistimiento 15/04/2024
13	Topógrafo (Cadenero)	Yuldi Natalia Beltrán Rojas	1.010.177.896	27/09/2022	Acta de desistimiento examen medico
14	Topógrafo (Cadenero)	Lismar Rossana Maldonado Medina	1.010.218.201	27/09/2022	Acta de desistimiento examen medico
15	Arquitecto residente de Obra	Carlos Andrés López Rincón	1.129.523.582	9/06/2023	Desistimiento 15/04/2024
16	Auxiliar SST	Diana Yonahira Capera Prada	1.106.395.300	5/09/2023	Desistimiento 08/03/2024
17	Ingeniero residente de obra	Edwin Albeiro Zambrano Reyes	1.110.532.830	08/09/2023	Desistimiento 15/04/2024
18	Arquitecto residente de obra	Patricia Torres Alvarado	41.786.896	08/02/2023	Desistimiento 03/04/2023
19	Ingeniero residente de obra	Enrique Enmanuel Calderón Padilla	169.376	03/05/2023	Desistimiento 19/09/2023
20	Ingeniero Residente de obra	José Andrés Acosta Posada	79.784.083	20/02/2023	Desistimiento 04/05/2023
21	Arquitecto residente de obra	Nicolas López Mora	8.160.151	30/01/2023	Desistimiento 26/02/2024
22	Almacenista	Luis Orlando Rodriguez Ladino	79.712.708	14/09/2023	Desistimiento 22/03/2024
23	Ayudante de obra	Yeison David Tique	1.026.595.057	4/07/2023	Desistimiento 27/02/2024
24	Ayudante de obra	Reinel Alfonso Garzón Mogollón	80.174.903	4/07/2023	Desistimiento 26/03/2024
25	Ayudante de obra	Johan Arboleda Murillo	1.027.964.140	10/01/2024	Desistimiento 06/02/2024
26	Ayudante de obra	José Bascra Silvestre	4.985.998	12/05/2023	Desistimiento 26/01/2024
27	Ayudante de obra	Fernando Barreto Garzón	7.793.427	18/05/2023	Desistimiento 03/01/2023
28	Ayudante de obra	Richard Andrés Sánchez Ortega	5.476.139	15/09/2023	Desistimiento 11/01/2023
29	Ayudante de obra	Carlos Javier Gamboa	5.106.848	4/07/2023	Desistimiento 03/01/2024
30	Ayudante de obra	Carlos Alberto Sánchez Santana	1.002.183.364	12/05/2023	Desistimiento 21/06/2023
31	Ayudante de obra	Jonathan Micolta Casierra	1.087.186.362	12/05/2023	Desistimiento 03/06/2023
32	Oficial de obra	Luis Alexis Moreno Rentería	1.077.425.902	12/05/2023	Desistimiento 03/06/2023
33	Oficial de obra	Luis Norbei Durango Vargas	1.033.776.058	7/07/2023	Desistimiento 17/10/2023

420

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso	Examen Egreso
34	Controlador de Equipos	John Freddy Mayorga Gutiérrez	79.183.964	8/07/2023	Desistimiento 13/10/2023
35	Ayudante de obra	Carlos Andrés Santana	1.045.728.055	29/06/2023	Desistimiento 26/09/2023
36	Ayudante de obra	Diego Rosas Vásquez	1.023.901.704	4/07/2023	Desistimiento 04/09/2023
37	Ayudante de obra	Jhon Teilor Iquira Vargas	1.192.720.084	4/07/2023	Desistimiento 19/10/2023
38	Ayudante de obra	Yeison Andrés Pérez	1.122.677.121	4/07/2023	Desistimiento 02/09/2023
39	Ayudante de obra	Yonathan Stiven Tabares	1.040.044.918	15/09/2023	Desistimiento 3/11/2023
40	Ayudante de obra	Jonathan Stiven Garzón Villamarin	1.007.699.471	15/11/2023	Desistimiento 20/03/2024
41	Oficial de obra	José Antonio Pacheco	79.398.390	6/12/2023	Desistimiento 22/12/2023
42	Maestro de Obra	Siervo de Jesús Castro Cañón	1.095.766.523	6/12/2023	Desistimiento 22/12/2023
43	Ayudante de obra	José Manuel Polo Ramos	6.308.634	6/12/2023	Desistimiento 22/12/2023
44	Ayudante de obra	Cristóbal Antonio Romero Reyes	92.506.145	6/12/2023	Desistimiento 22/12/2023
45	Oficial de obra	Jesús David Rodriguez	79.562.229	6/12/2023	Desistimiento 22/12/2023
46	Ayudante de obra	Camilo Garzón	14.257.202	14/12/2023	Desistimiento 22/12/2023
47	Oficial de obra	Juan Carlos Oviedo	73.434.386	22/07/2023	Acta de desistimiento examen medico
48	Ayudante de obra	Humberto Enrique Cotes	1007573922	28/07/2023	Acta de desistimiento examen medico
49	Ayudante de obra	José Ángel Matute Acosta	5.775.746	28/07/2023	Acta de desistimiento examen medico
50	Ayudante de obra	Benjamin Rafael Ramos	85.203.986	28/07/2023	Acta de desistimiento examen medico
51	Ayudante de obra	José Edwar Melo Castellano	80.132.219	9/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
52	Ayudante de obra	Fabio Oliveros Mendivil	1.007.743.580	8/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
53	Ayudante de obra	Edwin Ospina	79.965.115	8/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
54	Maestro de Obra	Wilmar Sibaja Reyes	1.143.330.331	5/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
55	Ayudante de Obra	José Gregorio Vega Urbina	13.412.472	18/08/2023	Acta de desistimiento examen medico

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen Ingreso	Examen Egreso
56	Oficial de obra	Jaime Alberto Acevedo Rodríguez	9.104.722	17/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
57	Ayudante de Obra	Joan Enrique Padilla Coronado	1.067.955.149	17/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
58	Ayudante de obra	Jonatan David Ramos Rojas	1.085.036.903	4/09/2023	Acta de desistimiento examen medico
59	Ayudante de obra	Andrey David Contreras Cueto	1.042.465.538	03/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
60	Ayudante de obra	Marlon de Jesús Alvarado Hernández	1.052.943.193	03/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
61	Maestro de Obra	Pedro Miguel Fernández Benavides	73.432.693	03/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
62	Ayudante de obra	Erick Zapata	1.077.432.437	08/11/2023	Acta de desistiiento examen medico
63	Oficial de obra	Pedro Bernal	79.547.401	08/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
64	Ayudante de obra	Ricardo Basabe	1.032.444.668	8/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
65	Oficial de obra	Adalberto Salcedo	9.155.746	08/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
66	Ayudante de obra	Carlos Armando Carrillo Sánchez	1.065.835.362	11/09/2023	Acta de desistimiento examen medico
67	Oficial de obra	Edgar Bautista Olaya	12.521.924	19/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
68	Ayudante de obra	Jesús Alberto García Portocarrero	16.509.405	06/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
69	Ayudante de obra	Omar David Aguas Salgado	1.103.117.901	5/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
70	Ayudante de obra	Wilberto Acevedo Campo	9.086.185	05/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
71	Ayudante de obra	Jorge Miguel Parrao	1.051.359.931	06/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
72	Ayudante de obra	Carlos Acevedo	1.047.433.556	6/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
73	Operario Retro excavadora	Jorge Andrés Diaz	1.071.162.382	6/07/2023	Acta de desistimiento examen medico

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso	Examen Egreso
74	Ayudante de Obra	Luis David Charris Garrido	1.004.375.225	09/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
75	Ayudante de Obra	José Alejandro Martínez Primiciero	80.225.569	12/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
76	Operador Vibrocompactador	Jhon Wilson Sánchez	79.725.969	29/06/2023	Acta de desistimiento examen medico
77	Operario Retroexcavadora	Juan Cruz	11.231.338	11/04/2023	Acta de desistimiento examen medico
78	Operario Minicargador	Carlos Andrés Beltrán	1.071.164.751	1/02/2023	Acta de desistimiento examen medico
79	Ayudante de obra	David Seña	1.003.239.887	25/09/2023	Acta de desistimiento examen medico
80	Operario Minicargador	Jorge Eliecer Gómez Acosta	1.005.411.756	9/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
81	Operario Vibro compactador	John Carlos Naranjo	88.204.896	16/12/2022	Acta de desistimiento examen medico
82	Ayudante de obra	Deyanir Fernando Trochez	1.004.249.796	01/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
83	Oficial de obra	Andrés Felipe Correa	1.016.065.812	07/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
84	Oficial de obra	Osmar Corredor Fandiño	1.073.507.269	19/01/2023	Acta de desistimiento examen medico
85	Oficial de obra	Bladimir España Ramírez	1.019.093.731	08/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
86	Ayudante de obra	Carlos Alfredo Arcila	1.020.795.014	30/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
87	Oficial de obra	Héctor Fabio Lasso	79.848.940	6/09/2023	Acta de desistimiento examen medico
88	Oficial de obra	Nolberto Otalora Cante	4.276.863	30/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
89	Oficial de obra	Efrén Enrique Prada	19.360.508	30/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
90	Ayudante de obra	Diego Fernando Zuluaga	71.782.703	30/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
91	Ayudante de obra	Jhon Jairo Flórez Londoño	1.112.766.335	17/11/2023	Acta de desistimiento examen medico

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen Ingreso	Examen Egreso
92	Ayudante de obra	Heimar Fabian Gordillo Martin	80.378.029	18/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
93	Ayudante de obra	Pedro Elias Prada Monsalve	80.247.913	4/02/2023	Acta de desistimiento examen medico
94	Ayudante de obra	Nelson Eduardo Ruiz Quiroga	13.686.463	22/03/2023	Acta de desistimiento examen medico
95	Ayudante de obra	Yilber Sneider Tovar Vique	1.007.289.245	17/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
96	Oficial de obra	Jimmy Alexander Rodriguez Villamil	80.249.210	10/01/2023	Acta de desistimiento examen medico
97	Ayudante de obra	Fidel Vargas	93.285.904	16/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
98	Ayudante de obra	Ángel Humberto Hernández	7.087.992	27/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
99	Oficial de obra	Gustavo Bosda Baron	19.432.306	16/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
100	Oficial de obra	Abel Aguilar Busto	3.839.838	27/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
101	Oficial de obra	Randy Diaz	92.558.620	27/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
102	Oficial de obra	Juan Jiménez	80.236.854	27/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
103	Oficial de obra	Jaime Tovar	83.169.712	27/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
104	Oficial de obra	Luis Hurtado	1.087.778.724	27/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
105	Oficial de obra	Arturo Numpaque	1.042.639	05/01/2024	Acta de desistimiento examen medico
106	Oficial de obra	José William Castro	79.866.052	18/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
107	Ayudante de obra	Julio Fernández	1.140.367.427	19/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
108	Oficial de obra	Benjamin González	17.900.562	4/01/2024	Acta de desistimiento examen medico
109	Oficial de obra	Julio Linares	3.099.588	16/01/2024	Acta de desistimiento examen medico

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso	Examen Egreso
110	Ayudante de obra	Freddy Cuellar Ramos	1.007.289.618	25/01/2024	Acta de desistimiento examen medico
111	Ayudante de obra	Jaider Messino Torrijo	1.007.559.654	24/01/2024	Acta de desistimiento examen medico
112	Maestro de Obra	Gerardo Linares	1.004.049.554	02/07/2021	Acta de desistimiento examen medico
113	Oficial de obra	Medardo Fernández	1.140.367.425	19/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
114	Oficial de obra	Guillermo Cifuentes	79.866.450	22/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
115	Eléctrico	German Diaz	7.214.384	30/05/2023	Acta de desistimiento examen medico
116	Eléctrico	Oscar Gonzales	74.374.293	30/05/2023	Acta de desistimiento examen medico
117	Ayudante de obra	Libardo Cardales Bravo	1.070.810.037	12/01/2024	Acta de desistimiento examen medico
118	Ayudante de obra	Kevin Leal Aguilar	1.000.7libwer81.464	19/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
119	Ayudante de obra	Luis Diomedes Morales Torres	1.070.781.990	19/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
120	Ayudante de obra	Yurley Forero	1.051.287.255	14/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
121	Ayudante de obra	Jonatan Estiben Mora Camacho	1.007.380.985	17/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
122	Ayudante de obra	Jhonatan Javier Gil Garrido	1.193.154.427	21/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
123	Ayudante de obra	Julián Linares	1.033.676.547	28/12/2023	Acta de desistimiento examen medico
124	Ayudante de obra	Roberto Rodríguez	1.032.379.516	08/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
125	Ayudante de obra	Luis Alberto Salgado	1.033.747.348	08/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
126	Ayudante de obra	José Romero	1.005.994.471	07/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
127	Oficial de obra	José Tibaquira	80.380.647	07/11/2023	Acta de desistimiento examen medico

A321

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen Ingreso	Examen Egreso
128	Ayudante de obra	Cristian Lozano	1.033.756.984	07/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
129	Ayudante de obra	Andrés Ceballos	1.033.795.546	08/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
130	Ayudante de obra	Haller Castro	1.006.190.871	07/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
131	Ayudante de obra	José Gamboa	1.001.176.646	07/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
132	Ayudante de obra	Andrey Felipe Sosa	1.032.836.922	19/08/2023	Acta de desistimiento examen medico
133	Oficial de obra	Wilson Reinaldo Torres Pulido	79.875.941	24/07/2023	Acta de desistimiento examen medico
134	Ayudante de obra	Camilo Andrés Romero Niviayo	1.023.955.322	15/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
135	Ayudante de obra	Dairon Jeanpeirre Gamboa Diaz	1.032.677.686	21/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
136	Ayudante de obra	Fabian Andrés Alfonso Urrego	1.193.048.861	15/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
137	Ayudante de obra	William Johan Tabares Perdomo	1.054.549.041	15/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
138	Ayudante de obra	Johan Stiven Pachón Márquez	1.192.795.788	27/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
139	Ayudante de obra	José Ernelio Mosquera	1.003.970.273	21/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
140	Ayudante de obra	Juan David Laverde Ceballos	1.073.672.941	21/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
141	Ayudante de obra	Manuel Santiago Palacios	1.193.340.329	21/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
142	Ayudante de obra	Wilmar Mauricio Sánchez	1.078.348.108	27/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
143	Ayudante de obra	Yeiner Enrique Núñez Añez	5.164.644	20/11/2023	Acta de desistimiento examen medico
144	Pañetador	Carlos Andrés Bohórquez	79.854.951	26/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
145	Pañetador	Alejandro Molina	79.720.424	26/10/2023	Acta de desistimiento examen medico

No	Cargo	Nombre	Identificación	Examen ingreso	Examen Egreso
146	Pañetador	Wilson Arrieta Tizzas	13.565.336	26/10/2023	Acta de desistimiento examen medico
147	Ayudante	Harol David Llerena de León	1.039.704.228	12/01/2024	Acta de desistimiento examen medico
148	Ayudante	Alfonso José Montero Orozco	1.128.327.628	05/02/2024	Acta de desistimiento examen medico

Fuente mapo ingeniería SAS, 2024.

8.5.2 Registro de casos de enfermedad laboral.

Durante la ejecución del contrato de obra FONDIGER No. 008 de 2023 y 002 de 2023, no se presentaron casos de enfermedad laboral por Covid- 19, o por cualquier otra patología.

8.5.3 Índice de Frecuencia de Accidentabilidad por mes

Durante el desarrollo del proyecto comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, en el contrato FONDIGER 008-2023 no se presentaron accidentes laborales en el personal de interventoría, ver **anexo 6L Certificados de accidentalidad mes a mes interventoría**, como se muestra en la tabla 85 y 86 correspondientes al año 2023 y 2024.

Sin embargo, para el contrato FONDIGER 002-2023 durante el desarrollo del proyecto comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, se presentaron 4 accidentes laborales en el personal de obra, **ver Anexo SST 6M Reporte de accidentes contratista de obra y certificado de accidentalidad mes a mes**, lo cual dio como resultado:

Ilustración 87. Accidentes laborales consorcio VAPA



Fuente Mapo ingeniería SAS, 2024.

Índice de severidad del 51.2%, el índice de severidad se calcula como el número total de días de incapacidad cargados debido a las lesiones laborales anteriormente descritas, dividido por el número de trabajadores en el mes multiplicado por 100, teniendo en cuenta esto el índice total indica una alta severidad de los accidentes, lo que significa que la cantidad de días perdidos debido a lesiones en relación con el número de trabajadores expuestos fue mayor.

El índice de lesiones incapacitantes del 1.21% representa una proporción baja de accidentes en comparación con las horas trabajadas. Aunque el número de accidentes puede ser bajo en relación con el tiempo de exposición al riesgo, el impacto de estos accidentes en términos de días de incapacidad es significativo.

Frente al análisis de índice de frecuencia e índice de accidentalidad se pudo evidenciar que en promedio la incidencia de accidentes de trabajo durante el desarrollo del proyecto es baja en relación con el número total de trabajadores y meses trabajados.

Interventoría, verifico el cumplimiento por parte del consorcio VAPA correspondiente a los procedimientos de reporte, investigación y toma de medidas correctivas en cada accidente laboral reportado, en la gráfica que se muestra a continuación se evidencia la información mes por mes.

Ilustración 88. Control de indicadores de accidentalidad 2023/2024 VAPA



Fuente Mapo ingeniería S.A.S, 2024

Tabla 84 Índice de frecuencia por accidentalidad por mes Interventoria año 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA																
INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																
ACCIDENTES DE TRABAJO																
INDICADOR	FORMULACIÓN	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	MES											
					FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
Número de trabajadores	Ninguna	N.A	MENSUAL	COORDINADOR SST	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
HHT Promedio	Ninguna	N.A	MENSUAL	COORDINADOR SST	1952	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2721
N° de accidentes	Ninguna	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° de días perdidos por accidentes	Ninguna	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice de frecuencia de AT	IF AT = (N° accidentes que se presentaron en el mes / N° trabajadores mes) x 100	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice de severidad de AT	IS AT = (N° días de incapacidad por AL en el mes + N° días cargdos en el mes / N° trabajadores en el mes) x 100	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes mortales	AM = (No accidentes mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) x 100	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD GENERAL Y ENFERMEDAD LABORAL																
INDICADOR	FORMULACIÓN	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	MES											
					FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
No. casos enfermedades laborales	Cantidad de casos	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. días de incapacidad por enfermedad laboral	Días de ausencia por incapacidad EL	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. casos enfermedad general	Cantidad de casos	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No días de incapacidad por enfermedad general	Días de ausencia por incapacidad EG	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(N° casos nuevos y antiguos de EL en el mes / N° promedio de trabajadores en el mes) x 100.000	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(N° casos nuevos de EL en el mes / N° promedio de trabajadores en el mes) x 100.000	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausentismo por causa médica	(N° días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / N° de días programados para trabajo en el	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Mapo ingeniería SAS, 2024.

Tabla 85. Índice de frecuencia por accidentalidad por mes Interventoria año 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA						
INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
ACCIDENTES DE TRABAJO						
INDICADOR	FORMULACIÓN	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	MES	
					FEB	MAR
Número de trabajadores	Ninguna	N.A	MENSUAL	COORDINADOR SST	12	12
HHT Promedio	Ninguna	N.A	MENSUAL	COORDINADOR SST	1152	2880
N° de accidentes	Ninguna	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
N° de dias perdidos por accidentes	Ninguna	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
Indice de frecuencia de AT	IF AT = (N° accidentes que se presentaron en el mes / N° trabajadores mes) x 100	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
Indice de severidad de AT	IS AT = (N° dias de incapcidad por AL en el mes + N° dias cargdos en el mes / N° trabajadores en el mes) x 100	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
Accidentes mortales	AM = (No accidentes mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) x 100	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0

ENFERMEDAD GENERAL Y ENFERMEDAD LABORAL						
INDICADOR	FORMULACIÓN	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	MES	
					FEB	MAR
No. casos enfermedades laborales	Cantidad de casos	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0
No. dias de incapacidad por enfermedad laboral	Dias de ausencia por incapacidad EL	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
No. casos enfermedad general	Cantidad de casos	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
No dias de incapacidad por enfermedad general	Dias de ausencia por incapacidad EG	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(N° casos nuevos y antiguos de EL en el mes / N° promedio de trabajadores en el mes) x 100.000	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(N° casos nuevos de EL en el mes / N° promedio de trabajadores en el mes) x 100.000	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0
Ausentismo por causa médica	(N° dias de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / N° de días programados para trabajo en el	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0

Fuente: Mapo ingeniería SAS, 2024.

Tabla 86 Índice frecuencia de accidentalidad contratista.

CONTROL DE INDICADORES ACCIDENTALIDAD CONSORCIO VAPA								
INDICES			FORMULAS					META
Índice de Frecuencia			(No. De Accidentes de Trabajo/No. Trabadores en el mes) *100					0
Índice de Severidad			(No. Dias de Incapacidad dias cargados/No. Trabajadores en el mes) *100					0
Índice de lesiones Incapacitantes			Índice de frecuencia*Índice de Severidad/100					0
Índice de Accidentalidad			# de accidentes/ # de trabajadores *100					0
2023	No. trabajadores	No. Accidentes de Trabajo	No. Dias de Incapacidad	Días Cargados	Índice de Frecuencia	Índice de Severidad	Índice de lesiones Incapacitantes	Índice de Accidentalidad
FEB	13	0	0	0	0	0	0	0
MAR	16	0	0	0	0	0	0	0
ABR	16	0	0	0	0	0	0	0
MAY	17	0	0	0	0	0	0	0
JUN	19	0	0	0	0	0	0	0
JUL	28	1	4	0	3,57	14,3	0,51	3,57
AGO	37	0	0	0	0	0	0	0
SEP	45	1	5	0	2,22	11,11	2,468	2,22
OCT	38	0	0	0	0	0	0	0
NOV	90	0	0	0	0	0	0	0
DIC	61	0	0	0	0	0	0	0
ENE 2024	51	1	0	0	1,96	0	0	1,96
FEB 2024	39	1	7	0	2,6	17,9	0,46	2,56
TOTAL	39	4	16	0	10,76	51,2	1,21	10,72

Fuente: Consorcio VAPA

8.5.4 Ausentismos

Durante el desarrollo del proyecto comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, en el contrato FONDIGER 008-2023 no se presentaron ausentismos en el personal de interventoría.

Tabla 87 Ausentismo Interventoria.

INDICADOR	FORMULACIÓN	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	2023												2024		
					FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	PROM
No. casos enfermedades laborales	Cantidad de casos	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. días de incapacidad por enfermedad laboral	Días de ausencia por incapacidad EL	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. casos enfermedad general	Cantidad de casos	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. días de incapacidad por enfermedad general	Días de ausencia por incapacidad EG	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(N° casos nuevos y antiguos de EL en el mes / N° promedio de trabajadores en el mes) x 100.000	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(N° casos nuevos de EL en el mes / N° promedio de trabajadores en el mes) x 100.000	RESULTADO	ANUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausentismo por causa medica	(N° días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / N° de días programados para trabajo en el mes) x 100	RESULTADO	MENSUAL	COORDINADOR SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Mapo ingeniería SAS, 2024.

Tabla 88 Tipo de ausentismo.

TIPO DE AUSENCIA	EVENTOS 2023	DÍAS PERDIDOS
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0
ENFERMEDAD PROFESIONAL	0	0
SUSPENSIÓN	0	0
MATERNIDAD	0	0
PATERNIDAD	0	0
PERMISO REMUNERADO	0	0
CALAMIDAD DOMESTICA	0	0
PERMISO NO REMUNERADO	0	0
NO LABORÓ	0	0
TOTAL	**0**	**0**

Fuente: Mapo ingeniería SAS, 2024.

Por parte del personal del contratista de obra, se presentaron cuatro (4) ausentismos debido accidente laboral que representaron un total de 16 días de incapacidad durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 89 Ausentismos Contratista de obra.

Mes	Enfermedad General	Accidente laboral	Enfermedad Profesional	Suspensión	Maternidad	Paternidad	Permiso Remunerado	Calamidad Domestica	Permiso No Remunerado
FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUL	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEP	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE 2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FEB 2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Consorcio VAPA

Número de casos de enfermedad laboral: Corresponde a las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral.

Días cargados: Es el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada.

La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada.

Número de días de trabajo programados en el mes es igual a: el número de días de trabajo programados en la empresa por el número de trabajadores.

Seguimiento a casos de salud especiales.
Para el periodo evaluado no se presentaron casos de salud especiales.

Análisis: De acuerdo con la información anterior se puede concluir que durante el periodo laborado el ausentismo fue de un 0% representando un porcentaje bajo, que no afectó de manera significativa la ejecución de las actividades de la obra.

442

8.5.5 Atención de emergencias

MAPO INGENIERIA S.A.S, remitió al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO–IDIGER, bajo radicado No. 2023ER6195 de fecha 16 de marzo de 2023, el plan de emergencias recibido por el Contratista de obra –CONSORCIO VAPA–, incluido en el plan de gestión en seguridad y salud en el trabajo numeral 24. Plan de emergencias ***"Todas las organizaciones sin importar su clase de riesgo, actividad económica o tamaño, tienen la necesidad de contar con metodologías prácticas que les permitan responder la manera más eficiente y eficaz a situaciones súbitas de emergencia que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema, ya sea por que causan daños a la integridad de las personas, pérdidas materiales y económicas, daños al medio ambiente, daños a la imagen de la organización o periodos de lucro cesante, entre otras".***

La interventoria verificó que el Contratista de obra –CONSORCIO VAPA– realizó socialización del plan de emergencias en la inducción al Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo impartida a cada trabajador en periodo de ingreso, adicionalmente interventoría verifico que contratista de obra realizo la conformación y capacitación de la brigada de emergencias, en evacuación y rescate, primeros auxilios y contra incendios.

El dia 01 de agosto de 2023, y el personal se identificó con un chaleco que lo acredito como brigadista.

Ilustración 89. Conformación y capacitación del plan de emergencia



Fuente Mapo ingenieria SAS, 2024.

La interventoría verificó el registro de inspecciones realizadas por el Contratista de obra –CONSORCIO VAPA– para el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024, dentro de las que se relacionan:

✓ Adecuada implementación de señalización del punto de encuentro instalada en el campamento.

✓ Punto PAC (camillas, extintor, botiquín, rutas de evacuación y salidas de emergencia) de tal forma que permanezcan en condiciones adecuadas.

A continuación, se evidencia la trazabilidad desde el informe N°1 hasta el informe N°13 de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en cuanto a implementación del Plan de Emergencias y que fueron verificadas por esta interventoría:

Ilustración 90. Cumplimiento Plan de emergencias contratista de obra



Fuente Mapo ingeniería SAS, 2024.

A su vez, la interventoría conto con los elementos para atención de emergencias (extintores, camillas y botiquín) y realizo las inspecciones de los equipos de emergencia, con el fin de tener en óptimas condiciones estos equipos.

Ilustración 91. Cumplimiento Plan de emergencias interventoría



Fuente Mapo ingeniería SAS, 2024.

Durante la ejecución del contrato, contratista de obra reporto dos emergencias las cuales se describen a continuación:

- El dia miércoles 13/09/2023 en horas de la noche se presentó incendio forestal la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de la localidad, controlando el fuego.

  El dia jueves 14/09/2023 el contratista de obra corroboró que la obra no sufriera afectaciones y activó el plan de emergencia, por lo cual continúo regando agua a puntos calientes que se avivaron por la brisa.

Ilustración 92. Atención de emergencia (conato de incendio 13/09/2023)



- El dia 1/02/2024 contratista de obra reporto conato de incendio en la parte sur de la ladera, por lo cual activo el plan de emergencias, cumpliendo con el mismo el personal de la brigada fue quien atendió oportunamente la emergencia utilizando las mangueras y extintores para sofocar el fuego. La emergencia fue controlada antes de la llegada del cuerpo de bomberos. No se presentaron personas lesionadas ni afectación a la estructura de la obra.

Ilustración 93. Atención de emergencia (conato de incendio 1/02/2024)



8.5.6 Administración y control de elementos de protección personal.

Durante el desarrollo del proyecto el contratista de obra realizó la entrega de elementos de protección personal (EPP) y dotación al personal contratado de manera directa por parte del consorcio (chalecos identificados con el número del contrato y logos de la entidad, camisas y chaquetas). Los registros de entrega de EPP y dotación se incluyen en el **Anexo SST 6F Registro entrega dotación, EPP Contratista de obra.**

El contratista presentó registros de entrega de EPP en los cuales se observa entrega de casco de seguridad, tapabocas, impermeable, guantes tipo vaqueta, uniforme (camisa pantalón), botas de seguridad y botas de caucho.

Ilustración 94. Registro fotográfico verificación uso EPP



Fuente Mapo ingeniería SAS, 2024.

AAG

8.5.7 Inspecciones de equipos de emergencia.

La interventoria verificó que el Contratista de obra realizo las inspecciones mensuales de los elementos para la atención de emergencias (extintores y botiquín) en obra, quedando en el registro según el documento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la interventoría y remitido a la entidad supervisora IDIGER el 16/03/2023 con radicado virtual No. 2023ER6195, estos soportes se presentaron mes a mes en los informes mensuales. Ver **Anexo 6N Reporte de inspecciones contratista de obra.**

Ilustración 95. Fotografías de Equipos de emergencia Contratista de obra.



Fuente: Mapo ingeniería SAS, 2024.

AA7

La interventoria realizó las inspecciones mensuales de los elementos para la atención de emergencias (extintores y botiquin) en oficina, estos soportes se presentaron en los informes mensuales. Ver **Anexo SST 6O Inspecciones elementos de atención emergencias interventoría.**

Ilustración 96. Inspecciones interventoria



Fuente: Mapo ingenieria SAS, 2024.

8.5.8 Hoja de vida de maquinarias y equipos.

Durante la ejecución del contrato FONDIGER No. 002 del 2023, contratista de obra reporto el ingreso de maquinaria correspondiente a Plataforma de elevación, Minicargador, vibro compactador, volquetas y retro excavadora, la relación de maquinaria y la documentación fue allegada a interventoría a través de los comunicados OFC-TEC-089-VP-2023 del 14/08/2023, OFC-TEC-084-VP-2023 del 9/08/2023 y OFC-TEC-066-VP-2023 del 6/07/2023, adicionalmente se reportó en los informes semanales y mensuales. Ver **Anexo SST 6P Documentación maquinaria y equipos.**


La interventoría verificó que, durante la ejecución del contrato, el contratista de obra realizara el mantenimiento a la maquinaria en obra por parte de personal especializado y quedo registrado en las hojas de mantenimiento de la maquinaria, igualmente contratista de obra realizó los preoperacionales, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria que se ingresó a obra en el transcurso del desarrollo del proyecto:

Tabla 90 Relación de Maquinaria y Volquetas.

MAQUINARIA Y EQUIPO	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
RETROEXCAVADORA KOBELCO	SK210LC-10	YQ15-20850	2018	J05ETA49274	10-07-2023	02-09-2023
VOLQUETA KENWORTH	SXX 267	-	2011	35274580	10-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SZO 698	-	2012	35288657	10-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TTP 770	-	2013	35305166	10-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	VEI 905	N439224	2007	35167249	10-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WCS 628	-	2014	35314527	10-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNT 929	-	2013	8206546	10-07-2023	Enero 2024
VOLQUETA INTERNATIONAL	TAX209	3HTWYAHT5DN403575	2013	35309091	29-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA KENWORTH	SNS 531	-	2013	35302852	29-07-2023	Enero 2024
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TTP 848	714448	2013	35306568	29-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WCS 629	-	2014	35314528	29-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA INTERNATIONAL	SNZ 896	3HTWYAHT2FN709376	2015	35329601	29-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA KODIAK 190	USD 346	9GDV7H4C18B006934	2008	9SZ38333	29-07-2023	Diciembre 2023
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TDS 178	-	2014	35295540	29-07-2023	Enero 2024
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	CAI50D	-	2008	MC096654	29-07-2023	11-12-2023
BOBCAT/D24	NA	S570	2017	BFG2112	29-07-2023	Febrero 2024

MAQUINARIA Y EQUIPO	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
RETROEXCAVADORA	NA	CAT3055EAWEZ1882	2017	7HA7332	06-10-2023	11-12-2023
BOBCAT/S185	NA	525022125	2005	05CO700	16-11-2023	02-12-2023
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CC12	NA	60116328	2005	00611651	19-12-2023	21-12-2023
EXCAVADORA SHANTUI	NA	RAS90CK13673	2024	CNJ0955	21-12-2023	23-01-2024
PLATAFORMAS DE ELEVACION PARA TRABAJO (MEWPS)	NA	10867	OTP 9	NA	20-2-2024	22-02-2024

Ilustración 97. Maquinaria y equipos

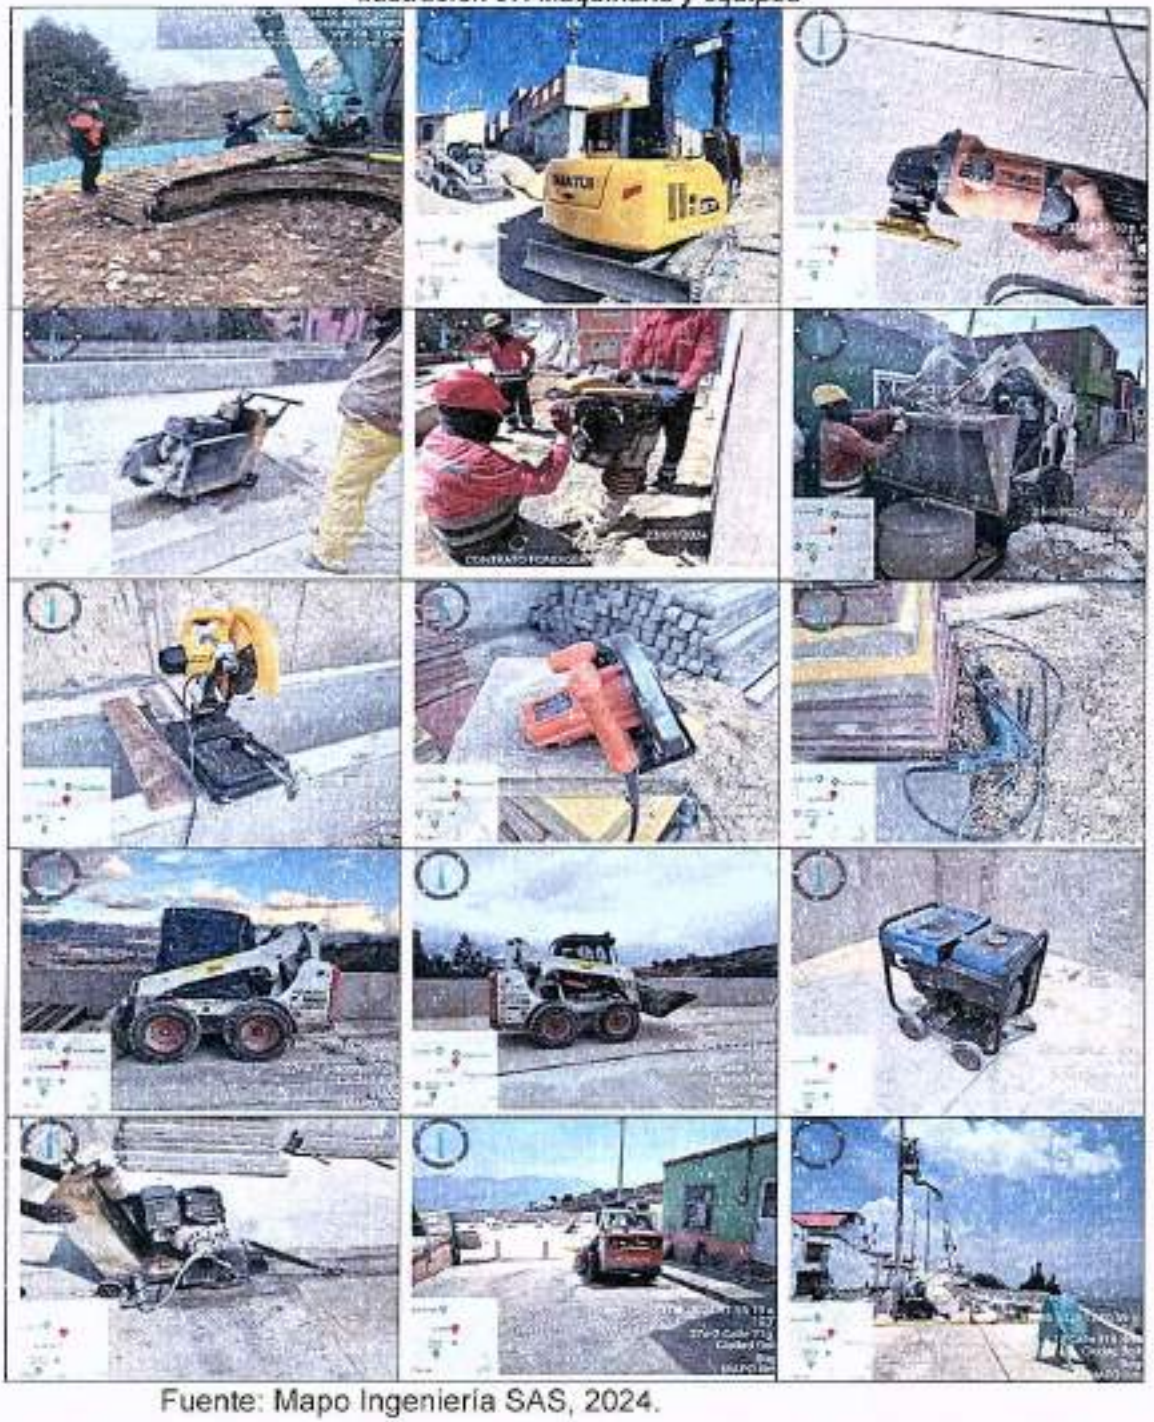

Fuente: Mapo Ingeniería SAS, 2024.

8.5.9 Seguimiento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

El Contratista de obra –CONSORCIO VAPA– remitió a está interventoria en el PLAN GENERAL DE OBRA, la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

La interventoría verificó el seguimiento a los controles administrativos relacionados en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y la implementación de la misma durante el desarrollo del proyecto, dentro de este seguimiento se evidenciaron y verificaron las siguientes actividades:

- Reunión del comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo.
- Pausas activas durante la jornada laboral.
- Inspección de extintores.
- Instalación de señalización en obra.
- Inspección de elementos de protección personal.
- Entrega de EPP y dotación.
- Entrega y uso de equipos para trabajos en alturas.

Adicionalmente en obra el contratista implementó controles en el sitio de ejecución de obra de acuerdo a los riesgos evidenciados -peligro público con una calificación no aceptable, Trabajos en alturas, biomecánico, entre otros, dentro de los cuales se contó con:

- Instalación de señalizaciones informativas con el fin de advertir las excavaciones profundas.
- Instalaron señalizaciones correspondientes a prohibir el paso a personal ajeno a la obra informar a la comunidad aledaña al sector sobre el riesgo de caída al vacio.
- Conformación y capacitación de la brigada.
- Capacitaciones del uso de los elementos de protección personal.

En la matriz IPER para el proyecto se identificaron riesgos y se valoraron los peligros a los cuales estaban expuestos las personas durante la ejecución del contrato, evidenciando el peligro público con una calificación no aceptable, trabajos en alturas, y biomecánico. La interventoría realizó la verificación a la identificación y control de los riesgos presentes, identificando los siguientes riesgos:

- Biológico (Virus). verificación en la disponibilidad de gel antibacterial y alcohol para la desinfección previa y posterior al uso de las herramientas, al igual que las manos, también se realizó la desinfección de las herramientas utilizadas. En la oficina se contó con lavamanos, jabón y gel antibacterial.

- Psicosocial. Se realizaron pausas activas, y descansos para consumo de alimentos y bebidas.

- Condiciones de seguridad (mecánico). Se realizaron las inspecciones preoperacionales de equipos y herramientas, adicionalmente se utilizaron los EPP de acuerdo al equipo.

- Condiciones de seguridad (locativo, caidas a diferente nivel). Se realizó señalización y demarcación.

- Condiciones de seguridad (trabajo en alturas). El personal conto con el curso actualizado de trabajo en alturas de acuerdo al decreto 4272 de 2021. Así mismo, se utilizaron equipos y andamios certificados. Al personal nuevo se le realizo la inducción SST y el examen médico ocupacional de ingreso.

- Condiciones de seguridad (públicos, robos, hurtos). En el proyecto se presentaron hurtos de materiales tales como: anclajes de biorrollos, postes para el cerramiento de la obra, tablones de madera, chatarra y residuos metálicos, entre otros. Por lo cual contratista de obra solicito acompañamiento de la policía nacional, adicionalmente se implementó vigilancia privada y se reforzó el cerramiento de la obra.

- Químico: La interventoría verificó que el contratista de obra –CONSORCIO VAPA–, para el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2023 al 29 de febrero de 2024 reportó en obra manipulación de sustancias químicas correspondiente a ACPM, inmunizante de madera y Sikaplan-impermeabilizante, estas sustancias se transportaron al sitio de ejecución de la obra en pequeñas cantidades en canecas con capacidad no más de 10lts debidamente rotuladas, con el fin de depositarlo en la máquina, además dispuso de un sitio de almacenamiento para las canecas, en la cual se implementó la respectiva señalización, ventilación, kits antiderrames y hojas de seguridad y finalmente la interventoria verificó el uso adecuado de Elemento de Protección Personal (EPP) para manipulación de sustancias químicas dentro de los que se relacionan; (1) Camisa manga larga; (2) Tapabocas; (3) Guantes.

Durante el desarrollo del proyecto no fue necesario actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos que aplicó en el proyecto para la Interventoría. Ver **Anexo SST 6Q Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Interventoría.**

Durante el desarrollo del proyecto no se identificaron riesgos nuevos a los iniciales ya identificados en la matriz del contratista de obra. Ver **Anexo SST 6R Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos contratista de obra.**

8.5.10 COPASST Y CCL

8.5.10.1 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

La interventoria evidenció que el contratista de obra el dia 11/07/2023, realizó inicialmente la conformación de un vigia, debido al número de personas contratadas inicialmente, sin embargo, a medida que avanzaba la contratación procedió a conformar el COPASST, el dia 10/08/2023, donde se definió como representante de los trabajadores, a la profesional Diana Castillo, como secretaria a la profesional Paola Moreno, y como representantes de los trabajadores a los profesionales Luis Durango y el Arquitecto Carlos López.

Así mismo, la interventoría verificó que el contratista de obra realizó las reuniones mensuales de COPASST durante los cuales llevó a cabo las siguientes actividades:

- Inscripción de los representantes del comité al curso virtual de las 50 horas.
- Programación de capacitaciones con la ARL sobre investigación de accidentes de trabajo.
- Capacitación del comité sobre sus funciones y responsabilidades.
- Participó en inspecciones de obra.
- Verificación de EPP en personal de obra.
- Verificación de las actividades de limpieza y desinfección requeridos por las medidas de bioseguridad.
- Reporte e investigación de los accidentes laborales presentados en obra.
- Verificación del cumplimiento del cronograma de capacitaciones.

Las anteriores actividades dan cuenta del cumplimiento de estos cronogramas por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, ver **Anexo 6S Actas reunión COPASST y CCL contratista de obra.**

A continuación, se relaciona la trazabilidad de las actividades desarrolladas por el CONSORCIO VAPA, que fueron verificadas periodo a periodo por esta interventoría:

Ilustración 98. COPASST contratista de obra

Acta de reunión vigía 11/07/2023	Convocatoria COPPAST 11/07/2023	Conformación COPASST 14/07/2023



Fuente Mapo ingeniería SAS, 2024.

8.5.10.2 Comité de Convivencia Laboral (CCL)

La interventoria verificó que el contratista de obra desarrollo tres (3) reuniones del comité de convivencia laboral en el transcurso de ejecución del contrato, y se reportó en el último comité llevado a cabo el dia 13/02/2024, un caso de conflicto entre trabajadores del consorcio, el comité recibió el día 12/02/2024 el formato de quejas relacionadas con situaciones de conflicto, por lo cual el comité procedió a abrir un espacio de dialogo con los trabajadores escuchando las partes involucradas para finalmente llegar a un acuerdo de convivencia para el buen desarrollo del contrato.

Ilustración 99. Reuniones comité de convivencia laboral Contratista obra



Así mismo la interventoría realizo la conformación del COPASST, **ver anexo 6T COPASST interventoría.**

8.6 REPORTE TRABAJO EN ALTURA Y CONFINAMIENTO

La interventoría verificó que para el periodo comprendido entre el 17/02/2023 de al 29/02/2024 el Contratista de obra –CONSORCIO VAPA– realizó actividades en alturas concernientes a:

Tabla 91. Actividades en alturas

ITEM	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Excavación de linea de trinchos en la parte pendiente de la ladera	Anexo SST 6U
2	Instalación de los trinchos	
3	Instalación de geotextil tejido TR5000	
4	Pañete de fachadas de las viviendas que colindan con el proyecto	
5	Construcción de pérgola	
6	Siembra de individuos arbóreos	

La interventoría realizó supervisión y seguimiento a las actividades de trabajo en alturas de acuerdo a la resolución 4272 de 2021 adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

- Acompañamiento y verificación de los permisos para trabajo seguro en actividades críticas.
- Se verificó que por parte del profesional SST del CONSORCIO VAPA se diligenciaron los permisos para trabajo en alturas, se realizara la inspección de

los equipos para trabajo en alturas, y se diligenciaran las hojas de vida registrando el estado de los implementos para el desarrollo adecuado de las tareas.

- Se verificó el cumplimiento del uso de los EPP durante el desarrollo las actividades de obra y se verifico la entrega al personal de los elementos que presentaron desgaste, durante la semana en curso.
- Supervisión y acompañamiento al programa de inducciones y capacitaciones.
- Supervisión y seguimiento al diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro bajo formato FT-SST-098, con el fin de identificar potenciales incidentes y condiciones de peligro para cada una de las tareas, elaborando procedimientos de seguridad y controles para minimizar riesgos y reducir la probabilidad de la materialización de incidentes y accidentes de trabajo.
- Así mismo se verificó que el personal contará con el entrenamiento requerido, así como el uso de los equipos de protección contra caídas requeridos para ejecutar la actividad, (líneas de vida, arnés y demás equipos de protección contra caídas).
- Recorridos en obra verificando el porte y uso adecuado de EPPs por el personal en el frente de obra.

Ilustración 100. Registro Fotográfico trabajo en alturas





Fuente Mapo ingeniería SAS, 2024.

La interventoría, además verificó los siguientes soportes del personal antes de la ejecución de la actividad:

- Hojas de vida de personal con su respectivo certificado de aprobación de curso para realizar actividades de trabajo en alturas.
- Exámenes médicos ocupacionales.
- Validación del curso ante el Ministerio de Trabajo.
- Afiliaciones de personal.
- Planillas de Seguridad Social.

La interventoría verificó el diligenciamiento adecuado de los registros que se enuncian a continuación:

- Permiso de Trabajo en alturas.
- Análisis de Trabajo Seguro.
- Inspecciones de equipos y de EPP.

- Correlación de hoja de vida de equipos con el registro de inspección.

Ver **Anexo SST 6U Reporte trabajo en alturas.**

Tabla 92. Consolidado certificados trabajo en alturas

Personal VAPA trabajo en alturas	Certificado	Anexo
Yenny Yulisa Cuesta Palacios	Bureau Veritas Colombia NIT. 900992376-4, del 2 al 3 de julio de 2023	**Anexo SST 6U Reporte trabajo en alturas.**
Luis Norbey Durango Vargas	Bureau Veritas Colombia NIT. 900992376-4, 8/07/2023	
Fernando Barreto Garzón	Bureau Veritas Colombia NIT. 900992376-4, 1/07/2023	
José Basora Silvestre	Prevención técnica en alturas S.A.S, NIT 901309746-2, del 25 al 28 de mayo de 2023	
Wilmar Alberto Sibaja Reyes	ETSA, NIT 901459576-1, 07/08/2023	
Juan Carlos Oviedo Arroyo	CEFECOL, NIT 901486560-7, 29/07/2023	
José Ángel Matute Acosta	CEFECOL, NIT 901486560-7, 29/07/2023	
Humberto Enrique Cortes Simerman	CEFECOL, NIT 901486560-7, 29/07/2023	
Benjamin Rafael Ramos Gómez	CEFECOL, NIT 901486560-7, 29/07/2023	
Fabio Oliveros Mendivil	ETSA, NIT 901459576-1, 09/08/2023	
Nolberto Otalora Cante	CEFECOL, NIT 901486560-7, 22/11/2023	
Efren Enrique Prada Hule	CEFECOL, NIT 901486560-7, 22/11/2023	
Héctor Fabio Lasso Hernández	Prevención técnica en alturas S.A.S, NIT 901309746-2, 13/09/2023	
Nelson Eduardo Ruiz Quiroga	Prevención técnica en alturas S.A.S, NIT 901309746-2, 23/03/2023	
Oscar Vladimir González Alvarado	SLANDA, NIT 901213311-9, 2/06/2023	
German Diaz Pinzón	SLANDA, NIT 901213311-9, 2/06/2023	

Fuente Mapo Ingenieria SAS, 2024.

8.7 REPORTE ACCIDENTES.

En el transcurso del desarrollo del proyecto, el contratista de obra, reportó 4 accidentes laborales a los cuales la interventoria realizó el respectivo seguimiento, a continuación, se describen los eventos reportados y el correspondiente proceso de reporte y cierre que el contratista de obra llevó a cabo para cada trabajador, ver **Anexo 6M Reporte de accidentes contratista de obra.**

El dia trece (13) de julio de 2023, se presentó un accidente de trabajo leve con el señor Fernando Barreto, el trabajador se encontraba realizando instalación de trinchos, cerca de él habia una retro excavadora vaciando tierra y al momento de caer la tierra al suelo una piedra salió de la cuchara con velocidad y lo golpeo en el pie derecho, posterior al golpe el trabajador presento inflamación, dolor y enrojecimiento. El contratista de obra le indico al trabajador desplazarse al centro

médico, donde recibió la atención, en la cual recibió incapacidad por cuatro días, una vez cumplida la incapacidad se reincorporo a sus labores. La incapacidad del trabajador fue desde el día 13 de julio hasta el 16 de julio del 2023, interventoría verifico que el contratista de obra realizo la respectiva investigación y registro del accidente en el formato correspondiente, realizo el informe de accidente de trabajo del empleador, realizaron además el reporte del accidente y cierre del mismo.

El día 18 de septiembre de 2023, el contratista de obra reporto un accidente de trabajo del señor Luis Durango.

El trabajador indico que al pisar el geotextil que estaba extendido no se percató que se encontraba una piedra debajo de este, piso la piedra y su pie izquierdo sufre una torcedura, el trabajador se retiró de la obra a tomar los quince minutos de desayuno y al momento de retomar nuevamente sus labores informa al área SST que presenta dolor e inflamación en su pie izquierdo, el contratista de obra le brindo los primeros auxilios y realizo el seguimiento para verificar la evolución, al día siguiente en las horas de la mañana el trabajador le informo al contratista que persistía el dolor en el pie, por lo cual el contratista de obra realizo el reporte a la ARL.

Contratista de obra realizo la investigación con el acompañamiento del COPASST generando acciones correctivas dentro de las cuales desarrolló una charla el día 18 de septiembre de 2023, a la cual asistieron 22 trabajadores, sobre trabajo-autocuidado mencionando la importancia de trabajar concentrado con el fin de evitar accidentes laborales, adicionalmente el dia 20 de septiembre de 2023 contratista de obra socializo el accidente de trabajo de Luis Durango con todos los empleados, la cual conto con la asistencia de 23 participantes, cumpliendo así con los requisitos necesarios frente al reporte y seguimiento del accidente laboral.

Ilustración 101. Reporte de accidentes (18 de septiembre 2023).



En el mes de enero de 2024 se presentó accidente de trabajo por parte del contratista WS, el hecho ocurrió el día viernes 12 de enero de 2024 cuando el trabajador Jorge Parrao mientras transportaba concreto en una carretilla, en el recorrido no se percató que habia una caja de inspección descubierta, por lo cual

(7441

dio un paso al vacío cayendo a distinto desnivel a una altura aproximada de 1.40 metros, golpeando su brazo derecho y su espalda a la altura del omoplato, se realizó el reporte a la ARL SURA y se brindaron los primeros auxilios y posteriormente se le indico al trabajador que debia acercarse a la clinica para que recibiera atención médica, el trabajador se retiró de la obra, pero no asistió al médico. Debido a lo anterior, el contratista le hizo un memorando al trabajador, igualmente este firmo carta donde se responsabiliza de la no asistencia al centro de salud.

El consorcio tomo medidas correctivas dentro de ellas: señalizar y cubrir todas las cajas de inspección del proyecto, el día 16 de enero de 2024, realizo capacitación sobre condiciones inseguras, importancia del trabajo concentrado y la socialización del accidente las cuales tuvieron una asistencia de 34 trabajadores, cada una.

Ilustración 102. Reporte de accidentes (12 de enero de 2024).



El dia 22 de febrero de 2024, el contratista de obra reporto el accidente laboral presentado por el señor Carlos Andrés Beltrán Reyes, trabajador del subcontratista VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA, se reportó que siendo las 2:00 pm el trabajador inicio la limpieza del minicargador, equipo que el opera, actividad que está dentro de sus funciones, evidenciando que en la cuchara del minicargador habian residuos de concreto pegados, por lo cual el colaborador utiliza maseta y puntero para despegar el concreto de la cuchara, durante la limpieza el puntero se le resbalo golpeo su dedo pulgar de la mano izquierda causando dolor e inflamación.

El contratista de obra realizó el reporte a la ARL, y le indicó al trabajador asistir al centro médico donde recibió quince días de incapacidad, el día 8 de marzo de 2024 el trabajador asistió al médico para seguimiento, en este seguimiento el medico diagnóstico fractura de la falange distal del pulgar izquierdo, la cual es manejada ortopédicamente. El trabajador debe asistir a diez (10) secciones de terapias fisicas, y asistir a control nuevamente en tres semanas.

Dentro de las medidas verificadas por la interventoría, desarrolladas por el contratista de obra, realizó una charla el dia 28/02/2024 sobre concentración en el trabajo y uso adecuado de herramientas al cual asistieron 20 trabajadores y este mismo dia se socializo sobre el accidente del trabajador Andrés Beltrán.

AG1

17442

Ilustración 103. Reporte de accidentes (22 de febrero de 2024).



8.8 REPORTE ESTADO DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS

La interventoria verificó que los equipos de atención de primeros auxilios como botiquín, camilla, extintor y señalización con los cuales fue dotada la oficina administrativa estuvieran en buenas condiciones para su uso al momento de presentarse alguna emergencia en obra. Estos elementos fueron inspeccionados en el periodo de reporte evidenciando que estos se encontraban en perfectas condiciones para su uso.

Se verificó la señalización y demarcación de las zonas con riesgo de caida a distinto nivel (conos, cinta de señalización). La interventoría supervisó el cumplimiento al Plan SST, plan de emergencias y normatividad vigente en temas SST, conforme al decreto 2157 de 2017, la ley 1523 de 2012 y resolución 312 de 2019.

Se realizó la inspección mensual de equipos contra incendios y botiquín, los cuales se encuentran en perfecto estado. Ver **Anexo SST 6O Inspecciones de equipos de emergencia Interventoría.**

8.9 REPORTE PLAN DE EMERGENCIAS

El contratista radicó el día veinte (20) de febrero el Plan de Emergencias, la versión final aprobada por la interventoria se radicado al IDIGER el día 16 de marzo 2023, mediante radicado virtual No. 2023ER6195.

Durante el desarrollo del presente proyecto la interventoría verificó constantemente la señalización y demarcación de las zonas con riesgo de caida a distinto nivel (conos, cinta de señalización). De igual manera se supervisó el cumplimiento del plan de emergencias y normatividad vigente en temas SST, conforme al decreto 2157 de 2017, la ley 1523 de 2012 y resolución 312 de 2019.

462

La interventoría llevó a cabo la verificación de los elementos del plan de emergencia (camilla, botiquin y extintor) de la oficina y áreas operativas del contratista Consorcio VAPA.

Durante la inducción SST de ingreso a la empresa, ya sea para personal directo o contratista, el contratista de obra realizó la socialización al personal el Plan de Emergencias y las medidas a tomar en caso de una emergencia.

8.10 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.

Para el periodo del presente proyecto el contratista de obra cumplió con las metas propuestas para cada indicador, en las tablas anexas se presentan el resumen del cumplimiento de acuerdo con lo definido en la resolución 312 del 2019, por cada mes de ejecución. ***Ver Anexo SST 6V Indicadores, objetivos y metas Contratista de obra.***

8.11 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

El 14 de agosto de 2023, mediante el oficio OFC-TEC-090-VP-2023, el Consorcio VAPA remitió el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres correspondiente al contrato FONDIGER No. 002 del 2023. Como resultado, se convocó una mesa de trabajo con el IDIGER el día 25 de agosto de 2023 para revisar el documento, durante la cual se generaron diversas observaciones.

No obstante, el 13 de septiembre de 2023, el contratista de obra informó, a través del oficio OFC-TEC-124-VP-2023, que había radicado el PGRD en la plataforma del IDIGER. Cabe señalar que, antes de esta radicación, el documento no había sido remitido por el Consorcio VAPA a la interventoría, lo que impidió su revisión y aval por parte de la interventoría. En consecuencia, no se pudo verificar si el contratista de obra había subsanado las observaciones realizadas en la mesa de trabajo del 25 de agosto de 2023.

Este documento es parte fundamental de la documentación de prevención y acción que debía considerarse durante la etapa constructiva del proyecto bajo el contrato FONDIGER No. 002-2023. En él se abordan los mecanismos de gestión del riesgo y atención de emergencias y desastres, incluidas las acciones coordinadas con las entidades distritales para la atención y prevención en la localidad de Ciudad Bolívar. El objetivo principal es dar una respuesta oportuna a posibles eventos de desastres catastróficos que puedan afectar el territorio en la localidad de influencia, con el fin de aportar a la reducción de afectaciones en seres humanos, daños ambientales y pérdidas económicas.

Durante la ejecución del proyecto, no se presentaron eventualidades que requirieran la activación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Todas las actividades se desarrollaron según lo previsto, sin incidentes que ameritaran la puesta en marcha de las medidas contenidas en el plan.

8.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó un control exhaustivo del personal del contratista de obra, reportando las novedades de nómina tales como ingresos, egresos, ausencias justificadas y no justificadas, licencias remuneradas y no remuneradas. El 100% del personal cuenta con su examen médico ocupacional de ingreso.
- No se presentaron accidentes laborales en el personal de la interventoría.
- Los accidentes laborales reportados por el contratista de obra fueron notificados, investigados y se tomaron las medidas correctivas necesarias, cumpliendo con la normativa vigente.
- Se llevó a cabo el control y seguimiento de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo el indicador de accidentalidad, índice de frecuencia, índice de severidad, índice de lesión incapacitante, horas hombre trabajadas (HHT) y el control diario de maquinaria y equipos.
- Se revisaron los soportes de pago de la seguridad social del contratista de obra, el Consorcio VAPA.
- Se verificó la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación.
- Se realizaron charlas de seguridad para desarrollar conocimientos y habilidades específicas en el trabajo y modificar actitudes respecto al puesto y ambiente laboral. El contratista de obra también implementó pausas activas.
- El contratista de obra llevó a cabo reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) cumpliendo con la resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994, participando activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Se verificó el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para identificar las actividades de cada tarea y los controles para evitar riesgos. Asimismo, el contratista VAPA realizó inspecciones preoperacionales y de seguridad a los equipos.
- Se registró y controló la maquinaria presente en el proyecto, además de elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de los equipos.
- Se verificó que el contratista de obra realizara los exámenes médicos ocupacionales de ingreso según la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 312 de 2019, notificando las recomendaciones a cada trabajador.
- Se comprobó el cumplimiento de los sistemas de señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, zonas de circulación y almacenamiento para prevenir incidentes y accidentes laborales.

- Se elaboró y presentó el plan de emergencias del proyecto, contemplando los recursos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia. El plan incluye el listado de teléfonos de emergencia y la conformación de brigadas de emergencia en temas como evacuación y rescate, primeros auxilios y control de incendios, además de los procedimientos normalizados correspondientes.
- El contratista de obra gestionó adecuadamente los residuos de construcción y demolición (RCD).

9 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

A continuación, se relaciona la correspondencia tramitada entre la interventoría y la Entidad., **ver Anexo 7.A correspondencia.**

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
01	001-008-2023	Entrega hojas de vida personal interventoria	17 abril 2023 N. Radicado 2023ER9573
02	003-008-2023	Firma acta inicio interventoría	15 febrero 2023 Correo electrónico
03	004-008-2023	Entrega juste hojas de vida interventoria	17 febrero 2023 Correo electrónico
04	005-008-2023	Radicación plan de gestión ambiental de obra y plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición de obra	06 maro 2023 Correo electrónico
05	006-008-2023	Radicación plan de gestión social de obra	08 marzo 2023 N. Radicado 2023ER5464
06	007-008-2023	Radicación plan de calidad y de inspección y ensayos de obra	08 marzo 2023 N. Radicado 2023ER5471
07	008-008-2023	Radicación plan de manejo de trafico de obra	08 marzo 2023 N. Radicado 2023ER5472
08	009-008-2023	Radicación plan de manejo tráfico de obra Radicación flujo de caja APU's, AIU de obra	08 marzo 2023 N. Radicado 2023ER5492
09	010-0082023	Solicitud contrato de obra e interventoria	15 marzo 2023 N. Radicado 2023ER6084
10	011-008-2023	Radicación sistema de gestión de seguridad en el trabajo SG-SST de obra	16 marzo 2023 N. Radicado 2023ER6195
12	013-008-2023	Radicación hojas de vida obra	21 marzo 2023 N. Radicado 2023ER6364
13	016-008-2023	Observaciones a los estudios y diseños por parte de la interventoría	04 abril 2023 N. Radicado 2023ER7702
14	017-008-2023	Solicitud al modificatorio al contrato de obra N. FONDIGER-002-2023	04 abril 2023 N. Radicado 2023ER7645
15	018-008-2023	Solicitud respuesta evaluación hojas de vida personal de interventoria- cambio personal de interventoria	05 abril 2023 N. Radicado 2023ER7887
16	019-0082023	Alcance al radicado IDIGER N. 2023ER5231-Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición de obra	05 abril 2023 N. Radicado 2023ER7888
17	020-008-2023	Radicación plan de gestión social de interventoria	05 abril 2023 N. Radicado

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
			2023ER617886
18	021-008-2023	Radicación documentación preliminar de obra	13abril 2023 N. Radicado 2023ER8278
19	022-008-2023	Radicación informes semanales de obra e interventoría	13 abril 2023 N. Radicado 2023ER8280
20	023-008-2023	Alcance al radicado N.2023ER7887-SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL INTERVENTOTIA	13 abril 2023 N. Radicado 2023ER8279
21	025-008-2023	Cambio arquitecto residente de obra	27 abril 2023 N. Radicado 2023ER8813
22	026-008-2023	Solicitud de modificatorio al contrato de interventoría N. FONNDIGER 008-2023	21 abril 2023 N. Radicado 2023ER8901
23	027-008-2023	Entrega de residuos y diseños obras de urbanismo secretaria distrital del habitad	21 abril 2023 N. Radicado 2023ER8961
24	028-008-2023	Información entrega estudios y diseños obras de urbanismo secretaria distrital del habitad	21 abril 2023 N. Radicado 028
25	030-008-2023	Cambio arquitecto residente obra	27 abril 2023 N. Radicado 2023ER9572
26	031-008-2023	Entrega informe mensual de obra N.1	17 abril 2023 N. Radicado 2023ER9574
27	032-008-2023	Radicación informes semanales de obra e interventoría	28 abril 2023 N. Radicado 2023ER9713
28	033-008-2023	Radicación sistema de gestión de seguridad en el trabajo de interventoría	28 abril 2023 N. Radicado 2023ER9712
29	034-008-2023	Entrega informe mensual de obra N.2	03 mayo 2023 N. Radicado 2023ER10221
30	037-008-2023	Información entrega estudios y diseños obras de urbanismo secretaria distrital del habitad	05 mayo 2023 2023ER10417
31	038-008-2023	Alcance justificación ajuste a los diseños	10 mayo 2023 2023ER10706
32	039-008-2023	Radicación informes semanales de obra e interventoría	10 mayo 2023 OFICIO
33	040-008-2023	Aval de la interventoría de los ajustes al diseño	11 mayo 2023 2023ER10901
34	041-008-2023	Alcance oficio 009-008-2023, radicado Idier 2023ER5492-radicacion programación, flujo de caja APU's, AIU de obra	12 mayo 2023 2023ER11042

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
35	042-008-2023	Alcance al radicado IDIGER N.2023ER7886-radicacion plan de gestión social de interventoría	16 mayo 2023 2023ER11197
36	043-008-2023	Alcance oficio 0331-008-2023 del 26 de abril 2023 con radicado IDIGER N.2023ER9574 radicación informe mensual N.1DE OBRA y al oficio 034-008-2023 del 03 de mayo del2023 con RADICADO IDIGER N.2023ER10221, respuesta al oficio RO-136935 con radicado IDIGER N.2023EE6314	16 mayo 2023 2023ER11198
37	044-008-2023	Respuesta al oficio N.RO136902, radicados IDIGER 2023ER7645, 2023ER7656, 2023ER8092, 2023ER8813, 2023ER8901	17 mayo 2023 2023ER11377
38	045-008-2023	Cambio ingeniero residente de obra	17 mayo 2023 2023ER11400
39	055-008-2023	Estado de avance de los ajustes a los diseños	23 junio 2023 Oficio
40	056-008-2023	Cambio arquitecto residente obra	28 junio 2023 2023ER14605
41	057-008-2023	Solicitud cambio de residente de interventoría	28 junio 2023 2023ER14608
42	059-008-2023	Entrega de documentación para tramite de permiso de aprovechamiento forestal	30 junio 2023 2023ER14770
43	061-008-2023	Alcance radicado IDIGER N.2023ER14770- entrega de documentación para tramite de permiso de aprovechamiento forestal	07 julio 2023 2023ER15358
44	063-008-2023	Entrega de diseños consorcio VAPA	06 julio 2023 Correo electrónico
44	067-008-2023	Entrega identificación postes eléctricos	13 julio 2023 2023ER15933
45	068-008-2023	Entrega informes mensuales de obra e interventoría	13 julio 2023 Correo electrónico
46	069-008-2023	Solicitud plan de contingencia al contratista de obra	17 julio 2023 2023ER16071
47	071-008-2023	Solicitud de oficios de aprobación de los informes mensuales de la interventoría 1 y 2	14 julio 2023 Correo electrónico
48	072ª-008-2023	Recomendación de aprobación balance mayores y menores cantidades de obra	01 agosto 2023 Correo electrónico
49	073-008-2023	Retiro de postes alumbrado público en zona de proyecto	18 julio 2023 Correo electrónico
50	078-008-2023	Radiación informe mensual de interventoría N.1	24 julio 2023 2023ER16508
51	079-008-2023	Radicación informe de interventora N.2	24 julio 2023 Oficio 079

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
52	080-008-2023	Solicitud retiro material antrópico por demolición de predios ubicados sobre la zona de ejecución del contrato de FONDIGER-002-2023	25 julio 2023 Correo electrónico
53	082-008-2023	Solicitud estado del trámite consecución por parte de la entidad carta de aprobación de fotometría de la UAESP	25 julio 2023 2023ER16616
54	087-008-2023	Radicación de informe mensual de interventoría N.2	02 agosto 2023 Oficio 087
55	092-008-2023	Entrega hoja de vida especialista estructural	08 agosto 2023 2023ER17659
56	098-008-2023	Entrega acta de recibo parcial de obra N.1	10 agosto 2023 2023ER17863
57	099-008-2023	Entrega del acta N.3 del recibo parcial de obra N.2	10 agosto 2023 2023ER17862
58	101-008-2023	Radicación informe mensual de interventora N.2	10 agosto 2023 2023ER17864
59	103-008-2023	Radicación informe de interventoria N.3	11 agosto 2023 2023ER19029
60	103*-008-2023	COMUNICACIÓN - TRÁMITE DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - OBLIGACIONES DEL CONTRATO FONDIGER-008-2023.	21 agosto 2023 Correo electrónico
61	108-008-2023	Aval de la interventoría al plan de contingencia para el proyecto de la referencia	15 agosto 2023 2023ER18696
61	109-008-2023	Aval de la interventoría la solicitud de cambio de tipo de madera para los trinchos	15 agosto 2023 Correo electrónico
63	114-008-2023	Remoción en masa desprendimiento de roca en ladera	18 agosto 2023 Correo electrónico
65	117-008-2023	Radicado IDIGER N.2023ER14608 junio 28 de 2023. Evaluación hoja de vida cambio residente de obra	22 de agosto 2023 2023ER18642
68	125-008-2023	Informe mensual de obra N.5	25 agosto 2023 2023ER18996
69	127-008-2023	Radicación informes semanales de interventoría	24 agosto 2023 2023ER18974
70	128-008-2023	Aprobación modificatorio N.2 y prorroga al contrato N.002-2023	25 agosto 2023 2023ER18989
71	130-008-2023	Entrega plan de interventora físico	24 agosto 2023 Oficio
72	131-008-2023	Entrega versión final informes mensuales de interventoría N.1,2,3 y 4	25 agosto 2023 2023ER18994
73	133-008-2023	Aprobación y validación a los ajustes de los estudios y diseños	30 agosto 2023 2023ER19335
74	135-008-2023	Entrega acta de recibo parcial de obra N.1	09 septiembre 2023

17420

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
			2023ER20187
75	136-008-2023	Entrega acta de recibo parcial de obra N.2	06 septiembre 2023 2023ER20186
76	137-008-2023	Cambio de profundidad en el alcance de los postes de trinchos	04 septiembre 2023 Correo electrónico
77	138-008-2023	Respuesta a la solicitud de ensayos de compactación	04 septiembre 2023 Correo electrónico
78	140-008-2023	Cambio ingeniero residente de obra	06 septiembre 2023 2023ER20188
79	141-008-2023	Radicación informes semanales de interventoria	06 septiembre 2023 2023ER20189
80	142-008-2023	Modificatorio 2 prorrogas contratos 002 y 008 2023	11 septiembre 2023 2023ER 20585
81	143-008-2023	Entrega de documentación cuenta N.1 de interventoría	11 septiembre 2023 2023ER20590
82	144-008-2023	Entrega documentación cuenta N. 2 de interventoría	11 septiembre 2023 2023ER20588
83	145-008-2023	Cambio residente gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST-SGA	11 septiembre 2023 2023ER20587
84	148-008-2023	Informe mensual N.6 de obra	14 septiembre 2023 2023ER20932
85	150-008-2023	Entrega acta de recibo parcial de obra N.3	15 septiembre 2023 2023ER20935
86	152-008-2023	Entrega versión final informe mensual de interventoria	19 septiembre 2023 2023ER21296
87	154-008-2023	Entrega versión final informe mensual de interventoria N.6	21 septiembre 2023 2023ER21456
88	155-008-2023	Entrega documentación cuenta N.3 de interventoría	21 septiembre 2023 2023ER21457
89	157-008-2023	Comunicación tramite de presunto incumplimiento obligaciones del contrato FONDIGER 008-2023	27 septiembre 2023 Correo electrónico
90	158-008-2023	Respuesta 2023EE19171devlucion radicado 2023ER20189-radicacion informes semanales de interventoría	29 septiembre 2023 2023ER21922
91	161-008-2023	Respuesta a los oficios con radicado IDIGER N. 2023EE18305 y 2023	29 septiembre 2023 2023ER22072
92	168-008-2023	Alcance oficio N.161-008-2023- entrega ajustes a diseños solicitud de modificatorio N.2 y solicitud de prorrogas	03 octubre 2023 2023ER22553
93	169-008-2023	Aprobación balance económico de los estudios y diseños ajustado	05 octubre 2023 2023ER22892
94	170-008-2023	Respuesta al oficio con radicado IDIGER N.2023EE18305-entrega de los ajustes a los diseños	05 octubre 2023 2023ER22893
95	171-008-2023	Respuesta al oficio con radicado IDIGER N. 2023EE18304- entrega de las	05 octubre 2023 2023ER22894

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
		actividades no previstas y solicitud de inclusión en el contrato de obra	
96	172-008-2023	Respuesta a observaciones informe N.6 de interventoria FONDIGER 008-2023 radicado N. 2023EE19513	04 octubre 2023 2023ER22801
97	172ª-008-2023	Respuesta a observaciones informe 5de interventoria FONDIGER 0082023 radicado N. 2023EE19513	09 octubre 2023 Correo electrónico
98	173-008-2023	Respuesta a observaciones informe 5de interventoria FONDIGER 0082023 radicado N. 2023EE19513	09 octubre 2023 Correo electrónico
99	174-008-2023	Aprobación de prorroga contrato de obra N. FONDIGER 002DE 2022	04 octubre 2023 Oficio
100	175-008-2023	Solicitud prorroga contrato de interventoria N. FONDIGER 008 DE 2022	04 octubre 2023 Oficio
101	176-008-2023	Entrega informe mensual de interventoría N.7	05 octubre 2023 2023ER22901
102	177-008-2023	Informes semanales subsanados del 17 al 26	04 octubre 2023
103	178-008-2023	Alcance al oficio 175-008-2023- prorroga al contrato de interventoría	05 octubre 2023 2023ER22802
104	179-008-2023	Alcance al oficio 174-008-2023- prorroga al contrato de obra	05 octubre 2023 2023ER22915
105	181-008-2023	Entrega documentación cuenta N.2 de interventoria	06 octubre 2023 2023ER22993
106	183-008-2023	Alcance al los radicados 2023ER22893 y 2023ER22894- entrega de documentación digital- ajustes a los diseños	06 octubre 2023 2023ER22058
107	186-008-2023	Solicitud encuesta de satisfacción a la comunidad	12 octubre 2023 Correo electrónico
108	192-008-2023	Informe mensual N.7 de obra	17 octubre 2023 2023ER23885
109	193-008-2023	Entrega acata recibo parcial de obra N.3	17 octubre 2023 Oficio
110	194-008-2023	Aval factura feva N.11 acta de recibo parcial de obra N.3	17 octubre 2023 Oficio
111	195-008-2023	Informes semanales subsanados del 27 al 29 y informes semanales del 30 al 34 en fisico	17 octubre 2023 2023ER23884
112	196-008-2023	Entrega documentación cuenta N.3 de interventoria	18 octubre 2023 2023ER23936
113	199-008-2023	Entrega informe visita técnica deslizamiento sector 'parte baja paseo llimani'-VT 002 -2023-NG	19 octubre 2023 2023ER23988 Correspondencia
114	200-008-2023	Aprobación diseño rampa	19 octubre 2023 Correo electrónico
115	202-008-2023	Aprobación informe fitosanitario	19 octubre 2023 Correo electrónico
119	207-008-2023	Aprobación programación de obra y flujo de inversión	20 octubre 2023 Correo electrónico

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
124	212-008-2023	Cambio profesional social	26 octubre 2023 En fisico
125	212-008-2023	Cambio profesional social	26 octubre 2023
126	216-008-2023	Radicación pólizas según modificatorio N.2	26 octubre 2023
127	219-008-2023	Informes semanales 35 y 36 entregado en fisico	30 octubre 2023
128	220-008-2023	Concepto forestal desistimiento aprovechamiento forestal individuos arbóreos	30 octubre 2023
129	221-008-2023	Radicación pólizas según modificatorio N.2 de obra	31 octubre 2023
130	222-008-2023	Entrega informe mensual de interventoria N.8	03 noviembre 2023 2023ER25448
131	225-008-2023	Comunicación solicitud entrega informe mensual N.8 radicado IDIGER N. 2023EF22477 FECHA DEL 01-11-2023-CR 50282	07 noviembre 2023 2023ER25562
132	230-008-2023	Entra documentación cuenta N.5 de interventoria	15 noviembre 2023 2023ER25048
133	231-008-2023	AVAL FACTURA FVEA N.15 acta recibo parcial de obra N. 5	14 noviembre 2023 Oficio
134	232-008-2023	Respuesta al radicado IDIGER N.2023EE22783	15 noviembre 202 2023ER26044
135	233-008-2023	Entrega acta recibo parcial de obra N.5	15 noviembre 2023 2023ER26050
136	234-008-2023	Informe mensual N.8 de obra	15 noviembre 2023 2023ER26049
137	235-008-2023	Informes semanales 37 y 38 entrega en fisico	15 noviembre 2023 2023ER26046
138	236-008-2023	Entrega del diseño del suds piloto tipo 8, denominado jardinera con tanque de retención	16 noviembre 2023 Correo electrónico
139	237-008-2023	Cambio ingeniera directora interventoria	28 diciembre 2023 2023ER29139
140	238-008-2023	Entrega acta recibo parcial de obra N.5	Noviembre 20 2023 2023ER26050
141	239-008-2023	Aval factura FEVA N.17 acta recibo parcial de obra N.5	Noviembre 20 2023 2023ER26050
142	240-008-2023	Concepto desistimiento tramite silvicultural	20 noviembre 2023 Correo electrónico
143	241-008-2023	Entrega documentación cuenta N.5 interventoria	21 noviembre 2023 2023ER26502
144	243-008-2023	Respuesta radicada 2023EE23289 entrega informe mensual N.8 ajustado	21 noviembre 2023 2023ER26504
145	244-008-2023	Profesional arquitecto residente de interventoria	20 noviembre 2023 2023ER26502

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
146	245-008-2023	Informe mensual N.9 obra	27 noviembre 2023
147	246-008-2023	Entrega acta recibo parcial obra N.6	27 noviembre 2023 2023ER27725
148	247-008-2023	Aval factura FEVA N.18 acta recibo parcial obra N.6	27 noviembre 2023 2023ER27725
149	248-008-2023	Entrega informe mensual de interventoría N.9	28 noviembre 2023 2023ER26957
150	249-008-2023	Entrega documentación cuenta N.6 de interventoría	28 noviembre 2023 Físico
151	250-008-2023	Informe mensual de obra N.9	27 noviembre 2023 Físico
152	252-008-2023	Entrega documentación cuenta N.5 de interventoría respuesta radicado N. 2023 EE24266	01 diciembre 2023 2023ER27322
153	254-008-2023	Entrega acta de recibo de obra N.6	04 diciembre 2023 2023ER28379
154	255-008-2023	Aval factura FEVA N.19 acta de recibo parcial de obra N.6	04 diciembre 2023 2023ER28379
155	256-008-2023	Entrega documentación cuenta N.6 de interventoría	04 diciembre 2023 Físico
156	258-008-2023	Alcance oficio N.256-008-2023 -entrega documentación cuenta N.6 de interventoría	06 diciembre 2023 Físico
157	259-008-2023	Solicitud prorroga N.2 de obra contrato 002-2023	14 diciembre 2023 2023ER28219
158	260-008-2023	Solicitud prorroga N.2y adición N.2 contrato de interventoría -008-2023	14 diciembre 2023 2023 ER28220
160	262-008-2023	Informes semanales 35 al 39 entrega subsanados en físico	14 diciembre 2023 2023ER28221
161	263-008-2023	Solicitud protocolo correctivo hormigueo columnas pérgolas	13 diciembre 2023 Correo electrónico a VAPA el 13/12/2023
162	268-008-2023	Entrega documentación cuenta N.7 de interventoría	15 diciembre 2023 2023ER28387
163	269-008-2023	AVAL FACTURA FVEA N.20 ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA N.7	15 diciembre 2023 Oficio
164	270-008-2023	Entrega acta recibo parcial obra N.7	15 diciembre 2023 2023ER28379
165	271-008-2023	Entrega informe mensual de interventoría N.10	18 diciembre 20023 2023ER28494
166	274-008-2023	Informes semanales 40 al 42	19 diciembre 2023 2023ER28624
167	278-008-2023	Solicitud prorroga N.2 OBRA	26 diciembre 2023 Correo electrónico

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
168	279-008-2023	Solicitud prorroga N.2 y adición N.2 contrato de interventoría- 008-2023	26 diciembre 2023 2023ER29015
169	283-008-2023	Entrega documentación cuenta N.7 de interventoría	03 enero 2024 2024ER105
170	292-008-2023	Alcance radicado N.2023ER29139	11 enero 2024 2024ER455
172	294-008-2023	Respuesta al oficio cr-50860 radicado IDIGER N.2023 EE1140	15 enero 2024 2024ER748
173	295-008-2023	Informe mensual N.11 de obra	15 enero 2024 2024ER751
174	296-008-2023	Entrega informe mensual de interventoría N.11	15 enero 2024 2024ER749
175	298-008-2023	Radicación pólizas según modificatorio N.3 obra	15 enero 2024 2024ER744
176	299-008-2023	Radicación pólizas según modificatorio N.3	15 enero 2024 2024ER745
177	301-008-2023	Respuesta al radicado 2023EE24257- solicitud evaluación técnicas de os desprendimientos de material que se están presentando en la corona del antiguo frente de explotación de cantera localizado al interior del área de intervención con el fin de evaluar si en la actualidad se compromete la ejecución de las obras y/o de la vida útil de las mismas	15 enero 2024 2024ER747
178	302-008-2023	Entrega informes semanales 43 al 45 en físico	15 enero 2024 2024ER746
180	305-008-2023	Entrega documentación cuenta N.8 de interventoría	17 enero 2024 2024ER1066
181	306-008-2023	Entrega acta de recibo parcial de obra N.8	17 enero 2024 2024ER1065
182	308-008-2023	Recomendación de aprobación balance mayores y menores cantidades obra	17 enero 2024 2024ER1072
183	312-008-2023	Entrega informes semanales 46 al 49 en físico	05 febrero 2024 2024ER2489
184	313-008-2023	Entrega documentación cuenta N.8 de interventoría	05 febrero 2024 2024ER2487
185	316-008-2023	Concepto geológico – geotécnico consorcio VAPA	09 febrero 2024 Correo electrónico correspondencia IDIGER
187	318-008-2023	Radicación informe mensual N.12 de obra	16 febrero 2024 2024ER3536

No.	Identificador	Asunto	Fecha de ENVIADO
189	320-008-2023	Entrega acta de recibo parcial de obra N.9	16 febrero 2024 2024ER3535
190	321-008-2023	Entrega informe mensual de interventoría N.2	16 febrero 2024 2024ER3534
191	322-008-2023	Entrega documentación cuenta N.9 de interventoría	16 febrero 2024 2024ER3537
192	326-008-2023	Entrega informes semanales 50 al 52 en físico	26 enero 2024 2024ER4065
194	329-008-2023	Respuesta, radicado 2024EE3097-solicitud cumplimiento dedicación profesional social interventoría contrato FONDIGER N.008 de 2023	01 marzo 2024 2024ER4410
195	330-008-2023	Traslado informe forestal de obra	28 febrero 2024 2024ER4268
197	332-008-2023	Entrega documentación N.9 de interventoría	04 marzo 2024 2024ER4653
198	340-008-2023	Acta terminación contrato de interventoría	26 marzo 2024 2024ER6208
199	342-008-2023	Solicitud cierre de pin ambiental N.22863	06 abril 2024 2024ER7000
200	343-008-2023	Entrega informe mensual de interventoría N.13	10 abril 2024 2024ER7138
201	344-008-2023	Radicación informe mensual N.13 de obra	10 abril 2024 2024ER7137

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida de la entidad supervisora IDIGER, **ver Anexo 6.A Correspondencia.**

No	Identificador	Asunto	Fecha de recibido
1	CR-46608	Citación formal – firma acta de inicio	15 febrero 2023 2023EE2355
2	CR-46943	Citación visita técnica de obra	01 marzo 2023 2023EE3287
		Respuesta a la radicación plan de gestión de obra y plan de gestión integral de residuos de construcción y	21 marzo 2023

17456

No	Identificador	Asunto	Fecha de recibido
3	RO-135594	demolición de obra con radicado 2023ER5231 del 6 de marzo de 2023	2023EE4664
4	RO-135891	Respuesta a la radicación plan de gestión de obra y plan de gestión integral	31 marzo 2023 2023EE5737
5	RC-47376	Entrega propuesta técnica y económica a los ajustes de diseños contrato de obra FONDIGER 002-2023 y respuesta a su oficio 010-008-2023	31 marzo 2023 2023EE5795
6	RO-136255	Respuesta evaluación hojas de vida personal de interventoría- cambio personal de interventoría	12 abril 2023 2023EE6217
7	RO-136378	Respuesta evaluación hojas de vida personal de interventoría- cambio personal- su oficio 023-008-2023	19 abril 2023 2023 EE6707
8	CR-47665	Invitación a mesa de trabajo	19 abril 2023 2023EE6710
9	CR-47858	Oficio 016-008-2023-radicaco IDIGER 2023ER7702 observaciones estudios y diseños	25 abril 2023 2023EE7296
10	RO-136615	Respuesta oficio remisorio 2023ER7886 del 05 de abril de 2023 plan de gestión social- interventoría contrato 008 del 2023	25 abril 2023 2023EE7290
11	RO-136626	Radicado No. 2023ER7888 del 5 de abril de 2023 Plan de gestión de obra- plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición – obra	25 abril 2023 2023EE7291
12	RO-136605	Oficio 010-008-2023 Radicado IDIGER 2023ER6084- solicitud suspensión a contratos de obra FONDIGER 002-2023 e interventoría FONDIGER 008-2023	25 abril 2023 2023EE7261
13	RO-136902	Radicados IDIGER 2023ER7645, 2023ER7656, 2023ER8092, 2023ER8813 Y 2023ER8901	2023EE8678
14	RO-136935	Radicado IDIGER 2023ER957	09 mayo 2023 2023EE8314
15	CR-48026	Incumplimiento obligaciones contrato interventoría FONDIGER-008-2023	11 mayo 2023 2023EE8680 Recibido 25/05/2023
16	RO-137095	Radicado IDIGER 2023ER10417-oficio 037-008-2023	11 mayo 2023 2023EE8676 Recibido 25/05/2023
17	RO-136813	Radicado IDIGER 2023ER9572 (27/04/2023) – oficio 030-008-2023 Respuesta evaluación hoja de vida arquitecto obra	11 mayo 2023 2023EE8671 Recibido 25/05/2023

No	Identificador	Asunto	Fecha de recibido
18	RC-49175	Devolución- acta parcial obra N.1	09 agosto 2024 2023EE15031 Recibido 10/08/2023
19	RO-139515	Respuesta evaluación hoja de vida del personal de interventoria oficio 0092-008-2023 de 04/08/2023 – radicado IDIGER 2023ER17659 de 08/08/2023	11 agosto 2023 2023EE15352
20	RO-139381	Radicado IDIGER N.2023ER14608-junio 28 de 2023. Evaluación hoja de vida – cambio residente interventoria FONDIGER- 008-2023	03 agosto 2023 2023EE4645
21	RO-139530	Respuesta a radicado de 2023ER16508-devolucion informe mensual de interventoría N.1	14 agosto 2023 2023EE15450
22	RO-138780	Radicado IDIGER N. 2023ER14770 – cumplimiento tramite permiso aprovechamiento forestal -secretaria distrital de ambiente (SDA)	23 agosto 2023 2023EE16146 Recibido 25/08/2023
23	CR-49332	Cumplimiento- obligaciones contractuales	23 agosto 2023 2023EE16148
24	RO-139723	Radicados IDIGER N. 2023ER17864 – 2023ER18029 Informes mensuales N. 2 Y 3 -contrato interventoria 008-2023. Devolución radicados N. IDIGER 2023ER17864-2023ER18029	23 agosto 2023 2023EE16144
25	RC-49351	Entrega ajustes diseños -precios no previstos	30 agosto 2023 2023EE16742
26	RC-49359	Comunicación – tramite presunto incumplimiento obligaciones del contrato FONDIGER -008-2023	07 septiembre 2023 2023EE17383
27	CR-49202	Supervisión contrato FONDIGER 002-2023	11 septiembre 2023 2023EE15400
28	RO-140626	Radicado IDIGER N.2023ER20587-septiembre 11 DE 2023. Cambio profesional gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Contrato de interventoría FONDIGER 008-2023 -paraíso mirador Ilimani	18 septiembre 2023 2023EE18496
29	RO-140435	Concepto subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático - IDIGER. Ajustes estudios y diseños Ilimani	13 septiembre 2023 2023EE18051
30	RO-140441	Validación oficina jurídica NPs- APUs Ajuste estudios y diseños Ilimani	15 septiembre 2023 2023EE18304
31	RO-140435	Concepto subdirección de análisis y efectos del cambio climático -IDIGER Ajustes estudios y diseños Ilimani	15 septiembre 2023
32	RO-140457	Devolución radicad2023ER20189 – radicación informes semanales de interventoria	25 septiembre 2023 2023EE19171

No	Identificador	Asunto	Fecha de recibido
33	RO-140956	Devolución documentación cuenta N.3 de interventoría- oficio 155-008-2023 Radicado IDIGER 2023ER21457	26 septiembre 2023 2023EE19221
34	RO-141057	Devolución documentación cuenta N.2 de interventoría -oficio 144-008-2023 radicado IDIGERER20588	28septiembre 2023 2023EE19506
35	RC-49912	Ajuste componente arquitectónico paseo Ilimani	28 septiembre 2023 2023EE19501
36	RO-141049	Devolución documentación acta de recibo parcial N.3 de obra- oficio 150-008-2023 radicado IDIGER 2023ER20953	28 septiembre 2023 2023EE19505
37	CR-49886	Cronograma plan de contingencia-atraso en ejecución de obra	28 septiembre 2023 2023EE19500
38	RO-140983	Respuesta a radicados 2023ER21296 Y 2023ER21456 – devolución de informes mensuales 5 y 6	28 septiembre 2023 2023ER19513
39	RO-14516	Respuesta a radicados IDIGER 2023ER N. 2023ER18612, 2023ER18989,2023ER20527 Y 2023ER20585 OFICIO 142-008-2023-septiembre 11 de 2023 prorroga contratos obra – interventoría	28 septiembre 2023 2023EE19507
40	RO-141173	Respuesta a radicados 2023ER18989, 2023ER19335 Y 2023ER22072-devolución de aprobación modificatorio N.2 y solicitud de prórroga del contrato FONDIGER -002-2023, y entrega ajuste a los diseños	03 octubre 2023 2023EE19892
41	CR-49973	Cronograma plan de contingencia – atraso en obra	06 octubre 2023 2023EE20154
42	RO-141561	Radicado 2023ER22279-octubre 10 de 2023 Socialización ajustes diseños arquitectónico- contrato 002-2023	18 octubre 2023 2023EE21219
43	CR-50282	Solicitud de entrega de informe mensual N.8	01 noviembre 2023 2023EE22477
44	RO-142117	Contrato de interventoría FONDIGER N.008 de 2023 Revisión hoja de vida- profesional social interventoría	08 noviembre 2023 2023EE22783
45	RO-142132	Devolución, radicado 2023ER24795-radicación informes semanales N.35 y 36 de interventoría	08 noviembre 2023 2023EE22842
46	RO-142297	Devolución radicado N.2023ER25448-radicación informe mensual N.8 de interventoría	16 noviembre 2023 2023EE23289
47	RO-142459	Devolución documentación cuenta N.5 interventoría Oficio 230-008-2023 – radicación IDIGER 2023ER26048 (15/11/2023)	20 noviembre 2023 2023EE23676

No	Identificador	Asunto	Fecha de recibido
48	RO-142446	Respuesta radicado N. 2023ER26346- cambio ingeniero residente interventoría	21 noviembre 2023 2023EE23695
49	RO-142505	Contrato de interventoría FONDIGER N. 008-2023 Revisión hoja de vida- profesional social interventoría	23 noviembre 2023 2023EE23964
50	CR-49404	Solicitud evaluación técnica de los desprendimientos de material de material que se están presentando en la corona del antiguo frente de explotación de cantera localizado al interior del área de intervención con el fin de evaluar si en la actualidad se compromete la ejecución de las obras y/o de la vida útil de las mismas	28 noviembre 2023 2023EE24257
51	RO-142671	Radicado IDIGER N.2023ER26502- oficio 241-008-2023 Devolución documentación cuenta N.5 – interventoría	29 noviembre 2023 2023EE24266
52	RO-143146	Devolución RAD.N. 2023ER28378- diciembre 15 de 2023 Entrega documentación cuenta N.7 de interventoría	22 diciembre 2023 2023EE25529
53	RO-143193	Respuesta radicados 2023ER28220 (14/12/2023) – 2023ER28219 (14/12/2023). Solicitud prorroga, adición contrato FONDIGER-008	22 diciembre 2023 2023EE25547
54	CR-50860	Solicitud – entrega de documento físico de reprogramación de obra FONDIGER-002-2023	04 ENERO 2024 2024EE114
55	RO-143565	Respuesta radicado N. 2023ER455 – cambio director interventoría	16 enero 2024 2024EE548
56	RO-143734	Devolución documentación cuenta N.8 DE interventoría Radicado IDIGER N. 2024ER1066 – oficio 305 – 008 – 2023	24 enero 2024 2024EE947
57	RO-144382	Devolución documentación cuenta N.9 interventoría Radicado IDIGER 2024ER3537 (16/02/2024) – oficio 322-008-2023	21 febrero 2024 2024EE3095
58	CR-51284	Solicitud cumplimiento dedicación profesional social Interventoría contrato FONDIGER N. 008 de 2023	21 marzo 2024 2024EE3097
59	CR-51583	Solicitud anulación y cierre del PIN N. 22890 de la plataforma del aplicativo RCD- SDA	21 marzo 2024 2024EE5110
60	CR-51774	Solicitud cierre ambiental N. 22863	15 abril 2024 2024EE6406
61	RO-145411	Respuesta de la subdirección de análisis a concepto geotécnico oficio	11 abril 2024 2024EE6172

17460

No	Identificador	Asunto	Fecha de recibido
		VAPA TEC -202- VP – 2024 de 29/02/2024	
63	RO-145867	Contrato de interventoria N. FONDIGER-002-2023 Radicado N. 2024ER7000 (08/04/2023) Solicitud cierre pin AMBIENTAL N. 22863	02-mayo 2024 2024EE7271
64	CR-51936	Cumplimiento obligaciones generales, especificas y transversales para la liquidación del contrato	02 mayo 2024 2024EE7249

420

ANEXOS COMPONENTE TÉCNICO

Anexo 1.A Pólizas.
Anexo 1.B Actas de comité.
Anexo 1.C Certificación y soportes de S.S. y parafiscales de interventoría.
Anexo 1.D Certificación y soportes actividades, equipos y vehículo interventoría.
Anexo 1.E Paz y salvos interventoría.
Anexo 1.F Informes semanales de interventoría.
Anexo 1.G Bitácora de obra.
Anexo 1.H Oficios aprobación programación obra y programaciones de Obra.
Anexo 1.I Modificatorios de obra.
Anexo 1.J Actas de pago interventoría.
Anexo 1.K Planos récord.
Anexo 1.L Manual de mantenimiento.
Anexo 1.M Soportes Contribución FIC correspondientes al contrato de obra
Anexo 1.N Concepto Geotecnia cantidades de excavación
Anexo 1.Ñ Conceptos y Recomendaciones respecto al desprendimiento de material
Anexo 1.O Documentación Acta Recibo a Satisfacción de Obra.
Anexo 1.P Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra.

ANEXOS COMPONENTE CALIDAD

Anexo 2.A Soportes de calibración de equipos de Obra.
Anexo 2.B Soportes de calibración de equipos de Interventoría.
Anexo 2.C Ensayos de laboratorio de obra – Densidad.
Anexo 2.D Ensayos de laboratorio de obra – Resistencia a la Compresión.
Anexo 2.E Consolidado de certificados de calidad de materiales de obra.

ANEXOS COMPONENTE PMT

Anexo 3.A Planos plan de majeo de tráfico.
Anexo 3.B COI de aprobación.
Anexo 3.C PMT No. 1.
Anexo 3.D PMT No. 2.

ANEXOS SOCIALES

Anexo 4.1.A Cronogramas de actividades sociales
Anexo 4.1.B Actas de seguimiento a actividades sociales de obra
Anexo 4.1.C Presentaciones de comités de veeduría
Anexo 4.1.D Actas y registros de asistencia de comités efectuados
Anexo 4.1.E Aprobación y metodología de talleres de cultura ciudadana

Anexo 4.1.F Actas y registros de asistencia a talleres de cultura ciudadana
Anexo 4.1.G Actas de recorridos urbanos
Anexo 4.1.H Encuestas de satisfacción con la comunidad y consolidados
Anexo 4.1.I Formatos y consolidado de PQRS y consolidados
Anexo 4.1.J Aprobación de piezas comunicativas preliminares aprobadas
Anexo 4.1.K Aprobación volante de reunión de inicio, divulgación y cartas a entidades
Anexo 4.1.L Aprobación y divulgación de volante de levantamiento de actas de inicio (1,2,3 visitas)
Anexo 4.1.M Registro de entrega de copias de actas de vecindad de inicio
Anexo 4.1.N Aprobación y divulgación de volante de actas de fachas para pintura y pañete, y entrega de copias.
Anexo 4.1.Ñ Aprobación, volante y registros de divulgación de volante de inicio de obra.
Anexo 4.1.O Aprobación de volante de reunión de ajuste a los diseños, divulgación y cartas a entidades
Anexo 4.1.P Aprobación de volante de reunión de avance, divulgación y cartas a entidades
Anexo 4.1.Q Aprobación de volante y registros de entrega de PMT
Anexo 4.1.R Aprobación de volante de generación de empleo
Anexo 4.1.S Aprobación de volante, informe y divulgación de pintura y pañete
Anexo 4.1.T Cartas de invitación a comité veedor y registros de entrega
Anexo 4.1.U Aprobación de volante y registros de entrega de talleres de cultura ciudadana
Anexo 4.1.V Reunión extraordinaria con propietarios
Anexo 4.1.W Aprobación volante de reunión de finalización, divulgación y cartas a entidades
Anexo 4.1.X Aprobación y plegable de sostenibilidad

Anexo 4.1.Y Aprobación y divulgación de volante de levantamiento de actas de cierre (1,2,3 visitas)
Anexo 4.1.Z Registro de entrega de copias de actas de vecindad de cierre
Anexo 4.2.A Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de inicio de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción.
Anexo 4.2.B Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de avance de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción
Anexo 4.2.C Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de finalización de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción.
Anexo 4.2.D Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción.
Anexo 4.2.E Actas y registros de asistencia de reuniones extraordinarias.

Anexo 4.2.F Actas y registros de asistencia de reuniones extraordinarias (otras actividades)
Anexo 4.2.G Actas de reuniones extraordinarias.
Anexo 4.2.H Aprobación, Metodología, Actas de capacitación a empleados de obra y registros de asistencia.
Anexo 4.2.I Actas de PMT de inicio y cierre.
Anexo 4.2.J Inventario predial inicio.
Anexo 4.2.K Actas de vecindad de inicio
Anexo 4.2.L Actas de vecindad levantadas a solicitud de la comunidad
Anexo 4.2.M Inventario predial de cierre
Anexo 4.2.N Actas de vecindad de cierre
Anexo 4.2.Ñ Actas de compromiso
Anexo 4.2.O Actas de actividades extraordinarias
Anexo 4.2.P Consolidado personal MONC
Anexo 4.2.Q Certificados de residencia
Anexo 4.2.R Actas de otras actividades sociales de obra
Anexo 4.2.S Consolidado de encuestas, formulario y hojas de cálculo de caracterización poblacional.

ANEXOS AMBIENTALES

Anexo 5A Capacitaciones ambientales interventoría.
Anexo 5B Capacitaciones ambientales contratista de obra
Anexo 5C Control de consumo de agua y facturas contratista de obra.
Anexo 5D Registro de generación de residuos sólidos y certificaciones contratista de obra.
Anexo 5E Informes de cumplimiento PGRCD del informe final de obra
Anexo 5F Reporte de indicadores de capacitación
Anexo 5G Inspección y mantenimiento de sumideros contratista de obra.
Anexo 5I resoluciones ambientales proveedores.
Anexo 5J control de limpieza de vía y humectación.
Anexo 5K Tramites forestales.
Anexo 5L fichas manejo ambiental.
Anexo 5M Formato control residuos líquidos y certificaciones.

ANEXOS DEL COMPONENTE SST

Anexo SST 6A Planillas de seguridad social Contratista de obra.
Anexo SST 6B Certificado de pago de aportes de parafiscales Contratista de obra.
Anexo SST 6C Relación de Información del personal del Contratista de obra mes a mes.
Anexo SST 6D Cronograma, inducciones y capacitaciones Contratista de obra.

17464

Anexo SST 6E Cronograma, inducciones y capacitaciones Interventoria.
Anexo SST 6F Registro entrega dotación, EPP Contratista de obra.
Anexo SST 6G Compromiso uso EPP interventoría.
Anexo SST 6H Exámenes médicos ocupacionales de ingreso contratista de obra.
Anexo SST 6I Exámenes de egreso contratista de obra
Anexo SST 6J Exámenes médicos ocupacionales de ingreso interventoría
Anexo SST 6K Exámenes egreso interventoría
Anexo SST 6L Certificación de accidentalidad mes a mes Interventoria.
Anexo SST 6M Reporte de accidentes contratista de obra y certificados de accidentalidad mes a mes.
Anexo SST 6N Reporte de Inspecciones Contratista de obra.
Anexo SST 6O Inspecciones equipos de atención emergencias interventoria.
Anexo SST 6P Documentación maquinaria y equipos.
Anexo SST 6Q Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Interventoría.
Anexo SST 6R Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Contratista de obra.
Anexo SST 6S Actas reunión COPASST y CCL contratista de obra.
Anexo SST 6T COPASST interventoria.
Anexo SST 6U Reporte trabajo en alturas.
Anexo SST 6V Indicadores, objetivos y metas Contratista de obra

Anexo 1.A Pólizas.

17466

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHOCO	18	18-44-101086519	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	02	2023	03	02	2023	00:00	03	10	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648856

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: CG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292601
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ACUSIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-008-2023. CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 8415 Y SUS ADENDOS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, UPR 67 LOCERO. INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INDEVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2023	01/10/2024	$161,931,701.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/02/2023	01/10/2028	$80,965,850.60
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2023	01/10/2028	$161,931,701.20

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,029,586.00	$ ******20,000.00	$ *****579,421.00	$ *********3,629,008.00	$ ******404,829,253.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA.	141993	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101086519, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de FEBRERO de 2023

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

1+467

MAPO INGENIERIA SAS
900364545-9
4853579
CL 152 B # 58 C-50 TO 12 OF 602
BOGOTA

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
KM 1.5 VIA CHIA CAJICA CENTRO
EMPRESARIAL NOU OF 508
TEL : 8151116 - CEL : 3112206566

Bogotá - Colombia
NIT: 900 645 735 -8

SEGUROS SYS

Fecha emisión: 2023-02-07 **Fecha impresión:** 2023-02-07

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A **NIT:** 860009578-6

Riesgo: CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. FONDIGER-008-2023

Remisión de cobro No: 15064

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
Cumplimiento	1010086519	03/02/2023 03/10/2028	3.029.586	20.000	579.421	3.629.007	0

Tomador: MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Asegurado:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Beneficiario:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9

Observaciones:

Ejecutivo : AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	**TOTAL**	3.029.586	20.000	579.421	3.629.007	0

Para efectos tributarios esta operación se celebra con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Acuerdo de pago hasta : 07/03/2023

Ley 45/90 art 82 - La mora en el pago de la prima, produce la cancelación automática de la póliza y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados.

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
Firma

MAPO INGENIERIA SAS
900364545-9
4853579
CL 152 B # 58 C-50 TO 12 OF 602
BOGOTA

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
KM 1.5 VIA CHIA CAJICA CENTRO
EMPRESARIAL NOU OF 508
TEL : 8151116 - CEL : 3112206566

Bogotá - Colombia
NIT: 900 645 735 -8

SEGUROS SYS

Fecha emisión: 2023-02-07 **Fecha impresión:** 2023-02-07

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A **NIT:** 860009578-6

Riesgo: CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. FONDIGER-008-2023

Remisión de cobro No: 15064

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
Cumplimiento	1010086519	03/02/2023 03/10/2028	3.029.586	20.000	579.421	3.629.007	0

Tomador: MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Asegurado:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Beneficiario:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9

Observaciones:

Ejecutivo : AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	**TOTAL**	3.029.586	20.000	579.421	3.629.007	0

Para efectos tributarios esta operación se celebra con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Acuerdo de pago hasta : 07/03/2023

437

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA

1+468

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101064101	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	02	2023	03	02	2023	00:00	03	10	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648966

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4292801
BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A EDIS 04-09 / E-RCE-601A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A.. GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-008-2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 5403 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, UPZ 67 LUCERO - INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍnimo: 1.00 SMMLV	03/02/2023	03/10/2023	$232.000.000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****384,547.00	$ *******3,000.00	$ ******73,634.00	$ **********461,182.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	140583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101064101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamora R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

17478

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

490

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

(747)

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

(747)

17992

MAPO INGENIERIA SAS
900364545-9
4853579
CL 152 B # 58 C-50 TO 12 OF 602
BOGOTA

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
KM 1.5 VIA CHIA CAJICA CENTRO
EMPRESARIAL NOU OF 508
TEL : 8151116 - CEL : 3112206566

Bogotá - Colombia
NIT: 900 645 735 -8

SEGUROS SYS

Fecha emisión: 2023-02-07 **Fecha impresión:** 2023-02-07

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A **NIT:** 860009578-6

Riesgo: CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. FONDIGER-008-2023

Remisión de cobro No: 15065

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
Responsabilidad Civil	101064101	03/02/2023 10/10/2023	384.547	3.000	73.634	461.181	0

Tomador: MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Asegurado:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Beneficiario:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9

Observaciones:
PSE: HTTPS://WWW.PORTALESTADO.TRANSFIRIENDO.COM/PORTALPAGUESTADO/WEBFORMS/ACCOUNT/VIEWS/INDEX.ASPX
CORRESPONSAL BANCARIO: BALOTO: REF POLIZA 959595/4361, LA 14 SURTIMAX, MONIL RED, BANCOLOMBIA.

Ejecutivo : AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	**TOTAL**	384.547	3.000	73.634	461.181	0

Para efectos tributarios esta operación se celebró con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Ley 45/90 art 82 - La mora en el pago de la prima, produce la cancelación automática de la póliza y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados

Acuerdo de pago hasta : 07/03/2023

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
Firma

MAPO INGENIERIA SAS
900364545-9
4853579
CL 152 B # 58 C-50 TO 12 OF 602
BOGOTA

AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
KM 1.5 VIA CHIA CAJICA CENTRO
EMPRESARIAL NOU OF 508
TEL : 8151116 - CEL : 3112206566

Bogotá - Colombia
NIT: 900 645 735 -8

SEGUROS SYS

Fecha emisión: 2023-02-07 **Fecha impresión:** 2023-02-07

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A **NIT:** 860009578-6

Riesgo: CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NO. FONDIGER-008-2023

Remisión de cobro No: 15065

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
Responsabilidad Civil	101064101	03/02/2023 10/10/2023	384.547	3.000	73.634	461.181	0

Tomador: MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Asegurado:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9 **Beneficiario:** MAPO INGENIERIA SAS - 900364545-9

Observaciones:
PSE: HTTPS://WWW.PORTALESTADO.TRANSFIRIENDO.COM/PORTALPAGUESTADO/WEBFORMS/ACCOUNT/VIEWS/INDEX.ASPX
CORRESPONSAL BANCARIO: BALOTO: REF POLIZA 959595/4361, LA 14 SURTIMAX, MONIL RED, BANCOLOMBIA.

Ejecutivo : AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	**TOTAL**	384.547	3.000	73.634	461.181	0

992

14419

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7709998021167004457491

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000044574916

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
07/02/2023 11:18a.m.	

RECIBIMOS DE: MAPO INGENIERIA S.A.S. — NIT: 900.364.545

LA SUMA DE: Cuatro millones noventa mil ciento noventa pesos **********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000044574916

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHICO-40-101064101-0-1	$387,548.00		$73,634.00	$461,182.00
CHICO-44-101066519-0-1	$3,049,586.00		$579,422.00	$3,629,008.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 4,090,190.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	4,090,190.00
OTROS:	$4,090,190.00

TRANSACCION: 0004457491

TOTAL: $4,090,190.00

CAJERO: PAGUESTADO

2/7/2023 11:18:41AM

172.16.10.23

103

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

495

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

496

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÈSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900.364.545-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.184.376-1
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4202801

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ROUBIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PONDIGER-638-2023. CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 6405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, UPS 67 LUCERO - INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2023	17/10/2026	$161.931.701,20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/03/2023	17/10/2026	$80.965.850,60	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2026	$161.931.701,20	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DE INICIO A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO 2023, DE ACUERDO AL DOCUMENTO ACTA DE INICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3.029.588,00	$ ******20.000,00	$ *****579.421,00	$ *********3.629.008,00	$ ******404.829.253,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	14350	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 ND 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zapata R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT:	900.364.545-8
DIRECCION: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	2646556

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT:	900.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	4292801

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171031 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADO: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101086519, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de FEBRERO de 2023

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

17479

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	15	15-40-101064101	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.645-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2548958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 05 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292801
BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A RADIC 04-05 / E-RCE-001A. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y AMPARADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SONDIGER-005-2023. CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO INFIMIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 5405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, UPZ 67 LUCERO - INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2023	17/10/2023	$232,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DE INICIO A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO 2023, DE ACUERDO AL DOCUMENTO ACTA DE INICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****384,547.00	$ *******3,000.00	$ ******73,634.00	$ **********461,182.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

15-40-101064101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.99

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101084101	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT:	900.364.545-9
DIRECCION: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	2648966

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT:	900.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	4292601

BENEFICIARIO: 900154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 55 NO 10-85 - TELEFONO: 6170035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101084101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamorra B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DUF1423835

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

17481

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.565-8	
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 607	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648959

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN:	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 899.154.275-1	
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 00 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292801
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y CUYAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-CO-CPS-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRATIVO, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE MEJORAS EN SITIOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL PROYECTO DE CIUDAD BOLIVAR, UNA ET HASTA INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2023	31/12/2026	$202,720,182.00	$202,720,182.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2023	31/12/2026	$101,360,091.00	$101,360,091.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2028	$202,720,182.00	$202,720,182.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO MODIFICATORIO NO. 12 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA ADICION Y PRORROGA EL CUAL AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 202.182.464 Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA ES POR EL TERMINO DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR. LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****137,460.00	$ ******8,000.00	$ *****27,637.00	$ **********173,098.00	$ ******506,800,455.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS PER SYEA	811563	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaccaro B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101088519	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9	
DIRECCION: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648056

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1	
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4292601

ADICIONAL:

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******137.460.00	$ ******8.000.00	$ ******27.637.00	$ **********173.098.00	$ ******5.00.800.456.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS [illegible] LTDA	43352	100.00			

LUCIDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 45 NO 10-65 - TELEFONO: 877035 - BOGOTA, D.C

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 110038113109G-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

(+984

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT:	900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648856

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT:	800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4282601

ADICIONAL:

OBJETO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLT-1423830

VIGILADO SUPERINTENDENCIA Financiera DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101086519, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de OCTUBRE de 2023

18-AA-1010865519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

17484

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101064101	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9	
DIRECCION: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648058

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN:	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1	
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 69 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292801
BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A RADO 04-09 - 15-05-2019 - 1319-P-05-80102-2-RCE-002A-D101, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO Y AMPARADAS EN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDIGER-014-2023, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA LA ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO, PARA REALIZAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGO, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 3425 2 DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA A. RELATIVO DEL BARRIO 7 Y EL MIRADOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DEL 11 BARRIO INVASION DE CERRO DE MITIGACION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERDIDA LUCROS E OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2023	31/12/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO CONTRACTUAL MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO No. 014-2023 ADICION Y PRORROGA EL CUAL ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ [illegible] Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN IGUALES Y VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****119,178.00	$ *****3,000.00	$ *****23,213.00	$ *****145,391.00	$ *****232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE ASESORES DEL NORTE	113583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 5171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101064101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zuluaga B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHOCO	18	18-40-101064101	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.154.275-1
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4292801
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****119.178.00	$ *******3,000.00	$ ******23.213.00	$ **********145.391.00	$ ******202.000.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE ASESORIAS AVE LTDA	111191	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1100361131017-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

1 7489

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101064101	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.364.545-9
MAPO INGENIERIA S.A.S			
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.154.275-1
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER			
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 05 IN 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4292801

BENEFICIARIO: 860154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER

TEXTO ADICIONAL

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101064101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DE1343618

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	3

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MAPO INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN:	CL 152 B NRO. 58 C - 58 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7648556

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN:	DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4202801
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ADJUNTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y ORIGINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20231004-IDIGER-2023, CUYO OBJETO ES LLEVAR ACABO LOS ESTUDIOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA VIGENCIA FUTURA, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO. PERSONA PARA EJECUTAR ACTIVIDAD DE ANALISIS DE RIESGOS, PREVENCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO PRIORIZADO EN EL CORREDOR FERREO PARA Y SUS ALREDEDORES PARA EL SECTOR DE PERDOMO EL USAQUEN A, MEDIANTE UNA FAMILIA DE 3 EL MEDIDOR Y, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DEL AT LADO INTERVENTORIA EN OBRAS DE MITIGACION

AMPAROS

RIESGO: INDEMNIZACION

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2023	17/10/2024	$202,720,163.00	$161,931,701.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2023	17/10/2028	$101,360,091.00	$80,965,850.60
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2028	$202,720,163.00	$161,931,701.30

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO No. 20231004 ADICION Y PRORROGA 01 QUE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 202,720,163 Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2028.

NOTA: EL ANEXO DE VALIDAR DEL SERVICIO DE VIGENCIA ES POR EL TERMINO DE 5 AÑOS CONTADO A PARTIR DEL EQUIPO A SATISFACCION POR PARTE DEL INTERVENTOR. LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******673,255.00	$ **********0.00	$ ******127,918.00	$ **********801,174.00	$ ********506,800,455.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SUSCRIPCION ESE LTDA	115483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zuñeda B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

17484

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MAPO INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900.364.545-9		
DIRECCIÓN CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELEFONO
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	NIT. 800.154.275-1		
DIRECCIÓN DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4202801

ADICIONAL

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogota — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****673,255.00	$ **********0.00	$ *****127,918.00	$ **********801,174.00	$ ******500,800,455.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE NEGOCIOS BNS LTDA	143581	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO CUANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-83 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1100361131098-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

504

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2023	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:** 2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 K - 09 IN 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 4298101

ADICIONAL:

TEXTO ADICIONAL

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

(748)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101086519, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de OCTUBRE de 2023

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

505

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670050792 57

NIT 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000050792570

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
20/10/2023 11:03a.m.	

RECIBIMOS DE: MAPO INGENIERIA S.A.S. — NIT 900.364.545

LA SUMA DE: Un millones ciento diecinueve mil seiscientos sesenta y tres pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000050792570

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHICO-40-101054101-3-1	$122,177.00		$23,214.00	$145,391.00
CHICO-44-101086519-3-1	$673,255.00		$127,919.00	$801,174.00
CHICO-44-101086519-4-1	$145,460.00		$27,638.00	$173,098.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 1,119,663.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	1,119,663.00
OTROS:	$1,119,663.00

TRANSACCION: 0005079257

TOTAL: $1,119,663.00

CAJERO: PAGUESTADO

10/20/2023 11:03:53AM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101064101	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	17	02	2023	00:00	29	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900.364.545-9	
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	NIT: 800.154.275-1	
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4292801
BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1319-P-06-00000-R-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1319-P-06-00000-R-RCE-0019-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-008-2023, CUYO OBJETO ES ADENA ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. ZPZ 47 LUCERO INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	17/02/2023	29/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO CONTRACTUAL MODIFICATORIO NO. 03 ADICION Y PRORROGA EL CUAL AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 161.803.702, QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE $ 1.159.302.612 Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******95,342.00	$ *******3,000.00	$ ******18,685.00	$ **********117,027.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BYR LTDA	143581	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑANIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101064101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101064101	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	17	02	2023	00:00	29	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648906

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4292801
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Olímpica · Corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******95,342.00	$ *******3,000.00	$ ******18,685.00	$ **********117,027.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6371035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998023187(8020)1100361149093(3900)000000117027(96)20240217

REFERENCIA PAGO: 1100361149093-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

(1480)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101064101	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	17	02	2023	00:00	29	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 08 IN 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4292601

BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101064101

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1403(0)

2

507

17488

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648856

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 900.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4292801

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECI6108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-068-2023, CUYO OBJETO ES JUNTA ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO CONTENIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 5405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, UPZ 67 LUCERO INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2023	31/12/2024	$231,540,522.60	$202,725,182.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2023	31/12/2026	$115,520,261.20	$101,369,091.60
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2028	$231,040,522.60	$202,725,182.60

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO MODIFICATORIO NO. 03 ADICION Y PRORROGA EL CUAL AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 141'601'702, CUBRIENDO UN VALOR TOTAL DE $ 5.155.202.612 Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****455,934.00	$ **********0.00	$ ******86,627.00	$ **********542,561.00	$ ******577,601,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SVS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamora B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO: 4292801

ADICIONAL:

P. GUESTADO

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****455,934.00	$ **********0.00	$ ******86,627.00	$ **********542,561.00	$ ******577,601,395.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BYE LTDA	143683	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998023167(8020)110361149175(3900)000000542561(96)20240228

REFERENCIA PAGO: 1103611491751

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

17484

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT:	900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	2648906

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT:	900.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 05 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	4292601

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 19-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101086519, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de ENERO de 2024

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

1748

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2024	17	03	2023	00:00	01	03	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.375-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4292801

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RUBRICAN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-106-2023, CUYO OBJETO ES LLEVAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 9165 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, CRA 47 LUCERO. INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2023	01/03/2025	$231,040,522.40	$231,040,522.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/03/2023	01/03/2027	$115,520,261.20	$115,520,261.20
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2028	$231,040,522.40	$231,040,522.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO MODIFICATORIO NO. 01 ADICION Y PRORROGA EL CUAL AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 346-621-702, QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE $ 1.155.202.610 Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,331.00	$ *******8,000.00	$ ******25,332.00	$ **********158,664.00	$ ******577,601,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143563	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

510

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-75 TELEFONOS: 601-2186877, 601-6015100 DLP1415038 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2024	17	02	2023	00:00	01	03	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9	
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2548556

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1	
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292801

ADICIONAL:

P. GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Mercd Red · Bancolombia · éxito · Olímpica · Corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,331.00	$ *******8,000.00	$ ******25,332.00	$ **********158,664.00	$ ******577,801,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171033 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1100361149176-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

1741

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2024	17	02	2023	00:00	01	03	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT:	900.384.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 802	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT:	860.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 05 IN 51	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4292801

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 19-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zacarias G. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

511

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1439A19

1-7492

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	MAPO INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900.364.545-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 152 B NRO. 58 C - 59 TO 12 OF 502		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO	4292801

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIDE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y CONSIGNADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDINGER-068-2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 8405 Y SUS ALCANCES PARA EL SECTOR DE URBANIZACIÓN EL MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, LPZ 67 M/SMMO - INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2023	01/03/2025	$231,040,522.40	$231,040,522.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2023	01/03/2027	$115,520,261.20	$115,520,261.20
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2028	$231,040,522.40	$231,040,522.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO, DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL, QUEDANDO ASI:

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******577,601,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE NEGOCIOS BSS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171635 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

512

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-0
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2648856

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.154.275-1
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		
DIRECCION: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4292801

ADICIONAL:

P GUESTADO

PAGINA WEB

pse

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER

SUPERMAX

Bancolombia

éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *********0.00	$ *********0.00	$ *********0.00	$ **********0.00	$ ******577,601,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SEB LTDA	145583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

17493

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	15	18-44-101086519	1

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 002	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2648966

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 830.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4292801

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-61 - TELEFONO: 6171933 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SB

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101086519, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de FEBRERO de 2024

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

17494

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9	
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 899.154.275-1	
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4282801

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIEN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FONDIGER-009-2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DEL HABITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANALISIS DE RIESGOS, REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DENTRO DEL POLIGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 8400 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAISO A, MIRADOR DEL PARAISO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - INTERVENTORIA DE OBRAS DE MITIGACIÓN.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2023	01/03/2025	$231,040,522.40	$231,040,522.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2023	01/03/2027	$115,520,261.20	$115,520,261.20
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023	17/10/2028	$231,040,522.40	$231,040,522.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO, DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL, QUEDANDO ASI:

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******577,601,306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	343581	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑANIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2648956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292801

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Olímpica · Ley · Cafam · Colsubsidio

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******577.601.306.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYB LTDA	143585	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

17495

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101086519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2024	17	02	2023	00:00	17	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MAPO INGENIERIA S.A.S.		NIT:	900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 58 C - 50 TO 12 OF 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	2646956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER		NIT:	800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 IN 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	4292801

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFONO: 6171635 - BOGOTA, D.C.

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OLF1433428 2

15

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101086519, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de FEBRERO de 2024

18-44-101086519

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670052828 60

Nit 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000052828601

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
12/01/2024 03:41p.m.	

RECIBIMOS DE: MAPO INGENIERIA S.A.S. — NIT. 900.364.545

LA SUMA DE: Ochocientos dieciocho mil doscientos cincuenta y dos pesos **********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000052828601

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHICO-40-101064101-4-1	$98,342.00		$18,685.00	$117,027.00
CHICO-44-101086519-5-1	$455,933.00		$86,628.00	$542,561.00
CHICO-44-101086519-6-1	$133,331.00		$25,333.00	$158,664.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 818,252.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	$818,252.00
OTROS:	$818,252.00

TRANSACCION: 0005282860

TOTAL: $818,252.00

CAJERO: PAGUESTADO

1/12/2024 3:41:27PM

172.16.10.23

Anexo 1.B Actas de comité.

1 f 449

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE – FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Lugar:	SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3	**Fecha:**	03	03	2023
Hora Inicio:	3:00 pm	**Hora Final:**	5:30pm		

Objetivo

Comité de Obra N. 01

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Definición entrega preliminares de Obra**
4. **Reconocimiento de la Zona (Revisión de aspectos técnicos, sociales y ambientales).**
5. **Aspectos Administrativos.**
6. **Varios.**

518

17499

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al presente recorrido de obra con la presentación de los asistentes a la misma, dentro de los cuales están el equipo profesional del contratista de obra, el equipo profesional de la interventoría, el supervisor del contrato por parte del IDIGER y su equipo de profesionales, un representante por parte de Secretaría del Hábitat y dos representantes de la JAC.

Se inicia el recorrido desde la estación del transmicable hacia el parque Illimaní, en el cual el contratista de obra explica las generalidades del proyecto, así como las observaciones e inquietudes que se tienen con respecto a los estudios y diseños entregados por la entidad contratante, encontrados en la revisión de esta documentación con el fin de realizar la respectiva apropiación de los mismos, los cuales fueron revisados en conjunto con la interventoría y entregados de manera parcial a la entidad contratante. Así mismo el contratista de obra informó, que los estudios y diseños del componente geotécnico y eléctrico se encuentran en revisión por parte de sus respectivos especialistas, y las novedades que se encuentren serán entregadas a la interventoría el día lunes 6 de marzo 2023.

Se solicita al contratista de obra realizar la ubicación de las invasiones en la localización del proyecto, con el fin de evidenciar si estas se encuentran dentro del área a intervenir, así mismo la ubicación de los árboles existentes, los cabezales de descarga y otras estructuras existentes.

El Supervisor del contrato manifiesta que es importante tener claro que el presente proyecto se basa en 2 diseños independientes, y por consiguiente el contratista de obra debe realizar la respectiva armonización de los 2 diseños tanto los del IDIGER en cuanto a las obras de mitigación del Riesgo como los estudios y diseños de Secretaría del Hábitat para las obras de urbanismo.

Teniendo en cuenta las observaciones parciales entregadas por el contratista de obra, se solicita una fecha de entrega de las observaciones en conjunto, así como la relación de documentación que evidencien faltante del presente proyecto, a lo que el contratista se compromete a entregarlas a más tardar el día 13 de marzo de 2023.

En este mismo sentido la interventoría solicita al contratista de obra realizar el posicionamiento y levantamiento topográfico con un área amplia que permita verificar las condiciones actuales del terreno versus la implantación del diseño presentado por la entidad contratante, para el análisis correspondiente.

El supervisor del contrato manifiesta la importancia de la radicación de los informes semanales todos los lunes, teniendo en cuenta que este proyecto cuenta con acta de inicio de 17 de febrero del 2023, y a la fecha serían 2 informes semanales que deben radicarse debidamente revisados y aprobados por la interventoría, así como la documentación preliminar antes del inicio de las obras.

El contratista de obra, solicita un espacio la siguiente semana con el fin de tratar los temas en cuanto a las observaciones que han surgido en la revisión de los estudios y diseños, a lo que secretaría del hábitat solicita que se le alleguen las respectivas observaciones antes de la reunión que se programe para tal fin.

Con respecto a la apropiación de los diseños que debe realizar el contratista de obra, el supervisor del contrato solicita que la misma se realice en los tiempos que se tienen establecidos contractualmente.

Con el fin de dar celeridad al tema de la ubicación de las invasiones que fue una pregunta realizada por los representantes de la JAC, se le solicita al contratista de obra hacer una planimetría para verificar los asentamientos se encuentran dentro del área de ejecución del proyecto, y el supervisor del contrato informa que este tema va a manejar conjuntamente entre secretaría del hábitat, IDIGER y alcaldía local.

Para finalizar se acuerda que los comités de obra se realizarán los días miércoles.

519

REGISTRO FOTOGRAFICO RECORRIDO DE OBRA













ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1. Entregar el conjunto de Observaciones de los estudios y diseños del proyecto, así como el listado de documentación faltante a los mismos.	Contratista de Obra	13	03	2023
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

17302

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

522

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?	Hoja ___ de ___
TEMA:	Recorrido de obra	RESPONSABLE:
LUGAR:	Sitio de obra	FECHA: 03-03-2023 HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
	Maria Serrano Lota	Interventoria	P. Social	3233907724	mariaserrano.mapa@hotmail.com	
	Yenny Costa	Contratista	P. Ambiental	3108612526	Consorciovapa@gmail.com	Yenny Costa
	Gustavo López	Contratista	Estructural	3057788877	gustavolopez7777@gmail.com	
	Nicolas López	Consorcio VAPA	Prof Presupu	3013709858	presupuesto.vanegasing@gmail.com	
	Orlando Salinas	Consorcio VAPA	Tecnico Topogr.	3193256319	[illegible]	
	Patricia Torres R	Consorcio Vapa	Residente Obra	3147034267	consorciovapa@gmail.com	
	Lauren M. Sánchez G.	Consorcio VAPA	Ing. de Calidad	3176696083	calidad.vanegas ingenieros@gmail.com	
	Erika Morales B.	Contratista	Ing. Hidraulico	3107700525	fullcrumsas@gmail.com DOCC@fullcrumsas.com	Erika Morales
	Eduardo Posada P	Interventoria	Ing. Civil	3203040795	Eduardo.posada.P@[illegible].com	
	Angie Pardo Ramirez	Interventoria	Ing. Civil	3005182630	ilumanicos.mapa@gmail.com	
	Maria Alejandra Rocha	Interventoria	R.L.	3125668879	ilumanicos.mapa	
	Wilson V Pinilla V	IDIGER	Prof. Ep	3108201800	@gmail.com	
	RAFAEL NIÑO	IDIGER	Ing Ecl	3118094997	rnino@idiger.gov	
	Darwin J. Ortiz G.	IDIGER	Subdirector		dortiz	

5/23

17/03

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?		Hoja ___ de ___
TEMA:	Recorrido de Obra	RESPONSABLE:	
LUGAR:	Sitio de Obra	FECHA: 03-03-2023	HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
	Mauro Hurtado	IDIGER	Ing. Civil		mhurtado	
	Julián Forero	SDHT	Ing Civil		julian.forero@habitatbogota.gov	

17705

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Lugar:	Oficinas IDIGER	**Fecha:**			
Hora Inicio:	3:40 pm	**Hora Final:**	5:30pm		

Objetivo

Comité de seguimiento N. 01
CONTRATO No. 002-2023
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Definición entrega preliminares de Obra**
4. **Observaciones Estudios y Diseños Iniciales**
5. **Aspectos Administrativos**
6. **Varios**

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes a la misma, dentro de los cuales están por parte del contratista de obra el director de obra, la residente de obra, la profesional ambiental y SST y la Profesional Social. Por parte de la interventoría están la directora de interventoría, la representante legal y la coordinadora, y por parte de la entidad se encuentran el subdirector del Idiger y Supervisor del contrato y el apoyo técnico a la supervisión del contrato.

Se continúa el presente comité por parte de la interventoría informando el estado de entrega de la documentación preliminar del contratista de obra, la cual se encuentra de la siguiente manera:

1) El Plan de Medidas Ambientales se encuentra aprobado por la interventoría.
2) El SG-SST y los protocolos de Bioseguridad, se encuentran en revisión por parte de la interventoría, el día de mañana martes 28/02/2023 se tendrá una mesa de trabajo con la profesional SST de obra con el fin de socializar las observaciones al respectivo documento.
3) El Plan de Gestión Social se encuentra en revisión por parte de la interventoría, se está coordinando mesa de trabajo entre las profesionales sociales de obra e interventoría con el fin de dejar el documento debidamente ajustado.

525

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DC – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

4) El Plan de Manejo de Tránsito se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
5) El Plan de Calidad y Plan de inspección y ensayos se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
6) La Programación de Obra se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
7) Los APU's de obra se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
8) El flujo de caja no ha sido entregado por el contratista de obra, se solicita que el mismo sea semanal y se compromete a entregarlo el día martes 28 de febrero 2023.

Se continúa con el presente comité por parte del Ingeniero apoyo a la supervisión de la entidad informando que, si es necesario tramitar algún permiso respecto al Permiso de Ocupación del Cauce, toda la información y documentación que se requiera, debe entregarla el contratista a la interventoría, y a su vez la interventoría al IDIGER debidamente revisada y aprobada.

En este mismo sentido la entidad solicita información respecto al componente social en obra, solicitando información de si hay invasiones en los predios donde se van a realizar las respectivas actividades, a lo que la interventoría informa que efectivamente hay alrededor de unas 5 invasiones en el área a intervenir, por consiguiente, y con el fin de evidenciar este tema social, se programa una visita conjunta entre IDIGER, Alcaldía Local, Secretaría del Hábitat, Contratista de Obra e interventoría, para el día viernes 03/03/2023 a las 8am en el sitio de ubicación del proyecto.

Al respecto de los estudios y diseños entregados por la entidad, tanto el contratista de obra como la interventoría informan, que se tienen algunas observaciones a los mismos, como por ejemplo se necesita la planta arquitectónica para ubicar los muros de contención la cual no se encuentra en la documentación entregada por la entidad, también se tienen observaciones del componente hidráulico, estructural, topográfico y arquitectónico, el contratista de obra informa que presentará las observaciones a la interventoría el día 28/02/2023. En este mismo sentido, la entidad solicita que se revise el ajuste de la armonización hidráulica y se tenga definido para la visita programada para el próximo viernes 03/03/2023. Teniendo en cuenta esto en el presente comité se revisan los planos hidráulicos con el fin de revisar la ubicación de los descoles, pero no se encontraron en estos planos. Se acuerda entre IDIGER, contratista de obra e interventoría, que el contratista de obra llevará una memoria a fin de que el IDIGER comparta todos los estudios y diseños por medio de la misma, toda vez que la documentación compartida por Drive se encuentra incompleta.

La entidad informa a la interventoría que ellos son muy estrictos con el tema de los tiempos y más para este proyecto el cual debe ser finalizado en el tiempo programado para el mismo. Así mismo informa que se realizarán reuniones en periodo semanal, que los cortes de los informes serán de inicio 17 a finalización 16 de cada mes, la entidad hace mucho énfasis en el tema de la gestión documental e informa que la entidad no ejecuta ni paga actividades programadas únicamente ejecutadas. En este mismo sentido la entidad explica la entrega de los informes semanales y mensuales, los semanales deben estar suscritos por los directores de obra e interventoría, y los mensuales debe ser un solo informe que contenga todos los componentes del proyecto y debe ir firmado por todos los profesionales responsables de cada componente. Los Informes semanales deben ser radicados los días lunes ante la entidad por parte de la interventoría.

La entidad hace aclaración que el presente proyecto se compone de: obras de mitigación del riesgo que es competencia del IDIGER y las obras de urbanismo y espacio público que obedecen a la secretaría del Hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Registre firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

527

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN No. 01					CÓDIGO	PLE-FT-09	VERSIÓN	2
						CÓDIGO DOCUMENTAL			
TEMA	MESA DE TRABAJO REVISIÓN DISEÑOS INICIALES ENTREGADOS POR EL IDIGER					ÁREA RESPONSABLE	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA DE OBRA		
FECHA	2	3	2023	LUGAR	OFICINAS NITERVENTORIA	HORA	8AM	HOJA _1__ DE _3__	

AGENDA

Revisión Estudios y Diseños Hidraulicos

Revisión Estudios y Diseños Estructurales

Revisión Topografia

Revisión Diseño Arquitectónico

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se Inicia la presente mesa de trabajo en las instalaciones de la interventoría a las 8:00 am, con presencia de los Representantes Legales, Directores y Especialistas Hidraulicos tanto de obra como de interventoria, así como el especialista estructural del contratista de obra.

Una vez revisado los estudios y diseños hidraulicos de manera conjunta en la presente mesa de trabajo, así mismo la interventoría analizó las observaciones técnicas presentadas por el especialista del contratista de obra, y por consiguiente, la interventoría manifiesta que esta de acuerdo con las mismas, las cuales se anexan a la presente acta, pero ejecutivamente se observa que:

Los diseños recibidos presentan inconvenientes para su implementación y construcción, por lo que se hace necesario evaluar los siguientes aspectos y aclarar los siguientes aspectos entre el diseñador y la entidad contratante:
Se requiere claridad sobre la competencia o no de la EAAB sobre los diseños mostrados.
Se requiere solicitar información base sobre los parámetros de diseño, estructuras planteada, las consideraciones y memorias de cálculo disponibles.
Debe aclararse junto a la entidad contratante la necesidad o no de tramites respecto a la entrega de aguas lluvias a quebrada, limas de caudales captados por parte del area ambiental.
No se tiene claridad sobre el punto de salida mencionado en notas de planos.

Seguidamente se continúo con la revisión de manera conjunta de los estudios y diseños estructurales del proyecto, así como la revisión punto a punto de las observaciones técnicas presentadas por el especialista estructural del contratista de obra, a lo que la interventoria una vez analizado y revisado el documento informa que efectivamente las observaciones son procedentes respecto a los diseños estructurales recibidos por la entidad, y estas se anexan a la presente acta.

En cuanto a la revisión realizada conjuntamente a la documentación topografica entregada por la entidad se evidenció que dentro de la información entregada de topografia del consultor no se encontró la ortofoto generada, no se encontraron puntos de apoyo aparte de los puntos de fotocontrol utilizados en el vuelo en su momento. En la información entregada por la SDHT no suministran apoyos topográficos, ni planos topográficos iniciales. Se revisó la información de arquitectura, pero no se encuentra georreferenciada, y la escala no corresponde. En la carpeta del IDIGER anexo V no están los planos en CAD.

Finalmente y una vez revisados los documentos entregados por la entidad contratante, referentes al diseño arquitectónico del proyecto, el contratista de obra y la interventoría concuerdan en que se presentan las siguientes observaciones:

- El plano de diseño arquitectónico no tiene concordancia con el plano estructural.
- El plano arquitectónico no tiene una limitación clara entre etapas.
- El detalle de los muertos en concreto ciclopeo, no están detallados en los planos de etapa 2, solo están detallados en los planos de la etapa 1, pero si están contemplados en el presupuesto item 5.3.5.
- En el presupuesto item 2.1, se especifica base en concreto de 2.500 PSI, de 0.15 cm de espesor; y en el detalle de planos estructurales se detalla placa de 0.10cm y concreto de 3.000 PSI, igualmente se requiere malla electrosoldada No 188, para aprox. 4.000 ml2 y en presupuesto 687 kilos.

Adicionalmente se evidencia que no se encuentran los planos de mitigación del riesgo.

17509

	ACTA DE REUNIÓN No. 01	CÓDIGO	PLE-FT-09	VERSIÓN	2
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	MESA DE TRABAJO REVISIÓN DISEÑOS INICIALES ENTREGADOS POR EL IDIGER	ÁREA RESPONSABLE	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA DE OBRA

FECHA	2	3	2023	LUGAR	OFICINAS NITERVENTORIA	HORA	8AM	HOJA _1__ DE _3__

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones encontradas a los diseños, estructurales, hidraulicos, topografia y arquitectónico, la interventoria se compromete a dar traslado de estas observaciones a la entidad contratante.

Anexos:

Observaciones a los estudios y diseños Estructurales.
Observaciones a los estudios y diseños Hidraulicos.
Observaciones a la Topografia.
Observaciones a los diseños Arquitectonicos.

529

1710

	ACTA DE REUNIÓN No. 01	CÓDIGO	PLE-FT-09	VERSIÓN	2
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	MESA DE TRABAJO REVISIÓN DISEÑOS INICIALES ENTREGADOS POR EL IDIGER	ÁREA RESPONSABLE	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA DE OBRA

FECHA	2	3	2023	LUGAR	OFICINAS NITERVENTORIA	HORA	8AM	HOJA _1__ DE _3__

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
ENVIAR AL IDIGER LAS OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	INTERVENTORIA	2	3	2023

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES
MARIA ALEXANDRA POSADA		INTERVENTORIA	
CARMEN POSADA ARDILA		INTERVENTORIA	
DIEGO FERNANDO GARCIA		INTERVENTORIA	
CESAR GUSTAVO OSPINA		CONTRATISTA OBRA	
FREDDY SUAREZ LUNA		CONTRATISTA OBRA	
PATRICIA TORRES		CONTRATISTA OBRA	
GUSTAVO LOPEZ DUQUE		CONTRATISTA OBRA	
OMAR ARCHILA MENDOZA		CONTRATISTA OBRA	
CAMILO BELTRÁN		CONTRATISTA OBRA	

530

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	OFICINAS IDIGER	Fecha:	17	03	2023
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Final:	9:30am		

Objetivo

Comité de Obra N. 03

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Información Respecto a la apropiación de los Estudios y Diseños del Proyecto**

17512

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al presente comité de obra con la presentación de los asistentes a la misma, dentro de los cuales están profesionales del contratista de obra, de la interventoría, el supervisor del contrato por parte del IDIGER y su equipo de profesionales.

Se inicia el presente comité informando las diferentes observaciones que se tienen por parte del Contratista de Obra a los estudios y diseños entregados por la entidad, las cuales fueron revisadas y avaladas por la interventoría en mesa de trabajo realizada conjuntamente con el contratista de obra, así mismo fueron radicadas mediante oficio No. 010-008-2023 del 15 de marzo 2023.

Teniendo en cuenta que se evidencia la necesidad de realizar un ajuste a los estudios y diseños entregados por la entidad, para lograr realizar la armonización correspondiente de los diseños, se le solicita al contratista de Obra entregar una propuesta técnica y económica para realizar los ajustes necesarios a los diseños del presente proyecto, por consiguiente, el contratista de obra se comprometió a hacer entrega a la interventoría de esta propuesta el día martes 21 de marzo 2023 para su respectiva revisión y aprobación y posterior traslado a la entidad.

532

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1. Entregar Propuesta técnica y económica para realizar los ajustes a los diseños del proyecto	Contratista de Obra	21	03	2023
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

1514

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Registrar los datos de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
GUILLERMO ESCOBAR	DIRECTOR GENERAL	IDIGER	
JHON JAIRO VILLAMIZAR	APOYO A LA SUPERVISION	IDIGER	
PILAR GARCIA	SUBDIRECTOR ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	IDIGER	
DARWIN JAVIER ORTIZ	SUPERVISOR SUBDIRECTOR PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	IDIGER	
WILSON PULIDO	COORDINADOR DE OBRAS	IDIGER	
MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA – MAPO INGENIERIA SAS	
MARIA DEL CARMEN POSADA	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA – MAPO INGENIERIA SAS	
FREDY SUAREZ LUNA	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA – CONSORCIO VAPA	

534

(+)(1)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Lugar:	VIRTUAL – PLATAFORMA MEET	**Fecha:**	22	03	2023
Hora Inicio:	9:00 am	**Hora Final:**	10:13 am		

Objetivo

Comité de Obra N. 04

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Propuesta Técnica y Económica contratista de Obra**
4. **Observaciones a los Diseños**
5. **Solicitud de Suspensión**

535

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al presente comité de obra con la presentación de los asistentes a la misma, dentro de los cuales están profesionales del contratista de obra, de la interventoría, el apoyo a la supervisión del contrato por parte del IDIGER.

Se inicia el presente comité solicitando información al IDIGER en cuanto a las observaciones presentadas a la entidad de los diseños entregados, así como de la solicitud de suspensión debido a estas observaciones. De acuerdo con esto, el IDIGER informa que se le informó a la SDH de esta situación e informaron que van a revisar esta información y con base a la propuesta técnica y económica que presente el contratista de obra se analizará la solicitud de suspensión presentada.

El contratista de obra informa que esta propuesta técnica y económica ya fue entregada a la interventoría, y la interventoría manifiesta que en esta propuesta no hay claridad de las actividades especificas que se van a realizar, así como los productos que se van a entregar y presentar un cronograma de estas entregas. La interventoría solicita que se determine si efectivamente el ajuste a los diseños lo va a realizar la SDH o el contratista de obra.

El contratista de obra solicita información respecto a la reunión interna entre entidades que se realizaría el pasado viernes 17 de marzo 2022 con SDH. A lo que el IDIGER informa que efectivamente se reunieron con SDH y se acordó reunirse el viernes 24 de marzo de 2023 para revisar la propuesta técnica y econmómica al ajuste a los estudios y diseños presentada por el contratista de obra.

El contratista de obra se compromete a entregar la propuesta ajustada a las observaciones realizadas por la interventoría el día de hoy a las 3PM, no obstante, solicita que las observaciones presentadas a los diseños sean aclaradas ya que son temas muy puntuales y que a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la entidad, teniendo en cuenta que el tiempo corre y no se está avanzando en el tema que corresponde a los que es netamente la obra, y no se puede avanzar por causas ajenas al contratista de obra, el cual tiene los profesionales al servicio del contrato que no se ha podido ejecutar. Así mismo, solicita respuesta con respecto al tema de la solicitud de suspensión del contrato, a lo que el IDIGER informa que están a la espera de la respuesta por parte de la SDH, no obstante, no se ve viable realizar la suspensión de la obra, y están a la espera de la reunión de todos los consultores para dar respuesta a las observaciones.

El contratista de obra manifiesta que se debe hacer seguimiento a las actividades de obra, no obstante, la obra no se puede iniciar por razones ajenas y por consiguiente informan que hoy reiteran la solicitud de suspensión del contrato a la interventoría. A su vez la interventoría manifiesta que es indispensable tener en cuenta los tiempos del proyecto, por consiguiente, ve considerable la suspensión del contrato para poder realizar las respectivas mesas de trabajo.

Seguidamente el IDIGER reitera que, para la realización de los ajustes a los diseños, es sumamente importante la propuesta técnica y económica del contratista de obra, para evaluar el tema.

El contratista de obra informa que la idea es que el ajuste a los diseños se realice tratando de que la obra se ejecute en los tiempos contractuales iniciales y el valor del contrato, pero el tema del precio se vería afectado con la consultoría. Así mismo manifiestan la inquietud de cómo se va a reponer el tiempo que ha pasado resolviendo estos temas, ya que necesitan que se reponga este tiempo en ejecución, toda vez, que son tiempos que no son imputables al contratista de obra ni a la interventoría.

Se informa por parte del contratista de obra y de la interventoría que, no obstante, a los inconvenientes presentados respecto a las observaciones que se tienen a los diseños, se está trabajando en las actividades sociales, elaborando actas de vecindad y caracterizaciones sociales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT - 21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

SOPORTE ASISTENCIA VIRTUAL





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1. Entregar Propuesta técnica y económica para realizar los ajustes a los diseños del proyecto, ajustada con las observaciones presentadas por la interventoria – 3pm	Contratista de Obra	22	03	2023
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Registre todas las personas que participan en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
JHON JAIRO VILLAMIZAR	APOYO A LA SUPERVISION	IDIGER	
MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA – MAPO INGENIERIA SAS	
MARIA DEL CARMEN POSADA	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA – MAPO INGENIERIA SAS	
ANGIE PARDO RAMIREZ	PROFESIONAL CIVIL	INTERVENTORIA – MAPO INGENIERIA SAS	
FREDY SUAREZ LUNA	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA – CONSORCIO VAPA	
CESAR OSPINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA DE OBRA – CONSORCIO VAPA	
YENNY CUESTA	PROFESIONAL AMBIENTAL-SST	CONTRATISTA DE OBRA – CONSORCIO VAPA	

(7520)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Lugar:	SALA DE JUNTAS IDIGER	**Fecha:**	29	03	2023
Hora Inicio:	5:00 pm	**Hora Final:**	06:26 pm		

Objetivo

Comité de Obra N. 05

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Propuesta Técnica y Económica contratista de Obra**
4. **Observaciones a los Diseños**
5. **Desalojo nuevas ocupaciones**
6. **Alternativa de Inicio de Obras**

540

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE – FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al presente comité de obra con la presentación de los asistentes a la misma, dentro de los cuales están profesionales del contratista de obra, de la interventoría, el supervisor del contrato con su equipo de trabajo por parte del IDIGER.

Se inicia el presente comité solicitando por parte del IDIGER la entrega del Plan de Gestión Social de la interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido entregado.

Así mismo y una vez revisadas las observaciones por parte del IDIGER, solicitan a la interventoría un concepto con respecto a las observaciones presentadas por el contratista de obra, para que la SDH pueda dar solución a estas observaciones teniendo en cuenta la reunión interna interinstitucional que realizan los días viernes con la SDH. No obstante, el contratista de obra indaga si el IDIGER tiene claras las partes de los diseños que tienen dificultad, y se recuerda que con anterioridad se solicitó una mesa de trabajo entre todos los especialistas tanto del contratista de obra, como de interventoría, como del IDIGER y de SDH.

El IDIGER manifiesta que en cuanto la solicitud de suspensión no es factible, toda vez que se suspenderían todos los actuantes directos en el presente proyecto, así mismo menciona el apéndice respecto a los Ajustes de los estudios y diseños, y que efectivamente hay unas acciones que ameritan todas las observaciones presentadas pero no hay respuesta punto a punto conceptual y técnicamente por parte de la interventoría, el contratista debe proponer a la interventoría el ajuste a la armonización de los diseños de urbanismo con mitigación.

El contratista de obra menciona un ejemplo de una observación hidráulica, en la cual se debe determinar el caudal en la zona de arriba, no existe caudal y esa es la propuesta del contratista de obra, armonizar las obras proyectadas con la realidad del terreno, así mismo, indica que el animo como empresa es llegar a las soluciones, teniendo en cuenta que al contratista de obra es al que más le pesa los plazos, por consiguiente, solicitan fijar fechas, actividades y compromisos.

El IDIGER señala que es necesario unificar criterios tanto de obra como de interventoría, y por eso solicita a la interventoría entregar el concepto de la interventoría punto a punto a cada una de las observaciones realizadas por los profesionales del contratista de obra. La Interventoría informa que efectivamente se realizó una mesa de trabajo con el contratista de obra para la revisión en conjunto de las observaciones que surgieron de las revisiones realizadas por los especialistas de obra y de interventoría.

El contratista de obra menciona que la topografía se realizó con RTK, estación y a su vez con vuelo de Drone, e informó que la implantación no se pudo realizar, porque no está consolidado en la planimetría, arquitectónicamente el proyecto no se puede implantar, por consiguiente, la propuesta es implantar la parte arquitectónica y urbanística y explica la dificultad social que presenta el diseño actual con el muro de contención que se propone construir aledañamente a las viviendas colindantes.

Seguido con el tema de la propuesta que presentó el contratista de obra, informa la estructura del mismo en el cual menciona que lo básico es el componente arquitectónico, luego seguirían con el componente hidráulico, seguido del geotecnista y finalizando con el estructural, teniendo en cuenta que el componente estructural es el más complejo y largo en tiempo se propone entregar por zonas para poder iniciar la ejecución de las obras, pero presenta una preocupación para poder iniciar estas obras se necesita el aval a estos diseños ajustados de la interventoría y del IDIGER.

El IDIGER menciona que el componente hidráulico se puede trabajar al tiempo con el arquitectónico y pueden avanzar en las obras de ladera. Con respecto al diseño de las obras de drenaje de descole, solicitan que se diseñe a un periodo de retorno de 100 años, teniendo en cuenta que la mayoría de obras de mitigación fallan por las obras de drenaje. Así mismo mencionan que el IDIGER tiene la estación en el tanque de Quiba en Brisas del Volador, y que esos datos se pueden descargar por la página Web del IDIGER.

El contratista de obra manifiesta que la interventoría le solicitó revisar los tiempos presentados en el cronograma de los ajustes a los diseños, ya que está para ejecutarse en 8 semanas, por consiguiente, propone traslapar las actividades de los componentes de Arquitectura, Hidráulico y Geotecnista, y el hacer entregar por etapas con el estructural.

El IDIGER ve con preocupación que al hacerlo sectorizado al inicio de los ajustes se evidencien actividades no previstas y/o adiciones, por consiguiente, la otra propuesta sería iniciar con las obras de ladera, mientras se solucionan los inconvenientes con las obras de urbanismo. El contratista de Obra manifiesta que efectivamente las obras de ladera no son una ruta crítica pero solicitan despejar las nuevas ocupaciones para poder entrar a trabajar en este sector, ya que en

SAI

estos sitios hay gran parte de arborización, no obstante, se debe llevar un árbol fortalecido, a lo que informa el contratista de obra que tiene sus especies compradas fortaleciéndose en vivero, también informa que en las obras de ladera se encuentran los biorollos pero los sustratos se tienen que fabricar, y por último los trinchos, esas son las únicas actividades que se podrían realizar en la zona de ladera.

El IDIGER indica que, si se llega a dividir por fases el ajuste a los diseños, se solicita realizar de tal manera que al inicio no se tengan APU's y/o adiciones y manejarlo mejor con actas de mayores y menores cantidades. Así mismo informa, que la SDH va estar incluido en el proceso de elaboración de los ajustes a los diseños arquitectónicos.


La interventoría indaga respecto a que si se requiere un prediseño arquitectónico para que SDH nos avale o ellos emiten los lineamientos a seguir, a eso el IDIGER manifiesta que el viernes 31 de marzo 2023 se realizará una reunión interinstitucional a la cual asiste la SDH por consiguiente solicita hacer una presentación ejecutiva de la parte arquitectónica a la SDH en esta reunión para ver la respuesta de ellos respecto a las observaciones presentadas, así mismo, solicita plantear la situación social con respecto al muro de 5m que se propone construir aledaño a las casas colindantes al proyecto, y por ultimo presentar las observaciones más relevantes de cada componente, con el fin de que la SDH defina que se puede mantener del diseño arquitectónico y que se puede modificar del mismo.

El IDIGER propone que el arquitecto de obra, pueda hacer una zonificación arquitectónica, de acuerdo con la caracterización y a la complejidad de las zonas, y con esto el contratista de obra presentar otra alternativa de cronograma para el inicio de las obras.

A continuación, el contratista de Obra presenta los costos a los ajustes a los diseños, a lo que el IDIGER manifiesta que dentro de la propuesta no se evidencia el rubro para la propuesta de elaboración del Estudio Hidrológico y diseño hidráulico, así como que se debe tener en cuenta los trámites para la obtención de los permisos que se requieren de otras entidades como lo son el acta del JBB para el paisajismo o el POC o el silvicultural con compensación. En este mismo sentido el IDIGER solicita revisar la implementación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) al presente proyecto, revisar con la profesional del IDIGER encargada de este tema para verificar qué tipos de SUDS se puede implementar en el presente proyecto.

Finalmente como compromiso del contratista de obra está la entrega de la propuesta económica de los ajustes a los diseños debidamente desglosada con la justificación de los costos desglosados para el día de mañana 30 de marzo 2023, así como la presentación en el comité del viernes con SDH de la parte arquitectónica, así como la entrega de las 2 propuestas de cronograma para los ajustes a los diseños la inicialmente presentada con entregas parciales por parte del especialista estructural y la de la zonificación arquitectónica.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

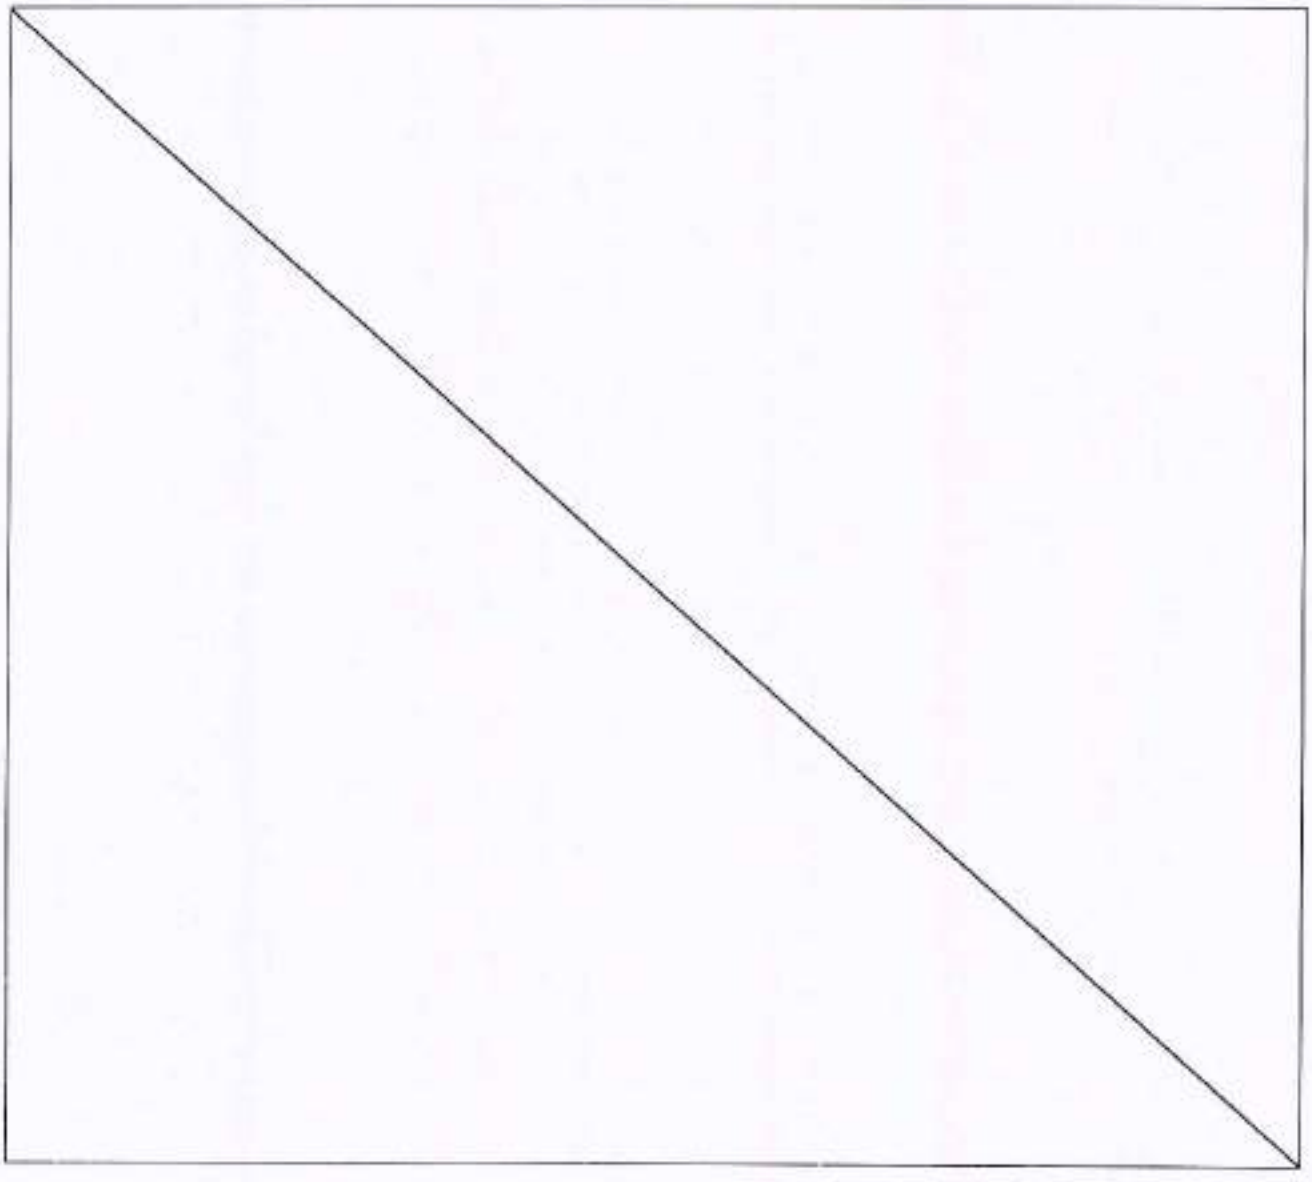

SA3

17524

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1. Entregar Propuesta económica desglosada con la discriminación de los costos presentados y la inclusión de los costos del estudio hidrológico y diseño hidráulico, así como de los trámites de los diferentes permisos.	Contratista de Obra	30	03	2023
2. Presentación Arquitectónica a SDH incluida la parte social, y los puntos mas relevantes de los demás componentes	Contratista de Obra	31	03	2023
3. Entrega 2 propuestas cronograma a los ajustes de los diseños	Contratista de Obra	30	03	2023
4. Entrega concepto con respecto a las observaciones presentadas por el contratista de obra	Interventoria	03	04	2023
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

544

17525

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Registre firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SAS

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONTROL DE ASISTENCIA**	Versión:05 Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☐ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual? COMITE DE OBRA			Hoja 1 de 1
TEMA:	COMITE DE OBRA	RESPONSABLE:	INTERVENTORIA	
LUGAR:	SALA DE JUNTAS IDIGER	FECHA:	29-03-2023	HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
	Jhon Jaire Villamizar R	Idiger	Apoyo a Supervisión	3134407777	jvillamizar@idiger.gov	
	Oscar Muñoz G.	IDIGER	Apoyo a Supervisor	3133766035	omuñoz@idiger.gov	
	Lucy Sepulveda A.	IDIGER	Apoyo A La Supervisión Social	3004510542	lsepulveda@idiger.gov.co	
	Marco Fernando Chaparro R.	IDIGER	Arq/Sup/Ambiental	3167640421	mfchaparro@idiger.gov	
	Freddy Suarez Luna	Contratista	Director Obra	3144541709	freddysuarez15@gmail.com	
	Cesar G. Ospina J	contratista	R. Legal	3132513142	Consorcio Vice Gerente	
	Gustavo López D	contratista	Estructural	3005726977	gustavo lopez 777 @gmail.com	
	Mª Alejandra Posada	Interventoría	R. L	3125665548	Email in jimagi.09.ap@g	
	Mª del Carmen Posada	Interventoría	Director	3133833742	carmenposadaruda@hotmail.co	
	Wilson R. Prado Villarreal	IDIGER	PAO ESP	3005105408	wprado@idiger.gov.	
	Angie Pardo Ramirez	Interventoria	Ing. Civil	3005182680	ilinamico8.mapa@gmail.	Angie Pardo

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	SALA DE JUNTAS IDIGER	Fecha:	12	04	2023
Hora Inicio:	5:00 pm	Hora Final:	06:30 pm		

Objetivo

Comité de Obra N. 06

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Componente Social**
4. **Componente Técnico**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al presente comité de obra con la presentación de los asistentes a la misma, dentro de los cuales están profesionales del contratista de obra, de la interventoria, el supervisor del contrato con su equipo de trabajo por parte del IDIGER.

Se inicia el presente comité solicitando por parte del IDIGER al contratista de obra información respecto al avance en la realización de los ajustes a los diseños, a lo que el contratista de obra informa que efectivamente ya se radicó toda la documentación ante la interventoria y esta ante el IDIGER, de la solicitud de modificación al contrato respecto a unas menores cantidades para poder incluir el ajuste a los diseños, de acuerdo con el cronograma que se entregó con esta solicitud, se van a mantener en los tiempos, esto quiere decir que el día 21/04/2023 se realizará la socialización de la fase 1 ante la comunidad, el 19/04/2023 a la 1pm se tendrá una mesa de trabajo entre obra e interventoría para revisar el anteproyecto que se presentará en la socialización, se espera que para esa fecha ya se cuente con el modificatorio en firme por parte del IDIGER.

El IDIGER manifiesta que efectivamente se está trabajando en el modificatorio y se espera tenerlo en firme esta semana, teniendo en cuenta que mañana es la reunión con SDH, ya que el IDIGER no presenta observaciones a esta solicitud.

El contratista de obra manifiesta que efectivamente en la justificación de la solicitud del modificatorio del contrato de obra se anexa la respectiva programación está se iniciará con la fecha con la que se firme el respectivo documento. No obstante, se requiere tener en cuenta estos tiempos con el fin de iniciar obras en la fase 1 el día 01/05/2023.

Se solicita al IDIGER el tema del desalojo de las unidades de invasión, si no se encuentran desalojados para la anterior fecha no es posible iniciar obras. El IDIGER informa que se están realizando los trámites pertinentes para realizar los respectivos desalojos, se están agotando todos los aspectos jurídicos respecto a este tema, igualmente se informa al contratista de obra y a la interventoría que efectivamente son consientes que si estos desalojos no se hacen se deberá hacer el respectivo ajuste a la programación de obra.

El contratista de obra manifiesta que independientemente que no se hayan podido iniciar las actividades de obra, se está trabajando en las diferentes actividades sociales, teniéndose un avance del 31% en este componente.

La interventoría manifiesta el tema de la necesidad del profesional especialista estructural que necesita la interventoría, teniendo en cuenta que efectivamente como ingenieros civiles se puede emitir un concepto técnico, pero no estamos en la capacidad de discutir y/o aprobar algún concepto de un especialista estructural que presente el contratista de obra.

El área social del Idiger solicita que, para el martes 18 de abril 2023, ya debe estar instalada la valla informativa, en el sitio del proyecto, teniendo en cuenta que ya fue avalado el respectivo arte. Así mismo se solicita que cuando se tenga la nueva instalación para el PAC se instale de manera inmediata el respectivo pendón el cual también ya se encuentra aprobado.


El IDIGER manifiesta la necesidad de realizar la socialización de inicio del presente proyecto, el cual se acuerda hacerla el día sábado 15 de abril 2023.

El IDIGER solicita la entrega del inventario de redes hidráulicas al contratista de obra, así como la información en cuanto al Permiso de Ocupación de Cauce.

En cuanto a los informes la interventoría manifiesta que efectivamente los informes semanales de obra ya han sido revisados, y serán radicados el día de mañana 13 de abril 2023 en conjunto con los informes semanales de interventoría.

17529

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

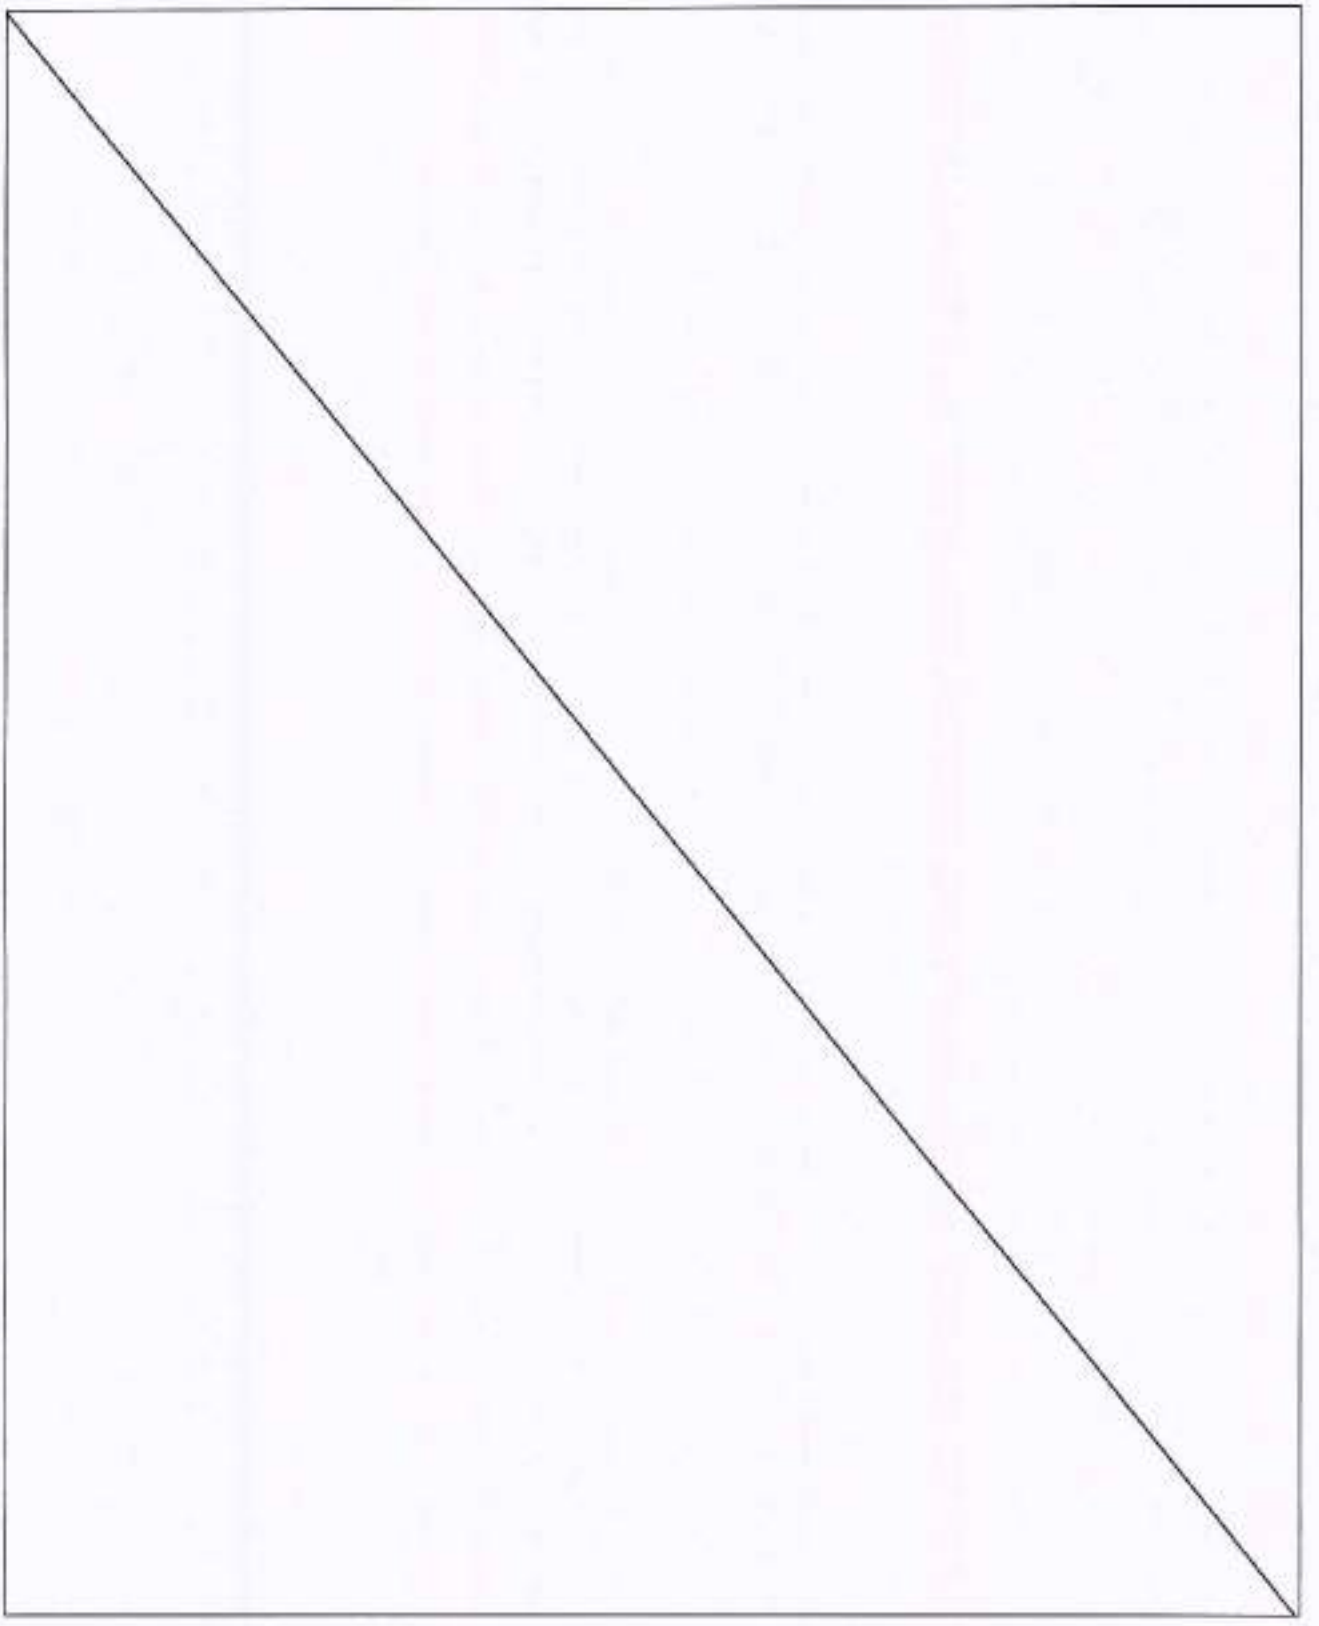

589

17530

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1. Socialización de Inicio	Contratista de Obra IDIGER Interventoria	15	04	2023
2.				
3.				
4.				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

550

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Requerirá firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

551

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☑ Reunión ☐ Sensibilización ☒ Otro Cual? COMITE OBRA.			Hoja ___ de ___
TEMA:	COMITE DE OBRA N°	RESPONSABLE:		
LUGAR:	IDIGER - SALA DE JUNTAS	FECHA:	12-04-2023	HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
01	Diana Castillo G.	Consorcio Vapa	P. Social	3133572655	Consorciovapa223@	
02	Freddy Suarez L.	Consorcio Vapa	Director	3144547[illegible]	g.consorciovapa223@gmail.com	
03	Jhon Jairo Villamizar	Idiger	Apoyo a Sup.	3134407777	jvillamizar@idiger.gov.co	
04	Oscar Muñoz D.	Idiger	Apoyo Sup.	3133760436	omunoze@idiger.gov	
05	Lucy Sepulveda A.	IDIGER	Apoyo a la Supervision Social	3004510542	lsepulveda@idiger.gov.co	
06	Carmen Taborda A.	Apoyo Interv.	Directora Interv.	3133883442	carmen.taborda@	
07	Maria Serrano Lota	Apoyo Ingeniera	P. Social	3238167774	maria.serrano.apoyo@gmail.com	
08	Darwin Juney Ortiz G.	IDIGER	Subdirector	3203425162	dortiz@idiger.gov.co	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

155

7532

17733

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DEL CONTRATO FONDIGER-002-2023

Lugar:	SALÓN COMUNAL BARRIO EL MIRADOR		**Fecha:**	15	04	2023
Hora Inicio:	3:00 PM	**Hora Final:**	5:00PM			

Objetivo

Realización de reunión de socialización del contrato FONDIGER-002-2023, con el fin de exponer actividades específicas del proyecto a nivel (Técnico, SST, Ambiental Y social), que darán respuesta a las especificidades del mismo tales como: (tiempo de ejecución del contrato, inversión inicial del proyecto, alcance, antecedentes , objetivos, cronograma, marco normativo, PMT y programas de Gestión técnico, ambiental, SST y Social).

Orden del día

1. Se adecuó el lugar de recepción (Salón comunal del barrio el mirador) con una logística que comprendía: (100) sillas, (2) mesas, (1) micrófono, (1) videobeam, presentación formal de los temas a exponer en la reunión y finalmente un refrigerio repartido para cada uno de los asistentes a la misma.
2. Se realizó la ubicación de la comunidad, los asistentes del instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio climático (IDIGER) y la interventoría en los espacios destinados para su repeción.
3. Se dio inicio a la presentación de la reunión de socialización a cargo del CONSORCIO VAPA, como ejecutor del proyecto, el cual realizó la respectiva presentación de los miembros que forman parte para el desarrollo del mismo (Representantes del IDIGER y Representantes de la interventoría Mapo ingeniería s.a.s)
4. Se realizó la proyección de la presentación del CONTRATO FONDIFER-002-2023, a cargo del CONSORCIO VAPA y dirigida a la comunidad, Junta de acción comunal del barrio El Mirador, Lideres comunitarios, Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y cambio climático (IDIGER) e interventoría.
5. Se abrió espacio de participación a la comunidad, con el fin de resolver dudas, inquietudes y/o sugerencias expuestas por la comunidad.
6. Se realizó compartir con la comunidad, evidenciando la entrega de un refrigerio a todos los asistentes a la reunión.
7. Se realizó cierre de la misma, tomando listados de asistencia, registros fotográficos y dejando como soporte de la ejecución de la misma, el levantamiento de un acta de la reunión ejecutada.

Desarrollo de la Reunión:

1. Para la recepción de los asistentes a la reunión de socialización, se contó con la óptima adecuación del espacio de recepción (Salón comunal barrio EL MIRADOR) en donde se dispuso de : (100) sillas, (2) mesas, (1) micrófono, (1) videobeam, y finalmente espacio para la distribución de un refrigerio para cada uno de los asistentes a la reunión.

2. Una vez contado con un cuórum de 50 personas ubicadas, la asistencia de la interventoría MAPO INGENIERIA S.A.S Y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y cambio climático IDIGER, se procede a dar inicio a la reunión siendo las 3:15 pm de la tarde.

3. Se dio inicio a la presentación de la reunión de socialización de inicio de obra siendo las 3:15 pm, a cargo del CONSORCIO VAPA (Contratista de obra), en donde inicialmente se realizó la presentación de cada uno de los representantes involucrados en la ejecución del proyecto en cabeza del Ingeniero

Darwin Ortiz, en calidad de Subdirector y Supervisor del contrato por parte del IDIGER, Representantes de la interventoría y del contratista.

4. Se proyecto la presentación del contrato FONDIGER-002-2023, a cargo del CONSORCIO VAPA, en donde se expuso lo siguiente: (antecedentes del proyecto, localización, objetivos, antecedentes, alcances del proyecto, cronograma de obra, marco normativo, desplazamientos peatonales, PMT, inversión general del proyecto, productos esperados y planes de Gestión Ambiental y social).

5. Una vez concluida la presentación por parte del contratista, se da apertura al espacio de participación ciudadana en donde se manifiestan las siguientes inquietudes:

a) El señor José piñeros pregunta, que va a pasar con las casas que se encuentran en reasentamiento en la parte de la ladera.

RTA: El ingeniero Darwin Ortiz, responde que para estos predios se ha realizado previas visitas de la caja de vivienda popular y la secretaria del hábitat, con el fin de llegar a un acuerdo de sobre una oferta inmobiliaria, a los (2) predios previamente identificados por el IDIGER. Se expone que hubo una última visita en la semana del 11 al 14 de abril de 2023 con el acompañamiento de la alcaldía local, personería, caja de vivienda popular e IDIGER. Por lo que se le sugiere al señor acercarse a la caja de vivienda popular con el fin de solucionar acuerdo entre el residente del predio y la caja de vivienda popular.

b) La señora Blanca Lilia Millán: Muestra inconformidad sobre la implantación de los muros falsos, ya que no está de acuerdo con la altura ni el espacio que yace entre pared del predio y el muro falso, expone que esto se prestaría para promover la inseguridad del sector en términos de (drogas, hurtos, y abusos) y adicional estas fachadas falsas taparían la vista de sus predios ya que algunas cuentan con ventanas que dan hacia la ladera. Por lo tanto pide se replantee esta actividad ya que afecta a la comunidad.

RTA: El ingeniero Darwin Ortiz, responde su solicitud y exponiendo que estos diseños ya están realizados previamente por una consultoría hace aproximadamente 5años, en donde posiblemente ha habido cambios, sin embargo se tendrá en cuenta esta solicitud y se escalará con el acompañamiento de la secretaría del hábitat.

c) La señora Yeiat Núñez: Solicita sea tenida en cuenta la solicitud anterior, ya que además de la inseguridad que se prestaría con la implantación de los muros falsos, estos generarían humedad en las casas y adicional con las pérgolas que se tienen proyectadas implantar, se prestaría para que los habitantes de calle, las usen como camas, y expendio de drogas.

RTA: El ingeniero Darwin Ortiz nuevamente responde que se tendrá en cuenta estas manifestaciones por parte de la comunidad y se dará conocimiento de las mismas a la secretaría del hábitat.

d) El señor Ángel Boscán: Ratifica que la implantación de los muros falsos además de lo anteriormente expuesto, proliferaría la propagación de plagas, por los espacios que quedan entre el predio y la fachada falsa.

RTA: El ingeniero Darwin Ortiz, ante la múltiple reiteración del desacuerdo por la implantación de muros falsos, sugiere a la comunidad se realice una próxima reunión de socialización del proyecto, con el acompañamiento de la secretaría del hábitat y la alcaldía local, con el fin de atender y dar respuesta a todas sus inquietudes.

e) La señora Flor María Silva: Manifiesta que hay escombros de muro pegado a su predio y no sabe si este será demolido para la realización del nuevo muro falso, sin embargo solicita pueda ser retirado para la ejecución del presente contrato, pero sugiere que no se implante nuevo muro falso y por el contrario propone se puedan pañetar las fachadas, generando uniformidad entre los predios.

17534

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FI-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

RTA: El Ingeniero Darwin Ortiz, responde que se va a realizar una próxima reunión con el fin de poder darle respuesta a la comunidad sobre esta reiterativa manifestación de inconformidad con la implantación de los muros falsos.

6. Finalmente se distribuye refrigerios a cada uno de los asistentes, se realizo registro fotográfico de la actividad, registros de asistencia y se levanta acta de la reunión.
7. Se procede a dar cierre a la reunión, siendo las 5:00 pm.
8. Se anexa listado de asistencia.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Se programará una próxima reunión con la comunidad.	Consorcio VAPA.			

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

55A

REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)

Código: DE-FT-02
Versión: 3
Página: 1 de 2
Vigente desde: 07/09/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. [x] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. Reunión de socialización de inicio.

2. TEMA DE LA SESIÓN: Socialización del proyecto 002-203 Ferrocarril

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón Comunal Barrio el Mirador.

5. FECHA: 15 04 23 6. HORARIO 6.1. INICIO: 3:00 pm 6.2. FIN: 5:00 pm

HOJA 1 DE 6

7.1. N°	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE LO VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE LO VIVE	7.5. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA (Marque solo una opción, si es el caso): Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguno de los anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
1	Jose Gutierrez	19	Mirador	X				54									X	NA	3107918240	JJgutierrez2012@yahoo.com.co	
2	Mercedes Sanchez	19	Mirador		X			58								X		NA	3205123049	NA	
3	Carlos A. Ariza	19	Mirador	X				63							X			NA	3134402999	NA	
4	Maria Mendoza	19	Mirador		X			50									X	NA	3133552228	NA	
5	Blanca Millan	19	Mirador		X			53									X	NA	3134598169	MYC0319@hotmail.com	
6	Elvira Torres	19	Mirador		X			62									X	NA	3212640186	NA	
7	Ruben Tellez	19	Mirador	X				60									X	NA	3227211945	NA	
8	Edgar Ojuela	19	Mirador	X				65									X	NA	3124474115	NA	
9	Jorge Ceron	19	Mirador					46									X	NA	3202582834	NA	
10	Blanca Carrion	19	Mirador		X			62									X	NA	3144650103	NA	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y los demás normas reglamentarias.

REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)

Código: DE-FT-02
Versión: 3
Página: 1 de 2
Vigente desde: 9/10/2022

1. TIPO DE REUNIÓN
1.1. [x] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. Reunión de socialización de inicio

2. TEMA DE LA REUNIÓN: Socialización Contrato formalice - 002-2023

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón comunal Barrio El Mirador

5. FECHA: 17 04 23 | 6. HORARIO EL INICIO: 3:00 PM | 6.1. FIN: 5:00 PM | HOJA 2 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE SD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE VD VIVE	7.5. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negro	Afrodescendiente	Palenquera	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
11	Luis Eduardo Arevalo	19	Mirador	X				67											X	NA	3102537499	NA	
12	Luis Santamaria	19	Mirador	X				53											X	NA	3223655830	NA	
13	Rubiela Aroca	19	Mirador		X			68											X	NA	301 2559246	NA	
14	Victor Moreno	19	Mirador	X				62											X	NA	3208099756	NA	
15	Yenire Garcia	19	Mirador		X			30										X		NA	3224815807	NA	
16	Reinaldo Trujillo	19	Mirador	X				67											X	NA	3102823154	NA	
17	Hasley Gonzalez	19	Mirador		X			28											X	NA	3187701059	NA	
18	Gilberto Rincon	19	Mirador	X				61											X	NA	3133255835	NA	
19	Cristian Lozano	19	Mirador	X				30											X	NA	3086606918	NA	
20	Hernando Pastor	19	Mirador	X				73											X	NA	3208258985	NA	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

555

1737

REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)

Código: DE-FT-02
Versión: 3
Página: 1 de 2
Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. [x] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. Reunión de socialización de interé

2. TEMA DE LA SESIÓN: Socialización Contrato Fondicer-002-2023

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón comunal Barrio el Mirador

5. FECHA: 15 04 23 | 6. HORARIO: 6.1. INICIO 3:00 Pm | 6.2. FIN 5:00 Pm | HOJA 3 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE LO VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE LO VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso									7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante (Internacional)	Ninguno de los anteriores				
21	Demetrio Garzon	Ciudad Bolivar	Mirador	X				83										X	NA	7904824	NA	
22	Luis Eduardo	Ciudad Bolivar	Mirador	X				42								X		X	NA	3202358678	NA	
23	Jhon Jairo Cubillos	Ciudad Bolivar	Mirador.	X				55										X	NA	3208147504	NA	
24	Teodulo Herrera	Ciudad Bolivar	Mirador	X				78										X	NA	3125213444	NA	Teodulo Herrera
25	Ana Isabel Herrera	Ciudad Bolivar	Mirador		X			65										X	NA	3138571756	NA	Ana Isabel Herrera
26	Adelina Lozano	Ciudad Bolivar	Mirador	X				66							X				NA	3223631443	NA	
27	Emma mogollon	Ciudad Bolivar	Mirador		X			64										X	NA	NA	NA	Emma Mo
28	Florinda Robayo	Ciudad Bolivar	Mirador		X			70							X				NA	3138323213	NA	
29	Maria lourdes Gallen	Ciudad Bolivar	Mirador		X			72										X	NA	3134379065	NA	
30	Ximeon Olavija.	Ciudad Bolivar	Mirador	X				77										X	NA	3134379065	NA	Ximeon O.

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y los demás normas reglamentarias.

REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)

Código: GR-FT-52
Versión: 3
Página: 1 de 2
Vigente desde: 17/08/2022

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. [x] Sesión 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. Reunión de Socialización de Inicio

2. TEMA DE LA SESIÓN: Socialización Contrato FENACORE-002-2023

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón Comunal Barrio El Mirador

5. FECHA: 25 04 23 6.1 HORARIO: 3:00pm 6.2 FIN: 5:00 Pm

HOJA 4 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.5. SEXO: Hombre	7.5. SEXO: Mujer	7.5. SEXO: Intersexual	7.5. SEXO: No definido	7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negra	Afrocolombiana	Palenquera	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
31	Jorge Espitia	Ciudad Bolivar	Mirador	X				64											X	NA	3135701775	NA	
32	Flor Alba Pulido	Ciudad Bolivar	Mirador		X			57											X	NA	3133026021	NA	Flor Pulido
33	Mabel Sanabria	Ciudad Bolivar	Mirador		X			57											X	NA	3112442190	mabeljusnubria 620@gmail.com	Mabel Sanabria
34	Carmen Rosa Cano	Ciudad Bolivar	Mirador		X			67											X	NA	3223254366	NA	NO FIRMA.
35	Carmen Vergara	Ciudad Bolivar	Mirador		X			71											X	NA	7905042	NA	
36	Doris Quimbaya	Ciudad Bolivar	Mirador		X			64											X	NA	3124439424	NA	
37	Marcos Cortes	Ciudad Bolivar	Mirador	X				70											X	NA	NA	NA.	
38	Flor Maria Silva	Ciudad Bolivar	Mirador		X			68											X	NA	7902055	NA	
39	Ana Rodriguez	Ciudad Bolivar	Mirador		X			86								X				NA	NA	NA	
40	Johana Mendoza	Ciudad Bolivar	Mirador		X			30											X	NA	3115052295	NA	

Al diligenciar este formulario autorizo la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE REUNIÓN
1.1. [X] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. Reunión de Socialización de inicio

2. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón Comunal Barrio Mirador

5. FECHA: 25 04 23 6. HORARIO 6.1. DESDE: 3:00pm 6.2. HASTA: 5:00pm

7. TEMA DE LA REUNIÓN: Socialización del Proyecto CIU-2023 Fenicia

HOJA 5 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE LO VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE LO VIVE	7.5. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, sino aplica deje en blanco: Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
41	Lucas Zuniga	Ciudad Bolivar	El Mirador	X				65												N/A	321 2226412	NO	Lucas Z.
42	Maria Eva Parra	Ciudad Bolivar	El Mirador		X			58												N/A	4136090	NO	
43	Olga Guzman	Ciudad Bolivar	El Mirador		X			60												N/A	3209126191	NO	Yamila Jaramillo
44	Luis Antonio Fuentes	Ciudad Bolivar	El Mirador	X				64												N/A	3142462472	NO	LFuentes
45	Daniela Gomez	Ciudad Bolivar	El Mirador		X			28												N/A	1002094124	NO	Daniela Gomez
46	Mayra Murillo	Ciudad Bolivar	El Mirador		X			58												N/A	3123110910	NO	Mayra M
47	Ruben Tellez	Ciudad Bolivar	El Mirador	X				62												N/A	3227216947	NO	Ruben Tellez
48	Luisa Hernandez	Ciudad Bolivar	El Mirador		X			54												N/A	3133979492	NO	luisa hernandez
49	Omar castro	Ciudad Bolivar	El Mirador	X	X			64												N/A	3024047178	NO	Castro
50	Carlos Sanchez	Ciudad Bolivar	El Mirador	X				72												N/A	3144418385	NO	Sanchez

Al diligenciar este formulario autorizo la recolección, almacenamiento, uso y circulación de mis datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)

Código: DE-FT-53
Versión: 3
Página: 1 de 2
Vigente desde: 17/03/2021

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. [x] Reunión 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.4. Reunión de socialización de inicio

2. TEMA DE LA SESIÓN: Socialización de Contrato FENOGE-CO2-203

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón Comunal Barrio El Mirador

5. FECHA: 1f 04 23 6. HORARIO 6.1. DESDE: 3:00pm 6.2. HASTA: 5:00pm

HOJA 6 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE USTED VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE USTED VIVE	7.6. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negra, afrodescendiente	Palenquera	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
51	Camilo Nieto	Ciudad Bolívar	El Mirador	X				53										NO	3108329042	NO	
52	Tatiana Jaimes	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			52										NO	3015936282	NO	
53	Gonzalo Maldonado	Ciudad Bolívar	El Mirador	X				56										NO	3107635747	NO	
54	Mireya Celi	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			62										NO	3112615832	NO	
55	Brigida Sancho	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			64										NO	3143447845	NO	
56	Milena Rojas	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			57										NO	3144621772	NO	
57	Veronica Cruz	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			64										NO	3122572392	NO	
58	Laura Diaz	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			28										NO	3115519599	NO	
59	Stefanny Bermudez	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			71										NO	3132615550	NO	
60	Luz Gonzalez	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			62										NO	3115725914	NO	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

537

1737

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONAS NATURALES)	Código: DE-FT-52 Versión: 2 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

7. TIPO DE SESIÓN: 7.1. [x] REUNIÓN 7.2. [ ] TALLER 7.3. [ ] OTRO 7.4. Reunión de Socialización de inicio

8. TEMA DE LA SESIÓN: Socialización Contrato FENOGER-002-2023

9. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

10. LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón comunal Barrio El Mirador

11. FECHA: 15 04 23 | 12. HORARIO: 12.1. INICIO 3:00 pm 12.2. FIN 5:40 pm | HOJA 7 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE SE VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE SE VIVE	7.6. SEXO: Hombre	Mujer	Intersexual	No definido	7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
61	Jean Ramos	Ciudad Bolívar	El Mirador	x				63												NA	3144771154	NO	
62	Carlos Alvarez	Ciudad Bolívar	El Mirador	x				60												N/A	3134402918	NO	
63	Hector Cuchia	Ciudad Bolivar	El Mirador	x				58												N/A	3114629040	NO	
64	Jhon Jairo Cubillos	Ciudad Bolivar	El Mirador	x				57												N/A	3206947864	NO	
65	Cesar Melendez	Ciudad Bolivar	El Mirador	x				65												N/A	3108525023	NO	
66	Martha Isabel Bello	Ciudad Bolivar	El Mirador		x			64												N/A	3206361998	NO	
67	May Cristiano	Ciudad Bolivar	El Mirador		x			62												N/A	3118230893	NO	
68	Hernan Olmos	Ciudad Bolivar	El Mirador	x				64												N/A	3135761652	NO	
69	Arelino Lozano	Ciudad Bolivar	El Mirador	x				66												N/A	3223631473	NO	
70	Eloy Acevedo	Ciudad Bolivar	El Mirador	x				69												N/A	3102537444	NO	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: GR-FT-63 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/08/2023

1. TIPO DE EVENTO
1.1. [x] Reunión 1.2. [ ] Taller 1.3. [ ] Otro 1.3.1. Reunión de socialización de inicio

2. TEMA DE LA REUNIÓN: Socialización del contrato Pendiente-002-2023

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Sede Comunal Barrio El Mirador

5. FECHA: 28

6. HORARIO 6.1. INICIO: 3:00 pm 6.2. FIN: 5:00pm

HOJA 8 DE 8

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE LO VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE LO VIVE	7.5. SEXO: Hombre	7.5. SEXO: Mujer	7.5. SEXO: Intersexual	7.5. SEXO: No definido	7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso: Negro	Afrodescendiente	Palenquero	ROM	Indígena	Raizal	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores	7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
72	Flor Silva Giraldo	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			63												N/A	NO	NO	
73	Juan Pablo	Ciudad Bolívar	El Mirador	X				57												N/A	3133587282	NO	
74	Ruth Guzmán	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			62												N/A	312 3568136	NO	
75	Oswaldo Tarón	Ciudad Bolívar	El Mirador	X				52												N/A	3155969414	NO	
76	Yuri Garcia	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			50												N/A	3229806394	NO	
77	Jhaneth Gonzalez	Ciudad Bolívar	El Mirador		X			47												N/A	3113721365	NO	
79																							
78																							
79																							
80																							

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y los demás normas reglamentarias.

Nota: El este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

85

17538

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05 Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☑ Reunión ☑ Sensibilización ☐ Otro Cual?_____			Hoja 1 de 1
TEMA:	Socialización contrato FONDECE-002-23	**RESPONSABLE:**	Componente social	
LUGAR:	Salón Comunal Bosque el Muelle	**FECHA:**	13 ABRIL 2023	**HORA:** 3:00 pm

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Carmen Posada	Directora Interventoria	Directora	3133883442	carmenposadardila@hotmail.com.	
2	Angie Katherine Pardo R.	Interventoria	Ing. Civil	3005182630	lluvia1008.mapo@gmail.com	
3	MAURICIO POSADA	INTERVENTORIA	ARQ.	3005680623	d.mauro.pm@hotmail.com	
4	Fernando Nieto	Interventoria	Geotecnista	3006141087	n-9ingenieros@outlook.com	
5	Maria Serrano Lota	Interventoria	T. Social	3238107724	maria Serrano. mapo@Gmail.com	
6	Dora Castillo Guerra	Contratista	T. social	3133726157	Contratistaca26@gmail	
7.	Yenny Cuesta palacios	Contratista	R. Ambiental	3109672526	Cuestayenny@gmail	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

17539

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSOLIDADO ENCUESTA SATISFACCIÒN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

1.	LA INFORMACIÓN PRESENTADA FUE CLARA	FEMENINO	MASCULINO
MUY SATISFECHO		3	3
SATISFECHO		2	2
POCO SATISFECHO		0	0
2.	CONSIDERA USTED SI FUE OPORTUNO EL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA REUNIÓN		
MUY SATISFECHO		3	3
SATISFECHO		2	2
POCO SATISFECHO		0	0
3.	SE EVIDENCIO DOMINIO FRENTE AL TEMA SOCIALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO CONTRATISTA DEL PROYECTO		
MUY SATISFECHO		1	3
SATISFECHO		3	2
POCO SATISFECHO		0	0
4.	EN LA SOCIALIZACIÓN SE ACLARARON LAS DUDAS E INQUIETUDES QUE TENÍA FRENTE AL PROYECTO		
MUY SATISFECHO		0	1
SATISFECHO		4	2
POCO SATISFECHO		1	2
TOTAL		5	5

559



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

1

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Camilo neto

No Documento: 79.787.038

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		




CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

2

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***


Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Blanca Milán

No Documento: 51.702.548

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		




CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		

- Se aclaró la duda que se planteó sobre la incertidumbre de instalar muros falsos, sin embargo espero sea aclarado de manera definitiva como quedarían las fachadas de los casas que colindan con la carrera.



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

3

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Jorge esata

No Documento: 1.7.615.218

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenia frente al proyecto		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

4

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Yamit García

No Documento: 21382239

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO	POCO SATISFECHO X
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		

- Está en desacuerdo con que pongan Pico y Placa porque promueve la inseguridad en el sector



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

5

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***


Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: José Gutierrez

No Documento: tel: 3107918240

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO	SATISFECHO x	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO	x POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		

- Se dio respuesta a la incertidumbre por la instalación de los muros falsos, pero la comunidad solicita sean mostrados los diseños definidos antes de comenzar obra.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Jorge Cerón

No Documento: 3202852854

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenia frente al proyecto		

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

7.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes ítems

NOMBRE: Hasley Gonzales

No Documento: 3187301059

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		




CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

8.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***


Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Demetrio Cerón

No Documento: 7906834

MUY SATISFECHO	X SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO	X SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO	X POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		

- La comunidad necesita se aclare en otra reunión si se van a instalar los muros falsos o no



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

9

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Flaminda Rebolo

No Documento: 3138323213

MUY SATISFECHO	X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara			

MUY SATISFECHO		SATISFECHO	POCO SATISFECHO
	X		
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión			

17548



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO	X SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	X SATISFECHO	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		

568



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

10.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PARA EL CONTRATO FONDIGER-002-2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Es importante saber su opinión frente a la reunión socializada, agradecemos su opinión frente a los siguientes Ítems

NOMBRE: Hardy Gauna

No Documento: 3017516585

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
La información presentada fue clara		

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Considera usted si fue oportuno el lugar donde se realizó la reunión		



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

MUY SATISFECHO X	SATISFECHO	POCO SATISFECHO
Se evidencio dominio frente al tema socializado por parte del equipo contratista del proyecto		

MUY SATISFECHO	SATISFECHO X	POCO SATISFECHO
En la socialización se aclararon las dudas e inquietudes que tenía frente al proyecto		

17730

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21 Versión: 02 Página: 1 de 2 Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	IDIGER	Fecha:	21	04	2023
Hora Inicio:	9:00	Hora Final:			

Objetivo

Contrato Fondiger 008-2023

Orden del día

Desarrollo de la Reunión:

1- La Ing. Directora de Interventoría manifiesta que en la reunión desarrollada en las Instalaciones del Habitat con presencia del Idiger - Habitat - Contratista e Interventoría recibió de manera informal no oficial, por parte de la Ing. Natalia Jimenez - Ing de Apoyo del proyecto por parte del Habitat, 2 DOS(2) CDs con toda la información de los diseños (Hidráulico, Geotecnico, Estructural, Arquitectonico, Electrico, Paisajistico, Ambiental, PMT, SGST, etc), completos, los cuales difieren de la información entregada en el mes de febrero/2023 por parte del Idiger. Tanto la Interventoria, como el Contratista generaron observaciones sobre dicha información, los cuales pueden diferir o no existir con la nueva información recibida ayer. Se ha enviado al Contratista Vías y a los especialistas de la Interventoria para que

Powered by CamScanner

570

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

de forma urgente analicen y validen la información por cada especialidad.

2- El Ing. Muñoz apoyo a la Supervisión le manifiesta a la Interventoria que oficialice al Idiger lo aquí expresado con relacion a los diseños, con la debida factibilidad. ~~Oficializar~~ Oficializar al Contratista de Obra el envío de la información compartida por el Habitat, para su correspondiente revisión, análisis y ajuste a la propuesta que va a presentar con las decisiones adoptadas en la reunión del 20 de Abril en la sede del Habitat. Al tiempo, la Interventoria por su parte con el apoyo de dos especialistas hará una evaluacion tecnica de los estudios entregados y se pronunciará al respecto.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Analisis y Validacion nueva informe.	Interventoria	28	04	2023
cion de los Diseños				

Participantes (Incluir en firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Oscar Munoz Delgado	Ing Apoyo Idiger	Educacion	
Carmen Posada A.	Directiva Interv.	Happ Interv.	
Jhon Jairo Villamizar Ros	Apoyo a Supervision	Reduccion Idiger	

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA

Codigo: DE-FT-10
Pagina: 1 de 1
Versión: 6
Vigente desde: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN: ☐ Reun ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual? _____ | Hoja ___ de ___

TEMA: | RESPONSABLE: | HORA:

LUGAR: | FECHA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	MARIA DEL CARMEN POSADA	IDIGER	DIRECTOR	3133883492	carmen.posada@bogotá.gov.co	
2	Oscar Muñoz Delgado	IDIGER	Apoyo a la supervision	3133760205	omunoz@idiger.gov.co	
3	Jhan Jairo Villamizar Roa	Idiger	Apoyo a supervision	3134409477	jvillamizar@idiger.	

Diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

225

7552

17553

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	Oficinas IDIGER	Fecha:	26	04	2023
Hora Inicio:	4:30 PM	Hora Final:	07:18 PM		

Objetivo

Comité de Obra N. 9

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1- Presentación Asistentes

2- Trazabilidad Diseños

3- Componente Técnico

4- Presentación Propuesta Arquitectónica

5- Componente Social

573

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al presente comité por parte del Idiger, informando la trazabilidad que se tiene, con respecto a los Diseños de las Obras de Urbanismo elaborados por la Secretaría Distital de Habitat, y de acuerdo con esto manifiesta la necesidad de realizar los ajustes a los diseños Hidraulicos, Arquitectónicos, afectando los demás componentes.

El Contratista de Obra manifiesta que la propuesta de los Ajustes a los diseños presentada por ellos, y revisada por la Interventoría, no necesita ningún ajuste, se mantiene el alcance de esta propuesta, y solicita al Idiger adelantar los respectivos trámites para que el modificatorio presentado quede en firme.

Se ratifica que en los diseños presentados por la Secretaría Distital de Hábitat se mantienen las inconsistencias Hidraulicas, Arquitectónicas, topograficas afectando los demás componentes.

El contratista de Obra informa que ya tiene la Fase 1 de la propuesta Arquitectónica, y por consiguiente, será entregada el día de hoy a la interventoría para su revisión, y una vez aprobada se entregue al Idiger para la respectiva socialización con la Secretaría Distital de Hábitat. Seguidamente el contratista de Obra procedió a realizar la presentación de la fase 1 de esta propuesta Arquitectónica.

El Idiger soliata que en esta etapa de Agostes a los diseños, asistan a los comités los profesionales responsables de estos agustes tanto de Obra como de Interventoria, a lo que se informa que hay unos profesionales de manera presencial y otros virtualmente.

Se soliata al contratista de Obra, que dentro de la presentación de la Fase 1 de la propuesta Arquitectónica que se va a entregar, se pueda evidenciar el antes (diseños Iniciales) versus el despues (diseños agustados). Se acuerda que el contratista de Obra realizará esta entrega a la interventoria el dia de mañana 27 de Abril 2023 y a su vez la interventoria enviará esta documentación al Idiger para la respectiva socialización con la Secretaria Distrital de Habitat. Presentar render.
El Idiger citará a Mesa de trabajo a la Secretaria Distrital de Hábitat, con asistencia del contratista de Obra y la Interventoria, para el día viernes 28 de abril 2023, la hora se informará el día de mañana, con el fin de hacer la presentación de la propuesta arquitectónica realizada por el contratista de Obra

El Idiger soliata al contratista de Obra información de la entrega del Inventario de Redes hidraulicas, a lo que el contratista de Obra informa que el dia de mañana dará una fecha de entrega de esta

575

documentación.

El Idiger solicita la respectiva justificación con respecto a la nueva entrega de los diseños realizada por SDHT, informando si se mantienen o no las inconsistencias presentadas con anterioridad, así como los costos de la propuesta de ajustes a los diseños si se mantienen o hay variación, esto con el fin de Informar a la SDHT y a la Caja de Vivienda popular, para poder continuar con los trámites respecto a las modificatorios del contrato de Obra y de Interventoria.

Con respecto al componente social se informa que se tienen 130 actas de Vecindad y caracterizaciones sociales, de 193 predios totales inventariados.

Se solicita por parte del Idiger el cumplimiento en cuanto a las entregas de los Informes Mensuales tanto de Obra como de Interventoria, los cuales deben estar acorde con la lista de Chequeo entregada por el Idiger.

El Idiger confirma reunión con SDHT para el jueves 04 mayo 2023 a las 8:00 AM.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE - FT -21
Versión:
01
Vigente desde:
05-06-2020

A la fecha del presente Comité se tiene pendiente la entrega por parte de la Interventoria al Idiger de los Apendices de la Interventoria.

El consorcio VAPA Solicita nuevamente el compromiso que tiene la SDHT, con respecto al retiro de las nuevas ocupaciones y reasentamientos que se encuentran sobre la ladera.

17558

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1 Entrega Propuesta Arquitectónica a la Interventoria	Consorcio VAPA	27	04	23
2 Reunión con la SDHT para la presentación Arquitectónica.	Idiger Consorcio VAPA Mapo Ingeniería SAS	04	05	23
3 Entrega justificación si hay Ajustes a la propuesta inicial presentada.	Consorcio VAPA	29	04	23
4 Radicación Informe Mensual de Obra N. 4 al Idiger	Mapo Ingeniería SAS	27	04	23
5 Entrega a Interventoria del Inf. Mensual 2 de Obra Digital	Consorcio VAPA	28	04	23
6 Entrega a Interventoria del Inf. Mensual 2 de Obra Fisico	Consorcio VAPA	05	05	23
7 Entrega a Interventoria del Inf. Mensual 3 de Obra	Consorcio VAPA	19	05	23
8 Entrega a Idiger del Inf. Mensual 4 de Interventoria	Mapo Ingeniería SAS	01	05	23
9 Entrega a Idiger del Inf. Mensual 2 de Interventoria	Mapo Ingeniería SAS	05	05	23
10 Entrega a Apendices Interventoria a Idiger	Mapo Ingeniería SAS	01	05	23.
11				
12				
13				

578

17559

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Ver Listado de Asistencia Anexa.			

579

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA

Codigo: DE-FT-10
Pagina: 1 de 1
Versión: 6
Vigente desde: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN: ☐ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual? COMITE DE OBRA. Hoja ___ de ___

TEMA: Comite de obra | RESPONSABLE: Jhen Jairo Villamizar – Lucy Sepulveda

LUGAR: Bodega 7 Idiger | FECHA: 26 abril 2023 | HORA: 5:50 pm

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Maria del Ca Posada A	Mapo	Director Interventoria	3133582948	caelmerposadaa@hotmail.com	
2	María Alexandra Pardo	Interventoria	Representante legal	3125681898	Mapoingenieria s@gmail.com	
3	Maria Serrano Lafa.	Interventoria	Prof. Social	3236107724	mariaserrano.Mapa@gmail.com	
4	Angie Pardo	Interventoria	Ing. Civil	3005182630	Illuani008 mapo@gmail.com	Angie Pardo
5	Yenny Acosta	Contratista	Residente Auto	3108612526	Consorciovapa2023@gmail.	Yenny Acosta
6	Nicolas Lopez Mora	Contratista	Residente Obra	3013709858	consorciovapa2023@gmail.com	
7	Freddy Suarez L.	Contratista	Director Obra	3144541709	Consorciovapa2023@gmail.com	
8	Omar Dechiris M	1A	Esp. Hidraulica	3162696242	Omar Dechiris M	
9	Lucy Sepulveda A	Apoyo a la Supervisión Social del IDIGER	Apoyo Supervisión social IDIGER	3004510542	lasepulveda@idiger.gov.co	
10	Jhen Jairo Villamizar	Apoyo a Supervision	Idiger	3134409479	jhvillamizar@idiger.gov.co	
11	Oscar Muñoz D.	IDIGER	Apoyo Supervision	3133760435	omunoz@idiger.gov.co	
12	Jessica Paola Cabezas	IDIGER	Ingeniera Ambiental	3208325620	jcabezas@idiger.gov.co	
13	Diana Castillo Cuervo	Consorcio VAPA	Prof. Social	3135782537	Consorciovapa2023@gmail.	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

17561

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	Oficinas de IDIGER	Fecha:	03	05	2023
Hora Inicio:	9:00	Hora Final:			

Objetivo

Comite de obra Contrato 002 - 2023

Orden del día

Comite de Obra: Componente técnico, componente Social, Componente ambiental - SST, Varios.

Desarrollo de la Reunión:

Se hace Solicitud Por Parte de la Supervición, que esten todos los especalistas de obra e interventoria en los comites.

la Supervicion Solicita Para el Presente comite a la Arquitecta que realizo los diseños de obra

para la cuenta de cobro se debe descriminar por corte indicando los espacios Publicos y la ladera

Se da inicio al comite, Definiendo lo que Se Va a Presentar en la Secretaria de habita, teniendo encuenta los Componentes del contratista

De los Cambios de los diseños Se debe indicar Si afecta al Presupuesto, Si Se tiene los mismos lineamientos

Cuales Son los Criterios tenidos Para los diseños, en que se basaron Para hacer los ajustes.

Se debe consentar el esquema que se tiene y Sobre este ajustar de acuerdo a los Criterios de la comunidad y ala Topografia.

Se realiza Presentación de los diseños Preliminares y la nueva propuesta.

581

17562

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT - 21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se evidencian los cambios de las zonas, en la plantación nueva no estan las ramplas ni las escaleras, de igual manera se modifica las terrazas, Se elimina el muro para colocar unas Jardineras los ajustes se realizaron de acuerdo a la Topografia y lo Solicitado por la Comunidad.
No se requiere de las escaleras ya que con el estudio topografico se determina que se nivela el terreno quedando una rampla para la Sustitución del muro se crea Peñete fachada de las casas que Colindan con la ladera y se Colocara una Jardinera conservando la altura del diseño inicial
Se evidencia los Cambios de las pergolas que tendrian material Metalico y muro en Concreto.
El Muro que da a la ladera queda a 1 metro en Concreto Se mantiene Como el diseño Inicial.
Se queda a la espera de la aprobación del Diseño y ajustar el Presupuesto

TEMA: GESTIÓN DOCUMENTAL.
No se ha cumplido con la entrega de Informes Mensuales y Semanales
Se debe entregar Con la lista de Chequeo y en el Orden que en este esta
No se esta Cumpliendo Con la información Semanal ya que se esta reportando las mismas actividades
Del Componente Social no se a entregado Cronograma de obra ni Interventoria.
Componente Ambiental Solicita Cronograma que sea medible
Solicitan el Plan de Vias seguridad Presentar el Seguimiento de las actividades.

532

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código: DE – FT -21
Versión: 01
Vigente desde: 05-06-2020

Para la parte del Pañete de las Fachadas de las viviendas que limitan con la ladera. la parte tecnica indica que Sera Pañete y pintura tipo Coraza. Por lo cual Se Solicita que Se entregue un Volante Socializando la obra que se realizara en los muros Fachada este debe Ser firmado Por el Propietario. Esta actividad Se realizara Una vez este aprobada por la Secretaria de habitat

Se Solicita planos anexo 5 componente hidraulicon entregado por el IDIGER entregado en PDF la Solicitud es que Se faciliten en DWG.

17564

IDIGER - Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: GE-FT-10
CONTROL DE ASISTENCIA	Version: 05
	Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN: ☐ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual? Comité De Obra — Hoja ___ de ___

TEMA: — RESPONSABLE:

LUGAR: — FECHA: 03-05-2023 — HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	MAURICIO FOSADA	INTERVENTORIA	ARQ	[illegible]	[illegible]	
2	Maria Fernanda Ospina P.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Nicolas Lopez Pico	Consorcio VMPA	Residente Obra	[illegible]	[illegible]	
4	Oscar Muñoz D.	IDIGER	Apoyo a Supervi.	[illegible]	[illegible]	
5	Hermes Pineda Bello	Interventoria	Ingeniero	[illegible]	[illegible]	
6	Maria Serrano	Interventoria	R. Social	[illegible]	[illegible]	
7	Lucy Sepulveda	Apoyo a la Supervision Social IDIGER	IDIGER	[illegible]	[illegible]	
8	Yuly Katherine Amaya	IDIGER	Financiera	[illegible]	[illegible]	
9	Jhon Jairo Villamizar	IDIGER	Apoyo a Supervis.	[illegible]	[illegible]	
10	Jessica Paola Cabezas	IDIGER	Ingeniera Ambiental	[illegible]	[illegible]	
11	Freddy Suarez L.	Contratista	Director	[illegible]	[illegible]	
12	Wilson V. Rojas Villarroel	IDIGER	Prof. Esp.	[illegible]	[illegible]	

Al diligenciar este formulario autorizo la recolección, almacenamiento, uso y tratamiento de mis datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y los demás decretos reglamentarios.

584

17565

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	OFICINAS SDHT – PISO 10	Fecha:	04	05	2023
Hora Inicio:	8:10 am	Hora Final:	11:20 am		

Objetivo

Reunión con SDHT

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1. **Apertura del Comité**
2. **Presentación de los integrantes**
3. **Componente Diseños**

585

17566

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

1.- Presentación de los asistentes presentes y por virtual.

2.- Presentación por parte de la arquitecta del consorcio Vapa del diseño que se plantea de acuerdo a la topografía existente en el terreno.

3.- Con la presentación se muestran las diferencias existentes entre el diseño inicial y la propuesta presentada.

4.- Los criterios para ajustes de diseño:

Intervienen: IDIGER, SDH, INTERVENTORIA, CONSTRUCTORA

4.1 La topografía tomada en el mes de febrero del 2023 distinta de la topografía inicial en donde existían todavía los asentamientos de viviendas que fueron retirados luego de dicho levantamiento.

4.2 Darle continuidad al peatón cumpliendo la norma de accesibilidad universal, haciendo más amigable el diseño con las personas adultos mayores o en calidad de incapacidad.

4.3 La propuesta presentada cumple con el requerimiento de darle continuidad al peatón desde la estación del cable Illimani hasta el Mirador Illimani.

4.4 Por solicitud de la comunidad, la cual fue expresada en la socialización que se hizo del proyecto el día 15 de abril 2023, donde se opusieron enfáticamente al muro de cinco metros, que según sus propias expresiones sería "aislarlos" y no integrarlos al proyecto, crearles problemas de seguridad (ladrones, vicios, etc.) tanto por el muro como por las pérgolas que sobre él se encuentran diseñadas.

5.- Ante la pregunta de la interventoría, sobre la continuidad de las materas fundidas en sitio contra las fachadas de las casas que colindan con la ladera, la SDHT responde que se deben hacer unas fijas y otras en mampostería o en algo que sea de fácil demolición para que en un futuro las personas puedan tener acceso al paseo, (sin dejar posibilidad de antejardín).

6.- La SDHT solicita que se tenga en cuenta la parte de estructura de las viviendas y se socialice con ellos para que la culata tenga una propuesta social (mural). Se debe tener en cuenta en la propuesta donde se debe incluir jardineras fijas y móviles para el futuro, con relación la pérgola solicita cimentación y seguridad con diseño estructural. Igualmente solicita renderización.

7.- La SDHT solicita realizar actas de reunión con la comunidad, para concretar las acciones (mural) se debe contar con el acompañamiento de la SDH.

8.- El contratista de Obra solicita el concepto jurídico sobre el uso de pañete en fachadas privadas.

9.- La SDHT En respuesta a la pregunta del contratista dice: Como no afecta el presupuesto la argumentación para la afectación de las fachadas hay que presentar el acta de reunión con la comunidad donde apruebe dicho pañete, avalada por la interventoría y que se incluya en mayores y menores de obra.

10.- El IDIGER solicita que se haga de manera inmediata una argumentación y soporte técnico del cambio de diseño para convocar reunión operativa incluyendo el costo del diseño y la sustentación del mismo.

11.- LA SDHT expresa que están de acuerdo con el diseño, que el cambio de escaleras por rampa permite hacer de dichas rampas pasos muy seguros y muy visibles desde abajo o desde arriba por seguridad del peatón.

12.- IDIGER PREGUNTA AL CONTRATISTA: Con el planteamiento arquitectónico presentado hay cambio en la propuesta técnica y económica. Presentar justificación de ajuste a los estudios y diseños.

13.- SDHT Solicita al contratista que se presente avalado por la interventoría la justificación del ajuste de estudios, diseños y de su valor económico.

14.- IDIGER: Convoca comité operativo y presenta su aval a los estudios y diseños teniendo en cuenta el pronunciamiento del contratista y el aval de la interventoría.

15.- IDIGER Solicita las nuevas observaciones de diseño para proponer nuevamente ajustes para diseño, en un documento justificando, así el Idiger lo lleve al comité operativo pronunciándose oficialmente al respecto.

526

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

16.- El geotecnista del contratista de obra hace la presentación de la parte geotécnica basado en un diseño de suelo armado, a lo que la SDHT hace las siguientes observaciones:

16.1 Contención de la ladera?

16.2 Qué pasa con las aguas infiltradas?

16.3 Tubería eléctrica la cual debe ir subterránea.

16.4 Biodegradación del material orgánico expuesto a la intemperie?

17.- IDIGER: Solicita que el planteamiento cumpla con las exigencias de la resolución 111 en todos sus factores, especialmente estabilidad sobre la ladera y que por lo tanto debe existir un análisis de estabilidad.

18.- CAJA DE VIVIENDA POPULAR: Solicita que la información se le envié con dos días de anticipación al correo para su análisis y estudio.

19.- INTERVENTORIA: Solicita le informen sobre las nuevas ocupaciones.

20.- IDIGER informa que están en el proceso pero que se requiere por seguridad no dar información de ningún tipo.

21.- IDIGER: Pregunta a la CVP sobre el acercamiento con los dos predios a los que no se le ha podido hacer la visita y por recomendación del IDIGER que sale de la socialización que se hizo el día 15 de abril 2023, les solicita se haga las visitas los sábados en la tarde porque la gente aduce que se encuentra trabajando y por esa razón no hay nadie en el predio.

17568

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1. Entrega Justificación ajuste a los diseños y costo	Consorcio VAPA	05	05	2023
2.				
3.				
4.				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

533

17569
(1)

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	IDIGER	Fecha:	10	05	2023
Hora Inicio:	3:38 PM.	Hora Final:	6:00 PM.		

Objetivo

Orden del día

- AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS

Desarrollo de la Reunión:

- EL VIERNES PASADO SE ENTREGABA EL AVAL DE LOS AJUSTES Y DISEÑOS, EL MARTES 9 DE MAYO SE ENTREGO AVAL DE LA INTERVENTORIA DE LA JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. EL IDIGER INFORMA QUE EL AVAL DADO POR LA INTERVENTORIA A LA JUSTIFICACION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CJM Y CENCAL.
LA INTERVENTORIA INFORMA QUE NO SE TIENE EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA DAR AVAL AL DISEÑO ESTRUCTURAL.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

589

17570

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

- LA INTERVENTORIA PRESENTARA AVAL CORRESPONDIENTE DE LA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, AL IDIGER EL DIA JUEVES 12 DE MAYO DE 2022.
- EL CONTRATISTA INFORMA DE SU APROBACIÓN AL AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y PREOCUPACIÓN DE LOS TIEMPOS PARA LA APROBACIÓN DE EL AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
- COMPONENTE AMBIENTAL:

NO SE HA INICIADO ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN EN CAMPO.

EL CONTRATISTA ENTREGO INFORME N°2.

SE PRESENTARON OBSERVACIONES DE FUENTE SUBSANADAS

SST

NO SE TENIA INFORMADO EL CAMBIO DE RESIDENTE TECNICO, INFORMES 1 Y 2 PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE PRESENTARON OBSERVACIONES DE LAS PLANILLAS POR QUE LOS SALARIOS NO COINCIDEN CON LOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

LA INTERVENTORIA SOLICITA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO HASTA QUE SE DEFINA EL AVAL DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

EL IDIGER SE VIENTA PRESENTAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR ESCRITO.

1771
2

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

EL CONTRATISTA INFORMA QUE YA REMITIÓ PLANILLAS CORREGIDAS CON EL IBC APROBADO.
SE REALIZA LA REUNIÓN VIRTUAL MAÑANA JUEVES 11 DE MAYO A LAS 4PM PARA DAR EL AVAL A LAS PLANILLAS.
SE REALIZO REVISIÓN REVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN S.S.T. DE INTERVENTORIA CON EL IDIGER

SOCIAL

SE APROBO INFORME SOCIAL ES 1 Y 2 POR PARTE DEL CONTRATISTA
SE REALIZARA MESA DE TRABAJO EL JUEVES 11 DE MAYO A LAS 9AM EN EL IDIGER. PARA REVISIÓN INFORME
SE HAN REALIZADO 184 Actas de Vecindad
SE HAN RECIBIDO 5 HOJAS DE VIDA. SE ESTAN CONTRATANDO DE OBRA NO CALIFICADA
EL IDIGER SOLICITA ALA PARTE TECNICA REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE PANELES.
PARA EL VIERNES 12 MAYO SE TIENE PROGRAMADO COMITE DE VECINDAD A LAS 3 P.M.

TECNICA:

SE PRESENTA AL IHC. ENRIQUE CALDERON COMO RESIDENTE DE OBRA, PAOLA TROMPETTO ARQUITECTA AUXILIAR, GIOVANNI MAURICIO FRANCO RESIDENTE INTERVENTORIA, SOISSO TOPOGRAFIA. INTERVENTORIA

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

591

17572

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE CUENTA CON TODO EL PERSONAL PARA INICIO DE OBRA.

EL CONTRATISTA RADICO ACTA DE OBRA. N° 1 EL 28 DE ABRIL, LA INTERVENTORIA INFORMA QUE SE ESTABA ESPERANDO CONFECCION DE PLANILLA.

SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA FINALIZADO LOS SITIOS DONDE SE PUEDE REALIZAR CERRAMIENTOS Y PATIETES, DESCAPOTES. DEMOLICIONES DE MUROS, TABLE ESTACADOS.

- LA CUAL SERA EL PROCESO DE APROBACION DE LOS APU NO PREVISTOS.

LA INTERVENTORIA APRUEBA LOS NO PREVISTOS QUE SE PRESENTEN, SE REMITEN AL IDIGER, PARA EL MODIFICATORIO FINAL.

SE APROBARAN LOS APUS DE ACUERDO A LAS ACTAS INTERADMINISTRATIVAS CON EL IDIGER Y LA SECRETARIA DE HABITAT

592

	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA	Codigo: DE-FT-10 Pagina: 1 de 1 Versión: 6 Vigente desde: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN: ☑ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual? Comité de Obra — Hoja ___ de ___

TEMA: — RESPONSABLE:

LUGAR: Sala de Juntas IDIGER — FECHA: 10 Mayo 2023 — HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Enrique Calderón	C. VAPA	R Obra	3132347172	ingecal58@hotmail.com	
2	Paola Marcela Castro	C. VAPA	Arquitecto Auxiliar	1014965987	arqpm.paolamarcela13@gmail.com	
3	Lucy Sepulveda Araujo	IDIGER	Apoyo a la Supervisión Social	80045105482	lsepulveda@idiger.gov.co	
4	Jhon Jairo Villamizar R.	Idiger	Apoyo a Supervisión	3134409477	jvillamizar@idiger.gov.co	
5	Diana Castillo Guerra	C. VAPA	Profesional SGSST	3133937654	Consorciovapa2023@gmail.com	
6	Oscar Muñoz D.	Idiger	Apoyo a Superv.	3133760435	omunoz2@idiger.gov.co	
7	MAURICIO POSADA	INTERVENTORIA	APOYO INTERV.	3004680625	diego.mfpr3@hotmail.com	
8	Freddy Stiven C.	Contratista	Directa	3144541764	Consorciovapa2@gmail.com	
9	Carmen Rosa P.	INTERVENTORIA	Directa	3133884962	carmenrosadelvalle@gmail.com	
10	Jesus Fabian Pena Q.	Interventoria	Topografo	3137229469	jesus.pena@hotmail.com	
11	Mary Bermudez Leal	Interventoria	Social	3136677724	mariabermudezleal@gmail.com	
12	mauricio Franco P	INTERVENT	Residente Tecnico	3143735330	mauriciofranco1@gmail.com	
13	Ma Yadira Contreras T.	Interventoria	Ambiental	3124[illegible]	[illegible]@gmail.com	
14	Jessica Paola Cabezas	IDIGER	Ingeniera Ambiental	3208325620	Jcabezas@idiger.gov.co	
15	Nicolas Lopez Mora	C Vapa	R. Obra	3013709858	consorciovapa2023@gmail.com	
16	Yuliana Julissa Cortes Palacios	C vapa	R Mecánica	3208072586	/ /	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	IDIGER	**Fecha:**	17	05	2023
Hora Inicio:	3:00 P.M.	**Hora Final:**			

Objetivo

SEGUIMIENTO OBRA.

Orden del día

Desarrollo de la Reunión:

- SE entrego AVAL DE JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTE. POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL DIA JUEVES 11 DE MAYO DE 2023
- SE REMITIO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 1 Y 2., SE RECIBEN OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL - 1.
- LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE LAS CORRECCIONES DEL INFORME AMBIENTAL Nº 1. SE solicita manejo de Residuos, Solidos y Liquidos, Relcabio de Maquinaria y no se ha iniciado OBRA.

- LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE LAS OBSERVACIONES SE HAGAN CON RESPETO, COMO PROFESIONALES. No.
- IDIGER INFORMA QUE HAY INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES 1 Y 2.
- ENTREGA INFORME MENSUAL 1 CORREGIDO EL VIERNES 12 DE MAYO DE 2023.
- IDIGER INFORMA QUE SE ENVIARON OBSERVACIONES DE LOS INFORMES SEMANALES DE 1 AL 7, INTERVENTORÍA INFORMA QUE NO HAN LLEGADO OBSERVACIONES.

(2)

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	IDIGER	Fecha:	17	05	2023
Hora Inicio:	3:00 PM.	Hora Final:			

Objetivo

SEGUIMIENTO OBRA..

Orden del día

Desarrollo de la Reunión:

LA INTERVENTORIA SOLICITA EL ESTUDIO POR CORREO DE LAS OBSERVACIONES SEMANALES 1 AL 7.

- SE ESTA EL PERMISO TOPOGRAFIA DEFINITIVA. PARA DEFINIR QUE ARBOLES, SE VAN AFECTAR.
- EL CONTRATISTA SOLICITARA A LA INTERVENTORIA VISITA AL SITIO DE LA OBRA PARA INVENTARIO FORESTAL Y LA INTERVENTORIA LO SOLICITARA AL IDIGER
EN RECORRIDO DE OBRA EL DIA JUEVES 18 DE MAYO SE OBSERVARAN LOS ARBOLES QUE SE VAN AFECTAR
- EL IDIGER SOLICITA PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PARTE SOCIAL DE LA INTERVENTORIA
- DE LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES 1 AL 7 solo se recibio de la parte Social, La INTERVENTORIA SOLICITA AL IDIGER SI HAY OBSERVACIONES DE LOS OTROS COMPONENTES. PARA AJUSTAR.
- NO SE PUEDEN REPETIR ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS ANTERIORES EN EL AREA SOCIAL. - LLEGAN INCOMPLETOS. NO SE INCLUYEN ACTIVIDADES
- LOS FORMATOS AMBIENTALES SE TOMARAN LOS QUE ESTAN EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PAGINA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

TECNICO

EL IDIGER INFORMA QUE EL DIA MARTES 16 DE MAYO SE INICIO REUNION CON LA SECRETARIA DE HABITAT, POR IDIGER.

LA SECRETARIA DE HABITAT SOLICITA UNA PRESENTACION DE LOS AJUSTES Y ESTUDIOS Y DISEÑOS. DE LO QUE HABIA CON LO ACTUAL.

LOS DOS PERFILES. MONTADOS., COSTOS,

LA INTERVENTORIA MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR LA DEMORA EN LAS APROBACIONES DE LOS AJUSTES Y DISEÑOS YA QUE SE LLEVAN 3 MESES Y MEDIO DE ATRASO Y NO SE HA DEFINIDO Y EL TIEMPO NO ALCANZARA PARA LA EJECUCION DE OBRA.

EL CONTRATISTA SOLICITA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE LOS AJUSTES Y DISEÑOS HACE 2 MESES Y NO SE HA APROBADO, SE SOLICITA REUNION CON EL DIRECTOR.

LA INTERVENTORIA SOLICITA SUSPENCION DEL CONTRATO.

EL IDIGER INFORMA QUE PARA LOS ANALISIS ULTIMOS SER APROBADOS SE DEBEN REALIZAR LOS MODIFICATORIOS AL CONTRATO DE OBRA.

EL CONTRATISTA PRESENTA PLANO CON UBICACION DE TRINCHOS DE ACUERDO A BUSESTO INICIAL. Y CON EL DISEÑO ACTUAL SE ELIMINAN TRINCHOS DONDE SE CONSTRUYE MURO ENTIERRA ANCLADA.

- PARA ELIMINAR LOS TRINCHOS SE DEBE JUSTIFICAR CON RESPECTO AL DISEÑO INICIAL
- EL IDIGER SOLICITA EL CAMBIO DE LA PROFESIONAL SOCIAL

596

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:		Fecha:			
Hora Inicio:		Hora Final:			


Objetivo

Orden del día

Desarrollo de la Reunión:

1777

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

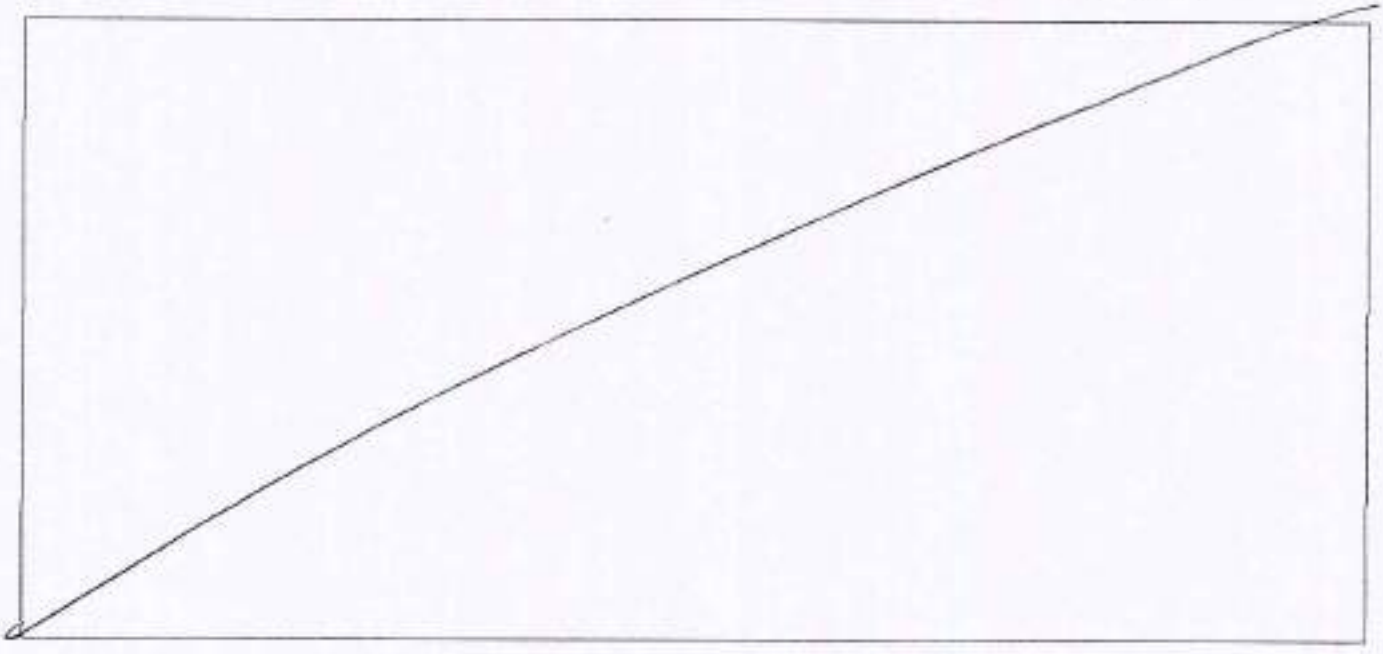

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
ENTREGA INFORME MENSUAL Y CONSOLIDAR INFORMES SEMANALES DE LOS 7 LOCALES	INTERVENTORÍA	19	05	23

Participantes (Incluya la firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?	Hoja 1 de 2
TEMA:	Comite de Obra Illimani	RESPONSABLE:
LUGAR:	Bodega 7 - IDIGER	FECHA: 17/09/2023 HORA: 3:00 p.m

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Oscar Muñoz D.	IDIGER	Apoyo a Supervisor.	3133760135	omunoz@idiger.gov.co	
2	Carmen Posada A.	Interventoría	Directora	3133333492	gerenciadelcontrato@gmail.com	
3	Mauricio Franco Parra	Interventoría	Residente	3143313386	mauriciofranco1@gmail.com	
4	MAURICIO POSADA	INTERVENTORIA	ARQ.	300 568 0623	diego.mpp@hotmail.com	
5	Nicolas Lopez Mora	Contratista	Ing Residente	3013709838	consorciovapa@gmail.com	
6	Jhon Jairo Villamizar	Idiger	Apoyo a Supervisor	3134467477	jvillamizar@idiger.gov	
7	Yuly Yulisa Cuesta	Consorcio VAPA	H. Ambiental	3108617526	consorciovapa2021@gmail	
8	Nilo Y. Cabrera S.	Interventoría	Profesional SST	3142552963	nilocabrera@gmail.com	
9	Freddy Suarez Luna	Consorcio Vapa	Director	3144541809	consorciovapa@gmail.com	
10	Wilson V. Polido Villareal	IDIGER	Prof Esp	3005725408	wpolido@idiger.gov.co	
11	Paola Moreno Castro	Consorcio VAPA	Arquitecta Auxiliar	3004965184	arqpm.paolamoreno3@gmail.com	
12	Jaime Alexander Moreno P.	Consor. VAPA	Resid SST	3165216417	ing_jamoreno@yahoo.com	
13	Jessica Paola Cabezas	IDIGER	Ingeniera Ambiental	3208825620	jcabezas@idiger.gov.co	
14	Marco Fernando Cifuentes	IDIGER.	Apoyo Ambiental Supervisión	3102409796	mchpereo@gmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

593

FT-10

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	[X] Reunión [ ] Sensibilización [ ] Otro Cual?		Hoja 2 de 2
TEMA:	COMITE DE OBRA ILUHANT	RESPONSABLE:	Grupo Obras de Mitigación
LUGAR:	BODEGA 7 - IDIGER	FECHA: 19/05/2023	HORA: 3:00 pm

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Lucy Sepulveda A.	IDIGER	Apoyo a la supervisión social	300 4510542	lsepulveda@idiger.gov.co	
2	Diana Castillo Guerra	Consorcio VIAPA	Social	3133372657	Consorciouman2023@gmail.com	Diana Castillo G
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	IDIGER	Fecha:	24	05	2023
Hora Inicio:	4:10 PM	Hora Final:			

Objetivo

Comité de Obra N. _____

CONTRATO No. 002-2023


"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO

Orden del día

- AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- INICIO DE OBRA.

(SE REALIZARA REVISION DE INFORME SON TREA SUALES 1 Y 2 SE ENVIO CORRECCIONES de la parte social a la Dra Lucy para revision y Aprobacion EL DIA 26 DE MAYO 4PM POR CORREO. SE realizara reunion con el IDIGER PARA REVISION DE LA PARTE SST Y AMBIENTAL EL VIERNES 26 DE MAYO DE 2023 EL SEMANAL 12 y 13 SE ENVIO. Y DE LAS CORRECCIONE DE LOS INFORMES 1 AL 7 SE enviaran con comunicados, PARA APROBACION DEL IDIGER Se realizara reunion para revision de los informes 1 y 2. de las correcciones con el IDIGER Y LA INTERVENTORÍA PARA APROBAR Y IMPRIMIR.

- SE VA A REALIZAR REVISION DE LAS ACTAS DE VECINDAD 184. EL VIERNES 26 DE MAYO. EL IDIGER SOLICITA ENVIAR LOS AJUSTES DE LAS ACTAS DE VECINDAD.
- INFORMES MENSUALES
- EL IDIGER SOLICITA AL A INTERVENTORIA AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS INFORMES

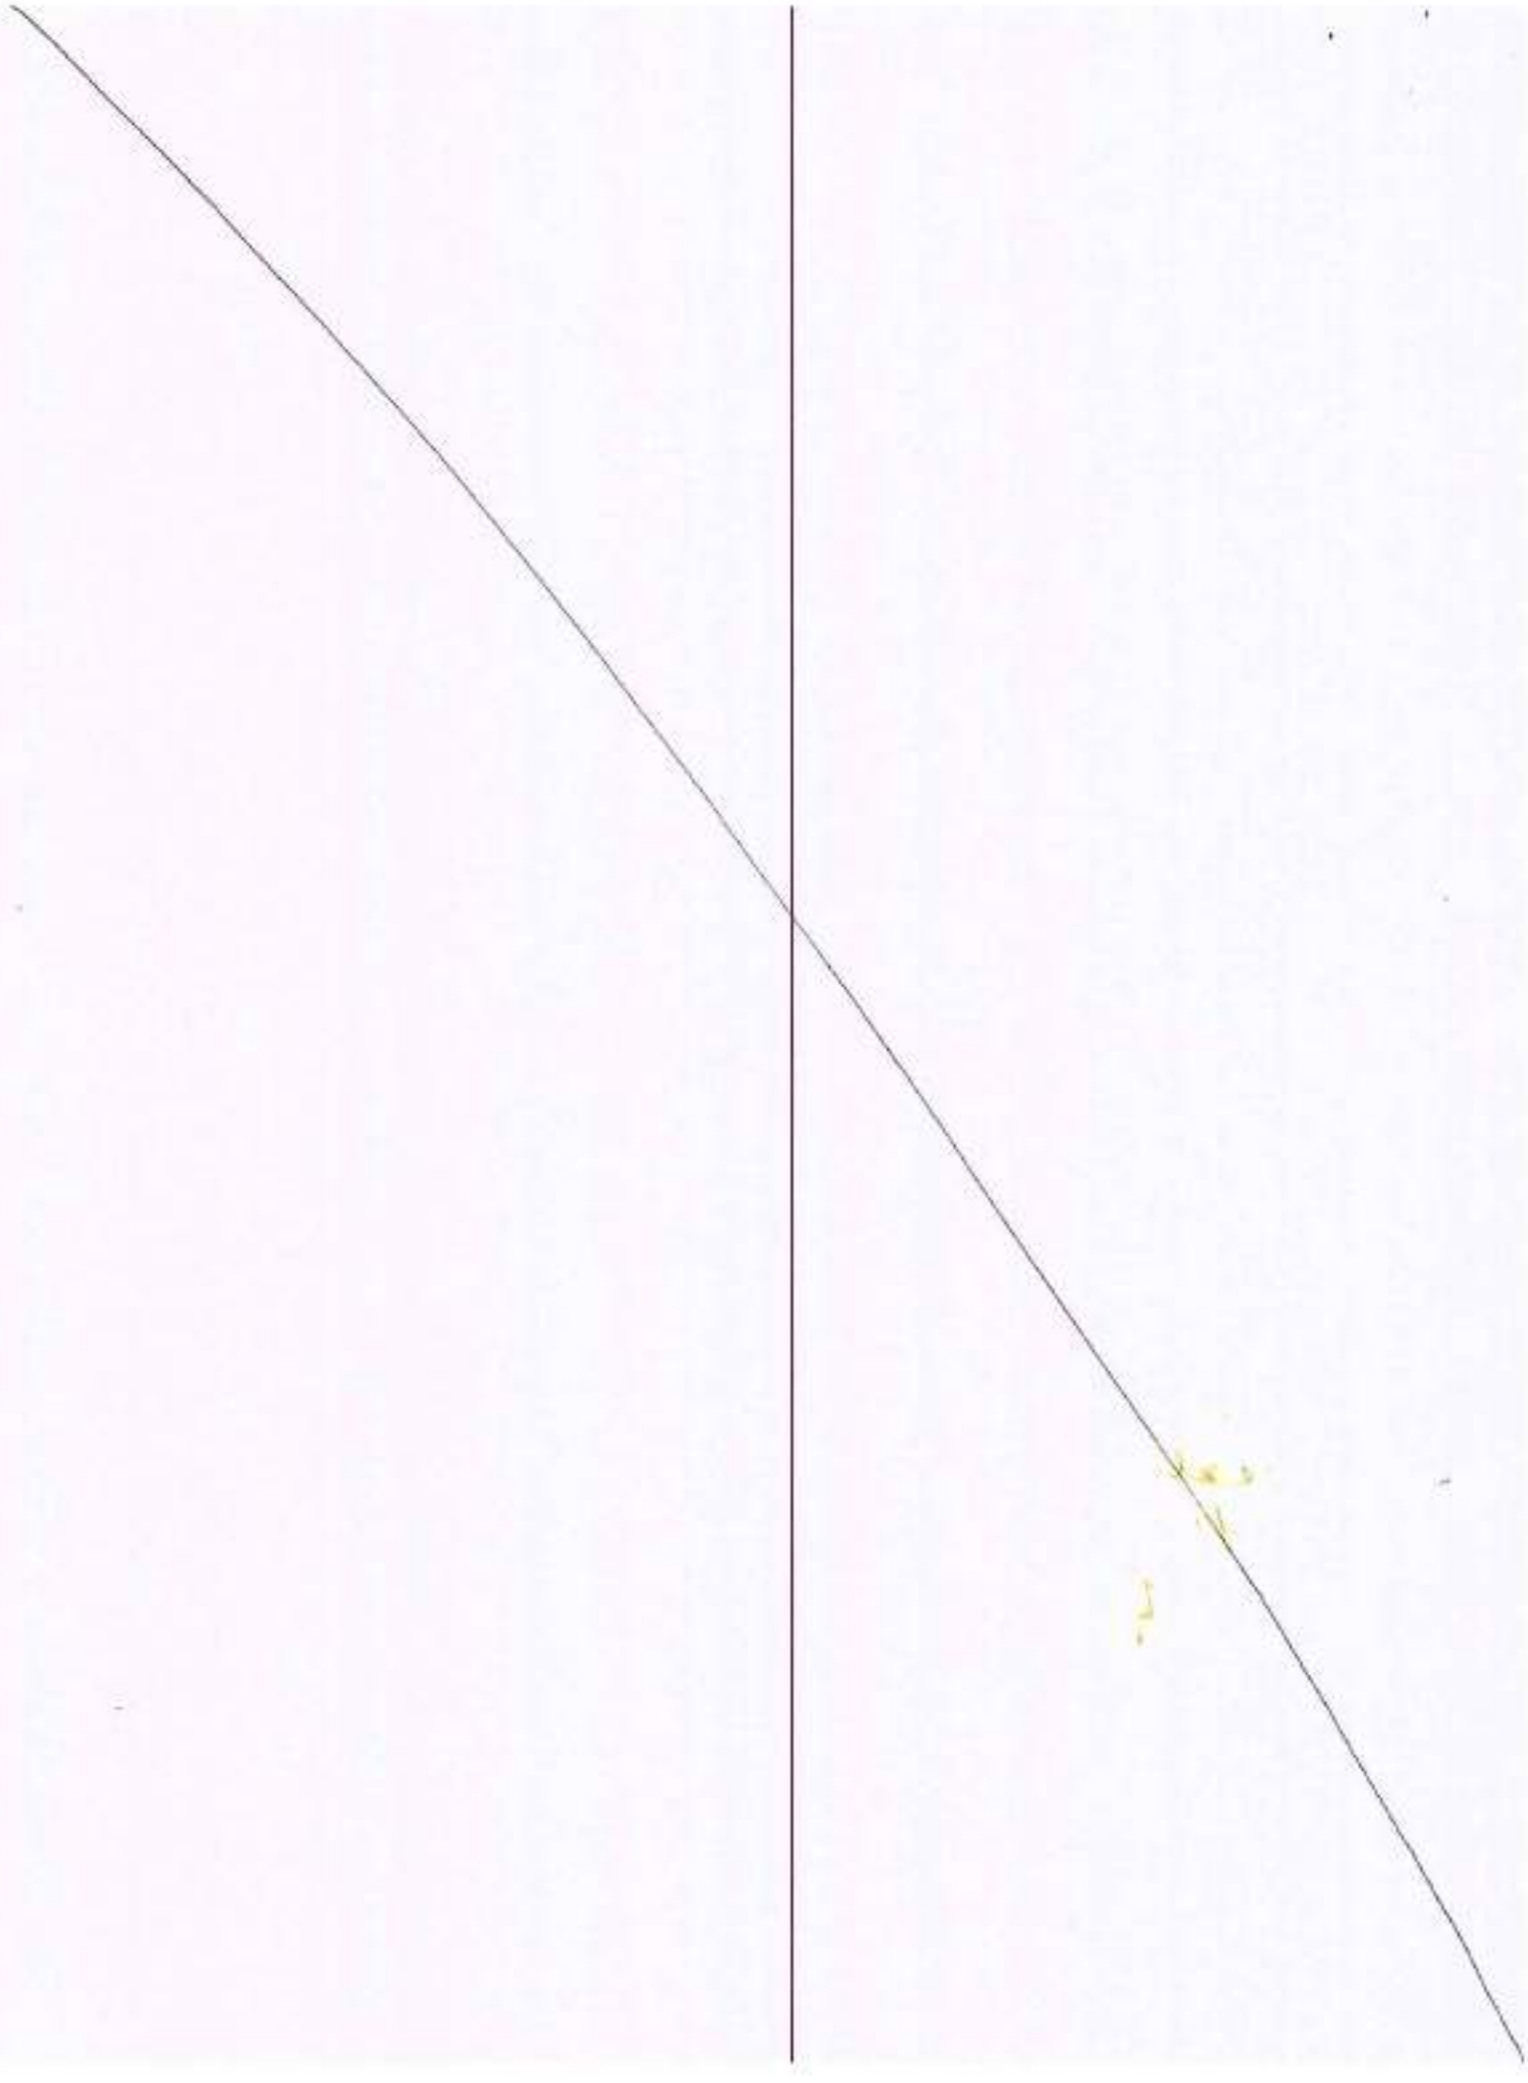


17581

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:


- PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES.
- AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SE PROGRAMO COMITE OPERATIVO, CON LA SECRETARIA DE HABITAT, IDIGER, SECRETARIA DE VIVIENDA EL JUEVES 18 DE MAYO SE DIO APROBACION DE LOS AJUSTES Y DISEÑOS DE ACUERDO A LOS COSTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y CON EL AVAL DE LA INTERVENTORIA.
SE ESTA ELABORANDO EL MODIFICATORIO EL CONTRATISTA INFORMA QUE DE LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SE TIENE LA TOPOGRAFIA AJUSTADA A LA COTA 2610. NIVEL DE ARQUITECTURA ACABADO., EL GEOTECNISTA ESTA ESTABLECIENDO COTA DE CIMENTACION DE MURO DE TIERRA ARMADA QUE ES APROXIMADA DE 3 MTS, COTA 2607
SE ESTA ACTUALIZANDO PRESUPUESTO EN EL DIA DE HOY SE TERMINA DISEÑO ARQUITECTONICO., CONCRETO HIDRAULICO DE ESPESOR DE 20 CMS, LOSETA, AJUSTE DE PERGOLAS., DISEÑO ELECTRICO SE ESTA AJUSTANDO, TRAMITES CODENSA, SI SE NECESITA SUBESTACION O TRANSFORMADOR.
DISEÑO HIDRAULICO SE ESTA EVALUANDO CAUDALES CONEXIONES A POZOS, CAPTACION DE AGUAS.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA AJUSTE AL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS

601

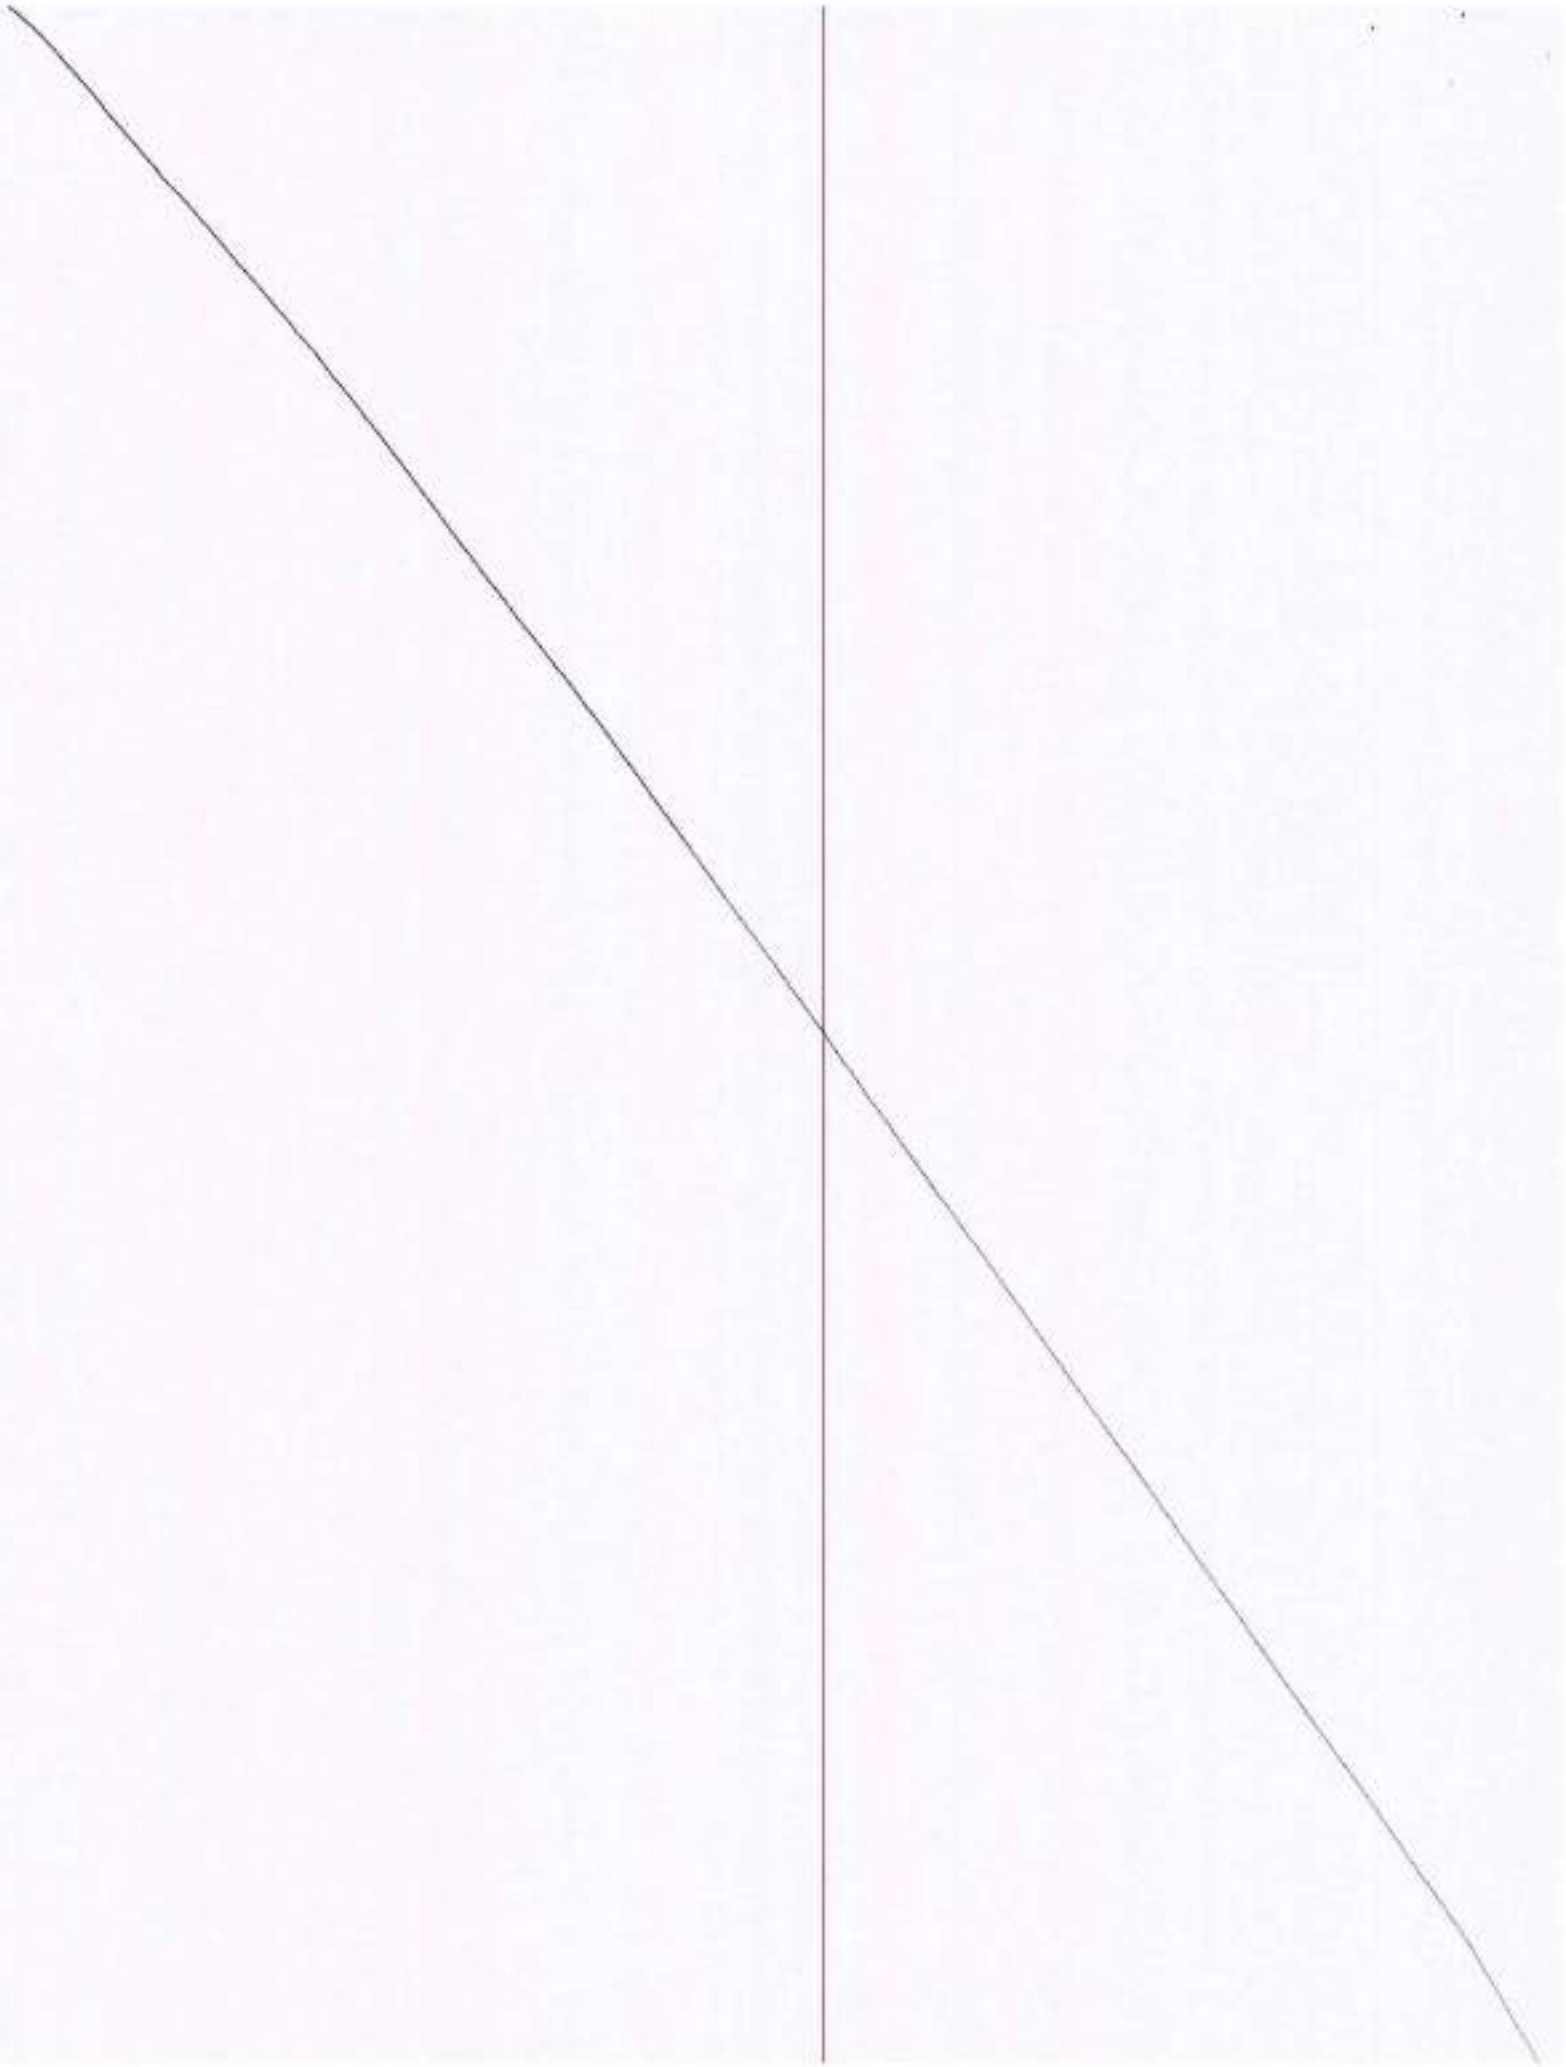

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

-EL IDIGER SOLICITA CUANDO SE ENTREGAN LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
EL CONTRATISTA INFORMA QUE EN QUINCE DIAS SE ENTREGAN LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DISEÑO EN TIERRA ARMADA SE ENTREGARA EL 2 DE JUNIO; EL IDIGER SOLICITA REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA REVISION DE DISEÑOS.
EL PROXIMO COMITE SE REVISARA CATASTRO DE AGUAS. CON LOS ESPECIALISTAS HIDRAULICOS, GEOTECNISTAS, EN LOS COMITES DE OBRA, EN EL PROXIMO COMITE ENTREGAR AVANCE DE LOS DISEÑOS.
LA ESTABILIDAD DE LA LADERA DEBE CUMPLIR CON LA RESOLUCION 111.
LA INTERVENTORIA INFORMA QUE HOY SE TRAMITO LA SOLICITUD DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO-
SE ESTA REALIZANDO EL DISEÑO DEL PAÑETE.
NO ENVIAN COPIA DE LAS COMUNICACIONES AL DIRECTOR DEL IDIGER Y AL JURIDICO SOLO AL SUPERVISOR.
LA OCUPACION DE CAUCE DEBE VENIR DENTRO DEL DISEÑO, EL IDIGER SOLICITA A LA INTERVENTORIA OFICIO DEL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO.
EL IDIGER SOLICITA ALLEGACION DEL CRONOGRAMA SEMANAL DEL AREA SOCIAL SEMANALMENTE.

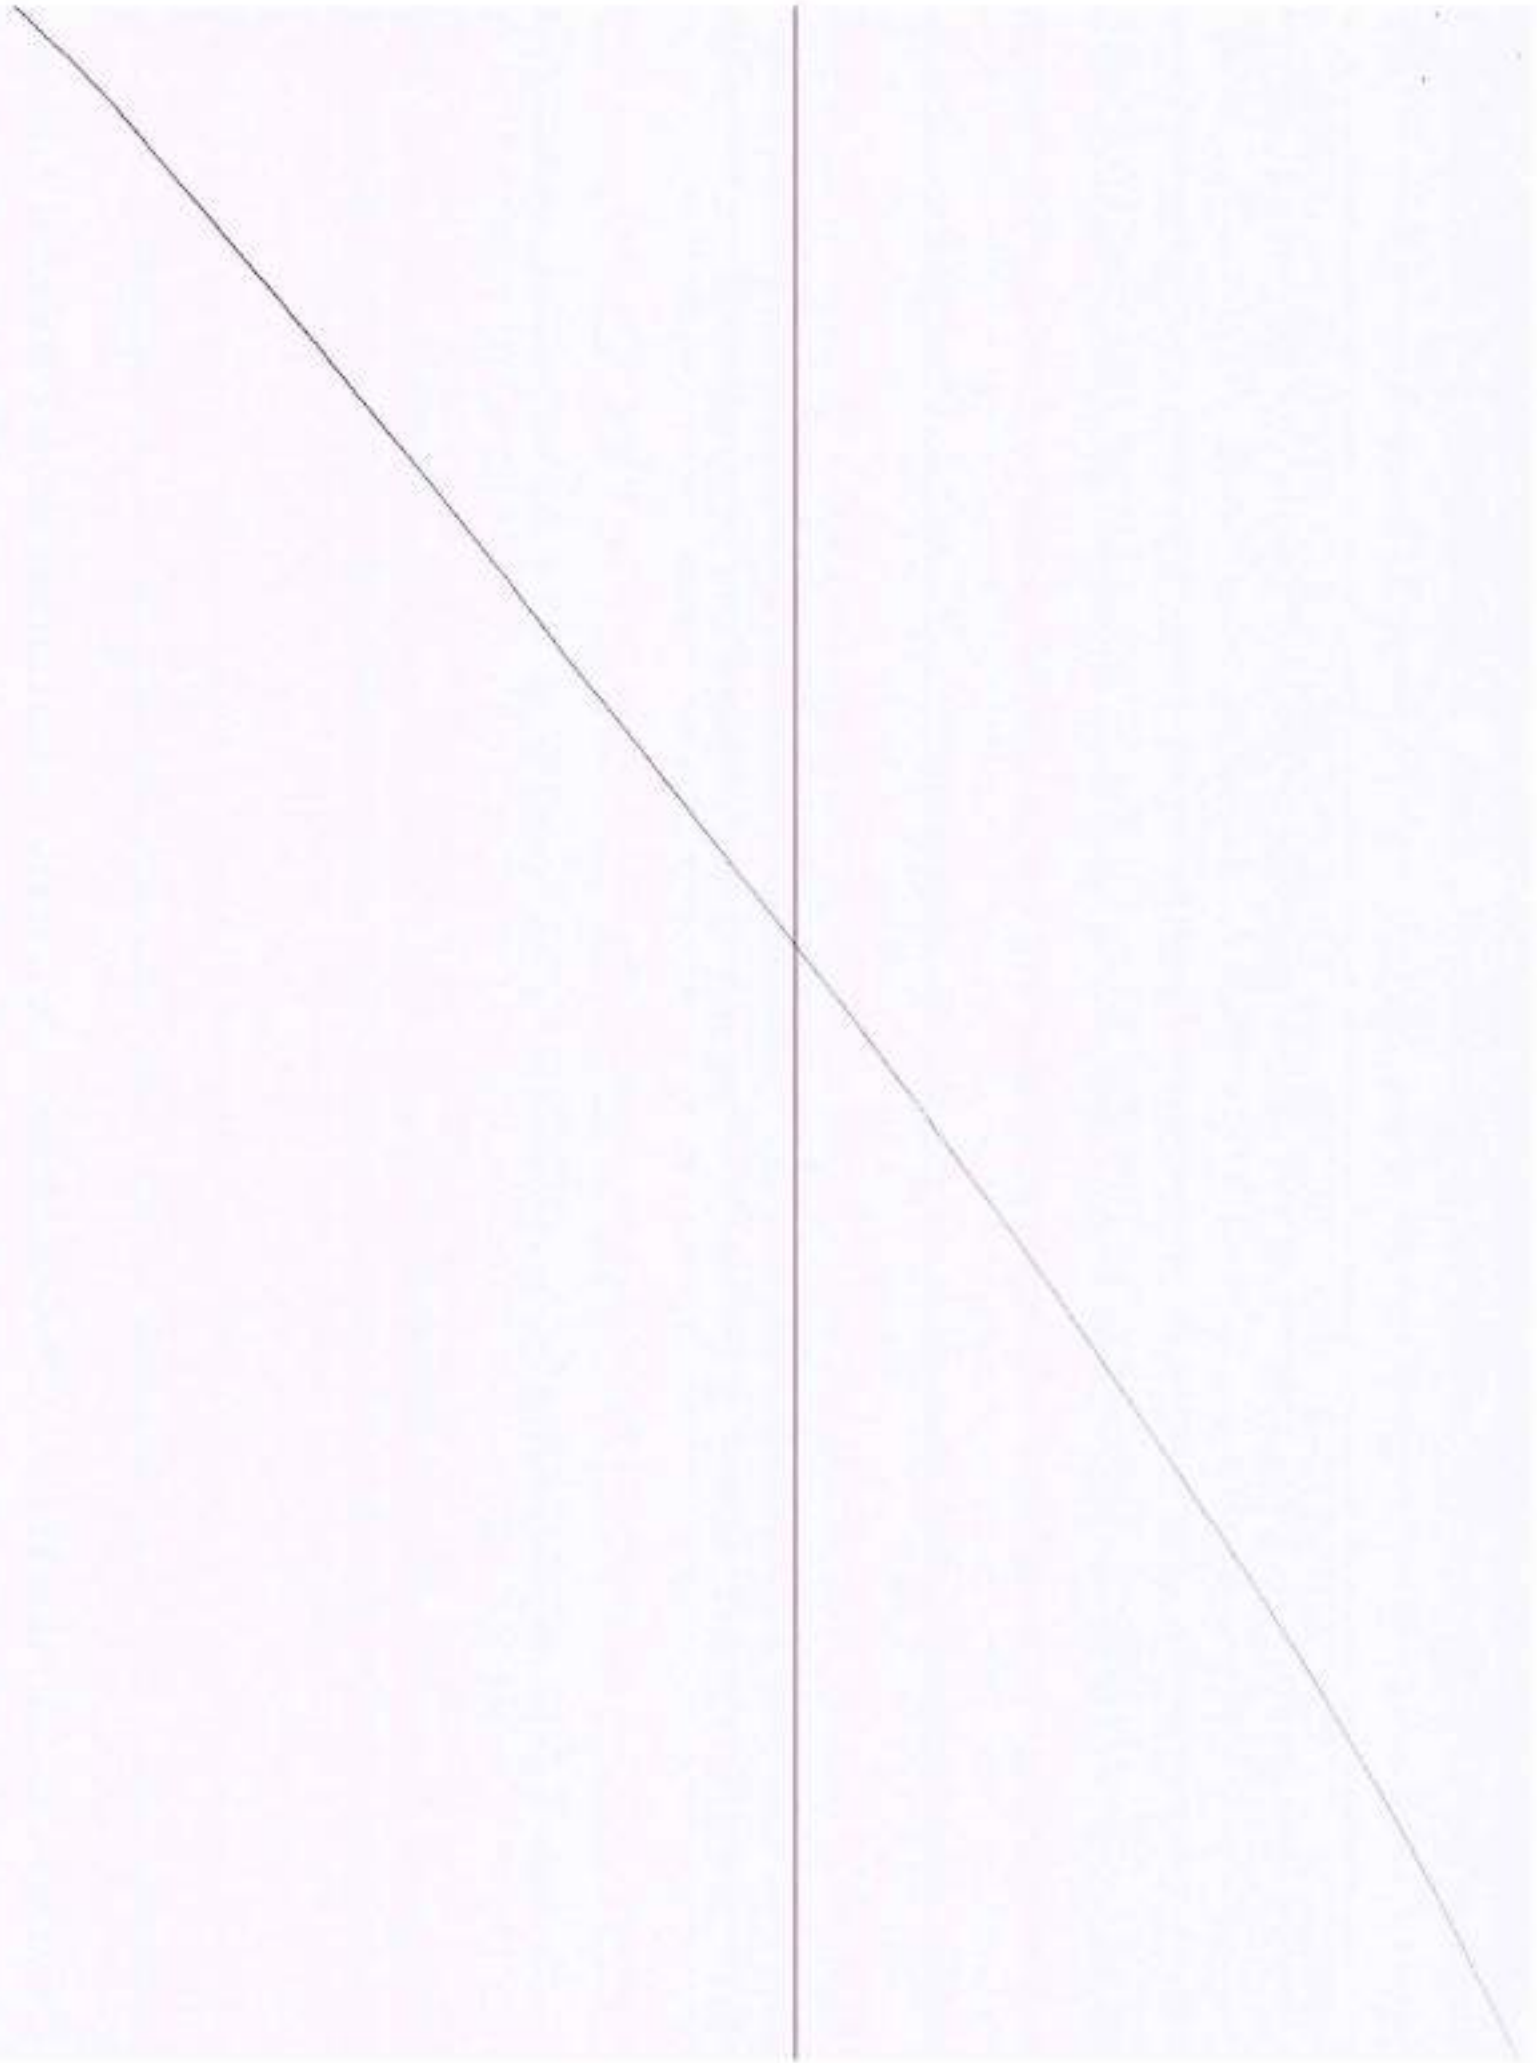


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

DE LOS SEGUIMIENTOS NO SE HAN ENVIADO HASTA QUE SE ENCUENTREN SUBSANADOS TODOS LOS COMPONENTES.

EL CONTRATISTA INFORMA, QUE ENTREGARA INFORME MENSUAL EL LUNES 29 DE MAYO

EL IDIGER SOLICITA ENTREGA DE INFORMES EL MARTES 30 DE MAYO. DE 2023.

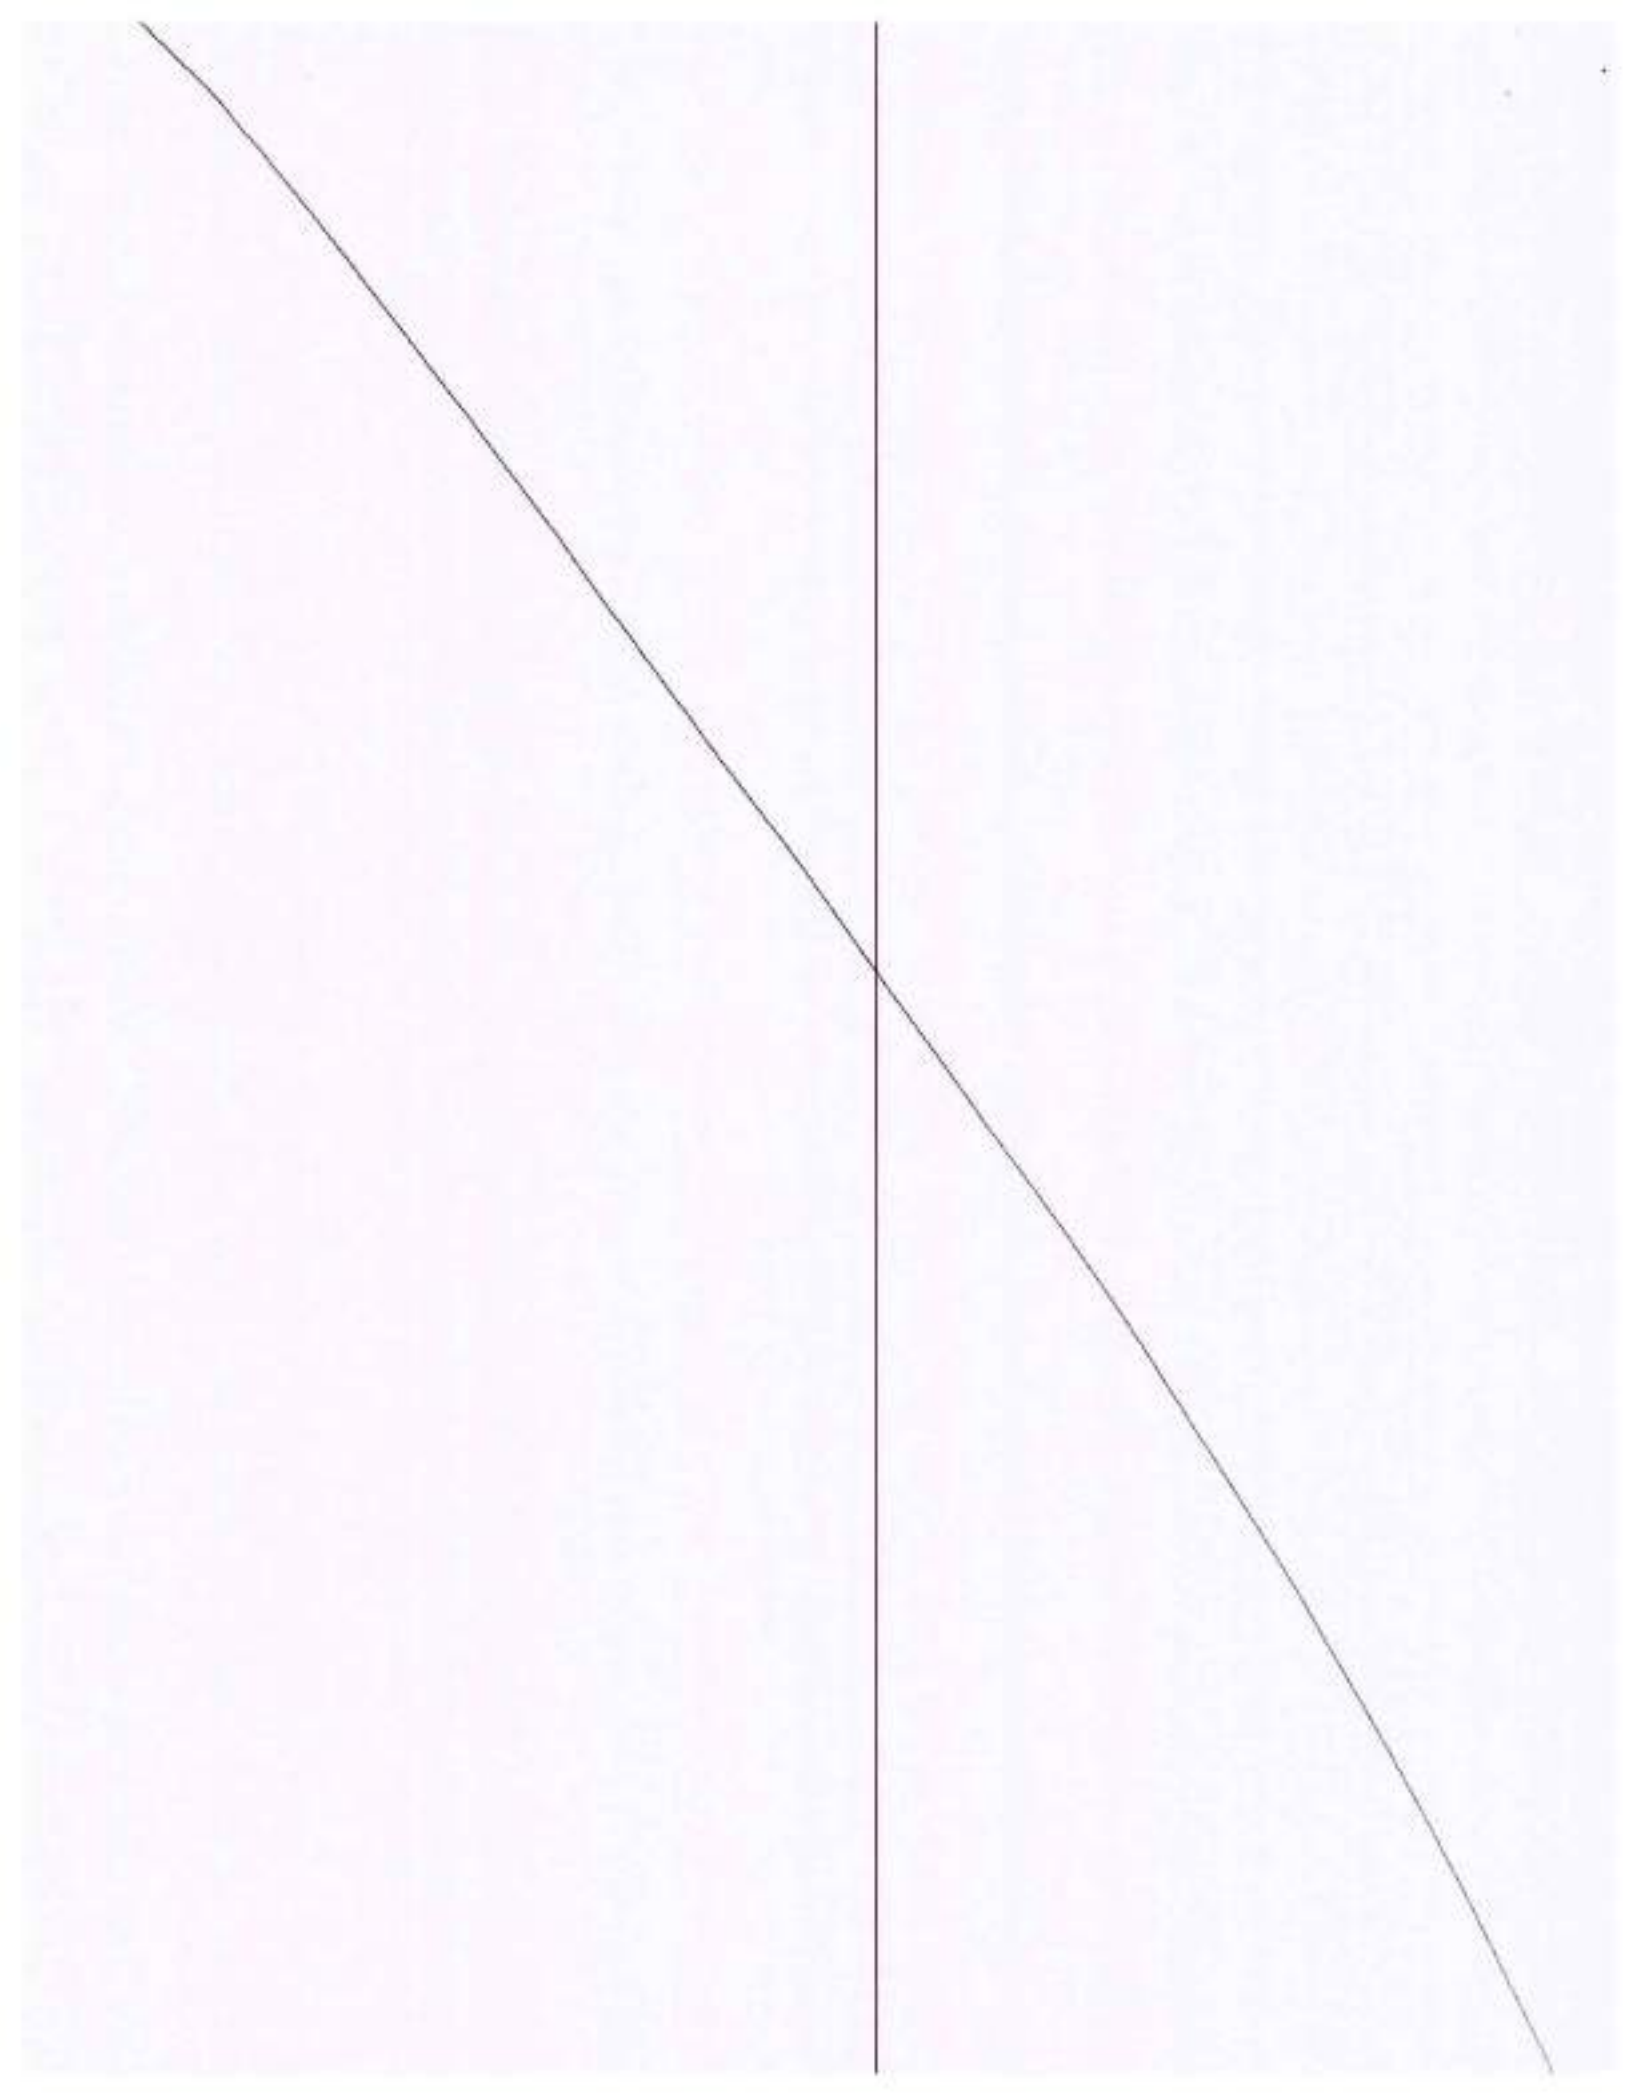


17584

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

COMPROMISOS

	Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1	DISEÑO TRONO EN TIERRA ARMADA	CONTRATISTA	02	06	23
2	ASISTENCIA ESPECIALISTAS CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	31	05	23.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

604

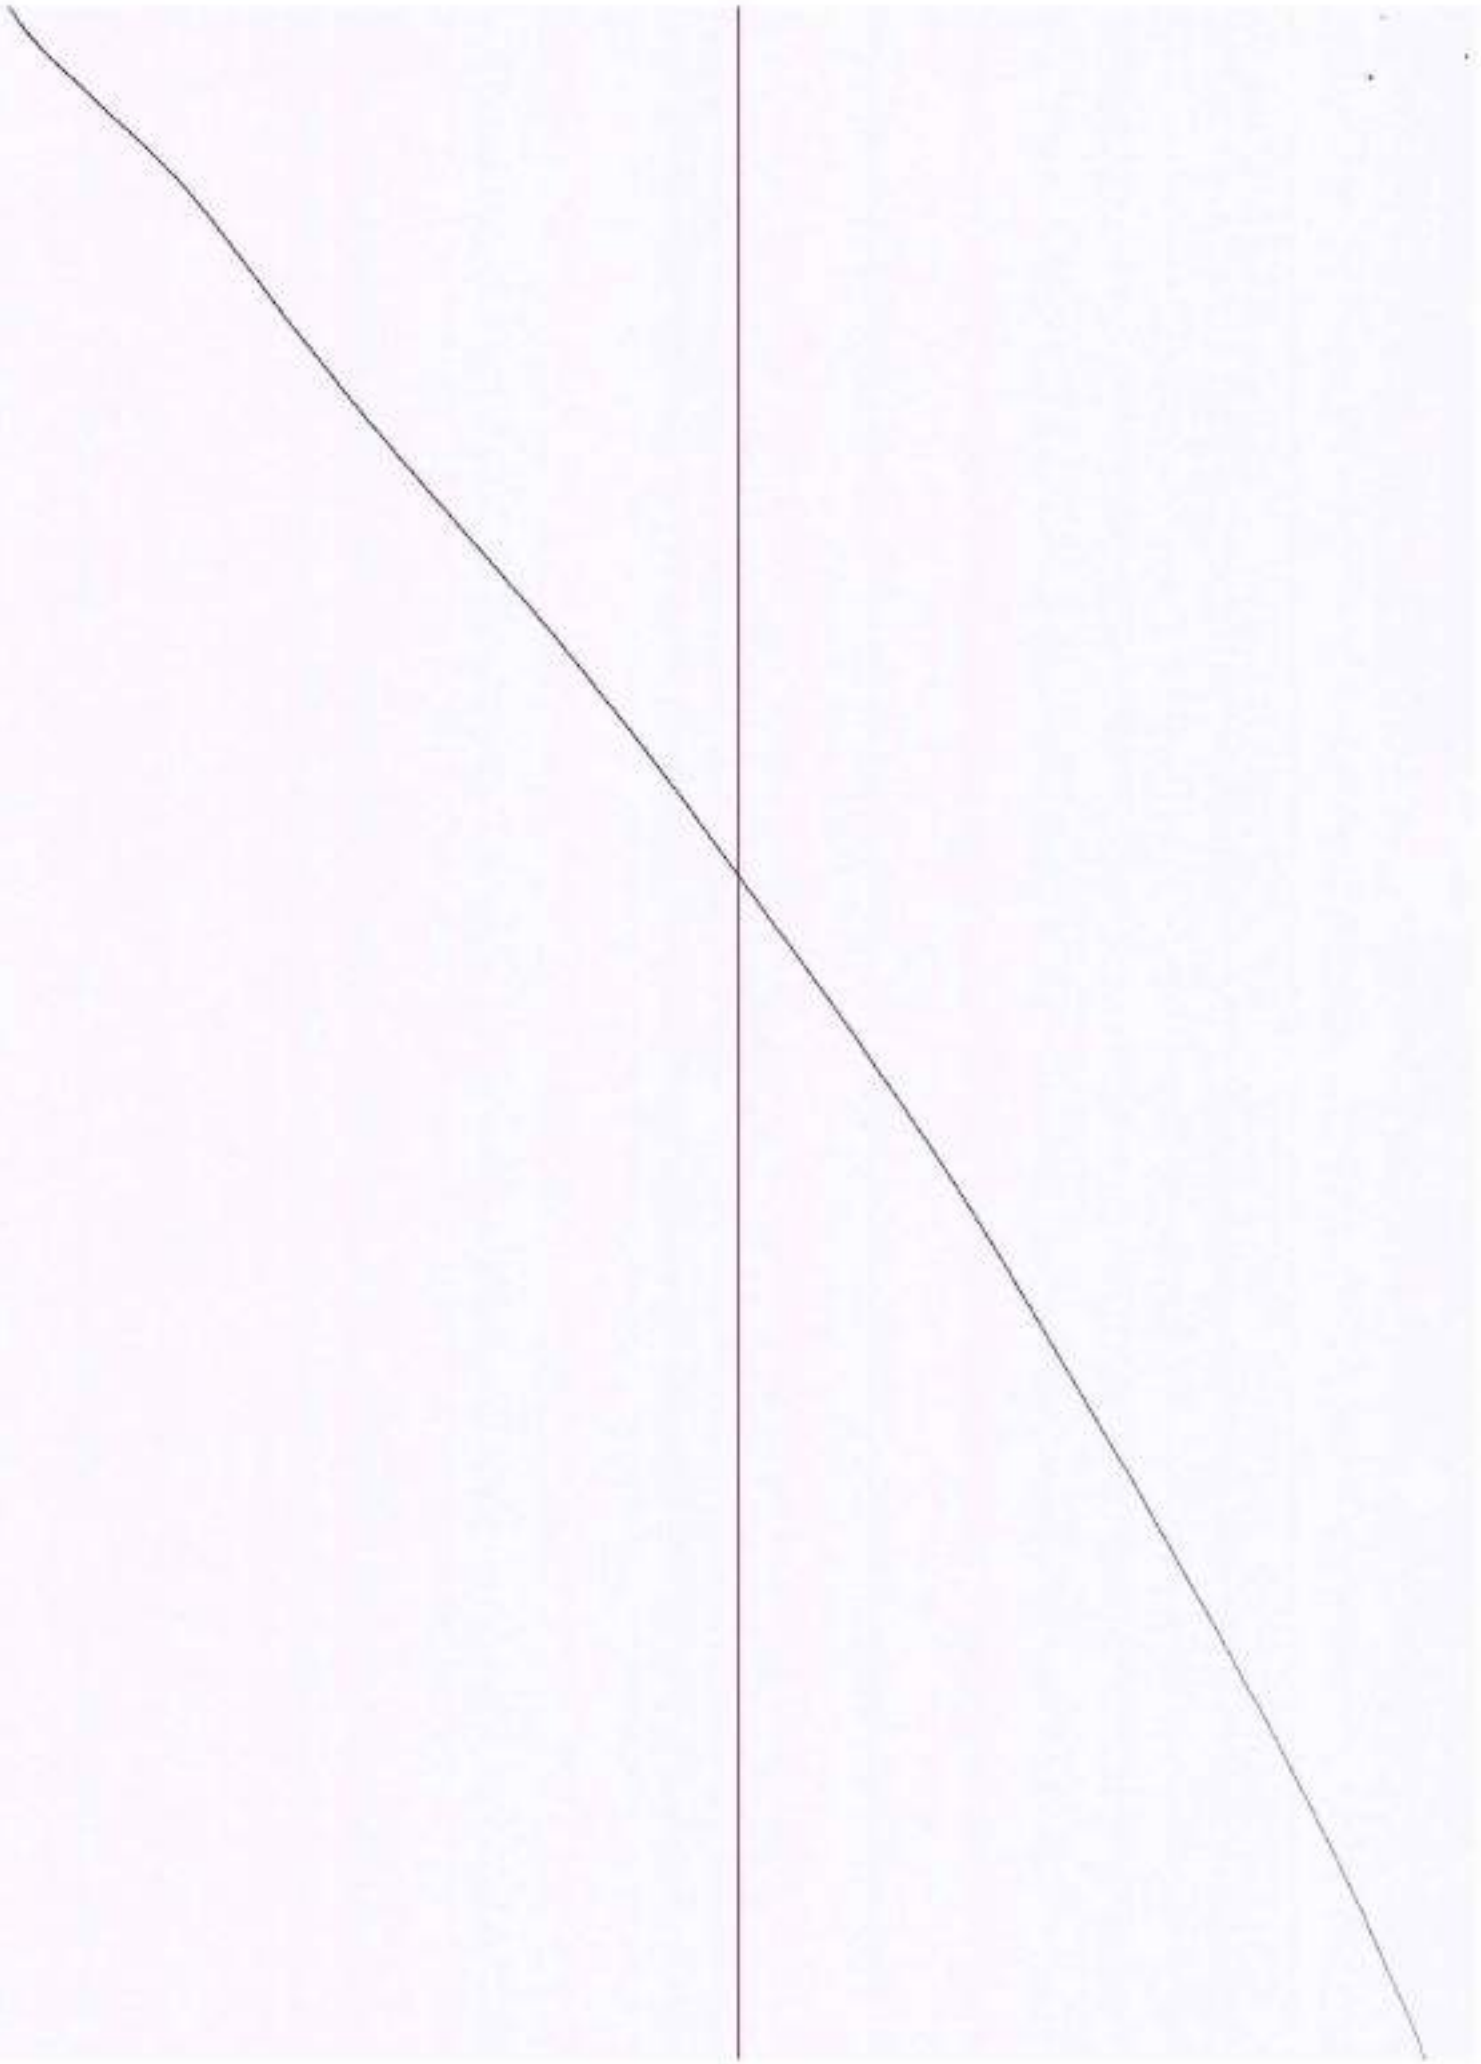

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONTROL DE ASISTENCIA**	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☑ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?		Hoja 1 de 2
TEMA:	Comité de obra 002-2023	RESPONSABLE:	
LUGAR:	IDIGER	FECHA: 24/05/2023	HORA: 4:10 PM.

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Oscar Muñoz D.	IDIGER	Apoyo a Supervisión	3133760435	omunoz@Idiger	
2	FREDDY SUAREZ LUNA	CONTRATISTA	DIRECTOR	3114541705	consorciovigia@gmail.com	
3	Nicolas Lopez Mora	Contratista	Residente	3505335264	consorciovigia@gmail.com	
4	MAURICIO POSADA	INTERVENTORIA APOYO	APOYO II	3005680623	diego.mpf@hotmail.com	
5	Carmen Acevedo-f.	Interventoria	Arquitecta	3133834	Carmenpatricia@hotmail.com	
6	Mauricio Franco Parra	Interventoria	Residente	3143318336	mauriciofranco.ic@hotmail.com	
7	Jessica Paola Cabezas S.	IDIGER	Ingeniera Ambiental	3208325620	jcabezas@idiger.gov.co	
8	Jhon Jairo Villamizar R.	Idiger	Apoyo a supervisión	3134407477	jvillamizar@idiger.gov	
9	Maria Serrano Lota	Interventoria	Pf. Social	3238109724	maria.serrano.mapa@gmail.com	
10	Paola Moreno Castro	Contratista	Arquitecta Auxiliar	3004965789	consorciovigia2023@gmail.com	
11	Yenny Yuliza Cuesta Robles	Contratista	Residente Ambiental	3108612526	Consorciovigia@gmail.com	Yenny Cuesta
12	Diana Castillo Rivera	Contratista	Profesional social	3133992657	Consorciovigia@gmail.com	
13	Lucy Sepulveda A.	IDIGER	Apoyo a la Supervision Social	3004510542	lsepulveda@idiger.gov.co	
14	Darwin J. Ortiz G.	IDIGER	SRRACC			

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONTROL DE ASISTENCIA**	Versión:05 Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☑ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?		Hoja 2 de 2
TEMA:	Comite de obra 002-2023	RESPONSABLE:	
LUGAR:	IDIGER	FECHA: 24/05/2023	HORA: 4:10 pm

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
15	Enrique Caldorón P.	C. UAPA	R. Obra	3132347920	ingcal38@hotmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

17587

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE – FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Lugar:	Oficina IDIGER	**Fecha:**	31	05	2023
Hora Inicio:	2:22 PM	**Hora Final:**			

Objetivo

Comité de Obra N. 15

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

1- Presentación Asistentes al Comité.

2- Presentación Avance Ajustes Diseños Arquitectónicos.

3- Presentación Avance Ajustes Diseños Geotécnicos.

4- Presentación Avance Ajustes Diseños Hidráulicos.

5- Presentación Componente Topográfico.

6- Presentación Componente Forestal.

7- Presentación Componente Social.

607

1

17788

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

Se inicia el presente Comité de Seguimiento Semanal con la presentación de los asistentes al mismo, por parte del Contratista de Obra, IDIGER e Interventoría.

Se continua con la presentación por parte del Contratista de Obra respecto al avance que se tiene del Ajuste a los diseños del componente Arquitectónico.

El IDIGER pregunta a la Interventoría, si se realizaron las respectivas mesas de trabajo entre los especialistas de Obra y de Interventoría, a lo que se informa que efectivamente se llevaron a cabo las mesas de trabajo entre especialistas hidraulicos, geotécnicos, arquitectónicos y se informó el avance en el componente eléctrico.

La Interventoría sugiere tener en cuenta el uso de materiales eco-urbanisticos, los cuales sirvan para dar cumplimiento al 25% de aprovechamiento de residuos, esto según la capacitación que tuvo la interventoría por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Contratista de Obra manifiesta que tendrá esta información en cuenta.

El contratista de Obra Informa que se tienen 30 cortes transversales, y que la cota de cimentación es la 2.810 msnm

608

2

17589

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

El especialista Geotécnico de Obra realiza la presentación del Avance que se tiene respecto al componente Geotecnico, en el cual Informa que se inicio con la revisión de la documentación de los diseños iniciales entregados por el Idiger y la SDHT, asi mismo informa que el proyecto se encuentra entre los perfiles geológicos 1 y 4. La propuesta por parte del Contratista de Obra es el Muro en tierra Reforzada mecanicamente con geotextiles, el cual trabaja por gravedad y se plantean con drenes horizontales Incluidos.

El IDIGER pregunta si se tienen otras alternativas, a lo que el contratista de Obra manifiesta, que se encuentra la propuesta Inicial que es el Muro en concreto, el cual presenta observaciones estructurales. La interventoria manifiesta que en la mesa de trabajo realizada entre especialistas se planteó la propuesta de Gaviones pero analizandola técnicamente la mas viable es la inicialmente presentada por el contratista de Obra.

Continúa con el comite el especialista Hidráulico de Obra realizando la presentación del avance que se tiene respecto al Componente Hidráulico, en el cual informa que las aguas de escorrentia del Urbanismo, se va a manejar lo más naturalmente

609

17590

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

posible, y su descarga se realizará sobre los 2 pozos existentes el 1 y el 6, con tuberías de 6" y 8".
La interventoría manifiesta que según el Acueducto la tubería mínima es de 10" por consiguiente se solicita al contratista de Obra analizar esta situación teniendo en cuenta que las planteadas pueden ser contraproducente. El contratista de Obra se compromete a hacer una entrega parcial a la interventoría el viernes 2 de Junio 2023.
El IDIGER solicita que el periodo de retorno sea mínimo de 25 años, a lo que el contratista de Obra manifiesta que acepta esta solicitud y realizará los ajustes pertinentes.
El IDIGER recuerda el requerimiento realizado en comité anterior, en el cual se requirió que en el proyecto se implementara un tipo de SUDS, a lo que el contratista de Obra y la Interventoría se comprometen a analizarlo e implementarlo.

El Profesional de topografía de Obra realiza la presentación respecto a que se realizó el respectivo levantamiento topográfico, generando una ortofoto y 60 cortes respectivos.

El contratista de Obra se compromete a entregar los diseños definitivos a la interventoría el día

610

17591

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

15 de Junio 2023. La Interventoría manifiesta que se tomaría 10 días para las respectivas revisiones finales.

El Contratista de Obra Solicita información respecto al Modificatorio de Obra, teniendo en cuenta que el tiempo sigue transcurriendo y no se tiene seguridad. El IDIGER manifiesta que en el comité operativo del convenio interadministrativo, llevado a cabo el día 18 de mayo 2023, se aprobó que el contratista de Obra realizara el Ajuste a los diseños con el respectivo aval de la Interventoría, se está a la espera de esta acta firmada por los miembros del comité, para que sea Soporte del respectivo Modificatorio. El Contratista de Obra manifiesta que estos tiempos afectan la programación de Obra y entre menos tiempo más compleja la ejecución de la Obra.
El IDIGER manifiesta que una posible entrega del Modificatorio del ajuste a los diseños sería el día Martes 6 Junio 2023.

El Profesional Forestal de Obra manifiesta que se encontraron un total de 72 individuos arboreos, de los cuales 18 son sujetos de Aprovechamiento Forestal, en el inventario no se encontraron epifitas ni en veda. El contratista de Obra se compromete a entregar la documentación para realizar los trámites

611

5

17592

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

para el permiso de Aprovechamiento Forestal el día Lunes 05 de Junio 2023.

Con respecto al componente Social la profesional Social de Obra, informa los avances de las actividades sociales realizadas en la semana, informando que se realizaron ajustes a las actas de vecindad Inicial, se informa que se tenían 4 personas de la zona de influencia contratadas, pero se retiraron 2 por temas de consumo de sustancias, en total se tienen 29 hojas de vida recepcionadas, se está organizando reunión con una persona de la Asociación de Grafiteros para ver el tema de las fachadas, el IDIGER Solicita que se programe para el lunes o martes, a la fecha el contratista de Obra ha realizado 197 caracterizaciones con 587 personas identificadas en el sector, la meta es hacer 200 caracterizaciones, también se ha realizado 1 capacitación de comunicación asertiva, el día de mañana 01 de junio 2023 el contratista de Obra enviará a la Interventoría la Metodología del Taller de Cultura Ciudadana, la cual se debe enviar al IDIGER una vez se encuentre aprobada por la Interventoría. El IDIGER solicita que la interventoría(la) envíe estas Metodologías teniendo en cuenta que no se están enviando al IDIGER. El IDIGER manifiesta que es importante trabajar de la mano con el comité veedor, con el fin de indagar qué quieren ellos con respecto al tema de las fachadas, y esto se podría hacer mediante un taller.

612

6

17594

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Teniendo en cuenta que el área social es la que interactua directamente con la comunidad, se requiere que el área social tenga el conocimiento y la claridad sobre el proceso de pañete, qué actividad y cómo se va hacer y con qué materiales, el trabajo social debe estar articulado con el componente técnico.
El contratista de Obra solicita una mesa de trabajo entre los profesionales técnicos y sociales, de Obra, Interventoría e IDIGER, con el fin de revisar las acta de vecindad Inicial, teniendo en cuenta que el polígono que se tomó para realizarlas es muy extenso y muchas viviendas que tienen actas de Vecindad no son de afectación directa del proyecto. Se propone entregar las actas de vecindad a la comunidad con la salvedad que en las actas de vecindad que no son de afectación directa del proyecto, se deje esta anotación en la respectiva acta.
El IDIGER solicita a la interventoría prestar atención a las Observaciones realizadas a los informes 1 y 2 Mensuales del componente Social, teniendo en cuenta que en algunos ítems se pone lo del apéndice social y no las actividades realizadas por la Interventoría, tener especial cuidado porque se están repitiendo información en diferentes ítems, un ejemplo de ello es el tema de las Actas de Vecindad.
La interventoría se compromete a enviar el cronograma semanal los viernes en horas de la tarde al IDIGER, así

613
7

17595

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21
		Versión: 01
		Vigente desde: 05-06-2020

Desarrollo de la Reunión:

como agotar los respectivos informes según observaciones del IDIGER.

Con respecto al Componente Ambiental y SST, se informa que el día de ayer en horas de la tarde se sostuvo mesa de trabajo entre los pares profesionales del IDIGER y la interventoría, con el fin de revisar las observaciones a los informes mensuales de interventoría 1 y 2 ambientales y SST, así mismo informaron que se tienen observaciones a los informes mensuales de Obra 1 y 2 de estos componentes, se acordó realizar una mesa de trabajo entre el contratista de Obra, interventoría e IDIGER para hacer la revisión de estas observaciones.

Siendo las 5:30 PM se da cierre al presente comité semanal.

614

8

17548

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-05-2020

COMPROMISOS

	Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
1	Entrega parcial Avance Hidraulico	Consorcio VAPA	2	6	2023
2	Revisar la Implementacion de SGTS en el Proyecto	Consorcio VAPA Interventoria.			
3	Entrega diseños definitivos	Consorcio VAPA	15	6	2023
4	Entrega Documentacion Permiso de Aprovechamiento Forestal	Consorcio VAPA	5	6	2023
5	Entrega Metodologia Taller Cultura ciudadana	Consorcio VAPA	7	6	2023
6	Entrega cronograma semanal Componente social	Interventoria	Viernes.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

615

9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE - FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Se Anexa Listado de Asistencia.			

616
10

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?		Hoja 1 de 2
TEMA:	Comité Semanal	RESPONSABLE:	Interventoria
LUGAR:	Oficinas IDIGER	FECHA:	31/05/2023 HORA: 2:22 PM

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
01	Dora Castillo G.	Consorcio VAPA	Profesional Social	3138826[illegible]	consorciovapa@gmail.com	
02	Oscar Muñoz D.	IDIGER	Apoyo A Subdir.	3133760435	omunoz@idiger	
03	Omar Archila W	Consorcio VAPA	Gst Hidra.	3162696312	OmarArchila@gmail.com	
04	Fernando Nieto	Interventoría Contractual		3006141084	n.g.ingenieros@outlook.com	
05	Nicolas Lopez Pava	Contratista	Residente Presupuestos	3013709830	consorciovapa@gmail.com	
06	Freddy Suarez	Dir. Contratista	Director	3144544	consorciovapa@gmail.com	
07	Enrique Calderón P.	Consorcio VAPA	R. Obra	3132747420	ingecol58@hotm...	
08	Nilda Y. Castroverde S.	Interventoría SST-HSA	Profesional SST-HSA	3124882405	nildacastroverde@gmail.com	
09	Jhon Jairo Villamizar R	Idiger	Apoyo a supervisión	3134467477	jjvillamizar@idiger	
10	Alexander Arevalo	Consorcio VAPA	Profesional Forestal	3176007073	alexarevalo@gmail.com	
11	Juan Ricardo Trancoso	Consorcio VAPA	Gst Gestión	3273791[illegible]	gerencia@ecoingenieria.com	
12	Yenny Yuliet Cortés	Consorcio VAPA	Residente Auxiliar	3108697886	consorciovapa2023@gmail.com	Yenny Cortés
13	Juan Sepulveda A	IDIGER	Apoyo a la supervisión	3004510542	jsepulveda@idiger.gov.co	
14	Jessica Paola Cabezas S.	IDIGER	Apoyo a la supervisión ambiental	3205525620	jcabezas@idiger.gov.co	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

(2) 619

1798

	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?		Hoja 2 de 2
TEMA:	Comite Semanal	RESPONSABLE:	Interventoria
LUGAR:	Oficinas IDIGER	FECHA:	31/05/2023 HORA: 2:22 PM

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
15	MAURICIO POSADA	INTERVENTORIA	ARQ. AVALUO	3005680623	diego.mpfa@hotmail.com	
16	Jenson Fabian Piña Q.	Interventoria	Topografia	3112229941	fabianpiña123@hotmail.com	
17	Cormac Posada A.	Interventoria	Director	3133803992		
18	Angie K. Pardo R.	Interventoria	Ing. Civil	3005182650	kimberly1008.mupo@gmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

(2) 618

1376

17601

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE - FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Lugar:	Oficinas IDIGER	**Fecha:**	07	06	2023
Hora Inicio:	2:00PM	**Hora Final:**			

Objetivo

Comité de Obra N. 96

CONTRATO No. 002-2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER ARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."

Orden del día

- Lectura y Cumplimiento Compromisos Comité Anterior.
- Avance Modificatorio de Obra.
- Avance Ajustes Estudios y Diseños.
- Cumplimiento entregas Informes.
- Componente Ambiental y SST.
- Componente Social.

619
