

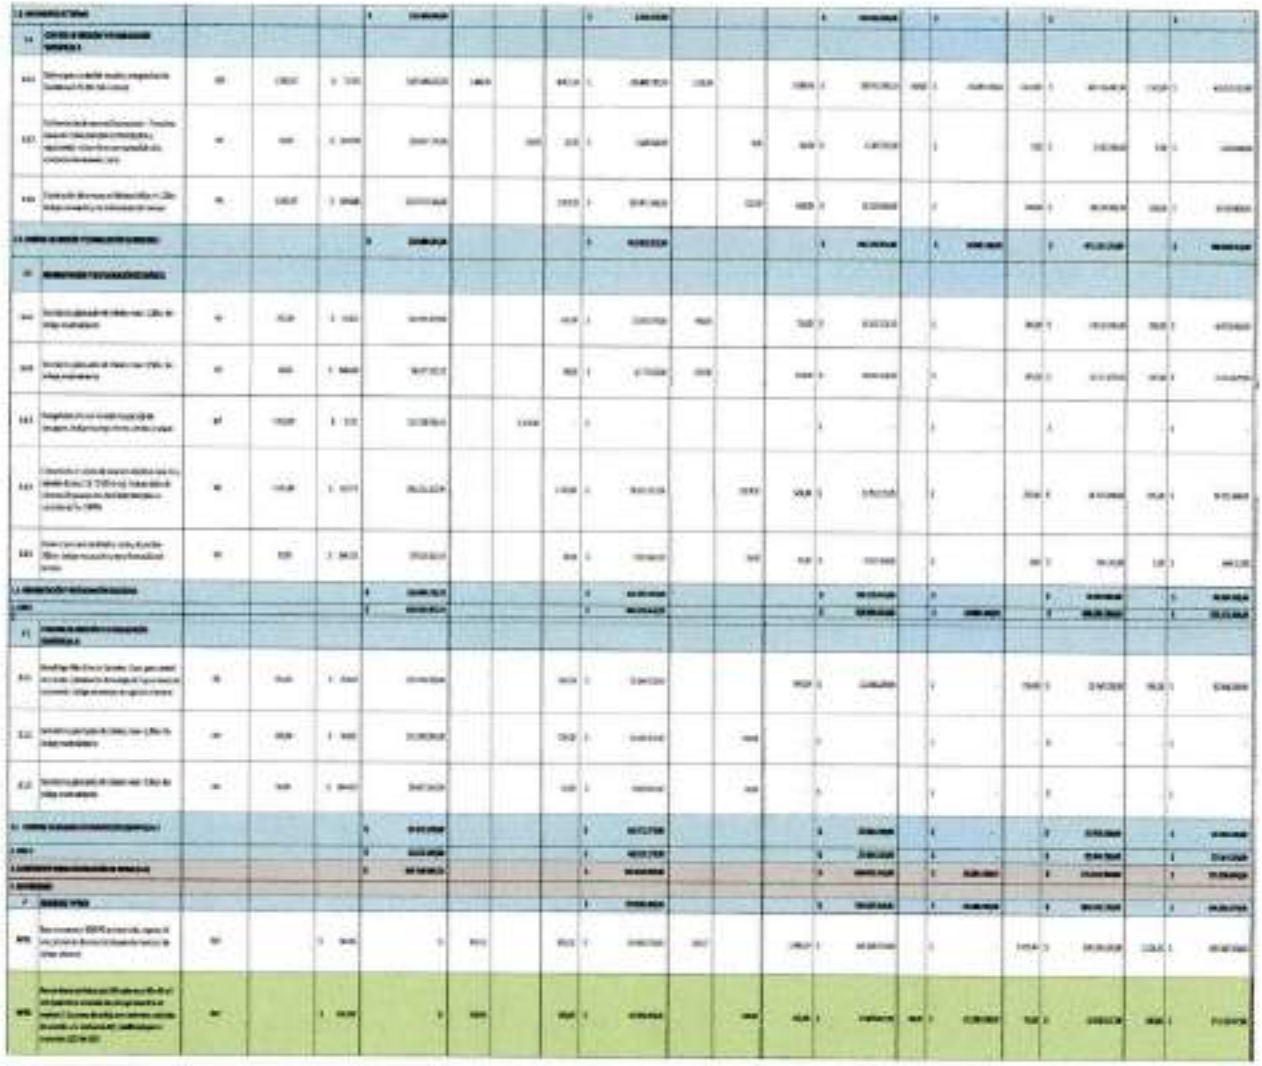


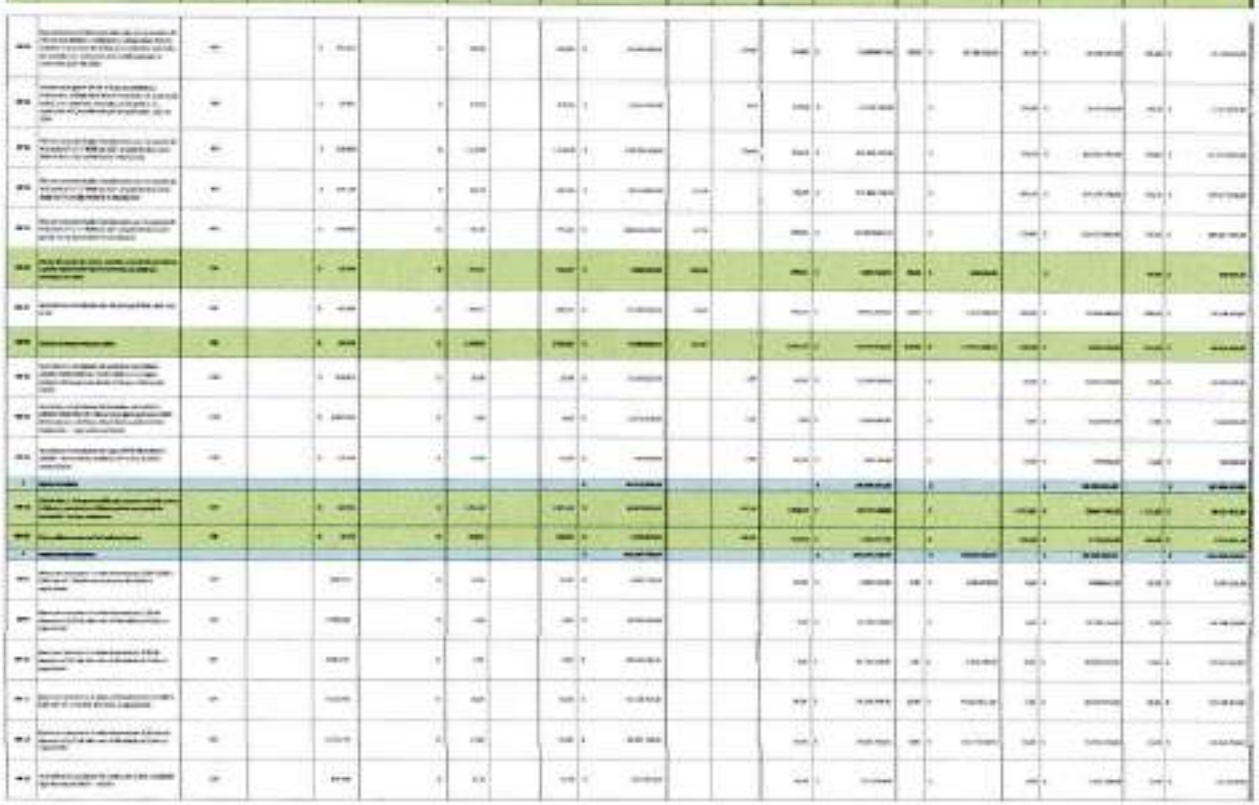

18706

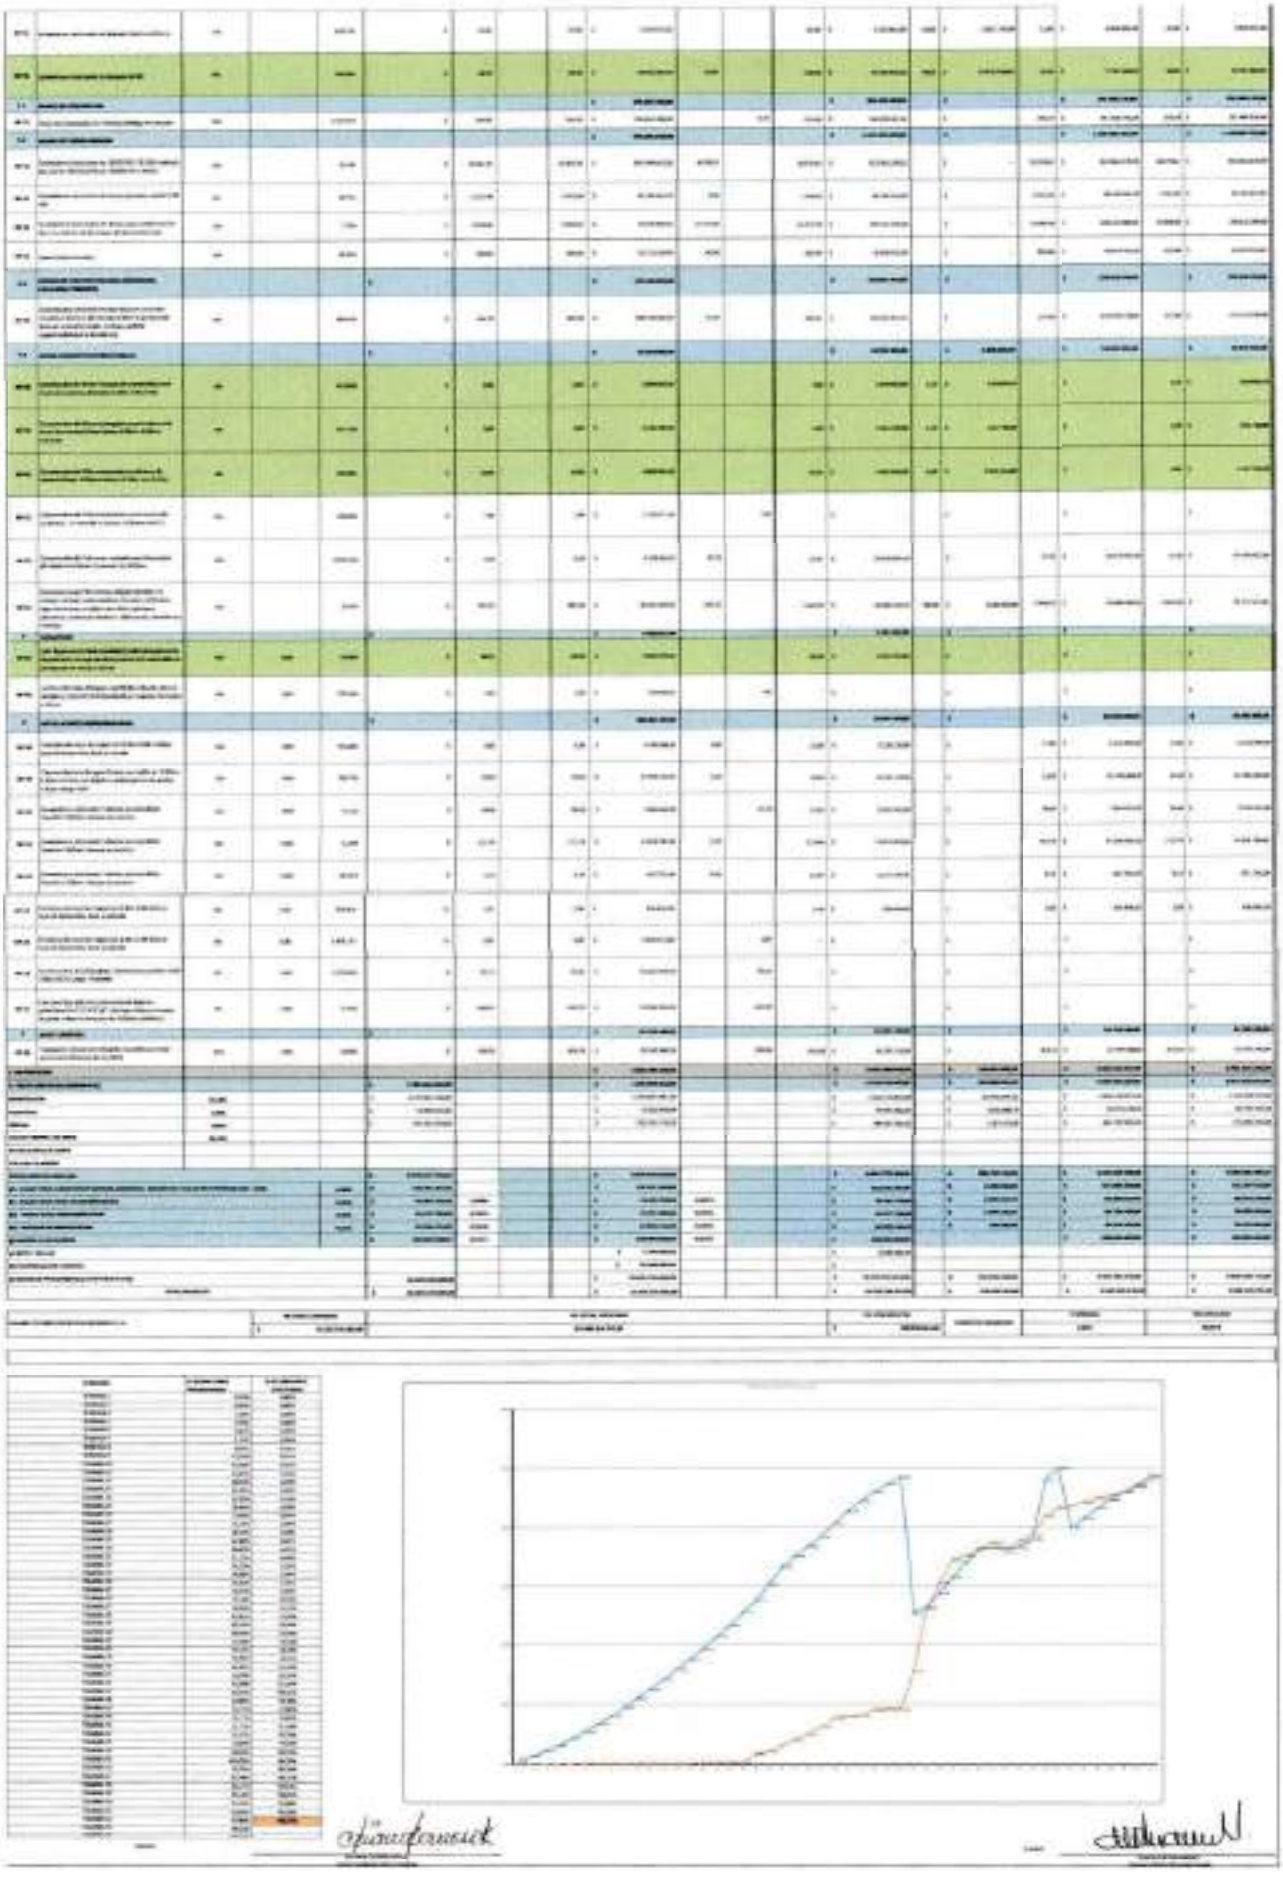

1725

18707

1726

| | |
|---|---|
| Estrategia de manejo de la enfermedad o de problemas comunes<br>1. Levantamiento de actas de reuniones de enero 15 de 22 de febrero, la intervención realizó un proceso de valoración de actas de reuniones de comité de las 3 veredas, las cuales fueron gestionadas el mismo día, y con ello divulgadas para conformidad de la sesión de enero 15 y 25 de febrero de 2024, actas donde se da la aprobación de la acta de reunión del comité de las veredas, y se da la aprobación de la acta de reunión del comité de las veredas, y se da la aprobación de la acta de reunión del comité de las veredas. | Se realizo el cierre de actas de reuniones el día 30 de marzo de 2024, siguiendo con seguimiento |
| Estrategia de participación y cultura ciudadana Hasta el periodo comprendido entre el 15 y el 25 de febrero de 2024 se reportan los siguientes:<br>1. Asistencia técnica:<br>a) El día 20 de febrero de 2024, contratista de obra realiza visita al lugar de obras con el acompañamiento del apoyo social de intervención y verifica el avance de la obra y la aplicación de las medidas de información relacionadas a la ejecución del POT, durante esta visita se realizó un aplicativo tipo 2) encuestas de satisfacción a la comunidad del sector.<br>3. Aplicación de encuestas de satisfacción: El día 20 de febrero de 2024, contratista de obra realiza la aplicación de tipo 2) encuestas de satisfacción a la comunidad, esta actividad se realizó durante el recorrido de obra y se pudo evidenciar que la comunidad se encuentra conforme con la ejecución de las obras, manifestando muchos de ellos el compromiso del contratista. Ver anexo encuesta aplicada y fotos registro fotográfico.<br>2. Reuniones extraordinarias de obra:<br>a) El día 20 de febrero, contratista de obra realiza a cabo mesa de trabajo con la presencia Director de Hábitat en el grupo de vivienda rural, con el fin de hacer encuentro para poder hablar actividades de inversión sobre gestión de proyectos, así como la posibilidad de intervenir el resto de vivienda y el mejoramiento que se entregó el convenio, durante el encuentro de visita, la visita el contratista de obra explica las medidas generadas del área de la practica. Ver Anexo Acta / Ver registro fotográfico.<br>b) El día 21 de febrero contratista de obra realiza reunión extraordinaria donde el componente social con integrante de la Alcaldía y Obras, equipo social de la Alcaldía, personas ejecutoras de Proyecto Calidad y la misma obra, donde se abordará la gestión para realizar un mejoramiento del proyecto, por lo tanto se realizo de trabajo, se socializo las diferentes actividades propuestas con parte de la comunidad del sector, tales como: los puntuales de fotografía, Geográfico, Realización de diseño de tarjeta, gestión de diferentes, propuestas realizadas colaborativas por mejorar con varias y se anexo diferentes entre otros). Ver Anexo Acta / Ver registro fotográfico. | Efectuar mantenimiento a vías y aplicación de encuesta de satisfacción |
| Estrategia de gestión social: Para el periodo comprendido entre el 15 y 25 de febrero de 2024 se reportan los siguientes:<br>1. Programa de socialización MOVIC: Contratista de obra realiza una actualización de censo: 25 trabajadores en obra en total, 18 de ellos de la región. 2 fueron reforzados. Mano de obra no calificada y 23 trabajadores son residentes del sector Ciudad Bolívar y quienes son el beneficiado de la vivienda, donde cumplimiento con un 85.4% de ejecución del 90% esperado. | No se tiene antecedente a la fecha |
| Actividades extraordinarias de obra:<br>a) El día 20 de febrero contratista de obra realiza visita a la obra con el MOVIC, con el fin de informar a la entidad sobre la fecha de entrega de la obra y la ejecución de las 23 viviendas restantes en la misma, además, contratista de obra solicita la inscripción y generación de código Bpin, para que dentro de la nueva administración de Bolívar, se mejoramiento del punto. Ver Anexo de correo y oficio de solicitud | No se tiene antecedente a la fecha |

## 5. Proyectos que tiene en ejecución (Cumplidos y No cumplidos)

| OBJETIVO | RESULTADO |
|---|---|
| Se realizo el MOVIC de octubre (Feb 2021) se efectuó seguimiento por cada uno de los interventores | |

## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS por Quien (Responsable) - Cómo se realizaron

| OBJETIVO | RESULTADO |
|---|---|
| Durante la semana se realizó una reunión el día 15 y 25 de febrero de 2024, se socializaron los siguientes compromisos de obra: | |
| Transmisión base generador: durante esta semana se realizó: *Llenado y comparación en la intervención entre los puntos de las poblaciones y población asociada (a las viviendas), *Continua actividad de aplicación de una nueva política de las un sector diverso en Población asistencia de las viviendas (Gobierno del proyecto), *Instalación de alumbrado público (CB), *Colocación (cuarzo) limpieza (1+14 Kpa (2800% en mayor forma semana), *Llenado, actividad, tierra negra, ventilación y negro de plástico sobre de Zanja sobre de (CB hasta 64.000). *Llenado y ensamblaje tierra negra sobre las descubiertas (64-62) Puntos de (CB) puede de la Gobierno Civil, *Instalación sobre de alumbrado (CB) sobre de Población intermedias en las ventanas y sobre de sobre sobre en nuestro sobre tierra (2" AA) en las cajas de Inspección, *Instalación de alumbrado (alcalde) sobre en nuestro de alumbrado (24" 500mm), *Instalación en el (6) sobre (20" long 1.4), *Llegada en "Caja (MK-60)", *Registro de (en) en la intervención para la en la formación en mayo #POSIBLES comunicación materia de obra, *Entrega actividad de cada punto en concreto. Caja de instalación. Llenado en la caja Concurrencia. Llenado puede (caja arena y c. Cemento). *Llenado caja base 4 en con arena de la de en el sobre de las viviendas), *Colocación (cuarzo perfiladora) sobre (cuarzo 3) en 1 vivienda y sobre en nuestro de las viviendas, *Trabajo de (cuarzo en) en sobre (cuarzo) 2 (CB) Personas (cuarzo) (cuarzo) sobre (cuarzo) en (cuarzo de) de las (cuarzo) en (cuarzo) en (cuarzo) en

18708

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| 25 | 2 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AÑO |

SEMANA N° 53 DEL 19 (DD) 2 (MM) 2024 (AÑO) AL 25 (DD) 2 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VAPA — CONTRATO No.: FONDIGER 002 2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: MAPO INGENIERIA SAS — CONTRATO No.: FONDIGER 008 2023

**VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES**

**COMPONENTE OBRA**



Panorámico de la obra



Extendido base granular corona muro tierra armada



Llenado y compactación en los intersticios entre los paredes de las jardineras y fachadas existentes de las viviendas



Continua actividad de aplicación de tres manos pintura koraza color blanco en fachadas existentes de las viviendas colindantes al proyecto



Continua actividad de aplicación de tres manos pintura koraza color blanco en fachadas existentes de las viviendas colindantes al proyecto



Instalación cicloparqueadero M101



Cicloparqueadero M101



Colocación Concreto limpieza f'c=14 Mpa 2000PSI en muro tierra armada



Colocación hilo nylon para la enredadera Bougainvillea (bougainvillea spectabilis)



Sembrado plantulas entre los abscisados k0+299 hasta k0+304



Llenado y extendida tierra negra entre los abscisados k0+299 hasta k0+304



Tierra negra entre los abscisados k0+299 hasta k0+304

1727



Llenado y extendida tierra negra entre los abscisados k0+037 hasta k0+039; predio de la Defensa Civil



Tierra negra entre los abscisados k0+037 hasta k0+039; predio de la Defensa Civil



Riego en las plantulas jardineras



Riego en las plantulas entre los abscisados k0+299 hasta k0+304



Riego en las plantulas zona de la ladera



Instalación cable de aluminio 1/0 AWG aislado



Instalación cable de aluminio 1/0 AWG aislado



Instalación cable de aluminio 1/0 AWG aislado



Instalación cable de aluminio 1/0 AWG aislado



Instalación cable de aluminio 1/0 AWG aislado



Instalación terminales en las entradas y salidas de las tuberías o ductos eléctricos 3" PVC en las cajas de inspección



Instalación luminarias Schreder, incluye soporte metalico, abrazadera 3/4" 500mm

18709



Instalación luminarias Schreder, incluye soporte metalico, abrazadera 3/4" 500mm



Luminarias Schreder, incluye soporte metalico, abrazadera 3/4" 500mm



Luminarias Schreder, incluye soporte metalico, abrazadera 3/4" 500mm



Instalación varilla cobre 5/8" long 2.4



Instalación varilla cobre 5/8" long 2.4



Bajante en Tubo IMC 02"



Replanteo del área de intervención para la conformación de muro HYDROBLOCK



Descapote manual en material común



Compactación manual del material de sitio



Muro de contención HYDROBLOCK



Muro de contención HYDROBLOCK



Muro de contención HYDROBLOCK

1723



Muro de contención HYDROBLOCK



Retoma actividad hincado postes concreto 10x10 Cerramiento ladera parte baja cerca a la Quebrada Limas



Instalación alambre de púas ladera norte del proyecto



Cerramiento postes ladera norte parte baja cerca a la Quebrada Limas



Cerramiento postes ladera norte parte baja cerca a la Quebrada Limas



Extiende capa base 4 cm con arena de río en el sector de los comedores



Colocación loseta prefabricada colores Ocre y Terracota en el sector de los comedores



Sellado con arena de peña piso losetas colores en el sector de los comedores



Franja de ajuste ancho variable concreto 2500 PSI mezclado insitu confinamiento en piso de losetas de colores



Franja de ajuste ancho variable concreto 2500 PSI mezclado insitu confinamiento entre muros jardinera y fachada existente



Corte en dilataciones concreto 4000 psi con pulidora en muro baranda



Corte en dilataciones concreto 4000 psi con pulidora en muro baranda

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Corte en dilataciones concreto 4000 psi con pulidora en muro baranda | Corte en dilataciones concreto 4000 psi con pulidora en muro baranda | Corte en dilataciones concreto 4000 psi en losa de concreto de colores con la cortadora de pavimento |
|  |  |  |
| Colocación Yumbolon en las dilataciones, espuma de polietileno brinda aislamiento y protección | Colocación Yumbolon en las dilataciones, espuma de polietileno brinda aislamiento y protección | Llenado con Vulkem para sellamiento de la juntas constructivas |
|  |  |  |
| Llenado con Vulkem para sellamiento de la juntas constructivas | Llenado con Vulkem para sellamiento de la juntas constructivas | Llenado con Vulkem para sellamiento de la juntas constructivas |
|  |  |  |
| Muro en mampostería con acabado en pintura se inicia con el pañete; durante el proceso del proyecto el propietario adyacente inicio actividades constructivas | Pañete liso 1:3 impermeabilizado sobre mampostería en mampostería nueva | Pañete liso 1:3 impermeabilizado sobre mampostería en culata de la propiedad contemplada en el presupuesto inicial; porque propietario adyacente levanto muros y techo |



Continua la actividad pañete liso 1:3 impermeabilizado sobre mampostería, fachadas existentes que colindan con el proyecto



Excavación y demolición base cimentación donde se instalaran las canecas



Caneca en acero inoxidable tipo Barcelona M121 - Sencilla



Bolardos metálicos M15-A



Perforación placa concreto, atornillado e instalación de platinas



Instalación de platinas



Montaje y construcción baranda M-82 en Rampa Sur



Montaje y construcción baranda M-82 en Rampa Sur



Montaje y construcción baranda M-82 en Rampa Sur



Montaje y construcción baranda M-82 en Rampa Norte



Baranda M-82 Rampa Norte



Montaje y construcción baranda M-82 en Muro Paralelo

18711



Baranda M-82 Muro Paralelo



Montaje y construcción baranda M-82 asbcisa k0+304



Baranda M-82 Abscisa k0+304



Proceso terminación en los muros de contencción



Proceso terminación en los muros de contencción



Proceso terminación en los muros de contencción



Proceso terminación en los muros de contencción



Proceso terminación en los muros de contencción



Proceso de terminación jardineras horizonrales en concreto monolítico



Proceso de terminación jardineras horizonrales en concreto monolítico



Proceso de terminación jardineras horizonrales en concreto monolítico



Proceso de terminación jardineras horizonrales en concreto monolítico

1730



Pañete cajas inspección redes hidrosanitarias



Construcción cañuelas en cajas inspección redes hidrosanitarias



Construcción cañuelas en cajas inspección redes hidrosanitarias



Instalación Caja recolectora de aguas lluvias con rejilla



Aseo General



Aseo General



Aseo General



Retiro de material producto de las excavaciones y demoliciones



Suministro Losetas prefabricadas 40x40x6 cms ASO colores OCRE - TERRACOTA



Verificación medidas



Verificación medidas



Verificación niveles

18712



Verificación medidas



Verificación medidas



Verificación medidas



Verificación medidas



Verificación medidas



Verificación medidas



Verificación medidas



Protección plantulas por actividades de pañete y pi tura



Acompañamiento en el trazado dilataciones en el muro baranda



Acompañamiento en el trazado dilataciones en el muro baranda



Comisión de topografía verificando niveles diariamente y levantamiento cantidades para las actas porciales



Mesa de trabajo pares via telefónica informes conciliando porcentajes y cantidades

1731

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Visita profesional de la empresa VANTI | Visita IDIGER | Asistencia a la reunión con Hábitat y Artistas |
|  | N.A. | N.A. |
| Visita HÁBITAT | | |

**COMPONENTE AMBIENTAL SST**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| La interventoría realizó el acompañamiento en la actividad del minicargador, el día 20 de febrero de 2024. | La supervisión del IDIGER e interventoría solicitan la recolección de los RCD ubicados en las calles aledañas al proyecto. Deregual manera señalizar y demarcar los materiales. | Vista panorámica de la siembra de plántulas sobre las jardineras, el día 20 de febrero de 2024. |
|  |  |  |
| Se recomienda realizar la inspección de los EPP y dotación y el cambio respectivo si así lo amerita, el día 20 feb. /24. | Se solicita reforzar la inspección del estado de los EPP y cambio respectivo, el día 20 feb. /24 | Se solicita reparar las fugas de la manguera utilizada en el frente de obra, el día 20 feb./24. |

18713



La interventoría realizó la inspección del estado de las plántulas sembradas en jardineras, el día 20 feb. /24.



Plántulas sembradas en jardineras, el 20 feb. /24.

| Nombre Científico | Nombre Común | No. |
|---|---|---|
| Pennisetum sp. | Forrajetum verde | 208 |
| Lolium perdurum | Lirio de pantano | 322 |
| Colonagrostis sp. | Calamagrostis | 361 |
| Dactylopomum dactylo | Margarita | 208 |
| Eragrostides sp. | Eragrostides | 209 |
| | | 1308 |



Acompañamiento de la interventoría en la actividad de soldadura de baranda, el día 20 feb. /24. Se observó el uso de la careta de soldadura.



Aunque algunas de las vías de acceso cuentan con malla o polisombra, de acuerdo a compromiso de comité semanal es necesario reforzar este cerramiento, el día 20 feb./24.



Se solicita realizar el cerramiento y señalización de las cajas de inspección, el 20 de febrero de 2024.



Verificación del estado de la siembra de plantulas en las jardineras, el día 20 feb. /24.



Acompañamiento en la preparación del pañete, uso de EPP y dotación. Se solicita que el personal de obra cuenta con el uniforme corporativo, el día 20 feb./24.



Se solicita realizar la demarcación y señalización de los acopios temporales de materiales en la obra. Así mismo cubrirlos con plástico para evitar la dispersión y afectación de la calida del aire y salud de trabajadores y comunidad, el día 20 feb. /24.



La interventoría realizó el acompañamiento en la actividad de instalación de postes y redes eléctricos, el día 20 feb. /24.



Se observó la ausencia del punto de hidratración el día 20 de febrero de 2024.



Se solicita al contratista evitar colocar plástico sobre las plántulas recien sembradas ya que afectan su estado y crecimiento. Así mismo se solicitar evitar que residuos de pintura afecten las plantulas sembradas en jardineras, 20 feb./24.



En la fotografía se observa como el plástico afecto algunas plantulas sembradas en jardineras, el día 20 feb. /24. Se recomienda mayor supervisión y cuidado por parte del contratista.

1732



Inspección de las unidades sanitarias portátiles ubicadas en el frente de obra, el día 20 feb. /24.



Se solicita realizar una jornada de barrio y limpieza en las boca calles aledaños al proyecto. De igual manera señalizar y cubrir los materiales de obra y pronta recolección de RCD, el día 20 feb. /24.



Se solicito reforzar el cerramiento de la obra, al igual organizar los acopios de materiales para evitar su desperdicio, la afectación de la calidad del aire y salud de la comunidad, 20 feb. /24.



Se solicita realizar la demarcación y protección de los acopios de materiales, el día 20 feb. /24.



Acompañamiento de la interventoría en la actividad de soldadura del baranda, el día 20 feb. /24.



La interventoría confirma que la comunidad ha arrojado escombros en la zona sur del proyecto, lo cual afecta de manera negativa la imagen de la zona.



Supervisión del estado fitosanitario de las plántulas sembradas en jardineras, el día 20 feb. /24.



Verificación del punto de hidratación en oficina administrativa del contratista el día 23 feb. /24.



Participación en el comité semanal de obra No. 50 con la asistencia de IDIGER, contratista e interventoría, el día 23 feb. /24.



Acompañamiento de la interventoría en actividades de trabajo seguro en alturas, el día 20 feb. /24.



Actividades de orden y aseo por parte del personal del consorcio VAPA, el día 20 feb. /24.



Acompañamiento en actividades de reparación de jardineras y comedores, se observa uso de dotación y EPP el día 20 feb. /24.

18714



Punto ecológico y botiquín de primeros auxilios en oficina administrativa del contratista el día 23 feb. /24.



Se solicita al contratista, realizar la recolección de residuos RCD y otros materiales de obra que han caído sobre los individuos arbóreos de la zona muro, el día 23 feb. /24.



Se observó adecuado mantenimiento del sumidero ubicado en el costado sur del proyecto el día 23 feb. /24.



Personas desconocidas han arrojado RCD en el costado sur de la obra, el día 23 feb./24.



Por favor recoger los RCD que han caído sobre la zona muro, afectando el crecimiento y estado de los individuos sembrados allpi, el 23 feb. /24.



Se solicita reforzar el cerramiento de la obra.



Se solicita reparar y proteger el sumidero ubicado en la calle 71 c sur, el día 20 feb. /24.



Se solicita recoger los residuos de plástico dejados por los trabajadores en las jardineras, situación que puede afectar el crecimiento de las plántulas, el día 23 feb. /24.



Se solicita realizar el mantenimiento en el sumidero de la fotografía, el día 20 feb. /24.



Acompañamiento de la interventoría en la pulida de jardineras, el trabajador no cuenta con la dotación corporativa ni guantes de protección, el día 23 feb,. /24.



Se solicita evacuar los RCD presentes en las calles de acceso a la obra, el día 23 feb. /23.



Se solicita evacuar los RCD presentes en las calles de acceso a la obra, el día 23 feb. /23.

1733

**COMPONENTE SOCIAL**



Valla informativa de Obra



Pendón externo de PAC



Cartelera informativa de PAC



Recorrido Urbano verificación de Punto Satélite de Panadería



Recorrido Urbano. Verificación de Punto Satélite de información del Salón Comunal del Mirador



Recorrido Urbano. Verificación de Punto Satélite de información depósito de papa



Aplicación de encuestas de satisfacción 20/02/2024



Aplicación de encuestas de satisfacción 20/02/2024




Aplicación de encuestas de satisfacción 20/02/2024

18715

| | | |
|---|---|---|
|  Reunión extraordinaria con Secretaría de Habitát y comité de Grafitti 20/02/2024 |  Reunión extraordinaria con Secretaría de Habitát y comité de Grafitti 20/02/2024 |  Reunión extraordinaria con Secretaría de Habitát y comité de Grafitti 20/02/2024 |
|  Reunion de mesa de trabajo con el equipo social de la Rolita y miembros de la biblioteca violeta 21/02/2024 |  Reunion de mesa de trabajo con el equipo social de la Rolita y miembros de la biblioteca violeta 21/02/2024 |  Reunion de mesa de trabajo con el equipo social de la Rolita y miembros de la biblioteca violeta 21/02/2024 |
|  Cierre de PQRS N°4 por afectación de vidrios 24/02/2024 |  Cierre de PQRS N°4 por afectación de vidrios 24/02/2024 |  Cierre de PQRS N°4 por afectación de vidrios 24/02/2024 |
|  Se evidencia punto de atención a la comunidad 24/02/2024 |  Se evidencia punto de atención a la comunidad 24/02/2024 | N.A |


1734

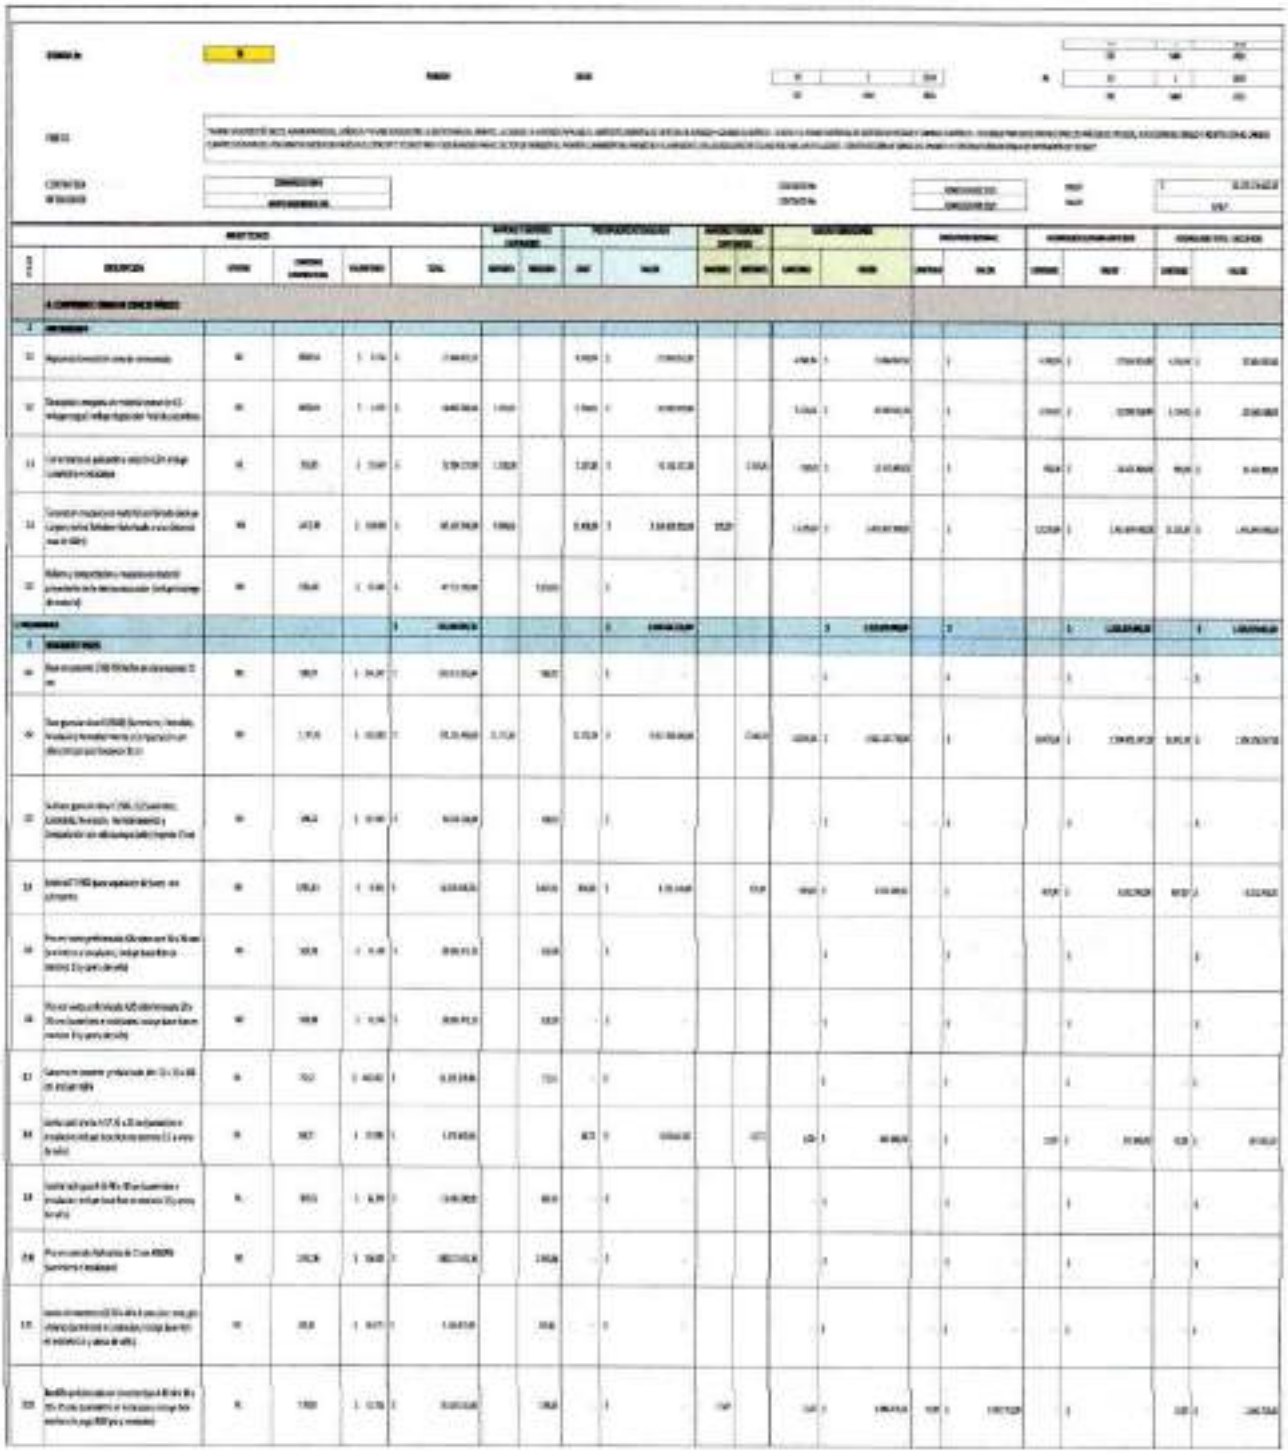



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




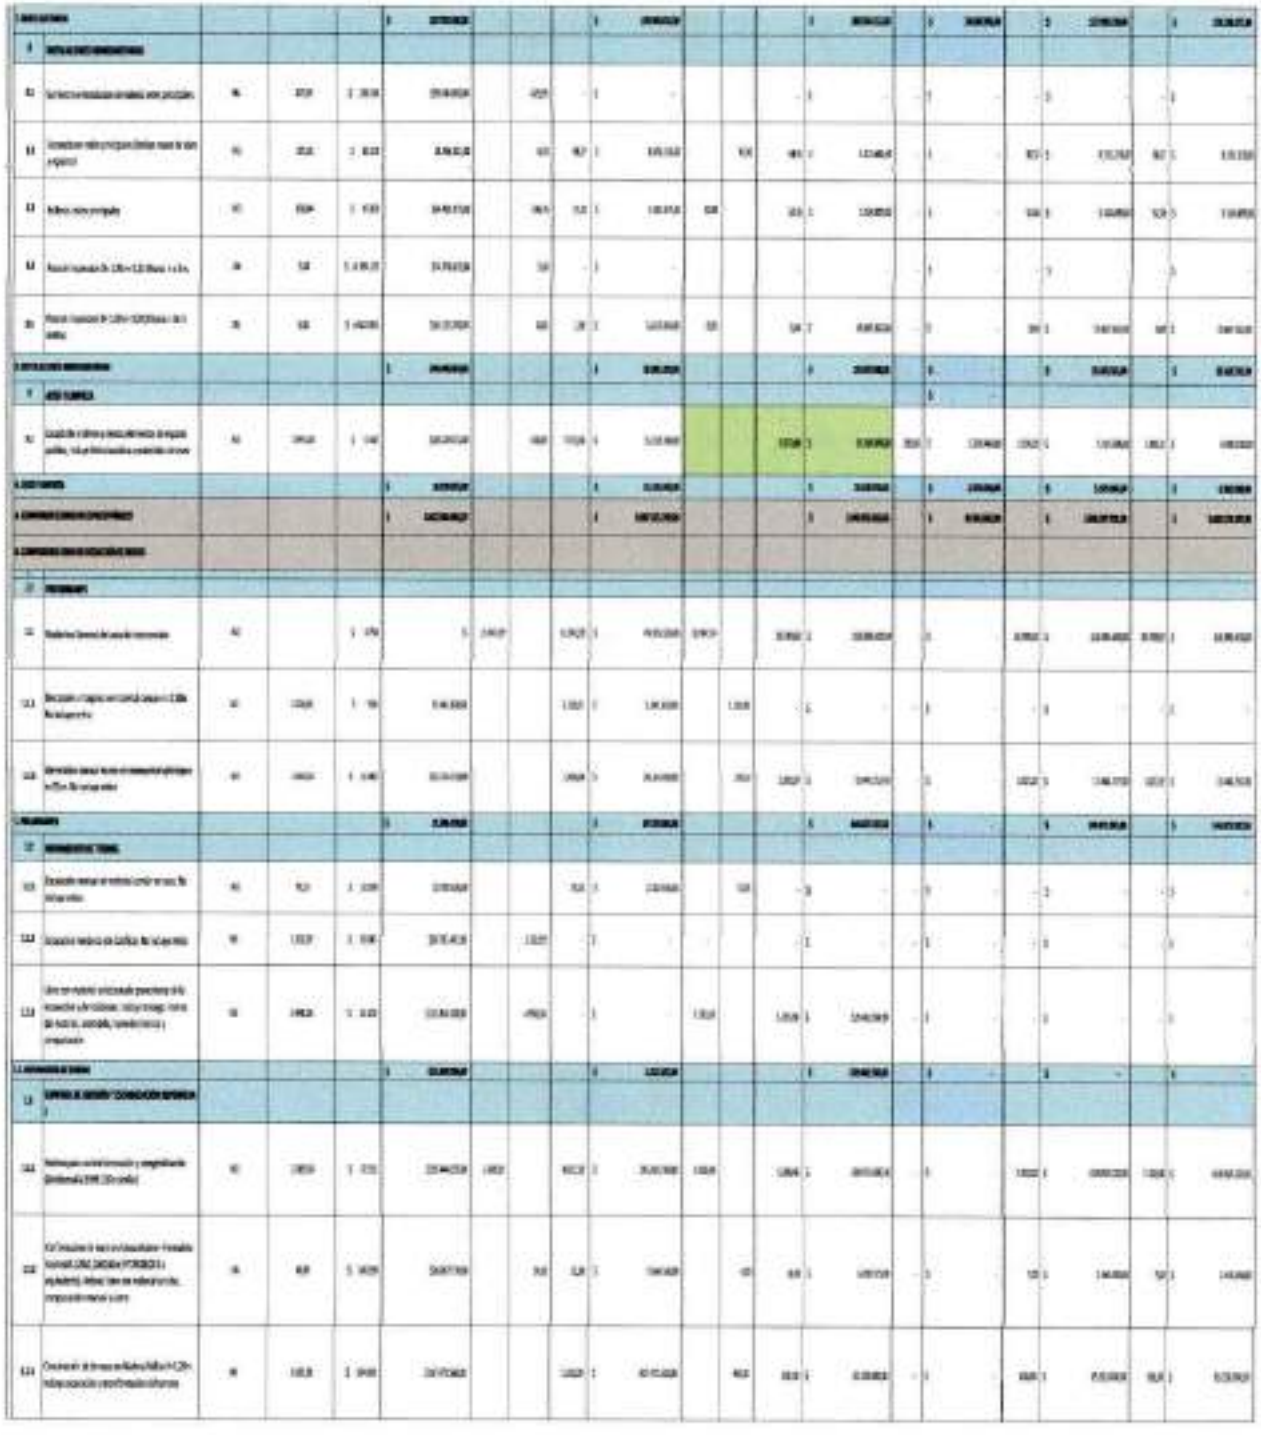

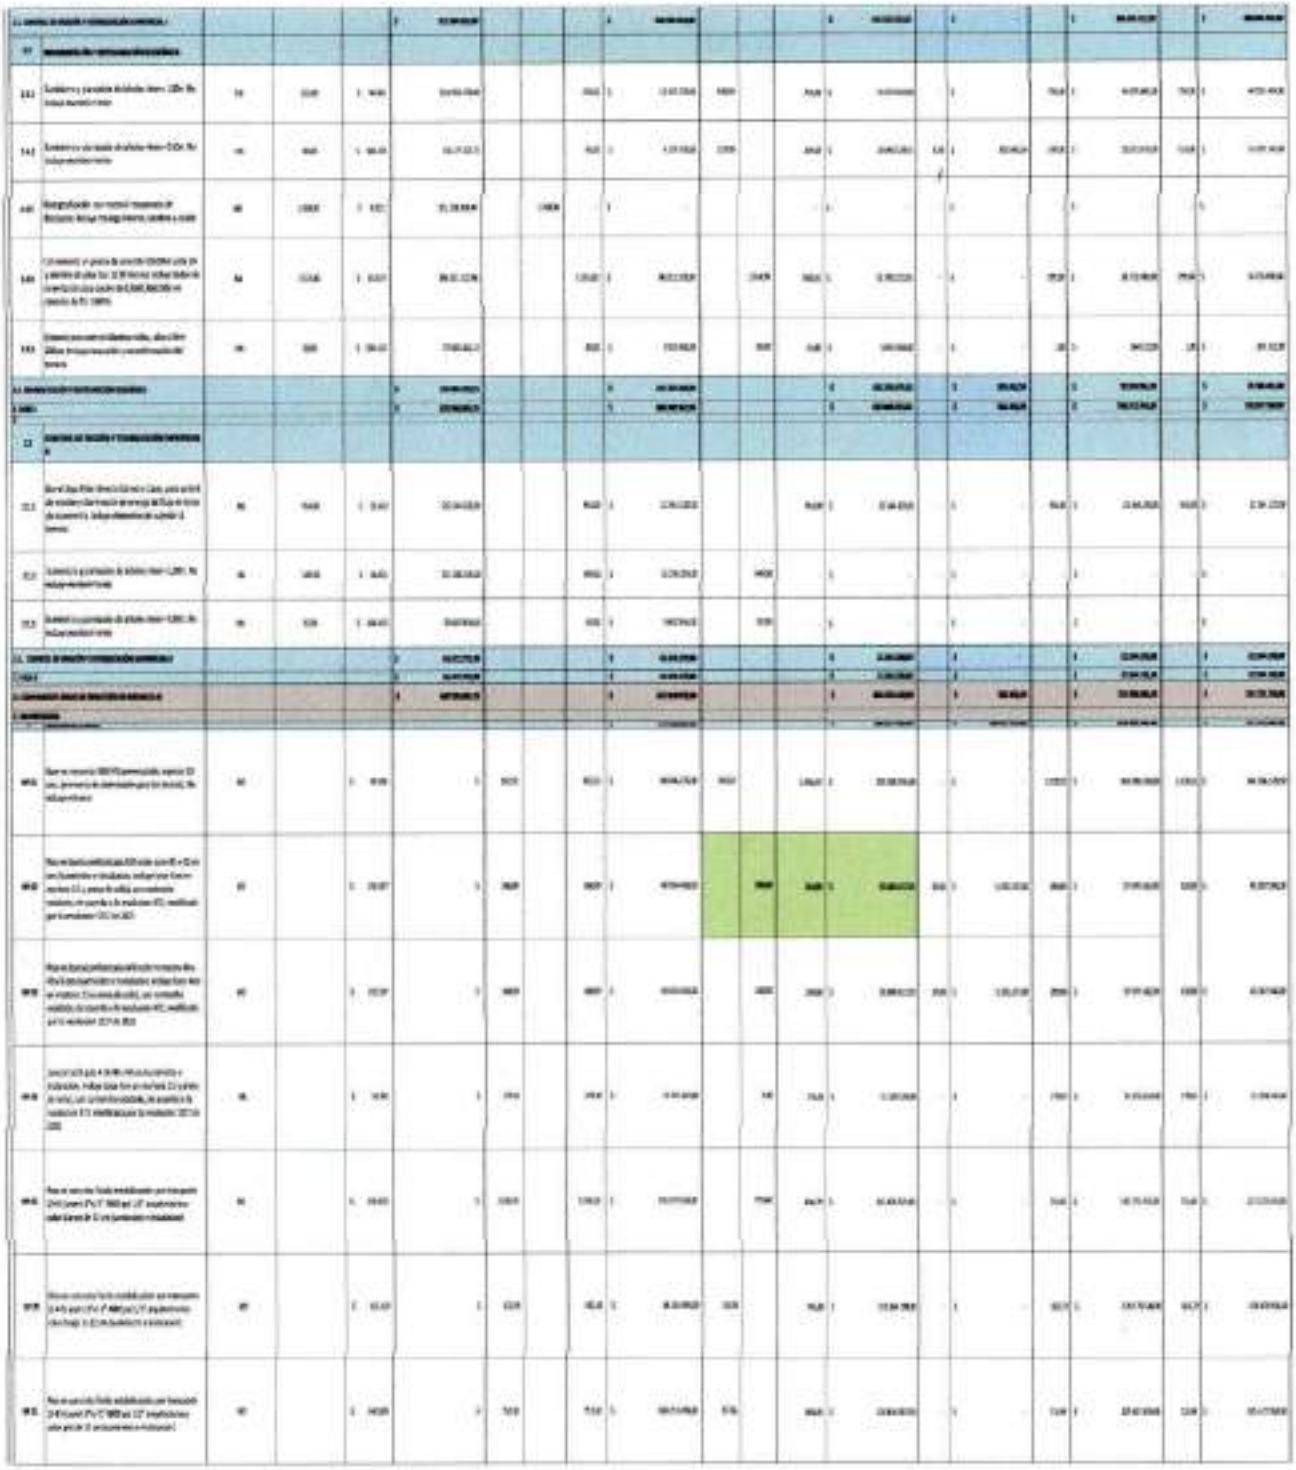

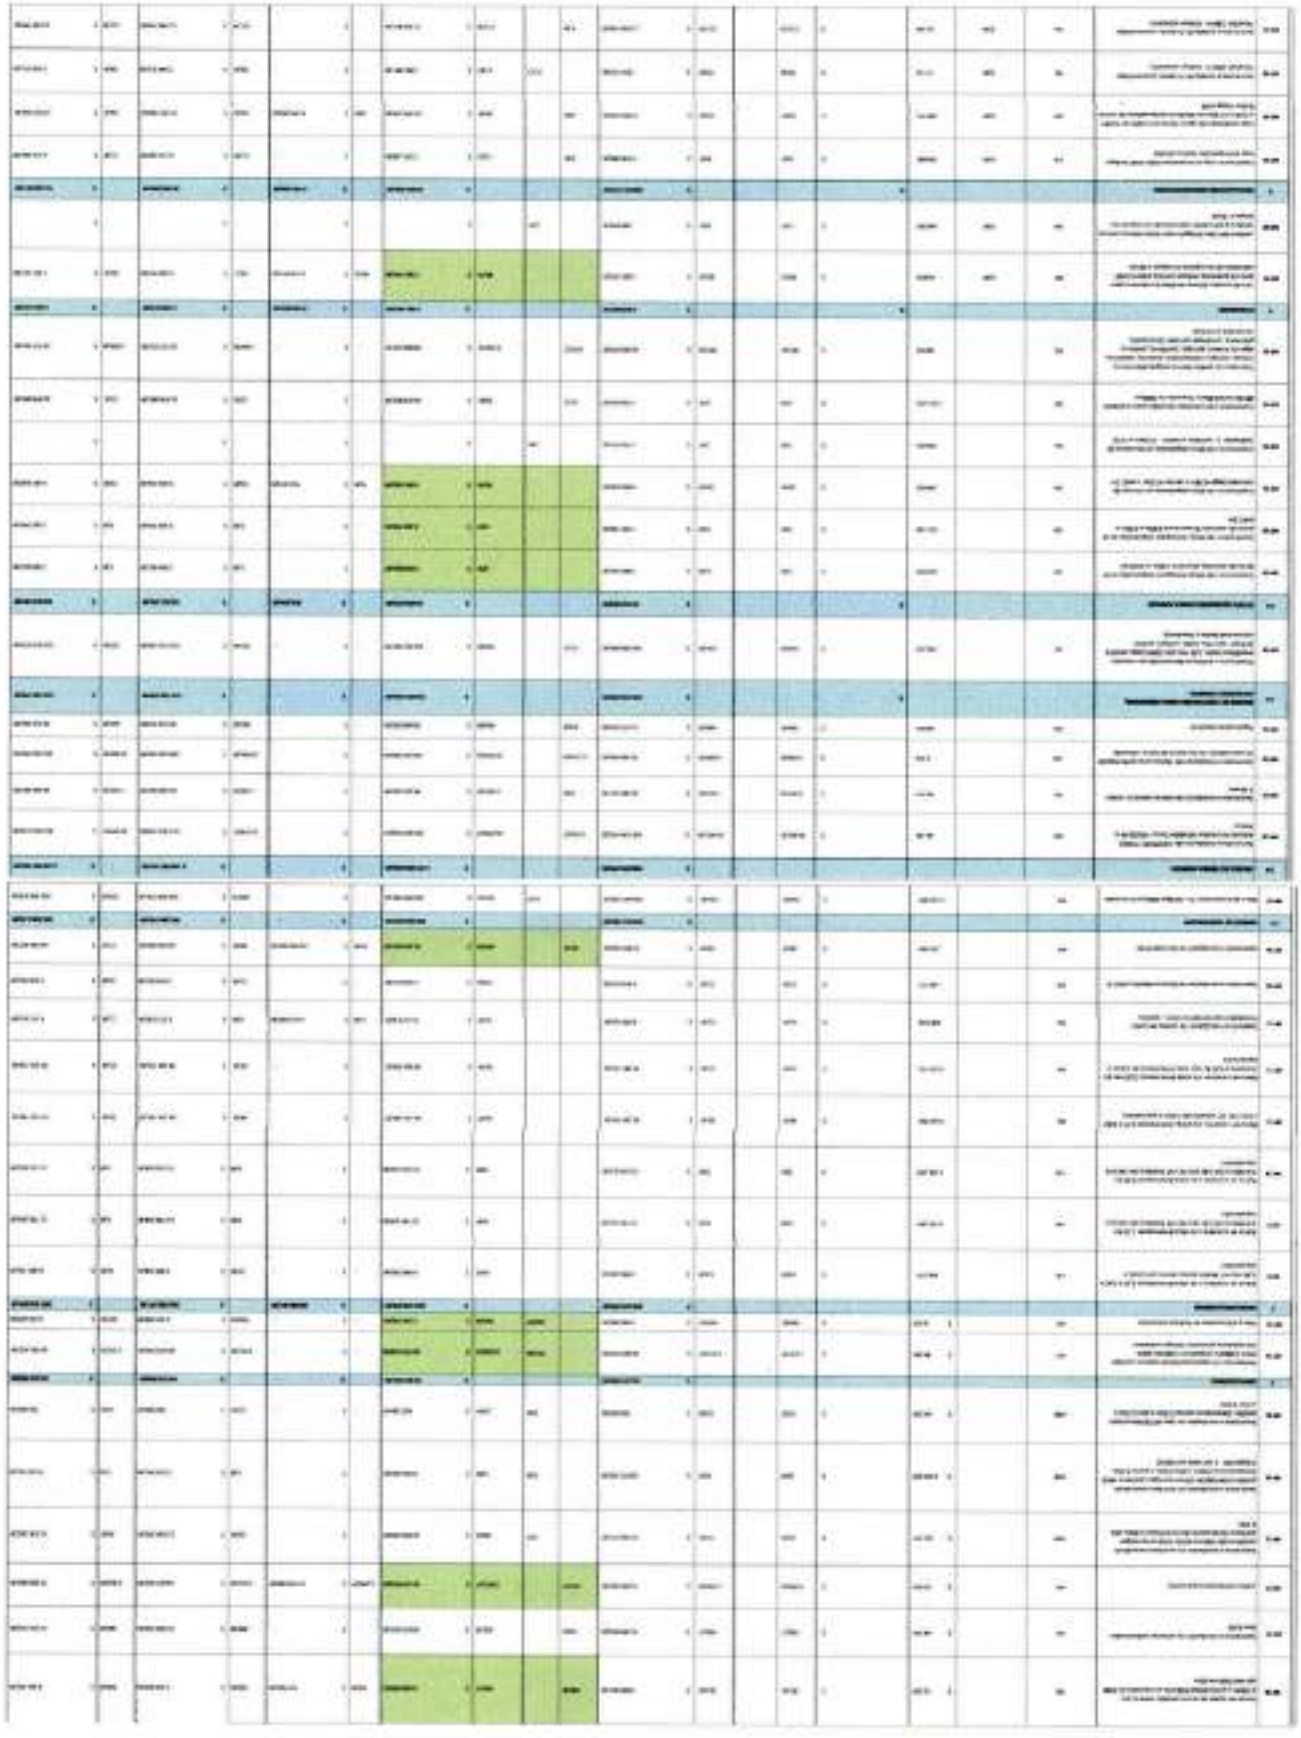

18719

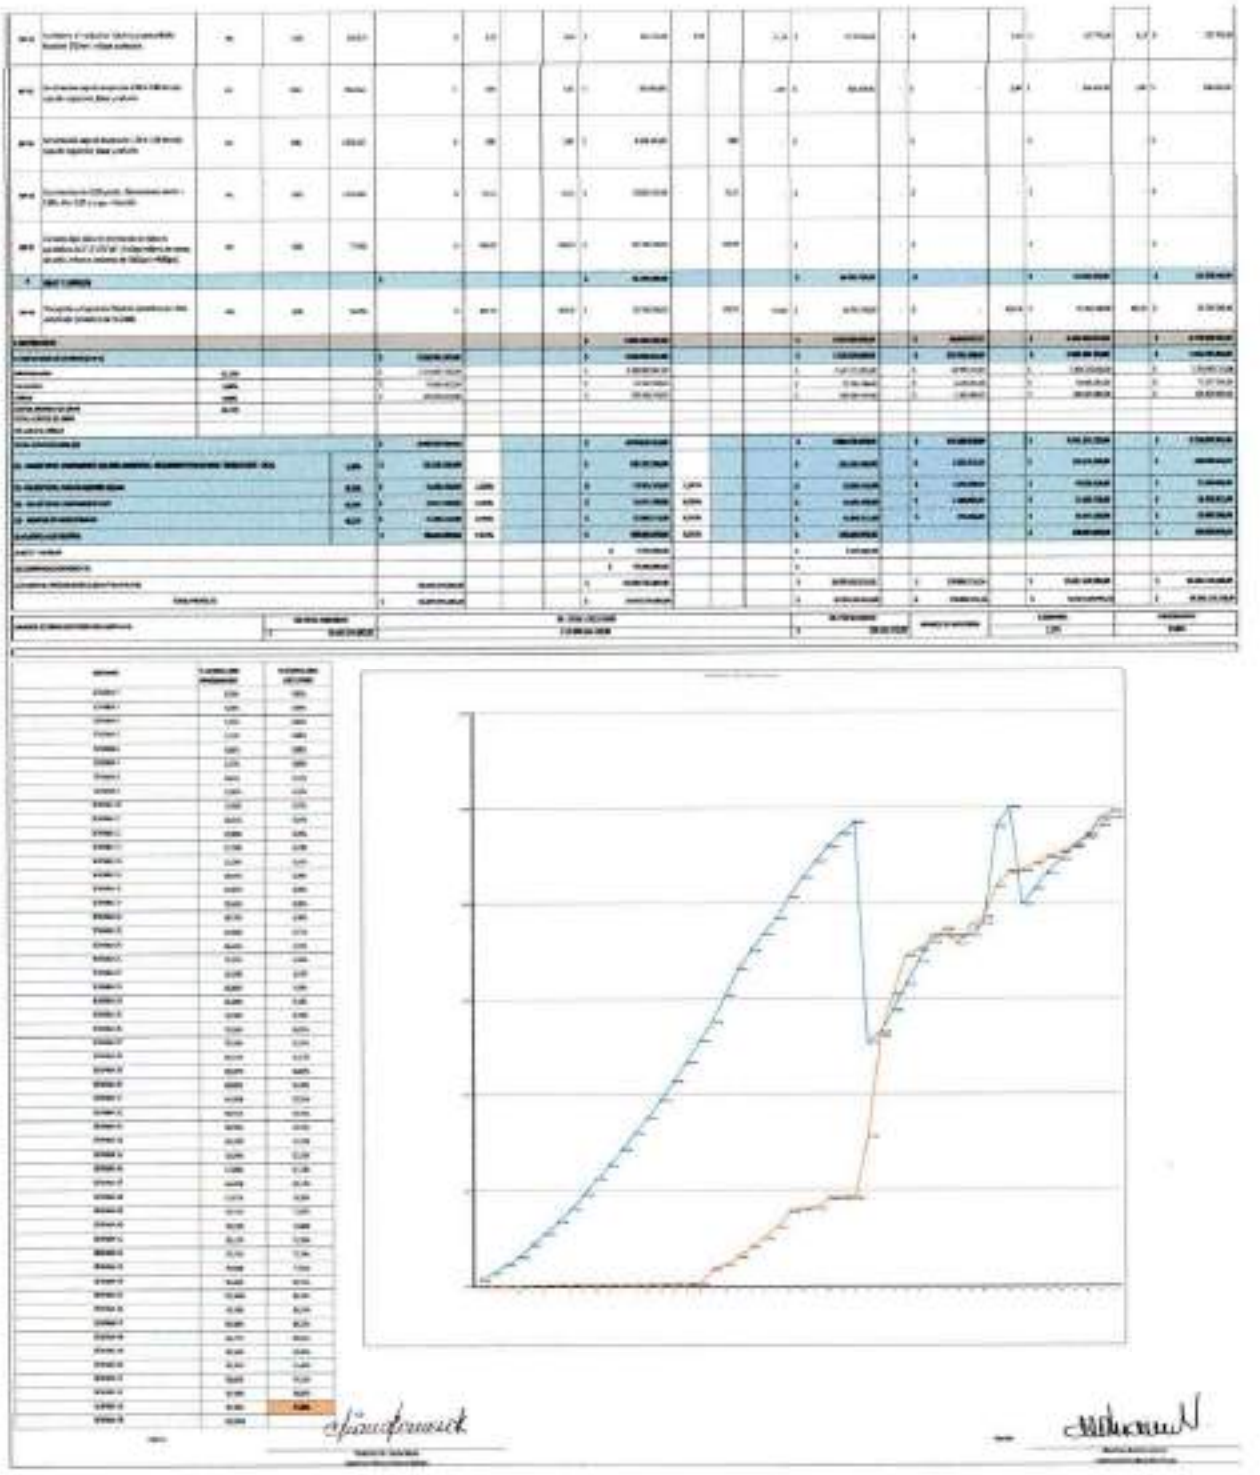

1738

18720

1739

| | |
|---|---|
| Entrega de muestras de la obra en la casa de grandes y cerezos:<br>Levantamiento de actas de vecindad de cierre. A partir de los días 27, 28 y 29 de noviembre de obra procedimos a dar inicio al levantamiento de actas de vecindad de cierre, registrando a la fecha un total de 5 actas de vecindad registradas. Ver Registro fotográfico de acuerdo adjuntos.<br>Ejecutado en menos tiempo para de operación de actas de vecindad de cierre. | Con vecindad, cuenta actualizados en fin de realizar el proceso hasta aprobación de finalización por parte del contratista de obra 6/08/2024 |
| Entrega de participantes a talleres realizados: Para el periodo comprendido entre el 21 al 29 de febrero de 2024 se reportan lo siguiente:<br>1. Personal de voluntarios:<br>El día 29 de febrero de 2024, en cumplimiento de actividades del plan de gestión social del proyecto, se llevó a cabo la actividad de cierre de actas de vecindad, con este, cumplimos con el objetivo de: 1) puntos cardinales de información de inicio de actividades de cierre de actas de vecindad, 2) se han realizado 5 encuestas de satisfacción a la comunidad del sector, identificando que la comunidad se encuentra conforme con la ejecución del proyecto, por los beneficios que este trae como lo es el mejoramiento del tránsito. Ver anexo lista de recorrido actores / Ver registro fotográfico.<br>2. Aplicación de encuesta de satisfacción (3 días 28 de febrero del 2024), el participativo en dos puntos con el cumplimiento de objetivos de cierre, aplicamos: (3) encuestas de satisfacción a habitantes de la comunidad durante el recorrido, actores, donde nos evidencia que la comunidad manifiesta que el proyecto tendrá beneficios al sector como el mejoramiento del tránsito y con ello la activación económica. Ver anexo encuesta aplicada / Ver registro fotográfico | N/A |
| Reuniones socializadoras en obra:<br>•El día 21 de febrero de 2024, el contratista de obra realizó reunión extraordinaria de gestión social la cual contó con la participación del Alcalde y la supervisión social de la entidad (DAGRI, Jair Rubio, ingeniera supervisora de Transversalidad, Biblioteca Virtuales y de profesional social del Concesionario ANAI, en donde se evidenciaron temas generados para la inauguración de la obra, se congeneró como fecha tentativa el día 15 de marzo de 2024, y se dejó como compromiso realizar un listado de stakeholders y requerimientos solicitados por los participantes en la actividad, con el fin de conseguir recursos conjuntamente con las entidades presentes, además se programó reunión para el día jueves 07 a las 2 pm, con el fin de concertar temas referentes a la inauguración con la participación del alcalde, la supervisión DAGRI, Rubio, Biblioteca Virtuales, profesional social contratista de obra e integrantes de las actividades que tienen a participar en la inauguración. Ver acta de reunión y registro fotográfico.<br>•El día 29 de febrero, el contratista de obra, realizo las figuras institucional con material reciclable (Botella / Botella) fabricadas demostrativas documentos sobre el cuidado ambiental y realizando por el artista local. Ver Registro fotográfico<br>Programa de capacitación a empleados de obra: El día 28 de febrero de 2024, el contratista de obra efectuó la última capacitación a empleados de obra, sobre igualdad de Género en el territorio nacional, la cual contó con la participación de 20 personas, y se encuentra a satisfacción. ver Acta de capacitación y registro de asistencia/ ver registro fotográfico | N/A |
| Entrega de gestión social: Para el periodo comprendido entre el 21 al 29 de febrero de 2024 se reporta lo siguiente:<br>Programa de vinculación MIGRC: El contratista de obra reporta que no cuenta actualmente con personal de 21 trabajadores en obra, de los cuales 21 son considerados Mano de Obra no calificada, y 0 trabajadores con residencia del sector Ciudad Bolívar y cuentan con la certificación de residencia, por lo cual cumplimiento de obra se encuentra dando cumplimiento con un 0,0% de vinculación del 10% requerido. | No se tiene programada actividades |

## 7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPRENDIDA POR ACTIVIDADES

| RELACIONE | PENDIENTES |
|---|---|
| Se aplica el PMA de octubre 19 de 2023, se efectúa seguimiento que este de la intervención a | |

## 8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA TERCERA COMPRENDIDA POR OBRAS ARQUITECTONICAS

| RELACIONE | PENDIENTES |
|---|---|
| Durante el periodo comprendido entre el 26 al 29 de febrero de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades de obra: | |
| *Cerramiento con polisombra a todo la peligrosa del proyecto. *Continua la actividad de pintura con blanco en las fachadas exteriores que colindan con el proyecto. *Se termina de realizar retiro concreto limpieza a la base de la cerca de la casa en tierra apisonada. *Ubicación y Nivelación definitiva de los planchones en las gaviones y parte de la cabeza hasta llegar a la quebrada Limas. *Reposición del individuo arbóreo en la parte baja de la cabeza cerca a la quebrada Limas. *Nivelación de andenes, jardineras y plazoletas. *Cerrera y recubierto planchón y andenes urbanos. *Instalación del Cable de aluminio 1/0 AWG aislado, tranzado, instalado en el fibra de aluminio especifica para cerco eléctrico Cable CS 1/0, medidor electrónico. Cubierta 1 1/2 SRC bajante cuadrado y rectangulares en la cerca eléctrica. *Certificación de cerco en formato cerrero, Revisa con material de obra, cerramiento manual y cerrero. *Cerramiento en postes de concreto 1.6x0.8cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hilerras) en la parte sur, norte y oriente de la cabeza cerca a la quebrada Limas. *Construcción e instalación cubierta para cerco en madera rústica. *Cambio en el cubierta con cerro de pellizcos las dilataciones planchón Limas cubierta en el sector de los comedores. *Traslado de agua suministrado 2500 (m) mediante un carro. *Aplicación sello en la junta constructiva en las dilataciones de los planchones de cubierta, Mortero Mastiff gris y cubrefugas. * Ahondar dilataciones juntas constructivas en el muro de contención, colocación protección y cubierta con Cubiertas. *Se continua actividad instalación cubiertas. *Se termina de instalar las baldosas metálicas RDS 6. *Se continuan hasta terminar el cerramiento y pintura con las barandas en las rampas sur, norte, nuevo pasadizo y finalizamos el parque Mirador. *Detallando y terminando el muro de contención con pintura color gris bacalao. *Terminando y detallando las pinchazos. *Demolición y detalle de las canaletas, Lilia, nuevas fotografiadas y restregamos). *Construcción cuja inspección (ESPECIFICACIÓN con acabado monolítico). *Retiro de material y productos de las excavaciones, almacenamiento. *Acompañamiento con el certificador RETIE y RETILAP. *Aseo y limpieza general. *Detallado y terminado en andenes con diferentes en proyecto. *Se efectuó el planta de mobiliario urbano en el mes Valmuestrario. *Se realizo de manera conjunta inspección del alcalde mediante un acta de inicio de la obra. | |
| Durante el periodo no se efectuaron pruebas | |
| Material suministrado: Concreto 3000 PSI premezclado, madera rústica para las estanterías, cuero, pintura color blanco, abrasivos y herramientas diversas. | |
| NO se efectuó control técnico | |
| Equipo disponible en obra: 4 (1) Equipo de topografía, una (1) motocargador 950GX, una (1) mezcladora de concreto, un (1) vibrador de concreto, una (1) mezcladora, una (1) compresa de ambulancia, una (1) Generadora de pavimento, una (1) martillo demoledor, un (1) Andamio manual, una (1) Camión Grúa, un (1) equipo soldadura MIG/FLU, una (1) plataforma de elevación canasta tijera JLG 3246ES, una (1) compresor, una (1) pistola metálica de cargo clavo, (2) cubertos eléctricos, una (1) Motobombeadora, pulidoras, cortadoras de andamio, bancos pequeños, varios | |
| Estado del tiempo durante la semana del 26 al 29 de febrero:<br>Lunes 26 febrero: De 1:00 AM a 5:00 PM lluvia ligera<br>Martes 27 de febrero: De 1:00 AM a 5:00 PM lluvia ligera<br>Miércoles 28 de febrero: De 1:00 AM a 5:00 PM lluvia ligera<br>Jueves 29 de febrero: De 1:00 AM a 5:00 PM lluvia ligera | |
| A la fecha no presenta una ejecución acumulada de 91,69% , contra ejecución programada de 91,91% | |

## 10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El Contratista tiene las vecinos permanente para poderse dirigir en la ejecución de la obra, ya que presenta un cronograma CRONOGRAMA 91,91% |
| El contratista debe efectuar siguiente para terminar actividades antes de la programada, de tal forma que no se acumulen actividades del final de la obra, como son las actividades contribución RETIE - RETILAP, actas de cierre de vecindad y gestionar de realizar las reubicadas urbanas por parte del Jardín Botánico |
| Al territorial la jornada verifica realizada por cierre esta el acceso a la obra por las calles residenciales a los predios. Por lo que recomendamos cerrar algunos minutos antes realizar un aseo general y retiro de herramientas menor en las áreas intervenidas. |

18721

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| 29 | 2 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AÑO |

SEMANA N° 54 DEL 25 / 2 / 2024 (DD / MM / AÑO) AL 29 / 2 / 2024 (DD / MM / AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO VAPA | CONTRATO No.: | FONDIGER 002 2023 |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: | MAPO INGENIERIA SAS | CONTRATO No.: | FONDIGER 008 2023 |

**VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO POR COMPONENTES**

**COMPONENTE OBRA**



Panorámico Obra



Cerramiento con polisombra a toda la poligonal del proyecto



Cerramiento con polisombra a toda la poligonal del proyecto



Continua la actividad de pintura color blanco en las fachadas existentes que colindan con el proyecto



Continua la actividad de pintura color blanco en las fachadas existentes que colindan con el proyecto



Actividad de pintura color blanco en la fachada existente de la vivienda que fue afectada por el vecino que fue construyendo en el proceso constructivo de la obra



Producto terminado en la fachada sobre la calle 71 g Sur



Se termina de colocar el concreto limpieza a lo largo de la corona del muro en tierra armada



Riego y humectación siembra de las plantulas en las jardineras



Riego y humectación siembra de las plántulas en las jardineras



Riego y humectación a los individuos arbóreos



Riego y humectación a los individuos arbóreos

1740



Riego y humectación a los individuos arbóreos



Reposición de individuos arbóreos en la parte baja de la ladera cerca a la quebrada Limas



Suministro de individuos arbóreos



Suministro de plántulas



Corteo y recibiendo plántulas



Instalación del Cable de aluminio 1/0 AWG aislado



Instalación de la barrajes en la red eléctrica



Instalación del triturado en el filtro de acuerdo a especificaciones tènicas Cajas CS-274 red eléctrica se observa la Varilla cobre 2,40m (5/8")



Instalación de la acometida de la red eléctrica



Instalación del capacete



Instalación medidor electronico



Medidor Electrónico



Instalación tubería 1 1/2 IMC bajante acometida a la red eléctica del proyecto



Juego de empalmes



Instalación de empalmes en la red eléctrica

18722



Instalación de empalmes en la red eléctrica



Panorámico postes y luminarias



Panorámico postes y luminarias



Conformación de muro en Geocontainer; lleno con material de sitio, compactación manual y cierre



Conformación de muro en Geocontainer; lleno con material de sitio, compactación manual y cierre



Conformación de muro en Geocontainer; lleno con material de sitio, compactación manual y cierre



Conformación de muro en Geocontainer; lleno con material de sitio, compactación manual y cierre



Conformación de muro en Geocontainer; lleno con material de sitio, compactación manual y cierre



Cerramiento en postes de concreto 10x10cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hileras) en la parte sur y baja de la ladera cerca a la quebrada Limas



Cerramiento en postes de concreto 10x10cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hileras) en la parte baja de la ladera cerca a la quebrada Limas



Cerramiento en postes de concreto 10x10cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hileras) en la parte baja de la ladera cerca a la quebrada Limas



Cerramiento en postes de concreto 10x10cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hileras) en la parte baja de la ladera cerca a la quebrada Limas



Cerramiento en postes de concreto 10x10cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hileras) en la parte baja de la ladera cerca a la quebrada Limas



Cerramiento en postes de concreto 10x10cm cada 2m y alambre de púas Cal. 12 (8 hileras) en la ladera norte



Construcción estancia para aves en madera rolliza



Construcción estancia para aves en madera rolliza



Construcción estancia para aves en madera rolliza



Excavación cimentación bases



Construcción e instalación estancia para aves en madera rolliza



Construcción e instalación estancia para aves en madera rolliza



Construcción e instalación estancia para aves en madera rolliza



Cimentación base en concreto



Estancia para aves



Estancia para aves



Continua el sellado con arena de pella en las dilataciones pisos loseta colores en el sector de los comedores



Franja de ajuste concreto 2500 psi mezclado en sitio



Franja de ajuste concreto 2500 psi mezclado en sitio



Franja de ajuste concreto 2500 psi mezclado en sitio



Aplicación sello en la junta constructiva en las dilataciones de los pisos concreto de colores, losetas táctil guía y cañuelas



Aplicación sello en la junta constructiva en las dilataciones de los pisos concreto de colores, losetas táctil guía y cañuelas

18723



Definiendo dilataciones juntas constructivas en el muro de contención



Colocación yumbolon



Sellado junta con Vulkem



Se continua actividad remates en Pañete



Se termina de instalar los bolardos metálicos MIS-A



Se termina de instalar los bolardos metálicos MIS-A



Continua montaje barandas en la rampa norte; soldadura en los empalmes de parales y tubería



Continua montaje barandas en la rampa norte; soldadura en los empalmes de parales y tubería



Aplicacipon de la pintura en la baranda rampa sur



Continua montaje barandas en el muro paralelo; soldadura en los empalmes de parales y tubería



Continua montaje barandas en el lindero del proyecto y parque mirador



Se suspende baranda existente dando continuidad a los andenes



Baranda Muro Paralelo



Platinas, parales; tornillería



Baranda Rampa Sur

1742



Baranda Sur para dar continuidad hacia el muro de contención



Baranda Lindero con el parque Mirador



Baranda Lindero con el parque Mirador



Detallando y terminado al muro de contención



Detallando y terminado al muro de contención



Terminado Muro de Contención se aplica color gris basalto



Terminado Muro de Contención se aplica color gris basalto



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras



Terminado y detallado en las jardineras

18724



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Detalles en los comedores



Mesas hexagonal empotradas en el muro de concreto



Mesa rectangular empotradas en el muro de concreto



Sillas empotradas en el muro de concreto



Mesas empotradas en el muro y sillas



Construcción caja inspección 80*80 KO+304 costado nororiental



Retiro de material producto de las excavaciones, demoliciones

1743



Acompañamiento con el certificador RETIE y RETILAP



Inspección RETIE



Inspección RETIE



Inspección RETILAC en la horas de la noche



Inspección RETILAC en la horas de la noche



Aseo y limpieza general



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyecto



Detallado y terminado en senderos colindantes al proyectoDetalle en senderos



Detalle escalón ingreso vivienda



Detalle escalón ingresa vivienda



verificación medidas



verificación medidas



verificación medidas



verificación medidas



verificación medidas



verificación medidas



Se efectua la prueba de estanqueidad en la red hidrosanitaria



Se efectua la prueba de estanqueidad en la red hidrosanitaria



Se efectua la prueba de estanqueidad en la red hidrosanitaria



Se efectua la prueba de estanqueidad en la red hidrosanitaria



Se realiza de manera conjunta inspeccion detallado verificando estado final de las obras

**COMPONENTE AMBIENTAL SST**



Inspección en la demarcación y cerramiento de obra, se observa la valla instalada así como el sumidero ubicado en la zona sur (junto a la estación del transmicable).



El sumidero ubicado en la zona sur del proyecto se encuentra correctamente protegido.



La comunidad ha arrojado escombros en la zona sur de la obra, lo cual afecta la imagen y el paisajismo.



Vista panorámica de la valla instalada en el proyecto el día 29 feb./24.



La interventoría realizó el seguimiento en la siembra de los individuos arbóreos, sembrados en la zona del muro y cable, se observan residuos arrojados por personas externas a la obra, el día 29 feb./24.



Se observa buen estado fitosanitario de los individuos arbóreos sembrados en la zona muro y zona cable del proyecto Ilimani, el día 29 feb./24.



Se evidenció buen uso de la dotación y elementos de protección personal EPP de los trabajadores, el día 29 feb./24.



Se solicita al contratista realizar una jornada de orden y aseo en la zona del cable, ya que se observan algunos residuos RCD.



Vista panorámica del mirador Ilimani, se observan las canecas instaladas para el almacenamiento de residuos sólidos urbanos.

18726



La interventoría realizó la supervisión de la siembra y crecimiento de las plántulas instaladas en las jardineras, las cuales se observaron en buen estado fitosanitario.



Se observan las margaritas en buen estado fitosanitario, el contratista ha realizado riego diario en las plántulas sembradas.



La interventoría realizó la verificación del estado de las plántulas sembradas en las jardineras, en la semana del 26 a 29 de febrero de 2024.



En la fotografía se observa adecuado cerramiento en una de las calles de acceso a la obra. La comunidad pasa por cualquier espacio posible hacia la zona de obra.



Se solicita al contratista realizar la recolección final de los materiales de construcción tales como arena y triturado así como los RCD.



Panorámica de los comedores instalador por parte del consorcio VIAPA en el proyecto Ilmani, en la semana del 26 a 29 de febrero de 2024.



Planta eléctrica utilizada en las actividades de reparación de muro, jardineras y comedores.



Verificación del uso de pulidora marca Dewalt en la reparación y pulida de los comedores del proyecto Ilmani. El contratista realiza las inspecciones preoperacionales de herramientas y equipos.



En la fotografía se observa adecuado cerramiento en una de las calles de acceso a la obra. Lo anterior para evitar que personal ajeno al proyecto ingrese a la obra.



Se resalta de manera positiva la protección que realiza el contratista en las canales de aguas lluvias instaladas y construidas en el proyecto.



Se recomienda retirar la cinta de señalización que no se esté utilizando como la observada en la imagen.



Vista de la siembra de individuos arbóreos en la zona del muro. Se observan algunos RCD en la zona baja que pueden afectar el crecimiento de los individuos arbóreos.



Vista de las estancias para aves instalados en la zona del muro, la cual servirá como sitio de descanso y similares para la avifauna presente.



Siembra de la especie Calamagrostis en zonas verdes al interior del proyecto Ilmani.



Se solicita al contratista realizar la recolección de los materiales de construcción aún presentes en los boca calles del proyecto.

1745



En la imagen se observo el acopio de arena en la zona norte de la obra, se recomienda realizar su recolección y barrido de vía.



Se evidenció el riego de las plántulas sembradas en las jardineras por parte del personal del contratista.



Actividades de lavado y limpieza de unidades sanitarias portátiles.



Se solicita al contratista realizar la entrega de los sumideros en iguales o mejores condiciones a las iniciales.



Se solicita al contratista realizar la entrega de los sumideros en iguales o mejores condiciones a las iniciales.



Se solicita al contratista realizar la entrega de los sumideros en iguales o mejores condiciones a las iniciales.



Se solicita al contratista realizar la entrega de los sumideros en iguales o mejores condiciones a las iniciales.



Se solicita al contratista realizar la recolección y barrido de los materiales de obra ubicados en las boca calles.



La interventoría generó el acompañamiento en las actividades de pintura sobre muro.



Se recomienda al contratista realizar la entrega de las recomendaciones necesarias para mantener los individuos arboreos y plántulas sembradas en jardineras.



Vista de las pergolas y plantulas sembradas en jardineras, el día 28 feb./24.



Instalación de sistemas para evitar que ingresen vehículos al sendero y mirador construido por parte del contratista.

18927



Siembra y resiembra de los individuos arboreos de las siguientes especies. Ciro (Baccharis bogotensis), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Tinto (Solanum spp.) y Arrayan (Myrcianthes leucoxyla) en la zona quebrada.



Siembra y resiembra de los individuos arboreos de las siguientes especies. Ciro (Baccharis bogotensis), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Tinto (Solanum spp.) y Arrayan (Myrcianthes leucoxyla) en la zona quebrada.



Siembra y resiembra de los individuos arboreos de las siguientes especies. Ciro (Baccharis bogotensis), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Tinto (Solanum spp.) y Arrayan (Myrcianthes leucoxyla) en la zona quebrada.

**COMPONENTE SOCIAL**



Valla informativa de Obra



Pendón externo de PAC



Cartelera informativa de PAC



Recorrido Urbano verificación de Punto Satélite de Panadería



Recorrido Urbano. Verificación de Punto Satélite de información del Salón Comunal del Mirador



Recorrido Urbano. Verificación de Punto Satélite de información depósito de pupa



Aplicación de encuestas de satisfacción 28/02/2024



Aplicación de encuestas de satisfacción 28/02/2024



Aplicación de encuestas de satisfacción 28/02/2024



Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad 26 y 27 de febrero de 2024



Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad 26 y 27 de febrero de 2024



Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad 26 y 27 de febrero de 2024

1746

| | | |
|---|---|---|
|  Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad 26 y 27 de febrero de 2024 |  Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad 26 y 27 de febrero de 2024 |  Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad 26 y 27 de febrero de 2024 |
|  Inicio de cierre de actas de vecindad |  Inicio de cierre de actas de vecindad |  Inicio de cierre de actas de vecindad |
|  Inicio de cierre de actas de vecindad |  Inicio de cierre de actas de vecindad |  Inicio de cierre de actas de vecindad |
|  Cierre de PQRS N°8 por afectación en anden 29/02/2024 |  Cierre de PQRS N°8 por afectación en anden 29/02/2024 |  Cierre de PQRS N°8 por afectación en anden 29/02/2024 |



Cierre de PQRS N°3 por pintura y pañete de muro 28/02/24



Cierre de PQRS N°3 por pintura y pañete de muro 28/02/24



Cierre de PQRS N°3 por pintura y pañete de muro 28/02/24



Reunión de gestión social para inauguración de obra 29/02/24



Reunión de gestión social para inauguración de obra 29/02/24




29-feb-24









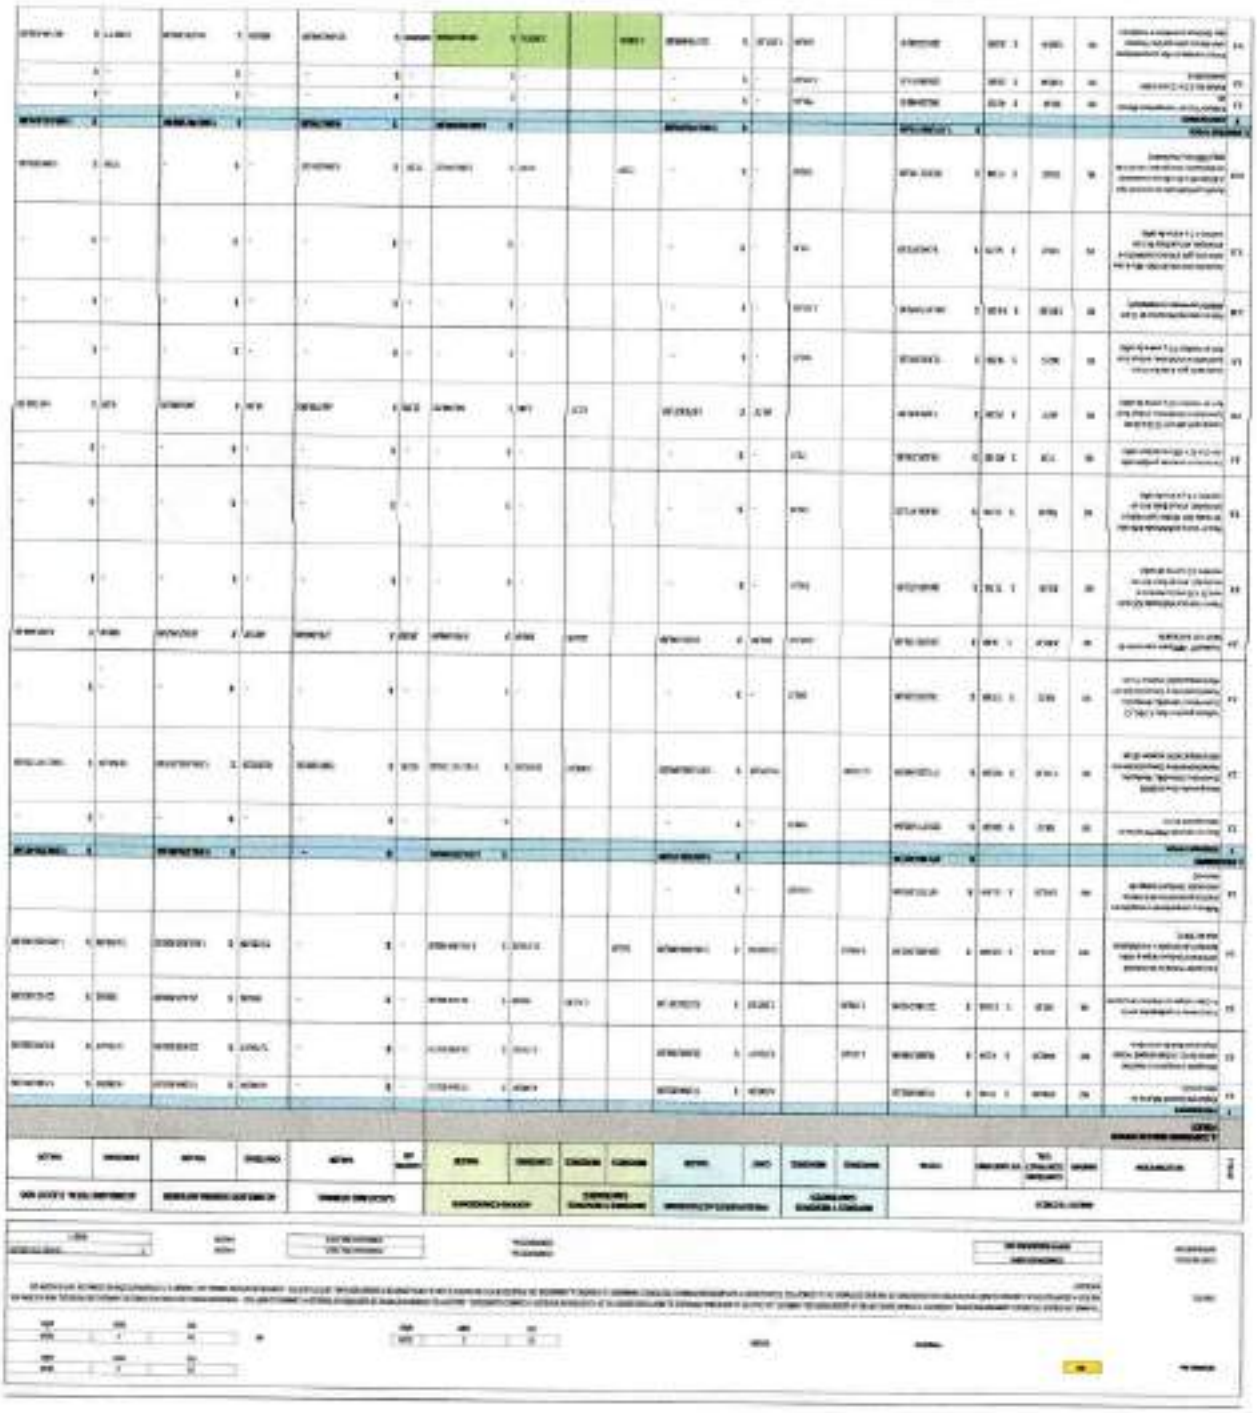



18729

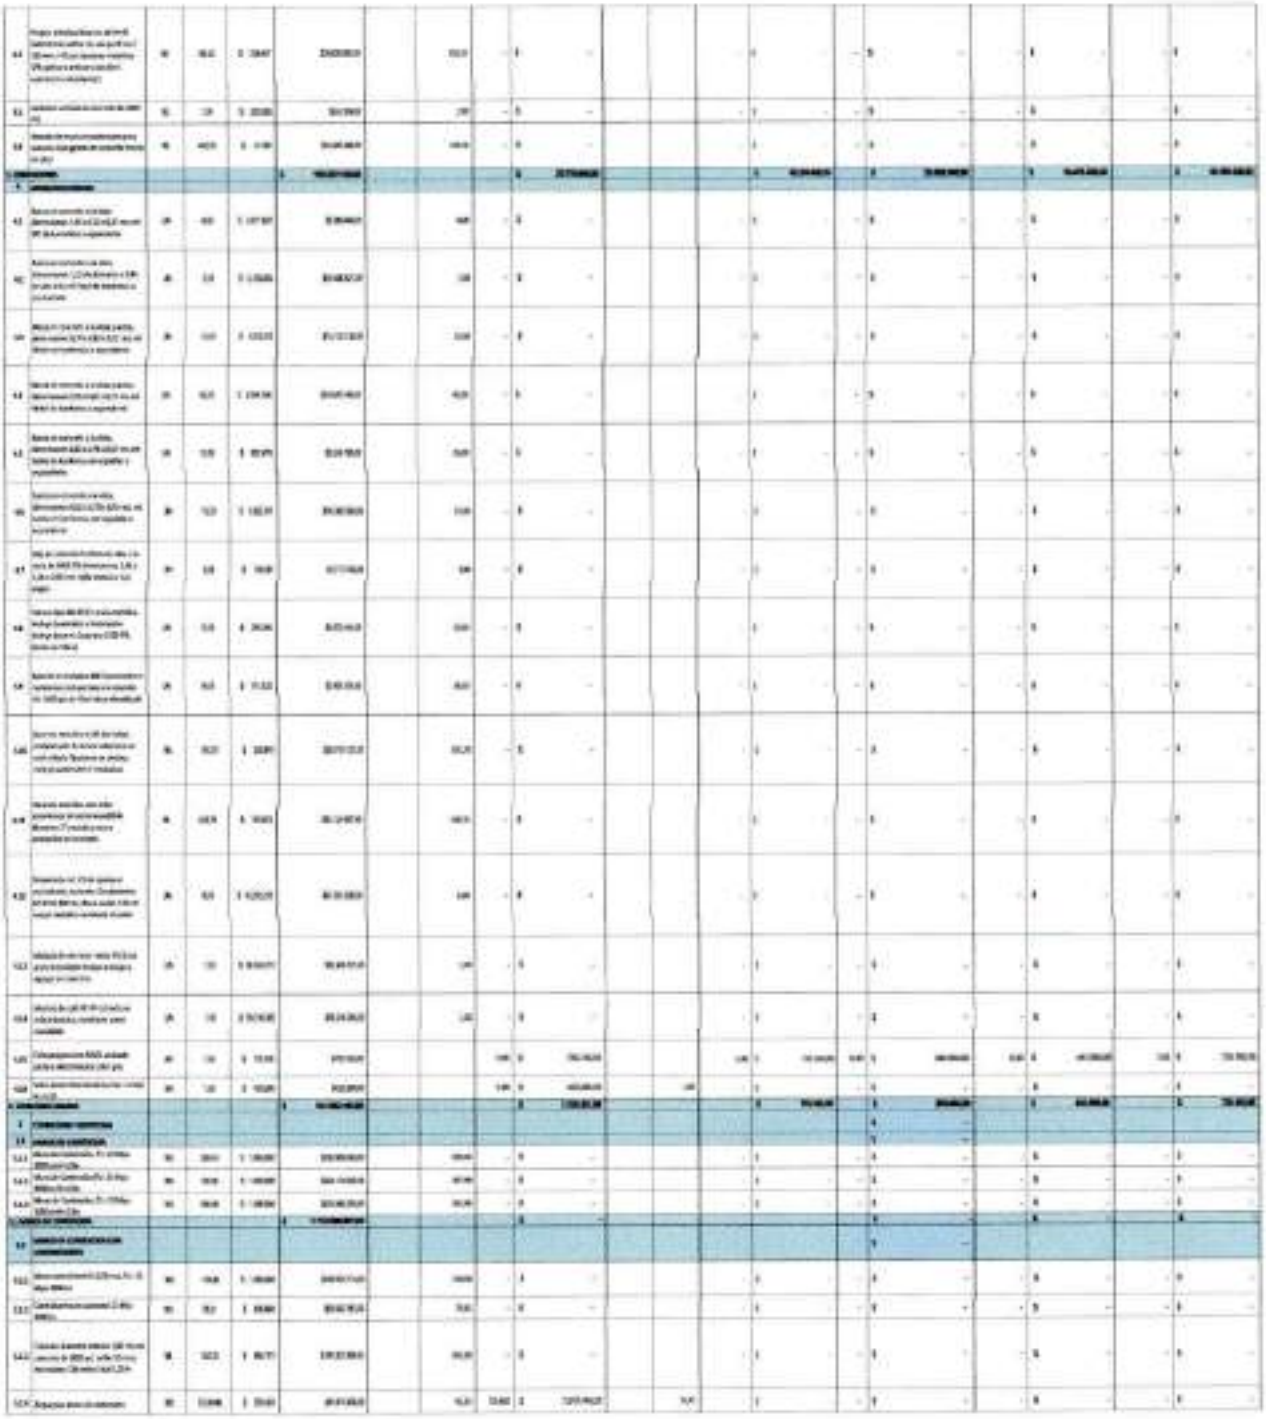


1748

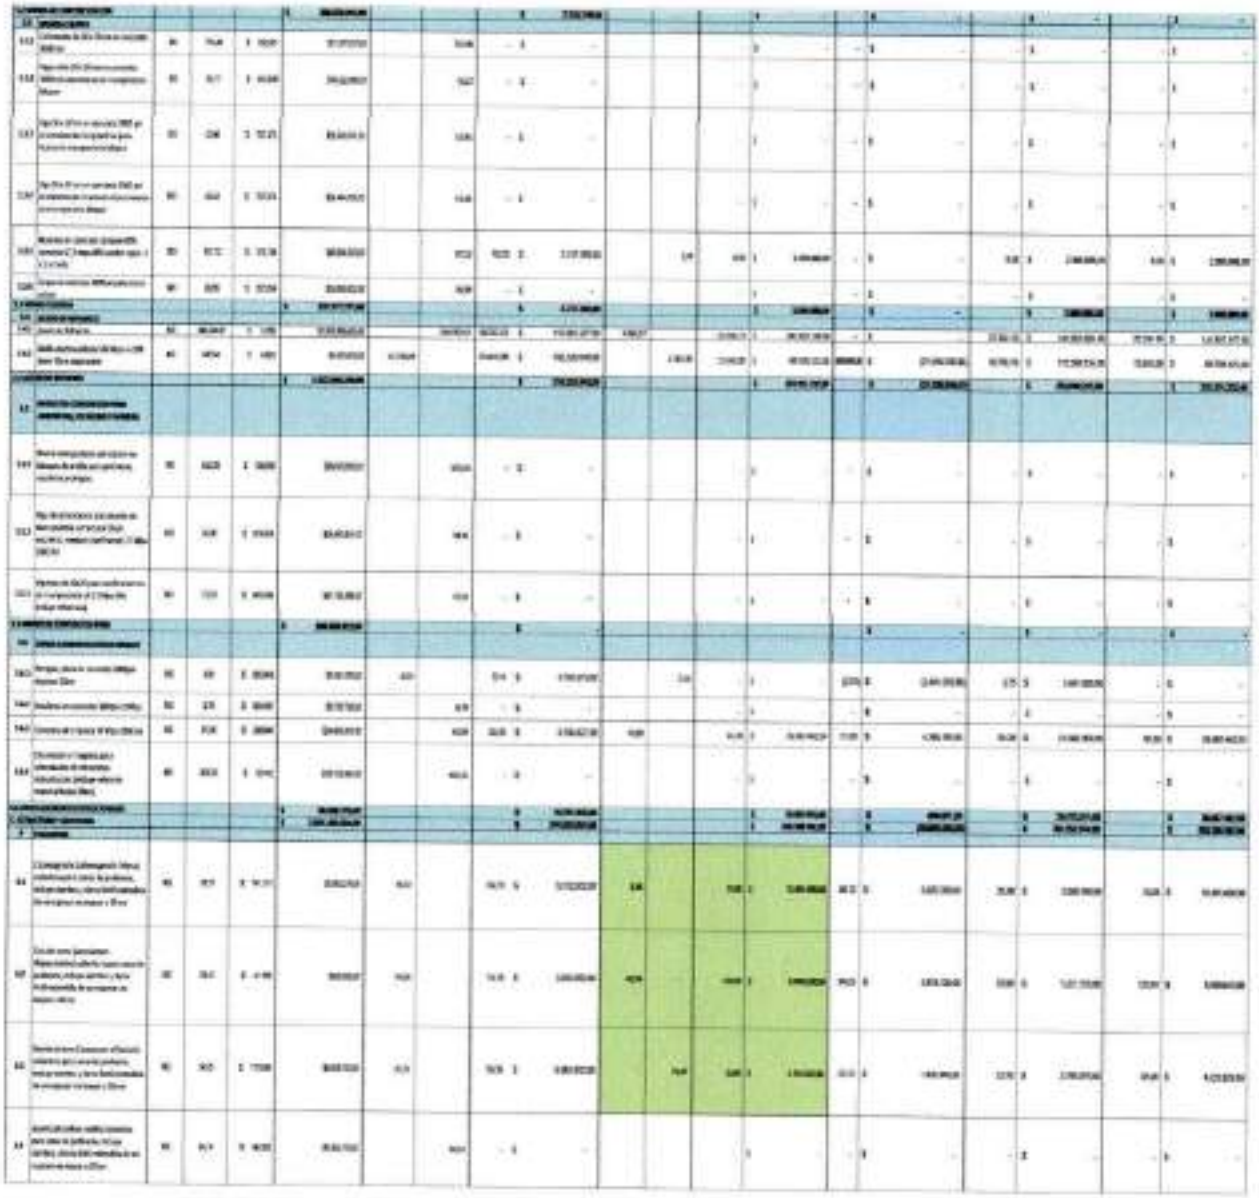


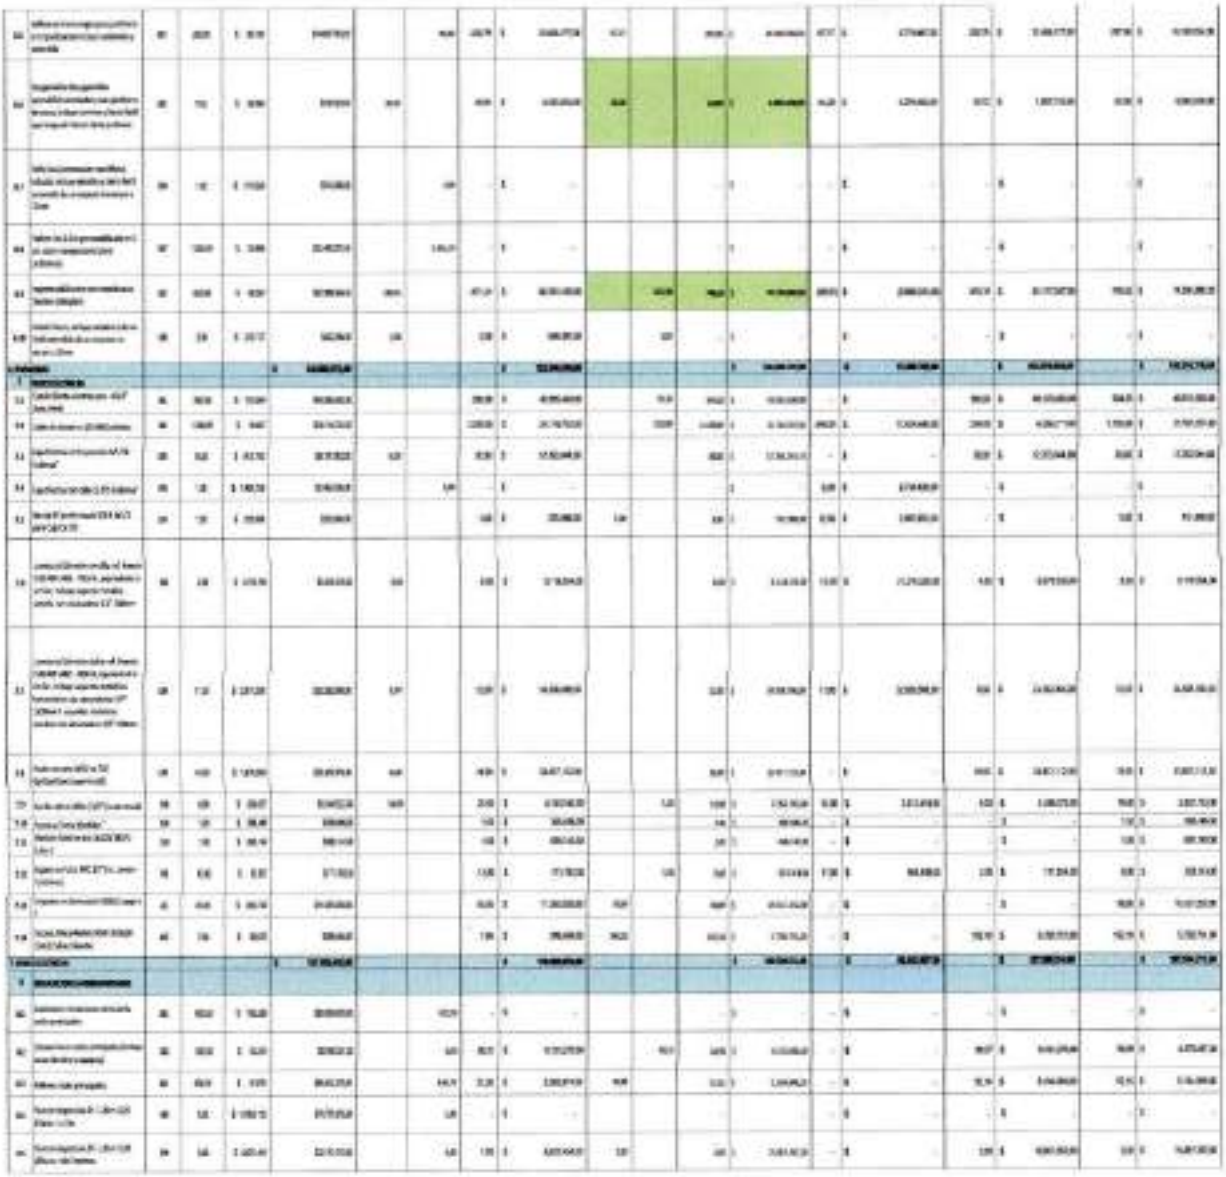


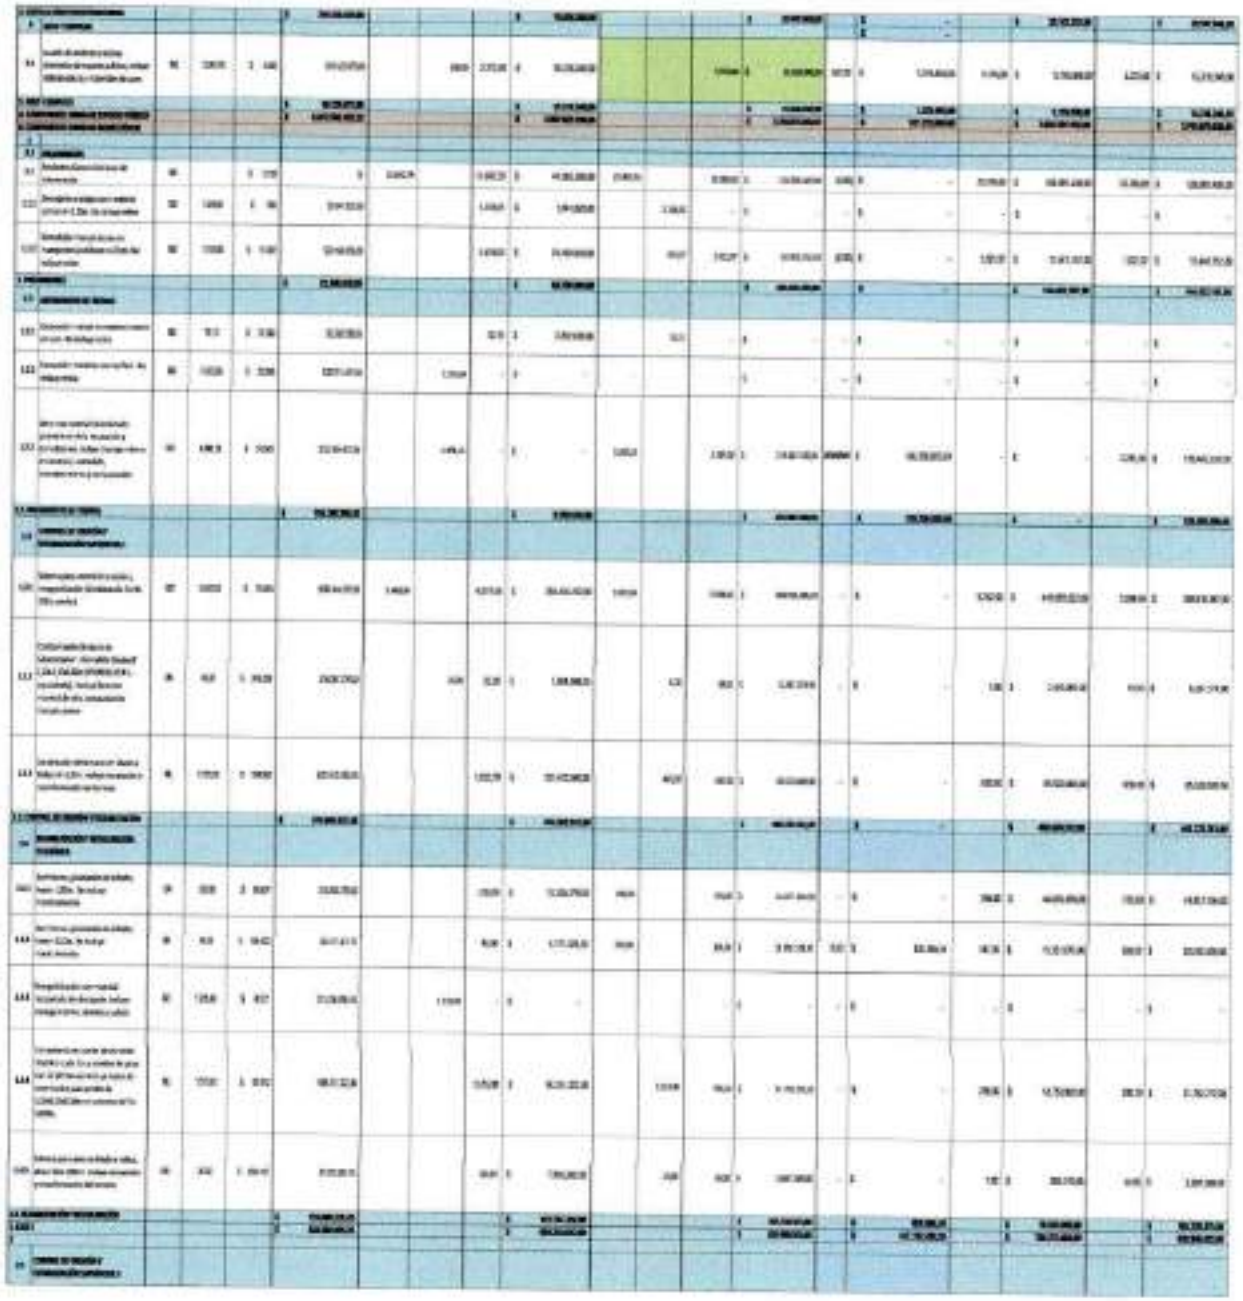

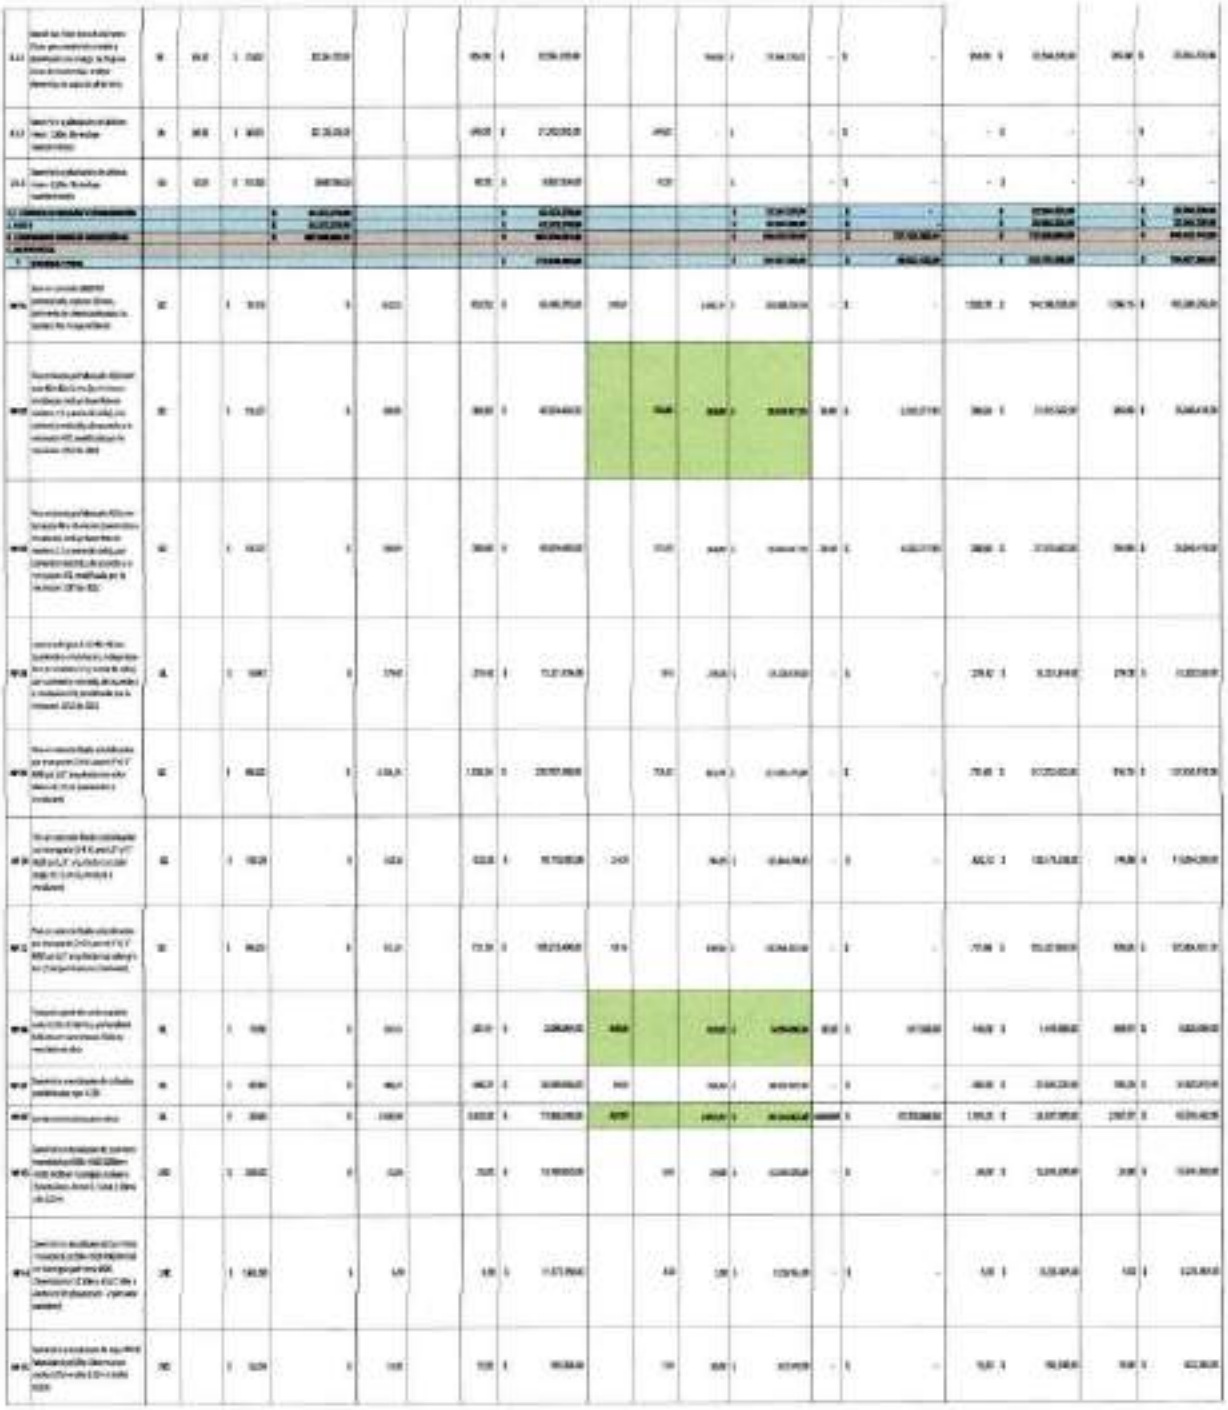



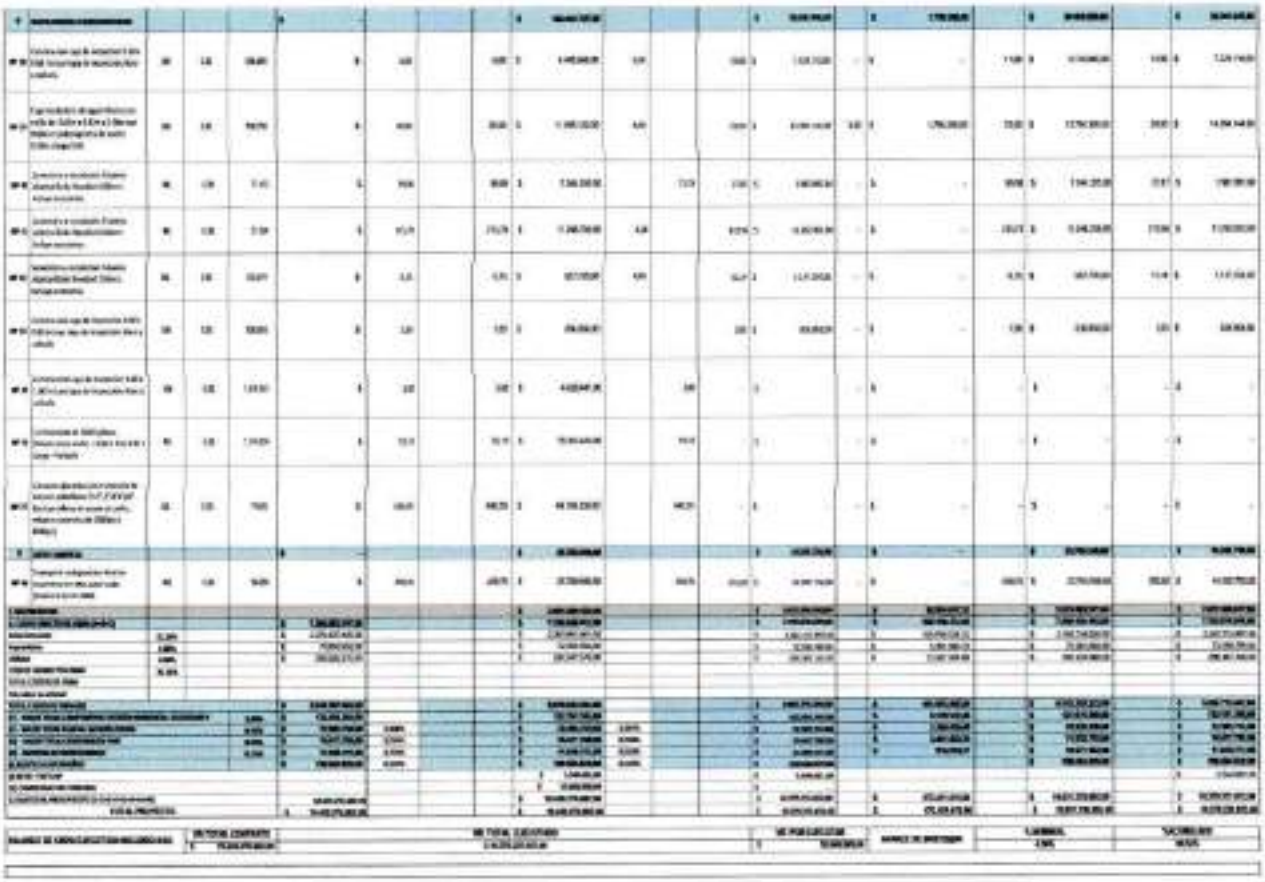

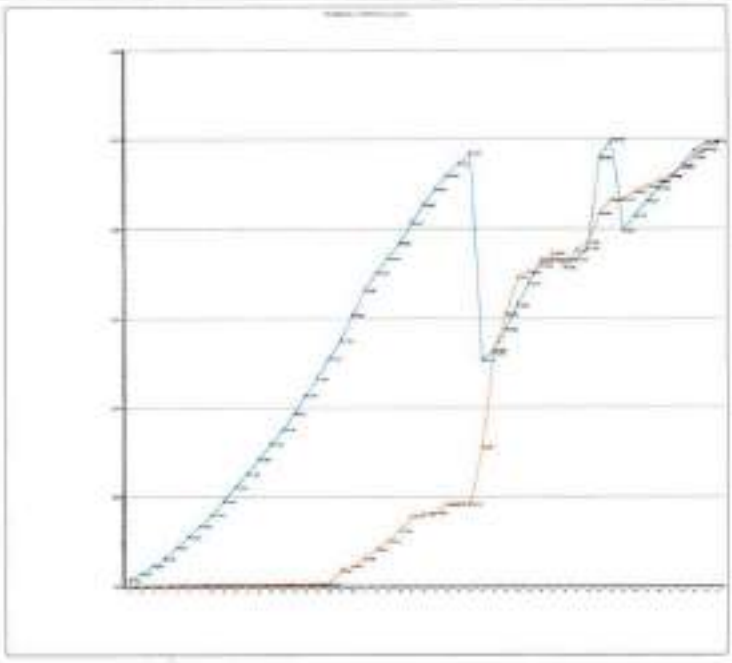



18733



1752



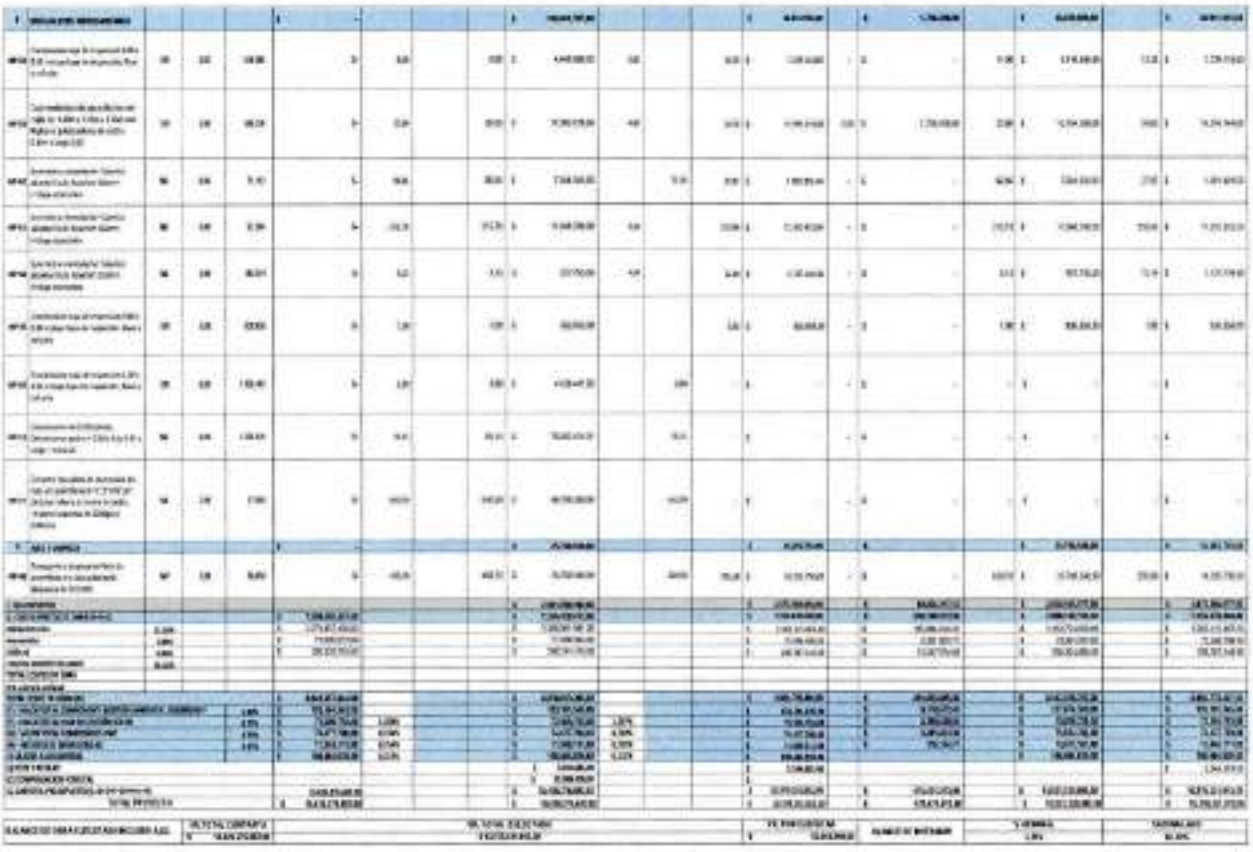

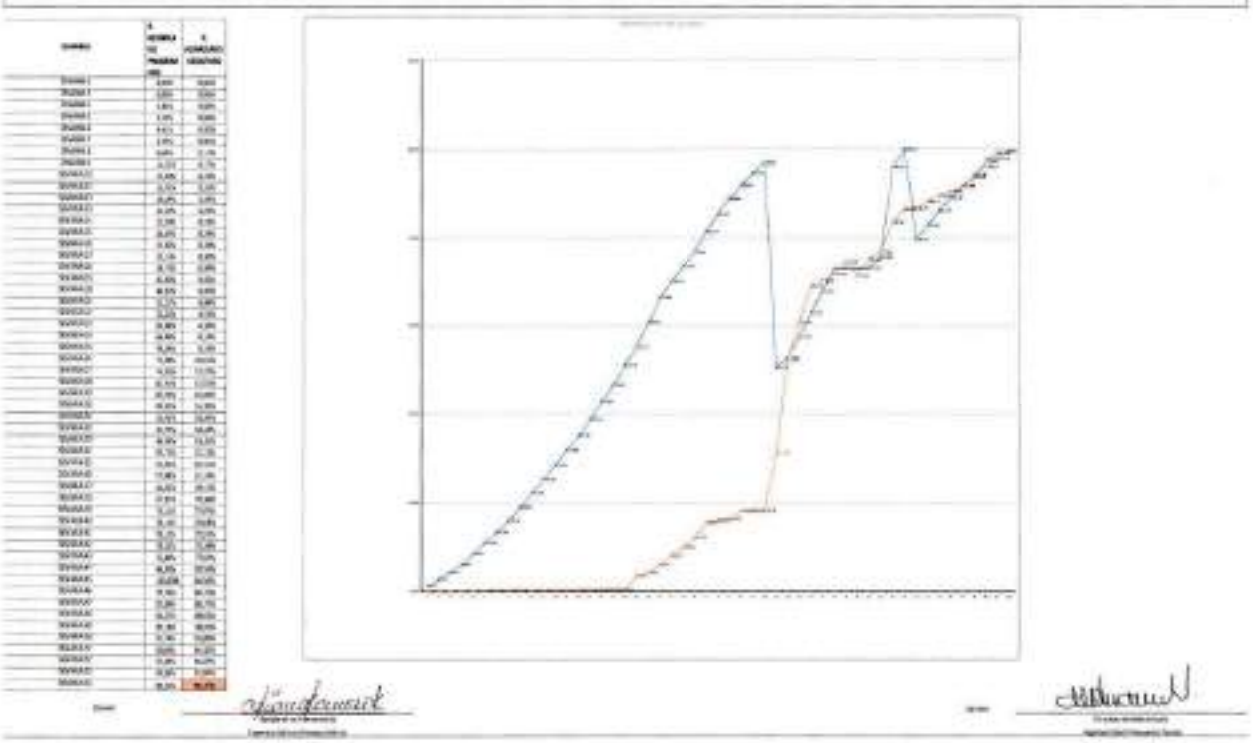

18735

| | |
|---|---|
| MAPO sas INGENIERIA | **Contrato de Interventoria FONDIGER 008-2023**<br>Formato v1-feb-2022 |

# **ANEXO 1.G** Bitácora de obra
# Del Folio 1755 al 1830

Calle 152B N° 58C - 50 Torre 12 Oficina 602 Bogotá D.C. Telefono: 6015974685
Cel 3202880119 e-mail: ilimani008.mapo@gmail.com

1754

# CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO SECTOR EL PARAISO, MIRADOR LOCALIDAD 19, UP2 67



CONTRATISTA : CONSORCIO UAPA

N° CONTRATO DE OBRA : FONDIGER 002 - 2023

INTERUENTORIA : MAPO INGENIERIAS S.A.S

N° CONTRATO DE INTERUENTORIA : FONDIGER 008 - 2023

TOMO 1.

BOGOTÁ, COLOMBIA

1755

18757

Del 17-02-2023 al 26-02-2023
se realizaron las siguientes actividades:

- Componente ambiental: entrega de PG-RCD de parte de la interventoria al IDIGER para tramite de PIN dela obra ante SDA.
- Componente SISO: se trabajo en la formulacion del plan de gestion en seguridad y salud en el trabajo, se realizaron evaluaciones medicas ocupacionales a los profesionales ambiental, social, y residente de obra.

Dirección Obra

Interventoría

Del 27-02-2023 al 5-03-2023
En esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- Componente ambiental: se realizo reunion virtual contratista e interventoria con el fin de realizar la revision y aprobacion a este documento (tramite de Pin ante SDA), el dia 3-03-2023 se realizo visita de reconocimiento a la zona a intervenir para el permiso silvicultural.
- Componente social: Se realizo visita a la zona de influencia con el fin de gestionar el punto PAC.
se realizo recorrido con miembros JAC del barrio Mirador parte tecnica y social del contratista con el fin de localizar puntos satelites de informacion.
Se realizo visita a la zona de intervencion directa del proyecto con la participacion de la supervision y subdireccion del IDIGER., supervision de la secretaria del Habitat. la interventoria Mapo ingenieria SAS. representantes de la JAC barrio Mirador y el contratista CONSORCIO YAPA con el fin de verificar la zona de intervencion de obra
- Componente Tecnico: Se continua con la revision y analisis de los documentos tecnicos que integran los estudios y diseños necesarios para la ejecucion

1956

del proyecto. Se realizo revision de planos con el IDIGER, y se concluye que se requieren los planos iniciales y/o planos matriz.

DIRECTOR OBRA

Interventoría

Semana del 6-03-2023 al 12-03-2023.
Componente social: Se realizo visita al predio escogido para el PAC ubicado en Calle 71H Nº 27-60, se reciben hojas de vida por parte JAC barrio Mirador
Componente tecnico: se terminan con la revision, estudios y analisis de los documentos tecnicos que integran los estudios y diseños
los componentes tecnicos: Topografia, Geotecnia, estructura, Diseño, instalaciones electricas, instalaciones hidraulicas. entregaron los informes tecnicos de la revision de diseño para envio a la interventoria

DIRECTOR OBRA.

Interventoría

Semana del 13-03-2023 al 19-03-2023
Componente social: Una vez aprobado los plantillas de volantes de divulgacion, se realizo entrega de volante informativo de levantamiento de actas de vecindad los dias 16 y 17 de marzo
Se realizo visita de reconocimiento del poligono de influencia directa del proyecto con el fin de determinar el numero de levantamiento de actas de vecindad a realizar por el contratista. Esta visita se realizo el dia 14-03-2023 con el acompañamiento de la supervision social del IDIGER, profesional social de interventoria, area tecnica y social del contratista. se determino la

realizacion de 193 actas de vecindad. se realizo mesa tecnica de trabajo el 15.03.2023 en conjunto con la interventoria para ajustar formato de caracterizacion poblacional.
El COI N°10 fue aprobado 9-03-2023 por SDM.
Componente Tecnico: se termino con la revision estudios y analisis de los documentos tecnicos que integran los estudios y diseños. se envia a interventoria los informes tecnicos de los componentes del proyecto

Director

Interventoria

Semana del 20-03.2023 al 26-03-2023
Componente social inicio el levantamiento de acta de vecindad el dia 22-03-2023. se programa levantamiento de 6 actas de vecindad por dia, se reporta en este periodo 21 actas realizadas con un 10.88% de avance
el contratista realizo envio de formato modelo de caracterizacion poblacional a la interventoria el dia 21-03-2023 formato que sera aplicado a los predios a los cuales se realice actas de vecindad

Director

Interventoria

Semana del 27-03-2023 al 2-04-2023
Se da continuidad al levantamiento de acta de vecindad se reportan 43 actas levantadas para un avance de 22.27%. se continua recibiendo hojas de vida de MONC.

1757

Componente tecnico: se termina con la revision, estudios y analisis de los documentos tecnicos que integran los estudios y diseños, se envia a interventoria los informes tecnicos de los componentes del proyecto.

Director

Interventoría

Semana del 03.04.2023 al 09.04.2023
Con respecto al permiso silvicultural, el consorcio KAPA, sigue trabajando en el levantamiento de la informacion referente a los arboles evidenciados en la zona a intervenir.
Componente social: Se encuentra en la nueva busqueda de punto PAC.
Se da continuidad al levantamiento de actas de vecindad se lleva un total de 47 actas con un avance del 24.35% en acuerdo de actas de vecindad se realizo con acompañamiento de interventoria se realizo caracterizacion poblacional y se indago sobre la percepcion de la comunidad a la pintura de murales e instalacion de fachadas falsas sobre los muros

Director

Interventoría

Semana del 10.04.2023 al 16.04.2023
Componente Social: Se formalizo la instalacion del nuevo punto de atencion a la comunidad PAC, ubicado en la calle 72F Bis Nº 27 A 20, se realizo la instalacion de tres (3) puntos satelites de

Informacion. en puntos estrategicos ubicados
1° Panaderia Cr 27B N° 71C 19 sur
2° Deposito de papa. Cr 27 B N°71G 50 sur.
3° Salon comunal barrio Mirador cll 71H sur N° 27-81j
Se realizo reunion de socializacion de inicio de obra con la comunidad. y los representantes del IDIGER e interventoria.
Se continua con actas de vecindad se reportan un total de 62 Actas levantadas con un avance del 32% sobre lo programado
una vez terminada la reunion de socializacion se realizo la conformacion del comite veedor
Se siguen recibiendo hojas de vida (2 hojas).
Componente tecnico: Se realizan reuniones con la Arq. Natalia Rincon para el ajuste de los diseños arquitectonicos.
se prepara reunion de socializacion con la comunidad.

DIRECTOR

Interventoria

Semana del 17-04.2023 al 23-04-2023
Componente social: se realiza entrega de volantes de segunda visita para el levantamiento de actas de vecindad, se continua con actas de vecindad total realizadas de 100 con un avance de 56.49% los dias 18 y 22-04.2023 se realizaron recorridos viabnos donde se verifico el estado de la valla informativa, estado actual de los puntos satelites de informacion y recorrido para inventario predial se recibieron cuatro (4) hojas de vida suministradas por residentes del barrio Mirador
El contratista esta realizando la aplicacion del formato modelo de caracterizacion poblacional. hasta la fecha se lleva un total de 86 caracterizaciones aplicadas

Componente Tecnico: se asiste a reunion con SDHT con el fin de presentar diferentes alternativas a los ajustes de los diseños arquitectonicos, de la reunion se concluye:

- Se puede eliminar la fachada falsa contra los casos y analizar el mejor acabado sin afectar la estructura de los casas
- Al eliminar el contrafuerte contra las casas, se debe garantizar la estabilidad del subsuelo.
- Presentar alternativa de materiales que no se puedan vandalizar
- Presentar alternativas de diseño por cambio de la localizacion de pergolas.
- Presentar alternativas para que en lo posible, no se presente el cambio de uso de los viviendas

DIRECTOR

Interventoría

Semana del 24-04-2023 al 30-04-2023

El pin otorgado por la SDA. para este contrato es Nº 22863 quedo bajo radicado 2023ER 83830 del 21-04-2023

Componente Social. se actualizo cartelera informativa con volante instalado en los puntos satelites. para generacion de empleo y PMT. Se realizo entrega de volantes del recubrimiento de actas de fachada para autorizacion de actividad, pañete y pintura. sobre muros de predios ubicados sobre la ladera, se continua con la actividad de actas de vecindad. para un total de 130 actas realizadas con un avance de 70.60%. se realizo levantamiento de actas de fachadas a 12 de los 19 predios ubicados sobre la ladera. Se continua con la recepcion de hojas de vida de MODC.

Componente Tecnico: se asiste a reunion en la SDHT con el fin de presentar las diferentes alternativas a los

ajustes de los diseños arquitectonicos. de la reunion se concluye:

- Se puede eliminar la fachada falsa contra los cosos
- Analizar cual es el mejor acabado sin afectar la estructura de la casa.
- Al eliminar el contrafuerte contra los cosos, se debe garantizar. la estabilidad del subsuelo.
- Presentar alternativas de materiales que no sean atractivos para quitar por parte de la comunidad.
- Presentar alternativas de diseño por cambio de localizacion de pergolas.
- Presentar alternativas para q' no se presente cambio de uso de viviendas.

DIRECTOR

Interventoría

Semana del 1-05-2023 al 7-05-2023

Componente social: se adecua punto PAC con el respectivo mobiliario para atencion a la comunidad se continua con volantes de generacion de empleo y PMT en puntos satelites, se continua con levantamiento de actas de vecindad. Para un total de 184 con un avance del 100%, se programa primera reunion comel comite veedor, se realizo un recorrido urbano donde se verifico actualizacion de puntos satelites, se continua con la recepcion de hojas de vida.

Componente Tecnico: El miercoles 23 de mayo se presenta ante la entidad. los nuevos diseños por parte de la Arq. Natalia Rincon. y la geotecnia por parte del ing Juan Ricardo Troncoso

DIRECTOR

Interventoría

1259

Semana del 8.05.2023 al 14.05.2023
Componente sisoma: En la presente semana se inicia el proceso de contratacion se envian a 5 personas (4 ayudantes y UN Oficial) a realizar examenes medicos de ingreso
Componente Social: se recepciona una PQRS presentada por la comunidad y representada por la sra. Sandra Villegas con solicitud: Desacuerdo por cruce de maquinaria pesada por los vias, esta se escalo al especialista del PMT, se levanta acta de compromiso a la PQRS Nº1 como soporte a la solicitud presentada El dia 13 de mayo a las 2:30PM se realiza visita (reunion) extraordinaria con la Caja de vivienda popular, IDIGER, contratista, con el fin de realizar visita a los predios identificados en proceso de reasentamiento, se realizo 1er comite veedor. (5 personas) y el equipo tecnico del contratista. Se realizaron dos recorridos urbanos se continua con la recepcion de hojas de vida
Componente Tecnico: se realiza medicion de fachadas de viviendas colindantes a la ladera con el fin de obtener cantidades de obra a pañetar., el miercoles se realiza comite de obra donde se revisan ajustes a los diseños

DIRECTOR

Interventoría

Semana del 15.05.2023 al 21.05.2023
Componente ambiental: se realizo capacitacion correspondiente al manejo y seperacion de los residuos solidos en la oficina administrativa (PUNTOPAC), se realizo induccion al personal que ingresara la proxima semana, la induccion se realizo el 18 de mayo de 2023
Componente Social: se verifico el estado de los tres puntos satelites en compañia de la interventoria

se levanto acta de compromiso a PQRS Nº2 presentada por la Defensa Civil. Se recibio visita de los presidentes de las juntas de accion comunal de los barrios vecinos como El edon, Bellaflor, Paraiso Verbenal del sur y Puertas del paraiso solicitando ser parte del comite vecdor, Se realizo un recorrido urbano verificando el estado de los puntos satelites Se realizo envio de metodologia de capacitacion a empleador de obra, se continua con el proceso de recepcion de hojas de vida

DIRECTOR

Interventoria

23 mayo de 2023

Componente SST - Ambiental: Se presta el ingreso de cuatro personas, 3 ayudantes de obra y un oficial, este personal se le hace entrega de dotacion y elementos de Proteccion Personal y se les recuerda la importancia de usar los EPP y el autocuidado en las actividades

Componente Tecnico: Se da inicio al replanteo de Trincheo, por parte de la topografia, se reciben 50 tablas burras y 20 varas rollizos de 2.50m,

Componente Social: Se efectua visita en obra por parte del apoyo a la Supervision social del Idiger donde no se encuentran a los Profesionales sociales en el territorio, donde se indaga que la profesional de obra se encontraba realizando ajustes de actas en las oficinas del contratista.

24 mayo de 2023

Se inician actividades correspondientes a rocerio y reemplazo de la linea de arboles,

Se realiza actividad de Reemplanteo por parte de la comision topografica del contratista

En obra se encuentra personal como 3 ayudantes 1 oficial y comision topografica.

Residente de obra, Residente ambiental y SST y Social Se verifica que todo el personal cuenta con los

1760

elementos de protección personal y el uniforme distintivo del IDIGER y del contrato
Componente Social: se realizo primer capacitación a empleados de obra (en los (5) vinculados, sobre comunicación asertiva, presentación de cada uno de los empleados y recepción de comunidad para direccionar al punto PAC, se da continuidad al ajuste de actas de vecindad.

Director

Interventoría

25 mayo de 2023
Se inicia con las excavaciones para la construcción de trinchos, se continua con la roceria sobre la linea de trinchos, de igual forma se continua con el replanteo en horas de la tarde asistencia a comite de seguimiento en las instalaciones del IDIGER
Componente ambiental - SST: Verificación de las condiciones de seguridad en el terreno donde se adelantan las actividades de excavaciones para la construcción de trinchos con un oficial y 3 ayudantes.
Estado del tiempo: Seco de 7:00 AM a 4:30 PM.

Interventoría

26 de mayo de 2023
Se continua con el replanteo y construcción de Trinchos (excavaciones)
Componente ambiental - SST: Se verifica los sitios donde se esta realizando la actividad de excavación para trinchos y roceria, lo mismo que el replanteo. de los mismos se verifico las condiciones del terreno y se requiere equipos para trabajo en alturas dado que el personal debe adelantar actividades cerca a la ladera, se realiza adecuaciones y actividades que demuestran la implementación de las medidas

de bioseguridad como el punto de desinfeccion.
se realizo la conformacion del vigia de seguridad y salud en el trabajo, inspeccion de herramientas, botiquin y extintor, se adelanto curso virtual de 20 horas
Estado del tiempo seco de 7:00 AM a 11:00 AM
lluvia moderada 11:00 AM a 2:00 PM
seco de 2:00 pm a 4:30 PM.

Interventoria

27 de mayo de 2023
Se continua con las excavaciones para la construccion de trinchos, replanteo de trinchos y roceria.
se realizo revision de catastro de redes de alcantarillado entre topografia de cosorcio e interventoria
Componente ambiental SST.
Se esta pendiente de los trabajadores que realizan la actividad de excavaciones para la construccion de trinchos y roceria.
Estado del tiempo seco de 7:00 AM a 11:00 AM y de 2:00 pm a 5:00 PM, lluvia moderada de 11:00 AM a 2:00 PM

Interventoria

29. de mayo de 2023
Se continua con las excavaciones y replanteo de trinchos y roceria
Componente ambiental: Se verifica asistencia del personal. y uso de los elementos de proteccion personal,
Estado Tiempo: 7:00 a 4:30 pm tiempo seco

Interventoria

30- mayo de 2023
se inicia excavacion para anclaje de linea de vida (muertos). se inicia verificacion por parte de topografia de diametro de tuberias de redes de alcantarillado. se continua con el replanteo de lineas de trinchos por parte de topografia.
componente ambiental SST. se verifica asistencia de personal. uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y condiciones del terreno en el area de trabajo.
Estado del tiempo: de 7:00 AM a 5:00 tiempo seco

Interventoria

31 de mayo de 2023
se continua con la excavacion para la instalacion de trinchos, se continua la verificacion por parte de topografia de diametros de tuberias de redes de alcantarillado. se continua con el replanteo de lineas de trinchos.
Componente ambiental SST: se verifica asistencia de personal uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y condiciones del terreno del area de trabajo.
Estado del tiempo:
lluvia moderada de 7 A.M. a 10:00 AM.
Tiempo seco de 10 AM a 5:00 PM.

Interventoria

01 de junio de 2023.
Se continua con la excavacion para la instalacion de trinchos. Se continua con la verificacion de diametros de tuberias de redes de alcantarillado por

Parte de topografia
Componente ambiental SST. Se verifica asistencia de personal uso de elementos de proteccion personal (EPP). y condiciones del terreno del area de trabajo
Estado del tiempo
Lluvia moderada 7:00 AM a 10:00 AM
tiempo seco de 10:00 AM a 5:00 PM

Interventoria

02 de junio de 2023.

Interventoria → Se realiza verificación del avance en el catastro de redes V2, para lo cual se cuenta con el 25% del catastro de redes.
→ Se realiza verificación de avance a excavacion de barras para fundida. el dia lunes. (2 Unidades).
→ Se cuenta con aproximadamente 90 ml de trinchos (Excavaciones)
→ El contratista cuenta con 2 ayudantes de Obra + Comision topografica. (Catastro de Redes). + Profesional tecnico.

Realizado por (Topografia).
Ing Jessica Fabiana Pena

Interventoria
R. obra

se inicia en horas de la tarde excavacion para iniciar el cerramiento
Estado del Tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Interventoria

03 de junio de 2023.
Se continua con la excavacion para iniciar el cerramiento porcial de la obra. Se continua con la verificacion de diametros de tuberia de redes de alcantarillado por parte de la topografia

Interventoría

05 de junio de 2023
Se continua con la excavacion para iniciar cerramiento parcial de la obra se continua con la verificacion de diametros de tuberia de redes de alcantarillado por parte de topografia

Interventoría

06 de junio de 2023

Recorrido de Obra. - Interventoria. — Area tecnica.
- 30 excavaciones para instalación de cerramiento..
- Se solicita por parte de la interventoria el envio de la programacion y proceso constructivo para la fundida de los muertos.
- El avance del catastro de redes va en un 82% con respecto a la nueva toma de datos.

"Nota: Verificar si es viable llegar con el modelo hidraulico al Pozo Nº 8."

- Se hizo el recorrido de los puntos de Satelites del area Social.
- Se evidencian 7 predios los cuales no se cuentan con respuesta del IDIGER ya que son predios en riesgo de derrumbe.

Interventoría
Ivan Cuy

Estado del tiempo: de 7:00 AM a 5:00 PM
Tiempo seco.

Interventoría

07. de junio de 2023
Se continua con excavaciones para
Cerramiento, en horas del medio dia se
reciben 100 varas de 300 m. y se inicio
cerramiento.
Estado del tiempo: de 7:00 AM a 5:00 PM
Tiempo seco

Interventoría

08 de junio de 2023
Se continua con el cerramiento, y
con excavaciones para este cerramiento
la topografia continua con la verificación
de diametro de tuberias de redes de alcan-
tarillado.
Estado del tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 11:00 AM.
lluvia moderada de 11:00 AM a 2:00 PM
Tiempo seco de 2:00 PM a 5:00 PM

Interventoría

09 de junio de 2023
Se continua con excavaciones para
cerramiento y cerramiento
Se continua con verificacion de diametros
de tuberias por parte de la topografia
Se recibieron materiales y herramientas de

la ferreteria camino al circo
Estado del tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Interventoría

10 de junio de 2023
Se funde Anclaje (muerto) para instalacion de linea de vida
Se continua con excavaciones para cerramiento
Estado de Tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 12:00 M.

Interventoría

13 de junio de 2023: Componente social.
-Se realizó visita de la secretaría del hábitat, El IDIGER, la interventoría Mapo Ingeniería SAS y El Contratista Consorcio VAPA, Con el fin de realizar recorrido sobre la zona de trabajo de obra, evidenciando predios que se encuentran en proceso de reasentamiento y nuevas ocupaciones.
- Se realizó recorrido con El IDIGER, La interventoría Mapo Ingeniería SAS, El Contratista Consorcio VAPA y El señor Mayi Rojas (Líder artístico), quien realizará propuesta de Murales sobre fachadas de los predios que se encuentran colindantes a la ladera, Propuesta que se plasmará de manera formal vía correo electrónico y será recibida por la profesional social de obra.

Interventoría

profesional social obra

Se funde segundo anclaje (muerto) para linea de vida
Se continua con cerramientos, y se hace levantamiento de postes de energia
Estado de tiempo;
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Interventoría

14 de junio de 2023
Se continua con excavaciones para el cerramiento del area de obra, se realizo chequeo de los equipos de topografia nivel y estacion.
Estado de Tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 9:00 AM
Lluvia moderada de 9:00 AM a 11:00 AM.
Tiempo seco de 11:00 AM a 12:00 M.
Lluvia moderada de 1:00 PM a 2:00 PM
Tiempo seco de 2:00 PM a 5:00 PM

Interventoria

15 de junio de 2023
Se inicia con excavaciones para cerramiento del area de obra costado norte
Estado del tiempo:
Tiempo seco: de 7:00 AM a 5:00 PM.

Interventoria

16 de junio de 2023
se inicia la instalacion de varas rollizos y polisombra verde del cerramiento costado norte.
Estado del tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Interventoria

17 de junio de 2023
Se continua con cerramiento del costado
nork y se inicia cerramiento de la obra
hacia el centro de la misma.
Estado del tiempo
lluvia moderada de 7:00 AM a 10 AM.
Tiempo seco de 10:00 AM a 12 AM.

Interventoria

20 de Junio de 2023
1) El dia 17 de Junio Se efectua reunión con los propietarios de los 19 predios, en los cuales Se tiene proyectado elaborar los murales en las Fachadas de las casas, por lo tanto se realiza dicha reunión con el animo de presentar la propuesta por parte de artista urbano (J) e indagar con la comunidad Su intención de dar aprobación y visto bueno a la actividad.
2) El dia 16 de Junio Se efectuo Segunda reunión con el comite Veedor, Contando con la participación de 12 personas de la Comunidad.
3) El dia 16 de Junio Se efectuo recorrido Urbano con Secretaria de habitat, Caja de Vivienda Popular y el IDIGER y Alcaldia local, con el animo de verificar los predios que se encuentran en ocupaciones ilegales y los tres predios renuentes de Caja de Vivienda, para adelantar los operativos respectivos.
4) Se programa Capacitación a empleados de la obra para el dia viernes 23 de Junio con la temática Inteligencia emocional.
5) Se programa Taller de Cultura Ciudadana para el Sabado 24 de Junio. Con la participación del grupo proceans de la Alcaldia local.

6) Durante la visita por parte del apoyo ala Supervisión social del IDIGER, Se evidencia q de no se encuentra la profesional social de la interventoria Maria Serrano, ni profesionales de interventoria de los Componentes tecnico y ambiental.

Lucy Sepulveda Arauso
Apoyo Supervisión social IDIGER. / Profesional social obra

Interventoria

20 de Junio de 2023
Se informa que entre los dias sabado 17 de junio y domingo 19 de junio se roberon 30 unidades de vara rollisa de 3.00m correspondiente al cerramiento de obra, que ya estaba instalado, se toma la desicion de sospender esta actividad, se hace impermeabilizacion de maderas para construccion de trinchos
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Interventoria

21 de junio de 2023
Se continua con impermeabilizacion de madera para construccion de trinchos comite tecnico en IDIGER hasta de la tarde
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Interventoria

22 de junio de 2023
Se continua con la impermeabilizacion de madera para construccion de trinchos
Estado de tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Interventoria

23 de junio de 2023
Se inicia descapote para llenos de terrazos de trinchos
Estado de tiempo
Tiempo seco 7:00 AM a 12:00 M.
1:00 PM a 5:00 PM

Interventoria

24 de junio de 2023
Se continua con descapote para llenos de terrazos de trinchos.
Estado de Tiempo
Tiempo seco de 7:00 a 12 PM.

Interventoria

26 de junio de 2023.

- Se realizo revision topografica para chaqueo de entrega catastro de redes v2. → lo cual cumple con precisiones y tolerancias para dar la aprobación de la actividad. Se realizo verificación de placas Gps's, Nivelación + verificación de catastro de redes en 3 zonas especificas inicial, intermedia y final.
- Se cuentan con 3 personas en campo. los cuales estan realizando actividades de descapote + Relleno de sendero. → transito de Personal.

- Se funden los muertos el dia.

- 16 de junio se funde el primer muerto y al dia 13 se funde el segundo, lo cual por cantidades topograficas da un total de $2m^3$:

Interventoria.

Se continua con descapote para llenos de terrazas de trinchos.

~~27~~ de junio de 2023

Se inicia replanteo de los segundos lineas de trinchos, se inicia la excavacion para la segunda linea de trinchos en la parte pendiente de la ladera, se utiliza lineas de vida para estas actividades.

Estado del tiempo:

Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

ING. INT.

28 de junio de 2023

se continua con excavaciones para la segunda linea de trinchos, en horas de la tarde comite tecnico en instalaciones del IDIGER.

Estado de tiempo:

Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

ING. INT.

29 de Junio de 2023
Se continua con excavaciones para segunda linea de trincho, se inicia excavacion para tercer anclaje (muerto) para las linea de vida
Estado de tiempo
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM

30 de Junio de 2023
Se continua con excavaciones para segunda linea de Trincho, se continua con excavacion para tercer anclaje, se continua con arreglo de maderos para trinchos.
Estado del tiempo
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM

1 de julio de 2023
Se funde Tercer muerto para lineas de vida, se continua con arreglos de maderos para Trinchos.
Estado de tiempo.
Tiempo seco 7:00 AM a 12:00 M.

4 de Julio de 2023
Se continua con arreglo de madera para trinchos, se continua con excavacion se hacen para reiniciar el cementado
Estado de tiempo.

lluvia moderada de 7:00 AM a 12:00 M.
Tiempo seco de 1:00 PM a 5:00 PM.

5 de Julio de 2023
Se continuo con arreglo de madera para trinchos, se continua con excavacion de huecos para cerramiento, se efectuo desalojo de cosos en la ladera.
Estado de tiempo:
Tiempo seco todo el dia

6 de julio de 2023
se continuo con arreglo de madera para trinchos, se continua con excavaciones para cerramiento, se acopia madera proveniente de la demolicion de los cosos a borde de ladera
Estado de tiempo.
Tiempo seco todo el dia

06/07/23 Componente Social:
Se asiste a Comite de obra, Continuo Se realiza con la profesional Social de obra el recorrido Urbano, se evidencia el desalojo de los predios de reasentamiento en la ladera, durante el recorrido la Comunidad no presento ninguna queja. Por otra parte Se realiza el acompañamiento y verificación a los puntos Satelites los cuales

Se encuentran en buen estado y con las vallas de Generación de Empleo, el PMT, en los tres Puntos, de igual manera Se evidencia el buen estado de la valla informativa. A la fecha Se reporta la recepción de 5 hojas de vida Para un total de 74 hojas de vida.

Mª De los Angeles Serrano
Profesional Social Interventoria

Dora Castillo
Dora Castillo Ochoa -
- Profesional Social obra -

7 de Julio de 2023
Se continua con arreglo de madera para trinchos (huecos en tabla burra y vanos)
Se continua con excavacion para cerramiento
Se ingresa retroexcavadora Kobelco 210.
Se instala puesto de vigilancia armada con coseta un vigilante 24 horas.
estado de tiempo
(lluvia moderada) 07:00 AM a 09:00 AM Tiempo seco de 09:00 AM a 03:30 PM lluvias fuertes y moderadas de 03:30 PM a 05:00 PM Tiempo seco.

8 de julio de 2023
Se continua con arreglos de madera para trinchos (huecos en tabla burra y vanos).
Se continua con excavacion para cerramiento
Se inicia desalojo de material recebo acopiado
Estado tiempo.
lluvia moderada de 07:00 AM a 11:00 AM
Tiempo seco de 11:00 AM a 12:00 PM

10 de Julio de 2023

Se realiza visita al frente de obra, se evidencia la presencia del vigilante, retroexcavadora y una volqueta, tambien esta el personal de la auxiliar de topografía y varios personal realizando trabajos de cerramiento, corte de madera para trinchos, tambien se observa trabajando por personas sobre la losa usando los equipos de protección contra caídas, los baños y almacen estan en optimas condiciones de aseo y orden, tambien se mantienen los puntos de hidratación para el personal, el personal en obra usa los EPPS de forma adecuada.

Yeimy Cortes
Residente SST-AML.
Coordinadora.

Nini Y. Cardozo S.
Profesional SST-PTA
Interventoría

El dia de hoy se inician trabajos de excavación con retro excavadora y 5 volquetes doble troque, se inicia la instalacion de madera para trinchos. se continua con el cerramiento de obra, replanteo y control topografico.

Estado de tiempo.

lluvia moderada de 7:00 AM a 12:00 M.
Tiempo seco de 12:00 M a 5:00 PM

11 de Julio de 2023

Se continua con trabajos de excavación con retroexcavadora y cinco volquetes. doble troque se continua con cerramiento con polisombra bocacalles, se cuentinua con replanteo de obra

Estado tiempo:

Tiempo seco de 07:00 AM a 5:00 PM

1268

En el proceso de excavación se presento un daño en manguera de gas natural, en horas de la tarde. Se solicito visita del recorredor para el dia 12 de julio de 2023

12 Julio 2023

Se continua con proceso de excavación y retiro de material. Se cuenta con retroexcavadora y 5 Volcas para este proceso. Teniendo en cuenta que se evidencian en los primeros estratos materiales de relleno, Se procede a profundizar la excavación, teniendo en cuenta las recomendaciones del especialista de geotecnia y contenidas en el informe del mismo componente que especifica lo siguiente: (...) es necesario que se construyan sobre la roca arenisca meteorizada (estrato Ksgl-m) adentrándose como mínimo 0,40 m.

Se continua con entramado de bocatulles

Se continua con replanteo y control de excavacion por parte de topografia

Estado de tiempo:

Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Se presenta daño de la red de Enel Codensa q' consiste en daño en dos postes de madera, ocacionado por una Volqueta.

Se presento Visita por parte del Ingeniero Shon Supervisor del contrato por parte de IDIGER. y Representantes de la alcaldia local. para revisar la situación de dos personas que aun continuan en area del proyecto, despues del desalojo. los señores esperan un cumplimiento de tipo económico que les acordaron con la Alcaldia

para proceder a retirarse de la zona.
Se entro a reparar la vivienda afectada por poste caido.
caido por, parte del contratista.
Salieron 23 viajes de material suelto proveniente excavaciones en Volquetas doble troque.

13 de julio de 2023

Se continua con excavación, corgue y transporte.
Topografia continua con replanteo y chequeo de niveles.
se continua con armado de trinchos.
Se recibio la visita de gas natural por motivo de solicitud de taponamiento de redes. se deja que toca programar Eutorr visitor y por parte del contratista toca hacer apiques para ubicar la linea y asi poder hacer el respectivo taponamiento
En horas de la mañana se derrizo una roca golpeando un trabajador que estaba trabajando en los trinchos, se remite este trabajador a su ARL respectiva.
Se cambia poste de Energia que fue afectado, esto por parte de codensa.

Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

1761

14-Julio Visita de Seguimiento de actividades del Componente Social Recorrido de Seguimiento y visita al Predio de la Cra 27# 71GBis 15. Por incidente de Caida de Poste de Luz, Por choque de una Volqueta, Generando daño en el techo de la Casa, Cuyo propietario es el Señor Jesus Lozano Caicedo. Esta afectación se presento el 12 de Julio, el area Tecnica realiza el mismo día la revision de las afectaciones, Generando el compromiso Con el Propietario de realizar las reparaciones, Cambio de tejas averiadas para el dia 13 de julio de 2023. Por otra parte la empresa Enel CODENSA realizo el retiro del poste.
El Componente Social de Obra desarrollo la Capacitacion a Empleados de obra N°3, abordando la tematica de liderazgo empresarial.

Profesional Social Obra — Profesional Socia Interventoria

Se continua con excavacion cargue y transporte
Topografia continua con replanteo y control de niveles
se continua con excavacion en ladera para trinchos, se continua con apiques para ubicar red de gas natural, Temperatura de 7:00AM a 5:00 PM

Julio 15 de 2023
En visita realizada el 14 y 15 de julio de 2023 se verificaron los 4 apiques realizados el 14 de julio y 8 apiques realizados el 15 de julio en 11 de los apiques realizada se encontró relleno antrópico de baja calidad con basuras hasta encontrar el estrato de arenisca, en el apique 12 último se encontro un estrado de 60cm aproximados de arcilla de buena calidad, se recomienda llegar hasta el estrato de arenisca en todo el proyecto.

Ing. Fernando Nieto

Se continua con excavacion cargue y trans.
Se continua con apiques para ubicar red de gas natural
Se descubre tubo de EAAB 3" ubicado sobre la excavación, se da aviso para hacer taponamiento de este.
Estado de tiempo
lluvia moderada de 7:00 AM a 8:00 AM
tiempo seco 8:00 AM a 12:00 M.

Julio 17 de 2023
Se continua con excavacion cargue y transporte, se continua con apiques para ubicar red de gas natural. se informa q' el dia sabado en horas de la tarde se repara el tubo de 3" de acueducto. Se continua con excavacion para instalacion de trinchos
Estado de tiempo
lluvia moderada de 7:00 AM a 9:00 AM.
Tiempo seco de 9:00 AM a 5:00 PM.

Julio 18 del 2023
En visita realizada a la obra se comunica al Director de obra y Residente de obra la posibilidad de incluir otro frente de obra para iniciar labores de excavación desde la abscisa Km+350 con el fin de darle continuidad al movimiento de tierra reflejado en la abscisa Km+000, asi mismo reflejar un avance de obra significativo.

Ing. Pedro Villamizar
Apoyo a supervisión

Se continua con excavacion cargue y transporte, Se continua con excavacion e instalacion

1770

de tranchos, se continua con reinstalación de Polisombra.
Estado de tiempo.
lluvia moderada: 7:00 AM a 2:00 PM
tiempo seco 2:00 PM a 5:00 PM.
se realizo taponamiento de red de gas natural en ½" 3/4" en boca calles.
Actividad realizada por cuadrilla de Vanti
Equipo: Retroexcavadora Kobelco L210, 5 Volquetes doble troque, equipo de topografia.

Julio 19 - 2023

Se realiza levantamiento topografico para calculo de cantidades de obra. Por parte de la interventoria, se solicito al contratista que se debe entregar formalmente y una vez finalizada la Subrasante de las excavaciones. se este, a la espera del informe geotecnico por parte del consultor para aprobación de excavaciones; por ahora son excavaciones Preliminares.

Jesson Pino Interventoria.

Por instrucciones de los geotecnistas de interventoria y Contratista se debe hacer la excavación de todo el material limoarcilloso y arenisos para llegar al estrato recomendado para sustentar y/o apoyar el muro.

Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte
Se continua con actividades de excavacion e instalacion de trinchos, se continua con reinstalacion de polisombra
Estado de tiempo.
lluvia moderada de 7:00 AM a 1:00 PM
tiempo seco de 1:00 PM a 5:00 PM.
Se instalo acopio de basura ya que no se estan recibiendo en el botadero, el material de excavacion esta revuelto con demolicion de obra, ticrra negra y basura como son bolsas plasticas, costales, ropa, colchones etc y estos no se reciben en el botadero.

Julio 21 de 2023
Se realiza recorrido de obra con profesional ambiental y SST de obra e interventoría, se capacita el personal en adecuados cadiciones laborales, usando los EPPs adecuados, se tiene instalado el cerramiento y señalización en obra, los sumideros estan protegidos y los vegetales cuentan con PM y cuando salen de obra se realiza la limpieza de las vias por el contratista de obra.

YUM Y. CONTRERAS
Profesional SST-HSA

GESTIÓN SST., Se realza reunión con interventor Contratista, Interventoria e IDIGER, en la cual, se verifico el cumplimto de las condiciones de seguridad, se visita con uso adecuado de EPP, Disponibilidad de señalización. Cierre de obra.

Ing. Jaime Murcia
2. SST obra

Yenny Cortes
Pr. Ambiental Consorcio UOPA.

1771

Se continua con actividades de excavacion
Corgue y transporte
se continua con la actividad de excavacion
e instalacion de trinchos
se continua con reinstalacion de polisombra
se inicia con reinstalacion de punto de
acopio.
Estado de tiempo
lluvia moderada de 7:00 AM a 3:00 PM
Tiempo seco de 3:00 PM a 5:00 PM
Se efectuo comite tecnico. en oficinas
del contratista en obra.
Equipo 1 Retroexcavadora y 5 Volquetas de Retroque.

Julio 22 de 2023.
Se continua con actividades de excavacion
Corgue y transporte.
Se continua con actividades de excavacion
e instalacion de trinchos.
Equipo: 1 Retro excavadora de cargue, 5 volquetas
Estado de tiempo.
(Tiempo) lluvia moderada de 7:00 AM a 9:00 AM
Tiempo seco de 9:00 AM a 12:00 M.

Julio 24 de 2023.
Se continua con actividades de excavacion
Cargue y transporte.
Se continua con la actividad de excavacion.
e instalacion de trinchos.
Equipo: 1 retro excavadora y 7 volquetas doble
troque.
Estado del tiempo:

Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
En horas de la tarde se realizó el arreglo de tubo de acueducto de 3" por parte EAAB.

Julio 25 de 2023.
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte.
Se continua con la actividad de excavacion e instalacion de trinchos para terrazes.
En horas del medio dia se rompio tubo de acueducto de 3" se reporto daño a la empresa de acueducto, se procedio a cierre de valvulas y en horas de la noche hicieron el respectivo arreglo.
Equipo de trabajo: 1 retroexcavadora, 4 volquetes
Estado del tiempo.
Tiempo seco: de 7:00 AM a 5:00 PM.

Julio 26 de 2023
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte.
Se inicia actividad de cerramiento para cumplimiento de acta de comite.
Se rompe tubo de acueducto de 3", se reporto a la empresa de acueducto, se procede a cierre de valvulas, y reparacion en las horas de la noche por parte de la empresa de acueducto.
Equipo de trabajo. retroexcavadora, 7 volquetes. doble troque, vibro compactador.
Estado de tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Julio 27 de 2023

Se continua con actividades de excavación Cargue y transporte.
Se continua con la actividad de Cerramiento.
Se replanteo muro baranda a lo largo del proyecto, sirve de referencia para la excavación de muro en tierra armada.
equipo de trabajo retro excavadora y 7 volquetas doble troque. un vibro compactador.
Se avanza con la compactación del Piso de cimentacion.
Estado de tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Julio 28 del 2023

En visita de obra realizada, se comunica a los directores de obra e interventoria la necesidad de incluir personal para realizar trabajos en la ladera en la construcción de trinchos, asi mismo la necesidad de incluir otro frente de obra para continuar realizando excavación y movimientos de tierra en la abscisa Km+350, con el fin de dar un avance significativo a la obra.

Juan Alfaro Villamizar

• Se realiza revisión de localización y replanteo de muro baranda, segun diseño arquitectonico, se logra identificar medidas constantes a lo largo del replanteo, se propone identificar medidas constantes y asi poder generar secciones tipicas para llevar control del movimiento de tierras. (Se Solicita plano arquitectonico Final.

Interventoria
Jeison Fabian Ayala

Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte.
Se traslada punto de acopio y se recoge este por parte de la Vaesp
Se recibe visita de funcionarios de ENEL-CODENSA para verificar ubicacion y logistica, para traslado de postes.
Estado de tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
Solicita la interventoria nuevamente que para iniciar la instalación de la capa de rajón, debe el contratista hacer entrega del tramo donde se va a ejecutar la actividad. Esto significa que la excavacion debe estar acorde con los planos en planta y en perfil, seguidamente la interventoria verifica, si no hay reparos se procede a liberar el tramo para iniciar la primer capa. - Rajón -
Sin esta liberación no se debe continuar actividad alguna.

Julio 29 de 2023
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte
Se continua con recoleccion de basura de las casas de desalojo.
Equipo. Una retro excavadora y 6 volquetas doble troque.
Estado de tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Jueves 31 de Julio de 2023

Se realiza ela entrega del plano Arquitectonico a la Interventoria y con base en este producto se establece:

1. Localización y Replanteo del muro baranda hasta la K0+60.
2. Se establecen lineamentos y parametros para el movimento de tierras en los primeros 60 mts
3. Se espera la version ajustada por parte de geotecnia con el fin de validar anchos de instalación de rajón y conformación de terrazas con los suelos conformados en terreno.
4. Se realiza la materialización del muro en tierra armada de los primeros 60 metros.

Interventoria.

Se continua con actividades de excavacion, cargue y transporte
se continua con actividades de armado de trinchos ingreso cuadrilla de 4 personas para esta actividad.
Se continua con recogida de material proveniente de desalojo de corte.
Equipo de trabajo retroexcavadora y 5 volquetas doble troque.
Estado de tiempo:
lluvia moderada de 7:00 AM a 9:00 AM.
tiempo seco de 9:00 AM a 5:00 PM.
Solicita la interventoria colocar en obra un otro frente de trabajo con retroexcavadora y volquetas para retirar excavaciones y material de escombros y de esta forma aumentar rendimientos que se hace imperativo. asi mismo se debe bustear entre el K0+060 a la bocatcalle o salida de la calle - 71F Bis

y la calle 91C Bis. ya se puede buscar y llevar las excavaciones a nivel de piso de fundación; en este tramo la profundidad de cortes es menor de 1:50. y ver la posibilidad de iniciar los rellenos con B-600.
- Se solicita iniciar con la construccion de terrazas en el sector cercano al mirador.

Martes 01 de agosto de 2023.
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte.
Se continua con actividades de armado de trinchos, arreglo de madera tabla. buena y varas rollizas.
Se continua con recogida de material. proveniente de desalojo de casas.
Equipo de trabajo: Retroexcavadora y 5 volquetes.
Estado de tiempo:
lluvia moderada de 7:00 AM a 5:00 PM.
se realizo apique numero 13.
La cuadrilla que ingreso el dia anterior se encuentra en la actividad de arreglo de madera para trinchos, se cruza y tiende muerto numero 4.

Miercoles 02 de agosto de 2023.
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte. equipo utilizado retro-excavadora y 6 volqueta doble troque. se cargaron 28 viajes.
Se continua con actividades de arreglo de

madera (Tabla burra y varas rollizas) hueco para instalarlos. se cuenta con una cuadrilla de 4 personas.
Se continua con recoleccion de material proveniente del desalojo de casos.
se excava muerto N°-5 para hincar de 4 dia. (se excava y funde).
Estado del tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
Llegó un viaje de Rajón en Volqueta doble troque.
- Solicita la interventoria allegar los resultados de laboratorio para materiales como: Rajón, B-600, fichas tecnicas de geotextil. que llegó a OBra.
Personal en OBra: 13 ayudantes, 1 oficial, control de Volquetas, topografo y cadenero, equipo de topografia.
Se presentó visita del ingeniero Jhon Villamizar de IDIGER en horas de medio dia.
Localizacion de trinchos para terrazas en ladera.

Jueves 03 de agosto de 2023
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte. equipo utilizado retro excavadora 6 volquetas doble troque se cargaron 25 viajes
Llego un viaje de rajon
se continua con actividades de trinchos se instalaron 9 ml
Se fundio muerto N5 y se excavo para fundir muerto N6.
Se continua con recoleccion de material proveniente de desalojo de casos.
Estado de Tiempo.
Tiempo Seco 7:00 AM a 5:00 PM.

Viernes 04 de agosto 2023
Se realizó recorrido de obra en donde se evidencia que los trinches no cumplen las especificaciones tecnicas, por tal motivo se comunica a los representantes legales de obra e interventoria para ajustar su proceso constructivo.

Viernes 04 de Agosto 2023.
Se realizó recorrido de campo y se pacto realizar limpieza a la ladera en la parte alta antes de los trinchos, asi como instalar señalizacion de "no botar Basura" y realizar Sensibilizacion a la Comunidad, aportar en los informes registros Fotográficos de evidencia de la actividad Cumplida.
Se recomienda hacer recogida de los materiales y desechos acopiados en obra para disponer en Relleno Sanitario.

Lorena Maso Jessica Cabezas Yeny Cuesta Nila

Nota
En los informes semanales y mensuales se debe reportando los registros fotograficos que evidencian el desarrollo de las actividades realizadas, se realizará relación de los registros fotograficos de la actividad.
La recogida de los residuos acopiados en obra se realizará cuando el IDIGER programe en conjunto con la UAESP la volqueta que realizará la gestión.
Yenny Cuesta.
R. Ambiental Vapa

Metodologia Constructiva: La actividad Consiste en conservar el nivel longitudinal de las Capas del suelo en tierra HOMOGENEA en la misma cota o nivel. En el Sentido Transversal se debe nivelar las Capas de Acuerdo A Nivel de Cimentación. Garantizando el Empalme Con el Sentido Longitudinal en la Cota de Continuidad.

19775

La colocación de Rajón Dependerá de las Características de la Arenisca encontrada para la Cimentación, En este Sentido, se Aclara que deberá realizarse Mejoramiento Con Rajón en los Niveles En los Cuales la Arenisca No sea Consolidada; en Caso Contrario, No se Requiere Mejoramiento pero Se debe Nivelar la Superficie Con base y Granulometría para proceder a la Instalación del Geotextil y Subsecuentes Capas.

Se continua con la actividad de excavacion Cargue y transporte, equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas doble troque cubiertas se sigue con actividades de trinchos se instalaron 6 ml.
Se pondio muerto Nº 6.
Se continua con la actividad de recoleccion de material proveniente de desalojo de cortes.
Estado de Tiempo.
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM.
En horas de la noche se retiraron de obra 4 poste de energia quedando 2 postes energizados
Se efectuó comite tecnico # 23 en oficinas de contratista en Obra.

Sabado 05 de Agosto de 2023
Se continua con actividades de excavacion. Cargue y transporte equipo utilizado

Retro excavadora y 6 volquetas. Bulldozer
se continua con actividades de trincheo
se instalaron.
Se continua con actividad de recolección
de material proveniente de desalojo de
cerro.

Estado de Tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM
En comité del día viernes 4 de agosto el contratista se compromete a implementar señalización adicional de la estipulada en el PMT en el punto de conexión entre vía principal del sector y la calle de acceso y salida vehicular de la obra; con el objetivo de evitar accidentes, así como también se estableció un horario de no transito vehicular frente al colegio para permitir salida y entrada de estudiantes.

08-08-2023 Se realiza Visita de Seguimiento al componente Social evidenciando las siguientes actividades:
1) Se evidencia actualización de los puntos satelites de información con el volante de cierre de convocatoria para la generación de empleo.
2) Se efectua levantamiento de dos (2) actas de compromiso, una por afectación a bloque de un muro de vivienda ubicado en la dirección Diagonal 71A - #27 - 26 perteneciente a la Señora Flor Jaramillo, y la Segunda acta de compromiso donde el Contratista Se Compromete a no realizar transito de Volquetas en horarios de ingreso y salida de estudiantes del Colegio Mirador el Paraiso Sede B, ubicado en la calle 71 c bis Sur Con carrera 27.
3) Se realiza divulgación del Volante de transito de Volquetas por via PMT el dia 08 de Agosto de 2023.
4) No se evidencia Presencia de la profesional social interventoria

Lucy Sepulveda Araujo
Apoyo Supervisión Social IDIGER.

Profesional Social obra

08 Agosto 2013

Se realizó recorrido a la obra, en donde se evidencio que no estan cumpliendo con las especfreaciones tecnicas en la zona de trinchos, por tal motivo se solicita a la Interventoria y contratista dar una oportuna intervencion en el cumplimiento del diseño establecido. Ohan Cairo Villamizar.

Se solicita al contratista efectuar las correcciones a los trinchos para terrazas que están instalados a la fecha teniendo en cuenta la especificación y plano respectivo. se debe utilizar madera rolliza de diametro de 10 cm. espaciados 4 m. el uno del otro.
ante la posibilidade de cambiar la madera rolliza por guadua para los postes, el contratista debe efectuar a la interventoria de manera oficial la solicitud de cambio con la sustentacion respectiva.

INCIDENTE.

Se continua con actividad de excavacion, Cargue y transporte, equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetos, 34 viajes
En trinchos se instalaron 9 ML.
Se continua con actividad de recoleccion de material (Basura) proveniente del desalojo de cunetas
Estado del tiempo
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM

INCIDENTE.

Miercoles 09 de agosto
Se continua con Excavacion Cargue y trans. Poste, equipo utilizado retro excavadora y 6 volquetes.

Se continua con actividades de armado de trinchos. se instalaron. 6 ml.
Ingreso de vibro compactador Dynapac. CA 15,
Se arregla polisombra en boca calles y aledaño a la ladera donde a sido vandalizado.
Visita del Ingeniero Jhon Villamizar apoyo a Supervisor, se verificó los postes pendientes de retirar que pertenecen a Codensa.
Se retira un viaje de basura por parte UAESP
Estado de tiempo:
Lluvia moderada 7:00 AM a 11:00 AM
Tiempo seco 11:00 AM a 5:00 PM.

Jueves 10 de agosto de 2023
se realiza acompañamiento de la interventoría donde indican HSE al personal del contratista, se ejecuta recorrido de obra se verifica que existan los puntos de hidratación, para el personal, que se cuente con los equipos para atención de emergencias (camilla, botiquin, extintor), que el personal porte de forma adecuada los EPP's, que hay instalada la señalización y punto ecológico.

[illegible]
Residente SST - HSA
Interventoría

Jueves 10 de agosto de 2023.
Se realiza recorrido con la alcaldía de Bogotá, Secretaría de Hábitat en compañía del IDIGER para conocer el avance de la ejecución en obra, adicionalmente se realizó comite en obra en los cuales se pactaron unos compromisos en la parte parte ambiental tales como:
1. El 11 de agosto la interventoria se comprometio en entregar por vía correo informe mensual N°4 para

Su debida revisión y aprobación por parte de la Supervisión.
2. El 14 de agosto el contratista se comprometio en entregar la documentación subsanada del aprovechamiento forestal por via correo a la Supervisión antes de medio día.

Lorena Alonso  Jessica Cabezas

Viernes 11 de Agosto de 2023.
Se realiza recorrido por parte del componente Ambiental de Interventoria y se solicita al contratista poner las mallas correspondientes en los sumideros ya que solo 1 se encuentra parcialmente cubierto.

NILA Y CONTRERAS S -Profesional ~~SST~~ de Interventoria

Jueves 10 de Agosto de 2023
se continua con actividades de excavacion cargue y transporte 20 viajes de doble troque equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas doble troque
se continua con la actividad de excavacion para trinchos
se continua con recogida de material producto de desalojo de cunetas
Estado de tiempo:
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM.
Se retiraron 20 viajes de excavación.
Se reitera por parte de la interventoria la correccion urgente de los trinchos para terraza instalados. deben cumplir con especificacion y plano, de lo contario deberán ser retirados y reinstalados.
Estamos pendiente de la entrega de laboratorios de materiales pétreos utilizados en obra.

Viernes 11 de agosto 2023.
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte 28 viajes de doble troque, equipo utilizado retroexcavadora y 6 volqueton doble troque.
Se continua con la actividad de excavacion para trinchos.
Se continua con recogido de material proveniente de desalojo de cajon
Estado de tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Sabado 12 de Agosto 2023
Se continua con actividades de excavacion para instalacion de trinchos.
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte 8 viajes de doble troque Equipo utilizado retroexcavadora y 6 volqueton doble troque.
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM
Se solicita al contratista presentar la caracterizacion de materiales petreos

Domingo 13 de Agosto 2023
Se instalo base granular extendido y compactado,
Se Riego tendidos reconformacion nivelacion con base extendido y compactado
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Lunes 14 Agosto de 2023
Se continua con actividades de excavacion
Cargue y transporte. 21 viajes de dobletroque
equipo utilizado, retro excavadora y
6 volquetas doble troque.
se continua con actividad de excavación
para instalacion de trinchos
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
Nuevamente se solicita al contratista hacer entrega
de la caracterización de materiales pretos,
asi mismo en la construcción de relleno se
deben tomar las densidades para garantizar
la solicitudes establecidas en las especificaciones
tecnicas

Martes 15 Agosto de 2023.
Se continua con actividades de excavacion
Cargue y transporte, 32 viajes de volqueta
doble troque, equipo utilizado retro excavadora
y 6 volquetas doble troque.
Se continua con actividad de excavacion
para instalacion de trinchos.
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Miercoles 16 Agosto de 2023
Se continua con actividades de excavacion.
Cargue y transporte, 17 viajes de volqueta
doble troque.
equipo utilizado retro excavadora y 6 volquetas
doble troque.

se continua con la actividad de excavacion para instalacion de tableros para trinchos
- En horas de la noche del dia anterior (martes 15 de agosto) se retiro poste q' estaba en el costado norte de la obra queda poste costado sur.
Estado de tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Jueves 17 agosto de 2023
Se continua con la excavacion, cargue y transporte. se retiraron 24 viajes en volqueta doble troque.
Se continua con actividad de excavacion para instalacion de tableros para trinchos.
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Viernes 18 de agosto de 2023
nuevamente estamos recordando al contratista que se debe allegar a la interventoria la caracterizaciones de materiales petreos a utilizar, asi como los diseños de mezclas para concretos a preparar en obra. La caracterizacion de materiales se ha solicitado en varias ocasiones como anotacion en esta bitacora. asi como por oficios radicados al consorcio Vapa.
- Con respecto a los trabajos a ejecutar en fines de semana incluido festivos, debe haber un permiso aprobado por la alcaldia local.
"Permisos para operación de equipos de construcción y reparacion de vias y generadores de ruido ambiental en horarios restringidos.
Está reglamentado en el Decreto 948 de 1995, en el

Distrito Capital la solicitud debe realizarse por parte del constructor usando el formato adoptado mediante resolucion 1391 del 6 de Octubre de 2023, los documentos que deben adjuntarse a la Solicitud son: Poder debidamente Otorgado, cuando se actue mediante apoderado, planos Catastro Distrital (1:10.000) ó (1:25000) indicando la Ubicación de las Obras, autoliquidación del cobro por el Servicio de evaluacion aplica la resolución 5589 de 2011, Original y 1 copia de Recibo de consignacion.

- En la construcción de trinchos se debe seguir la especificacion respectiva sonto a los planos establecidos, para que la interventoria le de aprobación y se puedan cobrar en Actas.

Se continua con la actividad de excavacion cargue y transporte se transportaron 34 viajes de doble troque.
Equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas doble troque
se continua con la excavacion para instalacion de trinchos
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 2:00 PM.
lluvia moderada de 2:00PM a 4:00 PM.
Tiempo seco de 4:00 PM a 6:00 PM

Sabado 19 Agosto de 2023
Se continua con actividad de excavación cargue y transporte. se transportaron 17 viajes.
Equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas doble troque.

Se continua con actividades de excavacion para instalacion de trinchos.
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Martes 22 de agosto de 2023.
Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte. 34 viajes de doble troque equipo utilizado retro excavadora y 7 volquetas doble troque
Se continua con actividades de excavacion para trinchos.
Estado de tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 6:00 PM.
Se tuvo visita de personal de enel-codensa revisando el estado de la obra para ingreso de camion para retiro de poste.
Se programo para el dia Jueves 24 de agosto de 2023.

Miercoles 23 de Agosto de 2023
Se realiza recorrido por parte del componente ambiental de Interventoría, se encuentra uno de los sumideros correctamente cubierto con polimalla, las demas estan pendientes. El punto ecologico ha sido trasladado dentro de la obra de acuerdo con las indicaciones dadas por la Interventoria. NILA Y. CONTRERAS S. - ~~Residente~~ Interventoria
Se continua con actividad de excavacion cargue y transporte. 24 viajes en volqueta doble troque Equipo utilizado retroexcavadora y siete volquetas doble troque
Se continua con actividad de excavacion para armado de trincho
Estado de tiempo

Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Jueves 24 agosto de 2023
Se continua con la actividad de excavacion cargue y transporte
equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas doble troque.
Se continua con la actividad de excavacion para instalacion de trinchos.
En horas de la mañana se realizo el retiro de luminaria y cables del poste de codensa. enel ubicado en el K0+005 en horas de la tarde se realizo el retiro de este.
Estado del tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
en la calle 71 F Sur se debe retirar pozo de inspeccion por estar cimentado sobre material comun en el sector del muro; y reconstruir dentro del Relleno a ejecutar.

Viernes 25 Agosto de 2023
Se continua con la actividad de de excavacion cargue y transporte.
equipo utilizado, retroexcavadora y 6 volquetas doble troque.
Se retiraron 8 viajes en volqueta doble troque.
Se continua con actividades de excavacion para la instalacion de Trinchos.
Se realizo comite tecnico en los

oficina del consorcio VAPA.
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
En comite tecnico y recorrido se solicito el trabajo los fines de semana.

Sabado 26 de Agosto.

Se realiza acompañamiento en el control de asentamientos en la zona del trasmicable, se realiza chequeo y verificación de niveles en relleno.

Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte.
equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas doble troque. 5 unds de doble troque
se continua con actividades de excavacion para instalacion de trinchos
se inicia actividad de aplicacion de inmunizante de madera.
Estado de tiempo.
tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

28 Agosto 2023

Se realizó el recorrido a la obra en donde se evidencio en la zona de trinchos, es necesario inmunizar en su totalidad los poste de madera Siendo notorio que se ha realizado de superficial (parte externa) y no se realiza en la parte que ha sido incada (parte enterrada)., por lo tanto se comunica al residente de obra y al contratista cumplir las especificaciones tecnicas contempladas en el diseño, el cual fue estipulado por la entidad en su parametros y objeto contractual. Jhon Pedro Villamizar.

Se informa que la madera (Guadua) que se encuentra incada se esta sacando pintando la y volviendo a ser incada.

se continua con actividad de excavacion cargue y transporte, se retiraron 29 Viajes en volqueta doble troque, equipo utilizado retroexcavadora y 6 volquetas.

se continua con actividades de instalacion de trinchos,

Estado de tiempo

Tiempo seco de 7:00 am a 5:00 PM.

23 de Agosto 2023

Se realiza recorrido por parte del componente ambiental de interventoria se encuentra punto ecologico y de hidratacion correctamente ubicados tanto en obra como oficina, los 3 sumideros se encuentran cubiertos, no obstante el que se encuentra al lado del colegio presenta desgaste.

NILA Y CONTRERAS S.
Profesional Gestion
Interventoria

Agosto 29/2023.
Solicita la interventoría dar cumplimiento a la especificación y planos de los trinchos para terrazas; estos deben estar una longitud de 1:30 metros enterrados, los postes deben ser de 2:50.
En sitios donde el anclajado sea muy difícil por existir roca; el contratista debe presentar una propuesta para instalacion de estos postes de tal forma que garanticen la estabilidad de la terraza.
La interventoría no se hace responsable de construcciones que no cumplan con lo solicitado tecnicamente en documentos.
La madera en general debe estar inmunizada.
asi mismo la tabla debe estar anclada al poste con tornillos tal y como se muestra en el plano.

Se continua con actividad de excavacion cargue y transporte,
equipo utilizado:
retro excavadora y 6 volqueton doble troque
se continua con actividad de excavacion de trinchos, inmunizada de madera tanto tabla buitacomo guadua.
Estado de tiempo:
tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

1782

Agosto 30 de 2023

Se realiza recorrido de obra, se observa sumidero 1 con protección de polimalla, sumidero 2 esta con la polimalla pero esta algo deteriorada por el paso de los vehículos, se solicita al contratista mejorar, sumidero 3 sin protección, actualmente no se usa vía para el ingreso y salida de volquetas, cuando se use se le instalara la polimalla eizd. Se cuenta con el BOAL, controlador de tráfico, dos (2) puntos de hidratación y punto ecológico en el frente de obra. El personal cuenta con los EPP's adecuados, esta la señalización instalada y visible en los frentes de obra.

NELLY M. CONTRERAS S.
Profesional SST-HSE
Interventoría

Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte.
Equipo utilizado.
Retroexcavadora y 2 volqueta doble troque para viajes internos.
Se continua con actividad de excavacion para instalacion de trincha, inmunizacion de madera tanto table burro como guadua.
Estado de tiempo:
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
Llega a bodega 2000 ladrillo para construccion de cajamos de proteccion para tuberia (2ø3) electrica.

31 de agosto de 2023
se realiza recorrido en conjunto con profesional ambiental del contratista, se observa el personal de ROA, se informa por residente de obra del cerramiento que por el momento no se realizara mas retiro de ROA. El contratista informa que hoy se programo mantenimiento de peluqueo en sendero 2 obra esta en adecuadas condiciones de orden y aseo. se tienen disponibles baños para el personal y estan en buen estado.

Profesional SST-HA
Interventoria

Se continua con actividades de excavacion
Cargue y transporte
Equipo utilizado retroexcavadora y 4 volquetas doble troque
Se continua con actividad de excavacion para instalacion de trinchos, inmunizacion de madera tabla buena y guadua.
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
la interventoria espera respuesta con respecto a lo solicitado con respecto a la instalacion de postes para trinchos para problemas en las excavaciones al encontrar roca y no poder excavar a la profundidad solicitada.
a pesar de continuar con la instalacion la interventoria se reserva no ha dado concepto al respecto.

Septiembre-01-2023
Se solicita al contratista por parte de la interventoria que el anclaje de la tabla a los postes de guadua en los trinchos para terrazas debe ser con tornillos como muestra el plano y solicita la Especificación

Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte, se continua con actividades de construccion de trinchos
Equipo: Retro excavadora Kobelco 210, vibrocompactador, minicargador 5 Volquetas, Rana, equipo topografia
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM

Sabado 2 de Septiembre

Se realiza levantamiento topografico por parte de la interventoria para chequeo de avances de obra, Se realiza verificacion con el topografo del contratista de:

1. 8 capa desde la abscisa K0+030 hasta la K0+080 donde se encuentra dentro de los parametros establecidos
2. 1 capa desde K0+260 hasta la K0+290; donde se observa que esta dentro de los Parmetros estableciados.
3. Se revisa puntos auxiliares de topografia para observar como estan.
4. Se realiza la enabracion de actividades esta 3

Topografia Interventoria

Se continua con actividades de excavacion cargue y transporte, equipo utilizado retro excavadora y 2 volquetas doble troque.
El dia de hoy se hace el retiro dela retro excavadora.
Se continua con la actividad de trinchos
Estado de tiempo
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
Se reitera la Solicitud de la Interventoria de -

anclar las tablas de los trinchos a los postes de guadua. con tornillos como se muestra en plano y se Solicita en especificacion, antes de efectuar el Relleno.

Lunes 04 septiembre de 2023.
Se continua con actividades de construccion de trinchos
Estado de tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM
Extendido y compactacion de base granular.

Martes 05 Septiembre de 2023
Se continua con actividades de construccion de trinchos.
Estado de tiempo
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM.
Extendido y compactacion de base granular.

Miercoles 06 septiembre de 2023
Se continua con actividades de construccion de trinchos
Extendido y compactacion de base granular.
En horas de la mañana el sñ propietario del lote ubicado en la cll 71 6 Bis 50r con cr 27 esta construyendo cimentacion columna y zapata saliendo de los parametros Esta actividad fue informada a los socios de interventoria como del contratista

para su respectivo tramite.
Solicita la interventoria iniciar reforzo en concreto para anclaje de los postes de los trinchos segun plano y solicitud aprobada. por parte de interventoria. Se hace necesario ejecutar esta actividad con urgencia y dar inicio a los rellenos; con esto se evita el hurto de las tablas, por poste de los Vandalos.

Jueves 07 septiembre de 2.023
Se continua con actividades de construccion de trinchos.
Extendido y compactacion de base granular

Viernes 8 de Septiembre, Se realizo comite de obra en el cual no se generaron Observaciones ni compromisos de igual manera se hace recorrido por la obra y puntos Satelites. Se realizo retroalimentacion de las observaciones del informe mensual N6 para ser Subsanadas.

Se continua con actividades de construccion

de trinchos
Extendido y compactacion de base granular
se reitera la solicitud al contratista de iniciar de a. Colocar el concreto en la pata de postes para trinchos con urgencia, Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Sabado 9 Septiembre de 2023
se continua con actividades de construc. cion de trinchos.
Extendido y compactacion de base granular,
Tiempo Seco: de 7:00 AM a 5:00 PM.
Equipo: un Vibro-compactador dinapac ca-15 un minicargador, compactadores manuales - rana y canguro. planta electrica, herramienta menor.

Lunes 11 Septiembre de 2023
Se continua con actividades de construccion de Trinchos,
Extendido y compactacion de base granular.
Estado de tiempo.
Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.
Equipo: minicargador, vibro-compactado ca-15 Dinapac Vibrocompactadores manuales, Rana y canguro, planta electrica, equipo de topografia.
Solicita la interventoria colocar en obra dos equipos independientes para colocacion, extendido y compactacion de base granular.

Martes 12 septiembre de 2023
Se continua con actividades de construccion de trinchos.
Extendido y compactacion de base granular.
Estado de tiempo
Tiempo seco 7:00 AM a 5:00 PM
Equipo utilizado, Minicargador, vibro-compactador Dynapac CA15, vibro-compactadores manuales, rana y canguro planta electrica. equipo de topografia.
La interventoria solicita tener especial cuidado en la compactacion de base granular en los bordes externos; donde se presenta mayor dificultad. para obtener la densidad solicitada.

MIERCOLES 13 de SEPTIEMBRE de 2023, Se realiza acompañamiento del componente social verificando las actividades reportadas en la Programación Semanal. Recorrido por la zona de obra y Puntos Satelites. NO Se Reporta novedad

Jueves 14 Septiembre, Se realiza recorrido a la obra en donde no se encuentra el residente de interventoria y Se puede encontrar las siguientes novedades en campo:
- El personal de obra no hace presencia en el costado norte de la obra, por lo cual se hace un llamado de atencion al contratista ante los constantes requerimientos de incorporar mas frentes de obra y maquinaria para que el avance de obra sea notorio.
- Al revisar los diseños del proyecto no tienen similitud a lo ejecutado en obra segun los cortes y abscisas del proyecto.
- Los traslapos del geotextil presentan variación, por lo que

no se estaria cumpliendo las especificaciones tecnicas, por tal motivo se solicita a la interventoria revisar la situación para tomar los correctivos

- Al revisar el muro en tierra armada y las capas realizadas se evidencia una altura de capa de 20 cm, lo cual no esta acorde a los diseños, por lo cual se informa a la interventoria la situación para que proceda con los correctivos. y se cumplan de la mejor manera las actividades contractuales. Ing Pedro Villamil

Interventoria - Jueves 14 de Septiembre

En atención a la nota de bitacora generada por la supervisión del contrato 002 fondiger, la interventoria permite hacer las siguientes aclaraciones:

1. El residente de la interventoría se encontró en obra hasta las 9:10 am y debido a una cita medica que lo acudia se tuvo que retirar sin embargo, como apoyo tecnico se encontraba el Ing. Jesson peña de parte de la interventoria.

2. Con respecto al personal de obra, estos se encontraban desde la abscisa. K0+00 - K0+120 realizando traslado de bolsas para la conformacion del muro en tierra Armada, adicionalmente dentro de la visita se pudo constatar que el geotextil se encontraba extendido y traslapado. para asi continuar con el lleno de material granular.

3. Con respecto a las diferencias encontradas por el supervisor en la bitacora de obra, es importante aclarar que ~~desde~~ de de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el contratista de obra en el Informe de Geotecnia V2. El muro en tierra armada debe cimentarse sobre una arenizca consolidada o (ROCA). En razón de lo anterior y cumpliendo el criterio del geotecnista diseñador, las excavaciones han sufrido modificaciones derivadas de las condiciones del terreno encontrado, es decir ha sido necesario aumentar o disminuir las excavaciones generando

1776

así diferencias con las secciones originales de diseño. Adicionalmente el contratista de obra se encuentra realizando renivelaciones con material granular para así poder ejecutar las capas de muro en tierra armada de forma homogenea.

4. Respecto a lo manifestado en la anotación de bitácora por parte del supervisor de obra, se aclara que el contratista continua con el lleno de las abscisas K0+00 y la K0+040. de forma escalonada con el fin de cumplir la pendiente de diseño.

5. Respecto a lo manifestado en la anotación de la bitacora de obra. los traslapos que tienen los geotextiles superan los 30 cm que especifican los detalles constructivos de diseño.

Solicitud:

Por ultimo la interventoria solicita a la supervisión realizar los recorridos de obra de manera conjunta con el fin de poder aclarar dudas o requerimientos de manera inmediata..

Ing. Residente Interventoria

Residente Interventoria

Residente Obra

Residente Obra.

Viernes 15 de Septiembre de 2023.

Se continua con actividades de trinchos

Extendido y compactacion de base granular

Equipo utilizado Mini cargador, vibrocompactador Dynapac CA15, vibrocompactadores manuales rana y canguro, planta electrica, equipo de topografia

Estado de tiempo.

Tiempo seco de 7:00 AM a 5:00 PM.

Se solicita al contratista entregar la caracterización de la nueva base que se inicio a instalar el dia de ayer. 14 de septiembre.

Sabado 16 de Septiembre de 2023.
Se continúa con instalacion de estacones en madera para construcción de terrazas, adicionalmente se inició llenado de las mismas con material proveniente de las excavaciones.
Se continúa con instalación de base granular.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador 1 Cuadrilla topográfica, Equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7:00am - 5:00pm. SECO

Lunes 18 de Septiembre de 2023
Se continúa con la conformación de las terrazas en madera, (Instalación de estacones en madera, Fijación de tabla burra, Fundida de dados en perfiles de menor altura)
Se continúa instalación y compactación de BG.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Cuadrilla topográfica, equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7:00 am - 5:00 pm SECO

Martes 19 de Septiembre
Se realiza el recorrido a la obra de manera conjunta con el residente de interventoria, en donde se evidencia lo siguiente:
- El traslapo del geotextil no se esta realizando de manera correcta, lo cual no cumple las especificaciones tecnicas, por lo cual se solicita a la interventoria brindar un efectivo acompañamiento en la ejecución de dicha actividad. Jhon Claro Villamizar

1787

Martes 19 de Septiembre de 2023
Se continúa con la conformación de las terrazas en madera. (Instalación de faja base, fundida de dados en concreto y relleno con material proveniente de excavaciones).
Se continúa instalación y compactación de base granular.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Comisión topográficos, equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am – 5pm SECO.
Respecto a la anotación de bitácora que antecede, el consorcio Vopa no considera procedente que se generalice de parte del apoyo a la (Construcción) Supervisión el no cumplimiento de los traslapes del geotextil toda vez que de 5 inspecciones, 1 se encontraba desplazado. No obstante de manera inmediata, se subsano y se atendió la observación por parte del área técnica del Contratista en compañía de la firma interventora.

Residente de Obra. CAR.

Miercoles 20 de Septiembre de 2023
Se continúa con la construcción de terrazas en madera,
Se continúa instalación y compactación de base granular.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Comisión topográficos y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7:am – 5pm SECO.

Jueves 21 de Septiembre de 2023
Se continúa con la conformación de las terrazas en madera,
Se continúa instalación y compactación de base granular.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Comisión topográfica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am – 5pm SECO

Viernes 22 Septiembre

Se realiza recorrido a la obra en donde se evidencio lo siguiente: No se esta cumpliendo con las especificaciones tecnicas en los trinchos y en la calidad de instalar la tabla barra, la cual presenta defectos. Jhon Fairo Villamizar Rea.

Se realiza recorrido en obra evidenciando el avance de la semana
Se realiza visita al predio haciendo Seguimiento de las fisuras que presenta los apartamentos del tercer piso, al cual se Segura llevando Segumento para evidenciar si son causadas por las actividades de la Obra.

Profesional Social de interventoria

Viernes 22 de septiembre de 2023
Se continuan con actividades de Cadena, Construcción de terrazas en madera.
Se Continua instalacion y Compactacion de base granular.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 VibroCompactador, 1 Comision topografica y equipos menores de compactacion
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO
* Respecto a la anotacion de bitácora generado por el apoyo a la supervisión, el consorcio vapa solicita ser mas especifico toda vez que no se puede generalizar la conducción del material aun cuando este ya ha sido verificado previamente por la interventoria. No obstante se realizará recorrido de obra en conjunto con el residente de interventoria a fin de poder identificar el material que no cumpla con la calidad requerida.

Sabado 23 de Septiembre de 2023
Se continuan actividades de Cadena, Construccion de terrazas en madera.
Se Continua instalacion y Compactacion de base granular.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 VibroCompactador, 1 Comision Topografica
Estado del tiempo: 7am - 12m SECO.

Lunes 25 de Septiembre de 2023
Se Continua con actividades de ladera; Conformación de terrazas en material. (instalación de estacas, instalación de tabla burra y relleno con material proveniente de excavaciones. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 Camión topográfica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.

Martes 26 de Septiembre de 2023
Se realiza visita de campo por parte de los Ingenieros de apoyo Rafael Niño y Oscar Muñoz, se hace recorrido con los profesionales de obra Carlos López - Arq Residente y Edwin Zambrano Ing. Residente y la Arq. Paola Moreno. Se sugiere por parte de la supervision revisar el diseño entre las abscisas K0+000 a la K0+030 ya que se aprecia que constructivamente con la implementacion de unas rampas se permitiría disminuir la pendiente pronunciada del 14.78% aproximadamente a un 10%, lo cual permitiria estar dentro de la normatividad y cambiar el perfil arquitectónico, siendo paisajísticamente mas amable con el paseo illimani y con el potencial turistico al tiempo con la población discapacitada.

Martes 26 de septiembre de 2023
Se realiza visita de campo por parte de los ingenieros Antonio Morales y Fernando Nieto, geotecnista de la interventoria, revisando la zona de la remoción en masa en la zona del proyecto, se recomienda realizar obras para el manejo de escorrentia superficial, revegetalizacion del talud, especialmente en la zona meteorizada, donde ocurrió el deslizamiento, realizando una reconformación del talud, las obras deben realizarse en época seca, en lo posible

Martes 26 de Septiembre de 2023
Se continúan actividades de ladera; (Instalación de tabla barra, Instalación de estacones en madera, Relleno con material proveniente de excavaciones), Se continúa con instalación de base granular, Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Comisión topográfica y equipos menores de compactación, Estado del tiempo: 7am – 5pm SECO.

Miercoles 27 de Septiembre de 2023
Se continuan actividades de ladera; (Instalación de tabla barra, Instalación de estacones en madera, relleno con material proveniente de excavaciones). Se continúa con instalación y Compactación de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Comisión topográfica y equipos menores de Compactación.
Estado del tiempo: 7am – 12m SECO
1pm – 3:30pm Lluvias.

Jueves 28 Septiembre de 2023
Se continuan actividades de ladera; (Instalación de tabla barra, Instalación de estacones en madera, relleno con material proveniente de excavaciones) Se continua con instalación y Compactación de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 comisión topográficas y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 12m SECO
1pm – 230 Lluvias.

Viernes 29 Septiembre de 2023
Se continuan actividades de ladera, Construcción de terrazas en madera. Instalación y Compactación de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Comisión topografica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: Lluvias 3 – 4 pm.

Sábado 30 de Septiembre de 2023
Se continuan actividades de ladera; Construcción de terrazas en madera, se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibro, 1 camion topografica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7 - 11 am SECO.

Lunes 2 de Octubre de 2023
Se continua con actividades de ladera; Lleno de terrazas con material proveniente de excavaciones. Se continua con instalación de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 camión topográfico y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.

Martes 30 octubre/2023
1) Se realizó recorrido en obra y almacén encontrando lo siguiente: Se observó humectación de vias por parte de un trabajador utilizando la manguera 2) Se recomienda señalizar y demarcar las zonas en las cuales se pueda presentar caida a distinto nivel (muro de armado en tierra). 3) Se recomienda realizar el cambio y/o la recarga del extintor multipropósito de 20lb ubicado en el almacén 4) Se evidenciaron recipientes con liquidos (sustancias desconocidas) sin marcar o rotular. Se recomienda rotular las sustancias químicas presentes en el almacén. 5) Se recomienda capacitar al almacenista en manejo de sustancias quimicas 6) Se recomienda elaborar e instalar la matriz de compatibilidad de sustancias quimicas. 7) Por favor, remitir a la interventoria el inventario de equipos para trabajo seguro en alturas, las fichas técnicas y los formatos de inspección o hojas de vida. Se evidencio un (arnes) sin inspección (sin diligenciar la casilla de fecha de inspección). Las hojas de seguridad (MSDS) deben encontrarse junto a la sustancia quimicas

Ing. Carlos Soto
SIAPO Interventor

Martes 03/10/13 Se realiza visita de obra por parte del apoyo a la supervisión del IDIGER, en compañía de los Ing. Residentes de obra, se identifica que vienen humectando el material seleccionado en los llenos del muro en tierra armada, vienen adelantando el lleno en los trinchos y la actividad de llenado de sacosuelo; En la visita anterior el contratista se había comprometido ingresar una excavadora de oruga para agilizar el lleno de los trinchos y dentro una Panoramica Progresiva en el proyecto, la oruga no ha ingresado a hoy Por lo tanto la supervision considera realizar á la brevedad con el fin de adelantar estas actividades atrazadas.
Se recomienda dar un poco más de celeridad en la construcción del muro en tierra armada, Pues durante el recorrido de obra no se evidencio ingreso de material, quedando algunos recursos a media marcha por falta de material.

Rafael Niño.

Martes 03 de Octubre de 2013
Se continuan labores de construcción de terrazas en madera sobre ladera; Se continua con instalación y Compactación de base granular. Se cuenta en obra con 1 mincargador, 1 Vibrocompactador, 1 Camion topográfica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.

Miercoles 04 de Octubre de 2013.
Se continuan actividades de Construcción de terrazas en madera, Se continua con instalación de base granular, Se cuenta en obra con 1 mincargador, 1 Vibrocompactador, 1 Camión topográfico y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.

1290

05 de Octubre de 2023.

Se realiza recorrido de obra evidenciando el avance de la misma. Se realiza nivelación de chequeo por parte de la interventoría comparando el diseño VS lo ejecutado por el contratista y se evidencia que cumple dentro del objeto contractual. Se realiza la verificación de coordenadas topográficas correspondientes al muro en tierra armada. para la cual se lleva en forma correcta..

Jesson Pérez
Mapo Ingeniería SAS.

05 de Octubre de 2023
Se continuan con actividades de Ladera; Construcción de terrazas en madera. Se continúa con instalación y compactación de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibro compactador, 1 Camión topográfico. y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: LLUVIAS INTENSAS EN HORARIO NOCTURNO.

06 Octubre de 2023
Se realiza acompañamiento del componente Social, evidenciando el avance de la obra la cual continua armando el muro en tierra armada. Se realiza recorrido por la zona aledaña a la obra identificando si la comunidad presenta alguna inconformidad pero no se presento ninguna queja. Se evidencia mantenimiento de los Puntos Satelites que se realizo el miercoles 4 de octubre instalando el volante informativo del Taller de Cultura Ciudadana. Se realiza visita al predio Cra 27A #71F 54 sur. para hacer seguimiento

07-10-2023 Se realiza el cierre de los Hallazgos que se presentaron SST. En recorrido con interventoria el dia martes 3 de octubre.

1 Reubicacion de Embalaje que contienen productos quimicos de aseo.
2 Se instala un extintor en buenas condiciones. con su recarga vigente.
3 Senalizacion de prevencion en el perimetro del muro armado en tierra.
4 Se facilita. en el almacen las fichas/hojas de seguridad. de productos quimicos que usamos para las actividades - gasolina & impunizante para madera.
5 Se capacita al almacenista sobre el manejo de productos quimicos.

- Se cambia algunas senalizaciones en el Almacen. y ubicacion

Yenny Acosta
Residente SST - Ambiental Consorcio Vara.

07 de Octubre de 2023
Se continuan actividades de Madera, Construccion de terrazas en madera. Se continua instalacion y compactacion de base granular. Se cuenta en obra con 1 Camion topo. grafica, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora y equipos menores de compactacion.
Estado del tiempo: Lluvias 7 - 11 am

09 de octubre de 2023
Se continuan actividades de Ladera, Construccion de terrazas en madera. Se continua con instalacion y compactacion de base granular. Se continua con mejoramiento del terreno en zona de Ladera con el fin de iniciar actividad de instalacion de geobloque. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora, 1 camion topografica y equipos menores de Compactacion.
Estado del tiempo: Lluvias intensas - fin de semana (7 - 8 octubre). Lluvias nocturnas

1 of 11

10-10-2023

Solicita la interventoria que una de las solicitudes técnicas para recibo parcial de trinchos de terrazas, es la verticalidad de estos, por lo tanto aquellos que a la fecha muestren algun grado de inclinación deben ser reparados. INT.

Miercoles 11 Octubre/23

Se realiza recorrido de obra verificando la actividad de colocación de geotextil (geomembrana) en el suelo. De igual manera llega personal y vehiculo de Laboratorio Idicol para realizar pruebas y ensayos de material. Se observaron los conos elaborados en la obra para señalización y demarcación de areas. Se observo ingreso de la volqueta de placas SNT929 color blanco. Se instala punto (ecológico) de hidratación en el area operativa. Se verifica y suministra tapabocas para el personal de obra (Control del material particulado). Se realiza observación de seguridad (evitar trabajadores en el radio de operación de la excavadora).

Ing. Carlos Soto (Interventoria)

11-10-2023

Se realiza visita de obra por parte del apoyo a la supervisión, continuan con las actividades del Muro en Tierra Armada, dando pendiente en el costado Sur de la Plataforma, continuan actividad de nivelación y conformación de Trinchos, se inicia el extendido de geomalla. Se toman densidades a capas del Muro en tierra Armada se realiza 3 pruebas 104,1, 103,0, 101,3 de densidades con densimetro nuclear, en obra hay un vibrocompactador, un mini-cargador, una excavadora Oruga 330 F, 1 volqueta. Se recomienda excavar el frente de K0+150 al K0+210, con el fin de dar empalme al muro. De la interventoria se encuentra el Ing. Residente, se comisión del Topografico de Interventoria no estuvo en obra.

INT

Miercoles 11 de octubre de 2023
Se continuan actividades en ladera; Construccion de terrazas en madera y se inicia instalacion de geobiomalla para revegetalizacion de ladera. Se continuan actividades de instalacion y compactacion de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 minirretro, 1 camioneta topografica, 1 Vibrocompactador, Equipos menores de compactacion.
Estado del tiempo 7am - 5pm SECO.

Jueves 12 de Octubre de 2023
Se continua intervencion sobre ladera; Construccion de terrazas en madera, instalacion de geobiomalla para revegetalizacion de ladera. Se continua con instalacion de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador 1 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador, 1 Camioneta topografica y equipos menores de compactacion.
Estado del tiempo: 7 am - 5pm SECO

Viernes 13 de Octubre de 2023
- Recorrido componente Ambiental
Se hace recorrido en obra el cual se identifica lo siguiente:
1. Se evidencia 2 trabajadores en la ladera instalando unas trinchas de las cuales no se evidencia la linea de vida
2. Se evidencia 2 trabajadores sin overol, guantes y gafas.
3. Se hace la recomendacion al contratista de Obra que cada vez que salgan las volquetas de obra la via se encuentre previamente humectada para minimizar la contaminacion atmosferica
4. Se solicita al contratista realizar el informe, con planos, Concepto fitosanitario de los especies arboreas y Concepto tecnico del Cual ya no se necesita el Permiso Silvicultural para el dia 17 de Octubre de 2023

Jessica Cabezas - IDIGER

Solicita la interventoría tener especial cuidado al ejecutar las excavaciones y rellenos en los sectores adjuntos a las viviendas existentes, debido a que pueden ser afectadas.

Viernes 13 de Octubre de 2023
Se Continuan labores y/o actividades de ladera; Construcción de trinos en madera e instalación de geobiomalla para revegetalización. Se continua instalación y compactación de base granular. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora, 1 Comision topográfica y equips menores de compactación.
Estado del tiempo: Todo el día SECO

Sabado 14 de octubre de 2023
Se continua con instalación y compactación de base granular; Se continuan labores de estabilización y reducción de riesgos en ladera con la construcción de terrazas en madera y instalación de geobiomalla para revegetalización. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora 1 Comisión topográfica y equipos menores de compactación.

17/10/2023
Se realiza recorrido de obra por parte del Apoyo a la Supervision del IDIGER, continuan actividades de excavacion y armado de Muro en tierra, inician actividad de Muro Berlinés, para lo cual se debe hacer un cronograma de avance semanal, teniendo en cuenta que es una ruta crítica de avance con las actividades sucesoras, Se recomienda dar celeridad en la construcción de Muro en tierra armada del KO+140 al KO+220, tambien en

el costado Norte. es importante que el contratista reorganice su cronograma en todas sus actividades teniendo en cuenta que la obra terminada es el 30/10/2023.

18/10/2023

se realizo visita por parte de componente ambiental Marco Fernando Chaparro y componente social Martha Rodriguez. se realiza recorrido por la obra evidenciando trabajos en obra, deposito de agua, fuga por ruptura de tuberia, riego de via (humectación) según compromiso con ciudadano.

Prof social de apoyo. IDIGER

Prof. Ambiental de apoyo. IDIGER.

18/10/2023

Se realizo acompañamiento a la entrega de volantes de invitación a la Socializacion de los ajustes realizados a los diseños arquitectonicos y el volante de inicio del muro a las fachadas que Colindan a la ladera. Se realizo visita a la vivienda Cll 71c Sur # 27-46. la cual ha presentado Fisuras y Grietas en la pared, Se realiza levantamiento de acta de vecindad en la que se aclara que a partir de hoy 18 de Octubre Se hace Seguimiento a la vivienda ya que Cuando se realizo la actividad de levantamiento de actas de inicio, No Se Permitio el ingreso al Segundo piso para hacer el registro Fotografico y escrito de este apartamento. Actualizacion de los puntos Satelites.

Prof. Social Interventoria.

19 de octubre 2023

Se continúan actividades sobre Ladera para reducción de riesgos; Construcción de terrazas en madera e instalación de geoloxmalla para revegetalización. Se continua con instalación y compactación de base granular. Se cuentan en obra con 1 mincargador, 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 1 Camión topográfica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.
Nov: Se rediza reparación de tubería de agua potable en absc K0+210 por parte de las EAAB.

24/10/2023

Se realiza recorrido de obra por parte del apoyo a la supervisión del IDIGER. y de acuerdo con las actividades que se vienen desarrollando en la obra (Excavación Mecánica) del K0+140 al K0+200, encuentro la siguiente observación y apreciación: No comparto el criterio del Geotecnista al contemplar en los diseños unas Profundidades de excavación mayor a 2m, pues en un Principio se había contemplado retirar la capa Vegetal ±0.30 m y una capa de arcillolita Rojiza alterada ~~por~~ contaminada por la capa Vegetal ±0.5m. En este tramo los materiales que afloran son conglomerados de buena resistencia y a mi criterio no se debían excavar a esas Profundidades, teniendo en cuenta que las estructuras sobre las capas mejoradas no estan sometidas a grandes cargas ni esfuerzos de impacto, a demas que el tiempo de ejecución nos esta apremiando. Se recomienda a interventoría evaluar esos criterios, pues las actividades sucesoras como es la construcción del muro en tierra armada y el muro baranda demanda tiempo de ejecución. Se recomienda al contratista dar mayor celeridad

en la construcción del muro baranda, para poder continuar con las actividades sucesoras y poder cumplir con el compromiso de entrega al 30/12/2023. Es importante que el contratista haya ordenada la provisión de mobiliarios para que los tiempos de entrega sean oportunos y se cumpla con el cronograma de actividades.

Rafael Niño

Se verifica punto de hidratación en el área operativa así como el punto ecológico. Se está realizando el llenado de los biorollos para la revegetalización del talud. Se elabora informe trimestral (Jul. Ago. Sep./'23) del componente SGA-SST. solicitado por el Idiger. Ing. Carlos Soto (25 Oct./23)

25/10/2023.

La interventoria solicita al contratista con respecto a las excavaciones, específicamente en cuanto a la profundidad; no excavar hasta la profundidad de 2 m. entre abscisas K0+130 a K0+200, en espera a ~~te~~ plantear el tema en el próximo comité técnico.

Con respecto a la fundida de la zarpa para muro baranda en concreto; la interventoria no autoriza la colocación de concreto ~~de zarpa~~ y zarpa de hasta tanto no se ejecute con formaleta metálica para el encofrado; El primer tramo de zarpa fundido ayer 24/10/2023 con formaleta en madera, no mostro acabado acorde a lo solicitado, quedamos a la espera que el contratista tome los correctivos y tener en Obra la formaleta metálica. Solicitada.

25 de octubre de 2023
Se continuan labores de estabilización en ladera, se continua con llenos en terrazas en madera, instalación de geobromalla e instalación de bigbags filters. Se continua levantamiento del muro en tierra armada; instalación de compactación de base granular, instalación de geotextil TR 5000 HF, sacos de polypropileno para conformación de fachada e instalación de geodren planar. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 4 volquetas, 1 Comisión topográfica y equipos menores de compactación.

26 de Octubre de 2023
Se continúan actividades de reducción de riesgos, instalación de geobromalla, instalación de bigbags filters y llenos de terrazas en madera con material proveniente de excavaciones. Se continua con el levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, sacos de polipropileno para conformación de fachada de muro, instalación de geodren planar. Se continua con la construcción del muro baranda, armado de acero de refuerzo, fundida de solado y fundida de zarpa. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 retro excavadora, 4 Volcos 1 Comisión topográficos y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am 5pm SECO.

Viernes 27 de octubre de 2023
Se continúan actividades de reducción de riesgos; instalación de geobromalla, instalación de bigbags filters y construcción de terrazas en madera. Se continua con el levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, sacos de polipropileno para conformación de fachada de muro, instalación de geodren planar. Se continua con la construcción del muro baranda.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retroexcavadora, 4 Volcos, 1 Comisión topográfica.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.

27/10/2023 Se presenta Ta Prof Social de interv. en el Comité de Obra, Practica prof. PAE y PS - Prof Social - PLATO-HSE

Sabado 28 de octubre de 2023
Se continuan actividades de reducción de riesgos Sobre ladera, Instalación de geobarrera, Instalación de biorrollos, Construcción de terrazas en madera y relleno de las mismas con material proveniente de excavaciones. Se continúa con Levantamiento de muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de sacos de polipropileno, drenes planares para manejo de escorrentías. Se continúa con la construcción del muro en Concreto reforzado; fundida de solado, fundida de zarpa e instalación de acero de refuerzo. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 4 Volquetas, 1 camión topográfica y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: 7am - 5pm.

Lunes 30 de octubre de 2023.
Se continua levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, Instalación de Sacos para conformación de fachadas de muro, Instalación de drenes planares e instalación y compactación de base granular.
Se continuan actividades de reducción de riesgos, instalación de Biorrollos Alfers, instalación de geobarrera y Construcción de terrazas en madera y llenos del mismo con material proveniente de excavaciones. Se continúa con las construcción del muro barandas, instalación de Encofrado, Instalación de concreto 4000 para zarpa e instalación de Acero de refuerzo.
Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador 1 retroexcavadora y 4 volquetas, 1 camión topográfica.
Estado del tiempo: 7am - 8pm SECO 8 - 6pm LLUVIAS.

Martes 31 de Octubre de 2023
Se Continuan actividades de reducción de riesgos; instalación de geobarrera, Instalacion de biorrollos tipo filtros, Construccion de terrazas en madera y llenos con

PAIS

material proveniente de excavaciones. Se continúa con levantamiento del muro en tierra armada, Instalación de geotextil, Instalación de Sacos de polypropileno, dren planar e instalación y compactación de base granular. Se continua con la construcción del muro baranda (zapata - Armado de acero). Estado del tiempo: Lluvias intensas sobre la madrugada que impiden el acceso de vehículos a canteras.

01/Noviembre 2023

Se continúan actividades de reducción de riesgos, instalación de geobarrera, Instalación de biorolls tipo filters y construcción de terrazas en madera. Se continúa levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de Sacos, Instalación de geobarrera, Instalación de dren planar e instalación de base granular. Se continúa con la construcción del muro instalación de acero de refuerzo y fundido de zapata. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 1 vibrocompactador y 1 Volquetas. 1 comisión topográfico. Estado del tiempo: Lluvias intensas 12m - 8pm. Teniendo en cuenta las fuertes lluvias, se suspende el suministro de materiales petreos hasta hoy que no hay accesos a los puntos de cargue.

02/Noviembre de 2023.

Se continúa actividades de levantamiento de muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de Sacos de polypropileno, instalación de dren planar, instalación de base granular, Se continúa construcción de muro baranda, Instalación de concreto de limpieza, Instalación de acero de refuerzo, instalación de concreto de 4000psi para zapata, instalación de formaleta para fundida de muro cuello. Se continúa actividades de reducción de riesgos, instalación de geobarrera, instalación de biorolls

Tipo fillers, Construcción de terrazas en ladera y llenos del mismo con material proveniente de excavación. Se cuenta en obra con 1 minicargadora, 1 Vibro - Compactador, 1 retroexcavadora. 1 Comisión topográfica. Estado del tiempo: Lluvias intensas 11am - 10pm. Se cancela suministro de materiales de cantera por la dificultad del acceso y vehicular.

03 Noviembre 2023

Se realiza recorrido en obra en el cual los trabajadores estan cumpliendo con los elementos de protección personal, los trabajadores que se encuentran en actividades en la ladera cuentan con su arnes y linea de vida.

Se hace la observación de la instalación de los Biorrollos sobre la recolección de la basura que se había hablado en el comité del día 27 Octubre 2023 ya que se evidencia basura al lado de los biorrollos

Apoyo a la Supervisión Ambiental y SST - IDIGER

Solicita la interventoria que los recubrimiento de aceros en las diferentes estructuras deben cumplir con lo solicitado en los planos o las normas respectivas.

Se realizó recorrido de la interventoria SGA-SST en las instalaciones de la obra observando la instalación y colocación de los biorrollos en ladera. No se presenta la presencia de residuos sólidos en la ladera junto a biorrollos. Se observó adecuadamente la señalización y demarcación de espacios vacios. Se observaron materiales petreos cubiertos con plastico adecuadamente Se evidenció correcto uso de EPP y dotación en los

trabajadores del consorcio VAPA. La zona de trabajo aún presenta humedad, charcos y zonas de estancamiento de agua, debido a las lluvias de horas anteriores. Se realizó comite semanal de obra con la presencia de Idiger, Interventoria y Contratista.
Asimismo se observón la señalización del PMT debidamente instalada sobre la calle 716 Sur.
Ing. Carlos Arturo Soto (3 Nov./25)

04 de Noviembre de 2023
Se continua en obra con actividades de reducción de riesgos, instalación de barandas tipo feller, Instalación de geotextil y Construcción de trinchos en madera. Se continúa con el levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de sacos de polipropileno para conformación de fachada, instalación de dren planar para filtro de escorrentías internas, instalación de base granular. Se continúa con la construcción del muro baranda, fundido de cabeza, instalación de acero de refuerzo, fundida de zapata y fundida de muro de nivelación. Se continua con pañetes en predios adyacentes al polígono de intervención.
Se cuenta en obra con 8 frentes de trabajo, 1 Camioneta topográfica, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 1 Volquetas y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: Lluvias intensas 2pm - 6pm.

04/11/2023. La prof Social de Interv. realizó acompañamiento del Taller de Cultura Ciudadana y Verificación Firmas

05 de Noviembre de 2023
Se continua en obra con actividades de reducción de riesgos, instalación de geomalla, instalación de barandas.
Se continua en obra con la construcción del muro baranda, armado de acero y encofrado de muro. Se inician actividades de canalizaciones electricas y cajas de inspección. Se continuan pañetes en predios adyacentes al polígono de intervención.
Estado del tiempo: Lluvias intensas en la madrugada.

06 de Noviembre de 2023
Se continuan actividades de reducción de riesgos, instalación de bermills e instalación de geomalla. Se Continúa con instalación de acero de refuerzo de muro baranda y encofrado para fundida del mismo. Se continuan pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención y Se continua con instalación de canalizaciones para redes electricas.
Se cuenta en obra con 1 mincargador, 1 Vibrocompactador 1 retroexcavadora, 1 camión topografico y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: Lluvias intensas en la madrugada.

07 de Noviembre de 2023
Se continua en obra con actividades de reducción de riesgos; instalación de geomalla, instalación de bermills tipo filter, Construcción de terrazas en madera y llenos del mismo con material proveniente de excavaciones. Se continua con el levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de Sacos para conformación de fachada, instalación de drenes planares, instalación de base granular, Se continua con la construcción del muro baranda; instalación de acero de refuerzo, instalación de concreto.
Se continua con pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención, Se continua con instalación de canalización para redes electricas y construcción de cajas de inspección. Se cuenta en obra con 8 frentes de trabajo, Se cuenta con 1 mincargador, 1 Vibro 1 retro, 1 camion topografica, 4 Volcos y equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: Lluvias intensas 4am - 630am.

08 de Noviembre de 2023
Se Continúa con actividades de reducción de riesgos, instalación de geobiomalla, Instalación de biorolls tipo filtro y Construcción de terrazas en madera y Verde del mismo con material proveniente de excavaciones. Se continua con levantamiento del muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de Sacos de polipropileno para conformación de fachadas, instalación de drenes planar + instalación de base granular. Se Continua con la construcción del muro baranda; Fundido de zarpa, Solado, instalación de acero de refuerzo. Se continua con instalación de pañetes en predios adyacentes al polígono de intervención. Se continua Con fundido del solado para construcción de jardineras. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 4 Volquetas, equipos menores de compactación y 1 Camioneta topográfica. ESTADO DEL CLIMA = SECO.

09/11/2023. La prof Social de Interv. Realizó acompañamiento a la Capacitación de trabajadores de MONC; se Verifica formatos y realización de actas. Prof Social - Interv MAPO INGENIERIA.

09 de Noviembre de 2023
Se continua con actividades sobre ladera para reducción de riesgos; instalación de biorolls tipo filtro, instalación de geobiomalla, instalación de tierra negra para revegetalización de trinchos. Se continua con levantamiento del muro en tierra armada. Se continua con la construcción del muro baranda. Se continúa con instalación de pañetes en predios adyacentes al polígono de intervención. Se continua con la construcción de jardineras. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 4 Volquetas, 1 Camioneta topográfica, equipos menores de compactación.
Estado del tiempo: SECO 7am 5pm

10/11/2023. Prof. Social de Interv. Realiza las siguientes activ.: Asist. Comité de Obra; Seg. Comité Vecinos; Prof Social MC

10 de Noviembre 2023 Interventoria
Se hace una corrección de las canastillas que se resporta al paramento del lado de la ladera pues la varilla tiene un desface de entre 2 a 3 cm y al armarla queda en zig zag.
Se debe colocar de un lado toda la amarrada del hierro parejo para que de un mejor acabado hacia la cara visible del muro.

(10 Nov./23) Mapo Ingeniería
Se realiza visita del especialista SGA-SST verificando el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) manejo integral de residuos sólidos, peligrosos y manejo de RCD. Se realizamesa de trabajo con la Ingeniera Yenny Cuestas para revisar y aprobar el informe mensual No. 8 Componentes SST y SGA. De igual manera se realizó comite de obra en la oficina del contratista. Ing. Carlos Soto (10 Nov./23)
Se realiza la revisión del Plan de Obra V20 ajustado a observaciones de acuerdo al modificatorio 2 y las observaciones fueron acatadas y tenidas en cuenta por parte del contratista. Se realizó el acta del comite de obra No. 35 (anotaciones del componente ambiental y SST). Se realizó recorrido en obra identificando punto de hidratación (sin botellón), señalización y demarcación de espacios vacios, cumplimiento programa orden y aseo, cubrimiento de materiales petreos. Se realizó supervisión de fundido de sobre, uso de EPP y dotación.
Ing. Carlos Soto (Interventoria SST/SGA), (10 Nov./23)
MAPO Ingeniería.

11/11/2023.
La Profesional social de la interventoria realizo, recorrido Urbano con verificación de los Puntos Satélites, Punto de Atención al Ciudadano; se habia programado visita a la vivienda de la Sra Maria Fonseca pero Canceló visita para Seguimiento por vibraciones, Se realizó Seguimiento de aplicación de Una encuesta de Satisfacción.

Prof. Social- Interventoria Mapo Ingeniería

10 de Noviembre de 2023
Se continuan con levantamiento del muro en tierra armada, Instalacion de geotextil, instalación y compactacion de base granular. Se continua con actividades de retiración de riesgos, instalación de geotextil y tierra negra para revegetalización de Trinchos. Se continua con instalación de pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con La Construcción del muro baranda. Se continua con la construccion de la jardinera en predios.
Estado del tiempo: Seco 7am - 5pm.

11 Noviembre/2023
Se realiza recorrido en obra verificando actividades tales como: instalación de biorrollos, pañetes en viviendas laterales, corte de varillas de acero, llegada de material B3600 fundida de solado en jardineras, refuerzo del cerramiento de la obra pruebas de laboratorio a cargo de Idicol, operación del mini cargador para transporte de sacosuelos, riego de material, entre los principales. Se verificó uso adecuado de EPP y dotación de personal. (Ing Carlos Soto) Interventoria y/o
Carlos Soto

Solicita la interventoria tener cuidado con los trinchos de terrazas, porque están siendo afectados por el trabajo de la maquina al conformar las áreas adyacentes; el recibo final de estas terrazas se efectuara una vez se corrijan los trinchos averiados.
Asi mismo tener cuidado en el almacenamiento de los aceros, en especial los que van contra la formaleta; debe garantizar el recubrimiento mínimo.

11 de Noviembre de 2023
Se continuan con obras de reducción de riesgos; Instalación de barrotes, Instalación de geotextil. Se continua con levantamiento del muro en tierra armada; Instalación de base granular. Se continua con la construcción del muro barranda; Fundida de solado, Instalación de Concreto para zapatas, muro cuello y muro barranda. Se continua con peñetes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se cuenta en obra con 2 minicargadores, 4 rodos, 1 vibrocompactador. Desde el contratista, se recomienda a la entidad enviar acompañamiento constante sobre la ladera todas vez que se ha ordenado personal con intención de invasión.

Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.

15 Noviembre (2023) Ing Carlos Arturo Soto (SGA ISST) M/APO
Se realizó recorrido de campo verificando los siguientes items Punto de hidratación instalado y operando, actividad de peñetes, colocación de tierra orgánica, centro de acopio de residuos sólidos, agregados petreos (BS600) en sitio, andamios en campo, llegada de volqueta de placas SVT929, se realiza acompañamiento al diligenciamiento de vales (llegada de material, se observan equipos para trabajo seguro en alturos. Se recomienda diligenciar la casilla "fecha de primera inspección"; la fecha de fabricación de un arnés y una (1) eslinga verificados en campo corresponde al mes de mayo de 2023. Se realizó acompañamiento al cocido de saco suelos con ayuda del equipo cosedora industrial de marca Kingter. Se observó compactador, minicargador y excavadora CAT. De igual manera se verificó el ingreso de volqueta de placa TTP848. Se realizó visita a la oficina del contratista consorcio VAPA y se verificaron equipos de emergencia tales como camilla, extintor y botiquin de primeros auxilios. Asimismo se inspeccionó el almacén de la obra y extintor operativo. (Carlos Arturo Soto)
Interventor SST/SGA.

1879

14 de Noviembre de 2023
Se continuan actividades de reducción de riesgos con la ejecución de actividades en Ladera; instalación de geomalla, instalación de biorolls tipo filters. Se continua con la construcción del muro en tierra armada, instalación de geotextil, instalación de drenes planares, instalación y compactación de base granular. Se continua con la construcción del muro baranda; Instalación de solado, Instalación de concreto para zapata, muro de nivelación y muro baranda. Se continua con la construcción de jardineras sobre pilotes. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 4 Volquetas, 1 comisión topográfica.
Estado del tiempo: Seco 7am - 5pm.
Nota: Se reitera a la interventoría y a la entidad la presencia de personas ajenas al proyecto con la intención de invadir la ladera con el fin de generar nuevos asentamientos.

15 de Noviembre de 2023
Se continuan actividades de levantamiento del muro en tierra armada; Instalación de geotextil, Instalación y compactación de base granular. Se continua con actividades de reducción de riesgos; Instalación de geomalla, Instalación de biorolls tipo filters.
Se continua con instalación de paneles en predios adyacentes al polígono de intervención. Se continua con construcción de jardineras. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 4 Volquetas, 1 Comisión de topografía.
Estado del tiempo: 7am - 5pm SECO.
Nota: Se evidencia nuevamente presencia de personas ajenas al proyecto con intención de invadir zonas afectadas al trinao.

16 de Noviembre de 2023
Se continuan con actividades de reducción de riesgos, instalación de geotextil, instalación de bolsacreto tipo filtros. Se continuan actividades de levantamiento del muro en tierra armada; instalacion del geotextil, Instalación del geotextil planar, instalacion y compactacion de base granular. Se continuan paneles en predios adyacentes al polígono de intervención. Se continua instalación y construcción de infraestructura de redes.
Se cuenta en obra con 2 minicargadores, 1 Vibro Apisonador, 1 Comisión topográfica.
Estado del tiempo: 7am - 5pm. SECO.
NOTA: Se retira personal ajeno de obra con presencia de policia toda vez que se evidencia intención de invasión de ladera.

(17 Nov/23) Ing. Carlos Soto (Interventoria)
Se realizó comité semanal de obra con la participación del Idiger, Interventoria MAPO y Consorcio VAPA. Se realiza recorrido de obra verificando manejo integral de residuos RCD, manejo de residos sólidos. Inspección de EPP y dotación. Se revisa comunicado para concepto de desistimiento forestal y algunas observaciones del informe mensual No. 8. Se verifican actividades de obra como construcción de jardineras, operación de dos (2) minicargadores, un (1) bulldozer, y uno (1) excavadora. Se verificaron dos (2) unidades sanitarios en la obra. De igual manera se recibió visita del laboratorio Idicol. Se Inspeccionó punto de hidratación en obra. Se realizó acompañamiento al suministro y reemplazo de EPP por parte del contratista. (Ing. Carlos Soto) (17 Nov/23). Interventor MAPO

(Sabado 18 Nov/23) Ing Carlos Arturo Soto
Se realizó recorrido de obra identificando centro de acopio de residuos solidos, uso de EPP, dotación, almacenamiento de materiales granulares, construcción de jardineras y

1800

esparcimiento de tierra orgánica para la revegetalización del talud.

(Martes 21 Nov./23) Ing Carlos Soto (Interventoría MAPO) Se realiza mesa de trabajo con la participación de la ingeniera Yenny Cuastas para el Informe mensual No. 9 en los componentes ambiental y SST Se realizó revisión de la fábk de personal actualizada.

17/11/2023 La Prof. Social de interventoría asiste a Comité y realiza recorrido de Vibora

18-11-2023

La Interventoría solicita al contratista tomar especial atención en adelante y tomar los correctivos necesarios, en los acabados final del muro baranda; presenta un nivel discontinuo y bordes no uniformes. recordamos que los concretos y en general la Obra, además de cumplir especificaciones de resistencia y demas, deben tener muy buena presentación. Con respecto a los formaletas metalicas. se debe utilizar el material antiadherente. o que no sea A.C.P.M. en el APV. está considerado un material de SIKA para tal efecto, por lo que se exige al contratista utilizar los materiales apropiados para tal fin. Con respecto al avance de Obra, dejamos constancia que las actividades de instalaciones electricas, sanitarias y construccion de muro baranda, presentan atraso en su ejecución, por que se solicita al contratista tomar las acciones necesarias para poder la ejecucion con la programación en estas actividades. No olvidar que el contrato tiene tiempo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2023.

Las cordineras debe tener Horaderos en la parte baja, para que sean colocados en Obra.

Int.

(Viernes 24 Nov./23) Ing Carlos Arturo Soto. (Interventoria)
Se realizó recorrido de obra verificando el manejo de los residuos solidos, RCD, punto de acopio, uso de EPP, dotación Se participo en comite semanal de obra. Se revisa el informe mensual No. 9 de los componentes SGA y SST. Ing. Carlos Soto
(Sábado 25 Nov. /23) Ing Carlos Soto / Interventoria MAPO)
Se realizó control diario de personal, se verificó recolección de residuos sólidos, se verificó operación de miniexcavadora, vibrocompactador, minicargador. (transporte de B600), humectación de material con manguera, excavación de cajas de inspección (x) instalación de postes. (Ing Carlos Soto) Interventoria MAPO

Int.

18/11/2023. La Prof. Social de interventoria realizo acompañamiento a Reunión de Apertura de obra.

(Lunes 20 Nov/23) Arq Carlos Lopez
Se continua con la excavación para siembra de árboles en la parte de la ladera. actividad de reducción de riesgos, de igual manera se continua con el levantamiento de muro en tierra armada; instalación de geotextil, geodren Plano, instalación, humectación y compactación de base granular. Se continua con instalación de pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se realiza la actividad de excavación para cajas de redes humedas y secas. Armado de acero de refuerzo, instalación de formaleta y fundida de zarpa, muro collo y muro baranda tipo. También se continua con la construcción de Jardineras; armado de acero, formaleta, fundido. Se continua con la base en concreto para piso en losetas.

Int.

(Martes, 21 Nov /2023) Arq. Carlos Lopez
Se continua con las actividades de reducción de riesgos; instalación de geobiomalla, bermas tipo filtro, excavación para siembra de árboles. Se continua con la instalación de pañetes en los predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con construcción de Jardineras. Se continua con el levantamiento de muro en tierra armada; instalación de geotextil, geodren plano, instalación, humectación y compactación de Base Granular. Se continua con el armado de acero, instalación de formaleta y fundido de concreto para zarpas, muro collo y muro baranda. Se continua con la construcción de Jardineras. Se continua con la instalación de base en concreto para pisos en losetas. Se cuenta en obra con 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 4 Volquetas y una comisión de Topográ-

Int

180

Arq. Estado del tiempo: 7:00am - 5:00pm Seco.

(Miercoles, 22 Nov/2023) ARQ. CARLOS LOPEZ.
Se continua con la construcción de muro en tierra armada; instalación de geotextil, drenes planares y humectación, compactación de base granular. Se continua con el armado de acero, instalación de formaleta, fundida en concreto para zarpa, muro cuello y muro baranda. Se continua con actividades de reducción de riesgos; instalación de biorolls tipo filtros, excavación para siembra de árboles. Se continua con la construcción de jardineras. Se continua con la instalación de pañetes en los predios adyacentes al polígono de Intervención. Se continua con la construcción de cajas para redes humedas y secas. Se continua con la instalación de Base en concreto para pisos en losetas. Se cuenta en obra con 4 Volquetes, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 comisión de Topografía. Estado del tiempo: 7:00 am - 5:00 pm SECO Int.

(Jueves, 23 Nov/2023) ARQ. CARLOS LOPEZ
Se continua con instalación de Base en concreto para pisos en losetas. Se continua con la construcción de muro en tierra armada; instalación de geotextil, drenes planares, humectación y compactación de base granular. Se continua con la construcción de Jardineras. Se continua con la instalación de geomalla para biorolls tipo filtros y excavación para siembra de árboles. Se continua con la instalación de pañetes en los predios adyacentes al polígono de Intervención. Se continua con el armado de acero, instalación de formaleta, fundida en concreto para zarpa, muro cuello y muro baranda tipo. Se continua con la construcción de cajas de Inspección para redes secas y humedas. En obra se cuenta con 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, 4 Volquetes y una comisión de Topografía. Estado del tiempo: 7:00am a 5:00pm SECO. Int.

(Viernes. 24 Nov/2023) Arq. Carlos Lopez)
Se continua con la instalación de pañetes en los predios adyacentes al polígono de Intervención, se continua con la excavación para redes humedas y secas, con la construcción de cajas de Inspección. Se continua con la construcción de tierra armada; instalación de geotextil, geodren planar, humectación y compactación de base granular. Se continua con la construcción de Jardineras; instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundido en concreto. Se continua con la excavación para siembra de arboles ubicac

dos en la ladera, se continua con actividades de reduccion de riesgos, instalacion de geobiomalla para biorrolls tipo Filters. Se continua con el armado de acero de refuerzo, instalacion de formaleta y fundido en concreto para zarpa, muro cuello y muro baranda. Se cuenta con 1 Vibrocompactador, 2 minicargadores, 4 Volquetas y una comision de Topografia. Estado del tiempo 7:00am - 5:00pm SECO.
Viernes 24/11/2023. Prof Social de interventoria [illegible] Int.
(Sabado, 25 Nov/2023)
Se continua con instalacion de geobiomalla para biorolls Tipo Filters. Se continua con instalacion de pañete a los predios adyacentes al poligono de Intervencion. Se continua con la construccion de Jardineras. Se continua con la construccion del muro en tierra armada; instalacion de geotextil, drenes planares, humectacion y compactacion de base granular. Se continua con la excavacion para siembra de arboles. Se continua con el armado de acero de refuerzo, instalacion de formaleta y vaciado de concreto para zarpa, muro cuello y muro baranda. Se continua con actividades para construccion de cajas de Inspeccion para redes secas y humedas. En dia se cuenta con 1 Vibrocompactador, 2 minicargadores, 4 Volquetas y una comision de Topografia. Estado del tiempo. 7:00am - 11:30am, SECO Int.
Sabado 25/Nov/2023. La Prof. Social de interventoria realizo recorrido y verifico Partes Skilla final
(Lunes, 27 Nov/2023)
Se Inicia la capa de Nivelacion; instalacion, humectacion y compactacion de base granular. Se continua con la instalacion de Base en concreto para pisos en Loseta. Se continua con el acero armado, instalacion de formaleta, vaciado de concreto en zarpa, muro cuello y muro baranda. Se continua con la excavacion para siembra de arboles. Se continua con la construccion de Jardineras. Se continua con la construccion de cajas para redes humedas y secas. Se continua con la instalacion de pañete en predios adyacentes al poligono de intervencion. Se cuenta con 1 Vibrocompactador, 2 minicargadores, 4 Volquetas y 1 comision de Topografia. Estado del tiempo 7:00am - 5:00 pm. SECO Int.

(Miercoles, 29 Nov. 123) Ing Carlos Arturo Soto
Se verifica ingreso de volqueta TDS 178, operación de minicargador, construcción de jardineras, señalización de espacios vacios y cajas de inspección. No se observa el punto de hidratación en areas operativas. Se realiza verificación del manejo de los residuos sólidos y RCD. Se realiza inspección de extintor de oficina Consorcio YAPA unidades sanitarios operativas y en funcionamiento, punto de hidratación de oficina del Consorcio YAPA y punto ecológico. Se verifican sumideros de las calle 71B y Calle 71C Sur el primero actualmente no cuenta con polisombra y se encuentra deteriorado por el paso de vehiculos. El Sumidero ubicado en la calle 71c Sur presenta material de arastre y ya no cuenta con rejilla. Se recomienda reforzar el uso de EPP, particularmente el casco y los guantes en todos los trabajadores. Se observó una mini excavadora marca CAT 305.5L en operación. Asimismo se realizó acompañamiento en actividades de poñete.
(Ing. Carlos Soto, Interventoria MADO).

(Miercoles, 29/11/23) Arq. Manuel Campos
Por parte de la interventoria se a pedido en varias oportunidades las ordenes de compra de:
- Postes de cerramiento de poligonos
- Mobiliario Urbano
- Estancia de aves
- Postes de luz

y se deja constancia en bitacora que hasta el dia de hoy no se ha tenido respuesta de esta solicitud.
(Arq. Manuel Campos, Interventoria MADO)
Int.

(Jueves 30/11/2023) Arq Carlos López
Se continua con la nivelación, instalación, compactación y humectación de Base Granular. Se continua con la instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para jardineras. Se continua con el armado de acero para vaciado de

muro cuello y muro Barando. Se continua con la construcción de cajas de Inspección para redes humedas y Secas. Se continua con la instalación de Poste en los predios adyacentes al poligono de Intervención. Se continua con la instalación de Base en concreto para pisos de losetas. Se continua con actividades de reducción de riesgo. instalación de Biorroll tipo Filtros para siembra de árboles. Se inicia el armado de acero para jardineras centrales y armado de columnas para pergolas. De igual manera llega mobiliario urbano a obra. En obra se cuenta con 1 Vibrocompactador, Cuatro Volquetas Dos minicargadores, una camioneta de Topografia, Un reflector para horario Nocturno.
Tiempo Seco de 7:00am - 5:00pm

Jueves 30 Nov/23 Desde la parte Social de la interventoria se llevó a cabo el recorrido Urbano con Verificación de los Puntos Satélites, aplicación de encuestas de satisfacción, Volantes - SO. Conv. de Talla P.C.
Viernes 1 Dic/23 (Ing. Carlos Interventoria/MAPO.
Participación en comité semanal de obra No. con la asistencia de Idiger, Interventoria MAPO y Consorcio VAPA. Se realiza verificación de sumideros y requieren limpieza y mantenimiento. Se verificó señalización y demarcación de espacios vacios y con riesgo de caida Se observó buen uso de EPP en términos generales. La obra se observa en optimas condiciones de orden y aseo, adecuado acopio de residuos sólidos y material de obra. Se inspeccionó minicargador en operación y presencia de trompo. Se realiza recorrido de obra por parte del especialista forestal del consorcio VAPA Se realizó Inspección de las unidades sanitarios en el almacén y se verificó extintor para control de incendio Se observa punto ecológico en oficina administrativo del contratista junto a la cartelera HSE, botiquin y punto de hidratación
Viernes 1 de dic/2023. La Profesional Social de interventoria realiza intervención en el Comité de Obra informando las actividades

del Componente Social ejecutadas: Se verificó Punto de Atención al Ciudadano. Sandra J. Rodríguez H Sábado 2 Nov/23 (Ing. Carlos Soto) Interventoría MAPO
Se realizó verificación de uso de EPP y dotación. Algunas trabajadores no utilizan gafas y guantes de seguridad. Se realizó acompañamiento en la actividad de descargue del acero. Se verificó humectación de material a la 9:30 am, sin embargo se recomienda reforzarla y aumentar la frecuencia de humectación teniendo en cuenta la presencia de material particulado que genera afectación en la salud y calidad del aire. Se verificó operación del minicargador realizando esparcimiento de material granular. Se verificó uso de EPP y dotación en el personal de pañete. Se realizó inspección de sumideros. Se requiere reforzar la señalización y demarcación de espacios vacíos y cajas de inspección (colocar cinta de peligro). Se observó operación del minicargador, vibrocompactador y excavadora. (Ing. Carlos Soto Int. MAPO).
Sábado 2 de diciembre/2023 La profesional Social de interventoría realizó acompañamiento al taller de Cultura Ciudadana con la implantación de metas en los 2 puntos críticos de botaderos de basuras por parte de las Comunidades vecinas del sector: Sandra J. Rodríguez

Sábado 2 de Diciembre 2023 Arq Carlos Lopez
Se continua con nivelación, compactación y humectación de Base granular, Se continua con instalación de Tubería para redes Secas y Humedas y elaboración de cajas para las mismas. Se continua con la instalación de acero de refuerzo para muro baranda. Se inicio con la nivelacion de piso para armado de acero de Rampa entre los abscisas K+0.270 y K+0.300 Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes a la zona de Obra. Se continua con la construcción de Jardineras y Columnas para pergolas. Se continua con la excavación para siembra de arboles. Por otra parte se presenta la novedad de hurto de material y/o Equipos de trabajo en la obra. Se asistió a reunión con la policia para reportar el caso. y se pone denuncia.

Residente Interventoría

Martes 5 Dic /23 / Ing. Carlos Soto (APO)
Se realizó recorrido de obra y se observón humectación de material granular por parte de un trabajador. Se verificó óptimas condiciones en el programa de orden y aseo y manejo integral de residuos sólidos y RCD. Se recomienda reforzar la asignación del auxiliar de tráfico (paletero) al ingreso y salido de volquetas ya que en los últimos semanas no se observa el cumplimiento a este ítem. Se solicita reforzar el aseo y limpieza de los sanitarios. Se observó uso de EPP y dotación. Se verificó la operación del minicargador. (Ing. Carlos Soto) APO

Martes 5 / 12 / 2023 - Arq. Carlos López
Se continua con la Nivelación de piso en Base Granular, se continua con elaboración de jardineras y conformación de columnas para pérgolas. Se continua con la Instalación de Pañete en predios adyacentes a la zona de Intervención. Se continua con el armado de acero de refuerzo para Rampas. Se continua con la elaboración de cajas de Inspección para redes humedas y Secas. Se continua con la excavación para siembra de árboles.
De igual manera se refuerza la seguridad y se instala en obra una planta reflectaria para horario nocturno de Vigilancia.
Se realiza reinstalación de polisombra para Cerramiento de Boca Calles adyacentes ala zona de Intervención.
En obra se cuenta con Cuatro Volquetas, un vibrocompactador un minicargador, una comisión de Topografía.
Estado del Tiempo:
Seco de 7:00am a 5:00pm.

Residente Interventoría

Miercoles 6/11/2 El Componente Social de interventoría realizó recorrido Urbano y Visitas a viviendas por Urbanización por Seguimiento Sgdio. J. Rodriguez Y

Miercoles 6 de Diciembre - 2023
Se continua con elaboración de jardineras y armado de acero de esfuerzo para columnas de Pergolas, de igual manera la instalación de formaleta para las mismas. Se continua con el armado de acero y formaleta para base de Rampa. Se continue con la limpieza de muro baranda. Se continua con la elaboración de cajas de inspección para redes secas y humedas. Se continua con excavación para instalación de Postes electricos. Se continua con Instalación de pañete en predios adyacentes alcance de Intervención. Se continue con la actividad de excavación para siembra de dibolez. Se continue con la instalación de Box en concreto para pisos en losetas.
En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador, una comisión de Topografia. Estado del tiempo Seco 7:00am - 5:00pm
Jueves 7 Diciembre / 23 (Ing. Carlos Soto Interventoria) Residente Interventoria
Participación en comité semanal de obra. Se realizó recorrido con la Secretaria de Hábitat para tratar el tema de la pintura de muros (artistico), con jóvenes locales. Se verificó punto ecológico, extintor de control de incendios, cartelera HSE, botiquin de primeros auxilios. De igual manera se observó operación de minicargador vibro compactador y excavadora. Ingresó material B600 en la obra. Se observó operación de unidades sanitarias en obra y en oficina. Se realizó inducción a seis (6) colaboradores. Se inspeccionaron actividades de pañete fundida de jardineras y soldo. Asi como apertura de huecos para la instalación de poste y compactación con canguro. Se observó uso de EPP, equipos TSA y dotación. (Ing. Carlos Soto) Interventoria MAPO.
Jueves 7/12/2023 Profesional Social de interventoria asistió al Comite de Obra No 39; realización de recorrido con representantes de la SDHT, IDIGER, Comunidad J.A.C del Barrio Bella Flor y El Mirador. Prof. Sociales, Técnicos del Contratista e interventoria. Sandra J. Rodriguez (Prof Social de

Jueves 7 de Diciembre / 2023 Arq Carlos López
Se continua con la instalación de redes secas y humedas, se inicia con la actividad de excavación para incado de postes. Se continua con el armado de acero, formaleta y vaciado de muro baranda y Rampa. Se continua con la fundida de solado para construcción de Jardineros de igual manera se continua con la actividad de construcción de Jardineros y Pergolas. Se continua con la instalación de Geobiomalla y TRM500, Se continua con la instalación de pañete en predios adyacentes al poligono de Intervención. En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador, una comisión de topografia. Estado del tiempo seco 7:00 am - 5:00 pm.
Residente Intervención

Sabado 8 de Diciembre / 2023 Arq Carlos López
Se continua con el armado de acero y fundida de muro baranda y Rampa, Se continua con la instalación de redes secas y humedas. Se continua con la excavación para incado de postes. Se continua con la fundida de solado para construcción de jardineros. Se continua con la construcción de Pergolas y jardineros. Se continua con la instalación de Geobiomalla y TRM500. Se continua con la instalación de paretes en predios adyacentes al area de intervención.
Residente Intervención

Sábado 9/12/2023 La profesional Social de interventoria realizó Seguimiento de las actividades ejecutadas en la semana del 4 al 9 de diciembre / 2023 y se verificó la relación de empleados MONTE de la localidad versus Certificaciones de residencia de la localidad

Lunes 11 / 12 / 2023 Arq Carlos López
Se continua con la construcción de muro Baranda y Rampa. Se continua con la excavación para incados de postes. Se inicia la instalación de postes. Se continua con la fundida de solado para construcción de bordineros. Se continua con el armado y vaciado de jardineros y pergolas en horarios extendidos. Se continua con la instalación de Geobiomalla y TRM500. Se continua con la instalación de paretes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con la instalación de redes

humedas y secas. En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador y una comisión de Topografía. Estado del tiempo seco 7:00pm a 5:00pm.

Residente Interventoría

Martes 12/12/2023

Se continua con la fundida de solado para construcción de jardineras y pergolas. Se continua con la excavación e instalación de postes. Se continua con la instalación de pañetes adyacentes al predio de area de intervención. Se continua con la instalación de redes secas y humedas. Se continua con la instalación de Geomalla y TERRA500. Se continua con la construcción de muro baranda y Rampa. Se continua con la insta-construcción de jardineras y pergolas. En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador y una comisión de Topografía. Estado del tiempo seco 7:00am - 5:00pm.

Residente Interventoría

Martes 12/12/2023 la interventoría solicita al contratista de manera urgente hallegar las carteras de topografía del levantamiento en la ladera, urbanismo, redes secas y húmedas de todo el proyecto. Residente

Miércoles 13 Dic./23 (Ing. Carlos Soto) Interventoria

Se realiza recorrido de obra se observa operación del mini-cargador organizando material triturado. Se evidencia adecuado uso de EPP y dotación. Se observa centro de acopio de residuos solidos. Se observó un trabajador utilizando las gafas de seguridad en trabajos con pulidora, sin embargo no utiliza careta completa. Se recomienda el uso de la careta para minimizar accidentes laborales. Se realiza acompañamiento en la actividad de encofrado para fundida, pulir muros, armado de acero y humectación de vias. Durante se observó jornada de orden y aseo por parte de los trabajadores. Se evidencia la presencia de algunos residuos de concreto en algunas zonas de la obra, por lo cual se recomienda recogerlos y ubicarlos en centros de acopio temporal previo

a la recolección con volquetas. Se realiza inspección en los sumideros y se encuentran con polisombra color azul sin embargo aún la estructura se encuentra averiado. (Ing Carlos Soto) Interventoría. MAPO).

Jueves 14/Dic./2023.

El Apoyo a la supervisión del IDIGER, evidencia que la interventoría MAPO, no hace presencia en obra, ningun ingeniero de MAPO, está en obra. las actividades de obra continuan en sendero, construcción de jardineras, Ramen de KO 1305, hincada de postes, Revoque y pañete en fachadas, tambien se informa que hubo recorrido de obra por parte de las directivas de IDIGER. La residencia por parte del contratista manifiesta iniciar extendido de concreto de placa piso el Proximo sabado 16 de Dic/2023, con un recor de obra de 1500m² instalados al Proximo 20/12/2023. Se espera que cumpla con los record de obra.

En oficina de interventoría cumpliendo con actividades administrativas como es revisión de informes del contratista, elaboración de informes propias de la interventoría y demás.

Residente.

Miercoles 13/2023

Se continua con el armado de acero y vaciado de muro bordo y Rumpa. Se continua con la excavación e incado de postes. Se continua con la construcción de jardinera y pergolas. Se continua con la fundido de adado para construcción de jardineras. Se continua con la instalación de redes humedas y secas. Se continua con la instalación de paneles en predios adyacentes a la zona de intervención. En obra se cuenta con un ubio compactador, minicargador, una comisión de topografía. Estado del tiempo 7:00am - 5pm.

Residente Interventoría

Jueves 14/2023

Se continua con la excavación encado de postes. Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes al peligro

1806

no de intervención. Se continua con la instalación de redes secas y humedas. Se continua con la construcción de soladas para jardineras y Pergolas. Se continua con la Geobiomalla y TRM500. Se continua con el armado y vaciado de muro baranda y Rampa. Se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador y una comisión de Topografia.
Estado del tiempo Seco: 7:00 am - 5:00 pm
Residente Interventoria
Viernes 15 de Diciembre / 2023 Carlos López
Se continua con el armado de acero de refuerzo para la construcción de Jardineras y Pérgolas. Se continua con la instalación de Geobiomalla y TRM500. Se continua con la instalación de redes secas y humedas. Se continua con la elaboración de muro baranda y Rampa. Se continua con el vaciado de base en concreto para instalación de piso en losetas. Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes a la zona de intervención.
En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador, una comisión de Topografia.
Residente Interventoria
Estado del Tiempo => Seco 9:00 am - 5:00 pm
Sabado 16 de Diciembre del 2023.
Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes al poligono de Intervención. Se continua con la base en concreto para instalación de losetas. Se continua con la instalación de redes humedas y secas. Se continua con la instalación de Geobiomalla y TRM500. Se continua con el armado de acero para la construcción de jardineras y pergolas. Se continua con la instalación de formaleta para posterior vaciado de concreto en jardineras y Pergolas. Se continua con la nivelación de base granular para dar inicio con la instalación de malla electrosoldada y vaciado en concreto fluido.
En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador, una comisión de Topografia.
Residente Interventoria
Estado del Tiempo => Seco 7:00 am - 11:30 am
Viernes 15/12/2023 El Componente Social de interventoria realizó recorrido Urbano y acompañamiento a la aplicación de 3 encuestas de satisfacción. Sandra J. Rodriguez

1 18788

# CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO SECTOR EL PARAISO, MIRADOR LOCALIDAD 19, UP2 67.



CONTRATISTA : CONSORCIO UAPA

Nº CONTRATO DE OBRA : FONDIGER 002 - 2023

INTERVENTORIA : MAPO INGENIERIAS S.A.S

Nº CONTRATO DE INTERVENTORIA : FONDIGER 008 - 2023

TOMO 2

BOGOTÁ, COLOMBIA

1807

318789

DICIEMBRE

JUEVES 18 Se continua con actividades de elementos estructurales tales como: Rampa de la abscisa K0+000 y K0+290 y muro paralelo. Se continua con la construcción de jardineras contiales, de piedra y pergolas. Se continua con la instalación de losetas y cañuelas. Se continua con la instalación de redes secos y humedas. Se continua con la elaboracción de cajas de inspección. Se continua con la capa de nivelación entre las abscisas K0+290 a K0+305. Se continua con la instalación de paretes en predios adyacentes al polígono de intervención. Estado del tiempo: SECO 7:00am a 5:00pm. En obra se cuenta con un minicargador, un vibrocompactador, una comisión de Topografia.

Residente interventoria

MARTES 19 Se continua con la construcción de jardineras contiales, de piedra y pergolas. Se continua con la instalación de losetas y cañuelas. Se continua con la elaboracción de cajas de inspección, e instalación de redes secos y humedos. Se continua con la instalación de paretes en predios adyacentes al polígono de intervención. Se continua con la capa de nivelación entre las abscisas K0+290 y K0+305. Se continua con la elaboracción de Rampa y muro paralelo. En obra se encuentra un vibrocompactador, un minicargador, una comisión de Topografia. Estado del tiempo SECO 7:00am - 5:00pm

Residente interventoria.

Se realiza recorrido de obra identificando las siguientes actividades. llegada de mixer, fundida con concreto 1000 psi, color gris modelación senderos, trasiego de material con minicargador mejoramiento del muro de contención, corte y figuración de hierro humectación de material triturado recebo, operación de unidades sanitarias se verificó uso de elementos de protecaión personal EPP y dotación, operación de minicargador y vibrocompactador. Se tiene un total de 51 trabajadores de obra Se observaron condiciones aceptables de orden y aseo, se recomienda realizar la recolección de residuos de concreto y disponerlos como RCD. Se observaron trabajadores en la parte baja de la ladera realizando excavación para instalar el cerramiento de la obra.

1308

Se verificaron elementos para atención del plan de emergencias tales como extintor de incendio, botiquin de primeros auxilios y camilla (en almacén de la obra). Se evidenció punto ecológico en oficina administrativa del proyecto.
Ing. Carlos Soto MAPO

Miercoles 20 Se continua con la elaboración de muro bovenda y Rampa, construcción de Jardineras, centrales, de predio y pergolas. Se continue con la instalación de pañete en predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con la instalación de losetas y cañuelas. Se continuan con la instalación de redes secas y humedas. Se continua con la capa de nivelación para base de losa de contrapiso. Estado del tiempo: Seco de 7:00am a 5:00pm. En obra se cuenta con un minicargador, un vibrocompactador, una comisión de Topografia.

Residente Interventoria

La presente interventoria solicita al contratista hidratar todos los elementos estructurales del proyecto de manera frecuente y diariamente; le recordamos hacer allegar estudios geotecnicos constructivos sus si son o no viables ejecutar los; así mismo los correctivos y mejoras en corona y muro de contención, y jardineras desde la calle 71 bis hasta el kototo; pendiente suministro de materiales y elementos como son estancias para las aves, canecas, bolardos, losetas táctil alerta, sumideros y material eléctrico.

Residente Interventoria

Jueves 21 Se continua con la construcción de Jardineras, centrales, de predio y pergolas. Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con la nivelación de piso para instalación de losa de contrapiso. Se continua con la elaboración de redes secas y humedas. Se continua con la construcción de Rampa y Muro Paralelo. Estado del tiempo: SECO 7:00am - 5:00pm. En obra se cuenta con un vibrocompactador, un minicargador, y una comisión de topografia.

Residente Interventoria

5187790

21-12-23 Se realiza visita por parte del componente ambiental (Marco Fernando Chaparro) y Social (Martha C Rodriguez) se evidencia la presencia de los profesionales sociales de interventoria y residente social de obra, el punto de atención funcionando normalmente. (Ing.

Prof. Social IDIGER

Componente Ambiental - Marco Fernando Chaparro R.
Se procede a realizar recorrido técnico en obra generando las siguientes observaciones en el poligono de obra:
* Se observa presencia de roedores como vectores en uno de los pozos de las redes de conducción de aguas del acueducto.
* Se observa que no se instala riego para humedecer las vías en las que se disponga material particulado del material de construcción
* A la fecha no se ha realizado la siembra de individuos arboreos programada.
* Se observan trapos impregnados con aceites y grasas dispuestos en la vía construida a lo largo de la obra.
* Se observa la presencia de los individuos arbóreos de los que se solicitado concepto de intervención.
- Se cierran las observaciones 21/12/23.

Se realizó recorrido Urbano junto con el Contratista se verificaron Puntos Satélites de información y acompañamiento de 3 encuestas de satisfacción y recorrido con P.S del IDIGER. Sandra J. Rodriguez (Prof. Social de interventoria).

Viernes 22 Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con la nivelación de piso para instalación de losa de contrapiso. Se continua con la elaboración de redes secas y humedas. Se continua con la construcción de Rampa y muro paralelo. Se continua con la construcción de jardineras, centrales, de predio y pergolas. Estado del tiempo Seco: 7:00 am - 5:00 pm. En obra se cuenta con un minicargador, un vibrocompactador y una comisión de Topografia.

Residente Interventoria

Se participó en el Comité de Obra N° 41 en donde se expusieron las actividades del Comp. Social de la Semana. Sandra J. Rodri (PS Interv.)

1389

Se realizó comité de obra con la asistencia de Ing. Interventoría y contratista. Se toman en cuenta las observaciones del Ingeniero Chaparro dejados el día anterior (21 Dic. /23). Se recomienda realizar la humectación de las vías de ingreso y la humectación de material granular, para evitar la afectación de material particulado en la salud de los trabajadores y de la comunidad. Se observaron algunas espacios vacios cubiertos con tablas, se realizó la recomendación de señalizarlos y demarcarlo la cual fue atendida por parte del contratista. Se observó uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y dotación en obra. Se observa de manera reiterado un (1) trabajador del área de pañetes, que no usa casco y se encuentra descansando en horario laboral. Se observó uso de elementos de protección contra caidas en trabajo en alturas y uso de andamios.

Sábado 23 Se continua con la elaboración de elementos estructurales como la Rampa y muro paralelo. Se continua con la elaboración de jardineras centrales, de predio y pergolas. Se continua con la instalación de losetas y cañuelos. Se continua con la instalación de pañete en predios adyacentes al polígono de intervención. Se continua con nivelación de piso para instalación de losa de contrapiso. Estado del tiempo SECO: 7:00 am - 11:30 am. En obra se cuenta con un vibro compactador, un minicargador, una comisión de topografía.

Residente Interventoría

Martes 26 Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes al polígono de intervención, se continua con la elaboración de jardineras, centrales, de predio y pergolas. Se continua con la instalación de losetas y cañuelas. Se continua con la nivelación de piso para instalación de losa de contrapiso. Se realiza la actividad de vaciado de concreto fluido de Colores. Se continua con la construcción de Rampa y muro paralelo. Se continua con la instalación de redes secas y humedas. Estado del tiempo SECO: 7:00 am - 5:00 pm. En obra se cuenta con un vibrocom-

padadas, un minicargador y una comision de topografia.

Residente
Interventoria

Se realizó recorrido en obra verificando manejo integral de residuos sólidos descargue de material triturado 3600 llegada de tres (3) mixer con concreto para fundida Se realizó recorrido con funcionarios de secretaria de habitat y del Idiger. Se inspeccionó punto de hidratación, punto ecológico, extintor para control de incendios con cargo vigente, baños en óptimo estado y unidades sanitarias. Se observó operación de excavadora y minicargador. Se recomienda instalar los porales diagonales del andamio para que tenga mayor resistencia y estabilidad!
Ing. Carlos Arturo Soto.

Miercoles 21 Se continua con la nivelación de piso para instalación de losa de contrapiso. Se continua con la instalación de concreto fluido de Colores (Gris y Beige). Se continua con la construcción de elementos estructurales como Rampa y muro Paralelo. Se continua con la instalación de Cañuelas y loseta. Se continua con la elaboración de jardineras tanto de predios como canchas y pergolas. Se continua con la instalación de panele en predios adyacentes al poligono de intervención. Estado del tiempo: Lluvias moderadas entre 7:00am y 10:00am. En dia se cuenta con un vibro compactador, un minicargador y una comisión de topografia.

Residente
Interventoria

Se solicita al contratista tener mas cuidado con las placas de concreto fluido ya fundidas al hacer el trasiego del concreto para fundir las losas adyacentes cae material en ellos sin efectuar el retiro inmediatamente; sino hasta el día siguiente cuando este ya esta endurecido; de igual manera al texturizar se evidencia losas con doble orilla costado occidental de la loseta guía llegando a la jardinera central entre los abscisas K0+030 - K0+060.

Residente.

Jueves 28 Se continua con la elaboración de Jardineras laterales, de predio y pergolas. Se continua con la nivelación de piso para instalación de loseta de contrapiso. Se continua con la instalación de concreto fluido colores (Gris y Beige). Se inicia con la limpieza delos placas en concreto fluido para dar mejor acabado. Se inicia con los correctivos del muro baranda (nivelación de corona, juntas de dilatación, hormigueos, acero). Se continua con la instalación de losetas y cañuelas. Se continua con la elaboración de elementos estructurales como Rampa y muro paralelo.

Residente
Interventoria

Profesiona Social de interventoria realizo lo siguiente Se realizó acompañamiento en recorrido Urbano, junto con el Contratista, se aplicaron 3 encuestas de Satisfacción, así como acompañamiento a la visita por Vibración de acta de Seguimiento Jardín Pub.

la presente interventoria solicita correctivo en las estructuras en concreto a la vista, nivelación en la corona del muro de contención, hacer juntas de dilatación, corregir hormigoneos; retirar hierros alambres exceso de concreto madera; de igual manera las jardineras corregir plomos; se realizar buena impermeabilización para que no se afecte sus acabados
En los espacios vacios entre jardineras y muro existente se solicita metodo de llenado con recebo.
Al iniciar la actividad de pisos es indispensable realizar pruebas de estanqueidad y limpieza en sus cajas de inspección. para su protección instalar tapas o en su defecto tapón de prueba
Estar pendiente del cronograma de las actividades que faltan finalizar los correctivos elementos estructurales
Se requiere el balance de mayores y menores cantidades con los ajustes de los correctivos.
insitimos en el tema de hidratación para el curado de los elementos estructurales

Residente

Viernes 29 Se continua con la nivelación de piso para instalación de losa de contrapiso. Se continua con la instalación de concreto fluido de colores (Gris, Beige y Blanco). Se continua con la elaboración de Jardineras cenitales, de Piedra y pergolas. Se continua con los correctivos del muro baranda y jardineras. Se continua con la limpieza de modulos en concreto fluido. Se continua con la construcción de Rampa K1+0.00 y Muro Paralelo. Estado del tiempo: lluvias moderadas entre las 7:00am y 11:00am. En obra se cuenta con un minicargador, un vibrocompactador y una comisión de Topografia.

Residente
Interventoria

Se realizó recorrido de obra verificando las siguientes actividades: encofrado de muro, corte, figurado, armado de refuerzo, jardineras y descimbrado de jardineras. Se observó barrido de vias. Se recomienda reforzar la humectación del material de obra y vias. Se recomienda evitar el desperdicio y derrames de concreto en los frentes de obra. Se recomienda señalizar y demarcar los acopios de residuos sólidos y RCD de obra, de igual manera cubrirlos para evitar la dispersión de material y afectación en la calidad de aire y salud de los trabajadores y comunidad. Se verificó extintor, punto ecológico, botiquin y punto de hidratación en oficinas del consorcio.

Sabado 30 Se continua con la elaboración de Jardineras, de piedra, de cenitales y pergolas. Se continua con la nivelación de piso para instalación de concreto fluido de Colores (Beige, Gris y Blanco). Se continua con los correctivos de muro baranda y jardineras. Se continua con la limpieza de modulos en concreto fluido. Se continua con la elaboración de elementos estructurales tales como la Rampa

de la abscisa K0+000 y muro paralelo entre abscisas K+210 y K+305. Se continua con la instalación de cañuelas y dosetas. Estado del tiempo: SECO 7:00am a 12pm.. En obra se cuenta con minicargador, un vibrocompactador y una comisión de Topografía.

Residente Interventoria

ENERO 2024

Martes 02 Se continua con la elaboración de elementos estructurales tales como: Rampa K0+000 y muro paralelo entre abscisas K0+210 y K0+305. Se continua con la construcción de jardineras centrales, de predio y pergolas. Se continua con la instalación de concreto fluido de Colores (Beige, Gris y Blanco). Se continua con la instalacción de Losetas y Cañuelas. Se continua con la nivelacción de paso para instalación de losa de contrapaso. Se continua con los correctivos del muro baranda y jardineras. Estado del tiempo: SECO de 7:00am - 5:00pm. En obra se cuenta con una comisión de Topografia, un vibrocompactador y un minicargador.

Residente Interventoria

Miercoles 03 Se continua con la instalación de losetas y cañuelas. Se continua con la elaboración de pergolas y jardineras centrales y de predio. Se continua con la instalación de concreto fluido de Colores (Beige, Gris y Blanco). Se continua con la construcción de Rampa y muro paralelo. Se continua con la instalación de paretes a predios adyacentes a polygono de intervención. Se continua con nivelación de paso para instalación de losa de contrapaso. Se continua con los correctivos del muro baranda y jardineras. Se inicia la instalación de postes en concreto para cerramiento de ladera. Estado del tiempo SECO: 7:00am a 5:00pm En obra se cuenta con una comisión de topografia, un vibrocompactador y un minicargador.

Residente Interventoria

Jueves 04 Se continua con la instalacion de postes en concreto para cerramiento de ladera. Se continua con la nivelacion de paso para instalacion de losa de contrapaso. Se continua con los correctivos del muro baranda y jardineras. Se continua con la elaboracion de jardineras centrales, de piedra y pergolas. Se continua con la instalacion de concreto fluido (Beige, Gris y Blanco). Se continua con la instalación de pared a predios adyacentes al poligono de intervencion. Se continua con la instalacion de losetas y cañuelas. Estado del tiempo SECO 7:00am - 5:00pm. En obra se cuenta con un minicargador, un vibrocompactador y una comision de topografia.

Residente Interventoria

Se realiza recorrido urbano entre las profesionales Sociales de Contratista e interventoria para Verificar puntos de información Satélite, solo encontrando que falta información en el Punto Satélite del Salón Comunal del Barrio el Mirador. Igualmente se realizó acompañamiento en la aplicación de 3 encuestas de Satisfacción a los habitantes cercanos a la zona de intervención.

Sandra J. Rodriguez A.
Prof. Social de interventoria.

Viernes 05 La profesional Social de interventoria hizo presencia en el Comite de Obra N°43 (N°43) y dio a Conocer las actividades ejecutadas en el trascurso de la semana y posteriormente se realizo la revisión Correspondiente del informe Social mensual N° 11 del Contratista y se trabajo en el informe Social mensual N° 11 de interventoria.

Sandra J. Rodriguez A.
Profesional Social de Interventoria.

Viernes 5 Se realizó recorrido de obra y se observó encofrado para fundición de jardineras, se realizó acompañamiento en la actividad de mantenimiento y aseo de unidades sanitarias portátiles. Se observó actividad de orden y aseo, y recolección de residuos sólidos comunes Se realizó acompañamiento en trabajo seguro en alturas en armado de columnas. Se verifica operación de excavadora marca shantai. Se observan elementos para atención de emergencias tales como botiquín, extintor de control de incendios y camilla. Se realizó cerramiento y demarcación de cajas de inspección (riesgo locativo) y evitar caidas a distinto nivel. Participación en comité semanal de obra en los componentes ambiental y SST. Se solicita al contratista reforzar el control y evitar en lo posible la disposición de llantas junto a la valla informativa del proyecto, al parecer la comunidad nuevamente está arrojando residuos sólidos en las areas cercanas al frente de obra.
Ing. Carlos Soto (Interventoria)

Personal Operativo; Entre ayudantes y oficiales 37. Almacenista 1, Topografia 2, Operarios de maquinaria 2 total Personal 42, maquinaria y Equipo. Retro excavadora y minicargador; Herramienta Menor, Andamio multidireccional, Mezcladora de concreto, Vibrado de concreto electrica, Frontado, Fundidora; 2 Canguro compactador, 1 Rana compactador.
Actividades Ejecutadas en el dia, Se continua con la construcción de jardineras centrales, de predio, de Pergolas; instalación de concreto fluido de color gris; se continua con cerramiento en lastra con Poste de concreto, Se continua con nivelación de Piso. para instalación de losetas y cañuelas, se continua con los correctivo de muro baranda, se realizo la instalacion de la losa de contrapiso, incluye malla electrosoldada Espesor. 10cm

Se llevó a cabo el comite de obra #43, con recorrido en obra con las entidades; mesa de trabajo TECNICO para la revisión del informe # 11.
Estado del tiempo "clima" 7am a 5Pm Seco

Residente interventoria

Sábado 6 Se verificó uso de elementos de protección personal (EPP) en los trabajadores y dotación en las actividades de demolición de cafetal en la jardinera y fundición de loza y placa. así como corte de madera. Se verificó el uso y operación de las unidades sanitarias en obra. Se observó punto de hidratación disponible en la obra además de óptimas condiciones de orden y aseo. Se realizó visita en sumideros y cuentan con polisombra
Ing Carlos Soto (SAPO)

En obra se cuenta con un personal operativo entre ayudantes y oficiales 37. en (1) Almacenista, una comisión de Topografia (2 personas) dos (2) operarios de maquinaria para un total de personal de 42.
Tambien se cuenta con un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, herramienta menor y andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto electrico, una tronzadora, una pulidora, 2 canguros compactador, una Rana compactadora.
Actividades ejecutadas: Se continua con la construcción de jardineras, centrales, de pedio y pegolas. Se continuo con la instalación de concreto fluido, se continua con el cerramiento en postes de concreto. Se continua con la nivelación de piso para instalación de loseta y cañuelas. Se continua con los correctivos de muro baranda. Se continua con la instalación de loza de contrapiso, incluye malla electrosoldada, e=10cm. Estado del tiempo seco : 7:00 am : 3:00 pm.

Residente interventoria

Mesa de trabajo con actividades administrativas propias del contrato como son informes semanales y mensuales, balance de mayores y menores cantidades, cronograma, flujo de caja, reprogramación

Residente interventoria

Martes 09 El fin de semana el contratista ejecuto las siguientes actividades constructivas: continuan con la modulacion para los pisos en concreto fluido color beige y ajustando asegurando e instalando la formaleta en la jardinera pergola. entre las abscisas K0+00 - K0+129

Residente Interventoria

El dia de hoy se realizó mesa de trabajo de seguimiento de actividades del mes de las actividades del informe 11, se revisó las subsanaciones solicitadas del informe Social, las que se Verificaron por la interventoria para darle aprobación por otro lado se revisan las actividades programadas para la semana del 9 al 13 de enero / 2024 entrega de Cartas de invitación para el Comité Veedor que se llevará acabo el 12 de enero / 2024; el jueves 11 de enero / 2024 se realizará recorrido Urbano entre P.S del Contratista e interventoria, aplicación de 3 encuestas de Satisfacción y Capacitación de los empleados con el tema de Estres en el trabajo.

Sandra J. Rodriguez A.
P.S Interventoria.

Miercoles 10 En obra se cuenta con 38 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, almacenista, una comisión de Topografia, operarios de maquinaria. Tambien se cuenta con un minicargador, vibrocompactador, retroexcavadora, herramienta menor, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto electrico, una frontzador una pulidora, dos canguros compactadores, una rana compactadora. Actividades Realizadas: Construcción de jardineras, centrales y de predio. Se realiza el vaciado de concreto para pergolas 6, columna 3 y 4. Se continua con la instalación de concreto fluido color Blanco entre las abscisas K+0.000 y K0+060 hacia el sur y hacia el norte entre las abscisas K+0.195 a la K0+260. Se continua con el cerramiento en polisombra en las bocacalles. Se realizó limpieza en la obra. Se continua con la humectación de las vias de acceso y de material granular instalado. Se realizo el respectivo curado de las placas de contrapiso instaladas durante el periodo de Enero y Diciembre.

Se hizo limpieza en los cordones existentes de los vias de acceso. Se realiza la señalización preventiva de las cajas para redes secas + humedas. Se presentó conato de incendio en la ladera el cual fue controlado por parte del contratista. Estado del tiempo SECO: 7:00 am - 5:00 pm. → Edwin Zambrano Reyes
Residente Interventoría
Residente de Obra

Acompañamiento Visita guiada a la obra con los profesionales de la secretaría habitat, Ideger y alcaldía para la visita de la nueva administración el día de mañana, se realiza visita del proveedor de carpintería metálica ultimos detalles de los barandas en rampas; mesa de trabajo con el contratista (Iti.) revisión de informes.
Residente Interventoría

Se realizó recorrido de obra, se observó un leve conato de incendio en la ladera el cual fue controlado efectivamente por el contratista. Se realizó una jornada de orden y aseo previa a visita del dia jueves 11/01/2024. Se confirmó buen uso de elementos de protección personal (EPP) y dotación. Se realizó revisión de detalle del informe mensual No. 11 componentes SST y ambiental. Se revisó la presentación del componente social, en los temas SST y ambiental.
Ing. Carlos Soto (Int. MAPO).

Jueves 11 Se realizó acompañamiento a Visita del Sr. Alcalde Mayor el Dr. Carlos Fernando Galán y las entidades Distrital. Igualmente se realizó recorrido Urbano en el Sector con aplicación de las 3 encuestas de Satisfacción.
P.S. Sandra J. Rodriguez A (MAPO - INGENIERA. Interv.).

En obra se cuenta con 45 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de Topografía, operarios de Maquinaria. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un mini cargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto electrico, una tronzadora, una polidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores. Actividades Realizadas: Construcción de bordillos, centrales y

de Predio. Se realiza desconchado de Jardineras y Pergolas. Se inicia con la instalación metalica de pergolas. Se continua con la instalación de losa de contrapiso en concreto floated en color gris. Se continua con la humectación de vias de acceso y material granular instalado. Se realizo respectivo curado de losas de contrapiso instaladas en obra. Se inicia la plantación de arboles en el sector de la ladera. De igual manera se recibe la visita del Alcaldia Mayor de Bogota. Estado del Tiempo DECO: 7:00am - 3:30pm y LLUVIAS FUERTES: 3:30pm - 5:00pm.

Residente Interventoria

la interventoria solicita allegar informe de topografia correspondiente al periodo del informe n°11, se reitera ejectuar la pruebas de estanqueidad a la red hidrosa, nitoria, se socializa (de) evidenciar dentro de los jardineras hierros para ser retirados y dar un correctivo a estas porque al retirar la formaleta quedan da con un mal acabado., segun comite pasado manifestaron de reactivar la actividad de pañete; hasta la fecha no hay cuadrilla en obra

Residente interventoria

Viernes 12 Se realizó comité semanal de obra con la participación de Idiger, Interventoria y el contratista. Se realizó inspección a la siembra de individuos arboreos. Se verificó el bando de las vias de ingreso y salida a volquetas. Paiticipación en el comite veedor. Se recomienda cubrir las cajas de inspección y lá señalizalas y demarcarlas para evitar la caida de trabajadores en las mismas Se observó adecuado uso de elementos de protección personal (EPP) y dotación. Se solicita señalizar las varillas de acero expuestas, para evitar golpes a visitantes, trabajadores y personal de obra. Se observó un adecuado manejo de residuos sólidos en obra y manejo de RCD. Se recomienda cubrir los materiales triturados, para evitar el

desperdicio de/material, afectación en la calidad del aire y la salud de los trabajadores y comunidad.
El día de hoy viernes 12 de enero no se observó punto de hidratación.
Ing. Carlos Soto (Int. MAPO).
Se asistió al Comite de Obra en el que se dió a conocer las actividades de la semana del 9 al 12 de enero /2024. del Componente social. Se realizó acompañamiento a la reunión del Comité Veedor con recorrido en la obra.
Jeydi J. Rodriguez A. (Prof. Social - int. MAPO - Ingeniería).
En obra se cuenta con 45 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografía, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tronzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Construcción de jardineras, centrales y de predio. Se realiza descofrado de Jardineras y Pergolas. Se inicia con la instalación metalica de pergolas. Se continua con la instalación de loza de Contrapiso en concreto fluido en color gris. Se continua con la humectación de vias de acceso y material granular instalado. Se realiza respectivo curado de losas de contrapiso instaladas en obra. Se continua la plantación de arboles en el sector de la ladera.
Estado del tiempo seco: 7:00 am - 5:00 pm

Residente interventoría

Sabado 13 En obra se cuenta con 45 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografia, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tronzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Fundida de losa de contrapiso color beige en costado sur, se continua con la implantación de especies

arboreas, instalación de cañuela, excavación de redes húmedas. Se realiza el respectivo curado de losa de contrapiso instaladas. Estado del tiempo Seco 7:00am - 2:30pm. llovisna 2:30pm - 2:45pm

Residente Interventoría

Recorrido en la obra para evidenciar jardineras hierros expuestos dentro de ellas y aposamientos, se envia registro fotografico al contratista para su respectivo correctivo; se recomienda efectuar esta actividad antes del llenado con tierra negra

Residente Interventoría

Lunes 15 Se verifica aleatoriamente las cantidades actividades constructivas en obra en compañia del contratista, interventoría y la supervisión encontrando algunas diferencias para ser ajustadas en las memorias de cálculo; mesa de trabajo pores con el balance de mayores y menores cantidades; revisión de los informes semanales del contratista evidenciando información no correspondiente al período para ser subsanadas, allegandoles con un oficio.

Residente Interventoría

En obra se cuenta con 39 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografia, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una franeadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.

Actividades Realizadas: Se inicia el dia con fundida de losas de contapiso blanco, se realiza revisión por parte del Componente Técnico, IDIGER e interventoria de acta de Obra, Texturizado de placas y el respectivo curado de las mismas. Se continua con la instalación metalica de pergolas. Se continua con la implantación de especies arboreas. Estado del tiempo Seco: 7:00 am - 7:00 pm.

Residente Interventoría

Martes 16 En obra se cuenta con 40 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografía, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Instalación de loseta guia, instalación de cañuela y excavación para cañuela, cargue de material para transporte a muro paralelo, se continua con instalación de estructura metalica en pergolas, instalación de drenajes e instalación de postes para cerramiento perimetral. Estado del tiempo seco: 7:00am - 7:00pm.

Residente
Interventoria

Mesa de trabajo pores | balance mayores y menores cantidades, acta parcial y observaciones al protocolo correctivos elementos estructurales en concreto

Residente
interventoria

Miercoles 17 En obra se cuenta con 42 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografía, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Se continua con instalación de formaleta en pergolas, instalación de loseta guia, humectación de via de acceso, instalación de cañuela, instalación de formaleta metalica para vaciado de placa de contrapiso color gris, fundida de losa de contrapiso color gris, costado centro, cargue de formaleta metalica para devolución, verificación de siembra de especies arboreas en la zona de manejo y preservación ambiental de la quebrada limas, texturizado de placas, instalación de

formaleta y malla electrosoldada para vaciado de placa color gris, cerramiento por el costado sur, curado de placas. De igual manera se recibe visita de IDIGER y habitat.
Estado del tiempo seco: 7:00 am - 7:00 pm.

Residente interventoria

Se realizó recorrido de obra identificando uso de elementos de protección personal (EPP) y dotación. Se cubrieron las cajas de inspección (riesgo caida a diferente nivel) con tablas de madera. Se verificó unidades sanitarias en obra y área administrativa en perfecto estado. Se haralizado la siembra de individuos arboreos de manera segura. Se realizó humectación de vias.

Ing Carlos Arturo Soto (Interventoria)

Jueves 18 En obra se cuenta con 41 personas (en obra) entre oficiales ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografía, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, un vibrocompactador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores. Actividades Realizadas: Excavación para instalación de cercamos, se realiza la debida humectación de via de acceso de maquinaria, fundida de contrapiso en color beige en costado centro y sur, se realiza afinado y texturizado de placa, se hace el debido curado de placa, llegada de individuos arboreos para adelantar el proceso de siembra. Estado del tiempo Seco: 7:00am - 8:00pm

Residente interventoria

Se recibe visita de la arquitecta natalia para su concepto Tecnico en las pérgolas y diseño en el sector donde se evidencia roca llegando al K0+304., mesa de trabajo semanal 48., inician la actividad instalación del alambre de pua's postes cerramiento en la ladera., suministro Tapas y marcos para las cajas de inspección

Residente interventoria

Se realizó Verificación del PAC; Cartelera y Pendón. Igualmente en Compañía del contratista se llevó a cabo un recorrido Urbano en el que se inspeccionó el estado de las carteleras de los 3 puntos satélites. Así mismo se aplicaron 3 encuestas de satisfacción a los vendedores Ambulantes del sector.

P.S Sandra Rodriguez A (Prof. Social de Interventoria).

Viernes 19 Se asiste al Comité de Obra Nº 45, se expusó las actividades sociales ejecutadas así como se dió a conocer los Compromisos Cumplidos del anterior Comité de Obra.

Sandra J. Rodriguez A (Prof. Social - interventoria)

- Participación en comité semanal de obra en los componentes ambiental y SST De acuerdo a información suministrada por el personal de siembra se tienen 549 individuos en el muro 14 en la linea del cable y 230 ind. en la quebrada para un total de 793 sembrados al dia de hoy Se observaron unidades sanitarias en funcionamiento y operación. Se realiza el acompañamiento en la fundida del pilote. Se verifica operación de la excavadora y el minicargador. El contratista ha realizado la protección de las cajas de inspección y espacios vacios (con riesgo de caida)
- Se inspeccionaron sumideros del área de influencia y se verificó cambio de polisombra. El jueves 18 de enero se realizó el cargé de Informe trimestral de RCD en el aplicativo de la secretaria distrital de ambiente (SDA) con la participación del Idiger, Consorcio VAPA e Interventoria MAB

participe en el comité en el componente técnico; ampliendo con las actividades administrativas propias de interventoria y en dara verificación y revisión tecnicas

Q. residente interventoria

En obra se cuenta con 40 personas entre oficiales, ayudantes y maestros, un almacenista, una comisión de topografía, operarios de maquinaria y ornamentadores. Tambien se

1817

encuentra (de) en obra herramienta menor, un minicargador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: fundida de losa de contrapiso color blanco en costado centro, afinado de losa de contrapiso, cerramiento con alambre de puas, tapado de pozos, pañete de muros, siembra de individuos arboreos, instalación de drenajes y cañuelas.
Estado del tiempo Seco: 7:00 am a 7:00 pm

Residente
INTERVENTORIA

· Dando respuesta a las diferentes evaluaciones de la interventoria por parte del área ambiental y SST, el Consorcio Vapa se permite informar que se han tomado en cuenta todas las recomendaciones dadas por la interventoría y se han desarrollado actividades tales como: Señalización de las cajas de inspección y plafonado con tablas (madera), entrega de elementos de protección personal, mantenimiento a la polisombra instalada en las bocacalles que dan acceso a la obra, limpieza de material, orden y aseo, separación de residuos sólidos, preoperacionales a la maquinaria que se encuentra en obra, humectación de la vía y barrido, cubrimiento de material de construcción con plastico, dispuso de punto de hidratación en obra. Al igual que todas las requerimientos hechos por la interventoría.

Yenny Cuesta
Residente Ambiental y SST. Consorcio Vapa.

Sabado 20 En obra se cuenta con 40 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, una comisión de topografía, y operarios de maquinaria. Tambien se encuentra en obra herramiento menor, un minicargador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Armado de última jardinera costado centro, instalación de tapa pozo, instalación de acero de refuerzo en zona de jardinera, lleno y compactación de muro paralelo, Resane en jardineras, instalación de marco, tapa y cintas de

ajuste en cajas de inspección, inicial excavaciones para cimentacion de comedores, Estado del tiempo Seco: 7:00am a 7:00pm

Residente Interventoria

Actividades administrativas propias de Interventoría para el buen desarrollo del contrato Residente Interventoria

Se asistió al Taller de Cultura Ciudadana N°7, el que contó con 12 personas por parte de la Comunidad; esta actividad se dividió en dos fragmentos, en la primera parte las profesionales sociales del Contratista e interventoría llevaron a cabo una sensibilización para generar el sentido de apropiación y la Creación de una mesa de trabajo interinstitucional para generar en Común estrategias de apropiación. Sandra J. Rodríguez J. P.S Interventoría

Lunes 22 En obra se cuenta con 33 personas entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, una comisión de topografía y operarios de maquinaria. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibradora de concreto eléctrica, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.

Actividades Realizadas: El dia domingo se realizarón actividades en obra como limpieza de alineadores y limpieza de jardineras para impermeabilizar, instalación de sumideros, excavación para los comedores, excavación para instalación de las cañuelas, excavación mécanica para realizar respectiva instalación de tubería y cárcamo, remvelación de pozo, instalación de cañuela, loseta guia y extendida y confirmación de base granular, extendida de material sobre rampa 2 costado norte, fundida de fondo jardinera, Estado del tiempo Seco 7:00am - 7:00pm

Residente interventoria

Actividades administrativos propios de interventoría para el buen desarrollo del contrato; recorrido en obra verificando medidas, niveles elementos estructurales; correctivos que se ejecutaran al muro de contención

Residente Interventoria 18/8

Martes 23 En obra se cuenta con 32 personas, entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, una comisión de topografía, y operarios de maquinaria. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, una retroexcavadora, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores
Actividades Realizadas: Humectación de via de acceso de maquinaria, trabajo en la zona baja ladera para siembra de arbol con elementos de protección contra caida, instalación de loseta guia y cañuela,

Residente Interventoría.

Realización de recorrido Urbano con Contratista verificación de los 3 puntos satélite con la información actualizada; se aplicaron 3 encuestas de Satisfacción a los habitantes del sector.
Sandra Rodriguez (Prof. Social - Interventoria).
Se continua con anotaciones de las actividades por parte del contratista: confirmación de base granular y instalación de la formaleta, excavación para instalación de Cajamo, Estado del tiempo: Seco 7:00 am - 7:00 pm.

Residente Interventoria

Mesa de trabajo subsanando observaciones informes semanales en las instalaciones de Idiger con el contratista quedando atentos que alleguen a la interventoría para su aprobación; paralelamente con actividades administrativas propias de la interventoría como son los informes semanal n°49 e informe mensual n°12 para evaluar desarrollo del contrato

Residente Interventoria

Miércoles 24 Se recibe visita por parte de Idiger atendiendo a sus observaciones técnicas con recorrido a la obra, aclarando inquietudes en las actividades constructivas como son: en el sector donde van los comedores, rampa llegando K0+280 que conecta los anderes; recomendando allegar

al contratista un oficio de iniciar con actividades aprobadas en comité N°45.

Residente, interventoria

Miercoles 24 (Jueves 25) (Se realizó visita de obra verificando) En obra se cuenta con 27 personas entre ayudantes oficiales y maestros, 1 almacenista, una comisión de topografia y operarios de maquinaria. Tambien: Herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, vibrador de concreto eléctrico, una frenzadora, una pulidora, una rana compactadora y 2 canguros compactadores. Actividades Realizados: fundida de piso color beige, afinado de losas de contrapiso y su debida curación, renivelación de pozo, instalación de tuberia, redes humedas, cargamo a caja, construcción de caja de redes humedas, fundida de solada para armado de acero de comedores. instalación de acero de refuerzo para comedor, fundida de losas de contrapiso color gris. Estado del tiempo. Seco 7:00am - 9:00pm.

Residente Interventoria

Jueves 25 Se realizó visita de obra verificando uso de elementos de protección personal EPP y dotación, inspección a sumideros de la zona encontrandose en buen estado de limpieza, se realizó banido de vias, operación de auxiliar de tráfico en la salida de la mixer. Se observó punto de hidratación, baños en optimo estado, botiquin de primeros auxilios, extintor de control de incendios, El contratista ha señalizado las cajas de inspección y de redes hidrosanitarias. Se observó uso de pulidora y martillo demolador. Asimismo se oboervó fundida de piso. De igual manera se verifica ron individuos arboreos sembrados. Al dia de hoy ya se tiene el 100% de cumplimiento de individuos sembrados. La única recomendación es cubrir los materiales granulares en obra para evitar el desperdicio y la afectación de la calidad de aire.

Ing. Carlos Soto (Int. MAPO).

Viernes 26 Mesa de trabajo componente técnico con recorrido de obra conciliando informe semanal n°49 cantidades y porcentajes

Presidente interventoría

Se asistió al Comité de Obra en donde se dió a conocer las actividades de la semana del Componente Social como son: Realización de taller de Cultura Ciudadana el 20 de enero/2024; recepción de un acta de Compromiso por Cableado deteriorado, pero fue arreglado por el Contratista, se llevó a cabo el recorrido urbano con verificación de los 3 puntos satélites de información y aplicación de 3 encuestas de satisfacción. Visita virtual Sandra J. Rodriguez Y. (Prof. Social de interventoría).

Se realizo visita para concepto técnico al inmueble que presentó fisuras por vibración evidenciando que estas han mantenido su longitud y profundidad desde los primeros días de seguimiento, cerrando así esta actividad.

Presidente interventoría

El día Jueves 25 de Enero, se cuenta con 30 personas en obra, entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, un topografo, un cadenero, y un operario de maquinaria. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Se realizo fundida de losas de contrapiso color beige con su respectivo texturizado y curado, construcción de cajas de redes humedas, se instala acero de refuerzo para comedores,
El dia viernes 26. se cuenta con 32 personas en obra entre ayudantes, oficiales, maestros, almacenista, topografo, cadenero y un operario de maquinaria, se cuenta con herramienta antes descrita.
Actividades Realizadas: fundida de placa de contrapiso de color blanco en el costado norte, instalación de acero de refuerzo para comedores, se realiza el inventario de los arbustos para cargar al SIGAU, fundida de placa color blanco costado (blanco) sur, limpieza y texturizado

de las losas de contrapiso y su respectivo curado. Estado de tiempo seco 7:00am - 7:00pm

Residente
Interventoria

SABADO 27 En obra se cuenta con 31 personas entre ayudantes, oficiales maestros, topográfos, y operario de minicargador. Tambien se cuenta en obra con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una trianzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores. Actividades Realizadas: Fundida de base en concreto de muro paralelo, armado de muro de jardinera de pergolas 5 y 6, limpieza general de obra y jardineras para impermeabilizar, fundida de boca calle losa de contrapiso color blanco, fundida de cimentación de jardineras, curado de losas. Estado del tiempo: Seco 7:00am - 7:00pm

Residente
Interventoria

LUNES 29 El día lunes 29 de Enero se encuentran 30 personas en obra entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, un topográfo, un cadenero y un operario de maquinaria. Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una trianzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores. Actividades Realizadas: Se continua con la instalación de la formaleta metalica para matera de costado centro, instalado y sellado de loseta prefabricada A50, corte de juntas de construcción, actividades de reparación de muro baranda, riego de plantulas en la ladera, instalación de acero de refuerzo y formaleta para comedores, Estado del tiempo Seco 7:00am - 7:00pm

Residente
Interventoria

Recorrido obra rectificando aceros refuerzo jardinera pérgola niveles y medidas acabados del mismo elemento estructural; inicia la actividad correctivo muro de contención con la nivelación de la corona escarificando y pulenda cortando

a concreto para proceder con el producto mejoramiento, acompañamiento verificando combuches en la parte baja de la ladera donde habitan personas que han hurtado elementos, materiales del contratista

Residente
Interventoria

Martes 30 En obra se cuenta con 33 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, dos topografos y un operario de maquinaria. Tambien se encuentro herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, vibrador de concreto eléctrico, una tranzadora, una polidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Vaciado de muros de materas costado centro, impermeabilizado de jardineras, reparación de muro baranda, instalación de la formaleta de los comedores, instalación de loseta y Sellado, se recepciona luminarias en obra, Estado del tiempo Seco: 7:00 am - 7:00 pm.

Residente
Interventoria

Se realizó visita de obra, se recomienda realizar la recolección de los RCD ubicados en la calle 716 Sur. Se observó uso de (compresor) y planta de energía eléctrica y pulidora Se recomienda evacuar los residuos ubicados en el punto de acopio. Se evidencia el minicargador en obra junto a la garita de seguridad. Algunas cajas de inspección no se encuentran cubiertas se solicita señalizarlas y demarcarlas. para evitar incidentes, y accidentes de obra. Se observaron unidades sanitarias en obra. Se verificó la fundida de algunas jardineras. Se observaron actividades de trabajo seguro en alturas (andamios) en pañete de viviendas. La oficina del consorcio VAPA cuenta con elementos de primeros auxilos, botiquin, camilla, y ademas punto ecológico y punto de hidratación.
Ing Carlos Soto (Int. VAPO)

En compañia con el contratista se arman el acero de refuerzo en sitio con el arranque en mesa hexagonal

con los pilas verificando niveles, medidas

Residente
Interventoria

Miercoles 31 Se llevó a cabo recorrido Urbano (visitándose los 3 puntos satélites de información los que se actualizaron el dia de hoy). Asimismo se verificó PAL; con la actualización de Cartelera y pendón externo; se acompaña a volanteo de taller de Cultura Ciudadana. Sandra J. Rodriguez Interv. MAPO 2016. Prof. Social;

Se realizó recorrido de obra en la zona del muro y el cable. Se solicita no arrojar residuos de construcción y demolición RCD sobra la zona de siembra. Se recomienda realizar una jornada de orden y aseo en la zona de siembra de árboles. Se observó jornada de orden y aseo en el punto de acopio de residuos. Se recomienda que el trabajador que se encuentra puliendo el muro utilice protector tapaoidas y un tapabocas para material particulado. Se realizó recorrido en los sumideros de la obra encontrandose con polisombra. Se evidenció actividad de impermeabilizacion de los jardineras. Se realizó conteo de arboles en zona de muro y cable. Se observaron elementos del plan de emergencias en la oficina del contratista VAPA. (botiquin, extintor y camilla). Se evidenció humectación de individuos arboreos. Se observaron RCD mezclados con los árboles sembrados y residuos de postes del cerramiento.

Ing. Carlos Arturo Soto (Interventoria MAPO).

En obra se contó con 28 personas entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, un topografo, un cadenero, dos personas impermeabilizando jardineras y uno de paisajismo. Se encuentra tambien herramienta menor, una mezcladora de concreto, un vibrador electrico de concreto, una tronzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.

Actividades Realizadas: impermeabilizado de jardineras, cerramiento de zona de obra, fundida de ultimos paños de gris, fundida de ultimos muros de jardinera y instalación de boseto prefabricada A-50 y sellado.

Estado del tiempo seco 7:00am - 7:00pm

Residente Interventoria

Se recibe visita de los profesionales de Idiger y Habitat recomendando al contratista de agilizar con las redes electricas por el tema de la certificación del Retie y Retilap; de igual forma con la terminación de las cajas de inspección de la redes hidrosanitarias para la prueba de estanqueidad.

Residente Interventoria

Jueves 1 Febrero

En obra se cuenta con 28 personas entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, un topografo, un cadenero y 2 impermeabilizadores de jardineras. Tambien se cuenta con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, un vibrador de concreto, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores. Actividades Realizadas: Instalación de loseta prefabricada, instalación de pañete, instalación de TRM 500 en costado norte, instalación de formaleta para comedores, corte de la junta de construcción, se realiza el retiro del residuo solido, acabado final de la corona del muro baranda, estado del tiempo Seco: 7:00am - 2:30 pm Precipitaciones 2:30 pm - 3:30pm

Residente Interventoria

Viernes 2

Se realizó recorrido de obra identificando óptimo uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación en los trabajadores. Se identificaron elementos de programa prevención de emergencias y Plan de Emergencias tales como botiquin de primeros auxilios, extintor y camilla. Se observó un buen manejo de residuos solidos al interior de la obra y en el area administrativa. Se realizó comité de obra semanal con la participación del Idiger, Interventoria MAPO y Consorcio VADA. Se adelantan actividades administrativas tales como informe semanal e informe mensual de obra.

Ing Carlos Soto (Int. MAPO)

En obra se cuenta con 29 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, un topografo un cadenero, dos impermeabilizadores y dos paisajistas. Tambien se cuenta con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, una tranzadora una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.

Actividades Realizadas: se adecua pared para realizar pañete de casa Doris Quimbaya, acabado final de corona de muro baranda, adecuación de terreno para instalación de cañuela, aplicación de última capa de emulsion en jardineras, instalación de loseta prefabricada, estado de tiempo sabado 7:00 am - 7:00 pm.

Residente Interventoria

Sabado 3

En obra se cuenta con 29 personas entre ayudantes, maestros, oficiales, almacenista, operador de maquinaria, topografo, cadenero, dos impermeabilizadores y dos de riego de arbustos, tambien se cuenta con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, una tronzadora, una pulidora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.

Actividades Realizadas: Se realiza el llenado de tierra(de) a las jardineras, instalación de cañuelas, limpieza de jardineras centrales, teminación de cajas, instalación de franja de ajuste, instalación de pañete, nivelación de pisos para loseta prefabricada de colores, instalación de loseta prefabricada entre jardineras costado centro, llenado y compactación de base granular en muros de comedores, aplicacion de emulsión en jardineras, acabado final en corona de muro baranda, vaciado de muro de comedor se lleva a cabo último taller de cultura ciudadana.

estado de tiempo: precipitaciones leves 7:00 am - 9:00 am. Seco: 9:00 am - 2:30 pm precipitaciones leves 2:30 pm - 7:00 pm.

Residente Interventoria

Lunes 5 El dia lunes 5 de febrero se cuenta con 27 personas en obra entre ayodantes, oficiales y maestros, un almacenista un operador de maquinaria, una comisión de topografia, electricos, un impermeabilizador y dos regadores de arboles. Tambien se cuenta con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, un vibrador de concreto electrico, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores:
Actividades Realizadas: Instalación de pañete, acabado final corona muro baranda, instalación de loseta prefabricada, impermeabilización de jardineras, Estado del tiempo: Seco: 7:00 am - 11:45am Precipitaciones: 11:45 - 5:00 pm

Residente
Interventoria

Martes 6 En obra se cuenta con 27 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, electricos, un almacenista, un operario de maquinaria, una comisión de topografía, Tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, un vibrador de concreto eléctrico, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: acabado final de corona muro baranda, armado de andamios para instalacion de pañete, instalación de pañete, instalación de la formaleta para comedores, instalación de marcos de cajas de redes secas y humedas, instalación de arena de sello, instalación de la loseta prefabricada, pegue de juntas de cañuela, acometida con respectiva conexión para instalación de contador, Estado del tiempo: Seco: 7:00 am - 3:00pm precipitaciones fuertes 3:00 pm - 7:00 pm

Residente
Interventoria

Miercoles 7 En obra se cuenta con 28 personas entre ayudantes, oficiales, maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, una comisión de topografía, electricos, un impermeabilizador.

Tambien se cuenta con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, una mezcladora de concreto, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora, un vibrador de concreto eléctrico, y dos canguros compactadores Actividades Realizadas: instalación de marcos en cajas de redes secas y humedas, acabado final de la corona en muro baranda, instalación de pañete, corte de junta de constiucción, impermeabilización de jardineras, prueba de lloraderas de jardineras, instalación de postes de concreto, instalación de loseta, vaciado de cinta de ajuste, actividades de limpieza de escombros de obra y organización de acopio de material. Estado del tiempo Seco 7:00 am - 7:00 pm.

RESIDENTE (INTERVENTORÍA)

Miercoles 7 Se llevó acabo acompañamiento y recorrido Urbano con secretaría de Habitat (Visitándose las 4 casas para los murales), en la tarde se realizó Recolección de Firmas. Para autorizar. (lo) "el tema murales". Finalizó, con la reunión con la rolita con (Paola) profesional social de la rolita transmicable. Sandra J. Rodríguez A. PROFESIONAL SOCIAL - INTERVENTORIA MAPO INGENIERIA

Jueves 8 Se realiza recorrido de obra identificando la realización de la jornada de orden y aseo, barrido en las áreas operativas, se evidenció buen uso de elementos de protección personal EPP y dotación. Se evidenció elementos de atención de emergencias tales como extintor, botiquin y camilla (en almacén del contratista). Se observa punto ecológico en oficina del consorcio VAPA. Se evidencio crecimiento y buen estado de los individuos arbóreos sembrados.

Ing Carlos Soto (Int. MAPO)

En obra se cuenta con 29 personas entre ayudantes, maestros, oficiales, un almacenista, un operario de maquinaria, una comisión de topografía, impermeabilizador, tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, un vibrador de concreto eléctrico, una

1823

pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: labores de pañete, acabado final de corona muro baranda, impermeabilización de jardineras, inicia actividad de pintura Koraza, limpieza de RCD en calles, translado e instalación de silla prefabricada, instalación de loseta prefabricada, vaciado de muro comedor, jornada de aseo, estado del clima Seco: 7:00 am - 7:00pm.

Residente
Interventoria

Viernes 9 Se cuenta con personas en obra entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, una comisión de topografía, impermeabilizador, tambien se cuenta con herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, un vibrador de concreto eléctrico, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: labores de pañete, traslado de mobiliaria de concreto, labores de pintura, instalación de loseta y junta de ajuste, aplicación de emulsión para la impermeabilización de las jardineras, instalación de loseta prefabricada, vaciado de placa de contrapiso, instalación y trasciego de mobilidario urbanistico, estado del clima: Seco 7:00am - 7:00pm

Residente
Interventoria

Sabado 10 En obra se cuenta con 29 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, impermeabilizador, una comisión de topografía, tambien se encuentra en obra herramienta menor, un minicargador, andamios multidireccionales, mezcladora de concreto, un vibrador de concreto eléctrica, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: acabado final de la corona del muro baranda, limpieza y acabado final de cajas de inspección, instalación de loseta prefabricada, Retiro de RCD, instalación de pañete, acabados de estructuras metalicas para pergolas, instalación de pintura Koraza a predios adyacentes al poligono de intervención, cerramiento de la

ladera con postes en concreto y alambre de púas, estado del tiempo seco 7:00am - 7:00pm

Residente Interventoría

el día viernes se asistió al comité de obra en donde se dió a conocer las actividades de la semana del componente social como son: se realización Reunión con la rolita (transmicable) el 7 de enero/2024; Posterior eso se expuso también, de la reunión con Rolita y representante de artistas locales y comité grafiteros. se llevó a cabo al recorrido urbano con verificación de los 3 puntos satélites de información y aplicación de 3 encuestas de satisfacción. visitas vivienda.

Sandra J. Rodriguez A, (Interventoria Mapo Ingeniería

domingo 11 Sandra J. Rodriguez A: se efectua recorrido en obra observando las siguientes actividades constructivas: continuan con la primera mano a base de pintura en fachadas existentes ; propietario de la vivienda entre las abscisas 265 a 289 levanta cuatro hiladas de mampostería; continuan con el llenado de jardineras con tierra negra; continua con la aplicación de pintura negra en la estructura metálica en pérgolas, continuan con la instalación loseta color ocre y terracota rompo muro paralelo

Residente Interventoría

lunes 12 Recorrido en obra verificando armado acero refuerzo varilla ø3/8 en mesas que componen los comedores segun diseño; inician actividades instalación tubería y platinas corte y soldadura para la construcción de barandas rompa sur.

Residente Interventoría

Martes 13 se asistió al (comité) la reunión InterInstitucional, con el Fin de abarcar temas de interés general, debido ala entrega de la obra, esta se efectuó en el auditorio de Transmicable alas 10:25 am se acom Sandra J (m) Rodríguez A. (Prof. Social de Interventoría). Para a volanteo del convocatoria ala Reunión Extraordinaria a los propietarios de los predios aledaños a la ejecucción de, obra. Sandra Rodrigu (PROF.Social de Interventoría). Sandra J. Rodriguez A

En obra se cuenta con 28 personas entre ayudantes, oficiales y maestros un almacenista, un operador de maquinaria, impermeabilizador, una comisión de topografía, también se cuenta en obra con una mezcladora de concreto, vibrador de concreto electrico, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora y dos canguros compactadores.
Actividades realizadas: Acabado Final de muro baranda (corona), limpieza y acabado final de cajas de inspección, instalación de losetas prefabricada, retiro de RCD, instalación de pañete en predios adyacentes al polígono de intervención, acabados en estructura metalica para Pergolas, instalación de pintura Koraza a predios adyacentes al polígono de intervención, concamiento en postes en concreto en la zona de la ladera. Se continua con el corte de las puntas de construcción. Se inicia la instalación de barandas metalicas en Rampa Katoco. Se continua con el lleno en tierra negra para jardineras. Se inicia con la excavación para instalación de Bolardos. Se continua con la construcción de comederos, instalación de bordillo ABO. Tiempo de Estado del tiempo SECO: 7:00 am - 5:00 pm.

Residente interventoría

Miércoles 14 En obra se cuenta con 26 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, impermeabilizador, una comisión de topografía, también se cuenta en obra con una mezcladora de concreto, vibrador electrico de concreto, una pulidora, una tronzadora, una rana compactadora, y dos canguros compactadores.
Actividades Realizadas: Acabado Final de corona de muro baranda

limpieza y acabado final de cajas de inspección, instalación de loseta prefabricado, instalación de pañete en predios adyacentes al polígono de intervención, acabados en estructura metálica para pergolas, instalación de pintura Koiaza en predios adyacentes al polígono de intervención, cerramiento en lodera con postes en concreto y alambre de púas, Se continua con el corte de los puntos de construcción, Se continua con la instalación de bolardos metálicos en bocacalles que intervienen en la obra, Se continua con la instalación de barandas metálicas en Rampas K0+000 y K0+305. Se continua con la instalacion de loseta en muro paralelo, Se inicia con la siembra de plantas ornamentales, se continua con la construcción de comederos, se continua con la instalación de bordillo A80 en costado norte K0+305.
Estado del tiempo; SECO 7:00am - 5:00pm.

Residente
Interventoria

Jueves 15. Se realizó recorrido de obra en la zona del muro y Urbano (visitándose los 3 puntos satélites de información los que se actualizaron (el día de hoy). Asimismo se verificó PAC; con la actualización de cartelera y Pendón exterior. (Sandra J. Rodríguez Interventoría)
Sandra J. Rodríguez A.

En obra se cuenta con 28 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquinaria, impermeabilizador, una comisión de topografía, una mezcladora, una polidora, una fisuradora.
Actividades realizadas: Instalación de pañete y pintura Koiaza en predios adyacentes al polígono de intervención, cerramiento en lodera con postes en concreto y alambre de púas, instalación de barandas metálicas en rampas K0+000 y K0+305, Excavación e instalación de bolardos metálicos en boca-calles, se continua con la siembra de arboles en jardineras, construcción de comederos, instalación de bordillo A80 en el costado norte K0+307.
Estado del tiempo: SECO 7:00am - 5:00pm.

Residente
Interventoria

1825

Viernes 16 Se asistió al comité de obra en donde se dió a conocer las actividades de la semana del componente social como son: Realización de la reunión con la rolita, Secretaría de Hábitat y alcaldía local (comunidad y artistas de sector).; Recepción de un acta de compromiso, por el retiro de tubería caliente de colata de la vivienda, ya que desemboca sobre los trabajos realizados por parte de obra. Realización de capacitación de empleados de obra n°10 a las 2:30pm el día 14 Febrero/2024; y volanteo para invitar a una reunión extraordinaria a los propietarios de los predios aledaños; se llevó a cabo el recorrido y barrido con verificación de los 3 puntos sátelites de información y aplicación 3 encuesta de satisfacción. visitas a la viviendas. Sandra J. Rodríguez A. (prof. social interventoría) y por último se asistió a la reunión del Comite Veedor.

Lunes 19 Se efectuo visita en obra por parte del Componente Social de la entidad, evidenciando que no se encuentra la profesional social de interventoria realizando labores de supervisión del Componente Social de obra.
Se efectua mesa de trabajo con la Profesional Social de obra con el animo de revizar la propuesta del programa de Cultura Ciudadana, y Ver la posibilidad de enfocar la propuesta en la instalación de un Comite de Seguridad conformado por la Comunidad. (Jacy Sepulveda - DIGER)

En obra se cuenta con 18 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquina, una comisión de topografía y una cuadrilla de electricos, en obra tambien se cuenta con maquinaria como la mezcladora, un minicargador

 18807

obrado de concreto, una polidora, una tronzadora, y dos compactadores.

Actividades realizadas:

Se continua con el acabado de corona final de muro baranda, se continua con la limpieza y acabado final de muro paralelo. Se continua con la instalación de loseta prefabricada. Se continua con el acabado de cajas de inspección, Se continua con la instalación de pañetes en predios adyacentes al poligono de intervención. Se continua con la instalación de luminaria en postes. Se continua con la instalación de postes en concreto para cerramiento de ladera, se continua con la instalación de bolardos. Se continua con la humectación en siembra de árboles. Se continua con la instalación de baranda metalica en las abscisas Kt 000 y Kor305. Se continua con el sello de losetas.

Estado del tiempo:

Seco 7:00 am - 5:00 pm

Residente interventoria

Arq Aurelio.

martes20 Se realizó acompañamiento para la realización de las encuestas de satisfacción (3 personas), se asistió al reunión con secretaria de hábitat, alcaldia local, La Rolita, contratista (y) interventoría y artistas para concretar punto de los murales y como se solicitará presupuesto para la realización. Sandra J. Rodriguez (prof. social Interventoría) Sandra J. Rodriguez Q.

En obra se cuenta con 26 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, un almacenista, un operador de maquina, una comisión de topografia una comisión electrica, en obra se cuenta con maquinaria tales como una mezcladora, una

1826

pulidora, una tronzadora, un minicargador, un manlift.
Actividades realizadas: Instalación de loseta prefabricada, se continua con el acabado final del muro baranda, Se continua con la instalación de la baranda metalica, se continua con el sello de loseta, Se continua con la instalación de luminarias, Se continua con la siembra de plantas costado sur, se continua con la instalación de bolardos y conectos en acero inoxidable.
Estado del tiempo: SECO 7:00am - 5:00pm.

Residente interventoría

Miercoles 21 En obra se cuenta con 25 personas entre ayudantes, oficiales y maestros, una comisión de topografia una comisión electrica, en obra tambien se cuenta con maquinaria tales como; un minicargador, una tronzadora, una pulidora, un manlift,
Actividades realizadas: Se continua con la instalación de pintura koraza en predios adyacentes al poligono de intervención, se continua con la instalación de loseta prefabricada, se continua con la instalación de luminaria, se continua con la instalación de bolardos y conectos en acero inoxidable, se continua con el riego de plantas en jardineras, se continua con el acabado final de muro baranda y muro paralelo, se continua con la instalacion de baranda metalica en rampas y muro paralelo. Se continua con el sello de loseta, se continua con la reparación de muros en jardineras.
Estado del tiempo: SECO: 7:00am - 5:00pm.

Residente interventoría

miercoles 21 se llevó acabo recorrido urbano (visitando 3 puntos satélites de información los que se actualizaron el día de hoy). Asimismo se verificó PAC vencido; con la actualización de caitelera y pendón exterior. Y se asistió a la reunión en donde se dio a conocer las actividades de trabajo
