GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME DE GESTIÓN N° 05

CONTRATO 1698 - 2024

PERIODO: 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTROL DE CAMBIOS					
DESCRIPCIÓN	**VERSIÓN**	**FECHA**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Informe Mensual N° 05	00	20 de noviem 2024	Jerson Lázaro Residente de Interventoría	Coordinador de Interventoría	Director de Interventoría

INFORME MENSUAL No. 05

DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No 1698-2024

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

BOGOTÁ D.C

NOVIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.1.1 Alcance General 9
2.1.2 Objeto del Contrato de Obra e Interventoría 11
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 12
2.3.1 Información General Contrato de obra 12
2.3.2 Información General Contrato de Interventoría 13
2.3.3 Personal involucrado en el proyecto 14
3. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 15
3.1 CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 15
3.2 ESTADO DE POLIZAS 16
3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 17
3.3.1 Balance financiero contrato de obra 17
3.3.2 Balance financiero contrato de interventoría 18
3.3.3 Anticipo contrato de obra e interventoría 19
3.3.4 Actas parciales Contrato de Obra 19
3.3.5 Actas parciales Contrato de Interventoría 19
3.3.6 Metas físicas, actividades por ejecutar y alcance 20
4. INFORMACION TECNICA 23
4.1 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA 23
4.2 INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 25
4.3 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO 25
4.4 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS EN EL PERIODO 26
4.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 28
4.6 DESCRIPCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO 28
4.7 CONTROL E INSPECCIÓN Y ENSAYOS 28
4.8 CALIFICACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO. 29
4.9 CALIFICACION DE PERSONAL, MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPOS: 29
4.9.1 Personal 29
4.9.2 Materiales 29
4.9.3 Maquinaria Y Equipos 29
4.10 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 30
4.11 GESTIONES ADELANTADAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA. 30
4.12 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS 31
4.13 BITÁCORA DE OBRA 31

4.14 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 31
4.15 CONTROL ADMINISTRATIVO 31
4.15.1 Personal del Contratista 31
4.15.2 Personal de la Interventoría 32
4.15.3 Control e inspección y ensayos 32
4.15.4 Control de equipos utilizados en obra 32
4.15.5 Control del estado del tiempo 32
5. COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SG-SST 33
6. INFORMACION AMBIENTAL Y SG-SST 33
6.1 INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE LA OBRA (INCLUYENDO EL COMPONENTE DE MAQUINARIA/EQUIPO Y VEHÍCULOS), CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL PIPMA. 33
6.2 CONTROL DE MATERIALES Y COPIA DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE ADQUISICIÓN DE TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL MES DENTRO DE LA OBRA. 33
6.3 CONTROL DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 36
6.4 MANEJO DE VEGETACIÓN 38
6.5 LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL MES DE OBRA 38
6.6 RELACIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIA AMBIENTAL Y/O PERMISO AMBIENTAL Y/O PIN AMBIENTAL. 39
6.7 RELACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA UTILIZADA POR EL CONTRATISTA DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. 39
6.8 COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICA DE LOS BAÑOS MÓVILES, ANEXANDO COPIA DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS VIGENTE EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 40
6.9 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 41
6.10 INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO TANTO DEL CONTRATISTA DE OBRA COMO DEL INTERVENTOR. 44
6.11 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 45
6.12 CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA (DE ACUERDO CON L NATURALES DE LA MISMA) Y SUBCONTRATISTAS, DONDE SE EXPRESE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SALARIOS QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL NÚMERO E TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL CONTRATO DE OBRA Y EL PERIODO LABORADO. 51

6.13 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 52
6.14 CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR (DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA MISMA) Y SUBCONTRATISTAS, DONDE SE EXPRESE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SALARIOS QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL CONTRATO DE OBRA Y EL PERIODO LABORADO. 53
6.15 CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST Y FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES..... 53
6.16 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA DONDE EXPRESE QUE SE HAN REVISADO LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGOS SALARIALES Y DEL SGSSI REMITIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL RESPECTIVO INFORME. 54
6.17 PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES 58
7. INFORMACION SOCIAL 61
7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA. DEBE INCLUIR COPIA DE LOS ANEXOS REFERENTES A LA GESTIÓN DEL CONTRATISTA REQUERIDO EN EL CONTRATO. 61
7.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA. DESCRIPCIÓN DE LOS ATRASOS O ADELANTOS O EVENTUALIDADES QUE SE ESTÉN PRESENTANDO CONFORME AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. ADEMÁS, SE DEBEN RELACIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS, ASÍ COMO LA RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA..... 61
7.3 RELACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORÍA. 62
7.4 CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL. 63
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (AMBIENTAL, SOCIAL Y SST)..... 64
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 64

ANEXOS

ANEXO No. 01 Acta Comité de Obra.
ANEXO No. 02 Control de personal del Contratista.
ANEXO No. 03 Control de personal de la Interventoría.
ANEXO No. 04 Control e inspección y ensayos.
ANEXO No. 05 Control de equipos utilizados en obra.
ANEXO No. 06 Control del estado del tiempo.
ANEXO No. 07 Correspondencia enviada.
ANEXO No. 08 Registro Fotográfico.
ANEXO No. 09 Bitácora de Obra.

LISTADO DE TABLAS

Tabla 01 Datos generales del Contrato de Obra No. 1665 de 2024 12
Tabla 02 Datos generales del contrato de Interventoría No. 1698 de 2024 13
Tabla 03 Personal de Gobernación del Tolima..... 14
Tabla 04 Personal de ALDEIC S.A.S. BIC 14
Tabla 05 Personal de CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO 14
Tabla 06 Control Legal Contrato de Obra..... 15
Tabla 07 Control Legal del Contrato de Interventoría..... 16
Tabla 08 Pólizas del Contrato de Obra 17
Tabla 09 Pólizas del Contrato de Interventoría 17
Tabla 10. Control de materiales granulares empleados en obra..... 34
Tabla 11. Control de bolsas de cemento empleados en obra 34
Tabla 12. Control de suministro de agua industrial en la obra. 35
Tabla 13. Control de RCD – MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe..... 36
Tabla 14. Control de RCD – MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe..... 37
Tabla 15. Control de RCD - MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca..... 37
Tabla 16. Control de RCD - MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca..... 37
Tabla 17. Vehículos utilizados mes 5..... 38
Tabla 18. Equipo y/o Maquinaria utilizada..... 39
Tabla 19. Relación de maquinaria y/o vehículos utilizados en obra en mes No 5 40
Tabla 20. Relación uso de unidades sanitarias contratista..... 40
Tabla 21. Capacitaciones SST contratista reportadas para informe No. 5..... 41
Tabla 13. Capacitaciones ambientales contratista reportadas para informe No. 5 42
Tabla 23. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo contratista 44
Tabla 24. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo Interventoría..... 45

Tabla 25. Comparación personal en obra según contratista e interventoría 46
Tabla 26. Documentación de afiliaciones personal contratista 48
Tabla 27. Seguridad social personal interventoría 52
Tabla 28. Trazabilidad requerimientos de presentación documento PAGA..... 53
Tabla 29. Seguridad social contratista mes de octubre 2024..... 55
Tabla 30. Identificación de permisos ambientales del proyecto. 58
Tabla 31. Charlas área social..... 62
Tabla 32. Consolidado PQRS del periodo del 11 de octubre al 10 de noviembre 2024 63

LISTADO DE FIGURAS

Figura No. 1. Descripción de la estructura del Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema..... 10
Figura No. 2. Localización Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es elaborado por el personal profesional en obra y de especialistas de la empresa ALDEIC S.A.S. BIC, contiene información de la etapa de construcción, el desarrollo de actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales, en el trabajo que realizó el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO para el CONTRATO DE OBRA N° 1665 DE 2024, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

Asimismo, describe la gestión realizada y el estado de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1698 de 2024, cuyo objeto es **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**.

El presente documento contiene una descripción general de las actividades realizadas, durante el período comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024 por parte de esta Interventoría.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Actualmente el Departamento del Tolima cuenta con una longitud total de 2192,76 kilómetros de vías a su cargo, divididos en 745,76 km de vías de segundo orden y 1447 km en vías de tercer orden. Ahora bien, además de la infraestructura vial que se encuentra a cargo del departamento, también es uno de los objetivos del gobierno departamental ejecutar proyectos para intervenir la infraestructura de puentes presentes a lo largo de dichos corredores.

El puente existente en la vía Palobayo – Ambalema, está ubicado en las coordenadas: 4.724581° y -74.84792°, dentro del Departamento del Tolima, cuya estructura cruza en sentido NE-SO el río Venadillo, el cual; por efectos del desgaste que sufren estas estructuras por la exposición a condiciones ambientales extremas, se encuentra en estado crítico. Según la inspección realizada por parte de la **CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO - AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**, se determinó como patología principal durante la inspección lo siguiente: Falla en la capacidad portante del suelo que soportaba uno de los estribos; dicho estribo no contaba con cimentación profunda, lo que lo volvió más susceptible a la socavación por efectos del flujo de agua generando el fallo de la superestructura.

La situación que se presenta con el puente sobre el Río Venadillo ha generado un impacto negativo en la comunidad y en la productividad de la región. En consecuencia, genera bajo desarrollo socioeconómico, aumento de los tiempos de viaje y costos de transporte de carga y pasajeros. Además, afecta el acceso a servicios médicos, la asistencia educativa y aumenta los costos de operación vehicular, lo que crea condiciones desfavorables y presuntamente alto riesgo de accidentalidad.

Los efectos positivos de la inversión en infraestructura de transporte, se ven reflejados a nivel macroeconómico, regional y en términos de competitividad; con ello se iniciaría a cerrar la brecha de infraestructura y atender los requerimientos que le impondrá el crecimiento de la demanda productiva y de servicios de transporte en las carreteras; la política de infraestructura de transporte que se adelantara, estará enmarcada en procesos integrales de planificación con un nivel alto de los estudios técnicos para la toma de decisiones; en la definición de lineamientos estratégicos para el sector en materia de adaptación y mitigación del riesgo frente a desastres naturales; en el desarrollo de programas que respondan y complementen las apuestas productivas y sectoriales; en la adopción de nuevos y mejores mecanismos de financiación y en la integración y desarrollo regional.

Los estudios y diseños definitivos, nos presentan las especificaciones de intervención del puente vehicular sobre el Río Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo - Ambalema, donde se describen: Estudios de tránsito, de capacidad y niveles de servicio, levantamiento topográfico, batimétrico, diseño geométrico, estudio de suelos, geológicos y diseño de estructuras de cimentación, así como estabilización de terraplenes, estudio hidrológico, hidráulico y de socavación, diseño estructural de puentes y obras complementarias (accesos y otros), gestión predial, gestión ambiental y social, estudio de análisis del riesgo y sostenibilidad entre otros para su ejecución en la etapa de construcción.

2.1.1 Alcance General

El puente existente en la vía Palobayo – Ambalema, ubicado en las coordenadas: 4.724581° y -74.84792°, en el Departamento del Tolima, cuya estructura cruza en sentido NE-SO el río Venadillo el cual, por efectos del desgaste de estructuras por la exposición a condiciones ambientales extremas, se encuentra en estado crítico.

Con la ejecución del proyecto se pretende realizar la demolición del puente existente y la construcción de uno nuevo en estructura metálica y placa de concreto, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra la demolición de la estructura existente puesto que este puente colapso en uno de sus estribos y la construcción de un nuevo puente con una cimentación profunda con estructura de apoyo en concreto, el puente se realizará con estructura metálica que soportará una placa de concreto. Teniendo en cuenta el amplio alcance del proyecto, la gestión de recursos, el entorno donde se desarrolla, la integralidad del mismo, el manejo y disposición del recurso humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta. Las actividades a ejecutar y el alcance del proyecto, se enfoca en realizar la construcción de un puente de 45 metros de longitud con dos

aproches a ambos lados de 8 metros. Se precisa como requerimiento la construcción, de estructuras nuevas para el soporte del puente, así como también el mejoramiento de la vía de acceso al puente, beneficiando al Municipio de Ambalema, al municipio de Venadillo, y demás municipios, corregimientos y veredas que se encuentran en el área de influencia del proyecto.

- ✓ Tipología = Mixta (superestructura en acero, con apoyos y cimentación en concreto reforzado).
- ✓ Luz = luz central de 45 metros, más dos luces con lozas de aproximación de 8 metros cada una.
- ✓ Ancho = 5,90 metros.
- ✓ Capacidad = hasta vehículos de 52 Toneladas.

Estructura en Concreto	Mixta con Superestructura en Acero
Bajo rendimiento constructivo: conduce mayor tiempo de emisión de polvo y ruido en sitio de la obra	Alto rendimiento Constructivo, mínimo emisión de polvo y ruido en ejecución de obra.
Se genera mayores desechos de construcción	Se genera bajos desechos de construcción
Mayor complejidad en el proceso constructivo	Proceso constructivo más cómodo
Requiere formaleta y andamiaje	Formaleta solo para tablero
Mayores tiempos de Cierre Permanentes	Bajos tiempos de cierres permanentes y ejecución
Mayor Peso, lo que se traduce en mayores dimensiones de cimentación	Pesos moderados, Menores obras de cimentación.
Se requieren muchos controles, para garantizar el diseño	Controles hechos en entornos controlados en taller
Mayor imprevistos y desperdicios	Mayor control en las cantidades y menor cantidad de desperdicios.

Figura No. 1**.** Descripción de la estructura del Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema
Fuente: Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo - Ambalema en el departamento del Tolima.

Que, según el Decreto Nro. 0117 del 28 de enero de 2022, por el cual se clasifican unas carreteras y se dictan otras disposiciones, y de acuerdo con los dispuesto en las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte, la Caracterización del tramo vial del Proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” se encuentra categorizada como vía de tercer orden a cargo y competencia del Departamento del Tolima.

ID	CODIGO	NOMBRE DE LA VIA	CLASIFICACION	LONGITUD (KM)
3	43TL13	PALOBAYO - AMBALEMA	VÍA DE TERCER ORDEN	23.80

2.1.2 Objeto del Contrato de Obra e Interventoría

El contrato de obra No. 1665 de 2024, cuyo contratista de la obra es el **CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO**, tiene como objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Por otra parte, para la interventoría del contrato de obra anteriormente descrito, se suscribió el contrato de interventoría No. 1698 de 2024 con la empresa **ALDEIC S.A.S. BIC**, cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

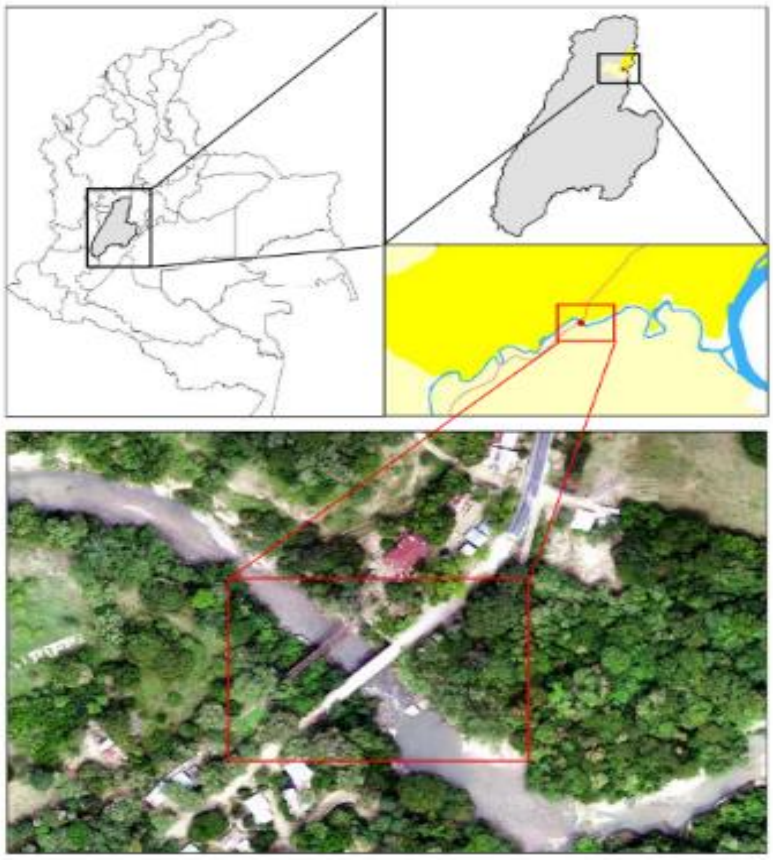


Figura No. 2**.** Localización Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema
Fuente: Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo - Ambalema en el departamento del Tolima

El proyecto contempla la construcción de un puente sobre el Río Venadillo en los municipios de Venadillo y Ambalema en el departamento del Tolima, nuevos tramos viales de accesos al puente, obras de drenajes y construcción de estructura de pavimentos.

En el presente informe se describe el proceso y se exhiben los resultados del proceso constructivo en el periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024, de cada una de las actividades a ejecutar a lo largo de la materialización del proyecto, localizado entre el municipio de Venadillo y Ambalema (Departamento del Tolima).

2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

2.3.1 Información General Contrato de obra

En la siguiente tabla se relacionan los datos generales del contrato de obra No. 1665 de 2024:

Tabla 01 Datos generales del Contrato de Obra No. 1665 de 2024

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO**		
	NIT O CC:	901.826.039-0		
	DIRECCIÓN:	CL 2 2 – 70 of. 405 Ed. El Molino	**TEL:**	6424928
	CIUDAD:	Ibagué – Tolima		
	REPR. LEGAL:	**LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ**		
	C. C. No.:	14.225.605		
SUPERVISOR GOBERNACIÓN:	**NEIL HAROL LEAL**			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 6.616.451.791,35**			
	Valor en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº 1**	**$ 0,00**		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 6.616.451.791,35**			
	Valor en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.			
PRORROGA	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION			
FECHA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº 1**	**SUSPENSIÓN**	N.A	
		REINICIACIÓN	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE ENERO DE 2025			

2.3.2 Información General Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se relacionan los datos generales del contrato de Interventoría No. 1698 de 2024:

Tabla 02 Datos generales del contrato de Interventoría No. 1698 de 2024

INTERVENTORÍA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ALDEIC S.A.S. BIC		
	NIT O CC:	901.099.626-4		
	DIRECCIÓN:	Carrera 18 No. 116-24	TEL:	601-2145198
	CIUDAD:	Bogotá D.C.		
	REPR. LEGAL:	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS		
	C. C. No.:	39.691.684 de Bogotá D.C.		
SUPERVISOR GOBERNACIÓN:	**NEIL HAROL LEAL**			
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$525.586.987,00** IVA INCLUIDO			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION			
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº 1	SUSPENSIÓN	N.A.	
		REINICIACIÓN	N.A.	
FECHA ACTA ADICIONAL 001	N.A.		N.A.	
PRORROGA	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			
VALOR ADICIÓN	N.A.			
	N.A.			
VALOR TOTAL INCLUYENDO ADICIÓNES	**$525.586.987,00** IVA INCLUIDO			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO PRORROGA	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE ENERO DE 2025			

2.3.3 Personal involucrado en el proyecto

Durante el presente período, cada uno de los participantes del proyecto ha dispuesto el personal que se relaciona a continuación:

2.3.3.1 Personal autorizado por Ente contratante

Tabla 03 Personal de Gobernación del Tolima

(Supervisión de los Contratos de Obra e Interventoría)

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA – SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	NEIL HAROL LEAL

2.3.3.2 Personal de Interventoría

Tabla 04 Personal de ALDEIC S.A.S. BIC

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Diana Esperanza Riveros
Residente de Interventoría	Jerson Said Lázaro Suárez
Especialista en Geotecnia	Hildebrando Ciendua
Especialista en Pavimentos	Teófilo Carlos Yidi
Especialista en Estructuras	Diego Ernesto Dueñas Puentes
Especialista en Hidráulica	Andrés Galarza Guzmán
Especialista Ambiental	Claudia Alicia Alfaro de Los Ríos
Especialista en Vías	Néstor Espinosa Niño
Ingeniero de Apoyo	Jhoan Sebastián Téllez Torres
Supervisor de Interventoría	Álvaro Javier Ferraro Hernández
Profesional HSEQ	Paula Dayana Castiblanco
Topógrafo	Marco Aurelio Murcia
Dibujante	Sergio Guarín Caldas
Laboratorista	Edgar Gómez
Secretaria	Nidia Gómez
Cadenero	Olga Rodríguez
Cadenero	Jhon Franco
Conductor	Wilson Yovanny Arias Martínez

2.3.3.3 Personal Profesional del Contratista

Tabla 05 Personal de CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO

CARGO	NOMBRE
Representante legal	Ing. Ricardo Ortigoza González
Director de Obra	Ing. Luis Fernando Urrego
Ingeniero Residente de Obra	Ing. Jaime Alexander Ortigoza
Residente Auxiliar	Ing. Diego Alejandro Reyes
Especialista Geotecnia	Juan Daniel Moya Robayo

CARGO	NOMBRE
Especialista en Pavimentos	Diego Andrés Díaz Díaz
Especialista en Estructuras	Hugo Alberto Calvo
Profesional HSEQ	Franklin Ricardo Piragua
Coordinadora SST	Gloria Astrid López
Auxiliar SST	Mónica Marcela Cifuentes Méndez
Ingeniero Ambiental	Jorge Alberto Ramos
Ingeniera Auxiliar Ambiental	Ángela Johana Vanegas
Topógrafo	Luis Enrique Garay Moreno
Auxiliar de Topografía	Oliverio Rivas Rayo

3. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

3.1 CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Tabla 06 Control Legal Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No:	1665	FECHA:	30 ABRIL 2024	
NUMERO DEL PROCESO:	LPO-003-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
VALOR INICIAL:	SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 6.616.451.791,35) incluidos impuestos y demás deducciones de Ley.			
VALOR ADICION:	NO APLICA			
VALOR FINAL:	SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 6.616.451.791,35) Incluidos impuestos y demás deducciones de Ley.			
PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato es de cinco (05) meses contados a partir del Acta de Iniciación.			
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	NO APLICA			
FECHA ACTA ADICIONAL – PRORROGA:	NO APLICA			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato es de cinco (05) meses contados a partir del Acta de Iniciación.			
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO		
	NIT O CC:	901.826.039-0		
	DIRECCIÓN:	CL 2 2 – 70 of. 405 Ed. El Molino	TEL:	6082639103
	CIUDAD:	Ibagué – Tolima		
	REPR. LEGAL:	LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
	C. C. No.:	14.225.605		

Tabla 07 Control Legal del Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1698	FECHA:	07 MAYO 2024		
NUMERO DEL PROCESO:	CMA-007-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA				
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($525.586.987,00) IVA INCLUIDO.				
VALOR ADICION:	NO APLICA				
VALOR FINAL:	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($525.586.987,00) IVA INCLUIDO.				
PLAZO DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.				
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	NO APLICA				
FECHA ACTA ADICIONAL – PRORROGA:	NO APLICA				
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.				
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ALDEIC S.A.S. BIC			
	NIT O CC:	901.099.626-4			
	DIRECCIÓN:	Carrera 18 No. 116-24	TEL:	601-2145198	
	CIUDAD:	Bogotá D.C.			
	REPR. LEGAL:	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS			
	C. C. No.:	39.691.684 de Bogotá D.C.			

3.2 ESTADO DE POLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra vigentes según acta de inicio del contrato de obra.

Tabla 08 Pólizas del Contrato de Obra

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Póliza No.	**I-100032865 –** No. de Anexo 3		
Fecha de expedición	14-06-2024		
Actualización de pólizas con respecto a la Fecha de inicio del Contrato de obra			
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del Contrato	28/10/2024	11/07/2025	$ 661.645.179,20
Prestaciones sociales	28/10/2024	11/01/2028	$ 330.822.589,60
Estabilidad de la Obra	11/11/2024	11/11/2029	$ 1.323.290.358,40
Póliza No.	**I-100007841** - No. de Anexo 3		
Fecha de expedición	14-06-2024		
Responsabilidad civil extracontractual	11/06/2024	11/01/2025	$ 650.000.000,00

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría vigentes según acta de inicio del contrato de interventoría.

Tabla 09 Pólizas del Contrato de Interventoría

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Póliza No.	21-44-101441008 – Anexo No. 4		
Fecha de expedición	14-06-2024		
Actualización de pólizas con respecto a la Fecha de inicio			
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del Contrato	11/06/2024	06/07/2025	$ 52.558.698,70
Calidad de Servicio	11/06/2024	06/01/2030	$ 157.676.096,10
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	11/06/2024	06/01/2028	$ 26.279.349,35

3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.3.1 Balance financiero contrato de obra

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1665 DE 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 6.616.451.791,35	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,0	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIALNo.1		$ 3.871.706.984,86
VALOR POR EJECUTAR		$ 2.744.744.806,49
SUMAS IGUALES	**$ 6.616.451.791,35**	$ 6.616.451.791,35

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. Valor Inicial Contrato	$ 6.616.451.791,35
2. Valor Adicional	$ 0,0
3. Valor total del Contrato (1+2)	$ 6.616.451.791,35
4. Valor Girado por Anticipo	$ 0,0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	$ 6.616.451.791,35
6. Valor Presente Acta parcial	$ 3.871.706.984,86
7. Amortización en esta acta	$ 0,0
8. Otras retenciones (Acumuladas)	$ 0,0
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)	$ 3.871.706.984,86
10. Pagos Actas Anteriores	$ 0,0
11. Valor pagado a la Fecha	$ 3.871.706.984,86
12. Saldo por pagar del presente Contrato	$ 2.744.744.806,49
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha con corte de la preacta parcial de obra	58.52 %

3.3.2 Balance financiero contrato de interventoría

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1698 DE 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 525.586.987,00	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,0	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIALNo.1		$ 307.573.505,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 218.013.482,00
SUMAS IGUALES	**$ 525.586.987,00**	$ 525.586.987,00

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. Valor Inicial Contrato	$ 525.586.987,00
2. Valor Adicional	$ 0,0
3. Valor total del Contrato (1+2)	$ 525.586.987,00
4. Valor Girado por Anticipo	$ 0,0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	$ 525.586.987,00
6. Valor Presente Acta parcial	$ 307.573.505,00
7. Amortización en esta acta	$ 0,0
8. Otras retenciones (Acumuladas)	$ 0,0
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)	$ 307.573.505,00
10. Pagos Actas Anteriores	$ 0,0
11. Valor pagado a la Fecha	$ 307.573.505,00
12. Saldo por pagar del presente Contrato	$ 218.013.482,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha con corte de la preacta parcial de obra	58.52 %

3.3.3 Anticipo contrato de obra e interventoría

Según lo pactado en la cláusula 5 del contrato de obra No. 1665 de 2024; la entidad contratante no entregara anticipo al contratista de obra.

De igual manera, según lo estipulado en la cláusula 6 del contrato de interventoría No. 1698 de 2024; la entidad no entregara al contratista de interventoría anticipo y/o pago anticipado.

3.3.4 Actas parciales Contrato de Obra

Durante el periodo reportado en el presente informe; el contratista de obra Consorcio PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO únicamente ha presentado el acta parcial de obra No.1, la cual se encuentra radicada en la entidad (Gobernación del Tolima) pendiente para el desembolso de los recursos.

Del trámite de acta parcial de obra No.1, se resumen los valores ejecutados y tramitados a continuación:

Acta Parcial de Obra No. 01	$ 3.871.706.984,86
TOTAL EJECUTADO	***$ 3.871.706.984,86***

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				$ 6,531,294,625.64				$ 3,871,706,984.86		$ 3,871,706,984.86
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				$ 48,260,000.00						
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 16,897,165.71						
	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DAGA -1.3-03				$ 20,000,000.00						
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 85,157,165.71						
	GRAN TOTAL				$ 6,616,451,791.35		$ -	TOTAL	$ 3,871,706,984.86	TOTAL	$ 3,871,706,984.86
	PORCENTAJE DE AVANCE							% PARCIAL	58.52%	% ACUMULADO	58.52%

Resumen tramite acta parcial de obra No 1

3.3.5 Actas parciales Contrato de Interventoría

La Interventoría ALDEIC S.A.S BIC, a fecha de corte del presente informe ha realizado entrega de acta parcial de costos de interventoría No. 1. Del acta parcial de costos de interventoría No. 1, se resumen los valores ejecutados y tramitados a continuación:

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1698 DE 2024			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 441.669.737		
IVA (19%)	$ 83.917.250		
VALOR TOTAL	**$ 525.586.987**		
ACTA PARCIAL N°01 (agosto/30/2024) - 58,52%		$ 258.465.130	
IVA (19%)		$ 49.108.375	
VALOR ACTA PARCIAL N° 01		$ 307.573.505	
VALOR ACUMULADO		$ 307.573.505	58,52%
VALOR POR EJECUTAR		$ 218.013.482	41,48%
VALOR TOTAL		$ 525.586.987	100%

Resumen tramite Acta parcial de interventoría No 1

3.3.6 Metas físicas, actividades por ejecutar y alcance

El proyecto contempla la construcción de un puente sobre el Río Venadillo en los municipios de Venadillo y Ambalema en el departamento del Tolima, accesos al puente, obras de drenajes y construcción de estructura de pavimentos.

Las actividades por ejecutar comprenden dos pilares fundamentales, el primero es la construcción de los tramos viales que conectarán la súper estructura a la vía existente, la cual comunica el municipio de Venadillo con el municipio de Ambalema en el departamento del Tolima, para ello se contemplan excavaciones y movimientos de tierra para el cajeo de la vía, a su vez, se requiere realizar la nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante empleando para ello material seleccionado según especificaciones técnicas, de manera seguida se realizará el suministro y colocación de base y subbase en concordancia con lo establecido en diseño de pavimentos, adicionalmente, se realizará la aplicación de emulsión asfáltica y aplicación de mezcla densa en caliente para la construcción de la carpeta asfáltica, además se deberán construirlas obras hidráulicas necesarias para la conducción de aguas producto de precipitaciones de la región.

Por otro lado, se realizarán las labores de excavaciones para la construcción de los cimientos del puente vehicular en concreto reforzado, también se contempla movimientos de materiales de excavación y de relleno en para el aproche del puente, del mismo modo, se contempla la construcción de estructuras en concreto reforzado de resistencias varias, la instalación de estructuras metálicas, drenajes sobre el viaducto y la construcción de una carpeta asfáltica para el paso vehicular, para finalizar con el proceso constructivo del proyecto se deben instalar las señales de tránsito verticales y horizontales según estudios y diseños.

Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán cerca de 19.427 habitantes de los municipios de Venadillo y Ambalema, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor conectividad local, incremento en el turismo, mejora en las condiciones comerciales, es decir municipios más atractivos, con mejor calidad de infraestructura, aumentará la productividad, disminuirán los tiempos de viaje en el servicio público y se reducirán los costos de operación que implica beneficio para los empresarios del sector transporte y también para la comunidad en general.

El presente proyecto se justifica debido a que, una vez ejecutada la construcción del puente vehicular, esta actuación contribuye a:

- ✓ El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Venadillo y Ambalema.
- ✓ Fortalecer instrumentos que garanticen el manejo y control eficiente del tránsito en los municipios.
- ✓ Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura de transporte que facilite la movilidad.
- ✓ Generar la comunicación intermunicipal de Ambalema y Venadillo para el transporte, ingreso y egreso de materias primas que generan crecimiento en la economía del departamento.

Ítems de pago del contrato de obra:

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
EXPLANACIONES				
1	201.2	Demolición de Estructuras	M3	615,00
2	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	202,12
3	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	808,48
PUENTE				
4	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes)	m3	698,49
5	600.2.4	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	77,61
6	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	200,00
7	621.1P	Caissons concreto anillo en concreto clase D y núcleo en concreto clase C, incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	295,07
8	630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero	m3	63,25
9	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	141,89
10	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37,93
11	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	9,00
12	650.2P	Suministro y Fabricación de Estructura Metálica en ASTM A709/ ASTM A588 Grado 50 para vigas y arriostramientos. (incluye transporte)	Kg	64802,67
13	650.2.1P	Suministro y fabricación de láminas de los apoyo de los neoprenos, anclajes de apoyo y baranda, Incluido fabricación, transporte, montaje y pintura donde se requiera.	Kg	963,96
14	650.4	Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	Kg	64802,67
15	632P	Barandas metálicas acero A36 y A500-C. Incluido fabricación.	ML	125,70
16	642.2	Juntas de dilatación según diseño.	ML	24,00
17	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	48596,29
18	673.2	Material Granular Drenante	m3	19,20
19	4P	Drenes PVC para el tablero 4"	u	24,00
20	642.1P	Suministro e instalación de aparatos de apoyos y topes sísmicos en Neopreno dureza 70(60 cm x60 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	6,00
21	642.1.1P	Suministro e instalación de aparatos de apoyos y topes sísmicos en Neopreno dureza 70(20 cm x2 0 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	20,00
22	5P	Bolsacretos de 1.0 m3 c/u.	u	600,00
23	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	378,00
24	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	18,90
25	6P	Prueba de carga	u	1,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
26	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	1.024,80
27	330.1	Base granular clase A	m3	215,14
28	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1.024,80
29	320.1	Subbase granular clase A	m3	215,14
PAVIMENTOS ASFALTICOS				
30	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	1.024,80
31	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	139,85
DRENAJES				
32	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	117,30
33	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	110,00
34	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	3.551,12

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
35	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo,	m3	26,88
36	673.2	Material Granular Drenante	m3	168,00
37	663,1P	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	336,00
38	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1.008,00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				
39	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	693,00
40	701.1	Tacha Reflectiva	u	173,00
41	710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	4,00


4. INFORMACION TECNICA

4.1 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

Según el cronograma de obra presentado por el contratista de obra, una vez se realiza la reprogramación de obra con el adicional de tiempo para completar las labores a un plazo de siete (07) meses el cual es aprobado por la interventoría del contrato; en el presente periodo de reporte el avance se ilustra a continuación:

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR.TOTAL	PROGRAMADO 11/09/24 AL 11/10/24	EJECUTADO ACUM 11/09/24 AL 11/10/24	PROGRAMADO 11/10/24 AL 07/11/24	EJECUTADO ACUM 11/10/24 AL 07/11/24
EXPLANACIONES								
Demolición de Estructuras	M3	705.00	$ 261,602.00	$ 184,429,410.00		$ 160,885,230.00	$ 23,544,180.00	$ 184,429,410.00
						2.43%	0.36%	2.79%
Excavación en roca de la explanación y canales	m3	202.12	$ 148,144.00	$ 29,942,865.28		$ 29,942,865.28		$ 29,942,865.28
						0.45%		0.45%
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	808.48	$ 48,706.00	$ 39,377,826.88		$ 39,377,826.88		$ 39,377,826.88
						0.60%		0.60%
SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 253,750,102.16**				
PUENTE								
Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes)	m3	1050.00	$ 72,128.00	$ 75,734,400.00		$ 50,380,686.72		$ 75,734,400.00
						0.76%		1.14%
Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	77.61	$ 79,492.00	$ 6,169,374.12				$ 6,169,374.12
								0.09%
Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	3002.73	$ 137,279.00	$ 412,211,771.67				$ 412,211,771.67
								6.23%
Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	295.07	$ 5,194,792.00	$ 1,532,852,106.55		$1,532,852,106.55		$1,532,852,106.55
						23.17%		23.17%
Concreto clase 35 MPA para tablero	m3	63.25	$ 1,843,684.00	$ 116,613,013.00				
Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	141.89	$ 1,529,279.00	$ 216,989,397.31				$41,405,228.93
								0.63%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37.93	$ 1,320,580.00	$ 50,089,599.40				
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	9.00	$ 842,321.00	$ 7,580,889.00				
Suministro y Fabricación de Estructura Metálica en ASTM A709/ ASTM A588 Grado 50 para vigas y arriostramientos . (incluye transporte)	Kg	64802.67	$ 26,732.00	$ 1,732,304,974.44	$ 866,152,487.22	$ 1,732,304,974.44		$ 1,732,304,974.44
					13.09%	26.18%		26.18%
Suministro y fabricacion de láminas de los apoyo de los neoprenos, anclajes de apoyo y baranda, Incluido fabricación, transporte, montaje y pintura donde se requiera.	Kg	963.96	$ 31,437.00	$ 30,304,010.52	$ 15,152,005.26			
					0.23%			
Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	Kg	64802.67	$ 5,671.00	$ 367,495,941.57	$ 183,747,970.79			$ 183,747,970.79
					2.78%			2.78%
Barandas metálicas acero A36 y A500-C. Incluido fabricación.	ML	125.70	$ 722,716.00	$ 90,845,401.20				
Juntas de dilatación según diseño.	ML	24.00	$ 456,196.00	$ 10,948,704.00				
Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	48596.29	$ 12,285.00	$ 597,005,422.65	$ 149,251,355.66	$ 381,270,626.10	$ 149,251,355.66	$ 381,270,626.10
					2.26%	5.76%	2.26%	5.76%
Material Granular Drenante	m3	19.20	$ 197,303.00	$ 3,788,217.60				
Drenes PVC para el tablero 4"	u	24.00	$ 16,516.00	$ 396,384.00				
Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sismicos en Neopreno dureza 70(60 cm x60 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	6.00	$ 1,592,408.00	$ 9,554,448.00				
Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sismicos en Neopreno dureza 70(20 cm x2 0 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	20.00	$ 1,194,726.00	$ 23,894,520.00				
Bolsacretos de 1.0 m3 c/u.	u	200.00	$ 1,084,134.00	$ 216,826,800.00		$ 175,629,708.00		$ 175,629,708.00
						2.65%		2.65%
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	m2	378.00	$ 4,763.00	$ 1,800,414.00				
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	18.90	$ 1,520,546.00	$ 28,738,319.40				
Prueba de carga	u	1.00	$ 121,615,000.00	$ 121,615,000.00				
SUBTOTAL PUENTE				**$ 5,653,759,108.43**				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
SUBTOTAL BASES				**$ 104,041,941.69**				
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
SUBTOTAL PAVIMENTOS				**$ 208,779,480.47**				
DRENAJES								
SUBTOTAL DRENAJES				**$ 301,996,321.15**				
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								
SUBTOTAL SEÑALIZACION				**$ 8,967,936.69**				
SUBTOTAL OBRAS				**$ 6,531,294,890.59**	**$ 1,214,303,818.93**	**$ 4,102,644,023.97**	**$ 276,837,477.40**	**$ 4,795,076,262.75**
VALOR TOTAL OBRAS				**$ 6,531,294,890.59**	**$ 1,214,303,818.93**		**$ 276,837,477.40**	
PAGA	NO MODIFICAR			$ 48,260,000.00	$ 6,894,285.71		$ 6,894,285.71	$ 34,471,428.57
					0.10%		0.10%	0.52%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	NO MODIFICAR			$ 16,897,165.71	$ 2,413,880.82		$ 2,413,880.82	$ 12,069,404.08
					0.04%		0.04%	0.18%
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DAGA -1.3-03	NO MODIFICAR			$ 20,000,000.00	$ 2,857,142.86		$ 2,857,142.86	$ 14,285,714.29
					0.04%		0.04%	0.22%
VALOR TOTAL OBRA				**$ 6,616,452,056.30**	**$ 1,226,469,128.31**		**$ 289,002,786.79**	
PORCENTAJE TOTAL				76.66%	18.54%	62.01%	4.37%	73.39%

4.2 INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

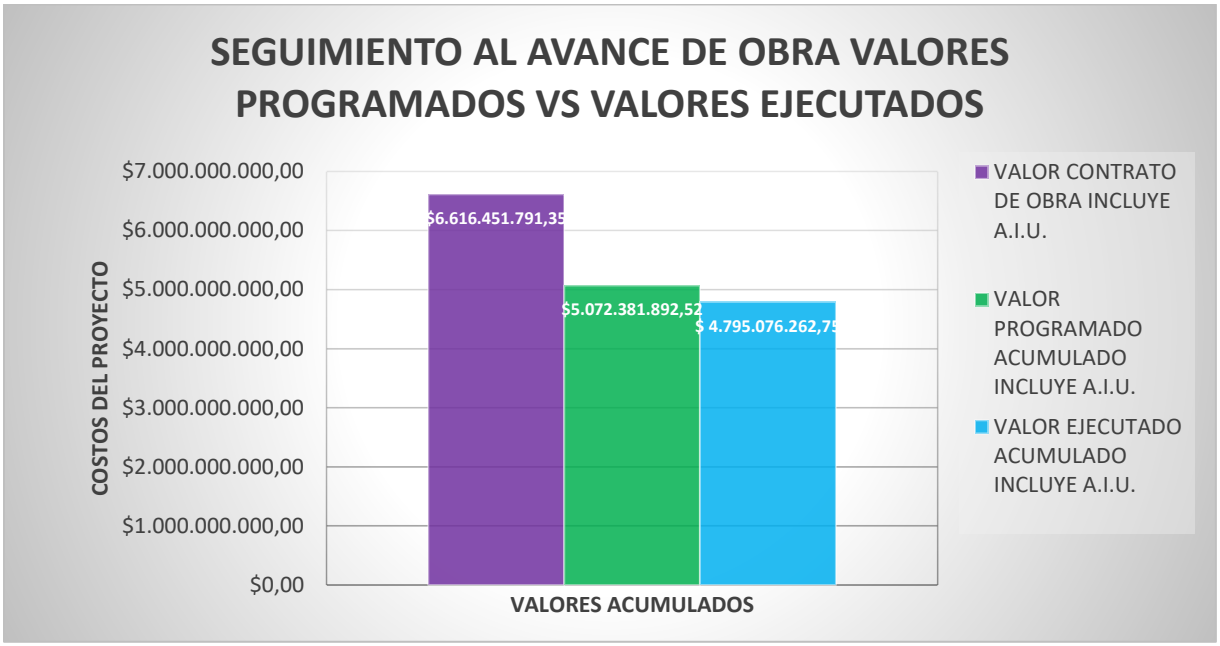

VALOR CONTRATO DE OBRA INCLUYE A.I.U.	**$ 6.616.451.791,35**	**100%**
VALOR TOTAL PROGRAMADO INCLUYE A.I.U.	$ 5.072.381.892,52	76.66%
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUYE A.I.U.	$ 4.657.422.491,08	73.39%

Con corte al 10 de Noviembre de 2024, de acuerdo a la reprogramación de obra entregada por el contratista de obra, y al seguimiento de ejecución de las actividades de obra por parte de la interventoría; se informa que se tiene un porcentaje programado acumulado de ***76.66%*** y el contratista de obra **CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO** ha ejecutado el ***73.39%*** del valor total del contrato de obra, lo que representa un retraso parcial (avance de obra) del ***3.27%,*** respecto a la ejecución de actividades que integran la programación de obra suministrado por el contratista.

El retraso presentado dentro de las actividades de obra según el cronograma de obra aprobado por la interventoría, obedece a que se han realizado actividades de excavaciones varias en material común, demoliciones y rellenos que no estaban contemplados en los diseños iniciales; sin embargo, dichas actividades ya se vienen realizando en el periodo de este informe acercando la brecha que venia del mes anterior que superaba el 20% sin reprogramación de obra gracias a la prorroga otorgada por el ente contrante.


4.3 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 06, se relaciona el estado del tiempo presentado durante las actividades ejecutadas durante el periodo reportado en el presente informe.


4.4 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS EN EL PERIODO

En el presente mes de reporte, la Interventora desarrolló labores de supervisión, revisión y control, de acuerdo a las funciones de seguimiento a las actividades de obra ejecutadas por el Contratista en el sitio de obras; las cuales se relacionan a continuación:


- ***Concreto Resistencia 28MPa (C).:*** En el presente periodo se inicia la construcción de la viga de amarre de las pilas de estribo y vigas de aproche, en el costado de Ambalema.

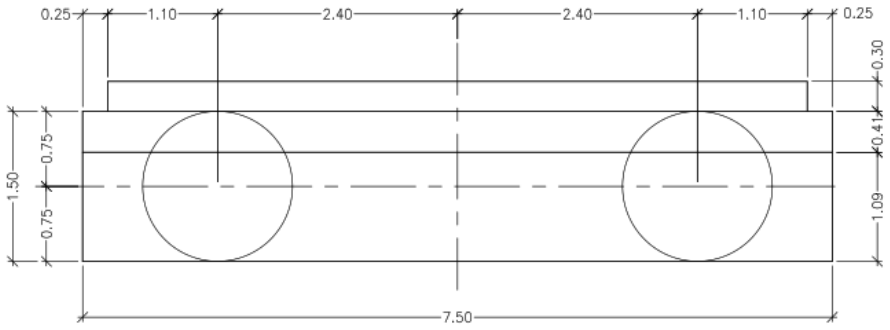


PLANTA

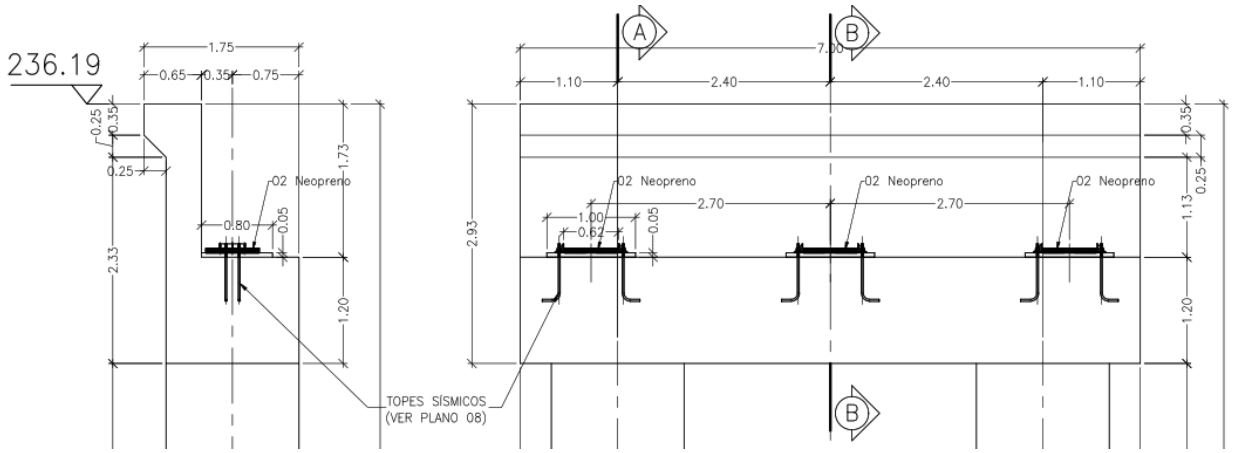


- ***Rellenos Para Estructuras con Recebo.:*** En el periodo de este informe se realiza el relleno con material de recebo en ambos costados, iniciando en el lado de Ambalema para dar espacio para las labores de montaje de la estructura metálica, de igual forma se inician los llenos necesarios para dar altura para realizar la instalación de formaleta y construcción de vigas en el costado de Palobayo.

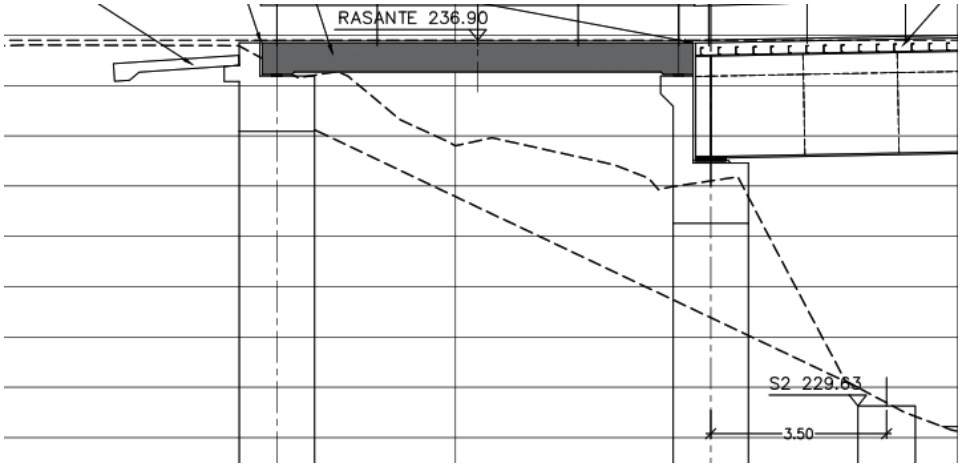

- ***Montaje y Pintura de Estructura Metálica.:*** en el presente periodo el contratista de obra realiza la adecuación del terreno para la estructura metálica, el montaje del falso apoyo en el lecho del rio para hacer el lanzado de las primeras 3 secciones de las vigas principales, inician labores de soldadura en el costado de Ambalema tanto de la estructura metálica como de los apoyos y soportes para líneas de vida del personal.

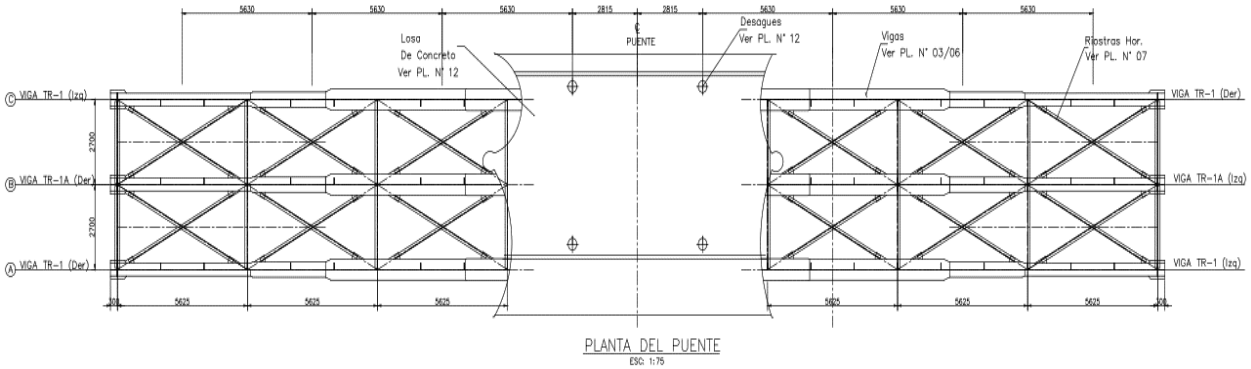

- ***Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.:*** esta actividad se realizó en el presente periodo con el suministro, e instalación de acero de refuerzo en la construcción de las vigas para estribo y aproche en ambos costados del puente.



- ***Obras varias:*** El contratista adecua en el costado Palobayo las zonas de reciclaje, zona para bolsas de cemento y recolección de filtros, taludes recubiertos en concreto para protección

de obras, además realiza cerramiento provisional en polisombra en ambos costados del puente y e instala señalización informativa temporal de obras en ejecución paso restringidos y demarcación para el paso del personal sobre el lecho del rio.

4.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

De manera general, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales desarrolla las siguientes labores:

- Consignación y registro de la información de la ejecución de la obra en los diferentes formatos destinados para tal fin.
- Vigilancia y velación por la buena y óptima calidad de los materiales utilizados en la construcción de la obra contratada.
- Diligenciamiento en conjunto con el contratista la bitácora de obra y presentación de registros fotográficos que evidencie las actividades de obra.
- Desarrollo de reuniones y/o comités de obra para analizar y revisar temas en todos los componentes involucrados en la etapa de construcción.
- Seguimiento al cronograma de la etapa de construcción y Flujo Financiero del proyecto.
- Seguimiento a las diferentes actividades contractuales para los diferentes frentes de obra.
- Elaboración informe mensual de Interventoría.
- El personal de especialistas de la interventoría ha realizado acompañamiento en la etapa de obra; conceptualizando diversos documentos técnicos que conforman el proyecto y proyectando solicitudes al contratista para el complemento de información técnica requerida en desarrollo de las actividades de obra.

4.6 DESCRIPCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

En el Anexo No. 08 se relaciona el registro fotográfico Técnico y SST, reporte el cual contiene las actividades realizadas durante el periodo reportado.

4.7 CONTROL E INSPECCIÓN Y ENSAYOS

En el presente periodo la interventoría del contrato de obra, ha realizado ensayos de resistencia a la compresión en los concretos clase C empleados en la construcción de las vigas de amarre de las pilas tanto para el estribo como para las vigas de soporte de aproche. Los resultados de laboratorio se presentan en el anexo No. 4. A medida de que avancen las labores de construcción y se presenten actividades de obra que requieran ensayos de laboratorio serán realizadas bajo las normas y especificaciones del INVIAS 2013, Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Código Colombiano de Puentes – CCP-14, considerando lo establecido en el Artículo Primero de la Resolución 108 del 26 de enero de 2015, por la cual se actualiza el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14; se determinó por parte de la Interventoría y el Contratista, para el recibo de las obras, realizar los trabajos de control de calidad haciendo las pruebas y ensayos de manera conjunta en los mismos sitios.

En el Anexo No. 04 se relaciona el resumen y resultados de los ensayos de laboratorio con el que ha contado la Interventoría durante el periodo comprendido entre 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024.

4.8 CALIFICACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO.

Los estándares de Calidad se supervisan bajo los parámetros descritos en las Normas y Especificaciones del INVIAS, Norma NSR-10, CCP14, guía de manejo de tránsito, guía para la presentación de resultados de ensayos de materiales empleados en obra, así como de las normas que modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen la normatividad técnica y todos los estudios y diseños particulares de este proyecto.

4.9 CALIFICACION DE PERSONAL, MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPOS:

4.9.1 Personal

Los profesionales vinculados en obra por el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO; fueron presentados y posteriormente aprobados por la interventoría mediante comunicados C–285-0014-0016-24 del 28-jun-2024 y C–285-0017-0019-24 del 4-jul-2024.

De acuerdo a lo anterior informamos que el personal ofrecido por el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO, para el cumplimiento de las Actividades objeto del contrato de obra es el Idóneo, optimo y con los conocimientos técnicos para la labor que desarrollan. Según lo anterior se cumple con lo establecido en el contrato y/o los documentos anexos o asociados del contrato de obra.

4.9.2 Materiales

Es responsabilidad del constructor CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO informar sobre la disponibilidad de las fuentes de los materiales necesarios para la ejecución de la obra y/o adquirirlos de proveedores debidamente legalizados; mantener en el sitio de obra la cantidad de material suficiente para evitar atrasos con el cronograma de obra.

El contratista ha ejecutado actividades de demolición y excavación, en cuanto al empleo de materiales de arrastre empleado en concretos, el contratista allegó información sobre la empresa proveedora de materiales granulares que corresponde a Triturados y Vías La Caima S.A.S para la actividad de concretos de anillos de caisson y concretos para vigas de amarre ménsulas y demás elementos de la superestructura.

4.9.3 Maquinaria Y Equipos

Los equipos que vienen siendo utilizados por el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO son relacionados en el Anexo No. 5 Control del Equipo de Obra del Contratista. Estos equipos son los requeridos en la ejecución de las obras correspondientes y serán

sometidos periódicamente a revisiones y mantenimiento por parte de supervisores y personal técnico del CONTRATISTA DE OBRA, y el área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

4.10 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El objeto del contrato sometido a seguimiento y control por parte de esta Interventoría, se viene cumpliendo de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 1665 DE 2024 en los respectivos pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas referenciadas en la propuesta del contratista y el cronograma de ejecución de obra. Se verifica el cumplimiento de los parámetros contenidos en las Normas y Especificaciones del INVIAS, Normas Técnicas Colombianas (NTC) y el Código Colombiano de Puentes – CCP-14, considerando lo establecido en el Artículo Primero de la Resolución 108 del 26 de enero de 2015, por la cual se actualiza el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14.

Por otra parte, en comunicado CA–285-0035-0077-24 del 04-sep-2024 se realiza por parte de la interventoría *“Solicitud técnica – Concepto del Proceso de colocación del concreto del núcleo, fuste o cuerpo de caisson.”,* lo anterior, debido a la carencia de la especificación técnica 621.1P de la actividad contractual *“Caissons concreto anillo en concreto clase D y núcleo en concreto clase C incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)”*; en atención a la solicitud realizada por la interventoría el contratista emite concepto el día 10-sep-2024 “*Concepto Geotécnico Para Colocación De Concreto.”*, avalado por el especialista en geotecnia para los caisson del costado Ambalema, quedando pendiente el concepto estructural del proceso de colocación del concreto del fuste, núcleo o cuerpo del caisson que a la fecha de este informe aún no se ha presentado formalmente a esta interventoría acertando que es un compromiso reiterado en el comité de obra del día 10 de octubre de 2024.

4.11 GESTIONES ADELANTADAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

El pasado 26-jun-2024 el contratista de obra CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO, envío comunicado a la interventoría informando sobre *“Paso De Los Habitantes Del Sector Por La Zona De Construcción Del Puente”*; atendiendo la solicitud del contratista, la interventoría realizado el traslado de su comunicado e informo a las diversas entidades públicas: Alcaldía Municipal de Ambalema (SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - Gestión en Ambiente y Gestión del Riesgo "CMGRD"), Alcaldía Municipal de Venadillo (SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO) y a la SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO - Dirección De Gestión y Riesgo De Desastres de la Gobernación del Tolima; dado a que la comunidad de la zona de influencia del proyecto NO ha respetado los cierres realizados por la construcción del puente, haciendo caso omiso a la señalización y pasando por la zona cruzando el rio en vehículos (carros y motos), caminando por el rio o por la estructura metálica (puente férreo) que se encuentra en el lateral derecho del puente objeto de intervención en sentido Palobayo – Ambalema y recientemente en

una balsa improvisada construida por integrantes de la misma comunidad tal como lo informa el contratista de obra en su oficio del 26-jun-2024 dirigido a la interventoría.

Según lo anterior, se solicitó a las entidades y/o autoridades correspondientes se tomen las medidas pertinentes para reducir riesgos y evitar consecuencias lamentables físicas o materiales originados por el paso imprudente de la comunidad por el sector donde se ejecutan las obras del contrato.

4.12 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS

En oficio CA–285-0006-0006-24 del 14-jun-2024 fue solicitado al Contratista de obra CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO, según lo descrito en el pliego de condiciones del contrato de obra "*CAPITULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO Numeral 8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA OBRA*"; para revisión y aprobación el Plan de Manejo del Tránsito. El contratista en atención al oficio en mención radico el 26-jul-2024 mediante correo electrónico denominado *"entrega de pmt para revisión y aprobación".* El documento PMT presentado por el contratista se le generaron observaciones por parte de interventoría relacionadas en el comunicado C–285-0027-0044-24 del 02-ago-2024; por lo anterior, se informa que a fecha de corte del presente informe el contratista de sigue sin presentar el documento de atención a las observaciones soportado y hablado en el comité de obra y especialistas del dia 08 de octubre de 2024.

Por otra parte, en obra se evidencia la instalación de señales de obra preventivas, instalación de pasacalles con información acertada del cierre del tramo vial, colocación de barreras plásticas (maletines), polisombra de color verde, delineadores tubulares con cinta de peligro, al igual que la instalación de la valla informativa del proyecto.

4.13 BITÁCORA DE OBRA

En el Anexo No. 09 se relaciona bitácora de obra.

4.14 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

En el presente periodo no se realizaron comités de obra.

Por lo cual en este periodo no se encuentra consignado en el Anexo No. 1 Actas de comité de obra.

4.15 CONTROL ADMINISTRATIVO

4.15.1 Personal del Contratista

En el Anexo No. 02, se relaciona el personal con el que el Contratista de obra contó durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024.

4.15.2 Personal de la Interventoría

En el Anexo No. 03, se relaciona el personal con el que ha contado la Interventoría durante el periodo comprendido entre 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024.

4.15.3 Control e inspección y ensayos

En el Anexo No. 04 se relaciona el resumen y resultados de los ensayos de laboratorio con el que ha contado la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024.

4.15.4 Control de equipos utilizados en obra

En el Anexo No. 05, se relaciona el seguimiento a los equipos dispuestos en el frente de obra por el Contratista durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024.

4.15.5 Control del estado del tiempo

En el Anexo No. 06, se relaciona el estado del tiempo presentado durante las actividades ejecutadas durante el periodo reportado en el presente informe.

5. COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SG-SST

La interventoría como ente garante de cumplimiento a la ejecución del "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" entre límites de los municipios de Venadillo y Ambalema (Tolima), supervisa y verifica en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo los lineamientos y procedimientos aplicados en la ejecución de actividades en obra. Igualmente hace seguimiento al desarrollo de la gestión ambiental y de gestión social conforme los lineamientos dados por INVIAS, particularmente en la Guía Ambiental INVIAS, 2022.

Tal como lo dicta el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en donde se debe dar cumplimiento a directrices y estándares correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el objetivo de velar por la integridad mental y física de los trabajadores, a través de actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con las obligaciones descritas en el Anexo 1- ANEXO TECNICO INTERVENTORIA del presente contrato, a continuación, se evidencia el cumplimiento y desarrollo de las mismas durante el mes de reportado:

6. INFORMACION AMBIENTAL Y SG-SST

6.1 INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE LA OBRA (INCLUYENDO EL COMPONENTE DE MAQUINARIA/EQUIPO Y VEHÍCULOS), CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL PIPMA.

El presente informe corresponde a las labores realizadas desde el área HSEQ en el periodo comprendido entre el 11 de OCTUBRE 2024 al 10 DE NOVIEMBRE 2024, este informe contiene el seguimiento y control de las principales tareas adelantadas referentes a las actividades ejecutadas durante el periodo en mención.

6.2 CONTROL DE MATERIALES Y COPIA DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE ADQUISICIÓN DE TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL MES DENTRO DE LA OBRA.

- ***MATERIALES PÉTREOS:***

El contratista allego información legal en informe No. 4 sobre la empresa proveedora de materiales granulares que corresponde a Triturados y Vías La Caima S.A.S con Nit 900.237.153-1, cuenta con permiso minero y licencia ambiental vigente. El contrato de concesión minera No. 0518-73 tienen una duración de 30 años y la licencia ambiental fue cedida. El sitio de explotación se ubica en el predio La Villas, Inspección de Caldas en el municipio de Alvarado. El RUCOM-2023110926168 se encuentra vigente.

Durante el periodo del presente informe el contratista constructor relacionó el uso de los siguientes materiales granulares en el desarrollo de la obra:

Tabla 10. Control de materiales granulares empleados en obra

Mes	Periodo	Tipo de material	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m^3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	Arena	68	68	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 28/09/2024
		Triturado	78	78	
2	11/07/2024 a 10/08/2024	Arena	68	136	
		Triturado	78	156	
3	11/08/2024 a 10/09/2024	Arena	68	204	
		Triturado	78	234	
4	11/09/2024 a 10/10/2024	Arena	35	239	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 11/10/2024
		Triturado	55	294	
5	11/10/2024 a 10/11/2024	Arena	35	239	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 08/11/2024
		Triturado	30	294	
TOTAL ARENA				**274**	
TOTAL TRITURADO				**319**	

Fuente. Elaboración propia

- ***MANEJO DE CONCRETO***

El contratista informó que los pedidos de cemento se han realizado a la empresa ARGOS de Colombia, y las bolsas se apilan sobre estibas de madera, cubriéndolo con plástico negro de polipropileno aislándolo del agua y de la humedad del suelo con el objetivo de mantener las condiciones físico-químicas en óptimas condiciones.

El contratista informó que las bolsas de cemento utilizadas son organizadas y apiladas en sitios de acopio temporal cerca al campamento principal y posteriormente serán trasladadas a la ciudad de Ibagué para entregarse a la empresa de servicios públicos Interaseo S.A.S E.S.P. quien hará la respectiva disposición final en el Relleno sanitario La Miel del municipio antes mencionado.

En este mes no se cuenta con el soporte de entrega de estos residuos a la ESP, el contratista solo presenta soporte de radicado de solicitud de documentación a esta empresa e informa que al tener un volumen superior a 8 m^3, y se hará la respectiva disposición final en el Relleno sanitario del municipio antes mencionado.

Durante el periodo del presente informe el contratista constructor presentó los ensayos de calidad del cemento suministrado por ARGOS, a continuación, se relaciona las cantidades de bolsas de cemento empleadas en el desarrollo de la obra:

Tabla 11. Control de bolsas de cemento empleados en obra

Mes	Periodo	Bolsas (und)	Bolsas acumuladas (und)	Soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	850	850	No presento
2	11/07/2024 a 10/08/2024	850	1700	No presento

Mes	Periodo	Bolsas (und)	Bolsas acumuladas (und)	Soporte
3	11/08/2024 a 10/09/2024	850	2550	No presento
4	11/09/2024 a 10/10/2024	850	3400	No presento
5	11/10/2024 a 10/11/2024	300	3700	No presento
TOTAL			**3700**	

Fuente. Elaboración propia

- ***MANEJO DE PREFABRICADOS***

El suministro de tubería, madera, formaletas, acero entre otros, materiales o elementos que son requeridos para la ejecución de la estructura del puente, son suministrados por proveedores debidamente legalizados de acuerdo con normatividad vigente, como también con el cumplimiento en los estándares de calidad de dichos materiales; se recibe por parte del contratista un compromiso de proveedor por parte de la empresa G&J – Empresas de acero Ferretería S.A. con fecha de 14/11/2024, se recibió por parte del contratista los certificados de calidad de acero y alambre anexos al presente informe.

De la madera se recibe certificación emitida por CORTOLIMA a favor de MADERAS PROFORCA con NIT 901.447.028-3 que cuenta con libro de operaciones forestales dentro del expediente D018 emitida el día 09/03/2023 y certificación emitida por esta corporación en la adopción del "Esquema de reconocimiento a la procedencia legal para las empresas forestales de transformación y comercialización de productos forestales ERPLEF" según resolución 7859 del 11/12/2023; adicional se recibe salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica No. 138210536368, los cuales se anexan al presente informe.

El manejo de materiales se ha realizado de la siguiente manera en obra:

- ✓ Acero, se ubica sobre estructuras de madera para evitar el contacto directo con el suelo y la humedad del mismo, como también la afectación o contaminación del suelo.
- ✓ Madera, en la parte frontal del campamento principal sobre una estructura metálica para aislarla del suelo y humedad.

- ***MANEJO Y SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE***

A continuación, se presenta trazabilidad de cantidades suministradas por contratista de obra con relación al agua industrial utilizada en obra, con respecto al soporte se solicitó al contratista mediante comunicado CA-285-0054-0171-24 de fecha 24/10/2024 y CA-285-0057-02378-24 de fecha 05/11/2024, el recibo o certificación que indique no solo el pago a IBAL, sino la cantidad o volumen de agua suministrado. A continuación, se lista lo que el contratista ha informado en sus respectivos informes mensuales:

Tabla 12. Control de suministro de agua industrial en la obra.

Mes	Periodo	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m^3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	5,5	5,5	No presento
2	11/07/204 a 10/08/2024	4,8	10,3	No presento
3	11/08/204 a 10/09/2024	6,7	17	Presenta recibo de pago por un valor de $502.800, del día 03/09/2024 que no

Mes	Periodo	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m^3)	Certificados de soporte
				especifica volumen en el mismo.
4	11/09/204 a 10/10/2024	2,5	19,5	No presento
5	11/10/204 a 10/11/2024	5	24,5	No presento
	TOTAL		**24,5**	

Fuente. Datos suministrados por contratista de obra en informe No. 4

6.3 CONTROL DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

El contratista informó que la disposición de RCD se realiza en dos predios para nivelación topográfica, Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo y Predio Villa Blanca de Propiedad de la señora Blanca Lucy Sánchez, el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito de material, estas actas se adjuntan al presente informe, anexos componente ambiental.

En referencia al uso de suelo el contratista informa que el día 10 de octubre se realizó solicitud de Certificado de Uso de suelo de los predios indicados a la Secretaria de Planeación del municipio de Ambalema, a la fecha se está a la espera de la respuesta a la solicitud.

Con respecto al predio Villa Blanca el contratista allego el uso de suelo del mismo, expedido por la Alcaldía del municipio de Venadillo, y el acta de entrega y paz y salvo del contratista con la Señora Lucy Sánchez, propietaria de este predio, los cuales se anexan al presente informe y sobre los cuales la interventoría tiene observaciones que se espera el contratista de obra subsane.

La interventoría realizó la inspección en campo en los predios de disposición de RCD, identificando que se realizado la nivelación topográfica con los materiales dispuestos por el contratista de obra. En el informe mensual, el contratista reporta las siguientes cantidades de RCD:

Tabla 13. Control de RCD – MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe

Mes	Periodo	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	398,76	398,76	Certificado mes de Junio 2024
2	11/07/2024 a 10/08/2024	398,76	797,52	Certificado mes de Julio
3	11/08/2024 a 10/09/2024	398,76	1196,28	Certificado mes de Agosto 2024
4	11/09/2024 a 10/10/2024	245	1441,28	Certificado mes de Septiembre 2024
5	11/10/2024 a 10/11/2024	0	0	N/A
TOTAL			**1441,28**	

Fuente. Elaboración propia

Tabla 14. Control de RCD – MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe

Mes	Periodo	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	205	205	Certificado mes de Junio 2024
2	11/07/2024 a 10/08/2024	205	410	Certificado mes de Julio 2024
3	11/08/2024 a 10/09/2024	205	615	Certificado mes de Agosto 2024
4	11/09/2024 a 10/10/2024	0	0	Certificado mes de Septiembre 2024
5	11/10/2024 a 10/11/2024	0	0	N/A
TOTAL			**615**	

Fuente. Elaboración propia

Tabla 15. Control de RCD - MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca

Mes	Periodo	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	512,7	512,7	Certificado mes de Junio 2024
2	11/07/2024 a 10/08/2024	-	-	N/A
3	11/08/2024 a 10/09/2024	-	-	N/A
4	11/09/2024 a 10/10/2024	-	-	N/A
5	11/10/2024 a 10/11/2024	-	-	N/A
TOTAL			**512,7**	

Fuente. Elaboración propia

Tabla 16. Control de RCD - MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca

T	Periodo	Volumen (m^3)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	0	0	N/A
2	11/07/2024 a 10/08/2024	-	-	N/A
3	11/08/2024 a 10/09/2024	-	-	N/A
4	11/09/2024 a 10/10/2024	-	-	N/A
5	11/10/2024 a 10/11/2024	-	-	N/A
TOTAL			**0**	

Fuente. Elaboración propia

El contratista informa que en el predio VILLA BLANCA de Propiedad de la señora Blanca Lucy Sánchez, en este predio ya no se está depositando material, se realizó la respectiva nivelación

del material, realizando el cierre correspondiente de esta zona, adjuntando los documentos mencionados previamente.

Por lo cual, solo se está utilizando el predio Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo; sin embargo, dentro de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe no se realizó disposición de material RCD.

6.4 MANEJO DE VEGETACIÓN

De lo observado en campo no existe vegetación arbórea objeto de aprovechamiento forestal, por lo cual este numeral no aplica para el presente proyecto, como fue consignado por el funcionario de CORTOLIMA en la visita técnica realizada el día 03/07/2024 en acta de visita correspondiente al expediente No 3479 de esta corporación dentro de los documentos correspondiente al trámite del permiso de ocupación de cauce.

6.5 LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL MES DE OBRA

Durante el periodo comprendido en este informe, el contratista de obra utilizó los siguientes vehículos:

Tabla 17. Vehículos utilizados mes 5

Equipo	Marca	Referencia/placa
Carrotanque Agua	International	WFV172
Volqueta Doble troque	Freinghtliner	SOP507
Volqueta Doble troque	Kenworth	USE683
Volqueta Doble troque	International	TGU480
Volqueta Doble troque	Kenworth	USE257
Camioneta de Estacas	Chevrolet Dimax	ICL610

Fuente. Elaboración propia

De los vehículos anteriormente mencionados y utilizados se recibió la documentación correspondiente a tarjetas de propiedad y verificación en la plataforma RUNT sobre estado de revisión tecno mecánica y de gases y seguro obligatorio, de los cuales se adjunta documentación dentro de los anexos SST del presente informe.
Sin embargo, el contratista no presento la documentación de los siguientes vehículos, y el cual será solicitado por la interventoría mediante comunicado.

Volqueta Doble troque	International	TGU480
Volqueta Doble troque	Kenworth	USE257

Para el abastecimiento de combustible el contratista emplea Camioneta de Estacas, Chevrolet Dimax de placa ICL610, en la cual se transportan 3 canecas metálicas de 55 galones, el abastecimiento de combustible se da mediante un sistema de tanqueo con bomba eléctrica para llevar un mayor control y evitas los derrames de combustible. Este vehículo cuenta con la documentación legal vigente y además cuenta con el equipo de emergencia para el control de incendios, sin embargo, mediante comunicado CA-285-0055-0225-24 de fecha 31/10/2024, se solicito al contratista de obra las certificaciones de las capacitaciones y documentación del

personal que manipula el combustible en la obra, y a la fecha del presente informe no se ha tenido respuesta del mismo.

6.6 RELACIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIA AMBIENTAL Y/O PERMISO AMBIENTAL Y/O PIN AMBIENTAL.

Es de aclarar que para la ejecución del contrato de obra No. 1665 del 2024, no es necesaria una licencia ambiental, sin embargo, se debe contar con permisos para la disposición de RCD y nivelaciones topográficas, para lo cual el contratista informo la disposición en dos predios ubicados en el AID del proyecto y de los cuales el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito de material, estas actas se adjuntaron en el informe del periodo previo, anexos componente ambiental.

El proyecto no es objeto de la obtención de PIN ambiental dado que este código se obtiene ante la Secretaría Distrital de Bogotá, para proyectos ubicados bajo su jurisdicción, lo que no corresponde al contrato de obra No. 1665 de 2024, que se localiza bajo jurisdicción de Cortolima.

6.7 RELACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA UTILIZADA POR EL CONTRATISTA DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría ha evidenciado en campo la siguiente maquinaria utilizada por el contratista durante el periodo de este informe se relaciona a continuación:

Tabla 18. Equipo y/o Maquinaria utilizada

Equipo	Marca	Referencia/placa
Excavadora sobre Oruga	Hyundai	H940C
Autohormiguera	Dieci	L3500
Autohormiguera	Dieci	L3500
Compresores	COPCO	XAS88
Planta eléctrica	Baifa	6560
Pulidora	Makita	
Martillo neumático	Honda	GX-100
Grúa telescópica		
Motosierra		MS310
Vibro compactador pequeño	Wacker Neuson	RD16

Fuente. Elaboración propia

La documentación correspondiente a las tres excavadoras sobre oruga listadas en la tabla anterior se adjunta dentro de los anexos SST del presente informe. Interventoría verificó en campo, documentación y el buen estado y uso de equipos y maquinaria a través de inspecciones.

Sin embargo, dentro de la documentación allegada y lo reportado en el informe del contratista, se presentan las siguientes inconsistencias:

Tabla 19. Relación de maquinaria y/o vehículos utilizados en obra en mes No 5

Maquinaria y/o reportada en informe No. 5 del contratista	Inspecciones allegadas en informe No. 5 de contratista	Maquinaria evidenciada por Interventoría	Documentación allegada en informe No. 5
Volqueta Sencilla Chevrolet Kodiak TBL046	No se presento	**No estuvo en obra**	N/A
Volqueta Doble troque Kenworth USE257	Ok	Ok	No se presento
Volqueta Doble troque International TGU480	Ok	Ok	No se presento
Grupa telescópica	Ok	Ok	No se presento
Vibro compactador pequeño Wacker Neuson RD16	Ok	Ok	No se presento

Fuente. Elaboración propia – información suministrada en informe mensual de obra No 5, pag. 56 Y 57.

Es de aclarar, que la maquinaria mencionada previamente se menciona dentro de los reportes de formatos preoperacionales remitidos por el contratista semanalmente, las inspecciones ejecutadas a los vehículos y maquinaria presentadas por el contratista se adjuntan al presente informe en los anexos SST.

6.8 COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICA DE LOS BAÑOS MÓVILES, ANEXANDO COPIA DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS VIGENTE EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

Inicialmente se establece que el contratista de obra no alquiló unidades sanitarias portátiles con empresa especializada. En la medida en que el frente de obra actual se ubica en el extremo Palobayo, el contratista alquiló un predio privado para campamento que pertenece a la Señora Jessica María Moreno Naranjo, dentro del cual se instalaron varias dependencias como oficina, almacén y zona de acopio.

Para dar cumplimiento en el manejo de aguas residuales el contratista firmó acta de acuerdo con la señora Jessica María Moren Naranjo para el préstamo de la unidad sanitaria, como también se hace uso de los baños ubicados en los campamentos donde residen los colaboradores del proyecto. Unidades sanitarias que están conectadas de manera directamente a pozos sépticos los cuales se pudieron verificar, a continuación, se especifica el uso de cada uno:

Tabla 20. Relación uso de unidades sanitarias contratista

PROPIETARIO	UBICACIÓN	USO	OBSERVACIÓN
Jessica María Moreno Naranjo	Restaurante / Vereda Vile Alto	Mixto	Se presenta acta de acuerdo
Blanca Lucy Sánchez	Campamento Auxiliar SST/ Vereda Vile Alto	Mujer	No se presenta acta de acuerdo
Ángela Sánchez	Campamento Personal obra / Vereda Vile Alto	Hombre	No se presenta acta de acuerdo

Fuente: Tomado de informe mensual No. 5, pág. 53

Las actas faltantes fueron solicitadas al contratista. El acta presentada fue anexa en los informes previos dentro de los anexos ambientales.

6.9 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

Contratista

Durante el periodo en cuestión, el contratista realizó capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y concientización para el personal de obra, a continuación, se relacionan las capacitaciones y charlas dirigidas al personal en obra:

Tabla 21. Capacitaciones SST contratista reportadas para informe No. 5

Tema	Fecha	No. participantes	Observaciones
Equipos de rescate	1 octubre 2024	19	Contratista
Que es un entibado discontinuo	2 octubre 2024	16	Contratista
Cuáles son los programas del plan me manejo	1 octubre 2024	16	Contratista
Disposición final de residuos solidos	4 octubre 2024	16	Contratista
Que son las pruebas de alcohol espiradas en el aire	5 octubre 2024	15	Contratista
Requisitos para el ingreso de personal nuevo a la obra o personal trasladado	7 octubre 2024	16	Contratista
Protección de pozos y sumideros	8 octubre 2024	9	Contratista
Tanqueo seguro de maquinaria y equipo de obra	9 octubre 2024	8	Contratista
Rotulación de envases que contienen productos químicos	10 octubre 2024	14	Contratista
Cáncer de seno y próstata	11 octubre 2024	15	Contratista
Calistenia – yo tengo un tic	16 octubre 2024	16	Contratista
Alcoholismo	17 octubre 2024	19	Contratista
Manejo defensivo motocicletas	18 octubre 2024	17	Contratista
Procedimientos para tramitar permiso de aprovechamiento forestal y tala de arboles	19 octubre 2024	13	Contratista
Que hacer en caso de derrame de sustancias químicas en obra	20 octubre 2024	11	Contratista
Riesgo químico	21 octubre 2024	8	Contratista
Transporte de heridos	22 octubre 2024	12	Contratista
Buenas prácticas para ahorro de agua y energía	24 octubre 2024	17	Contratista
Cómo actuar ante una emergencia en obra	25 octubre 2024	13	Contratista
Primeros auxilios	28 octubre 2024	10	Contratista
Conciencia de la importancia del medio ambiente	29 octubre 2024	11	Contratista
Calistenia – que son pausas activas	30 octubre 2024	19	Contratista
Prevención de actos inseguros	31 octubre 2024	16	Contratista
Comunicaciones relaciones interpersonales y trabajo en equipo	7 octubre 2024	21	Contratista
Riesgo publico	15 octubre 2024	14	Contratista
Manejo extintores	23 octubre 2024	14	Contratista
Uso obligatorio EPP – casco	9 octubre 2024	3	ICMO SAS
Actos inseguros	10 octubre 2024	3	ICMO SAS
Uso obligatorio EPP - guantes	11 octubre 2024	3	ICMO SAS

Tema	Fecha	No. participantes	Observaciones
Condiciones inseguras	12 octubre 2024	3	ICMO SAS
Uso obligatorio EPP - monogafas	15 octubre 2024	3	ICMO SAS
Acciones preventivas	16 octubre 2024	3	ICMO SAS
Uso obligatorio EPP - tapabocas	17 octubre 2024	3	ICMO SAS
Acciones correctivas	18 octubre 2024	3	ICMO SAS
Política integral HSEQ	19 octubre 2024	4	ICMO SAS
Uso obligatorio EPP - Careta	21 octubre 2024	4	ICMO SAS
Inducción SST - ambiental	22 octubre 2024	5	ICMO SAS
Reglamento de higiene y seguridad industrial	23 octubre 2024	5	ICMO SAS
Actividades de alto riesgo	24 octubre 2024	5	ICMO SAS
Kit de emergencias	25 octubre 2024	4	ICMO SAS
Inspección de herramientas manuales	26 octubre 2024	4	ICMO SAS
Riesgo locativo	28 octubre 2024	5	ICMO SAS
Riesgo publico	29 octubre 2024	5	ICMO SAS
Inspección de herramientas eléctricas	30 octubre 2024	5	ICMO SAS
Nombramiento vigía SST	31 octubre 2024	5	ICMO SAS

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Capacitaciones ambientales contratista reportadas para informe No. 5

Tema	Fecha	No. participantes
Contaminación del aire	3 noviembre 2024	16
Recurso suelo	2 noviembre 2024	12
Residuos metálicos	1 noviembre 2024	15
Porque usar un código de colores	31 octubre 2024	14
Destino de residuos sólidos	30 octubre 2024	19
Manejo de aceites usados	29 octubre 2024	11
Protección de la fauna	28 octubre 2024	18
Protección de la flora	26 octubre 2024	17
Residuos orgánicos reciclables	25 octubre 2024	13
El recurso del agua	24 octubre 2024	20
Medio ambiente	23 octubre 2024	19
Protección ambiental	22 octubre 2024	12
Reciclaje	21 octubre 2024	13
Residuos líquidos peligrosos	20 octubre 2024	13
Relleno de seguridad	19 octubre 2024	14
El recurso del suelo	18 octubre 2024	16
Incidentes ambientales	17 octubre 2024	17
Manejo de bolsas de cemento	16 octubre 2024	13
Manejo de escombros	15 octubre 2024	17
Prevención de accidentes ambientales	11 octubre 2024	15

Fuente: Elaboración propia

Los registros de asistencia a las capacitaciones e inducciones reportadas por el contratista se encuentran en la carpeta de anexos del presente informe, ANEXOS SST, al igual que las inducciones ambientales reportadas por el mismo.

El contratista reporta haber realizado las siguientes actividades, y de las cuales se adjuntan los soportes en la carpeta de anexos SST del presente informe:

- Entrega de elementos de protección personal – EPP: 9 folio de formato Control Suministro Elementos de Protección
- Acta COPASST: reunión celebrada el 28 de octubre de 2024 (2 folios)
- Permisos de ATS, permisos para trabajos en alturas, hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados y permisos para trabajos en espacios confinados y trabajos en alturas, que corresponde a 60 folios debidamente diligenciados titulados Análisis de Trabajo Seguro – ATS.
- Inspección elementos de emergencia e inspección de maquinaria y vehículos, que corresponde a 81 folios debidamente diligenciados.
- Afiliaciones nuevo trabajador – vigilante, que corresponde a 4 folios con la documentación correspondiente.
- EMO vigilante - que corresponde a 2 folios con la documentación correspondiente.
- Inducción vigilante - que corresponde a 2 folios debidamente diligenciados
- Oficios para permisos de trabajo los fines de semana – que corresponde a 3 folios con la información radicada ante la ARL SURA.
- Carpeta con la documentación del subcontratista ICMO SAS, encargado del montaje de la estructura metálica del puente donde se adjunta:
  1. Afiliaciones de trabajadores
  2. Certificados de calidad de EPP utilizados en alturas
  3. Cursos de alturas
  4. EMO trabajadores
  5. Inducción, reinducción y capacitaciones
  6. Planillas pre operacionales
  7. Programa de prevención contra caídas
  8. Registro y entrega de EPP
  9. Soportes de inducción SST
  10. Política integral HSEQ

Interventoría

Durante el periodo en cuestión, la interventoría realizó la inspección locativa en la oficina ubicada en el municipio de Ambalema, Tolima, así como los botiquines de primeros auxilios y al vehículo que funciona como medio de transporte para el personal en campo, los formatos soporte de esto se adjuntan dentro de los anexos SST del presente informe.

Se realizó el día 5 de noviembre 2024 capacitación sobre uso adecuado de recursos naturales y liderazgo, el registro de asistencia se adjunta como anexo dentro de los anexos SST del presente informe.

El día 31 de octubre de 2024 se realizó la reunión mensual de COPASST, donde se socializaron las acciones realizadas desde los diferentes proyectos que ejecuta la empresa, y dentro de ellos lo referente al contrato de Interventoría No. 1698 de 2024.

También se realizaron pausas activas cognitivas, visuales y movilidad y estiramiento durante el mes de octubre de 2024.

En la obra se realizó inspección locativa, inspección del uso de los EPP al personal de campo y una lista de chequeo de la señalización en campo, los formatos soporte de esto se adjuntan dentro de los anexos SST del presente informe.

El día 30/10/2024 se realiza asistencia a la capacitación protección auditiva realizada por CPT S.A.

El día 31/10/2024 se realiza el cambio de aceite del vehículo DAV827, para lo cual se anexan los documentos legales correspondientes a la serviteca donde se realizó dicha actividad.

6.10 INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO TANTO DEL CONTRATISTA DE OBRA COMO DEL INTERVENTOR.

Contratista

Para el presente periodo se presenta la siguiente relación de ausentismos, incapacidades accidentes y/o incidentes del contratista:

Tabla 23. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo contratista

FECHA	ACCIDENTE		INCIDENTE		Total
	SI	NO	SI	NO	
Del 11 junio 2024 – 10 julio 2024		x		x	0
Del 11 julio 2024 – 10 agosto 2024		x		x	0
Del 11 de agosto 2024 – 10 septiembre 2024		x		x	0
Del 11 de septiembre 2024 – 10 octubre 2024		x		x	0
Del 11 de octubre 2024 – 10 noviembre 2024		x		x	0
INCAPACIDADES POR ACCIDENTES	**INICIA**		**TERMINA**		**Nº de días**
No se presentaron incapacidades durante este periodo.	-		-		0
INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	**INICIA**		**TERMINA**		**N° de días**
No se presentaron incapacidades durante este periodo.	-		-		0

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo del presente informe, el contratista adjunto documento de certificación de la ARL de no accidentes laborales durante el periodo correspondiente.

Interventoría

Para el presente periodo se presenta la siguiente relación de ausentismos, incapacidades accidentes y/o incidentes de la interventoría:

Tabla 24. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo Interventoría

FECHA	ACCIDENTE		INCIDENTE		Nº
	SI	NO	SI	NO	
Del 11 junio 2024 – 10 julio 2024		x		x	0
Del 11 julio 2024 – 10 agosto 2024		x		x	0
Del 11 de agosto 2024 – 10 septiembre 2024		x		x	0
Del 11 de septiembre 2024 – 10 octubre 2024		x		x	0
Del 11 de octubre 2024 – 10 noviembre 2024		x		x	0
INCAPACIDADES POR ACCIDENTES	**INICIA**		**TERMINA**		**Nº de días**
No se presentaron incapacidades durante este periodo.	-		-		0
INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	**INICIA**		**TERMINA**		**N° de días**
No se presentaron incapacidades durante este periodo.	-		-		0

Fuente: Elaboración propia

6.11 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Con base en las labores de Interventoría, se lleva un control diario del personal del contrato de obra, el cual se adjunta en el Anexo 2 – personal del contratista. Sobre este tema la interventoría emitió los siguientes comunicados:

- CA-285-0057-0237-24 del 05/11/2024 – Observaciones al informe mensual No. 4 componente ambiental y de gestión social y SST
- CA-285-0061-0255-24 del 13/11/2024 - Solicitudes SST, certificación en cursos de altura, certificados de elementos de alturas para trabajadores de ICMO SAS y otras solicitudes del componente de gestión ambiental.

En respuesta de lo anterior, se recibe por parte del contratista los comunicados:

- CE-018-2024 del 11/10/2024 - Respuesta a Reiteración a cumplimiento de requerimientos HSEQ en Informes mensuales y a comunicado CE-015-2024 del 01/10/2024 y CE-016-2024 del 03/10/2024
- CE-020-2024 del 08/11/2024 – Respuesta del oficio CA-285-0057-0237-24 – Observaciones al informe mensual No. 4 componente SST
- CE-026-2024 del 21/11/2024 – Respuesta a Solicitudes SST, certificación en cursos de altura, certificados de elementos de alturas para trabajadores de ICMO SAS.

Aun así, y en conformidad con lo recibido por parte del contratista durante el periodo que corresponde al informe No.5, se recibe un cuadro que relaciona el personal en obra del contratista como se muestra a continuación:

Tabla 25. Comparación personal en obra según contratista e interventoría

OCUPACIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN VIAS:	1	1
Luis Fernando Urrego Hoyos		
INGENIERO RESIDENTE:	1	1
Jaime Alexander Ortigoza Giraldo		
INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR: Diego Alejandro Reyes Afanador	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNIA: Juan Daniel Moya Robayo	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA PAVIMENTOS: Diego Andres Diaz Diaz	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA: Hugo Alberto Calvo Echevarria	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y AMBIENTAL: Jorge Alberto Ramos Salazar	1	1
PROFESIONAL HSEQ:	1	1
Flanklin Ricardo Piragua Roa		
TOPOGRAFO:	1	1
Luis Enrique Garay Moreno		
TOPOGRAFO AUXILIAR:	1	1
Oliverio Rivas Rayo		
ALMACENISTAS: Yeimi amaya Lozano	2	2
Jose Samuel Torres Gomez		
COORDINADORA SST Gloria Astrid Lopez	1	1
AUXILIAR SST Mónica Marcela Cifuentes Méndez	1	1
INGENIERA AMBIENTAL AUXILIAR Angela Johana Vanegas	1	1
CONDUCTORES VOLQUETAS	3	4
Juan Carlos Sosa Gonzalez		
Jairo Alonso Rios Corredor		
Conductor volqueta TGU480		
Conductor volqueta USE257		
OPERADOR DE MAQUINARIA Sixto Manuel Lamaza Vega Miguel Antonio Villalobos Gutierrez	2	4

OCUPACIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
Operador Vibrocompactador Operador DIECI		
Miguel Antonio Villalobos Gutierrez		
VIGILANTE Luis Carlos Naranjo	2	2
Jose Gregorio Duran Montaña		
MAESTRO JULIO ARANAGA: Romel Muñoz Paez	1	1
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN JULIO ARANAGA: Nelson Fabian Culma Patiño	1	1
Auxiliar SST ICMO SAS: Jisell Donoso Bejarano	No reporto	1
Capataz ICMO SAS: Edgar Fabian Vega Cardenas	No reporto	1
Ayudante de obra ICMO SAS: Jose Carlos Lopez Rivera	No reporto	1
Vigilante ICMO SAS: Jose Eliecer Mendoza Oliveros	1	1
Operador maquinaria ICMO SAS: Eliaz Fernando Cortes Bustamante	No reporto	1
Montador ICMO SAS: Jhon Jairo Chapeta Camargo	No reporto	1
AYUDANTES DE OBRA SUBCONTRATISTA JULIO ARANAGA:	16	17
Lady Avila		
Julio Ernesto Aranaga Londoño		
Luis Fernando Navarro Segura		
Luis Henry Rueda Pereira		
Gabriel Orlando Silva Rondon		
Juan Esteban Moreno Gualteros		
Jose Jair Hoyos Diaz		
Jose Alexander Barrios Martinez		
Robinson Damian Perdomo Sanchez		
Jose Armando Naranjo Moreno		
Harold Arbelaez Nieto		
Wilson Esteban Moreno Mendoza		
Jaider Rincon Patiño		
Jose Triana Hernandez		
Luis Alberto Porras Piñeros		
Cristofer Duvan Moreno Naranjo		
Victor Alfonso Vargas		

OCUPACIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
AYUDANTES DE OBRA CONSORCIO: Robinson Briñez Diaz	1	1
CONDUCTORES: Henry Rico Sanabria	2	2
Alexander Ortigoza Leal		
TOTAL	**44**	**54**

Fuente: Tabla página 61 y 62 del INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST del Periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024, Versión 1 y cuadro CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA de Interventoría

Como se observa, hay discrepancias entre lo reportado por el contratista constructor y lo que la Interventoría tiene de manera contractual y lo observado en campo.

Por otra parte, según los documentos presentados por el contratista, y la tabla mencionada anteriormente, existe discrepancia en el siguiente personal:

- Conductores de volquetas
- Operadores de maquinaria
- Personal de ICMO SAS
- Ayudantes de obra

La documentación remitida por parte del contratista se relaciona en los anexos SST del presente informe.

Tabla 26. Documentación de afiliaciones personal contratista

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	AFILIACIONES		
				EPS	ARL	PENSION
Luis Fernando Urrego Hoyos	79.939.277	Director de obra / especialista en vias	Profesional	Famisanar	Sura	Colpensiones
Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1.110.539.630	Residente de obra	Profesional	Salud total	Sura	Colpensiones
Juan Daniel Moya Robayo	3.192.972	Especialista geotecnia	Profesional	EPS Sura	Sura	Skandia
Diego Andres Diaz Diaz	53.824.544	Especialista en pavimentos	Profesional	Salud Total	Sura	Colpensiones
Hugo Alberto Calvo Echevarria	8.680.183	Especialista en estructura	Profesional	Famisanar	Sura	Colpensiones
Jorge Alberto Ramos Salazar	79.893.182	Especialista en hidraulica / ambiental	Profesional	Sanitas	Positiva	Proteccion
Franklin Ricardo Piragua Roa	93.407.404	Profesional HSEQ	Profesional	Salud total	Positiva	Colpensiones
Luis Enrique Garay Moreno	14.241.018	Topografo	Profesional	Salud Total	Sura	Colpensiones

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	AFILIACIONES		
				EPS	ARL	PENSION
Gloria Astrid Lopez Sanchez	65.753.684	Coordinadora SISO	Administracion	Salud total	Sura	Porvenir
Diego Alejandro Reyes	1.152.686.000	Ing. Auxiliar Residente	Administracion	Salud total	Sura	Colpensiones
Angela Johana Vanegas	28.554.915	Profesional ambiental	Administracion	Salud total	Sura	Proteccion
Yeimi Amaya Lozano	1.106.713.033	Almacenista	Administracion	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Monica Marcela Cifuentes Mendez	65.800.518	Auxiliar SST	Administracion	Nueva EPS	Sura	Colfondos
Oliverio Rivas Rayo	93.142.391	Topografo	Administracion	Salud Total	Sura	Colpensiones
Jose Samuel Torres Gomez	6.009.657	Almacenista	Administracion	Salud Total	Sura	Proteccion
Sixto Manuel Lamaza Vega	5.976.167	Operador de maquinaria indirecto	Consorcio	Salud Total	Sura	Colpensiones
Miguel Antonio Villalobos Gutierrez	7.060.819	Operador de maquinaria	Consorcio	Sanitas	Sura	Porvenir
Henry Rico Sanabria	93.375.223	Conductor carrotanque	Consorcio	Salud total	Sura	Colpensiones
Alexander Ortigoza Leal	93.402.894	Conductor Camioneta	Consorcio	Salud total	Sura	Colpensiones
Jose Adan Rodriguez Calderon	93.392.253	Conductor de volqueta	Consorcio	Salud total	Sura	Colpensiones
Luis Carlos Naranjo	5.836.918	Vigilante	Consorcio	Nueva EPS	Sura	Colpensiones
Robinson Briñez Diaz	14.136.568	Ayudante de obra	Consorcio	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Nelson Fabian Culma Patiño	1.110.527.312	Oficial de construcción	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Lady Avila	83.234.477	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Salud total	Sura	Proteccion
Romel Muñoz Paez	14.223.742	Maestro	Subcontratista JA	Salud total	Sura	Porvenir
Julio Ernesto Aranaga Londoño	14.226.887	Subcontratista	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Colpensiones
Luis Fernando Navarro Segura	1.106.712.399	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Proteccion
Luis Henry Rueda Pereira	80.440.122	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Salud total	Sura	Porvenir

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	AFILIACIONES		
				EPS	ARL	PENSION
Gabriel Orlando Silva Rondon	1.106.713.856	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Asmet Salud	Sura	Proteccion
Juan Esteban Moreno Gualteros	1.106.482.704	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Jose Jair Hoyos Diaz	1.005.848.823	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Colfondos
Jose Alexander Barrios Martinez	1.005.848.808	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Asmet Salud	Sura	Porvenir
Robinson Damian Perdomo Sanchez	1.005.848.345	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Asmet Salud	Sura	Porvenir
Jose Armando Naranjo Moreno	1.007.667.166	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Harold Arbelaez Nieto	1.005.848.634	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Wilson Esteban Moreno Mendoza	1.005.848.884	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Jaider Rincon Patiño	1.006.094.932	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Salud total	Sura	Porvenir
Jose Triana Hernandez	5.874.742	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Luis Alberto Porras Piñeros	93.456.328	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Asmet Salud	Sura	Proteccion
Cristofer Duvan Moreno Naranjo	1.005.828.283	Ayudante de obra	Subcontratista JA	Asmed Salud	Colmena seguros	Porvenir
Victor Alfonso Vargas	1.106.127.022	Oficios varios	Subcontratista JA	Salud total	Sura	Porvenir
Juan Carlos Sosa Gonzalez	13.991.970	Conductor de volqueta	Consorcio	Sanitas	Sura	Colpensiones
Jairo Alonso Rios Corredor	5.821.057	Conductor de volqueta	Consorcio	Salud total	Sura	Colpensiones
Jose Gregorio Duran Montaña	93.456.922	Vigilante	Consorcio	Nueva EPS	Sura	Porvenir
Jisell Donoso Bejarano	65.708.823	Auxiliar SST	ICMO SAS	No presento	No presento	No presento
Edgar Fabian Vega Cardenas	4.149.044	Capataz	ICMO SAS	No presento	No presento	No presento
Jose Carlos Lopez Rivera	1.085.481.250	Ayudante de obra	ICMO SAS	No presento	No presento	No presento
Jose Eliecer Mendoza Oliveros	5.836.434	Vigilante	ICMO SAS	Nueva EPS	Colpatria	Porvenir
Eliaz Fernando Cortes Bustamante	75.059.524	Operador maquinaria	ICMO SAS	No presento	No presento	No presento

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	AFILIACIONES		
				EPS	ARL	PENSION
Jhon Jairo Chapeta Camargo	1.002.300.113	Montador	ICMO SAS	No presento	No presento	No presento
Conductor volqueta TGU480	No presento	Conductor de volqueta	Consorcio	No presento	No presento	No presento
Conductor volqueta USE257	No presento	Conductor de volqueta	Consorcio	No presento	No presento	No presento
Operador vibro compactador	No presento	Conductor de volqueta	Consorcio	No presento	No presento	No presento
Operador DIECI	No presento	Conductor de volqueta	Consorcio	No presento	No presento	No presento

Fuente: Elaboración propia

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
Conductor volqueta TGU48	Conductor de volqueta	No se presentó documentación correspondiente a: nombre, numero de cedula, EMO, parafiscales mes de Octubre, fecha de ingreso.
Operador vibro compactador	Operador maquinaria	No se presentó documentación correspondiente a: nombre, numero de cedula, EMO, parafiscales mes de Octubre, fecha de ingreso.
Operador DIECI	Operador DIECI	No se presentó documentación correspondiente a: nombre, numero de cedula, EMO, parafiscales mes de Octubre, fecha de ingreso.
Conductor volqueta USE257	Conductor de volqueta	No se presentó documentación correspondiente a: nombre, numero de cedula, EMO, parafiscales mes de Octubre, fecha de ingreso.

Evidenciando la falta de información por parte del contratista la interventoría emitirá comunicado solicitando la información faltante por parte del contratista.

6.12 CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA (DE ACUERDO CON L NATURALES DE LA MISMA) Y SUBCONTRATISTAS, DONDE SE EXPRESE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SALARIOS QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL NÚMERO E TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL CONTRATO DE OBRA Y EL PERIODO LABORADO.

Este documento fue adjunto con el acta parcial No.1 y No.2 en cumplimiento a lo descrito en el pliego de condiciones del contratista, en el numeral 3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. *El contratista debe acreditar, **para realizar cada pago del contrato**, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda.*

6.13 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

En el informe mensual No. 4 la Interventoría reportó la no entrega de los soportes de seguridad social del personal del contratista de obra correspondiente al mes de septiembre de 2024, no obstante, estos registros fueron recibidos en octubre de 2024, lo que fue revisado por Interventoría y encontrado conforme. En el Anexo SST subcarpeta Parafiscales mes de SEPTIEMBRE se adjunta el total de la documentación pendiente.

A continuación, se relaciona el personal durante que el periodo en cuestión hace parte del grupo de trabajo y profesional de la interventoría, inicialmente se indican los cargos directivos y de especialistas que tienen dedicaciones de tiempo parcial al proyecto así:

Tabla 27. Seguridad social personal interventoría

Nombres y Apellidos	Cargo	EPS	ARL	AFP	CCF
Claudia Alfaro de Los Rios	Representante legal	Aliansalud	Porvenir	Axa Colpatria	N/A
Diana Esperanza Riveros	Director de interventoría	Compensar	Positiva	Colpensiones	N/A
Hildebrando Ciendua	Especialista en Geotecnia	Compensar	Colpensiones	No indica	N/A
Teófilo Carlos Yidi	Especialista en pavimentos	Sanitas	Colpensiones	ARL Sura	N/A
Diego Ernesto Dueñas Puentes	Especialista en estructuras	Compensar	Colpensiones	Positiva	N/A
Andrés Galarza Guzmán	Especialista en hidráulica	Compensar	Colpensiones	Colpatria	N/A
Claudia Alfaro de Los Rios	Especialista Ambiental	Aliansalud	Porvenir	Axa Colpatria	N/A
Néstor Espinosa Niño	Especialista en vías	Nueva EPS S.A	Colmena S.A	Colpensiones	N/A
Jerson Said Lazaro suarez	Ingeniero residente	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	COMFENALCOTOLIMA
Johan Sebastián Téllez Torres	Ingeniero de apoyo	Compensar	Axa Colpatria	Protección	Cafam
Paula Dayana Castiblanco Molina	Profesional HSEQ	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	COMFENALCOTOLIMA
Álvaro Javier Ferraro Hernández	Supervisor de interventoría	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	COMFENALCOTOLIMA
Wilson Yovanny Arias Martínez	Conductor	Salud total	Axa Colpatria	Colfondos	COMFENALCOTOLIMA
Edgar Gómez Sánchez	Laboratorista	Nueva EPS	Colpatria S.A	Pensionado R. 639472 de 2002	COMFACUNDI
Marco Aurelio Murcia	Topógrafo	Sanitas	Colpatria	Porvenir	No reporta
Sergio Guarín Caldas	Dibujante	Famisanar	AXA Colpatria	Porvenir	Cafam
Nidia Gómez	Secretaria	Compensar	AXA Colpatria	Porvenir	Cafam

Nombres y Apellidos	Cargo	EPS	ARL	AFP	CCF
Olga Rodríguez	Cadenero	Sura	AXA Colpatria	Colpensiones	Cafam
Jhon Franco	Cadenero	Famisanar	AXA Colpatria	Colpensiones	Cafam

Fuente: Elaboración propia

Al presente informe se anexan las planillas pagas de los profesionales y especialistas que forman parte de la interventoría en los anexos SST.

6.14 CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR (DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA MISMA) Y SUBCONTRATISTAS, DONDE SE EXPRESE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SALARIOS QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL CONTRATO DE OBRA Y EL PERIODO LABORADO.

Fue adjunto a las actas parciales No.1 y No.2

6.15 CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST Y FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES.

Inicialmente se establece que dentro del Contrato de consultoría No. 4666 del 2022 el Consorcio Venadillo 182 encargado de los estudios y diseños del puente vehicular formuló el documento PAGA versión 0 de febrero de 2023, el cual fue revisado por esta Interventoría encontrando que no cumple con el contenido exigido en la Guía Ambiental de INVIAS del año 2022. Adicionalmente se evidenció que no es específico para las condiciones contractuales del contrato de obra, ni para el entorno socio ambiental del sitio donde se desarrolla el proyecto, a manera de ejemplo, no fue determinado el nivel de complejidad del proyecto, por lo cual los componentes de la línea base ni las fichas propuestas en el manejo ambiental y social no pueden ser determinadas. En tal sentido, la Interventoría solicitó al contratista constructor ajustar y complementar el documento PAGA, con el fin de definir las fichas de seguimiento de las labores ambientales y poder brindar una calificación por parte de Interventoría.

A continuación, se detallan los requerimientos formulados al contratista constructor sobre la entrega del documento PAGA:

Tabla 28. Trazabilidad requerimientos de presentación documento PAGA

Comunicado	Asunto
CA-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Solicitud perentoria presentación documento PAGA para contrato de obra No.1665 de 2024 y mesa de trabajo 05/08/2024
CA-285-0025-0032-24 de fecha 31/07/2024	Alcance comunicados C–285-0020-0023-24 del 18/7/2024 y C–285-0023-0028-24 del 24/07/2024. Observaciones al Informe Mensual No.1 – Componente Ambiental y de Gestión Social
CA-285-0031-0064-24 del 21/08/2024	Observaciones PLAN DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL para contrato de obra No. 1665 2024.
CA-285-0044-0123-24 de 02/10/2024	Reiteración a cumplimiento de requerimientos HSEQ en informes mensuales y presentación documento PAGA ajustado al contrato de obra No. 1665 de 2024

Comunicado	Asunto
CA-285-0059-0244-24 de 06/11/2024	Observaciones documento PAGA versión 0.1 de fecha 23/10/2024

Fuente: Elaboración propia

El día 23/10/2024 el contratista allego una versión 0.1 del documento PAGA a la interventoría, el cual fue revisado, pero aún no cuenta con aprobación de la misma, las observaciones se emitieron mediante comunicado CA-285-0059-0244-24 del 06/11/2024.

Posterior a esto, se recibe ante la interventoría el día 22/11/2024 el PAGA versión 0.2, documento que se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Una vez se cuente con el documento PAGA aprobado, se diseñará una tabla que liste las fichas ambientales para calificar el cumplimiento del componente de gestión ambiental y SST.

6.16 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA DONDE EXPRESE QUE SE HAN REVISADO LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGOS SALARIALES Y DEL SGSSI REMITIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL RESPECTIVO INFORME.

La interventoría no genera ningún tipo de certificación, puesto que la documentación remitida por el contratista en referencia a pagos salariales y del SG-SSI se encuentra incompleta y no está acorde al personal que se evidencio en obra en el periodo reportado.

Cabe anotar que la Interventoría hizo los siguientes requerimientos al contratista de obra:

- CA-285-0057-0237-24 del 05/11/2024 – Observaciones al informe mensual No. 4 componente ambiental y de gestión social y SST
- CA-285-0061-0255-24 del 13/11/2024 - Solicitudes SST, certificación en cursos de altura, certificados de elementos de alturas para trabajadores de ICMO SAS y otras solicitudes del componente de gestión ambiental.

En respuesta de lo anterior, se recibe por parte del contratista los comunicados:

- CE-018-2024 del 11/10/2024 - Respuesta a Reiteración a cumplimiento de requerimientos HSEQ en Informes mensuales y a comunicado CE-015-2024 del 01/10/2024 y CE-016-2024 del 03/10/2024
- CE-020-2024 del 08/11/2024 – Respuesta del oficio CA-285-0057-0237-24 – Observaciones al informe mensual No. 4 componente SST
- CE-026-2024 del 21/11/2024 – Respuesta a Solicitudes SST, certificación en cursos de altura, certificados de elementos de alturas para trabajadores de ICMO SAS.

La documentación allegada por parte del contratista se encuentra en los anexos SST del presente informe, sin embargo, a continuación, se relaciona los documentos faltantes del periodo comprendido entre el 11 octubre 2024 al 10 noviembre 2024:

Tabla 29. Seguridad social contratista mes de octubre 2024

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social OCTUBRE
Luis Fernando Urrego Hoyos	79.939.277	Director de obra / especialista en vias	Profesional	11/06/2024		Ok
Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1.110.539.630	Residente de obra	Profesional	11/06/2024		Ok
Juan Daniel Moya Robayo	3.192.972	Especialista geotecnia	Profesional	11/06/2024		Ok
Diego Andrés Diaz Diaz	53.824.544	Especialista en pavimentos	Profesional	11/06/2024		Ok
Hugo Alberto Calvo Echevarria	8.680.183	Especialista en estructura	Profesional	11/06/2024		Ok
Jorge Alberto Ramos Salazar	79.893.182	Especialista en hidraulica / ambiental	Profesional	11/06/2024		Ok
Franklin Ricardo Piragua Roa	93.407.404	Profesional HSEQ	Profesional	11/06/2024		Ok
Luis Enrique Garay Moreno	14.241.018	Topografo	Profesional	11/06/2024		Ok
Gloria Astrid Lopez Sanchez	65.753.684	Coordinadora SISO	Administracion	23/07/2024		Ok
Diego Alejandro Reyes	1.152.686.000	Ing. Auxiliar Residente	Administracion	15/06/2024		Ok
Angela Johana Vanegas	28.554.915	Profesional ambiental	Administracion	23/07/2024		Ok
Yeimi Amaya Lozano	1.106.713.033	Almacenista	Administracion	11/06/2024		Ok
Monica Marcela Cifuentes Mendez	65.800.518	Auxiliar SST	Administracion	19/07/2024		Ok
Oliverio Rivas Rayo	93.142.391	Topografo	Administracion	11/06/2024		Ok
Jose Samuel Torres Gomez	6.009.657	Almacenista	Administracion	11/06/2024		Ok

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social OCTUBRE
Sixto Manuel Lamaza Vega	5.976.167	Operador de maquinaria indirecto	Consorcio	11/06/2024		Ok
Miguel Antonio Villalobos Gutierrez	7.060.819	Operador de maquinaria	Consorcio	23/01/2024		Ok
Henry Rico Sanabria	93.375.223	Conductor carrotanque	Consorcio	2/02/2024		Ok
Alexander Ortigoza Leal	93.402.894	Conductor Camioneta	Consorcio	12/01/2024		Ok
Jose Adan Rodriguez Calderon	93.392.253	Conductor de volqueta	Consorcio	6/06/2024		Ok
Luis Carlos Naranjo	5.836.918	Vigilante	Consorcio	22/07/2024		Ok
Robinson Briñez Diaz	14.136.568	Ayudante de obra	Consorcio	16/01/2024		Ok
Nelson Fabian Culma Patiño	1.110.527.312	Oficial de construcción	Subcontratista JA	2/07/2024		Ok
Lady Avila	83.234.477	Ayudante de obra	Subcontratista JA	2/07/2024		Ok
Romel Muñoz Paez	14.223.742	Maestro	Subcontratista JA	2/07/2024		Ok
Julio Ernesto Aranaga Londoño	14.226.887	Subcontratista	Subcontratista JA	2/07/2024		Ok
Luis Fernando Navarro Segura	1.106.712.399	Ayudante de obra	Subcontratista JA	2/07/2024		Ok
Luis Henry Rueda Pereira	80.440.122	Ayudante de obra	Subcontratista JA	8/07/2024		Ok
Gabriel Orlando Silva Rondon	1.106.713.856	Ayudante de obra	Subcontratista JA	8/07/2024		Ok
Juan Esteban Moreno Gualteros	1.106.482.704	Ayudante de obra	Subcontratista JA	28/07/2024		Ok
Jose Jair Hoyos Diaz	1.005.848.823	Ayudante de obra	Subcontratista JA	28/07/2024		Ok
Jose Alexander	1.005.848.808	Ayudante de obra	Subcontratista JA	20/07/2024		Ok

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social OCTUBRE
Barrios Martinez						
Robinson Damian Perdomo Sanchez	1.005.848.345	Ayudante de obra	Subcontratista JA	20/07/2024		Ok
Jose Armando Naranjo Moreno	1.007.667.166	Ayudante de obra	Subcontratista JA	20/07/2024		Ok
Harold Arbelaez Nieto	1.005.848.634	Ayudante de obra	Subcontratista JA	10/07/2024		Ok
Wilson Esteban Moreno Mendoza	1.005.848.884	Ayudante de obra	Subcontratista JA	12/08/2024		Ok
Jaider Rincon Patiño	1.006.094.932	Ayudante de obra	Subcontratista JA	12/08/2024		Ok
Jose Triana Hernandez	5.874.742	Ayudante de obra	Subcontratista JA	12/08/2024	11/10/2024	Ok
Luis Alberto Porras Piñeros	93.456.328	Ayudante de obra	Subcontratista JA	15/07/2024	15/10/2024	Ok
Cristofer Duvan Moreno Naranjo	1.005.828.283	Ayudante de obra	Subcontratista JA	11/06/2024		Ok
Victor Alfonso Vargas	1.106.127.022	Oficios varios	Subcontratista JA	15/01/2024		Ok
Juan Carlos Sosa Gonzalez	13.991.970	Conductor de volqueta	Consorcio	15/06/2024		Ok
Jairo Alonso Rios Corredor	5.821.057	Conductor de volqueta	Consorcio	10/01/2024		Ok
Jose Gregorio Duran Montaña	93.456.922	Vigilante	Consorcio	15/10/2024		Ok
Jisell Donoso Bejarano	65.708.823	Auxiliar SST	ICMO SAS	16/10/2024		Ok
Edgar Fabian Vega Cardenas	4.149.044	Capataz	ICMO SAS	16/10/2024		Ok
Jose Carlos Lopez Rivera	1.085.481.250	Ayudante de obra	ICMO SAS	16/10/2024		Ok
Jose Eliecer Mendoza Oliveros	5.836.434	Vigilante	ICMO SAS	19/10/2024		Ok

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social OCTUBRE
Eliaz Fernando Cortes Bustamante	75.059.524	Operador maquinaria	ICMO SAS	22/10/2024		Ok
Jhon Jairo Chapeta Camargo	1.002.300.113	Montador	ICMO SAS	16/10/2024		Ok
Conductor volqueta TGU480	No presento	Conductor de volqueta	Consorcio	No presento		No presento
Operador vibro compactador	No presento	Operador maquinaria	Consorcio	No presento		No presento
Operador DIECI	No presento	Operador maquinaria	Consorcio	No presento		No presento
Conductor volqueta USE257	No presento	Conductor de volqueta	Consorcio	No presento		No presento

Fuente: Elaboración propia

6.17 PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES

En informes anteriores el contratista envió evidencia acerca de la radicación para el permiso de ocupación de cauce sobre el río Venadillo por parte del contratista ante CORTOLIMA, bajo radicado No. 3479 del 18/03/202. La documentación correspondiente al radicado se ha adjuntado en los anexos ambientales – permiso de ocupación de cauce de informes anteriores, sin embargo, no se han reportado avances ni respuesta por parte de la corporación, así lo informo el contratista constructor en comité de obra del día 08/10/2024. En el comité ambiental realizado de manera presencial se solicitó al contratista hacer un acercamiento con la autoridad ambiental para indagar por el acto administrativo requerido.

Tabla 30. Identificación de permisos ambientales del proyecto.

Demanda	Descripción del tipo de demanda			Cumplimiento por parte de contratista
RECURSO: AGUA				
Agua superficial	Requiere permiso	NO	Se realizó la compra de agua en cubo al acueducto veredal y/o acueducto municipal, principalmente para el manejo de material particulado y preparación de concretos.	No se presenta documentación correspondiente a concesiones del acueducto veredal y de la empresa IBAL quien suministra agua de uso industrial, se presenta resolución 0500/2020, donde se adopta contrato de servicios públicos domiciliarios para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Ibagué.

Demanda	Descripción del tipo de demanda			Cumplimiento por parte de contratista
Vertimientos	Requiere permiso	NO	Se realiza la gestión con propietarios de predios para el préstamo de unidades sanitarias para uso del personal de la obra, las cuales cuentan con sistema séptico.	Se presentó acta de acuerdo con la señora Jessica María Moren Naranjo para el préstamo de la unidad sanitaria, como también se hace uso de los baños ubicados en los campamentos donde residen los colaboradores del proyecto. Unidades sanitarias que están conectadas de manera directamente a pozos sépticos los cuales se pudieron verificar y son de uso mixto. Se anexa el uso de dos unidades sanitarias en predios de propietarios Blanca Lucy Sanchez y Angela Sanchez, de las cuales no se recibe actas ni permiso para el uso de los mismos.
Ocupación de Cauce	Requiere permiso	SI	Acta No. 003 - CMGRD (15-03-2024) mediante esta acta se pudo iniciar las actividades constructivas. Solicitud POC radicado ante Cortolima bajo No. 3479 del 18/03/2024. Visita de evaluación por Cortolima realizada el 03/07/2024.	No se presenta avances en cuanto al trámite ante Cortolima en el periodo reportado.
RECURSO: SUELO				
Materiales de construcción	Requiere permiso	NO	Los materiales de construcción son suministrados por Triturados y Vías La Caima, proveedor que cuenta con la documentación minera y ambiental conforme.	El contratista cuenta con soportes minero y ambiental y ha emitido los certificados de los materiales granulares suministrados al proyecto.
Manejo y disposición de RCD	Requiere permiso	NO	Se realizará la disposición de material de excavación en predios aledaños al proyecto, donde se desarrollan nivelaciones topográficas.	El contratista reporta disposición en los predios: Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo y Predio Villa Blanca de Propiedad de la señora Blanca Lucy Sánchez, el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito de material, se allegó información detallada sobre ubicación, capacidad del sitio del mismo, del predio Hacienda Guadalupe, se presentaron certificaciones de cantidades dispuestas. Se presentó el certificado de uso de suelo del predio Villa Blanca y el paz y salvo y entrega del mismo.

Demanda	Descripción del tipo de demanda			Cumplimiento por parte de contratista
Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Requiere permiso	NO	Se acopian los residuos en un punto protegidos del agua, al tener un volumen considerable se entregarán para realzar disposición final en el relleno sanitario.	La entrega se realiza a la empresa de servicios públicos Interaseo S.A.S E.S.P. sin embargo, el contratista hace referencia que hasta completar los 8m3 de volumen se entregaran los residuos, tampoco carta de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo por parte de Interaseo S.A.S.E.S.P.
RECURSO: FLORA				
Aprovechamiento forestal	Requiere permiso	NO	No se requiere la solicitud de dicho permiso, teniendo en cuenta que no existe afectación al componente arbóreo.	Evidenciado por el funcionario de CORTOLIMA en la visita técnica realizada el día 03/07/2024 como quedó consignado en el acta de visita correspondiente al expediente No 3479.
Plan de Arqueología Preventiva	Requiere permiso	NO	De acuerdo al Decreto número 138 de 2019 del 06 de febrero del año en curso del Ministerio de Cultura por el cual se modifica la parte VI “Patrimonio Arqueológico” del Decreto 1080 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en el Título V Programa de Arqueología Preventiva en el Articulo 2.6.5.2 en el ámbito de aplicación establece que el programa de Arqueología Preventiva deberá formularse y desarrollarse en todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes.	N/A

Fuente: Elaboración Propia

Por lo anterior, el contratista realizo la instalación de un tanque para el almacenamiento de agua la cual será suministrada por la empresa IBAL S.A E.S.P y transportada en el carrotanque de la empresa, de la cual se adjunta resolución No.500 del 29/12/2020, la cual hace alusión a un contrato de servicios públicos domiciliarios para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ibagué.

Se adjunta un recibo de pago realizado a IBAL SA, de fecha del mes de septiembre de 2024, lo cual no es vigente para el periodo del presente informe, para lo cual la interventoría genero comunicado CA-285-0061-0255-24 de fecha 13/11/2024 y CA-285-0057-02378-24 de fecha 05/11/2024 donde se solicita aclaración al contratista en referencia a este soporte y las cantidades suministradas por IBAL SA, sin embargo, a la fecha del presente informe no ha sido respondido.

7. INFORMACION SOCIAL

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA. DEBE INCLUIR COPIA DE LOS ANEXOS REFERENTES A LA GESTIÓN DEL CONTRATISTA REQUERIDO EN EL CONTRATO.

Contratista

Se da claridad que el Plan de Gestión Social no ha sido actualizado por el contratista, en la medida que este componente hace parte del documento PAGA, y el cual aún no se cuenta aprobado por parte de la interventoría.

Por otra parte, el contratista presentó en su INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST del Periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024, Versión 1, en el componente SOCIAL, en el cual se informó las siguientes actividades:

- El contratista reporto la contratación de 44 personas, de los cuales el 40% (19 personas) corresponde a mano de obra calificada y el 60% (25 personas) corresponde a mano de obra no calificada, de los cuales 17 son locales y 8 externos.
- Se menciona la elaboración de 4 actas de vecindad de inicio del sector objeto de intervención, sin embargo, estas carecen del plano de la construcción dentro de las mismas.

Interventoría

Por parte de la interventoría, se realizan inspecciones diarias al contratista que garanticen el cumplimiento del programa de gestión social, al igual que el acompañamiento en atención a la comunidad, sin embargo, a la fecha y durante el periodo del presente informe no se han presentado ningún tipo de novedades con la comunidad.

Se realizó el acompañamiento a la reunión realizada con la comunidad el día 18/10/2024, donde se informó a funcionarios de las alcaldías de Ambalema, Venadillo y a líderes de la comunidad sobre el avance de la obra y la prórroga de tiempo que iba a extender la duración del contrato en la construcción del Puente sobre el rio Venadillo.

7.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA. DESCRIPCIÓN DE LOS ATRASOS O ADELANTOS O EVENTUALIDADES QUE SE ESTÉN PRESENTANDO CONFORME AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. ADEMÁS, SE DEBEN RELACIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS, ASÍ COMO LA RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Durante el periodo la interventoría emitió los siguientes comunicados dirigidos al contratista relacionado con la presentación y aprobación del documento PAGA
CA-285-0057-02378-24 del 05/11/2024 – Observaciones al informe mensual No. 4 – Componente ambiental y de gestión social

Desde el día 08/08/2024 el contratista allego una versión 0 del documento PAGA a la interventoría, el cual fue revisado, pero aún no cuenta con aprobación de la misma, las

observaciones se emitieron mediante comunicado CA-285-0031-0064-24 del 21/08/2024; La interventoría emitió comunicado CA-285-0044-0123-24 de 02/10/2024 - Reiteración a cumplimiento de requerimientos HSEQ en informes mensuales y presentación documento PAGA ajustado al contrato de obra No. 1665 de 2024, citando además a mesa de trabajo, que se realizó el día 08/10/2024 y del cual se adjunta presentación utilizada en el mismo y acta al presente informe, donde se socializó nuevamente al contratista las observaciones del documento en cuestión, para lo cual se recibió el compromiso en la presentación del mismo para el día 15/10/2024 con las observaciones subsanadas; en pro del cumplimiento de esto, se recibe el día 23/10/2024 una versión 2 del documento PAGA, pero aún no cuenta con aprobación de la misma, las observaciones se emitieron mediante comunicado CA-285-0059-0244-24 del 06/11/2024, y se recibe el día 22/11/2024 una versión 3 del documento PAGA y el cual se encuentra en revisión de la interventoría en lo que comprende al periodo del presente informe.

Se concluye que hasta tanto no se cuente con un PAGA aprobado por Interventoría, no es factible realizar un instrumento para obtener una calificación como se solicita por la entidad contratante.

7.3 RELACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORÍA.

Contratista

El contratista cuenta con el punto SAU ubicado en el área de influencia directa del proyecto en el predio de la Sra Jessica Moreno vereda Vile Alto, para la atención a la comunidad en general. El contratista está presto en campo a recibir todas las peticiones quejas y/o reclamos que se generen, en el horario de atención de martes, miércoles y jueves de 10:00 am a 4:00 pm; como también se cuenta con la línea de atención al usuario (3124886337 - 3124458304), con la disposición de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, donde la comunidad en general y la de los sectores más distantes del Proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.

Adicional a esto se realizó la instalación del buzón de sugerencias, el cual se ubica en la vereda EL ALTO, mismo punto del Sistema de Atención a la Comunidad, del cual se reporta no haber recibido ningún tipo de PQRS durante el periodo del presente informe.

El contratista presentó en el presente informe las evidencias de las instalaciones con el equipamiento que se debe tener para cumplir atender a la comunidad, junto con los formatos utilizados para atención al usuario.

El contratista relaciona las charlas dadas al personal de obra en cuanto a inducción y las demás con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de obra en diversos temas de interés para el proyecto, de las cuales se anexa listas de asistencia en carpeta de anexos componente social.

Tabla 31. Charlas área social.

Tema	Fecha	No. de participantes
Sentido común	3 noviembre 2024	16
Orden y aseo	2 noviembre 2024	12
Hábitos de vida saludable	1 noviembre 2024	15
Tolerancia	31 octubre 2024	14
Todo es cuestión de actitud	30 octubre 2024	19

La cooperación	29 octubre 2024	11
Liderazgo positivo	28 octubre 2024	18
Liderazgo negativo	26 octubre 2024	17
Nadie trata de echarle la culpa al otro	25 octubre 2024	13
Las pequeñeces de la vida	24 octubre 2024	20
Manejo del estrés	23 octubre 2024	19
Que nos hace sentir bien sobre nuestro trabajo – motivación	22 octubre 2024	12
Resolución de conflictos	21 octubre 2024	13
Trabajo en equipo	20 octubre 2024	13
Porque no se trabaja en el trabajo	19 octubre 2024	14
Como alcanzar el equilibrio entre la vida y el trabajo	18 octubre 2024	16
El secreto para trabajar mejor y feliz	17 octubre 2024	17
Puntualidad	16 octubre 2024	13
Trabajo en equipo	15 octubre 2024	17
Resolución de conflictos	11 octubre 2024	15

Fuente. Elaboración propia

Interventoría

Por parte de la interventoría, se relaciona a continuación el consolidado de PQRS recibidas por parte de la comunidad o entes externos.

Tabla 32. Consolidado PQRS del periodo del 11 de octubre al 10 de noviembre 2024

PQRS	Acumuladas	Presente periodo	Observaciones
Recibida	0	0	N/A
Cerrada	0	0	N/A
Abierta	0	0	N/A
En tramite	0	0	N/A

Fuente: Elaboración propia

7.4 CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL.

Se presentó una versión 3 del documento PAGA el día 22/11/2024, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría a la fecha y durante el periodo del presente informe, y el cual contiene las actividades de área, y es la base fundamental para poder realizar seguimiento correspondiente a las actividades reportadas en el informe mensual No. 5

El contratista presenta la evidencia de las actas de vecindad diligenciadas, sin embargo, estas carecen del plano de construcción, para lo cual el contratista deberá complementarlas y presentarlas a la interventoría.

El contratista manifiesta no haber realizado procesos de divulgación a la comunidad durante el periodo del informe No 5.

Dicho lo anterior la interventoría califica la gestión social por parte del contratista de forma regular, considerando que el componente está incompleto, hasta no presentarse los documentos faltantes para la aprobación del mismo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (AMBIENTAL, SOCIAL Y SST)

En el Anexo No. 08 se relaciona el registro fotográfico Técnico y SST, las cuales contienen las actividades realizadas durante el periodo reportado

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe realizar el levantamiento de los esquemas de la infraestructura encontrada dentro de las actas de vecindad presentadas por parte del contratista y presentarse completas a la interventoría.
- Se debe presentar la documentación faltante con respecto al personal de ICMO SAS y conductores de volquetas doble troque en obraConclusiones y recomendaciones
- En el presente periodo se presentaron avances significativos respecto al cronograma de obra aprobado por la interventoría; lo anterior, debido al amarre de acero de refuerzo, el vaciado de concreto para vigas y estribos, el montaje de la estructura metálica y los rellenos de estructura con material de recebo a lo largo del periodo de este informe.
- Se evidencia que el contratista está realizando la construcción de los elementos del puente basándose en los estudios y diseños entregados por parte de la Gobernación del Tolima y siguiendo la normativa de construcción vigente colombiana y lo especificado en la información en campo correspondiente.
- Respecto al mes anterior y la reprogramación de obra aprobada a los dos (2) meses de prorroga el proyecto avanza a la par entre la línea de tendencia de programado vs lo ejecutado.

ANEXO No. 01

ACTAS COMITÉ DE OBRA (NO SE GENERARON EN EL PERIODO DEL INFORME)

ANEXO No. 02

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

ALDEIC S.A.S BIC	GOBERNACION DEL TOLIMA MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 5	@gobertolima www.tolima.gov.co	INFORME Nº	5	
			PERIODO	11/10/2024 AL 10/11/2024	
			PAGINA	1	DE 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698	ALDEIC SAS BIC	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DÍA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN VIAS: Luis Fernando Urrego Hoyos	1				1						1							1							1					
INGENIERO RESIDENTE: Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1				1						1							1							1					
INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR: Diego Alejandro Reyes Afanador	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNIA: Juan Daniel Moya Robayo	1				1						1							1							1					
INGENIERO ESPECIALISTA PAVIMENTOS: Diego Andres Diaz Diaz	1				1						1							1							1					
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA: Hugo Alberto Calvo Echevarria	1				1						1							1							1					
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y AMBIENTAL: Jorge Alberto Ramos Salazar	1				1						1							1							1					
PROFESIONAL HSEQ: Flanklin Ricardo Piragua Roa	1				1						1							1							1					
TOPOGRAFO: Luis Enrique Garay Moreno	1				1						1							1							1					
TOPOGRAFO AUXILIAR: Oliverio Rivas Rayo	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ALMACENISTAS: Yeimi amaya Lozano	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jose Samuel Torres Gomez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
COORDINADORA SST Gloria Astrid Lopez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AUXILIAR SST Mónica Marcela Cifuentes Méndez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
INGENIERA AMBIENTAL AUXILIAR Angela Johana Vanegas	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CONDUCTORES VOLQUETAS																														
Conductor volqueta TGU480	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conductor volqueta USE257	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Juan Carlos Sosa Gonzalez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jairo Alonso Rios Corredor	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OPERADOR DE MAQUINARIA Sixto Manuel Lamaza Vega	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Miguel Antonio Villalobos Gutierrez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Operador Dieci	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Operador Vibro compactador pequeño	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VIGILANTE Luis Carlos Naranjo	1	1			1																									
Jose Gregorio Duran Montaña					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAESTRO JULIO ARANAGA: Romel Muñoz Paez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN JULIO ARANAGA: Nelson Fabian Culma Patiño	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auxiliar SST ICMO SAS: Jisell Donoso Bejarano						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capataz ICMO SAS: Edgar Fabian Vega Cardenas						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ayudante de obra ICMO SAS: Jose Carlos Lopez Rivera						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vigilante ICMO SAS: Jose Eliecer Mendoza Oliveros						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operador maquinaria ICMO SAS: Eliaz Fernando Cortes Bustamante						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Montador ICMO SAS: Jhon Jairo Chapeta Camargo						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AYUDANTES DE OBRA SUBCONTRATISTA JULIO ARANAGA:																														
Lady Avila	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Julio Ernesto Aranaga Londoño	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Luis Fernando Navarro Segura	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Luis Henry Rueda Pereira	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gabriel Orlando Silva Rondon	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Juan Esteban Moreno Gualteros	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jose Jair Hoyos Diaz	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jose Alexander Barrios Martinez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Robinson Damian Perdomo Sanchez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jose Armando Naranjo Moreno	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Harold Arbelaez Nieto	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Wilson Esteban Moreno Mendoza	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jaider Rincon Patiño	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jose Triana Hernandez	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Luis Alberto Porras Piñeros	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cristofer Duvan Moreno Naranjo	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Victor Alfonso Vargas	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTES DE OBRA CONSORCIO: Robinson Briñez Diaz	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CONDUCTORES: Henry Rico Sanabria	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Alexander Ortigoza Leal	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Total	47	39	0	0	48	45	45	45	45	45	53	45	45	45	45	45	0	53	45	45	45	45	45	45	53	45	45	45	45	6

Firma
Nombre: Paula Dayana Castiblanco Molina
Profesional HSEQ

Firma
Nombre: Jerson Said Lazaro
Residente de Interventoría

PLANILLAS DE PARAFISCALES DE PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO URREGO HOYOS identificado(a) con CC 79939277 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S NI 900641841																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473204718	908774315	E	2024-09-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473204718	908774315	E	2024-09-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473204718	908774315	E	2024-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473204718	908774315	E	2024-09-12	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-05 a las 16:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DANIEL MOYA ROBAYO identificado(a) con CC 3192972 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S NI 900641841																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473204718	908774315	E	2024-09-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473204718	908774315	E	2024-09-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473204718	908774315	E	2024-09-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473204718	908774315	E	2024-09-12	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-05 a las 16:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que HUGO ALBERTO CALVO ECHEVERRIA identificado(a) con CC 8680183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HUGO ALBERTO CALVO ECHEVERRIA CC 8680183																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9472361471	2024093009 0715028128	I	2024-09-30	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9472361471	2024093009 0715028128	I	2024-09-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-05 a las 16:11.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93407404	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA	CALLE 62 6 60	2688235	ricardopiragua01@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	17/10/2024	80533402	$1.056.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	450.000	0		0		0	15	4.900	0	454.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	576.000	0	0	0	0	15	6.200	0	582.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.800				18.800	15	300	19.100			188	19.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	450.000	454.900
Pensión	1	576.000	582.200
Riesgos Laborales	1	18.800	19.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.044.800	1.056.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93407404	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA		CALLE 62 6 60	2688235	ricardopiragua01@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	17/10/2024	80533402	$1.056.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93407404	PIRAGUA ROA FRANKLIN RICARDO	59	0			N								X								25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS002	3.600.000	450.000	14-23	3.600.000	1	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS ENRIQUE GARAY MORENO identificado(a) con CC 14241018 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GARAY MORENO LUIS ENRIQUE CC 14241018																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9474441360	958947473	I	2024-10-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9474441360	958947473	I	2024-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-05 a las 16:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ identificado(a) con CC 5824544 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DIAZ DIAZ DIEGO ANDRES CC 5824544																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9474332089	31204745	I	2024-10-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9474332089	31204745	I	2024-10-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9474332089	31204745	I	2024-10-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-05 a las 16:11.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28554915
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELA MARIA VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO JORDAN	TELÉFONO:	3124886
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**2330952006**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	31206466		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD					ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 28554915	VANEGAS ANGELA JOHANA	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500				$ 0	$ 0	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 396.500**

Planilla Pagada

PLANILLAS PARAFISCALES LEGIBLES MES SEPTIEMBRE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901826039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943345850**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	950178704		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 230.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.750.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 52.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 52.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 276.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 109.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 489.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	8	$ 489.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 489.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 851.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 851.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.581.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.581.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901826039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7943345850**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		950178704	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 0	$ 230.100
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 1.750.100**	**$ 0**	**$ 1.750.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 109.600
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													**$ 489.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 489.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 851.900	$ 851.900	$ 0	$ 0	$ 851.900
SUBTOTALES:									**$ 851.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 851.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	8	$ 489.600	$ 0	$ 489.600
SUBTOTALES:			**$ 489.600**	**$ 0**	**$ 489.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES												
																											PENSIÓN										SALUD						ARP																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																					
1	CC 1006127022	VARGAS CESPEDES VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1106713033	AMAYA LOZANO YEIMI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 14136568	BRIÑEZ DIAZ ROBINSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 5836918	NARANJO LUIS CARLOS	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 6009657	TORRES GOMEZ JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 65800518	CIFUENTES MENDEZ MONICA MARCELA	DEPEND		$ 1.438.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.438.000	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.438.000	$ 57.600	$ 0	$ 57.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.438.000		$ 100.100	30	$ 1.438.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 93412391	RIVAS RAYO OLIVERIO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 93456328	PORRAS PIÑEROS LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.581.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943352237**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		950193333

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.023.100
		SUBTOTAL:	21	**$ 3.855.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 43.400
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2	$ 104.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	8	$ 336.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 244.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 287.800
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.015.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	22	$ 1.015.900
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.015.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.768.100
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.768.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.655.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.655.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943352237**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		950193333	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.023.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.023.100	$ 0	$ 3.023.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 3.855.100**	**$ 0**	**$ 3.855.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 287.800
EPS041	NUEVA EPS CM	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 336.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 244.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 43.400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 1.015.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.015.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.768.100	$ 1.768.100	$ 0	$ 0	$ 1.768.100
SUBTOTALES:									**$ 1.768.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.768.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	22	$ 1.015.900	$ 0	$ 1.015.900
SUBTOTALES:			**$ 1.015.900**	**$ 0**	**$ 1.015.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																				
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005828283	MORENO NARANJO CRISTOFER DUVAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005848345	PERDOMO SANCHEZ ROBINSON DAMIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005848423	HOYOS DIAZ JOSE JAIR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1005848634	ARBELAEZ NIETO HAROLD	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005848808	BARRIOS MARTINEZ JOSE ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005848849	NARANJO CARDOZO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25															230301-PORVENIR	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.083.334		$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1005848884	MORENO MENDOZA WILSON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1006094932	RINCON PATIÑO JAIDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007667166	NARANJO MORENO JOSE ARMANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1054557702	GUTIERREZ CARDONA KRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 693.334		$ 48.300	16	$ 693.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1106482704	MORENO GUALTEROS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1106482764	TRIANA LOPEZ CARLOS MANUEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 63.400	21	$ 910.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943352237**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		950193333

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1106484892	SANCHEZ VILLADA JOKSY ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667		$ 6.100	2	$ 86.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1106712399	NAVARRO SEGURA LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1106713856	SILVA RONDON GABRIEL ORLANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1110469827	LOZANO ARANZALES MACOL DAMIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 63.400	21	$ 910.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1110527312	CULMA PATIÑO NELSON FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 14223742	MUÑOZ PAEZ ROMEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 5837476	MORENO SALOMON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 63.400	21	$ 910.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 5874742	TRIANA HERNANDEZ JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 80440122	RUEDA PEREIRA LUIS HENRY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 83234477	AVILA LADY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 7.655.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 28554915
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28554915		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELA MARIA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
DIRECCIÓN:	BARRIO JORDAN	TELÉFONO:	3124886		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28554915		
APELLLIDOS:	VANEGAS	NOMBRES:	ANGELA JOHANA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
TIPO COTIZANTE:	INDEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:					
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

PLANILLA No:	2330904060	TIPO DE PLANILLA:	I	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2024	FECHA DE PAGO:	04/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.300.000																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 396.500

Planilla Pagada
ach SOI

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1152686000
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1152686000
APELLLIDOS:	REYES AFANADOR	NOMBRES:	DIEGO ALEJANDRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939462419	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.000.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 619.200

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 65753684
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65753684
APELLLIDOS:	LOPEZ SANCHEZ	NOMBRES:	GLORIA ASTRID
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939453398	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.600.000																		230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	1	$ 181.000	30	$ 2.600.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 805.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1110539630
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110539630
APELLLIDOS:	ORTIGOZA GIRALDO	NOMBRES:	JAIME ALEXANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939462419	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.500.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000	1	$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.083.600

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5821057
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5821057
APELLLIDOS:	RIOS CORREDOR	NOMBRES:	JAIRO ALONSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939871831	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.938.000	14																	230201-PROTECCION	17	$ 1.098.200	$ 175.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.800	EPS002-SALUD TOTAL	17	$ 1.098.200	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.098.200		$ 76.500	17	$ 1.098.200	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 340.300

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93392253
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901710657
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL OGG RO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N.2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93392253
APELLLIDOS:	RODRIGUEZ CALDERON	NOMBRES:	JOSE ADAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939467887	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	02 - INFRAESTRUTURA VIAL OGG-RO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.638.000																		230301-PORVENIR	30	$ 1.638.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 114.100	30	$ 1.638.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 507.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13991970
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13991970
APELLLIDOS:	SOSA GONZALEZ	NOMBRES:	JUAN CARLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939871831	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.938.000	14																	231001-COLFONDOS	17	$ 1.098.200	$ 175.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.800	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 1.098.200	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.098.200		$ 76.500	17	$ 1.098.200	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 340.300

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13991970
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13991970
APELLLIDOS:	SOSA GONZALEZ	NOMBRES:	JUAN CARLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939871831	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.938.000	14																	231001-COLFONDOS	17	$ 1.098.200	$ 175.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.800	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 1.098.200	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.098.200		$ 76.500	17	$ 1.098.200	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 340.300

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7060819
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7060819
APELLLIDOS:	VILLALOBOS GUTIERREZ	NOMBRES:	MIGUEL ANTONIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939453398	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.500.000																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 774.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 2736167
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA OCTUBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2736167
APELLLIDOS:	LAMAZA VEGA	NOMBRES:	SIXTO MANUEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7943343130	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	septiembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	octubre - 2024	FECHA DE PAGO:	01/10/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 2.338.000																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 724.100

PLANILLA No:	7939453398	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 2.338.000																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 724.100

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93402894
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA OCTUBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93402894
APELLLIDOS:	ORTIGOZA LEAL	NOMBRES:	GUILLERMO ALEXANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7943343130	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	septiembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	octubre - 2024	FECHA DE PAGO:	01/10/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.338.000																	230301-PORVENIR	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 724.100

PLANILLA No:	7939453398	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.338.000																	230301-PORVENIR	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 724.100

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79893182		RAMOS SALAZAR JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 3 76 Oficina 507	IBAGUE-TOLIMA	2694886	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1063941998	9475014888	I	2024/10/21	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	30	$447,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79893182	RAMOS JORGE	230201	30	$1,510,000	$241,600	EPS005	30	$1,510,000	$188,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,510,000	$7,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,510,000	$241,600			$1,510,000	$188,800			$0	$0			$1,510,000	$7,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,600	$5,200	$0	$246,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$241,600	$5,200	$0	$246,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$200	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,900	$200	$0	$8,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,800	$4,100	$0	$192,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$188,800	$4,100	$0	$192,900
TOTAL				1	$438,300	$9,500	$0	$447,800

2024/11/20 11:17 AM

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ERNESTO ARANAGA LONDOÑO identificado(a) con CC 14226887 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES NI 900336004																
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades							
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9471964867	884448351	2024-09-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30								

Este certificado se expide el día 2024-11-19 a las 15:11.

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93375223
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93375223
APELLLIDOS:	RICO SANABRIA	NOMBRES:	HENRY
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939462419	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.638.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.638.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 114.100	30	$ 1.638.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 507.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1106482704
DESDE SEPTIEMBRE 2024 HASTA OCTUBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1106482704
APELLLIDOS:	MORENO GUALTEROS	NOMBRES:	JUAN ESTEBAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7943352237	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	septiembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	octubre - 2024	FECHA DE PAGO:	01/10/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF							
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.300.000																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 402.500

PLANILLA No:	7939858691	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF							
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.300.000																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 402.500

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1003710894
DESDE JULIO 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003710894
APELLLIDOS:	TIQUE SANCHEZ	NOMBRES:	RRYUD MILER
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7939858691	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2024	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.300.000	05	10																230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	NUEVA EPS CM	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000		$ 18.100	6	$ 260.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 80.500

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943352237**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		950193333	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.023.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.023.100	$ 0	$ 3.023.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 3.855.100**	**$ 0**	**$ 3.855.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 287.800
EPS041	NUEVA EPS CM	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 336.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 244.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 43.400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 1.015.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.015.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.768.100	$ 1.768.100	$ 0	$ 0	$ 1.768.100
SUBTOTALES:									**$ 1.768.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.768.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	22	$ 1.015.900	$ 0	$ 1.015.900
SUBTOTALES:			**$ 1.015.900**	**$ 0**	**$ 1.015.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005828283	MORENO NARANJO CRISTOFER DUVAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005848345	PERDOMO SANCHEZ ROBINSON DAMIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005848423	HOYOS DIAZ JOSE JAIR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1005848634	ARBELAEZ NIETO HAROLD	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005848808	BARRIOS MARTINEZ JOSE ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005848849	NARANJO CARDOZO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25															230301-PORVENIR	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.083.334		$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1005848884	MORENO MENDOZA WILSON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1006094932	RINCON PATIÑO JAIDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007667166	NARANJO MORENO JOSE ARMANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1054557702	GUTIERREZ CARDONA KRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 693.334		$ 48.300	16	$ 693.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1106482704	MORENO GUALTEROS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1106482764	TRIANA LOPEZ CARLOS MANUEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 63.400	21	$ 910.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7943352237**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	950193333

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS														CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1106484892	SANCHEZ VILLADA JOKSY ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667		$ 6.100	2	$ 86.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1106712399	NAVARRO SEGURA LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1106713856	SILVA RONDON GABRIEL ORLANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1110469827	LOZANO ARANZALES MAICOL DAMIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 63.400	21	$ 910.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1110527312	CULMA PATIÑO NELSON FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 14223742	MUÑOZ PAEZ ROMEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 5837476	MORENO SALOMON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 63.400	21	$ 910.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 5874742	TRIANA HERNANDEZ JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 80440122	RUEDA PEREIRA LUIS HENRY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 83234477	AVILA LADY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 7.655.000**

Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HUGO ALBERTO CALVO ECHEVERRIA identificado(a) con CC 8680183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HUGO ALBERTO CALVO ECHEVERRIA CC 8680183																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9475025389	2024110618 5521028106	I	2024-11-07	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9475025389	2024110618 5521028106	I	2024-11-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-13 a las 15:11.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5824544		DIAZ DIAZ DIEGO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12-270oficina401	IBAGUE-TOLIMA	2637743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	39648814	9476304958	I	2024/11/14	2024/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$6,800**		**$0**	**$0**		**$377,300**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$6,800**		**$0**	**$0**		**$377,300**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$6,800**		**$0**	**$0**		**$377,300**
1	CC	5824544 DIAZ DIEGO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5824544		DIAZ DIAZ DIEGO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12-270oficina401	IBAGUE-TOLIMA	2637743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	39648814	9476304958	I	2024/11/14	2024/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14241018		GARAY MORENO LUIS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 N 270 oficina 405	IBAGUE-TOLIMA	2637743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1032014018	9476707423	I	2024/11/07	2024/11/06	NEQUI	0	$855,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	14241018	GARAY LUIS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14241018		GARAY MORENO LUIS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 N 270 oficina 405	IBAGUE-TOLIMA	2637743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1032014018	9476707423	I	2024/11/07	2024/11/06	NEQUI	0	$855,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				**1**	**$855,000**	**$0**	**$0**	**$855,000**

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ERNESTO ARANAGA LONDOÑO identificado(a) con CC 14226887 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES NI 900336004																
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades							
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9473645068	949843021	2024-10-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								

Este certificado se expide el día 2024-11-19 a las 15:11.

PAGADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79893182		RAMOS SALAZAR JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 3 76 Oficina 507	IBAGUE-TOLIMA	2694886	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1063951707	9476939686	I	2024/11/22	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$438,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79893182	RAMOS JORGE																		230201	30	$1,510,000	$241,600	EPS005	30	$1,510,000	$188,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,510,000	$7,900	0	$0	$0	No	$438,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,510,000	$241,600			$1,510,000	$188,800			$0	$0			$1,510,000	$7,900		$0	$0		$438,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79893182		RAMOS SALAZAR JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 3 76 Oficina 507	IBAGUE-TOLIMA	2694886	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1063951707	9476939686	I	2024/11/22	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$438,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,600	$0	$0	$241,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$241,600	$0	$0	$241,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,800	$0	$0	$188,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$188,800	$0	$0	$188,800
TOTAL				1	$438,300	$0	$0	$438,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93375223
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93375223
APELLLIDOS:	RICO SANABRIA	NOMBRES:	HENRY
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7946784766	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.638.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.638.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 114.100	30	$ 1.638.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 507.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1110539630
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110539630
APELLLIDOS:	ORTIGOZA GIRALDO	NOMBRES:	JAIME ALEXANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7946784766	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.500.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000	1	$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.083.600

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1152686000
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1152686000
APELLLIDOS:	REYES AFANADOR	NOMBRES:	DIEGO ALEJANDRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7946784766	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.000.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 619.200

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038763861	9477165589	E	2024/11/06	2024/11/12	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$17,533,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (8 Afiliados)																						**$16,818,354**	**$2,691,500**			**$17,558,354**	**$684,700**			**$17,515,020**	**$682,900**			**$17,558,354**	**$1,165,400**		**$0**	**$0**	**$5,224,500**
Centro de Trabajo: 1 OPERATIVOS (8 Afiliados)																						**$16,818,354**	**$2,691,500**			**$17,558,354**	**$684,700**			**$17,515,020**	**$682,900**			**$17,558,354**	**$1,165,400**		**$0**	**$0**	**$5,224,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						**$16,818,354**	**$2,691,500**			**$17,558,354**	**$684,700**			**$17,515,020**	**$682,900**			**$17,558,354**	**$1,165,400**		**$0**	**$0**	**$5,224,500**
1	CC	1002300113	CHAPETA JHON								X									230301	30	$1,567,391	$250,800	EPS037	30	$1,567,391	$62,700	CCF24	30	$1,567,391	$62,700		30	$1,567,391	$109,100	30	$0	$0	$485,300
2	CC	83252604	CHAVARRO ALDEMAR								X									230301	30	$3,263,999	$522,300	EPS037	30	$3,263,999	$130,600	CCF24	30	$3,263,999	$130,600		30	$3,263,999	$227,200	30	$0	$0	$1,010,700
3	CC	75059524	CORTEZ ELIAS																	25-14	26	$2,120,855	$339,400	EPS037	26	$2,120,855	$84,900	CCF24	26	$2,120,855	$84,900		26	$2,120,855	$147,700	26	$0	$0	$656,900
4	CC	75059524	CORTEZ ELIAS												X					25-14	4	$326,286	$52,300	EPS037	4	$326,286	$13,100	CCF24	4	$326,286	$13,100		4	$326,286	$0	4	$0	$0	$78,500
5	CC	1085181250	LOPEZ JOSE								X									231001	29	$1,412,102	$226,000	EPS002	29	$1,412,102	$56,500	CCF24	29	$1,412,102	$56,500		29	$1,412,102	$98,300	29	$0	$0	$437,300
6	CC	1085181250	LOPEZ JOSE										X							231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF24	0	$0	$0		1	$43,334	$0	0	$0	$0	$8,800
7	CC	5836434	MENDOZA JOSE	X							X										0	$0	$0	EPS037	12	$740,000	$29,600	CCF24	12	$740,000	$29,600		12	$740,000	$51,600	12	$0	$0	$110,800
8	CC	79124248	ROMAN GILBERTO								X									25-14	30	$3,513,289	$562,200	EPS037	30	$3,513,289	$140,600	CCF24	30	$3,513,289	$140,600		30	$3,513,289	$244,600	30	$0	$0	$1,088,000
9	CC	1193570170	SANABRIA MIGUEL								X									230201	30	$1,516,478	$242,700	EPS041	30	$1,516,478	$60,700	CCF24	30	$1,516,478	$60,700		30	$1,516,478	$105,600	30	$0	$0	$469,700
10	CC	79666893	VEGA ALVARO								X									25-14	24	$2,604,620	$416,800	EPS037	24	$2,604,620	$104,200	CCF24	24	$2,604,620	$104,200		24	$2,604,620	$181,300	24	$0	$0	$806,500
11	CC	79666893	VEGA ALVARO									X								25-14	6	$450,000	$72,000	EPS037	6	$450,000	$0	CCF24	6	$450,000	$0		6	$450,000	$0	6	$0	$0	$72,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: MESETAS (2 Afiliados)																						**$4,816,957**	**$770,800**			**$4,816,957**	**$192,800**			**$4,816,957**	**$192,800**			**$4,816,957**	**$272,300**		**$0**	**$0**	**$1,428,700**
Centro de Trabajo: PUENTE SANTO DOMINGO (2 Afiliados)																						**$4,816,957**	**$770,800**			**$4,816,957**	**$192,800**			**$4,816,957**	**$192,800**			**$4,816,957**	**$272,300**		**$0**	**$0**	**$1,428,700**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						**$4,816,957**	**$770,800**			**$4,816,957**	**$192,800**			**$4,816,957**	**$192,800**			**$4,816,957**	**$272,300**		**$0**	**$0**	**$1,428,700**
12	CC	65708823	DONOSO JISSELL												X					230301	8	$586,667	$93,900	EPS002	8	$586,667	$23,500	CCF34	8	$586,667	$23,500		8	$586,667	$0	8	$0	$0	$140,900
13	CC	65708823	DONOSO JISSELL							X		X								230301	22	$1,637,247	$262,000	EPS002	22	$1,637,247	$65,500	CCF34	22	$1,637,247	$65,500		22	$1,637,247	$114,000	22	$0	$0	$507,000
14	CC	4149044	VEGA EDGAR								X									230301	26	$2,273,043	$363,700	EPS005	26	$2,273,043	$91,000	CCF34	26	$2,273,043	$91,000		26	$2,273,043	$158,300	26	$0	$0	$704,000
15	CC	4149044	VEGA EDGAR												X					230301	4	$320,000	$51,200	EPS005	4	$320,000	$12,800	CCF34	4	$320,000	$12,800		4	$320,000	$0	4	$0	$0	$76,800
Total		**Afiliados(10)**																				$21,635,311	$3,462,300			$22,375,311	$877,500			$22,331,977	$875,700			$22,375,311	$1,437,700		$0	$0	$6,653,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038763861	9477165589	E	2024/11/06	2024/11/12	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$17,533,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,462,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$233,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,442,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,543,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$242,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038763861	9477165589	E	2024/11/06	2024/11/12	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$17,533,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,437,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,437,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$875,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$192,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$682,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$877,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$565,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$147,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,800
TOTAL				**10**	**$6,653,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901826039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7946780752**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1029829718		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 735.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.000	$ 0	$ 735.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 0	$ 230.100
SUBTOTALES:										**$ 1.861.100**	**$ 0**	**$ 1.861.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 276.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 0	$ 0	$ 137.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 517.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 517.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 900.200	$ 900.200	$ 0	$ 0	$ 900.200
SUBTOTALES:									**$ 900.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 900.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	9	$ 517.400	$ 0	$ 517.400
SUBTOTALES:			**$ 517.400**	**$ 0**	**$ 517.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28554915
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELA MARIA VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO JORDAN	TELÉFONO:	3124886
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**2330992210**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	39649163

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 28554915	VANEGAS ANGELA JOHANA	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500				$ 0	$ 0	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 396.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7947298636**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1031618893

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.087.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.087.000	$ 0	$ 2.087.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 2.919.000**	**$ 0**	**$ 2.919.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 260.000
EPS041	NUEVA EPS CM	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 209.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.800	$ 0	$ 0	$ 209.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:													**$ 781.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 781.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.360.600	$ 1.360.600	$ 0	$ 0	$ 1.360.600
SUBTOTALES:									**$ 1.360.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.360.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	16	$ 781.800	$ 0	$ 781.800
SUBTOTALES:			**$ 781.800**	**$ 0**	**$ 781.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																						
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005828283	MORENO NARANJO CRISTOFER DUVAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005848345	PERDOMO SANCHEZ ROBINSON DAMIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005848423	HOYOS DIAZ JOSE JAIR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1005848634	ARBELAEZ NIETO HAROLD	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005848808	BARRIOS MARTINEZ JOSE ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005848884	MORENO MENDOZA WILSON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1006094932	RINCON PATIÑO JAIDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1007667166	NARANJO MORENO JOSE ARMANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1106482704	MORENO GUALTEROS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1106712399	NAVARRO SEGURA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1106713856	SILVA RONDON GABRIEL ORLANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1110527312	CULMA PATIÑO NELSON FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7947298636**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1031618893

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																													
13	CC 14223742	MUÑOZ PAEZ ROMEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI																															EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 5874742	TRIANA HERNANDEZ JOSE LEONEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		01																230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	NUEVA EPS CM	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 80440122	RUEDA PEREIRA LUIS HENRY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 83234477	AVILA LADY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.843.200**

Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DANIEL MOYA ROBAYO identificado(a) con CC 3192972 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S NI 900641841																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9475433032	983103934	E	2024-10-16	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9475433032	983103934	E	2024-10-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9475433032	983103934	E	2024-10-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9475433032	983103934	E	2024-10-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-13 a las 14:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO URREGO HOYOS identificado(a) con CC 79939277 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S NI 900641841																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9475433032	983103934	E	2024-10-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9475433032	983103934	E	2024-10-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9475433032	983103934	E	2024-10-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9475433032	983103934	E	2024-10-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-13 a las 14:11.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93407404	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA	CALLE 62 6 60	2688235	ricardopiragua01@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	05/11/2024	81118997	$1.044.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	450.000	0		0		0	0	0	0	450.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.800				18.800	0	0	18.800			188	18.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	450.000	450.000
Pensión	1	576.000	576.000
Riesgos Laborales	1	18.800	18.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.044.800	1.044.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93407404	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA		CALLE 62 6 60	2688235	ricardopiragua01@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	05/11/2024	81118997	$1.044.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93407404	PIRAGUA ROA FRANKLIN RICARDO	59	0			N																	25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS002	3.600.000	450.000	14-23	3.600.000	1	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 2736167
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2736167		
APELLLIDOS:	LAMAZA VEGA	NOMBRES:	SIXTO MANUEL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7946834501	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.338.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 724.100

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5821057
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5821057
APELLLIDOS:	RIOS CORREDOR	NOMBRES:	JAIRO ALONSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7947289181	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	06/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	2030 - PAVETOL

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.938.000																		230201-PROTECCION	30	$ 1.938.000	$ 310.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.938.000	$ 77.600	$ 0	$ 77.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.938.000		$ 134.900	30	$ 1.938.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 600.200

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7060819
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7060819
APELLLIDOS:	VILLALOBOS GUTIERREZ	NOMBRES:	MIGUEL ANTONIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7946834501	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES					
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.500.000																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 774.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13991970
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901830951
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					PAVETOL CONSTRUCCIONES Y TRASPORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE	DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 415 EDIFICIO E	TELÉFONO:			2637743
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		13991970
APELLLIDOS:		SOSA GONZALEZ	NOMBRES:		JUAN CARLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE	DEPARTAMENTO:		TOLIMA
TIPO COTIZANTE:		DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:		NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO DE SALARIO:		FIJO			
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI

PLANILLA No:	7947289181	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	06/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	2030 - PAVETOL

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.938.000																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.938.000	$ 310.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.938.000	$ 77.600	$ 0	$ 77.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.938.000		$ 134.900	30	$ 1.938.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 600.200

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 65753684
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65753684		
APELLLIDOS:	LOPEZ SANCHEZ	NOMBRES:	GLORIA ASTRID		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7946834501	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.600.000																		230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	1	$ 181.000	30	$ 2.600.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 805.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93392253
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901710657
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL OGG RO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N.2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93392253
APELLLIDOS:	RODRIGUEZ CALDERON	NOMBRES:	JOSE ADAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7946597079	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	02 - INFRAESTRUTURA VIAL OGG-RO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.638.000																		230301-PORVENIR	30	$ 1.638.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 114.100	30	$ 1.638.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 507.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93402894
DESDE OCTUBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93402894		
APELLLIDOS:	ORTIGOZA LEAL	NOMBRES:	GUILLERMO ALEXANDER		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7946834501	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	05/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.338.000																		230301-PORVENIR	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 724.100

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

ANEXO No. 03

CONTROL DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

ALDEIC S.A.S BIC	GOBERNACION DEL TOLIMA MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 5	@gobertolima www.tolima.gov.co	INFORME Nº	5		
			PERIODO	11/10/2024 AL 10/11/2024		
			PAGINA	1	DE	1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698	ALDEIC SAS BIC	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

PERSONAL / DÍA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA Claudia Alicia Alfaro de Los Rios																														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Diana Esperanza Riveros	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Jerson Said Lazaro Suarez	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Hildebrando Ciendua	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Teofilo Carlos Yidi	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Diego Ernesto Dueñas Puentes	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Andres Galarza Guzman	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA AMBIENTAL Claudia Alicia Alfaro de Los Rios	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN VIAS Nestor Espinosa Niño	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
INGENIERO DE APOYO Jhoan Sebastian Tellez Torres	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA Alvaro Ferraro Hernandez	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
PROFESIONAL HSEQ Paula Dayana Castiblanco	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
LABORATORISTA Edgar Gomez	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
TOPOGRAFO Marco Aurelio Murcia	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
DIBUJANTE Segio Guarin	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
SECRETARIA Nidia Gomez	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
CADENERO Olga Rodriguez	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
CADENERO Jhon Franco	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
CONDUCTOR Wilson Yovanny Arias Martinez	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
Total	18	18	0	0	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	0	0	18	18	18	18	18	0

Firma
Nombre: Paula Dayana Castiblanco
Profesional HSEQ

Firma
Nombre: Jerson Said Lazaro
Residente de Interventoría

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39691684
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 18 N° 116-24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7947727200**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1095907042	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 906.300	$ 0	$ 0	$ 28.400	$ 28.400	$ 0	$ 0	$ 963.100	$ 0	$ 963.100
SUBTOTALES:										**$ 963.100**	**$ 0**	**$ 963.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 708.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.100	$ 0	$ 0	$ 708.100
SUBTOTALES:													**$ 708.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 708.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 29.600	$ 29.600	$ 0	$ 0	$ 29.600
SUBTOTALES:									**$ 29.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD					ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39691684	ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 5.664.191				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 5.664.191	$ 906.300	$ 28.400	$ 28.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 963.100	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 5.664.191	$ 708.100	$ 0	$ 708.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 5.664.191	39691684	$ 29.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.700.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51936744
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 65A # 17 - 56	TELÉFONO:	7731989
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7947307392**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1093670030

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 570.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 570.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860041968
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 N° 116-24	TELÉFONO:	2136402
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	CIA-285 - PUENTE VENADILLO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7948474292**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1096594445

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.760.000	$ 0	$ 1.760.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 1.984.000**	**$ 0**	**$ 1.984.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 56.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 440.000
SUBTOTALES:													**$ 496.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 496.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 863.100	$ 863.100	$ 0	$ 0	$ 863.100
SUBTOTALES:									**$ 863.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 863.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	4	$ 496.000	$ 0	$ 496.000
SUBTOTALES:			**$ 496.000**	**$ 0**	**$ 496.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860041968
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 N° 116-24	TELÉFONO:	2136402
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	CIA-285 - PUENTE VENADILLO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7948398261**	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1096563029

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79429941	GALARZA GUZMAN JUAN ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 79542726	ESPINOSA NINO NESTOR ANIBAL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 754.600**

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA con documento NIT 860041968, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOHN ALBERTO FRANCO BOTTIA con documento CC 79316775, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7951306783	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/02	Número de Autorización	1094221131

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF21 - CAFAM	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA con documento NIT 860041968, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ con documento CC 53094244, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7951306783	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/02	Número de Autorización	1094221131

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF21 - CAFAM	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA con documento NIT 860041968, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OLGA RODRIGUEZ CANGREJO con documento CC 35507550, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7951306783	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/02	Número de Autorización	1094221131

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF21 - CAFAM	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA con documento NIT 860041968, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JHOAN SEBASTIAN TELLEZ TORRES con documento CC 1026588218, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7951306783	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/02	Número de Autorización	1094221131

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF21 - CAFAM	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ALDEIC SAS BIC con documento NIT 901529306, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) SERGIO STEVEN GUARIN CALDAS con documento CC 1054683430, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7951309022	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/02	Número de Autorización	1094259340

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF21 - CAFAM	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA identificado(a) con CC 1083912902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1100716046	9478508086	E	2024-12-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,927,160	$468,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,927,160	$203,800
CCF	COMFACA	30	4%	$2,927,160	$117,100
EPS	SANITAS	30	4%	$2,927,160	$117,100

Este certificado se expide el día 2024-12-06 a las 10:14.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL	AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	04/12/2024	82290910	$770.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	15.600	0	0	15.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	325.000	325.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	15.600	15.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	770.200	770.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL		AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	04/12/2024	82290910	$770.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79795367	YIDI VILLARREAL TEOFILO CARLOS	59	0			N																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	325.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	15.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 04

CONTROL E INSPECCIÓN Y ENSAYOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698

CONTRATISTA: ALDEIC SAS BIC

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. ORDEN	ESPECIFICACIÓN						
	DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. MUESTRAS	RANGO CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE OBTENIDO%	OBSERVACIÓN /ACCIONES
1	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTES PLACA AGUAS ARRIBA LADO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	113,4%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
2	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTES PLACA AGUAS ARRIBA LADO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	114,5%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
3	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTES PLACA AGUAS ARRIBA LADO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	132,5%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
4	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTES PLACA AGUAS ARRIBA LADO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	130,4%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
5	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE ESTRIBOS AGUAS ABAJO PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	74,6%	RESULTADO A LOS 7 DIAS
6	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE ESTRIBOS AGUAS ABAJO PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	118,6%	RESULTADO A LOS 14 DIAS
7	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE ESTRIBOS AGUAS ABAJO PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	152,5%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
8	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE ESTRIBOS AGUAS ABAJO PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	153,6%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
9	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO ESTRIBO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	77,8%	RESULTADO A LOS 21 DIAS
10	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO ESTRIBO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	77,3%	RESULTADO A LOS 21 DIAS
11	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO ESTRIBO AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	109,8%	RESULTADO A LOS 28 DIAS
12	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE AGUAS ARRIBA PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	84,2%	RESULTADO A LOS 14 DIAS
13	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE AGUAS ARRIBA PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	92,6%	RESULTADO A LOS 21 DIAS
14	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE ESTRIBO AGUAS ARRIBA PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	66,3%	RESULTADO A LOS 14 DIAS
15	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE ESTRIBO AGUAS ARRIBA PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	103,2%	RESULTADO A LOS 21 DIAS
16	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE PLACA AGUAS ABAJO PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	127,7%	RESULTADO A LOS 10 DIAS
17	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO PILOTE DE PLACA AGUAS ABAJO PALOBAYO	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	128,9%	RESULTADO A LOS 14 DIAS
18	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO VIGA DE APROCHE AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	72,7%	RESULTADO A LOS 7 DÍAS
19	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS EN CONCRETO VIGA DE APROCHE AMBALEMA	INV E-410 - 2023	CANTERA LA CAIMA	1	4000 PSI 100 %	75,0%	RESULTADO A LOS 14 DIAS

FIRMA:

Nombre: Jerson Said Lázaro Suárez

Residente de Interventoría

ANEXO No. 05

CONTROL EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA

ALDEIC S.A.S BIC	**GOBERNACION DEL TOLIMA.** **MANUAL DE INTERVENTORÍA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA. Nº 5**	@gobertolima www.tolima.gov.co	INFORME Nº	5
			PERIODO	11/10/2024 AL 10/11/2024
			PAGINA	1 DE 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698	CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
	CONTRATISTA INTERVENTORIA:	ALDEIC SAS BIC	

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MÁQUINA / DÍA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Excavadora sobre Oruga Hyundai 150C	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Compresor Neumatico	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Planta electrica	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Compresor Neumatico	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Carmix DIECI (carro hormiguero) L3500	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Carmix DIECI (carro hormiguero) L3500	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Camioneta de estacas DIMAX ICL610	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I
Carrotanque de agua International WFV172	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I
Motosierra MS310	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Martillo Neumatico	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Pulidora 6A-9020	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Oxicorte	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Volqueta dobletroque TGU480	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I
Volqueta dobletroque SOP507	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I
Volqueta dobletroque USE683	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I
Volqueta dobletroque USE257	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I
Grua Telescopica	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Vibro compactador doble rodillo 2 Ton	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I
Vibro compactador de concreto	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I
Total	8	8	0	8	8	9	9	8	10	0	8	9	9	8	8	8	0	8	8	8		8	8	0	0	8	10	8	8	8	0

CONVENCIONES ACTIVO = A REPARACION = R INACTIVO = I	La inactivdad de la maquinaria reportada en este formato se debe a que no se requeria la maquinaria todo el mes o se usaba cuando se requeria para las actividades inherentes de la obra	Firma Nombre: Jerson Said Lázaro Suárez Residente de Interventoría



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 126987

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC660819	SHANTUI	SE75	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	66SE07EJNP0014499

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO Y NEGRO	CNE2841	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7650 Kg	2680 mm	2250 mm	6240 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSTRUBERNAL MAQUINARIA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.216.594



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL DE SOACHA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
07-02-2024	07-02-2024	** ****

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000304048	22/07/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700003621 7

COSMOCOLOR-TM-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 121284

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC684016	HYUNDAI	R215VS	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HJSCN6AEKM0008737

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO NEGRO	90191224	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
20700 Kg	2990 mm	2800 mm	9510 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BARRIOS VARON EDUVIN ALBERTO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 93.379.434

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA-GRAN SUBASTA SAS

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
28-09-2023	28-09-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000332137	08/08/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700037169

COSMOCOLOR-TM-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 114922

No. DE REGISTRO: MC630158	MARCA: HYUNDAI	LINEA: H940C	AÑO MODELO: 2023
TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION	CLASE: RETROEXCAVADORA	No. SERIE: HHKHUF01CU0001570	
COLOR(ES): AMARILLO	No. MOTOR: RG75486*B049578H	RODAJE: NEUMATICOS	

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO: 8230 Kg	ALTO: 3680 mm	ANCHO: 2250 mm	LARGO: 7080 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ORTIGOZA GIRALDO RICARDO JOSE Y OTRO(S).

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.110.587.017

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO: 11-05-2023	FECHA EXPEDICIÓN: 11-05-2023	FECHA VENCIMIENTO: ******
ORIGEN: IMPORTACIÓN	DEC. IMPORTACIÓN: 352023000118676	FECHA DE LEVANTE: 15/03/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000034244

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT. 890903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia
Teléfono: 57 4 - 3606161
www.navitrans.com.co

Sede de Venta: Cra 48 Sur No 92 65 , IBAGUÉ - COLOMBIA, Tel:2690195
Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26 de 2022
Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIIU 4511. Tarifa 0.40%
En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
En Medellin somos Autorretenedore
Autorización numeración de facturación No. 18764038099687 del 2022-10-19 vigente hasta 2024-04-19 del TOLD130001 al TOLD150000
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

ORTIGOZA GIRALDO JAIME ALEXANDER
NIT/Cédula: 1110539630-0
TV 19 A SUR 125 134 B RESERVAS DEL CAMPESTRE ZN 4 CA 2 - IBAGUÉ, TOLIMA, COLOMBIA
Teléfono:
Tercero Relacionado: ORTIGOZA GIRALDO JAIME ALEXANDER
Email: jaimeortigoza7@gmail.com
Condición Pago: Contado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
TOLD133300	09/05/2023 12:31:26	09/05/2023	OV-3345243	58043797	1 de 1

MARCA	PLACA	LÍNEA	MODELO	CANTIDAD (UND)	TIPO DE MOTOR	A. MODELO
HYUNDAI		H940C	H940C	1.00 (94)	MOT-5	2023
Nº MOTOR	**FECHA MFTO**	**LEVANTE**	**No. ADHESIVO DE PAGO**	**SERIE No.**	**VIN**	**COLOR**
RG75486*R049578H	15/03/2023	352023000107398	92352300566611		HHKHU601CU0001570	
CÓDIGO	**DESCRIPCION**		**VALOR UNITARIO**	**DIVISA**	**TOTAL**	
H940C	RETROEXCAVADORA H940C		380.378.541,18	COP	380.378.542,00	

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION		PORCENTAJE	VALOR
1110539630	ORTIGOZA GIRALDO JAIME ALEXANDER	50,00	190,189,271.00
1110587017	ORTIGOZA GIRALDO RICARDO JOSE	50,00	190,189,271.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES:
TRM $ 4.490,58 // 9 MAY 2023.

Forma Pago : Instrumento no definido

%IVA	BASE	IMPUESTO
IVA 19,00%	380.378.542,00	72.271.922,00

SUBTOTAL	380.378.542,00
DESCUENTO	
IVA	72.271.922,00
IMPOCONSUMO	
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA COP	452.650.464,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses, Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:9a8154d3fc3e3d61112c6499bfddcdda193a32330ebb9baa590330cb00eb234637c56b8ad2231e374f64be47d0f80a56

Fecha de Validación: 2023-05-09 12:33:08-05:00
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar esta formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352023000118676-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890903024	1	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 11 SUR CR 50 50	3787077	35	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800143377	7	AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A - NIVEL1	26	0176

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
31380923	Virginia Mosquera Moreno

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25136	No. 116575013217183	2023 - 03 - 08	No. ESSAPUS23020959	2023 - 02 - 15

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD	SEOUL	190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
12TH FL., HYUNDAI BLDG. 75, YULGOK-RO, JONGNO-GU	82-2-2038-6456

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
CV23BAS0116004	2023 - 02 - 09	190	1	434	5	MAERSK COLOMBIA S.A	4,748.61

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429590000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
02	01	190	7,164.00		7,162.00		YY	48	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
62,980.00	1,858.30

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
30.47	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,888.77	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
64,868.77	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 308,036,490	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 308,036,490	99 58,527,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 58,527,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serieles y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

CÓDIGO OEA IMPORTADOR NO: OE0374 DO: M0260825MDE-BUN PEDIDO NRO MAQ20230004-H - HYUNDAI 0129 DECLARACION 6 de 6 // RESOLUCIÓN NO. 005742 DEL 14/07/2022, POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S COMO OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO PARA EL TIPO DE USUARIO IMPORTADOR // NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 272 DE2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; DECRETO NÚMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2// Nro. Factura CV23BAS011 6004 - 09/02/2023 - - ITEM NRO 6 NÚMERO DE CHASIS/NUMERO VIN: HHKHU601CU0001570, NÚMERO DE MOTOR: RG75486*R049578H, MODELO/LINEA/ REFERENCIA: H940C, PRODUCTO: RETROEXCAVADORA, MARCA: HYUNDAI,ANO MODELO: 2023, COLOR: AMARILLO, USO O D(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352023000118676 133. Feha: 2023 03 15

134. Levante No. 352023000107398	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 03 - 15		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352300566611 Fecha presentación 2023-03-15 15:42:11 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-03-15 15:57:09

20230316811464

ISO 9001:2008
Calle 20A Sur No. 22ª 67
Medellín - Colombia
www.spectrum.com.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 105935

No. DE REGISTRO MC035278	MARCA DIECI	LINEA L3500	AÑO MODELO 2015
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE AUTOHORMIGONERA		No. SERIE H6820820
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 1024354		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
12000 Kg	3550 mm	2330 mm	5030 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ARANAGA LONDOÑO JULIO ERNESTO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 14.226.887



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
13-09-2023	13-09-2023	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352023000332121	28/07/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000035973

COSMOCOLOR TM-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 109579

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC612744	DIECI	L3500	2012

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	AUTOHORMIGONERA	LH6820348

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	0912979	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6150 Kg	2915 mm	2330 mm	5030 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA S.A.S	NIT 901.495.253

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
13-01-2023	13-01-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482012000488221	07/11/2012



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000032598

COSMOCOLOR-TM-22

MAQUITIERRA S.A.S.
NIT. 900.857.515-4
CALL 106 NO 54-93 OF 209 Tel.4672010
PBX 4672010 Cel.3506322247
www.maquitierra.com
administracion@maquitierra.com

FACTURA DE VENTA No. FA-MT- 206

Régimen común-Act Econ 4659 No somos Autorretenedores,Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a un título valor según lo establecido en la ley 1231 de 2008, artículos 774 Cod.de comercio.

Resolución DIAN No. 18672004033348 de 14/07/2017 Rangos: 39 al 10000

CLIENTE	LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NIT	14225605 3		Carlos Javier León Beltrán	Contado
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
CL 12 2 70 Of 405	Ibagué	2639103	23-ago-18	23-ago-18

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
VIBRO COMPACTADOR RD 16-100 SERIE 20287897	1,00	65.546.219	19%	65.546.219

VALOR EN LETRAS

SETENTA Y OCHO MILLONES UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	65.546.219
DESCUENTO	0
IVA	12.453.782
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	78.000.001

Firma Responsable NIT 900.857.515 Recibido Por

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE MAQUITIERRA S.A.S O CONSIGNAR - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No 467-866900-72

Despues de su vencimiento esta factura causará interes de mora a la tasa maxima legal vigente, sin prejuicio de los demás efectos legales por incumplimiento en el pago. las mercancias viajan por cuenta y riesgo del comprador.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872016000039285-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900790547	1	WACKER NEUSON BOGOTA S.A.S.

13. Direccion	15. Teléfono	12. Cod. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cod. Ciudad Municipio
CR 69 L 64 43	4929544	87	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860402363	4	AGENCIA DE ADUANAS TRASLADOS INTERNACIONALES S A S NIVEL 2	26	0224

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
7215263	BALLESTEROS SANTOS MARIO ALBERTO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Deposito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
BAQ	13901	No. 116575006019504	2015 - 04 - 07	No. ECCI-MIA-COBAQ-04-621235	2015 - 03 - 25

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.Pais Exportador
WACKER NEUSON LOGISTICS AMERICAS LLC	GERMANTOWN	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
W180N11691 RIVER LANE GERMANTOWN WI 53022	262-255-7177

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. pais procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Codigo de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
4130004594	2015 - 10 - 29	249	1	580	11	GLOBAL SHIPPING AGENCIES SA	3,203.03

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. pais de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429400000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	1,156.29	1,040.74	PK	65	7	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
19,271.18	512.71

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
64.22	110.26

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
687.19	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
19,958.37	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cod Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 63,927,258	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 63,927,258	99 10,228,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124	
		Total	125 10,228,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO M160287013 ,PEDIDO ECCI-MIA-COBAQ-04-621235 DECLARACION 5 DE 7;FACTURA(S):4130004594;/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DE 2013 MER CANCIA QUE NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION, MERCANCIA NUEVA/ PRODUCTO RODILLOS TANDEM ,REF: 0620402,MARCA WACKER NEUSON , 1 U NIDAD , MODELO: ROLLER RD 16 - 100, USO O DESTINO: CONSTRUCCIÓN, COMPACTACIÓN DE ASFALTO. MAQUINA RODILLO APLANADOR, MODELO ROLLE R, RD16-100, REV 233, KG 1533, LBS 3379, KW 16.8, HP 22.5, CONMOTOR KOHLER, MODELO KDW 1003, RPM 2650,,SERIAL 4407801360, SPEC PX -XDW1003-5003A, REF:0620402, SERIAL: 20287897 XXXXXXXXXXXXXX

RD 16-90
Rodillos vibratorios hidrostáticos
Código de artículo 0620060



Rodillo de alta calidad con desempeño máximo de compactación

El rodillo RD 16 de Wacker Neuson incluye accionamiento en ambos tambores para ofrecer máxima tracción y dirección articulada para un control de gran precisión. La unidad con motor diesel ofrece vibración en los dos tambores para un asfalto de alta calidad. Un excelente rendimiento general del rodillo y una alta frecuencia del excitador permiten la compactación a velocidades mayores, al mismo tiempo que una cobertura uniforme y resultados excelentes.

Ficha técnica

Descripción	Métrico		Imperial	
Peso (en seco)	1.356	kg	2.990	lb
Peso de servicio (con operario (79 kg) y medio tanque con agua)	1.485	kg	3.274	lb
Diámetro tambores adelante/atrás	560	mm	22	in
Ancho tambores adelante/atrás	900	mm	35,4	in
Largo x ancho x alto (l x a x h)	1.950 x 1.000 x 2.545	mm	76,8 x 39,4 x 100,3	in
Altura vertical libre (der./izq.)	400	mm	15,7	in
Saliente lateral (der./izq.)	45/45	mm	1,9/1,9	in
Contenido tanque de agua	100	l	26,4	US gal
Peso de transporte (con embalaje)	1.436	kg	3.165	lb

Dimensiones de transporte	2.025 x 1.085 x 1.975	mm	79,8 x 42,6 x 77,7	in
Tipo de motor	Motor diesel refrigerado a líquido Lombardini LDW 1003			
Cilindrada	1.028	cm^3	62,7	in^3
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046	20,0	kW	26,8	hp
con	3.600	1/min	3.600	rpm
Potencia de trabajo	16,5	kW	24,5	hp
con	3.000	1/min	3.000	rpm
Consumo de combustible	3,6	l/h	1,0	US gal/h
Capacidad tanque de combustible	23	l	6,1	US gal
Sistema eléctrico	12	V	12	V
Número de tambores vibrantes	2			
Fuerza centrífuga por tambor	15	kN	3.400	lb
Frecuencia	70	Hz	4.200	Hz
Presión linear dinámica por tambor	16,7	N/mm	96	lb/in
Profundidad de compactación asfalto	10	cm	4	in
Velocidad de avance y retroceso (infinitamente variable)	0-9,3	km/h	0-5,8	mph
Velocidad de avance y retroceso (infinitamente variable)	0-155	m/min	0-510	ft/min
Capacidad de ascenso	30	%	30	%
Radio de giro exterior	2,92	m	9,5	ft
Máximo rendimiento superficial	8.386	m^2/h	90.270	ft^2/h

Las especificaciones pueden variar debido al continuo desarrollo de los productos.

Características y ventajas

- Sistema de rociado presurizado con flujo de agua constante. Un temporizador de ocho posiciones permite que el operario ajuste el flujo de agua según las condiciones existentes.
- El diseño de la máquina elimina sobresalientes laterales. La unidad fácil de maniobrar permite compactar el asfalto al ras y hasta el borde.
- La plataforma trasera y la cubierta del motor delantera abatibles hacia arriba facilitan el acceso y el mantenimiento de la máquina.
- El RD 16, que cumple con la directiva CE, incluye un motor diesel Lombardini fiable, que ofrece un alto rendimiento y una estructura antivuelco abatible estándar para facilitar el transporte y el almacenamiento.
- La plataforma del operario, de diseño ergonómico, está equipada con un asiento con suspensión totalmente ajustable para máxima comodidad. Asimismo, la cubierta inclinada del motor proporciona una excelente visibilidad.
- Diseñado para compactar capas base y de acabado del asfalto, así como material granular de sub-base en áreas confinadas. Ideal para estacionamientos, entradas para automóviles y trabajos en banquinas.

Contenido de entrega

- Incluye manual de operación y lista de repuestos.

Para encontrar al representante Wacker Neuson más cercano a su localidad, por favor visite nuestro sitio en Internet www.wackerneuson.com

© 2010 Wacker Construction Equipment AG

Rodriguez y Londoño S.A.
BOGOTA EQUIPO
Av Calle 80 116B - 01
(57 -1) 5936830
890928551-1

Página 1 de 1

RMBOG - REMISION MERCANCIA

Número: **38209**
Fecha: 20-jun.-2024
Vencimiento: 20-jun.-2024

Original

Señores:
ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA S.A.S

Atención : ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA S.A.S

CL 12 2 70 OF 405 ED EL MOLINO BRR CENTRO
Ibagué SubZona: Bogotá D.C Zona Centro
Tel. 3124054651 3115917686
Nit: 901496253 - 9 Asesor: HUGO ALBERTO DIAZ SALAZAR

Referencia:	PD/ID 167903
Referencia Ped.	
Vehículo:	2023 ATLAS COPCO EQUIPO UTILITARIO XAS88KD CC

Código	Descripcion	Cantidad	Valor Und	% Dcto	% Iva	Valor Total
XAS88KD-2023 WUP250813	2023 ATLAS COPCO EQUIPO UTILITARIO XAS88KD COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL, ATLAS COPCO, MODELO XAS88KD	1	57,750,000.00		19.00	57,750,000.00

Ubica 1:

Subtotal $ 57,750,000.00

Rte Fte: -1.443.750,00 Rete Rete Rete Rete

Valor Neto	$ 57,750,000.00
Iva	$ 10,972,500.00

Notas: Entrega del equipo en Ibague

Total a Pagar **$67,278,750.00**

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100

Id Doc: **979232** 20-jun.-2024 Forma de Pago: CREDITO 08 DIAS CLIENTES

Fecha Recibe Acepto, firma y sello

www.advance.ms

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352024000212215-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890923691	1	RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV CL 80 116 B 61	5938830	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830147508	2	AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A NIVEL	26	476

29. Número documento de Identificación	30. Apellidos y nombres
38470953	BALANTA ARIZALA ANYELA YESENIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907059288	2024 - 04 - 29	No. SHP0133284	2024 - 03 - 13

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ATLAS COPCO (WUXI) COMPRESSOR CO.,LTD.	WUXI	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
No.22, Changjiang Road,New District,Wuxi, Jiangsu,	510 8521 1410

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
255751	2024 - 03 - 11	215	1	351	76	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3.964.59

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8414409000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215		5.570.00		5.013.00	PK	8	1	u	8.00

78. Valor FOB USD [redacted]

79. Valor fletes USD [redacted]

80. Valor Seguros USD [redacted]

81. Valor Otros Gastos USD

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD [redacted]

83. Ajuste valor USD [redacted]

84. Valor aduana USD [redacted]

85. Código registro o licencia	86. Número
X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 [redacted]	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 [redacted]	99 [redacted]	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 [redacted]		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DECLARACION 1 DE 1; D.O. 143-24-IMP CODIGO UTS B00194 PEDIDO ATLAS 204 DO CUSTOM 03-6518-0424-1 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION. MERCANCIA NUEVA Y EN BUEN ESTADO/// MERCANCIA CON INSPECCION PREVIA /// UBICACION ZONA FRANCA CELPA DEPOSITO LOGICOMER SAS // ///// REFERENCIA: 8161005197, PRODUCTO: COMPRESOR DE AIRE CON ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO, MARCA: ATLAS COPCO, AÑO FABRICACION: 2023, MODELO: XAS88KD /XAS88, SERIAL MAQUINA: WUP250798, SERIAL MOTOR: 1PL4284 // SERIAL MAQUINA: WUP250799, SERIAL MOTOR: 1PL4435 // SERIAL MAQUINA: WUP250800, SERIAL MOTOR:1PL4432 // SERIAL MAQUINA: WUP250801, SERIAL MOTOR:1PM7968 // SERIAL MAQUINA: WUP250797, SERIAL MOTO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352024000212215 133. Feha: 2024 04 30

134. Levante No. 352024000196790	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 04 - 30		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352401031554 Fecha presentación 2024-04-30 15:39:33 Valor pagado $0.00

Fecha de Impresión: 2024-05-01 18:33:39

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352024000212215-1**
Subpartida : **8414409000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, señales y otros)

R: 1PL5106 // SERIAL MAQUINA: WUP250813, SERIAL MOTOR:1PM7608 // SERIAL MAQUINA: WUP250814, SERIAL MOTOR: 1PM7606 // SERIAL MAQUINA: WUP250815, SERIAL MOTOR: 1PL4433 // MARCA MOTOR: KUBOTA // USO O DESTINO: EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MINERIA, POTENCIA: 32.5 KW (44 HP), TIPODE COMPRESOR: TORNILLO, PRESIÓN: 7 BAR (105 PSI), SISTEMA MOTRIZ: MOTOR DIESEL, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: AGUA. DATOS FACTURA: XAS88 KD SQE, REFERENCIA FABRICA, TRAILER, PATA DE APOYO, FILTRO COMBUSTIBLE ADICIONAL, CANTIDAD: 8 UNIDAD /// FACTURA 255751 DE 11/03/2024XXXX

RYLSA DESDE 1979
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.
NIT. 890.923.691-1

SOLUCIÓN INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE SU OBRA

ACTA DE ENTREGA No. 0031-24
EQUIPO ELU

A los (22) días del mes de Junio 2024 en la cuidad de Ibague, se hace entrega de (1) COMPRESOR DE AIRE PORTATIL MARCA ATLAS COPCO MODELO XAS88KD Con serial No WUP250813 a la empresa ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA S.A.S. Identificada con Nit 901.495.253. El equipo es nuevo y esta 100% operativo el cual se recibe a satisfacción por parte del cliente. El equipo cuneta con la siguiente configuración:

MARCA	ATLAS COPCO
MODELO	XAS 88 KD HARDHAT
MARCA MOTOR	KUBOTA
MODELO MOTOR	V1505-T
TIPO MOTOR	DIESEL 45 HP
CAPACIDAD	177 CFM A 100 PSI
RANGO DE PRESION OPERACIONAL	Normal 100 PSI – 7 Bar
UNIDAD	Tipo Tornillo
PESO	740 Kg.

El equipó cuenta con la garantía técnica del distribuidor. Esta garantía está sujeta al cumplimiento de los mantenimientos rutinarios según manual de operación, exclusivamente con repuestos originales y mano de obra de Rodriguez y Londoño. - Los costos de mano de obra, traslado, repuestos, aceites para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo son asumidos directamente por el cliente.

Entrega:

RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.
NIT. 890.923.691-1

Recibe:

ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.495.253



TERMINOS DE GARANTIA

COMPRADOR: Ortigoza Ingeniera SAS

NIT: _____

EQUIPO: Compresor XAS88KD

N ° DE SERIE: WUP250813

FECHA DE LA VENTA: _____

FECHA DE ENTREGA TÉCNICA: _____

1. Atlas Copco, garantiza el producto arriba descrito de acuerdo con las siguientes condiciones:

2. El período de la Garantía es de 12 (doce) meses o 2.000 horas el equipo en general, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de la Entrega del equipo. Garantia de Motores: Para equipos con Motor Cummins tiene cobertura de 24 (Veinticuatro) meses ó 2000 horas, para motores Kubota de 12 (Doce) meses o 750 horas, para motores Kohler 24 (Veinticuatro) meses ó 1000 horas, lo que ocurra primero a partir de la fecha de la entrega del equipo. Si el equipo no fuera puesto a trabajar inmediatamente, podrá ser almacenado hasta 6 (seis) meses. Pero, para esto, el propietario deberá informar por escrito a Atlas Copco por medio de RYLSA. Durante este período de almacenaje prolongado, el propietario deberá hacer todas las medidas de mantenimiento. Estas medidas están en el manual de mantenimiento del producto, en el capítulo llamado "Almacenaje por periodos prolongados". Después de 6 meses de almacenaje, empezara a computarse el período de la garantia, tenga o no hecha la Entrega Técnica. Atlas Copco no será responsable por alquiler de equipos satélite y/o prejuicios ocurridos por lucros cesantes.

3. Durante el período de la garantía, el propietario deberá hacer las 5 revisiones, de acuerdo con el horómetro o el período (lo que ocurra primero): la primera, llamada Entrega Técnica, con la que empieza el período de la garantía. La segunda, con 50 horas (o en la primera semana) de trabajo del equipo. La tercera, con 250 horas (o en el final del primer mes) de trabajo. La cuarta con 500 horas (o al final del primer trimestre) de trabajo. La quinta con 1000 horas (o al final del primer semestre) de trabajo.

4. Atlas Copco garantiza la calidad de sus productos, si la aplicación del equipo está de acuerdo con las instrucciones de los manuales de manejo y mantenimiento.

5. Las piezas reclamadas en garantía deberán ser encaminadas al distribuidor Atlas Copco para análisis. La pieza sustituida en estos casos será de propiedad Atlas Copco.

6. La garantía Atlas Copco será cancelada en los siguientes casos:
   7.1. Por utilizar piezas no originales Atlas Copco
   7.2. Por alteración en el producto sin autorización por escrito de Atlas Copco.
   7.3. Por no hacer cualquiera de las revisiones de mantenimiento de 50h, 250h, 500h, 750h 1000h, 1250h, 1500h, 1750h y 2000h.
   7.4. Por no seguir las instrucciones de operación y/o aplicación del producto de acuerdo con los manuales de Atlas Copco.

7. No están en garantía:
   8.1. Deterioro de la pintura, debido utilización normal o por intemperie.
   8.2. Costos de análisis de piezas que no tienen defectos.
   8.3 Los desperfectos originados de acuerdo al ítem 7

8. Las reclamaciones de la garantía serán reconocidas cuando hayan sido comunicadas al distribuidor autorizado Atlas Copco.

9. Atlas Copco reserva el derecho de modificar las especificaciones o de introducir mejoras en sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin la obligación de efectuar las mismas modificaciones o mejoras de los productos anteriormente vendidos.

10. La actual garantia cubrirá los siguientes costos: Mano de obra de la reparación, transporte del personal técnico al sitio y Repuestos.

    Los costos que no están amparados por la actual garantía son: Gastos de viaje (alimentación y hospedaje), Desplazamientos del equipo Atlas Copco (grúas y camas bajas o similares).

Firma y sello de aceptación.

_____

Factura Electrónica De Venta No

MT No. 161

Resolución de Facturación electrónica DIAN No. 18763003846145
Prefijo: MT, consecutivo: del 1 al 1.000 del 31 de Enero de 2020 - Vigencia 18 meses

MAQUITIERRA S.A.S.

Nit 900857515

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT	14225605 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 12 2 70 Of 405	Ibagué	2639103

POR CONCEPTO DE
APISONADOR GASOLINA MOTOR HONDA GX 120 SERIAL 29134300950

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/02/2021	27/02/2021	JAVIER LEON BELTRAN	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	APISONADOR GASOLINA MOTOR HONDA GX 120 SERIAL 29134300950	1	Und.	7.600.000	19%	1.444.000	7.600.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.600.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.444.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.044.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.044.000**

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2021 14:32:48
Medios de Pago: Efectivo

KM 6 5 VIA SIBERIA TENJO EDS EL GATO BG 104 Teléfono 3508476724
Correo Electrónico administracion@maquitierra.com

CUFE: 5e01bc206a2908bd4d6c41597be608753b03aafe3a344db2a1101838ebc94dd661ac3dd92ee12b82dd0e7f567a297d6e--Expedición:12/02/2021 02:37 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ANEXO No. 06

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

ALDEIC S.A.S BIC	GOBERNACION DEL TOLIMA. MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA. Nº 5	@gobertolima www.tolima.gov.co	INFORME Nº	5
			PERIODO	11/10/2024 AL 10/11/2024
			PAGINA	1 DE 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698	CONTRATISTA:	ALDEIC SAS BIC

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CLIMA / DÍA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Seco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lluvias moderadas																															1
Lluvias intensas																															
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Se hace referencia a los días que tuvieron tiempo seco y lluvia, hay presencia de nubosidad algunos días pero no se presentan lluvias en la obra

Firma

Nombre: Jerson Said Lázaro Suárez
Residente de Interventoría

ANEXO No. 07

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 15 octubre de 2024

CA–285-0049-0149-24

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Atn: Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría Nº 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Respuesta oficio solicitud de prorroga

Respetados señores (as),

Con relación al oficio del asunto, esta Interventoría confirma que efectivamente en campo se evidencio la afectación del cronograma de obra debido al desarrollo de actividades como la demolición del Concreto Ciclópeo de la estructura colapsada en el estribo del Costado de Palobayo generando esto mayores tiempos utilizados en dicha actividad que no estaba contemplada en la magnitud que se constató en el sitio de los trabajos. También es importante mencionar que efectivamente, como lo menciona el CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO, como consecuencia de lo anterior, se requiere un volumen de relleno mucho mayor al que estaba previsto en las condiciones iniciales y por ende mayor tiempo de ejecución de esta actividad.

Sin embargo, se considera que es importante adjuntar a la solicitud de prórroga, el concepto emitido por la firma Consultora que realizó los Diseños Detallados Consorcio Venadillo 182, quienes realizaron visita en compañía de sus especialistas y confirmaron la situación presentada.

Por lo anteriormente expuesto, esta interventoría da concepto favorable a la solicitud de prórroga por un Término de dos (2) meses solicitados por la firma Contratista y es consiente que en obra esta actividad de demolición se realizó con un menor rendimiento y debido a esto se requiere un relleno importante que dilata los plazos previstos inicialmente.

Con base en lo anterior, esta Interventoría ha preparado un presupuesto por el tiempo que se requiere para cumplir con el objeto contractual teniendo en cuenta la prórroga de dos (2) meses solicitada por el Contratista de obra el cual asciende a la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NUEVENE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($127.009.099,00)

ALDEIC S.A.S BIC

con IVA, en este presupuesto se ajustaron algunas dedicaciones de especialistas que se considera ya no serían necesarias en la etapa final del proyecto. El detalle de lo anterior, se muestra en el cuadro que se adjunta.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC



DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: D.Riveros – Directora Interventoria
Revisó: D.Riveros – Directora Interventoria
Aprobó: D. Riveros – directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 15 octubre de 2024

CA–285-0050-0150-24

Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Anexos mesa de trabajo ambiental y HSEQ – comité de obra y mesa de trabajo 08/10/2024

Respetados señores (as),

Por medio de la presente nos permitimos enviar acta de reunión y presentación utilizada en mesa de trabajo de componentes ambiental y HSEQ en comité realizado el día 08/10/2024 en las instalaciones del campamento de obra.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., octubre 21 de 2024

CA–285-0051-0156-24

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Atn: Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría Nº 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Entrega documentos adicionales interventoría- solicitud de prórroga.

Respetados Señores:

Atendiendo a lo requerido por la Gobernación del Tolima, remitimos a ustedes la documentación adicional de interventoría con el fin de continuar con el proceso de prórroga.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: S. Guarín - Ing., Apoyo
Revisó: D. Riveros – Coordinadora de Interventoría
Aprobó: C. Alfaro – R.L.
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., octubre 21 de 2024

CA–285-0052-0157-24

Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Solicitud de informe No. 4

Respetados señores (as),

De acuerdo a las funciones contractuales de la interventoría, y según las obligaciones contraídas por la parte contratista con la firma del contrato citado en la referencia; en especial con lo descrito en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 25, 28 y 29*.

Se solicita la presentación del informe No.4, teniendo en cuenta que el corte de este, es en el periodo del 11 de septiembre al 10 de octubre del presente año, y a la fecha no ha sido remitido a la interventoría; la cual debe realizar la correspondiente revisión y observaciones pertinentes.

De acuerdo a lo anterior, quedamos atentos a la respuesta del presente comunicado con la presentación de los documentos relacionados.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: J. Lázaro – Residente de Interventoría
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., octubre 22 de 2024

CA–285-0053-0159-24

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Atn: Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría Nº 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Entrega documentos adicionales contratista de obra- solicitud de prórroga.

Respetados Señores:


Atendiendo a lo requerido por la Gobernación del Tolima, remitimos a ustedes la documentación adicional del contratista de obra con el fin de continuar con el proceso de prórroga.

Igualmente es importante mencionar que se realizaron observaciones a la reprogramación enviada por la firma contratista, la cual; una vez subsanadas las mismas, es aprobada y se adjunta a este documento.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC



DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: S. Guarín - Ing. Apoyo
Revisó: D. Riveros – Coordinadora de Interventoría
Aprobó: C. Alfaro – R.L.
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 24 octubre de 2024

CA–285-0054-0171-24

Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Solicitud de compromisos comités de obra de fecha 08/10/2024 y 10/10/2024

Respetados señores (as),

Según las obligaciones descritas y adquiridas por la parte contratista con la firma del contrato de obra No.1665 de 2024 en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 6, 11, 22, 25, 28, 32, 38, y 41.*


Se solicita la presentación de la documentación según compromisos adquiridos bajo actas de comité realizados en obra en las fechas mencionadas en el asunto del presente oficio, y la cual a la fecha no ha sido remitido a la interventoría; la cual debe realizar la correspondiente revisión y observaciones pertinentes; se reitera los compromisos adquiridos:

TAREA	RESPONSABLE	FECHA PACTADA	COMITÉ DE OBRA
Presentación del documento PMT con observaciones subsanadas	Contratista de obra	15 octubre 2024	08/10/2024
Presentación de los informes de gestión ambiental y social No.1, 2 y 3 con observaciones subsanadas.	Contratista de obra	22 octubre 2024	08/10/2024
Presentación del concepto técnico de la consultoría para solicitud de prorroga	Contratista de obra	Semana del 14 al 19 de octubre 2024	10/10/2024
Presentación del soporte técnico del suministro de instalación de concreto clase C (fundida) de los Caisson en varios cuerpos.	Contratista de obra	Semana del 14 al 19 de octubre 2024	10/10/2024

De acuerdo a lo anterior, quedamos atentos a la respuesta del presente comunicado con la presentación de los documentos relacionados.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC



DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 31 octubre de 2024

CA–285-0055-0225-24

Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Requerimientos área HSEQ

Respetados señores (as),

Según las obligaciones descritas y adquiridas por la parte contratista con la firma del contrato de obra de la referencia en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 32, 6, 9, 12, 15, 16, 22, 36, 37, y 38.*

Si bien es de conocimiento de la interventoría que el contratista transporta el combustible en un vehículo que cuenta con la señalización e implementación de elementos de emergencia, se solicita al contratista de obra que suministre a la interventoría las capacitaciones y documentación del personal que manipula y transporta el combustible en la obra, donde conste que este se encuentra certificado y apto para la manipulación de estos elementos.

Por otra parte, se solicita se informe a la interventoría el origen del agua industrial utilizada por ICMO para la elaboración del falso apoyo para el armado de las vigas metálicas principales del puente y lavado de herramientas utilizadas en las obras que se adelantan dentro del cauce del Rio Venadillo, y las labores de mitigación para evitar la contaminación de esta fuente hídrica en el desarrollo de dichas actividades, así como también se solicita se realice la señalización y delimitación de las actividades realizadas dentro del cauce del rio, como se evidencia a continuación:





Debido a las inspecciones realizadas por la interventoría, se solicita al contratista de obra que realice el cerramiento total de la obra en los accesos por los que pudiesen transitar personas y tener algún

tipo de riesgo, así como la instalación en estos sitios de avisos "**PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO",** en los lugares que se evidencian a continuación:





De igual forma se requiere, la instalación del pasacalle que se cayó en el costado Ambalema, y no volvió a instalarse, donde se indique no solo la información del contrato, sino también la **NO EXISTENCIA DEL PASO VEHICULAR** de ningún tipo, esto con el fin de evitar incurrir en responsabilidades en caso de que llegase a ocurrir algún tipo de accidente dentro del AID, teniendo en cuenta que la vía se encuentra cerrada y prohibido el paso a cualquier tipo de motorizado, y que en la actualidad, la comunidad utiliza un paso alterno, el cual está bajo responsabilidad de quien lo transita, y/o si es el caso, realizar el requerimiento a las autoridades locales competentes, teniendo en cuenta que es responsabilidad del contratista de obra tener la señalización adecuada que indique el cierre de la vía.

Teniendo en cuenta lo mencionado y los compromisos adquiridos en comité de obra del día 08/10/2024, y lo solicitado mediante comunicado C-285-0027-004-24 de fecha 02/08/2024, se reitera al contratista la importancia y premura en la presentación y radicación del PMT ante la interventoría y a su vez ante la entidad de tránsito correspondiente.

Se reitera al contratista la presentación de la documentación y evidencias de cierre y paz y salvo del predio Villa Blanca, predio utilizado como sitio de disposición de RCD en el inicio del desarrollo de actividades de obra.

Por último, y teniendo en cuenta que en el desarrollo de la obra se han realizado labores de demolición de la placa de concreto existente en el lado Ambalema, con el fin de alcanzar los niveles y alturas requeridas para la instalación y soporte de la estructura metálica, se solicita que tan pronto se realicen dichas actividades el material de demolición sea retirado de la obra y dispuesto en los sitios correspondientes, se evidencia a continuación:



De acuerdo a lo anterior, quedamos atentos a la respuesta del presente comunicado con la presentación de los documentos relacionados y la implementación de los elementos de seguridad descritos en el presente oficio, en cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial aplicables en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y comunidad del AID del proyecto.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., noviembre 01 de 2024

CA–285-0056-0235-24

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Atn: Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría Nº 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Solicitud cambio de personal – supervisor interventoría

Respetados Señores:

Por medio de la presente se envía para su revisión y aprobación la hoja de vida con sus respectivos soportes del ingeniero FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO en reemplazo del ingeniero ALVARO JAVIER FERRARO HERNANDEZ para el cargo de supervisor de interventoría.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: S. Guarín - Ing., Apoyo
Revisó: D. Riveros – Coordinadora de Interventoría
Aprobó: C. Alfaro – R.L.
Copia. Archivo de Interventoría

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA "

PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE: FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO: SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA PORCENTAJE DE DEDICACION: 100%

A. FORMACIÓN ACADEMICA Y ESPECIALIZACIONES

PREGRADO

No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (día - mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No.	Fecha de expedición de matrícula
1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	INGENIERO CIVIL	11-dic-14	15202-293808	8-ene-15

POSTGRADOS O SUPERIORES

No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Especialización, Maestría, Doctorado o superior)	FECHA DE GRADO (día - mes - año)	TIEMPO DE DEDICACIÓN	
				Completo	Parcial
1	AREANDINA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13-dic-18		
2	AREANDINA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES	24-jun-15		

Fabian Silvestre Fonseca Velasco

NOMBRE: FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA "

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN TRABAJOS SIMILARES (Sólo como profesional. Relacionar en orden cronológico)

No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS	PERÍODO LABORADO			% DEDICACIÓN	MESES
					INICIA (día - mes - año)	TERMINA (día - mes - año)	DURACIÓN (días)		
1	UNIÓN TEMPORAL VALERU VIAL	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VEREDA TUNAL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO	14-dic-21	30-dic-23	746	100%	**24,87**
2	UNIÓN TEMPORAL VALERU VIAL	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO CON LA VEREDA MORCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO	15-jul-19	27-sep-21	805	100%	**26,83**
								TOTAL:	**51,70**

FIRMA DEL PROFESIONAL: Fabian Silvestre Fonseca Velasco

(1) Diligenciar únicamente si la profesión esta reglamentada, consignando el número del documento (matrícula o tarjeta) y la fecha a partir de la cual puede ejercer legalmente.

NOTAS:
* El contenido del formulario deberá ser diligenciado en su totalidad, de lo contrario no se tendrá en cuenta para su calificación.
* La información incluida en el formulario, es de la responsabilidad del proponente y deberá allegarse con la documentación que la soporte.
* La firma del profesional en este formulario será considerada como carta de intención.
* La experiencia especifica deberá estar diligenciada en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Las fechas de inicio y fin del tiempo laborado, deben diligenciarse en su totalidad, es decir incluir día/mes/año.
* En ningún periodo el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación mensual, en caso contrario no se tendrá en cuenta como experiencia.
* La información consignada en el formulario debe corresponder con exactitud a los soportes y certificaciones. En caso contrario se considerará como no relacionada dicha información; para tal efecto prevalece la información consignada en los soportes y el
* En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o empresa que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.
* Solo se tendrán en cuenta los estudios formales de postgrado, especializaciones, maestrías, PhD o superiores relacionados en la formación académica. No se tendrán en cuenta seminarios, cursos, educación no formal, tecnologías, diplomados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.626.665**

FONSECA VELASCO

APELLIDOS

FABIAN SILVESTRE

NOMBRES.



Fabian Silvestre Fonseca

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1991**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-SEP-2009 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0700100-00209436-M-1049626665-20100118 **0020**011743A 3 27608759

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.
15202-293808 BYC
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **08/01/2015**
FABIAN SILVESTRE
FONSECA VELASCO
C.C. 1049626665
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Fabian Silvestre Fonseca Velasco

C. C. Nº 1.049.626.665 de Tunja (Boyacá)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 11 días del mes de diciembre de 2014

Admisiones y Control
de Registro Académico
Diploma No. 87656
Libro de Registro No. 49
Folio No. 837
Fecha 11-12-2014

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Fabian Silvestre Fonseca Velasco

C. C. Nº 1.049.626.665 de Tunja

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Infraestructura Vial

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 13 días del mes de diciembre de 2018

Admisiones y Control de Registro Académico
Diploma No. 115207
Libro de Registro No. 56
Folio No. 391
Fecha 13-12-2018

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Fabian Silvestre Fonseca Velasco

C. C. Nº 1.049.626.665 de Tunja (Boyacá)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Salud Ocupacional y Protección de Riesgos Laborales

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 24 días del mes de Julio de 2015

Admisiones y Control de Registro Académico
Diploma No 090378
Libro de Registro No 30
Folio No 341
Fecha 24-07-2015

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador

Boyacá Orgullo de América	SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA licencia de Salud Ocupacional Persona Natural Seguridad y Salud en el Trabajo"	RESOLUCION No 1988 FECHA EXPEDICION: 11 SEP 2013

EL SECRETARIO DE SALUD DE BOYACA

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Resolución 04502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Resolución 04502 del 28 de diciembre de 2012, se establece que la Expedición, renovación ,vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo, definidos por el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012, estará a cargo de las Secretarias Seccionales y Distritales de Salud, en cumplimiento de la competencia asignada a estas por el inciso primero del artículo 23 de la citada ley.

SEGUNDO: Que **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO,** identificado (a) con C.C Nº 1.049.626.665, ha solicitado licencia para la prestación de servicios en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el mundo del trabajo" cumpliendo con los requisitos establecidos en los Artículos 2 de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012 y anexando a su petición la documentación exigida para demostrar Especialización en un area de la Salud Ocupacional.

TERCERO: Que los documentos fueron verificados por la profesional de la Secretaria de Salud, referente del procedimiento de otorgamiento y renovación de las licencias de Salud Ocupacional.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO, otorgar licencia en prestación de servicios de Salud Ocupacional "Seguridad y Salud en el Trabajo" a **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO,** identificado (a) con C.C Nº 1.049.626.665, como **INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES**, en los campos de acción:

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	INVESTIGACION EN AREA TECNICA
DISEÑO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EDUCACION , CAPACITACION
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA SEGÚN FORMACION ACADEMICA	

ARTICULO SEGUNDO, la licencia que trata el artículo anterior tiene carácter personal e intransferible y es válida en todo el territorio nacional por una vigencia de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovada por un término igual.

ARTICULO TERCERO, Que los titulares de las licencias, deberán cumplir en el ejercicio de sus actividades con las normas, técnicas y éticas para la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, que para tal fin expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTICULO CUARTO, contra la presente resolución, procede los recursos de reposición y apelación en primera y segunda instancia ante la Secretaria de Salud, según el Artículo 13 de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012.

ARTICULO QUINTO, la presente resolución surte efectos a partir de su ejecución.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

GUILLERMO ORJUELA ROBAYO
Secretario de Salud de Boyaca

JOSE ISRAEL BUITRAGO GALINDO
Director Tecnico de Salud Publica

Elaboro: Judy Ibañez-Profesional U.

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación Media Diversificada "Inem"

Carlos Arturo Torres

Tunja - Boyacá

Autorizado por la Secretaría de Educación de Tunja,
Según Resolución No. 0142 del 25 de Octubre de 2004

Confiere a:

Fabián Silvestre Fonseca Velasco

Identificado (a) con T.I. No. 91082055482 de Tunja

El Título de:

Bachiller Técnico

Con Especialidad en Electricidad y Electrónica

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Técnica, según los planes y programas vigentes

Registro Interno en el Instituto

Acta No. 044 Folio No. 404 Libro No. 4

El Rector

El Jefe de Unidad Administrativa

CESAR HERNANDO FIGUEROA BÁEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL VALERU 4,
Nit No. 900806488-5

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.049.626.665,se desempeñó como ingeniero residente de interventoría en el contrato 1133 DEL 19 DE ENERO DE 2015, cuyo objeto es "*Interventoría, Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental Y Social Al Proyecto Cuyo Objeto Es: Mantenimiento, Recuperación Y/O Adecuación De La Malla Vial De La Ciudad De Tunja Etapa 4*",en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2016 (1 Año).

la presente se expide a petición del interesado a los 11 días del mes de abril de 2019.

Cordialmente,

cc 7172415 Tunja.

CESAR HERNANDO FIGEROA BAEZ
R/L CONSORCIO VIAL VALERU 4
CC. 7172415C

LA SUSCRITA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC

CERTIFICA

Que FONSECA VELASCO FABIAN SILVESTRE, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.626.665 de Tunja efectuó para la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, la ejecución de los siguientes Contratos de Prestación de Servicios:

Contrato	**No. 341-2016**
Objeto	Prestar servicio ingeniero auxiliar residente en el municipio de Piedecuesta Santander, con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo No. 3121-2013 suscrito entre INVIAS y la UPTC.
Fecha de Inicio	15 de febrero de 2016
Fecha de Terminación	31 de julio de 2016
Valor	$23.761.237,50
Adición No. 2	$3.600.187,50
Prorroga No. 2	Del 6 al 31 de agosto de 2016
Adición No. 3	$2.160.112,50
Prorroga No. 3	Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016
Estado	Terminado

Para el desarrollo del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoría con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras.
2. Colaborar con el residente en el control del equipo ofrecido por el contratista e informar sobre deficiencias e incumplimientos.
3. Colaborar en la verificación diaria de los profesionales, trabajadores y equipos del contratista empleados en la ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos.
4. Colaborar en la toma de los ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
5. Ayudar en la toma de las mediciones y el cálculo las cantidades de obra ejecutadas al residente de interventoría.
6. Ayudar en la elaboración del pre-acta detallada de cantidades de obra en el período ejecutado.
7. Colaborar en la elaboración del informe en el formato establecido en el manual de interventoría y presentarlo a la unidad ejecutora dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución durante la vigencia de la interventoría.
8. Colaborar en la verificación del programa de utilización del equipo este de acuerdo con el programa de obra.
9. Colaborar con el residente en la revisión semanal y conjuntamente con el contratista de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra.
10. Recibir las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, comunidad y demás actuantes en el desarrollo de la obra e informar al residente y director de Interventoría.

11. Colaborar en la elaboración del informe final en original a la unidad ejecutora y ejemplar a la Dirección Territorial correspondiente.
12. Colaborar en la elaboración del acta de entrega y recibo definitivo de obra
13. Estar disponible en el sitio de trabajo según la programación con residente y director de Interventoría.
14. Informar al residente o director de interventoría si hay incumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal del contratista.
15. Colaborar con la elaboración del acta de liquidación de obra.
16. Todas las demás actividades que el residente y el director de interventoría le soliciten dentro del objeto de la presente orden de servicios.
17. Colaborar en el diligenciamiento diario de la bitácora de obra.

La presente certificación se expide en Tunja a los 23 días del mes de agosto de 2017.

POLICARPA MUÑOZ FONSECA
Vicerrectora Administrativa y Financiera

G.Báez

EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA DE
FESA TEMPORAL COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.165.357-7

C E R T I F I C A:

Que el (la) señor(a) **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO** identificado(a) con cédula de ciudadanía número **1.049.626.665** expedida en **TUNJA ,** laboró en la empresa en las fechas, cargos y empresas detalladas a continuación:

No.	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	CARGO	EMPRESA EN MISION
1	28/11/16	05/02/17	INGENIERO INTERVENTOR	MINAS PAZ DEL RIO SA

La presente se expide a solicitud del interesado a los **once** (**11**) días del mes de **julio** de **dos mil dieciocho** (**2018**).

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA
GRUPO FESA

Si desea confirmar los datos de esta certificación comuníquese con **FESA TEMPORAL COLOMBIA S.A.S.** al correo servicioalcliente@grupofesa.co, citando en el asunto el código **157F75F4**

Correo electrónico del empleado: silver-f2@hotmail.com

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS
VIGILADA MINEDUCACIÓN

LA SUSCRITA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC

CERTIFICA

Que FONSECA VELASCO FABIAN SILVESTRE, identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.626.665 efectuó para la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, la ejecución del siguiente Contrato de Prestación de Servicios:

Contrato	**No. 811- 2017**
Objeto	Prestar servicio Profesionales como ingeniero auxiliar para ingeniería de detalle (diseño eléctrico, redes y ductos), con el fin de dar cumplimiento al Convenio interadministrativo No. 000412 de 2012 celebrado entre el Departamento de Boyacá y la UPTC.
Fecha de Inicio	17 de abril de 2017
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2017
Valor	$22.500.000,oo
Estado	Terminado

Para el desarrollo del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Apoyar las actividades relacionadas con los estudios de impacto ambiental, afectación predial y urbana, teniendo en cuenta que se trata del diseño y la afectación de una zona que ya cuenta con un complejo vial, servicios comerciales, patrimoniales y urbanos diferenciados.
2. Apoyar las actividades relacionadas con el diseño eléctrico, redes y cableado, en donde se plantearán elementos electrónicos y eléctricos que requerirán de un sistema de redes de cableado que serán diseñadas para atender a las necesidades en términos de iluminación, comunicación y otras asociadas al proyecto.
3. Elaborar los estudios de costos y presupuesto de tal manera que se detallen las cantidades de materiales y procesos en cada uno de los estudios, con los que se desarrollaran presupuestos para construcción.
4. Apoyar el estudio del sistema de acueducto, alcantarillado, redes y demás ductos en la zona, el cual se hará a partir del replanteo de la información disponible y de posibles perforaciones.
5. Apoyar al grupo de auxiliares encargados de la ingeniería de detalle en las actividades propias del proyecto.

La presente certificación se expide en Tunja a los 15 días del mes de agosto de 2018.

POLICARPA MUÑOZ FONSECA
Vicerrectora Administrativa y Financiera

G.Báez

JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Ingeniero Civil
M.P. 5420235674 NTS

CONSTANCIA

Yo, JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía 13.475.323 de Cúcuta, Director de la interventoría para la CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PR80+150 DE LA VIA SAN GIL - BUCARAMANGA, RUTA 45A07, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3121 DE 2013 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA UPTC, certifico que el Señor FABIAN SILVESTRE VELAZCO FONSECA identificado con cedula de ciudadanía 1.049.626.665 de Tunja, se desempeñó en el cargo de INGENIERO AUXILIAR RESIDENTE desde el día 15 de Febrero de 2016 al 31 de Julio de 2016, destacándose como una persona honesta, seria y responsable.

Esta referencia se expide a petición del interesado a los 31 días del mes de Julio de 2016.

Atentamente,



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
13.475.323 de Cúcuta
Celular 3208334352

Carrera 29 No. 94-48 Torre 8 Apto. 103 Miradores de San Lorenzo
Tel: (7) 6943119
jaragara@gmail.com

INGENIERIA DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit: 900.459.383-1

CERTIFICA QUE:

FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.626.665 de Tunja, Ingeniero Civil con M.P. 15202293808 BYC, presto sus servicios como Ingeniero Residente de Interventoría, en la ejecución del siguiente contrato:

No. Contrato	EMC-CM-002-2017.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "LA ESTABILIZACIÓN EN ASFALTITA DE LA VÍA QUE PARTE DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA TOTA HASTA EL SECTOR EL BOQUERON DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TOTA.
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR CONTRATO:	$ 52 000 000.
FEHA INICIO:	30 JUNIO 2017.
FECHA TERMINACIÓN:	04 JUNIO 2018.

La presente se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de junio de 2018, en la ciudad de Tunja.

Cordialmente,

HECTOR EDUARDO CONTRERAS SOTO
Representante legal

FORZZA CONSTRUCTORES LTDA.
Calle. 42 A N° 1D-55. Telf.: 7454330 Cel. 3203466911
Resolución DIAN 200000023249 Tunja del 5 de Marzo de 2009
Régimen Común - Nit. 900242211 - 0

FORZZA CONSTRUCTORES LTDA. CON NIT .900242211-0
CERTIFICA QUE:

FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.626.665 de Tunja, Ingeniero Civil con M.P. 15202293808 BYC, presto sus servicios como Ingeniero auxiliar Residente de Interventoría, en la ejecución del siguiente contrato:

NIT:	900.916.441-1
CONTRATISTA	FORZZA CONSTRUCTORES LTDA.
NIT:	900242211-0
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE VIVIENDA "URBANIZACIÓN SAN JERÓNIMO" EN EL MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACÁ).

El contrato laboral ejecutado tiene fecha de inicio el 09 de abril de 2018 y fue finalizado el 09 de julio de 2018 (3 meses).

La presente se expide a solicitud del interesado, a los quince (09) días del mes de agosto de 2018, en la ciudad de Tunja.

Cordialmente,

LUZ MARCELA PEÑA RUSSI
R/L FORZZA CONSTRUCTORES LTDA

EL SUSCRITO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

HACE CONSTAR QUE:

FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO, identificado con C.C. No. 1.049.626.665 de Tunja, presta sus servicios como **INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA** en la empresa **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S.,** mediante contrato por obra labor ejecutada desde el 29 de octubre del 2018 hasta la fecha de expedición del presente certificado, en los siguientes proyectos:

- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA CON LA MODALIDAD DE PARCHEO Y SELLO ASFÁLTICO. ETAPA 4.
- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL PROYECTO: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA IVIALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA.

Desempeñando las siguientes funciones:

- Elaboración de Informes semanales de interventoría
- Verificación de cantidades y control de avance financiero del contrato de obra
- Control semanal de calidad a los materiales utilizados en obra, incluyendo base granular, sub base granular, concreto asfáltico y concreto estructural
- Toma de niveles y verificación de espesores, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
- Solicitudes técnicas al contrista para la correcta ejecución de las obras del contrato.
- Informe mensual de interventoría con los respectivos requerimientos solicitados por la supervisión de la alcaldía mayor de Tunja.
- Participación en comités técnicos, realizados, con la participación de la supervisión, el contratista y la interventoría; con el fin de hacer seguimiento al avance y ejecución del contrato.
- Seguimiento y control al personal de obra, en lo referente al pago de la seguridad social integral y respecto a la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo en los diferentes frentes.
- Seguimiento a la gestión social del contratista, en lo referente a toma de actas de vecindad y socialización a la comunidad de las obras a ejecutar.

- Seguimiento y control al plan de manejo ambiental propuesto por el contratista, haciendo énfasis en la correcta disposición y gestión de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato.
- Seguimiento y control de las actividades diarias ejecutadas en obra, mediante el registro diario de la bitácora de obra.

Se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de junio de 2019, en Tunja (Boyacá).

Cordialmente,

JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA
Representante Legal

CONTROL INGENIERÍA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BÁEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL VALERU VIAL
NIT No 901295143-9
CERTIFICA QUE:

El ingeniero **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.626.665, se desempeñó como ingeniero residente de interventoría en el contrato de No 24 80 del 25 DE JUNIO DE 2019; cuyo objeto es*: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO CON LA VEREDA MORCA DEPARTAMENTO DE BOYACA".* En el periodo comprendido entre el 15 de JULIO de 2019, hasta el 27 de septiembre de 2021; cumpliendo las siguientes funciones:

- Verificación de cantidades y control de avance financiero del contrato de obra
- Control semanal de calidad a los materiales utilizados en obra, incluyendo base granular, sub base granular, concreto asfáltico y concreto estructural
- Toma de niveles y verificación de espesores, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
- Solicitudes técnicas al contrista para la correcta ejecución de las obras del contrato.
- Informe mensual de interventoría con los respectivos requerimientos solicitados por la supervisión de la alcaldía mayor de Sogamoso.
- Participación en comités técnicos, realizados, con la participación de la supervisión, el contratista y la interventoría; con el fin de hacer seguimiento al avance y ejecución del contrato.
- Seguimiento y control al personal de obra, en lo referente al pago de la seguridad social integral y respecto a la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo en los diferentes frentes.
- Seguimiento a la gestión social del contratista, en lo referente a toma de actas de vecindad y socialización a la comunidad de las obras a ejecutar.
- Seguimiento y control al plan de manejo ambiental propuesto por el contratista, haciendo énfasis en la correcta disposición y gestión de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato.
- Seguimiento y control de las actividades diarias ejecutadas en obra, mediante el registro diario de la bitácora de obra.

la presente se expide a petición del interesado a los 27 días del mes de septiembre de 2021.

Cordialmente:

CESAR HERNANDO FIGEROA BAEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL VALERU VIAL
Contacto: 3132963393
CC. 7172415

CESAR HERNANDO FIGUEROA BÁEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL VALERU SPACE
NIT. 901.350.679-1
CERTIFICA QUE:

El ingeniero **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.049.626.665, se desempeñó como ingeniero residente de interventoría en el contrato de No 0114 del 17 DE enero DE 2020; cuyo objeto es*: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEBUSBANZA, FIRAVITOBA Y PAYA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.* En el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2021 ; cumpliendo las siguientes funciones:

- Verificación de cantidades y control de avance financiero del contrato de obra
- Control semanal de calidad a los materiales utilizados en obra, incluyendo base granular, sub base granular, concreto asfáltico y concreto estructural
- Toma de niveles y verificación de espesores, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
- Solicitudes técnicas al contrista para la correcta ejecución de las obras del contrato.
- Informe mensual de interventoría con los respectivos requerimientos solicitados por la supervisión de la alcaldía mayor de firavitoba.
- Participación en comités técnicos, realizados, con la participación de la supervisión, el contratista y la interventoría; con el fin de hacer seguimiento al avance y ejecución del contrato.
- Seguimiento y control al personal de obra, en lo referente al pago de la seguridad social integral y respecto a la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo en los diferentes frentes.
- Seguimiento a la gestión social del contratista, en lo referente a toma de actas de vecindad y socialización a la comunidad de las obras a ejecutar.
- Seguimiento y control al plan de manejo ambiental propuesto por el contratista, haciendo énfasis en la correcta disposición y gestión de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato.
- Seguimiento y control de las actividades diarias ejecutadas en obra, mediante el registro diario de la bitácora de obra.

la presente se expide a petición del interesado a los 12 días del mes de enero de 2021.

Cordialmente:

CESAR HERNANDO FIGEROA BAEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL VALERU VIAL
Contacto: 3132963393
CC. 7172415

CESAR HERNANDO FIGUEROA BÁEZ.
NIT No 901295143-9
CERTIFICA QUE:

El ingeniero **FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.626.665, se desempeñó como ingeniero residente de interventoría en el contrato No 535 de 2019; *cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA A TRAVES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VEREDA TUNAL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA. En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2021, hasta el 30 de diciembre de 2022.*; cumpliendo las siguientes funciones:

- Verificación de cantidades y control de avance financiero del contrato de obra
- Control semanal de calidad a los materiales utilizados en obra, incluyendo base granular, sub base granular, concreto asfáltico y concreto estructural
- Toma de niveles y verificación de espesores, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
- Solicitudes técnicas al contrista para la correcta ejecución de las obras del contrato.
- Informe mensual de interventoría con los respectivos requerimientos solicitados por la supervisión de la alcaldía mayor de Tunja.
- Participación en comités técnicos, realizados, con la participación de la supervisión, el contratista y la interventoría; con el fin de hacer seguimiento al avance y ejecución del contrato.
- Seguimiento y control al personal de obra, en lo referente al pago de la seguridad social integral y respecto a la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo en los diferentes frentes.
- Seguimiento a la gestión social del contratista, en lo referente a toma de actas de vecindad y socialización a la comunidad de las obras a ejecutar.
- Seguimiento y control al plan de manejo ambiental propuesto por el contratista, haciendo énfasis en la correcta disposición y gestión de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato.
- Seguimiento y control de las actividades diarias ejecutadas en obra, mediante el registro diario de la bitácora de obra.

la presente se expide a petición del interesado a los 4 días del mes de enero de 2024.

Cordialmente:

CESAR HERNANDO FIGEROA BAEZ
Contacto: 3132963393
CC. 7172415

AVENIDA UNIVERSITARIA #75A-00 CENTRO
EMPRESARIAL GREEN HILLS, BLOQUE A, OFICINA 5ª
TUNJA (BOYACA)

CORREO ELECTRONICO: intermorca@gmail.com
CELULAR: 3132963393

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 05 noviembre de 2024

CA-285-0057-02378-24


Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Observaciones al Informe Mensual No.4 – Componente Ambiental y de Gestión Social y SST

Respetados señores (as),

La Interventoría ha revisado en detalle INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST del Periodo comprendido entre el 11 de SEPTIEMBRE al 10 de OCTUBRE de 2024, Versión 1, compuesto por un documento principal de 124 páginas y los siguientes anexos:



El contratista en este documento tiene como objetivo describir en detalle la gestión ejecutada en los componentes ambiental, social y SST para el periodo reportado de los proyectos y programas del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental (PAGA) en el Contrato de Obra No. 1665 de 2024; haciendo la salvedad de que no se cuenta con el documento PAGA aprobado para el proyecto, si bien éste ha sido radicado en su versión 2 en comunicado emitido por el contratista del 23/10/2024, aún se encuentra en revisión por parte de Interventoría. En este sentido el Informe Mensual No.4 es indicativo y no permite a la Interventoría realizar el debido seguimiento al desarrollo de los componentes señalados anteriormente.

Pese a lo anterior, y en aras de que el contenido de un informe mensual aporte en debida forma la trazabilidad a la información y el cumplimiento a lo designado por INVIAS, normatividad ambiental, social, etc., a continuación, se brindan las observaciones particulares para el componente ambiental y de gestión social, y SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Subprograma 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental y Social
Tabla sin numerar *titulada Conformación Grupo de gestión Ambiental (PAGA*). Sin comentarios.

Subprograma 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.

Tabla. *Relación Inducción Área Ambiental*. Sin comentarios.

Subprograma 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales

En la Tabla*. Cumplimiento de Requisitos Legales para el Contrato 1665 de 2024,* si bien se esclarece cuáles permisos serán necesarios, se debe profundizar el tema particularmente para:

a. Proveedor de agua de uso industrial: Se plantea la instalación de un tanque para el almacenamiento de agua la cual será suministrada por la empresa IBAL empresa de acueducto de Ibagué y transportada en el carrotanque de la empresa, de la cual se adjunta resolución No.500 del 29/12/2020, la cual hace alusión a un contrato de servicios públicos domiciliarios para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ibagué, sin embargo, el contratista no remite acuerdo comercial o de ofrecimiento del servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo,

   Durante el periodo del presente informe el contratista constructor relacionó el uso de agua proveniente de esta empresa, en el desarrollo de la obra, y como soporte solo se adjunta un recibo de pago realizado a IBAL S.A, el cual se encuentra en los anexos del componente ambiental del presente informe, sin embargo, este pago no especifica la cantidad de agua industrial empleada en el mes dentro de la obra.

b. Vertimientos: Se indica la firma de un acta con la señora JESSICA MARÍA MOREN NARANJO para el préstamo de la unidad sanitaria, como también se hace uso de los baños ubicados en los campamentos donde residen los colaboradores del proyecto. Unidades sanitarias que están conectadas de manera directamente a pozos sépticos los cuales se pudieron verificar y son de uso mixto.

   Se debe aportar todos los acuerdos suscritos con propietarios y/o tenedores de los predios donde se utilizan las unidades sanitarias.

c. Proveedor de materiales granulares: Triturados y Vías La Caima S.A.S. Se cita el Anexo 3, observaciones al Anexo 3 se especifican más adelante.

d. Disposición RCD: El contratista informó que la disposición de RCD se realiza en dos predios para nivelación topográfica, Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo y Predio Villa Blanca de Propiedad de la señora Blanca Lucy Sánchez, el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito de material, estas actas se adjuntan al presente informe, anexos componente ambiental.
   Se allego documento correspondiente al certificado de tradición y libertad, que detalla y describe la siguiente información sobre el predio Hacienda Guadalupe:
   - Ubicación: Ambalema, departamento del Tolima
   - Área: 624Ha, 4671 m2
   - Tipo de predio: rural
   - Destinación económica: no registra

   En referencia al uso de suelo el contratista informa que el día 10 de octubre se realizó solicitud de Certificado de Uso de suelo de los predios mencionados anteriormente a la Secretaria de Planeación del municipio de Ambalema, a la fecha se está a la espera de la solicitud realizada.

Con respecto al predio Villa Blanca no se allego información referente a ubicación, capacidad del mismo, ni uso del suelo. Se necesita indicar o complementar la gestión realizada en este tema.

e. Acopio y disposición de residuos sólidos convencionales: no se menciona la ubicación del sitio de acopio mencionado, tampoco se adjunta soporte de la entrega de estos residuos a la ESP. Con el clima en donde se desarrolla el proyecto los residuos ordinarios (convencionales) no pueden ser acopiados por periodos prolongados en la medida en que se generan vectores, olores ofensivos, etc. Entonces se precisa detallar la gestión y manejo de los residuos sólidos convencionales y por otra parte lo correspondiente a acopio de bolsas usadas de cemento que no se biodegradan rápidamente como los residuos orgánicos.

No se está de acuerdo con el resultado del Indicador como se observa en página 35:

Desarrollo del Indicador
Autorizaciones y/o permisos para el proyecto
Autoriza = (Autoriza y permisos tramitados/ Autoriza y permisos requerimientos) X 100
Autoriza = (1/1)*100 = 100%

El resultado del indicador es cero (0%) hasta tanto no se obtenga el acto administrativo correspondiente al permiso de ocupación de cauce sobre el R. Venadillo. Corregir.

Subprograma 1. Manejo integral de materiales de construcción.

- MATERIALES PETREOS

Se presenta trazabilidad de cantidades y certificaciones, se solicita corregir cantidades, puesto que el TOTAL, debe ser el último valor acumulado por tipo de material y no la suma de los mismos, revisar.

Relación volúmenes de material granular requerido en obra

MES	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (m^3)	CANTIDAD ACUMULADA (m^3)
11/06/2024 a 10/07/2024	Arena	68	68
	Triturado	78	78
11/07/2024 a 10/08/2024	Arena	68	136
	Triturado	78	156
11/08/2024 a 10/09/2024	Arena	68	204
	Triturado	78	234
11/09/2024 a 10/10/2024	Arena	35	239
	Triturado	55	294
TOTAL			**1409**

Los dos indicadores que se observan en página 36 son insuficientes. Incluso deberían tenerse indicadores por tipo de material.

La descripción de las condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales no son descritas en el Informe, pero el indicador que se calcula da 100%: No se evidencia registro fotográfico que soporte las adecuadas condiciones de almacenamiento en los dos lugares indicados.

Desarrollo del Indicado
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales AM = Lugares almacenamiento adecuados utilizados / Total lugares almacenamiento utilizados) x100 CD = (2/2)*100= 100%

- MANEJO DE CONCRETO

En este mes no se cuenta con el soporte de entrega de estos residuos a la ESP, el contratista solo presenta soporte de radicado de solicitud de documentación a esta empresa e informa que al tener un volumen superior a 8 m3, serán cargadas en volqueta y posteriormente serán trasladados a la ciudad de Ibagué para entregar a la empresa de servicios públicos Interaseo S.A.S E.S.P. quien hará la respectiva disposición final en el Relleno sanitario La Miel del municipio antes mencionado, para lo cual se solicita sea remitido dicho soporte a la interventoría tan pronto se tenga respuesta de dicha empresa.

Se presenta trazabilidad de cantidades, se solicita corregir cantidades, puesto que el TOTAL, debe ser el último valor acumulado no la suma de los mismos acumulados, corregir

Relación Bolsas de Cemento empleadas

MES	CANTIDAD BOLSAS UND.	CANTIDAD ACUMULADA	SOPORTE
11/06/2024 a 10/07/2024	850	850	
11/07/2024 a 10/08/2024	850	1700	
11/08/2024 a 10/09/2024	850	2550	
11/09/2024 a 10/10/2024	850	3400	
TOTAL		8500	

Llama la atención de si se tienen acopiadas 3.400 bolsas vacías de cemento, no se haya llegado al volumen deseado de 8 m^3. Por favor validar en campo, cuántas bolsas de cemento se requieren para tener un metros cúbico como volumen y así tener certeza en estos estimativos. Anexar registro fotográfico del acopio de bolsas usadas.

También se hace necesario comentar acerca de sobrantes, aguas de lado de canaleta y posibles derrames de concretos y cómo se han controlado.

- MANEJO DE PREFABRICADOS

El suministro de tubería, acero entre otros, materiales o elementos que son requeridos para la ejecución de la estructura del puente, son suministrados por proveedores debidamente legalizados de acuerdo con normatividad vigente, como también con el cumplimiento en los estándares de calidad de dichos materiales; sin embargo, no se allega la documentación correspondiente que certifique la legalidad de dichos proveedores. Esta observación ha sido reiterativa por parte de Interventoría.

Las condiciones de almacenamiento de estos elementos como se observan en las fotografías no son las mejores. Falta señalización, demarcación y orden.

No hay indicadores que permitan calificar esta actividad.

¿Porque este indicador de CSA no fue valorado? Ver página 41, así:

Desarrollo del Indicador
CSA = (Personas que asisten a capacitación / Total de personas) x100
CSA = (- / -) x100 =
Para el periodo del presente informe no se realizó Campaña de Sencibilización

Cuando en las charlas Área ambiental se observan tema de manejo de materiales de construcción realizada el 24 de septiembre de 2024.

Subprograma 3. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

El único indicador que se observa en página 41, no se comprende cómo se estima, ¿solo hay 6 señales?

Desarrollo del Indicador
Señalización y demarcación propuesta
S y D = (Señalización y demarcación Instalada / Señalización y demarcación propuesta) x 100
S Y D = (6/6) * 100 = 100%

Subprograma 4: Manejo Integral de los Residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.

Se presenta cuadro de trazabilidad y certificaciones, queda pendiente documentación legal faltante de los predios, mencionada previamente en el presente oficio.

Se presenta trazabilidad de cantidades y certificaciones, se solicita corregir cantidades, puesto que el TOTAL, debe ser el último valor acumulado no la suma de los mismos, revisar.

MATERIAL DE EXCAVACIÓN			
MES	CANTIDAD (m^3)	VOLUMEN ACUMULADO (m^3)	SOPORTE
VILLA BLANCA			
11/06/2024 a 10/07/2024	512,7	512,7	Certificado Mes Junio
Subtotal		**512,7**	
HACIENDA GUADALUPE			
11/06/2024 a 10/07/2024	398,76	398,76	Certificado Mes Junio
11/06/2024 a 10/07/2024	398,76	797,52	Certificado Mes Julio
11/06/2024 a 10/07/2024	398,76	1196,28	Certificado Mes Agosto
11/06/2024 a 10/07/2024	245	1441,28	Certificado Mes Septiembre
Subtotal		**3833,84**	
TOTAL ACUMULADO		**4346,54**	

MATERIAL DE DEMOLICIÓN			
MES	CANTIDAD (m3)	VOLUMEN ACUMULADO (m3)	SOPORTE
VILLA BLANCA			
11/06/2024 a 10/07/2024	0	0	N/A
Subtotal		**0**	
HACIENDA GUADALUPE			
11/06/2024 a 10/07/2024	205	205	Certificado Mes Junio
11/06/2024 a 10/07/2024	205	410	Certificado Mes Julio
11/06/2024 a 10/07/2024	205	615	Certificado Mes Agosto
11/06/2024 a 10/07/2024	0	0	N/A
Subtotal		**1230**	
TOTAL ACUMULADO		**1230**	

En página 45 hay dos indicadores así:

Desarrollo Indicador
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD) AERCD = (Autorizaciones RCD tramitados en periodo/Autorizaciones RCD requeridos en periodo) x100S D = (2/2) * 100 = 100%

Desarrollo Indicador
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM) APDM = (Predios utilizados para disposición en período/Autorizaciones propietarios en período) x 100 APDM = (1/1) * 100 = 100%

Cuáles son las autorizaciones y/o permisos vigentes del primer indicador? La Interventoría no tiene conocimiento de permisos concedidos por Cortolima para los dos predios utilizados.
Las dos fotos que se observan son casi iguales y no permite apreciar las debidas condiciones técnicas en que se debe hacer el relleno o disposición final de RCD (página 46).

No hay fotos que soporte el transporte en volquetas en “buenas condiciones” que no permita la perdida de materiales. Ilustrarlo.

Subprograma 2.5: Seguimiento y Control al manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales.

En cuanto a residuos convencionales, llegar a los 8 m3 para transportarlos a Ibagué, debe revisarse por la rápida descomposición de la fracción orgánica en esas condiciones climáticas.

En página 48 se observan fotografías de Brigada de orden y aseo, donde se aplastan bolas vacías de cemento y en página 49 se observa el sitio donde se almacenan (sin señalización, sin señales de SST). Dos fotos muestra un cerramiento en malla verde con cubierta (tejado), pero otras dos fotos están las lonas a la intemperie así:

	Aquí se suponen se guardan 8.400 bolsas?. Se precisa que se obtengan los soportes de la disposición final realizada de bolsas de cemento usadas.

Ya no es de aceptación por parte de Interventoría afirmar después de cuatro meses de obra contínua que no se generan residuos peligrosos, más aún cuando se tiene equipos y maquinaria en pleno funcionamiento.

Es imperativo que se soliciten los servicios del gestor autorizado nombrado que corresponde a la empresa "ASEIN" y se implementen o se materialicen en obra todo lo relativo a canecas de 55 galones para almacenar aceite quemado y filtros inservibles debidamente rotuladas, cumplimiento normas de seguridad industrial y control ambiental. En cada Informe ambiental se debe especificar el número de canecas y/o volumen almacenado acumulado y definir con ASEIN cual es el volumen mínimo para que se realice la recolección por parte de este gestor autorizado.

De esta empresa solo se adjunta un brochure que presenta los servicios que presta la misma, sin embargo, se carece de información y documentación legal de la misma, se solicita se adjunte a los Anexos del informe. No se comprende el resultado del Indicador propuesto en página 49 del 100% cuando no se tiene nada, como se observa:

Desarrollo Indicador
Autorizaciones de las empresas de recolección de residuos peligrosos AERespel AERespel = (Generación de ResPel en período/Empresas Autorizadas ResPel en período) x 100 AERespel = (-/-) * 100 = 100%

Subprograma 3.1: Seguimiento y Control al manejo de aguas superficiales.

Una observación que aplica para todo el Informe en general se redacta en tiempo verbal futuro como si las medidas fueran a ser implementadas posteriormente, cuando el objetivo de un informe mensual es hablar de lo ya ejecutado, realizado, cumplido, es decir, en tiempo verbal pasado. Tener en cuentas esta observación siempre.

A manera de ejemplo., se afirma que el Agua de uso industrial "*se realizara mediante la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL, líquido que será transportado en el carrotanque de la empresa y se almacenará en obra en un tanque metálico con capacidad de 12.000 litros…",* redactar en tiempo verbal pasado, colocar foto del tanque metálico de almacenamiento, etc.

Se presenta trazabilidad de cantidades, sin embargo, se carece de certificaciones, se solicita corregir cantidades, puesto que el TOTAL, debe ser el último valor acumulado no la suma de los mismos, revisar.

MES	PROVEEDOR	CANTIDAD (m^3)	CANTIDAD ACUMULADA (m^3)
11/06/2024 a 10/07/2024	IBAL	5,5	5,5
11/07/2024 a 10/08/2024		4,8	10,3
11/08/2024 a 10/09/2024		6,7	17
11/09/2024 a 10/10/2024		2,5	19,5
TOTAL			52,3

¿Cómo se llegan a estas cantidades de agua (m3) si el recibo de pago que se adjunta no lo indica?

¿Este indicador en página 50 a qué alude?

Desarrollo del Indicador
Manejo de aguas superficiales
((Número de medidas implementadas / Número de medidas programadas) X 100
CD = (2/2)*100= 100%

¿Cuáles son las dos medidas implementadas?

Se insiste en que no se detallan de medidas de control ambiental encaminadas al río Venadillo.

Subprograma 3.2: Seguimiento y Control al manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.

Falta evidencia de este sitio, debe estar señalizado y dotado con los elementos para la higiene personal de los trabajadores. Se supone debe existir unidad sanitaria para hombres y una segunda unidad sanitaria para mujeres.

Se debe adjuntar el listado de las baterías sanitarias ya seleccionas ubicadas en las viviendas cercanas al proyecto (nombre propietario/tenedor, ubicación, uso para hombres o mujeres).

Esa señalización que se observa en la fotografía es deplorable



Fuera de unidades sanitarias, no se menciona nada de vertimientos industriales (en agua y en suelos), que en el mejor de los casos no se tienen, pero hay que señalarlo en el documento.

No se observa ningún indicador.

3.4.1 Subprograma 3: seguimiento, control y monitoreo a la Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles

"*Son las unidades ambientales específicas biológicas, características físicas, estructuras y procesos proveen a la sociedad de bienes y servicios vitales. Así las cosas, los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país y son tres (3): paramos, humedales y bosques*". Buena definición y en efecto el proyecto no se desarrolla ni en páramos, ni en humedales ni en bosques, pero es una corriente superficial importante el cual requiere protección y conservación, en donde se deben implementar medidas de mitigación, corrección y compensación de los efectos adversos generados por la construcción del puente.

No es de aceptación lo que se indica:
"Por lo anteriormente expuesto, en el área de influencia directa del proyecto no se cuenta con un ecosistema sensible".

Corregir, y se espera que en el PAGA versión 2 se contemple una ficha específica para este tema.

Subprograma 5.1: Seguimiento, control y monitoreo a la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales.

El texto presentado aplicó meses atrás, redactar en tiempo verbal pasado y validar si en realidad se tienen solo los 20 m2. "*Para el desarrollo del contrato de obra 1665 de 2024, se realiza verificación de AID del proyecto para escoger área para la adecuación del campamento principal, para ello se contactó al sr. Jose Elias Encarnación Lozano con quien se firma acta de acuerdo para el uso del área con un área aproximada 20 m2 de ocupación, se adecuo el campamento con una bodega principal de manera rectangular donde se almacenan las herramienta, equipos menores, dotación y EPP, Equipos de Emergencias, como también el espacio con una mesa y sillas para atención a la comunidad".*

Falta esquema de ubicación del campamento. Además, se observa en las fotografías de la página 54 la ocupación de áreas externas adicionales con trompo, materiales, cerramientos, validar la información y actualizar al mes 4 reportado.

Colocar direcciones e información adicional de las do viviendas alquiladas en la vereda Vile Alto para la vivienda de los trabajadores. Indicar nombres propietarios/capacidad de albergue y cuantas personas se alojaron en el mes 4.

Subprograma 5.3: Seguimiento, control y monitoreo al manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Se solicita se corrija el reporte de vehículos y maquinaria utilizada durante el periodo del presente informe, puesto que existen discrepancias en lo evidenciado en obra por la interventoría y los soportes de inspecciones preoperacionales realizadas por el contratista en campo, como se menciona a continuación:

Maquinaria y/o reportada en informe No. 4 del contratista	Inspecciones allegadas en informe No. 4 de contratista	Maquinaria evidenciada por Interventoría	Documentación allegada en informe No. 4
Excavadora sobre Oruga Hyundai H940C	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Excavadora Sobre Oruga Shantui SE75	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Excavadora Sobre Oruga Hyundai 150C	Ok	Ok	Ok
Autohormiguera Dieci L3500	Ok	Ok	Ok
Autohormiguera Dieci L3500	Ok	Ok	Ok
Compresores	Ok	Ok	Ok
Planta eléctrica	Ok	Ok	Ok
Pulidora	Ok	Ok	Ok
Martillo neumático	Ok	Ok	Ok
No se reporta	**Ok**	**Motobomba**	**No se presento**
No se reporta	**Ok**	**Vibro de concreto**	**No se presento**
Volqueta Sencilla Chevrolet Kodiak TBL046	Ok	Ok	Ok
Volqueta Doble troque Freinghtliner SOP507	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Volqueta Doble troque Ketword USE683	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Carrotanque Agua International WFV172	Ok	Ok	Ok
Camioneta de Estacas Chevrolet Dimax ICL610	Ok	Ok	Ok

Es de aclarar, que la maquinaria mencionada previamente se menciona dentro de los reportes de formatos preoperacionales remitidos por el contratista semanalmente, las inspecciones ejecutadas a los vehículos y maquinaria presentadas por el contratista se adjuntan al presente informe en los anexos SST.

Las fotos de trasiego de combustible denotan falta de señalización, rotulación, demarcación, no se observa extintor en este sitio, realmente no denotan un adecuado manejo.

CONSIDERACION FINAL:
Como se ha advertido en meses anteriores, INVIAS considera según la complejidad que de determine para el proyecto la aplicación de Medidas de manejo Ambiental que pueden no estar contempladas en este Informe Mensual, por lo que la revisión de la Interventoría puede ser parcial e incompleta.

COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

El contratista plantea algunas de las fichas de gestión social que se contemplan en la Guía Ambiental de INVIAS, pero como no se tiene el documento PAGA aprobado por la interventoría, la Interventoría no puede realizar una revisión integral a este componente. No obstante, sobre la información presentada se considera necesario atender las siguientes observaciones:

Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

La Tabla. *Relación de Personal en Obra,* la información que contiene dicha tabla no coincide con las fechas de ingreso y retiro del personal presentado en informes de periodos pasados.

No se entiende porque se presentan 3 conductores de volquetas, cuando en el periodo solo opero 1 volqueta en la obra, tampoco 1 vigilante y 1 oficial, personal reportado con retiro en meses pasados.

Los datos de profesionales, trabajadores o colaboradores como lo señala el contratista de obra, deben ser cifras o datos que sean coherentes con lo que se reporta en los demás componentes como son el Área Técnica y el Área de seguridad y salud en el trabajo.

Hay una desproporción en la información presentada entre las tablas tituladas Personal de Obra No Calificada en el Contrato 1665 de 2024 (página 59) y Tabla. Relación de Personal en Obra (páginas 60-61). En esta última apenas se señala la ocupación y la cantidad. Se debe complementar la última tabla o modificar la presentación del contenido, separando mano de obra no calificada y los demás colaboradores.

Subprograma 1: Infraestructura de predios y servicios públicos

Hay que establecer si las cuatro actas de vecindad de inicio que se afirma se levantaron en el periodo reportado, en efecto se hicieron en el mes 4, o fue una actividad ya ejecutada en el Mes 1. Cuando se revisa el indicador Acta de Vecindad= 4/4 *100= 100%, por lo que se entendería que fueron actas de vecindad anteriores al Mes 4.

Se precisa ampliar la información de estas actas, en tabla que describa nombre propietario/tenedor, fecha del acta, localización predio y observaciones a destacar. Falta adjuntar planos/esquemas de construcción de las viviendas existentes.

Subprograma 1. Atención a la Comunidad.

Se establece que se considera que no es necesario contar con puntos de atención al usuario móviles, lo que se considera pertinente, sin embargo, en página 64 se presenta el Indicador, el cual debe ser retirado del informe.

Desarrollo del Indicador
Verificación de instalación de puntos móviles de información por frente activo.
Información = (Puntos móviles de información/ Frentes activos) x 100
Información = (-/ -) x 100 =

En la misma página se observa:

Consolidado de P.Q.R.S

QUEJAS	ACUMULADAS	PRESENTE PERIODO	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	0	0	
CERRADAS	0	0	
ABIERTA	0	0	
EN TRAMITE	0	0	
Fuente: Elaboración propia a partir de los recopilados en campo.			

Este cuadro debe llevar la trazabilidad de los meses 1, 2, 3 y 4, colocando los valores correspondientes y colocando la observación respectiva. No dejar celdas vacías.

Desarrollo del Indicador
Seguimiento y control en la gestión para el cierre de PQRS. Cierre PQRS = (PQRS cerradas/ PQRS presentadas) x 100 Cierre PQRS = (-/-) * 100 = 100%

Calcular el indicador = 0/0 *100 = 0%

Subprograma 2. Información y divulgación.

Se indica que para el Mes 4 no se realizaron reuniones con la comunidad, entonces porque el indicador presentado se calcula CD=(1/3)*100=33.33%. ¿A qué alude este resultado?

En cuanto a reuniones Veeduría y/o comité de participación se habla de su conformación que tuvo que ser en un periodo inicial. En efecto en el Anexo 3 se observa Acta de conformación de CPC del 17/06/2024, por lo que el texto debe colocarse esta fecha.

Dentro del Informe se deben dar los datos básicos de las personas que conforman este Comité y demostrar cómo se ha mantenido la **comunicación constante** en el mes 4 con este Comité.

Se deben realizar reuniones periódicas, ya han pasado cuatro meses y no se brinda soporte alguno de una segunda reunión, ni de cumplimiento de compromisos que se puedan fijar, ni de registro fotográfico de reuniones, etc.

En cuanto a piezas de comunicación, se indica que en el Mes 4 no se distribuyeron volantes. Se considera que para el mes 5 se debe hacer nuevamente esta actividad y en esta oportunidad si tomar una planilla para recoger firmas de quienes reciben el volante.

Se dice que no se aplica cartelera informativa. Para el mes 5 se debe tener una cartelera informativa con toda la información necesaria, esto es necesario.

En cuanto a cartas personalizadas, deben ser preparadas para informar a Autoridades municipales, empresas de transporte, comunidad y en general partes interesadas sobre el cierre de la vía, respecto a señalización y otros temas que se consideren pertinentes más aún para época decembrina donde hay fiestas y consumo de alcohol.

4.3.3 Subprograma 3: Cultura Vial Y Participación Comunitaria
Se espera se haya realizado la actividad programada para el 148/10/2024.


Revisar resultados de indicadores que se observan en página 66, a lo ejecutado en el mes 4.

4.3.4 Subprograma 4: Inclusión Social Con Perspectiva De Género Y De Transversalización

Revisar resultados de indicadores. Ejemplo: se habla de dos madres cabezas de hogar, pero el indicador di: Flexibilización = (1 / 1) x 100


La capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género, debe ser programada y realizada a la brevedad.

RESULTADO REVISION DE ANEXOS AREA AMBIENTAL




En el Anexo 1 se encuentran registros de asistencia a charlas e inducciones. Sin novedad

En el Anexo 2




Subcarpeta 1. Permiso de Ocupación de Cauce donde se despliega:



El archivo "*ACTA DE VISITA EVALUACIÓN AMBIENTAL CORTOLIMA EL DIA 4 DE JULIO DE 2024*", sin novedad.

En cuanto a la subcarpeta "*Radicado Solicitud Permiso"*

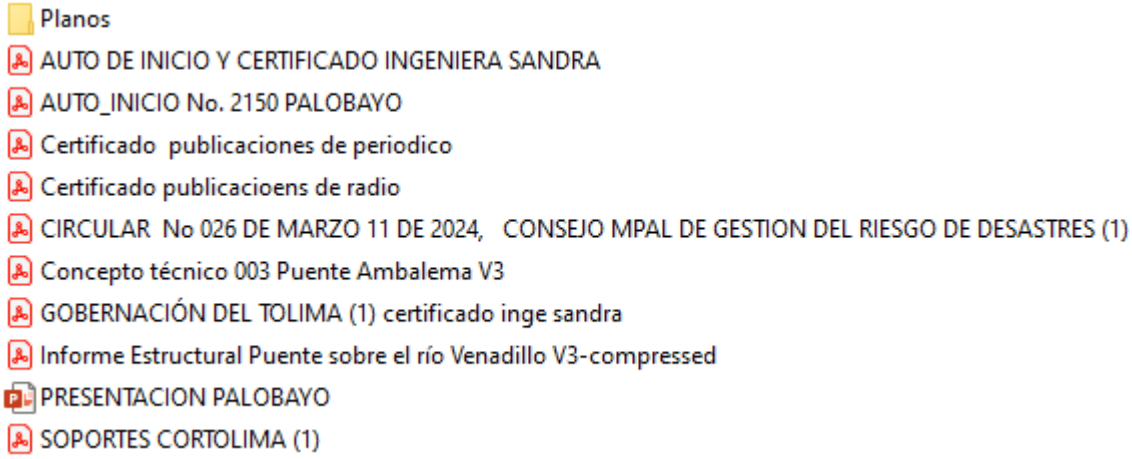

Datos relevantes de esta documentación debería ser nombrada en el Informe principal.

Subcarpeta 2. Manejo RCD. Se encuentran actas de predios de disposición, certificado de libertad de Hacienda Guadalupe y certificaciones de disposición de la siguiente manera:

- Hacienda Guadalupe: Junio, julio, agosto, septiembre.
- Predio Villa Blanca: Junio.

Sin novedad.

Subcarpeta 3. Manejo de aguas superficiales.

- Se adjunta Resolución No. 500 del 2020. Sin novedad.
- Se adjunta recibo de pago a IBAL SA. Sin novedad
- Se adjunta documento que soporta relación consorcial. Retirar este soporte, no tiene nada que ver con el tema de Aguas superficiales.


Subcarpeta 4. Manejo de residuos.
CONVENCIONALES Y BOLSAS DE CEMENTO:

- Se adjunta RUT INTERASEO S.A.S.E.S.P. Sin novedad
- Se adjunta soporte de solicitud carta de aceptación de disposición de residuos. Sin novedad, sin embargo, se solicita respuesta tan pronto sea enviada al contratista.

ESPECIALES O PELIGROSOS:

- Se adjunta Brochure empresa ASEI. Sin novedad, sin embargo, se solicita se presente a la interventoría la documentación legal y la carta de ofrecimiento en la prestación de servicios al contratista de obra.


En el Anexo 3. Fuentes de materiales se observa




Para las subcarpetas nombradas acero, alambre, cemento. Sin novedad, presentan UNICAMENTE certificación de calidad de materiales, sin embargo, se solicita se allegue la documentación legal de los proveedores de dichos materiales.

Para la subcarpeta nombrada Madera, sin novedad.


Para la subcarpeta nombrada Material Granular en la que se observa:




Certificaciones, sin novedad.



RESULTADO REVISION DE ANEXOS AREA SOCIAL



Anexo 1. Infraestructura De Predios, se visualiza lo siguiente:



Archivo en .pdf de 20 páginas, en las cuales se encuentran formatos de ACTA DE VECINDAD diligenciadas, firmadas por: Oliva Moreno, Gladis Moreno, Yessica Moreno, Lady Johan Encarnación. Como lo ha solicitado la Interventoría se precisan adicionar esquemas/planos de la infraestructura (viviendas).

En las subcarpetas 1, 2, 3, 4 se encuentran los registro fotográficos.

Anexo 2 Verificación de Buzones satélites

1 Control Punto SAU	2 CPS - Jul - Agos 2024.pdf 1 CPS - Jun - Jul 2024.pdf 3 CPS Ago-Sep 2024.pdf 4 CPS Sep-Oct 2024.pdf
2 Consolidado PQRS	1 CONSOLIDADO PQRS.pdf

Sin observaciones. Salvo que el formato de consolidación de PQRs debería estar dentro del documento principal.

Anexo 3

2 Volantes
1 CPC

Estos soportes son del Mes 1, no hay nada que demuestre acciones en el Mes 4.

Anexo 4

2. Oct 2024.pdf
1 Sep 2024.pdf

Sin comentarios.

COMPONENTE SST

5.2. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el periodo comprendido en este informe se reporta el uso de los siguientes vehículos y maquinaria:

Equipo	Marca	Referencia/placa
Carrotanque Agua	International	WFV172
Volqueta Sencilla Chevrolet	Kodiak	TBL046
Volqueta Doble troque	Freinghtliner	SOP507
Volqueta Doble troque	Ketword	USE683
Camioneta de Estacas	Chevrolet Dimax	ICL610

Equipo	Marca	Referencia/placa
Excavadora sobre Oruga	Hyundai	H940C
Excavadora Sobre Oruga	Shantui	SE75
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	150C
Autohormiguera	Dieci	L3500
Autohormiguera	Dieci	L3500
Compresores	COPCO	XAS88
Planta eléctrica	Baifa	6560
Pulidora	Makita	

Martillo neumático	Honda	GX-100

Sin embargo, dentro de la documentación allegada y lo reportado en el informe del contratista, se presentan las siguientes inconsistencias:

Maquinaria y/o reportada en informe No. 4 del contratista	**Inspecciones allegadas en informe No. 4 de contratista**	**Maquinaria evidenciada por Interventoría**	**Documentación allegada en informe No. 4**
Excavadora sobre Oruga Hyundai H940C	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Excavadora Sobre Oruga Shantui SE75	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Excavadora Sobre Oruga Hyundai 150C	Ok	Ok	Ok
Autohormiguera Dieci L3500	Ok	Ok	Ok
Autohormiguera Dieci L3500	Ok	Ok	Ok
Compresores	Ok	Ok	Ok
Planta eléctrica	Ok	Ok	Ok
Pulidora	Ok	Ok	Ok
Martillo neumático	Ok	Ok	Ok
No se reporta	**Ok**	**Motobomba**	**No se presento**
No se reporta	**Ok**	**Vibro de concreto**	**No se presento**
Volqueta Sencilla Chevrolet Kodiak TBL046	Ok	Ok	Ok
Volqueta Doble troque Freinghtliner SOP507	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Volqueta Doble troque Ketword USE683	No se presento	No estuvo en obra	N/A
Carrotanque Agua International WFV172	Ok	Ok	Ok
Camioneta de Estacas Chevrolet Dimax ICL610	Ok	Ok	Ok

Fuente. Elaboración propia – información suministrada en informe mensual de obra No 4, pag. 55.

DOCUMENTACION Y PARAFISCALES FALTANTES:

Aun así, y en conformidad con lo recibido por parte del contratista durante el periodo que corresponde al informe No.4, se recibe un cuadro que relaciona el personal en obra del contratista como se muestra a continuación:

Comparación personal en obra según contratista e interventoría

OCUPACION	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN VIAS Luis Fernando Urrego Hoyos	1	1
INGENIERO RESIDENTE: Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1	1
INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR: Diego Alejandro Reyes Afanador	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNIA: Juan Daniel Moya Robayo	1	1

OCUPACION	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INGENIERO ESPECIALISTA PAVIMENTOS: Diego Andrés Diaz Diaz	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Hugo Alberto Calvo Echevarría	1	1
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y AMBIENTAL: Jorge Alberto Ramos Salazar	1	1
COORDINADORA SST Gloria Astrid López	1	1
PROFESIONAL HSEQ: Franklin Ricardo Piragua Roa	1	1
AUXILIAR SST Mónica Marcela Cifuentes Méndez	1	1
INGENIERA AMBIENTAL AUXILIAR Angela Johana Vanegas	1	1
TOPOGRAFO Luis Enrique Garay Moreno	1	1
TOPOGRAFO AUXILIAR: Oliverio Rivas Rayo	1	1
OPERADOR DE MAQUINARIA DIRECTO Sixto Manuel Lamaza Vega Miguel Antonio Villalobos Gutiérrez	2	2
CONDUCTORES VOLQUETAS José Adán Rodríguez Calderón	3	1
CONDUCTORES Henry Rico Sanabria Alexander Ortigoza Leal	2	2
MAESTRO Romel Muñoz Páez	1	1
OFICIALES DE OBRA Nelson Fabian Culma Patiño	2	1
Vigilante Luis Carlos Naranjo	2	1

OCUPACION	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
Ayudantes de Obra	21	CUADRILLA CAISSON, AYUDANTES DE OBRA: 1. Kristian David Gutierrez Cardona 2. Lady Avila 3. Julio Ernesto Aranaga Londoño 4. Maicol Damian Lozano Aranzalez 5. Luis Fernando Navarro Segura 6. Luis Henry Rueda Pereira 7. Josky Esteban Sanchez Villada 8. Gabriel Orlando Silva Rondon 9. Juan Esteban Moreno Gualteros 10. Jose Jair Hoyos Diaz 11. Jose Alexander Barrios Martinez 12. Robinson Damian Perdomo Sanchez 13. Jose Armando Naranjo Moreno 14. Harold Arbelaez Nieto 15. Luis Andres Naranjo Cardozo 16. Wilson Esteban Moreno Mendoza 17. Jaider Rincon Patiño 18. Carlos Manuel Triana Lopez 19. Salomon Moreno 20. Jose Triana Hernandez CONSORCIO: 21. Robinson Briñez Diaz
Almacenistas Yeimi Amaya Lozano José Samuel Torres Gómez	2	2
TOTAL	**48**	**44**

Fuente: Tabla página 59, 60 y 61 del INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST del Periodo comprendido entre el 11 de septiembre al 10 de octubre de 2024, Versión 1 y cuadro CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA de Interventoría

Como se observa, hay discrepancias entre lo reportado por el contratista constructor y lo que la Interventoría tiene de manera contractual y lo observado en campo.

En cuanto a los profesionales y especialistas contractuales aprobados por la interventoría, se carece aún de la siguiente documentación:

Relación de documentos profesionales contratista.

NOMBRE	CARGO	DOCUMENTACIÓN PENDIENTE
Luis Fernando Urrego Hoyos	Director de obra / especialista en vias	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	Residente de obra	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Juan Daniel Moya Robayo	Especialista geotecnia	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Diego Andres Diaz Diaz	Especialista en pavimentos	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Hugo Alberto Calvo Echevarria	Especialista en estructura	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Jorge Alberto Ramos Salazar	Especialista en hidraulica / ambiental	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Franklin Ricardo Piragua Roa	Profesional HSEQ	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE
Luis Enrique Garay Moreno	Topografo	Pendiente parafiscales mes de SEPTIEMBRE

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, según los documentos presentados por el contratista, y la tabla mencionada anteriormente, existe discrepancia en el siguiente personal:

- 2 conductores de volquetas
- 1 vigilante
- 1 oficial

A continuación, se relaciona los documentos faltantes del periodo comprendido entre el 11 septiembre 2024 al 10 octubre 2024, puesto que las planillas de pago de seguridad social adjuntas no son legibles, se solicita sean remitidas en formatos que puedan ser claros para la correspondiente revisión por parte de la interventoría, al igual que la revisión del personal existente para el periodo del presente informe, como se evidencia a continuación:

Seguridad social contratista mes de septiembre

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social SEPTIEMBRE
Luis Fernando Urrego Hoyos	Director de obra / especialista en vias	Profesional	11/06/2024		No presento
Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	Residente de obra	Profesional	11/06/2024		No presento
Juan Daniel Moya Robayo	Especialista geotecnia	Profesional	11/06/2024		No presento
Diego Andres Diaz Diaz	Especialista en pavimentos	Profesional	11/06/2024		No presento

ALDEIC S.A.S BIC

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social SEPTIEMBRE
Hugo Alberto Calvo Echevarria	Especialista en estructura	Profesional	11/06/2024		No presento
Jorge Alberto Ramos Salazar	Especialista en hidraulica / ambiental	Profesional	11/06/2024		No presento
Franklin Ricardo Piragua Roa	Profesional HSEQ	Profesional	11/06/2024		No presento
Luis Enrique Garay Moreno	Topografo	Profesional	11/06/2024		No presento
Gloria Astrid Lopez Sanchez	Coordinadora SISO	Administracion	23/07/2024		No presento
Diego Alejandro Reyes	Ing. Auxiliar Residente	Administracion	15/06/2024		No presento
Angela Johana Vanegas	Profesional ambiental	Administracion	23/07/2024		No presento
Yeimi Amaya Lozano	Almacenista	Administracion	11/06/2024		No presento
Monica Marcela Cifuentes Mendez	Auxiliar SST	Administracion	19/07/2024		No presento
Oliverio Rivas Rayo	Topografo	Administracion	11/06/2024		No presento
Jose Samuel Torres Gomez	Almacenista	Administracion	11/06/2024		No presento
Sixto Manuel Lamaza Vega	Operador de maquinaria indirecto	Consorcio	11/06/2024		No presento
Miguel Antonio Villalobos Gutierrez	Operador de maquinaria	Consorcio	23/01/2024		No presento
Henry Rico Sanabria	Conductor	Consorcio	2/02/2024		No presento
Alexander Ortigoza Leal	Conductor Camioneta	Consorcio	12/01/2024		No presento
Jose Adan Rodriguez Calderon	Conductor de volqueta	Consorcio	6/06/2024		No presento
Luis Carlos Naranjo	Vigilante	Consorcio	22/07/2024		No presento

ALDEIC S.A.S BIC

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social SEPTIEMBRE
Robinson Briñez Diaz	Ayudante de obra	Consorcio	16/01/2024		No presento
Nelson Fabian Culma Patiño	Oficial de construcción	Caisson	2/07/2024		No presento
Kristian David Gutierrez Cardona	Ayudante de obra	Caisson	2/07/2024	16/09/2024	No presento
Lady Avila	Ayudante de obra	Caisson	2/07/2024		No presento
Romel Muñoz Paez	Maestro	Caisson	2/07/2024		No presento
Julio Ernesto Aranaga Londoño	Ayudante de obra	Caisson	2/07/2024		No presento
Maicol Damian Lozano Aranzalez	Ayudante de obra	Caisson	8/07/2024	21/09/2024	No presento
Luis Fernando Navarro Segura	Ayudante de obra	Caisson	2/07/2024		No presento
Luis Henry Rueda Pereira	Ayudante de obra	Caisson	8/07/2024		No presento
Josky Esteban Sanchez Villada	Ayudante de obra	Caisson	8/07/2024	2/09/2024	No presento
Gabriel Orlando Silva Rondon	Ayudante de obra	Caisson	8/07/2024		No presento
Juan Esteban Moreno Gualteros	Ayudante de obra	Caisson	28/07/2024		No presento
Jose Jair Hoyos Diaz	Ayudante de obra	Caisson	28/07/2024		No presento
Jose Alexander Barrios Martinez	Ayudante de obra	Caisson	20/07/2024		No presento
Robinson Damian Perdomo Sanchez	Ayudante de obra	Caisson	20/07/2024		No presento
Jose Armando Naranjo Moreno	Ayudante de obra	Caisson	20/07/2024		No presento
Harold Arbelaez Nieto	Ayudante de obra	Caisson	10/07/2024		No presento
Luis Andres Naranjo Cardozo	Ayudante de obra	Caisson	5/08/2024	25/09/2024	No presento
Wilson Esteban Moreno Mendoza	Ayudante de obra	Caisson	12/08/2024		No presento
Jaider Rincon Patiño	Ayudante de obra	Caisson	12/08/2024		No presento
Carlos Manuel Triana Lopez	Ayudante de obra	Caisson	12/08/2024	21/09/2024	No presento

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Seguridad social SEPTIEMBRE
Salomon Moreno	Ayudante de obra	Caisson	12/08/2024	21/09/2024	No presento
Jose Triana Hernandez	Ayudante de obra	Caisson	12/08/2024		No presento

Fuente: Elaboración propia

SOLICITUDES AL CONTRATISTA DE OBRA

Se solicita al Consorcio Puente Ambalema – Palobayo a tomar en cuentas las observaciones dadas en el presente comunicado los componentes de ambiente, gestión social y Seguridad y salud en el trabajo, de tal forma que se presente una segunda versión del Informe Mensual No. 4, con datos de personal, cantidades de obra, maquinaria, vehículos, entre otros, que coincidan tanto en los aspectos técnicos, ambientales, sociales y SST.

Por otra parte se reitera la necesidad de subsanación de las observaciones emitidas por la interventoría a los informes mensuales previos, cuyo ajuste era parte de los compromisos adquiridos por el contratista de obra en comité de obra realizado el día 08/10/2024, pero que a la fecha no han sido recibidos en su versión ajustada. Para tener en cuenta se detallan a continuación los oficios de observaciones de interventoría a cada uno de los informes mensuales pendientes de ajuste y/o complemento:

Informe	Periodo	Oficio Interventoría
INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – SOCIAL-SST No. 1	11 de junio al 10 de Julio de 2024	CA-285-0033-0071-24 de fecha 30/08/2024.
INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – SOCIAL-SST No. 2	11 de Julio al 10 de agosto de 2024	CA-285-0036-0088-24 de fecha 10/09/2024.
INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – SOCIAL-SST No. 3	11 de agosto al 10 de septiembre de 2024	CA-285-0043-0122-24 de fecha 30/09/2024.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría

Elaboró: C. Alfaro – Especialista Ambiental
P. Castiblanco – Profesional HSEQ
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., noviembre 6 de 2024

CA–285-0058-0238-24

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Atn: Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría Nº 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Entrega informe mensual No.4 del 11 de septiembre al 10 de octubre 2024

Respetados Señores:

Atendiendo a lo requerido por la Gobernación del Tolima, remitimos a ustedes el Informe Mensual No 4 del contrato de referencia.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC



DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: S. Guarín - Ing., Apoyo
Revisó: D. Riveros – Coordinadora de Interventoría
Aprobó: C. Alfaro – R.L.
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 6 noviembre de 2024

CA–285-0059-0244-24

Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Observaciones documento PAGA Versión 0.1 de fecha 28/08/2024

Respetados señores (as),

La Interventoría ha revisado en detalle el documento PAGA versión 0.1 fecha 28/08/2024 pero presentado por el contratista de obra el día 23/10/2024, y teniendo en cuenta las observaciones descritas por la interventoría mediante comunicados C-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024 y CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024; con base en dichos requerimientos, en el siguiente cuadro se hace una verificación de los ajustes, correcciones o complementos de los oficios señalados anteriormente:

<table>
<tr><th>Observación interventoría comunicado CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024</th><th>Verificación</th></tr>
<tr><td colspan="2">OBSERVACIONES GENERALES COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL</td></tr>
<tr><td>Corregir el nombre del contratista constructor. El documento no señala que es la versión 0 (versión inicial), debe contar con los demás datos:
INDICE DE MODIFICACIONES
<table>
<tr><th>INDICE REVISION</th><th>CAPITULO MODIFICADO O ADICIONADO</th><th>FECHA DE MODIFICACION</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>Versión 0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Versión 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Versión 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Versión 3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Se subsana.
<table>
<tr><th>INDICE REVISION</th><th>CAPITULO MODIFICADO O ADICIONADO</th><th>FECHA DE MODIFICACION</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>Versión 0.0</td><td>Elaboración Documento</td><td>06/08/2024</td><td>Se realiza proyección del documento PAGA con sus respectivos anexos</td></tr>
<tr><td>Versión 0.1</td><td>Ajustes
- Análisis Nivel de Complejidad
- Implementación de cartografía de complejidad
- Firmas Profesional en subprogramas y Seguimiento y Monitores</td><td>28/08/2024</td><td>Se realizan ajustes a las observaciones realizadas por la interventoría</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Datos de revisión y aprobación, así:
<table>
<tr><th colspan="5">REVISIÓN Y APROBACIÓN.</th></tr>
<tr><th colspan="2">NÚMERO DE REVISIÓN</th><th>0.0</th><th>0.1</th><th>0.2</th><th>0.3</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Especialista Ambiental CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO</td><td>Nombre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vo. Bo. R. Legal CONTRATISTA</td><td>Nombre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Se subsana.
<table>
<tr><th colspan="5">REVISIÓN Y APROBACIÓN.</th></tr>
<tr><th>NÚMERO DE REVISIÓN</th><th></th><th>0.0</th><th>0.1</th><th>0.2</th><th>0.3</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Especialista Ambiental CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO</td><td>Nombre</td><td>Jorge A. Ramos</td><td>Jorge A. Ramos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td>06/08/2024</td><td>08/30/2024</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vo. Bo. R. Legal CONTRATISTA</td><td>Nombre</td><td>Ricardo Ortigoza</td><td>Ricardo Ortigoza</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td>06/08/2024</td><td>08/30/2024</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Cra. 18 No. 116-24, Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: interventoriapuentevenadillo@gmail.com
Tel. 6012136402 – 311 2027033

Observación interventoría comunicado CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024	Verificación
Numeral 3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO, no es claro el procedimiento con el cual se determina que el nivel de complejidad es bajo, pero que el contratista lo sube a la categoría de Media- Baja. El análisis debe llegar al cálculo numérico definiendo todas las variables previamente, y teniendo en cuenta: - Sensibilidad Ambiental Tabla 3. Variables establecidas para cada medio, páginas 603 a 606 de la Guía Ambiental - Sensibilidad Social PÁGINAS 606 a 608 de la Guía Ambiental	Tema desarrollado en el numeral 3.3. Se llega a la clasificación de nivel de complejidad de Media-Baja
Numeral 4.1 Área de Influencia. Si bien se listan los criterios o aspectos considerados, cuál fue el resultado o caracterización de cada criterio que condujeron a la definición del área de influencia, y en donde se presenta el mapa. Dentro del documento debería presentarse una figura.	El contratista presenta matriz de riesgos teniendo en cuenta los aspectos considerados en el área de influencia, se encuentran Figuras de sensibilidad del proyecto, pero como tal un plano de área de influencia del proyecto no se tiene.
Numeral 6. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. Se detalla en tabla sin numerar los Programas de Gestión Ambiental y Social que aplican para el Proyecto, que corresponden al grado de complejidad media-baja (asumiendo que esta calificación es la correcta, lo que se constata una vez se califique como se solicitó anteriormente).	Se subsana, ahora corresponde a la Tabla 15. Programas de Gestión Ambiental y Social que Aplican para el Proyecto. No obstante, no se comprende porqué se suprimió el Programa 3. Gestión hídrica y atmosférica Este tema tiene dos subprogramas para la planificación de medidas de manejo a implementar para la conservación y protección de los recursos agua y aire Subprograma 3.1 manejo de aguas superficiales, donde las actividades relacionadas aluden a seguimiento en la construcción de obras con ocupación de cauce, seguimiento a las actividades de compra de agua a terceros, seguimiento a uso de las aguas lluvias. Subprograma 3.2 manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Para complejidad media- baja el Subprograma 4.3 no aplica Falta agregar el Subprograma 5.1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales.

Observación interventoría comunicado CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024	Verificación
Ninguno de los subprogramas cuenta con la firma del profesional.	Se subsana
SUBPROGRAMAS COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL	
Subprograma 1.1: Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social El ejecutor conformará el grupo de profesionales, se precisa se coloca tabla con datos de nombres, cédula, cargo, celular, correo de cada miembro de este Grupo de profesionales que están en el contrato de obra.	Se subsana
Subprograma 1.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra "…*se debe establecer el cronograma de capacitación, en el cual se indique la fecha, temas y a quien va dirigida la capacitación*". Este cronograma debe anexarse al PAGA debidamente formulado.	Se subsana
SUBPROGRAMA 3.1: Cumplimiento de Requerimientos Legales Tema incompleto, hay que complementar todo lo referente a terceros o proveedores o gestores autorizados. Se reitera la inclusión en el subprograma y los debidos soportes en anexos de: a. Señalar en el texto el permiso minero, permiso ambiental y No. RUCOM de la Fuente de material b. Proveedor de mezcla asfáltica: permiso de emisiones atmosféricas vigente, RUT, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. Información minera y licenciamiento ambiental de los insumos granulares para la producción de mezcla asfáltica c. Proveedor de agua de uso industrial: Concesión aguas uso industrial vigente, RUT con actividad económica correspondiente, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. d. Gestor de residuos peligrosos: RUT, permisos o licencias ambientales, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. e. Empresa reciclaje: RUT, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo f. Empresa de servicio de recolección de basuras: carta de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo	Se mencionan los documentos, mas no se referencia la carpeta de anexos que los contiene, sin embargo, al revisar anexos se encontró: a. No se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio ni documentación legal de proveedores de acero, alambre, cemento b. No se menciona, pendiente al entrega de información c. No se presenta concesión de aguas, no se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio d. No se adjunta la documentación mencionada, no se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio, queda pendiente información e. No se menciona, queda pendiente información f. No se adjunta carta de ofrecimiento, sin embargo, se presenta tramite g. Se subsana, uso de baños existentes y conectados a pozo séptico h. Se adjunta documentación de dos predios para nivelación topográfica, Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo

Observación interventoría comunicado CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024	Verificación
g. Proveedor de baños: acuerdo firmado con propietario, fotografías h. Para disposición de RCD también a este nivel de avance de obras se debe concretar los datos de los sitios, volúmenes estimados de RCD, y adjuntar todos los soportes incluyendo Alcaldía Municipal y si es necesario de Cortolima.	y Predio Villa Blanca de Propiedad de la señora Blanca Lucy Sánchez, el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito de material. Se allego documento correspondiente al certificado de tradición y libertad, que detalla y describe la siguiente información sobre el predio Hacienda Guadalupe: ✓ Ubicación: Ambalema ✓ Área: 624 ha, 4671 m^2 ✓ Tipo de predio: rural ✓ Destinación económica: no registra En referencia al uso de suelo no se presentó Certificado de Uso de suelo de los predios indicados Con respecto al predio Villa Blanca no se allegó información referente a ubicación, capacidad del mismo, queda pendiente falta información
Subprograma 3: Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles. En página 80, hay imagen invertida	Se subsana. No obstante, para el nivel de complejidad determinado, esta ficha no aplica
Numeral 8 Programa de seguimiento y monitoreo. El contratista debe formular un programa como tal, se reitera que se debe cumplir con las disposiciones contenidas en el Volumen 5 (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO) páginas 413 a 499 de la Guía Ambiental de INVIAS, esto ya había sido requerido en comunicado previo.	Esto es todo lo que se observa: 8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO El seguimiento es el conjunto de decisiones y actividades planificadas para el cumplimiento de los indicadores de éxito, que son establecidos para cada objetivo propuesto en los proyectos de los diferentes subprogramas. En el Anexo 9. Indicadores de seguimiento y monitoreo se observan las fichas con las respectivas acciones a tener en cuenta durante el desarrollo del proceso constructivo Se referencia al Anexo 9, textos que deberían hacer parte del documento principal. En la medida en que el capítulo anterior tendrá ajustes, este capítulo también será modificado.
REVISIÓN DE ANEXOS COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL	
ANEXO 2 PLAN DE INVERSIÓN. Archivo EXCEL dañado, no abre Archivo PDF. Comprende proyectos y actividades que no hacen parte de los Subprogramas presentados en el PAGA. Contiene actividades que no aluden a medidas compensatorias objeto de	Se observa formato INVIAS MASPS-MN1-IN-1-FR-2 titulado PLAN DE INVERSION AMBIENTAL, con casillas incompletas, sin datos de interventoría, sin datos de valores de contratos, con la inclusión de actividades y/o obligaciones de rubros que INVIAS no reconoce (ver Guía Ambiental 2022) como

Observación interventoría comunicado CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024	Verificación
reconocimiento, más aún cuando el permiso de ocupación de cauce no ha sido emitido por Cortolima. Hay muchas actividades que no son una realidad en el proyecto No se comprende porque hay dos archivos, uno en PDF que no corresponde al otro archivo en Excel. INVIAS tiene dentro de su Manual de Interventoría otra plantilla de formato para el Plan de Inversión Social, el cual no existe en este Anexo.	puede ser a manera de ejemplo: Profesional SST, Profesional Ambiental, Ayudante de Obra, Tarifa de Evaluación - Permiso de Ocupación de Cauce, Medidas de señalización a implementar durante la ejecución de las obras en el proyecto. No se comprende porque en este formato se incluyen rubros de gestión social. Para el Plan de Inversión Social INVIAS tiene otro formato específico. Igualmente, no hay reconocimiento de rubros como: Recepción de hojas de Vida, revisión y selección del personal de acuerdo a lo requerido en obra, Verificación de la contratación de mano de obra, igualdad de género, instalación del SAU y aplicación de medidas y muchas más. Un aspecto de forma, es disminuir ancho de columnas, mejorar tamaño de letra, de tal manera que cuando se imprima sea legible.
ANEXO 4. CRONOGRAMA PROYECTO En ambos archivos agregar columna o fila en cada mes para llevar la trazabilidad de cumplimiento. a. Cronograma social. Hay cuatro actividades que no fueron programadas en los 6 meses. Validar la inclusión de la totalidad de actividades del plan de gestión social. b. Cronograma ambiental. Verificar que las actividades correspondan a lo descrito en el PAGA, para los subprogramas contemplados.	a. Se subsana b. Se subsana
ANEXO 6 MANEJO AMBIENTAL MATERIALES. Se allega un RUCOM vigente hasta el 31 de julio 2025 y un certificado de Cortolima emitido el 05/06/2024 en la que se detallan todos los antecedentes y se constata la cesión de la licencia ambiental a favor de Triturados y Vías La Caima S.A.S. Falta adicionar el acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. No sobra recordar que se debe contar con certificados emitidos por esta empresa para cada mes en donde se detalle tipo y cantidad de material suministrado al Contrato de Obra Nº 1665 de 2024.	No se presenta el acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. Tampoco se presenta la documentación que previamente se ha mencionado en referencia a proveedores de materiales. Se debe aportar la información. Ver observaciones previas en este tema
REQUERIMIENTOS FINALES COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL	

Observación interventoría comunicado CA-285-0031-0064-24 de fecha 21/08/2024	Verificación
Documento general, sin mayor especificidad de contenido de subprogramas	Ver observaciones del presente comunicado
sin una definición clara del nivel de complejidad.	Se subsana
no existe anexo de cartografía.	Se adjuntan imágenes generales del país y el departamento del Tolima, mas no se adjunta cartografía a detalle del proyecto.
no se formularon las medidas de monitoreo y de seguimiento.	Están en un anexo, una vez ajustado se debe incorporar al documento principal
plan de inversión ambiental no atiende las directrices de INVIAS en cuanto a que es dirigido al establecimiento de las medidas compensatorias objeto de reconocimiento que imponga Cortolima.	Continua sin correcciones
No se adjuntó el formato INVIAS para el Plan de Inversión Social.	No existe este formato
OBSERVACIONES COMPONENTE DE GESTION SOCIAL	
Firma del profesional que elaboro el PAGA, pues no se presenta, el profesional responsable de elaboración de la ficha de firmar cada Ficha.	Se subsana
Subprograma 10.1: Atención A La Comunidad – se deberá especificar los horarios exactos del punto de atención al usuario.	Se subsana

Observación interventoría comunicado C-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Verificación
CONTENIDO	
Introducción	Se subsana
Objetivos	Se debe corregir el año del número de contrato de obra en OBJETIVO GENERAL, al igual que en ítem. ALCANCE DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA).
a. Información contractual según el pliego de condiciones. b. Decreto 1076 de 2015 o aquella norma que lo modifique, reemplace o sustituya	a. Se subsana b. Se subsana
Localización general y específica del proyecto	Se subsana
Descripción del proyecto (de conformidad con el anexo técnico del contrato)	Se subsana
Identificación de la complejidad del proyecto según lo establecido en el volumen II	Se subsana
Definición del área de influencia (numeral 5.2.1-5.3.1 y 5.4.1 según sea el caso volumen III) y Línea Base	Se subsana
Cartografía del área de influencia (según lineamientos establecidos en el volumen III	Se presentan solo diagramas de mapas generales del departamento del Tolima, no se muestra cartografía a detalle del AID dentro del cuerpo del documento.

Observación interventoría comunicado C-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Verificación
Demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (según lineamientos establecidos en el volumen III).	Se presenta relación correspondiente, sin embargo, no se menciona documentación en carpeta de anexos de proveedores, terceros y/o gestores autorizados
Evaluación ambiental e identificación de impactos acumulativos potenciales (según lineamientos establecidos en el volumen III).	Se subsana
Formulación de medidas de manejo según lo establecido en el volumen V (numeral 5.2.2 - 5.3.2 y 5.4.2 según sea el caso).	Por ajustar según nivel de complejidad, considerando que hay subprogramas que no aplican.
Formulación de medidas de monitoreo y seguimiento (numeral 5.2.2-5.3.2 y 5.4.2 según sea el caso).	Ver comentarios previos
ANEXOS	
Plan de contingencias ambientales (proyectos de complejidad media-alta y alta)	Se subsana
Formatos aplicables del Manual de Interventoría y sus anexos	Realmente solo se presentó el Plan de Inversión ambiental, no hay Plan de inversión social ni FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS (MASPS-MN1-IN-1-FR-1)
Relación de permisos y/o autorizaciones ambientales y social necesarios/obtenidos de los entes competentes.	a. Fuentes de materiales: No se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio ni documentación legal de proveedores de acero, alambre, cemento b. Proveedor de mezcla asfáltica: No se mencionan opciones ni se adjunta documentación c. Proveedor de agua de uso industrial: No se presenta concesión de aguas, no se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio d. Gestor de residuos peligrosos: No se adjunta la documentación mencionada e. Empresa reciclaje: No se menciona f. Empresa de servicio de recolección de basuras: No se adjunta carta de ofrecimiento, sin embargo, se presenta tramite g. Proveedor de baños portátiles: Se subsana, uso de baños existentes y conectados a pozo séptico
Anexo cartográfico (cartografía, metadatos y GDB cartografía base y GDB temática según el modelo de datos del ANLA vigente)	Se presentan solo diagramas de mapas generales del departamento del Tolima, no

Observación interventoría comunicado C-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Verificación
	se muestra cartografía a detalle del AID dentro del cuerpo del documento.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA	
Presentar cuadro de control de cambios en donde se lleve la trazabilidad de las versiones, fechas y modificaciones realizadas al mismo	Se subsana, sin embargo, se deben colocar las fechas de presentación del documento que corresponden, porque este PAGA no fue elaborado en agosto 2024
Marco Legal Aplicable al Proyecto: Señalar normas incluyendo las emitidas por Cortolima que deban ser consideradas en el Proyecto.	Se subsana
En descripción del proyecto, incluir fotografías de las condiciones iniciales del proyecto. Describir las fases o actividades del proyecto (pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento), maquinaria y equipo mínimo requerido para la intervención, insumos requeridos como materiales de construcción, materiales sobrantes y cómo será su manejo y disposición, proveedores de materiales, empresas de recolección residuos ordinarios, respel, reciclables, estimación de los volúmenes de residuos, su clasificación de residuos sólidos. Se debe identificar los impactos previsibles y plantear las correspondientes medidas de manejo. Adjuntar costos del proyecto, organigrama del proyecto ni una descripción general de las funciones del personal encargado, programa de obra.	No se presentan las fotografías dentro del cuerpo del documento.
En Línea Base, si bien se toma información secundaria del Contrato 4666 del 2022 realizado por el Consorcio Venadillo 182 ahora según el nivel de complejidad (baja, media-baja, media-alta o alta) que se determine, se deberán desarrollar los componentes y en la profundidad necesaria. Esto quiere decir, que en el capítulo de Línea Base se debe brindar información en el medio abiótico de geotecnia, suelos y uso de suelos, en el medio biótico considerar flora y fauna y en el medio socioeconómico presentar información sobre el componente territorial, componente demográfico, económico, político organizativo e institucional). Esto precisa recolectar información primaria y no solo la obtenida del Esquema de Ordenamiento Territorial, como se observa en el PAGA Versión 0 del Consorcio Venadillo 182.	Se subsana
Demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. Según el PAGA de la etapa de	No se referencia cual carpeta de anexos contiene la información sobre la

Observación interventoría comunicado C-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Verificación
estudios y diseños, se estableció la necesidad de obtener los siguientes permisos: - Concesión de aguas - Permiso de Ocupación de Cauces - Plan de gestión RCD - Permiso de Aprovechamiento Forestal Ahora en el PAGA el CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO debe definir claramente el tema, reportar las gestiones realizadas y anexar los soportes de trámites, actos administrativos, oficios enviados a Cortolima, etc.	documentación mencionada correspondiente a los permisos requeridos. En cuanto a materiales de construcción se establece que serán suministrados por la empresa Vías La Caima SAS, de la cual se anexa documentación en el ANEXO 3, lo cual NO es verdad, puesto que en la carpera de anexos este corresponde al plan de contingencia, se debe corregir.
MEDIDAS DE MANEJO. Es importante recalcar que según el grado de complejidad del proyecto las fichas a considerar varían.	Hacen falta incorporar fichas para la complejidad medio-baja
Es de anotar que el PAGA realizado en febrero 2023 por el Consorcio Vendadillo 182 NO determinó el Nivel de Complejidad del proyecto; por esto se ilustra a manera de ejemplo, las exigencias para una complejidad Media-Baja, sin embargo, el CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO debe determinarlo siguiendo la metodología indicada por INVIAS en su Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura -MODO CARRETERO, 2022 (Volumen 2).	Se subsana
La estructura de cada ficha debe ser ajustada y profesional responsable de elaboración de la ficha de firmar cada Ficha.	Se subsana
En el tema de INDICADORES, no obviar los propuestos por INVIAS en el Volumen 5 (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO) páginas 413 a 499).	Están en un Anexo, deben ser complementados y trasladados al documento principal
PROVEEDORES Y TERCEROS AUTORIZADOS En el documento PAGA se debe nombrar en capítulos y fichas pertinentes y adjuntando los soportes que respalden: a. Fuentes de materiales: contrato de concesión minero, licencia ambiental, RUT, RUCOM vigente, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema- Palobayo b. Proveedor de mezcla asfáltica: permiso de emisiones atmosféricas vigente, RUT, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. Información minera y licenciamiento ambiental de los insumos granulares para la producción de mezcla asfáltica	Se mencionan los documentos, mas no se referencia la carpeta de anexos que los contiene, sin embargo, al revisar anexos se encontró: a. No se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio ni documentación legal de proveedores de acero, alambre, cemento b. No se mencionan opciones ni se adjunta documentación c. No se presenta concesión de aguas, no se presenta acuerdo comercial o de ofrecimiento al Consorcio d. No se adjunta la documentación mencionada

Observación interventoría comunicado C-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Verificación
c. Proveedor de agua de uso industrial: Concesión aguas uso industrial vigente, RUT con actividad económica correspondiente, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. d. Gestor de residuos peligrosos: RUT, permisos o licencias ambientales, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. e. Empresa reciclaje: RUT, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo f. Empresa de servicio de recolección de basuras: carta de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo g. Proveedor de baños portátiles: Licencia o permisos ambientales, RUT, acuerdo comercial o de ofrecimiento servicio al Consorcio Puente Ambalema-Palobayo	e. No se menciona f. No se adjunta carta de ofrecimiento, sin embargo, se presenta tramite h. Se subsana, uso de baños existentes y conectados a pozo séptico

Por último, teniendo en cuenta las obligaciones descritas y adquiridas por parte del contratista con la firma del contrato de obra de la referencia en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8.OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 22, 37 y 38* y en cumplimiento a la Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 *"Por la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modos marítimo y fluvial 2022*" emitida por el Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías INVIAS, se solicita, se realicen los ajustes, modificaciones y complementos para la presentación de la versión 0.2 del documento PAGA para su correspondiente revisión y aprobación.

Es necesario que el oficio remisorio detalle la respuesta a las observaciones dadas por la Interventoría.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., 07 de noviembre de 2024

CA–285-0060-0245-24

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Atn: Ing. HAROL LEAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Director de Infraestructura
Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría Nº 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Solicitud corrección numero de documento de identidad – Solicitud de prorroga

Respetados señores (as),

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la corrección del numero de identidad de Claudia Alicia Alfaro de Los Rios Represéntate Legal de ALDEIC S.A.S BIC en su calidad de interventoría, debido a que, en la SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO de la referencia se encuentra un error en el número de cedula.

Dicho lo anterior, se solicita la modificación del documento de solicitud de adición y prorroga con el numero de identificación correcto.

C.C 39.691.684 de Bogotá

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: D.Riveros – Directora Interventoria
Revisó: D.Riveros – Directora Interventoria
Aprobó: D. Riveros – directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ALDEIC S.A.S BIC

Bogotá, D.C., noviembre 13 de 2024

CA–285-0061-0255-24

Señores:
CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO
Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González
Contratista de obra
Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra Nº 1665 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ASUNTO: Solicitudes SST, certificación en cursos de altura, certificados de elementos de alturas para trabajadores de ICMO SAS y otras solicitudes del componente de gestión ambiental.

Respetados señores (as),

Según las obligaciones descritas y adquiridas por la parte contratista con la firma del contrato de obra de la referencia en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 13,15, 18, 27* y dando cumplimiento a los requisitos legales aplicables al área de Seguridad y Salud en el Trabajo; como lo es el Decreto Único Reglamentario Trabajo 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.11; Artículo 2.2.4.6.12; Artículo 2.2.4.2.2.18, la ley 100 de 1993 y el CST (Código Sustantivo del Trabajo) Articulo 23 y 24.

Se solicita la presentación de los siguientes soportes del personal a adelantar actividades **encaminadas al montaje de la estructura metálica a cargo de ICMO SAS** del contrato de obra citado en la referencia:

- Soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes o contratistas que se encuentran vinculados a la actividad de montaje de la estructura metálica.
- Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal y dotación del personal vinculado a la actividad de montaje de la estructura metálica.
- Conceptos de exámenes de ingreso (EMO) o periódicos de los trabajadores que se encuentran vinculados a las labores en mención (montaje de la estructura metálica).
- Soportes de inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a los trabajadores vinculados a las actividades de montaje de la estructura metálica de manera previa al inicio de sus labores.
- Afiliaciones y/o soportes de pago de seguridad social integral de los trabajadores vinculados las labores de montaje de la estructura metálica.
- Cronograma de capacitaciones diarias a inicio de cada semana, y al final de la misma las evidencias de las mismas.
- Planillas pre operacionales de los equipos y/o maquinaria (grúa telescópica, equipos de soldadura, plantas eléctricas, etc.).
- Presentar la trazabilidad del ingreso del personal que labora en la actividad de montaje de la estructura metálica, a manera de ejemplo en un cuadro como se muestra a continuación:

NOMBRE	CEDULA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA
xxx	xxx	xxx	xxx

Es de tener en cuenta, que en cumplimiento a la Resolución No. 4272 del 2021 expedida por el Ministerio de Trabajo, en sus artículos 2, 4, 15, 22, 23, 24, 27 y 61; así como lo mencionado en el Decreto Único Reglamentario Trabajo 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.24 y la Resolución No. 0491 del 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo, en sus artículos 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; se solicita:

- **Remitir a la presente interventoría las certificaciones de trabajo en alturas para TODOS los trabajadores que se encuentran laborando en la actividad de montaje de la estructura metálica,** se recuerda que el personal debe contar con los requisitos de seguridad emanados en el marco normativo aplicable en total cumplimiento, además manifestamos que cualquier eventualidad con el personal que adelanta la actividad es de exclusiva responsabilidad del contratista de obra.
- Remitir el programa de prevención y protección contra caída en alturas.
- Certificación de todos los elementos utilizados en trabajo en alturas (eslingas, mosquetón, anclajes, conectores, ganchos de seguridad, arnés, línea de vida, cascos con barbuquejo, etc.) utilizados dentro del montaje de la estructura metálica.

Se solicita al contratista constructor que en cumplimiento al Código sustantivo del trabajo "*prohibición de sustancias psicoactivas en el trabajo*", el Decreto 120 de 2010 "*por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol";* presentar la política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas del contratista constructor y de ICMO SAS para el desarrollo de sus actividades de montaje de la estructura metálica.

Por otra parte, se requiere que el contratista realice la respectiva señalización y demarcación al sitio de acopio de las bolsas de cemento, y se indique a la interventoría la cantidad de bolsas que representan 1m3, teniendo en cuenta que el contratista informo en los respectivos informes presentados a la interventoría la entrega de estas al llegar a un tope de 8m3 y a la fecha de terminación del informe No. 4 se llevaba un reporte de 3400 unidades al 10/10/2024.

De igual manera es pertinente que el contratista constructor realice la verificación de la cantidad de agua industrial que esta reportando en los informes y lo real utilizado en la obra, puesto que la interventoría en sus chequeos diarios evidencio que la capacidad del carrotanque es de 12m3, y para la fabricación de 2m3 de concreto se utilizan 0,5m3 de agua; con base a esto, y teniendo en cuenta que para la actividad de fundido de CAISSON en su totalidad y lo reportado en el acta parcial No.1 los valores son superiores a los reportados por el contratista en el informe como se muestra a continuación:

MES	PROVEEDOR	CANTIDAD (m^3)	CANTIDAD ACUMULADA (m^3)
11/06/2024 a 10/07/2024	IBAL	5,5	5,5
11/07/2024 a 10/08/2024		4,8	10,3
11/08/2024 a 10/09/2024		6,7	17
11/09/2024 a 10/10/2024		2,5	19,5
TOTAL			52,3

Ilustración 1. Tomado de la página 50 del informe No.4 presentado por el contratista constructor.

De acuerdo a lo anterior, quedamos atentos a la respuesta del presente comunicado con la presentación de los documentos relacionados; en cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial aplicables garantizando la seguridad de los trabajadores del proyecto.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
Directora Interventoría
Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ
Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría
Copia. Archivo de Interventoría

ANEXO No. 08

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TECNICO



NOTA: ACTIVIDADES DE CURADO DE VIGAS COSTADO AMBALEMA



NOTA: RELLENOS DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE RECEBO COSTADO AMBALEMA



NOTA: ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE FORMALETA , AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CABEZAL Y TOPES SISMICOS



NOTA: LIBERACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y ENCOFRADO VIGA CABEZAL



NOTA: MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y ENSAYO DE ASENTAMIENTO - VIGAS AMBALEMA



NOTA: CHEQUEO COTA VIGA DE ESTRIBO SECTOR AMBALEMA (PUNTA AGUAS A BAJO COTA 234,505)(COTA CENTRO VIGA 234,51)(PUNTA AGUAS ARRIBA 234,525)

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TECNICO



NOTA: RELLENOS DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE RECEBO COSTADO PALOBAYO



NOTA: IZAJE DE TUBERÍA FALSO APOYO E IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOLDADURA DE SECCIONES VIGAS PRINCIPALES



NOTA: IINSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL ESTRIBO Y VIGA DE APROCHE COSTADO AMBALEMA



NOTYA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI, PARA VIGAS Y ESTRIBOS COSTADO AMBALEMA - VIGA APROCHE

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SST, AMBIENTAL Y SOCIAL



NOTA: Manejo material granular en obra



NOTA: Inspeccion puntos ecologicos




NOTA: Manejo concreto en obra



NOTA: Demarcacion y cerramiento de obra



NOTA: Reunión avance de obra con comunidad

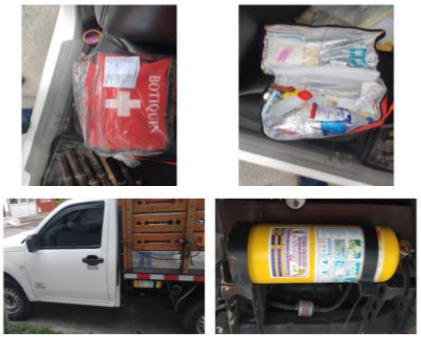

NOTA: Kit emergencias camioneta que transporta combustible



NOTA: Almacenamiento residuos peligrosos en obra



NOTA: Almacenamiento de bolsas de concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SST, AMBIENTAL Y SOCIAL




NOTA: Inspección preoperacional vehiculos obra



NOTA: Instalacion de señaliacion para reiterar cierre total de la via



NOTA: Inspeccion a cerramiento perimetral - montaje estructura metalica

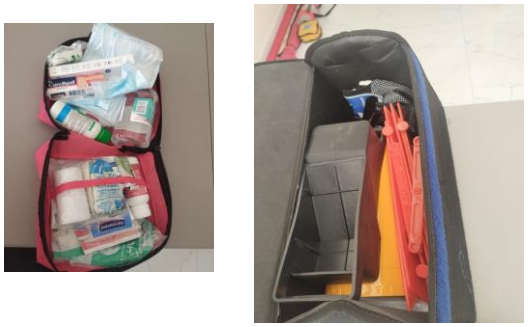

NOTA: Inspeccion botiquin y equipo de carreteras vehiculo interventoria



NOTA: Brigadas de orden y aseo



NOTA: Inspección a firma de ATS contratista

ANEXO No. 09

BITÁCORA DE OBRA

relleno en base compactado en los dos extremos del puente, aun no se registra acopio de material en la obra.

▸ Estructura Metalica: Aun no se registra material izaje de la estructura que ya se esta armando en suelo firme.

▸ Social: No se han presentado novedades en quejas, reclamos, solicitudes, observaciones o sugerencias ni en el buson fisico u otros canales de comunicación.

DIEGO REYES
R.A OBRA

Residente Interventoría

11-10-24 Viernes

▸ Clima: Soleado calido

▸ Personal de Obra: -Ing. Residente ... 1 - Cadenero 1
-HSQ ..... 1 - Maestro general 1
-Aux SST ..... 1 - Oberos 11
-Topografo ..... 1 - Operarios de maquina ... 3

▸ Maquinaria y Equipo: -Grupada 150 con balde ... 1 - Planta electrica 1
-Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
-Volqueta sencilla ..... 0 -Compresor neumatico 2

▸ Estructura en concreto: Se continua con el amarre de los aceros del estribo de puente del lado Ambalema; se continua con el amarre de los aceros para el segundo cuerpo de pilote de estribo aguas abajo del lado paloblayo.

▸ Movimiento de Tierra: Aun no se define por parte de la gobernación las cantidades para el relleno compactado del lado Ambalema y Paloblayo

▸ Estructura Metalica: Continua sin presentar avance.

▸ Social: No se presentaron novedades.

DIEGO REYES
R.A OBRA

Residente Interventoria

12-10-24 Sabado

No se realizaron labores dado que el contratista no programo actividades para hoy

Residente Interventoría

13-10-24 Domingo

No se labora por dia dominical.

14-10-24 No se laboro por ser Lunes festivo
Lunes

DIEGO REYES — JHONATAN HAZARD S
R A OBRA — Residente Interventoría

15-10-24 ▸ Clima: Calido con cielo despejado
Martes ▸ Personal de Obra: - Ing. Residente ... 1 - Cadenero 1
- HSQ ..... 1 - Maestro general 1
- Aux SST ... 1 - Obreros 11
- Topografo ... 1 - Operarios de maquina 3
▸ Maquinaria y Equipo: - Cuadrilla ISC con balde ... 1 - Planta electrica 1
- Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
- Volqueta sencilla ..... 0 - Compresor neumatico 2
- Operarios de maquinas 2
▸ Estructura en Concreto: Se realiza liberacion de aceros del estribo de puente del lado arabalema y se autoriza el formaleteo, se continua con el amarre de los aceros del pilote de estribo aguas abajo del lado palobayo.
▸ Estructura Metalica: No se presentan novedades
▸ Social: No se presentan novedades

DIEGO REYES — JHONATAN HAZARD S
R A OBRA — Residente Interventoría

16-10-24 ▸ Clima: Calido con cielo despejado
Miercoles ▸ Personal de obra: - Ing. Residente ... 1 - Cadenero 1
- HSQ ..... 1 - Maestro general 1
- Aux SST ..... 1 - Obreros 11
- Topografo ... 1 - Operarios de maquina ... 3
▸ Maquinaria y Equipo: - Cuadrilla ISC contable ... 1 - Planta electrica 1
- Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
- Volqueta sencilla ..... 0 - Compresor neumatico ... 2
▸ Estructura en Concreto: Se comparan resultados de las muestras a los 7, 14 y 28 dias con resultados satisfactorios, no se presentan novedades sobre las superficies de las estructuras ya fundadas.
▸ Estructura Metalica: Se inicia armado de la estructura metalica sobre suelo firme
▸ Social: No se presentan novedades.

DICCO DECO
LA OBRA

Jersonlázaro
Ing Residente Interventoría

17-10-24 Jueves
- Clima: Humedo con cielo despejado
- Personal de Obra: -Ing. Residente ... 1 -Cadenero ..... -HQS ..... 1 -Maestro general ..... -Aux SST ..... 1 -Obreros ..... 1 -Topografo ..... 1 -Operadores de maquinas ...
- Maquinaria y Equipo: -Dragado tipo con balde ... 1 -Planta electrica ..... 1 -Carmix ..... 2 -Retrocargador ..... 0 -Volqueta sencilla ... 0 -Compresor neomatico ... 2
- Estructura en Concreto: Elementos ya fraguados, no presentan novedades sobre las superficies
- Estructura metalica: Se continua con el armado de la estructura sobre suelo firme, no se presentan izajes ni presencia de PH.
- Social: No se presentan quejas, sugerencias o reclamos por parte de la comunidad.

DICCO DECO
LA OBRA

Jersonlázaro
Residente Interventoría

18-10-24 Viernes
- Clima: Humedo con cielo despejado
- Personal de Obra: -Ing. Residente ... 1 -Cadenero ..... 1 -HQS ..... 1 -Maestro general ..... 1 -Aux SST ..... 1 -Obreros ..... 11 -Topografo ..... 1 -Operarios de maquinas ... 3
- Maquinaria y Equipo: -Dragado tipo con balde ... 1 -Planta electrica ..... -Carmix ..... 2 -Retrocargador ..... 6 -Volqueta sencilla ..... 0 -Compresor neomatico 2
- Estructura en Concreto: No se presenta novedades
- Estructura Metalica: Se continua con el armado en suelo firme, aun no se presentan novedades en izaje.
- Rellenos: Aun no se presentan avances en rellenos con material clasificado y compactado.
- Filtros y Obras de arte: aun no se presentan novedades
- Social: Se realizo sobre las 9:00 am comite de socializacion de

avance de la obra con representantes de las alcaldías de los municipios de Venadillo y Ambalema, donde la solicitud principal de las alcaldías fue que las informaramos en caso de alguna eventualidad como un retraso de obra o paro total de actividades.

DIEGO REYES — JERSON HARO
RA OBRA — Residente Interventoria

19-10-24 Sabado
- Clima: Humedo con cielo despejado
- Personal de Obra: -Ing. Residente ... 1 -Cadenero ... 1
  -HSQ ... 1 -Maestro general ... 1
  -Aux SST ... 1 -Obreros ... 11
  -Topografo ... 1 -Operarios de maquinas ... 3
- Maquinaria y Equipo: -Cargada 150 con balde ... 1 -Planta electrica ... 1
  -Carmix ... 2 -Retrocargador ... 0
  -Volqueta sencilla ... 0 -Compresor neumatico ... 2
- Estructura en Concreto: No se presentan novedades
- Estructura metalica: Se continua con el armado en suelo firme del lado de Ambalema, aun no se presentan izajes.
- Rellenos: Sin novedad.
- Filtros y Obras de arte: Sin novedades
- Social: Sin novedades

DIEGO REYES — JERSON HARO
RA OBRA — Residente Interventoria

20-10-24 Domingo
- Clima: Humedo con presencia de nubes oscuras
- Personal de Obra: -Ing. Residente ... 1 -Cadenero ... 1
  -HSQ ... 1 -Maestro general ... 1
  -Aux SST ... 1 -Obreros ... 11
  -Topografo ... 1 -Operarios de Maquinas ... 3
- Maquinaria y Equipo: -Cargada 150 con balde ... 1 -Planta electrica ... 1
  -Carmix ... 2 -Retrocargador ... 0
  -Volqueta sencilla ... 0 -Compresor neumatico ... 2
- Estructura en Concreto: Sin novedad
- Estructura Metalica: Sin novedad, el avance se sigue presentando en suelo firme del lado de Ambalema.

- Rellenos: Sin novedad
- Filtros y Obral de arte: Sin novedad
- Social: Sin novedad

DIEGO RECES
R.A OBRA

JEISON LÁZARO S
RESIDENTE INTERVENTORIA

27-10-24 Lunes

- Clima: Humedo con cielo despejado
- Personal de Obra: - Ing. Residente ... 1 - Cadenero 1
  - HQS ..... 1 - Maestro general 1
  - Aux SST ..... 1 - Obreros 11
  - Topografo .... 1 - Operarios de maquinas ... 3
- Maquinaria y Equipo: - Cargador 150 con balde ... 1 - Planta electrica 1
  - Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
  - Volqueta sencilla ..... 0 - Compresor neumatico 2
- Estructura en concreto: Sin novedad
- Estructura metalica: Se continua con el armado en suelo firme del lado de Ambalema.
- Rellenos: Sin novedad
- Filtros y Obras de arte: Sin novedad
- Social: Sin novedad

DIEGO RECES
R.A OBRA

JEISON LÁZARO S
RESIDENTE INTERVENTORIA

22-10-24 Martes

- Clima: Seco con cielo despejado
- Personal de obra: - Ing. Residente .. 1 - Cadenero 1
  - HGS ..... 1 - Maestro general 1
  - Aux SST ..... 1 - Obreros 11
  - Topografo ..... 1 - Operarios de maquinas 3
- Maquinaria y Equipo: - Cargador 150 con balde ... 1 - Planta electrica 1
  - Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
  - Volqueta sencilla ..... 0 - Compresor neumatico ... 2
- Estructura en concreto: Se inicia con el armado de acero del estribo de pedestal del lado pabbajo, aun no se desencofra el estribo de pedestal del lado Ambalema.
- Estructura Metalica: Se continua con el armado en suelo firme del lado de Ambalema.

- Rellenos: No se presentan novedades
- Filtros y Obras de arte: No se presentan novedades
- Social: Sin novedades

DIEGO REYES
R.A OBRA

JEPSON VIZCAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

23-10-24 Miercoles
- Clima: Seco con cielo despejado
- Personal de Obra: - Ing. Residente ... 1 - Cadenero 1
  - HSQ ..... 1 - Maestro general 1
  - Aux SST ..... 1 - Obreros 11
  - Topografo ..... 1 - Operarios de maquinas ... 3
- Maquinaria y Equipo: - Cargador 150 con balde ... 1 - Planta electrica 1
  - Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
  - Volqueta sencilla ..... 0 - Compresor neomatico ... 2
- Estructura en Concreto: Se continua con el armado del estribo de puente del lado poblayo
- Estructura metalica: Se continua con el armado en suelo firme en el lado de Ambalema, aun no se presentan izajes
- Rellenos: Sin novedad
- Filtros y Obras de arte: Sin novedad
- Social: Sin novedad

DIEGO REYES
R.A OBRA

JEPSON VIZCAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

24-10-24 Jueves
- Clima: Soleado y temperatura de 38°C.
- Personal de Obra: - Ing Residente ... 1 - Cadenero 1
  - HQS ..... 1 - Maestro general 1
  - Aux SST ..... 1 - Obreros 11
  - Topografo ..... 1 - Operarios de maquinas ... 3
- Maquinaria y Equipo: - Cargador 150 con balde ... 1 - Planta electrica 1
  - Carmix ..... 2 - Retrocargador 0
  - Volqueta sencilla ..... 0 - Compresor neomatico ... 2
- Estructura en concreto: Se continua con el armado de estribo de puente del lado de Poblayo.
- Estructura metalica: Se continua con el armado en sitio pero aun no se presentan izajes.

- Rellenos: No se presentan novedades
- Filtros y Obras de arte: Sin novedades
- Social: Sin novedades

RESIDENTE DE OBRA — JEFE DE OBRAS
RESIDENTE INTERVENTORIA

25-10-24 Viernes

- Clima: Soleado con cielo despejado
- Personal de Obra: - Ing. Residente -- 1 — - Cadenero 1
  - HSQ ..... 1 — - Maestro general 1
  - Aux SST ..... 1 — - Obreros 11
  - Topografo ..... 1 — - Operadores de maquinas -- 3
- Maquinaria y Equipo: - Grupada con balde ... 1 — - Planta electrica 1
  - Carmix ..... 2 — - Retrocargador 0
  - Volqueta sencilla .... 0 — - Compresor neumatico 2
- Estructura en Concreto: Sin novedades
- Estructura metalica: Sin novedades
- Rellenos: Sin novedades
- Filtros y Obras de arte: Sin novedades
- Social: Sin novedades
- Topografia: Se realiza visita a la obra por parte del topografo Albeiro para revisar los niveles del estribo de puente del lado de Ambalema y verticalidad de pilotes.

RESIDENTE DE OBRA — JEFE DE OBRAS
RESIDENTE INTERVENTORIA

26-10-24 Sabado

- Clima: Soleado con cielo despejado
- Personal de Obra: - Ing. Residente --- 1 — - Cadenero 1
  - HSQ ..... 1 — - Maestro general 1
  - Aux SST ..... 1 — - Obreros 11
  - Topografo ..... 1 — - Operadores maquinas ... 3
- Estructura en Concreto: Grupada con balde ... 1 — - Planta electrica 1
  Maquinaria y Equipo - Carmix ..... 2 — - Retrocargador 0
  - Volqueta sencilla ..... 0 — - Compresor neumatico ... 2
- Estructura en Concreto: No se presentan novedades
- " Metalica: No se presentan novedades
- Rellenos: Sin novedades

- Tilthos y Obras de arte: Sin novedades
- Social: Sin novedades
- Otros: El personal trabajo medio día donde con ingenieros con las labores de armado de acero del estribo de Puente de Tío Hoyo. El ingeniero de intervantoria Ing. Mario Tenorio Penaloza presento su carta de renuncia hasta hoy.

Diego Beltrán
R.A OBRA

Jorge Tenorio
Residente Interventoria

27-10-24 Domingo
- Este día no se laboro por dominical

Jorge Tenorio
Residente Interventoria

28-10-24 LUNES
CLIMA: Seco - Soleado
Personal de obra: Ing Residente ... 1 Cadeneros ... 1
Aux. SST ... 1 Maestro General ... 1
HSEQ ... 1 Obreros ... 11
Topografo ... 1 Operadores maquinaria 4
MAQUINARIA Y EQUIPOS - Retroexcavadora de Oruga 1. Carro 2
Planta Eléctrica 1 Compactor de rodillos 2
Volquetas 3 Vibrocompactador 1
Estructura en concreto: Se inicia instalación de formaleta y armado de acero de refuerzo en vigas.
Estructura Metálica: No se presentan novedades.
Rellenos: Se inicia relleno en el costado de Ambalema
Tilthos y Obras de arte: No presentan novedades a la fecha.
Social: Sin novedades.

Jorge Tenorio
Residente Interventoria

Diego Beltrán
R.A OBRA

29-10-24 MARTES
CLIMA: Seco - Soleado
PERSONAL DE OBRA: Ing Residente ... 1 Cadeneros ... 1
Aux. SST ... 1 Maestro General ... 1
HSEQ ... 1 Topografo ... 1
Obreros ... 11 Operadores maquinaria ... 4
Mantenedores ... 2 Capataz ... 1
Operador de Grúa ... 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS- Retroexcavadora de Oruga... 1 Carmix... 2
Vibrocompactador... 1 Grúa telescopica... 1
Compresor Neumático... 2 Volquetas... 4

Estructura en concreto: Continúa el armare de acero de refuerzo en la viga del apoche del costado de Ambalema.

Estructura metálica: Se inician perforaciones en el lecho del río para construir el apoyo para el armado de las vigas principales

Rellenos: Se continúa con el relleno de la estructura en el costado de Ambalema y se inicia en el costado de Palobayo.

Filtros y obras de arte: No se presentan novedades a la fecha

Social: No hay novedades:

DIEGO REYES
RESIDENTE DE OBRA

JEISON VÁSQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

30/10/24 MIERCOLES

CLIMA: Seco, Soleado

PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 | Topógrafo 1
Cadenero ... 1 | HSEQ 1
Aux SST ... 2 | Maestro General 1
Obreros 11 | Operador de Maquinaria 4
Montadores 2 | Capataz 1
Operador de Grua 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora de Oruga 1 Carmix 2
Vibrocompactadora 1 Grua Telescopica 1
Compresor Neumatico 2 Volquetas 1

Estructura de concreto: Continúa el armare de acero de refuerzo en la viga del apoche del costado de Ambalema, se ajusta formaleta según lo requerido en los planos.

Estructura Metalica: Se realiza montaje de estructura en acero de refuerzo para proximo vaciado del falso apoyo

Rellenos: Se finaliza el relleno en el costado de Ambalema y se continua relleno en el costado de palobayo hacia los pilotes que soportan la estructura metálica.

Filtros y obras de arte: Sin novedades

Social: Sin novedades

DIEGO REYES
RESIDENTE DE OBRA

JEISON VÁSQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

31/10/24 CLIMA: Seco, soleado
JUEVES PERSONAL DE OBRA: Ing. Residente ... 1 Topógrafo ... 1
Aux. SST ... 2 Cadenero ... 1
Maestro General ... 1 Almacenista ... 1
Oficiales ... 2 Obreros ... 11
Operadores maquinaria ... 4 Montadores ... 2
Conductor carrotanque ... 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora de Oruga ... 1 Carmix ... 2
Grua Telescopica ... 1 Compresor neumaticos ... 2
Equipo oxiacetileno ... 1 Herramienta menor.
Estructura de concreto: Se realiza vaciado de concreto de 4000 PSI para viga de amarre de apoche costado Ambalema.
Estructura Metálica: Se realiza vaciado de concreto para soporte de falso apoyo para construcción de vigas principales.
Rellenos: Sin novedades en las actividades.
Filtros y obras de arte: Sin novedades en las actividades
Social y ambiental: Sin novedades en las actividades.

DIEGO REYES
R.A OBRA

JEISON LÁZARO S
RESIDENTE INTERVENTORIA

01/11/24 CLIMA: Seco-Soleado
VIERNES PERSONAL DE OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1
Aux. SST 2 Cadenero 1
Maestro General 1 Almacenista 1
Oficial 2 Obreros 11
Capataz 1 Operadores maquinaria 4 Montadores 2
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora de Oruga 1 Carmix 2
Grúa Telescopica 1 Compresor neumatico 2
Equipo oxiacetileno 1 Herramienta menor.
Estructura de concreto: Se realiza enrofrado de mensula en viga de apoche y se realiza vaciado de concreto de 4000 PSI. en el costado de ambalema.
Estructura Metalica: Sin novedades.

DIEGO REYES
R.A OBRA

JEISON LÁZARO S
Residente Interventoría

2 02/11/24 CLIMA: Seco-Soleado
Sábado PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 2
Cadenero 1 [illegible] 1
Aux SST 2 Maestro General 1
Oficial 2 Obreros 11
Capataz 1 Operador Maquinaria 4 Montadores 2
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora de Oruga 1 Autohormigoneras 2
Grúa Telescópica 1 Compresor Neumático 1
Equipo Oxicorte 1 Herramienta menor
Estructura de concreto: Revisión niveles finales por parte de topografía en ambos costados del puente.
Estructura Metálica: Sin novedades
Filtros y obras de arte: Sin novedades
Social, SST y ambiental: Sin novedades

03/11/24 CLIMA: Seco-Soleado
Domingo Día no laboral por dominical

[illegible]
RESIDENTE DE OBRA
[illegible]
Residente Interventoría

04/11/24 CLIMA: Seco-Nublado
Lunes No se programan actividades por ser día festivo.

[illegible]
RESIDENTE DE OBRA
[illegible]
Residente Interventoría

05/11/24 CLIMA: Seco-Soleado
MARTES PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1
Cadenero 1 HSEQ 1
Aux SST 2 Maestro General 1
Oficial 2 Obreros 11
Capataz 1 Soldador 1
Operador Maquinaria 4 Montadores 2
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Oruga 1 Autohormigoneras 2
Grúa Telescópica 1 Compresor Neumático 2
Volquetas 3 Equipo Oxicorte 1 Herramienta Menor
Estructura de concreto: Retiro de formaletas de la viga de cabezal de los ejes de acceso del costado de Ambalema.

Rellenos: Se realiza relleno del lado de Ambalema entre las vigas y dejando a nivel para inicio de soldadura de vigas.
Estructura Metálica: Se realiza corte y soldadura de tubería para el falso apoyo.
Social, SST, Ambiental: Sin novedades.

DIEGO REYES
RA OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

6/11/24 CLIMA: Soleado-Seco
MIÉRCOLES PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 1
Cadenero 1 HSEQ 1
Aux SST 2 Maestro General 1
Oficial 2 Obreros 11
Capataz 1 Soldador 1
Operador Maquinaria 4 Montadores 2
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Oruga 1 Autohormigonera 2
Grúa Telescópica 1 Compresor Neumatico 1
Volquetas 4 Equipo oxicorte 1
Herramienta Menor
Estructura de Concreto: Sin novedades.
Estructura Metálica: Continuan los trabajos de soldadura en la tubería para el falso apoyo con ayuda de la grua telescópica.
Rellenos: Continuan los rellenos en el costado de Ambalema y se inicia relleno en el costado de Paloalto

DIEGO REYES
R. A OBRA

Residente Interventoría

7/11/24 CLIMA: Parcialmente nublado-Seco
JUEVES PERSONAL DE OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1
HSEQ 1 Aux SST 2 Maestro General 1
Oficial 2 Obreros 11 Capataz 1
Soldador 1 Montador 2 Operador Maquinaria 5
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Oruga 1 Autohormigonera 2
Grúa telescopica 1 Volquetas 4
Compresor Neumático 1 Vibrocompactador 1
Equipo oxicorte 1 Herramienta menor

Estructura de concreto: Sin novedades
Estructura Metálica: Se continua con corte y soldadura de tubería para falso apoyo.
Rellenos: Continúa el descargue de material de recebo, relleno y compactación del material en el costado de paldoayo.

DIEGO BETS
R.A OBRA

JESSY LAZARO
Residente Interventoría

08/11/2024 VIERNES
CLIMA: Seco - Soleado
PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 HSEQ 1 Almacenista 1 Aux. SST 2 Maestro General 1 Oficial obra 1 Obreros 11 Capataz 1 Soldador 1 Montador 2 Operador Maquinaria 5.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Orugada 1 Autohormigoneras 2 Grua Telescopica 1 Volqueta 4 Vibrocompactador 1 Compresor Neumatico 1 Equipo Soldadura 1 Equipo Oxicorte 1 Herramienta menor
Estructura de Concreto: Sin novedades.
Estructura Metálica: Se inicia emparejamiento de vigas en piso y acomodación de tubería de falso apoyo. en el costado de Ambalema
Rellenos: Continua relleno en el costado de Paldoayo en el acceso a las pilas de aproche y compactación de la misma.
Social, SST y Ambiental: Sin novedades.

DIEGO BETS
R.A OBRA

JESSY LAZARO
RESIDENTE INTERVENTORIA

09/11/2024 SÁBADO
CLIMA: Parcialmente Nublado - Seco
PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Aux SST 1 Capataz 2 Soldador 2 Montador 4 Mecánico 1 Operador Maquinaria 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Grúa Telescópica 1 Equipo Soldadura 2 Equipo Oxicorte 1 Herramienta menor
Estructura de concreto: No se programan actividades en este frente de obra
Estructura Metalica: Se realiza movimiento de vigas en el costado de Ambalema, se realizan apoyos para elementos en piso.
Rellenos: Sin novedades
Social, SST, Ambiental: Sin Novedades

DIEGO DELGADO
R.A OBRA

JERSON HAZARD
Residente Interventoría

10/11/24 DOMINGO
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS EN LA MAÑANA - NUBLADO EN LA TARDE.
PERSONAL EN OBRA: ING. RESIDENTE 1 AUX SST 1 CAPATAZ 2 SOLDADOR 2 MONTADOR 4 MECANICO 1 OPERADOR MAQUINARIA 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Grúa Telescópica 1 Equipo Soldadura 2 Equipo Oxicorte 1 Herramienta menor.
Estructura Metálica: Se continúa con la realización de apoyos "tarros" para soporte de las vigas y desplazamiento de las mismas para acercamiento a las pilas de soporte.

DIEGO DELGADO
R.A OBRA

JERSON HAZARD
RESIDENTE INTERVENTORIA

11/11/24 LUNES
CLIMA: Soleado - Seco
PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Aux SST 1 Capataz 2 Soldador 2 Montador 3 Mecánico 1 Operador Maquinaria 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Grúa telescópica 1 Equipo Soldadura 2 Equipo Oxicorte 1 Herramienta menor.
Estructura Metálica: Relación de apoyos en tubería de escalones para acceso al falso apoyo.

DIEGO DELGADO
R A OBRA

JERSON HAZARD
RESIDENTE INTERVENTORIA

14/11/24 MARTES
CLIMA: Soleado - Seco
Personal en obra: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenista 1 Aux SST 2 Maestro General 1 Oficial Obra 1 Obreros 11 Capataz 2 Soldador 2 Montador 4 Mecánico 1 Operador Maquinaria 5
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Orugada 1 Autohormigonera 2 Grúa Telescópica 1 Vibrocompactador 1 Compresor 1 Volquetas 2 Equipo Soldadura 2 Equipo Oxicorte 1 Herramienta menor
Estructura Metálica: Se inicia la instalación del falso apoyo sobre el lecho del río, montaje en piso de vigas principales según planimetría en el costado de Ambalema.
Rellenos: Continua el relleno en el costado de Palobayo en la base de los pilotes.
