

INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 7

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 10

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 10

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 10

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 11

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 11

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 11

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 11

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 11

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 12

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 12

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 12

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 12

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 12

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 12

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 13

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 13

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 14

4.11.6. INFORME SEMANAL 14

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 17
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 18
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 19
5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 19
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 21
6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 21
6.7.2. APLICATIVO CIFRA 21
6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 22
6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 24
9. ANEXOS 30
9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 30
9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS. 34

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**, el cual fue adjudicado a **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA**, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL MUNICIPIO DE TEORAMA suscribió el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL CIENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. LP-001-CO-001-2020, comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento inicialmente contemplaba la construcción de 730 metros lineales de placa huellas, 6 alcantarillas en concreto reforzado, en los sectores críticos según las condiciones iniciales de la propuesta económica del contrato de obra. Una vez realizada la revisión de los estudios y diseños entregados por el contratista de obra, interventoría aprueba de acuerdo al alcance y presupuesto ajustado presentado por el contratista de obra, la construcción de 610 ml de Placa Huella, 6 Alcantarillas y Caracterización vial de 9,30 km

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE TEORAMA (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER)

El municipio de Teorama, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. Teorama es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. Su población asciende a 21 524 habitantes. Dista 238 km de Cúcuta, capital del departamento. La cabecera municipal se encuentra a una altitud media de 1.158 m s. n. m., y la temperatura promedio es de 21.4 °C.

La cabecera municipal se encuentra ubicada a 73° 17' 24" al oeste del meridiano de Greenwich (longitud) y a 8° 26' 18" al norte del paralelo ecuatorial (latitud), a una distancia de 274 km de Cúcuta, capital del departamento. El municipio de Teorama está localizado en la subregión occidental del departamento del Norte de Santander.

Limites:

- **Norte**: República Bolivariana de Venezuela y el municipio de Convención.
- **Sur**: Municipio de Ocaña.
- **Oriente**: Municipios de El Tarra, Tibú y San Calixto.
- **Occidente**: Municipio de Convención.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía hacia el corredor de MIRACOTES-LOS RANCHOS, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el tránsito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de Teorama, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cual se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella. Se revisaron los sectores y las abscisas concuerdan con las suministradas inicialmente, también en algunos tramos de vía no se cumple con los 5 m de ancho. Por lo cual es necesario revisar los diseños. El ingeniero residente ejecutó el inicio de la topografía para el 14 de diciembre del 2020. Una vez iniciada la etapa de localización y replanteo, la comunidad manifiesta la inclusión de otro tramo, por lo tanto, queda por definir el diseño geométrico, sin que se tenga que intervenirlos taludes.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Actualmente, en el municipio se identificó que presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 900 mm, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de placa huella, y actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	NO. LC-001-CO-001-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	ALCALDÍA DE TEORAMA
NIT. No.	800017022-9
Contratista	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
NIT. No.	901424260-7
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	5 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Fecha de Acta de Inicio	30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Fecha de Terminación	29 DE ABRIL DEL 2021
CDP	NO. 1106-1, 11 DE JUNIO DE 2020
RP	0511-2, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		PÓLIZA NO.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		400-47-99400007 2639	$ 105.250.391,20	5/11/2020	5/08/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 52.625.195,60	5/11/2020	5/04/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 105.250.391,20	5 años	
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	400-74-99400001 8160	$ 175.560.600,00	5/11/2020	5/04/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- El contratista de obra hace entrega de los estudios y diseños a los cuales la interventoría solicita realizar modificaciones.
- Una vez revisados los volúmenes de estudios y diseños, la interventoría mediante oficio CSN-EYD-CTUMBO-003 de fecha 25/01/2021, realiza la aprobación parcial de estudios y diseños mediante el Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-5, Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños, para así dar inicio a las actividades de obra.
- El contratista de obra inicia actividades de obra, traslado de materiales, equipos y maquinaria, organización campamentos y centro de acopio de materiales.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

N/A.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Interventoría continúa solicitando la documentación (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, presupuesto ajustado, entre otros) necesaria al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento del avance de la ejecución de obra.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Programación de visitas y elaboración de comités de obra con la participación del contratista de obra y demás personal requerido.
- Se tiene programada socialización del proyecto con presencia de la Interventoría, ART, Alcaldía Municipal, contratista de obra y la Comunidad, el 2 de febrero de 2021 en la escuela de la vereda Miracotes del municipio de Teorama, NS.
- Visitas técnicas a la obra con el fin de supervisar los inicios de actividades de ejecución del proyecto; Aniquitar revisión y programación del presupuesto y cantidades de obra para aprobación total de ajuste a los estudios y diseños, Verificación de planillas de seguridad social y afiliación al personal, entre otros.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, se encuentra aprobados estudios y diseños; la obra se encuentra en la ubicación de maquinaria, equipo , campamento de obra y demás actividades de inicio de ejecución, ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2021, la información se encuentra diligenciada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3, en el cual se presenta la relación del resumen mensual del estado general del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de enero se ejecutó estudios con el Equipo de topografía, se traslada maquinaria y equipo a sitio de obra pero no se han puesto en marcha; se encuentra diligenciada la información en el formato MINFRA-MN-

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

IN-15-FR-4, en el cual está la relación de la maquinaria contratada por el contratista en la ejecución del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de enero está diligenciado en el formato en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 la relación del personal contratado por el contratista en la ejecución del proyecto para el periodo del mes de enero de 2021. (Se anexa formato en PDF).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021 se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se presentó la información del estado general del tiempo durante la ejecución del proyecto debidamente firmados por el contratista y la interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2021, el contratista no ha realizado ensayos de laboratorio para el contrato de obra.

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12. Se verifica que el personal se encuentra activo en afiliaciones correspondiente al presente periodo y se anexa el formato de control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra diligenciado con la planilla de pago de seguridad social del mes anterior teniendo en cuenta que el contratista tiene plazo de realizar el pago hasta el mes siguiente. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14, donde realizó seguimiento al estado financiero y avance físico del contrato de obra, incluyendo el estado financiero actualizado del contrato de interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, donde se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra, con la respectiva ampliación de pólizas de acuerdo a la orden de inicio. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, en contratista hace entrega del Plan de Calidad, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17, donde se registra el seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, se relaciona otros documentos entregados por el contratista de obra.

- Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-5, Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños
- Actas de aprobación de ampliación de pólizas de acuerdo a acta de inicio del contratista de obra

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, se solicitó al contratista la reprogramación de obra, de acuerdo a los ajustes de los Estudios y Diseños que se realizaron, el cual el contratista se encuentra elaborando.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó una entrega preliminar del programa de inversiones. Sin embargo, se solicitó al contratista la reprogramación del programa de inversiones, de acuerdo a los ajustes de los Estudios y Diseños que se realizaron, el cual el contratista se encuentra elaborando.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, realizó visitas de obra al municipio de Teorama, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**
5/01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 2
16/01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 3
22/01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 4
25/01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 5

4.11.4.1. ACTA DE AVANCE DE OBRA AL INVIAS

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2021, realizó comité de obra con los representantes del INVIAS, donde se muestra el avance los contratos de obra y distintos temas relacionados con la ejecución de la obra. La información se encuentra registrada en el formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1, relacionados en la siguiente tabla:
(Se anexa formato en PDF).

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**
21/01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 1
28/01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 2
29//01/2021	ACTA COMITÉ DE OBRA NO. 3

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría; también se diligenció los informes semanales en el aplicativo CIFRA-INVIAS.
En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
1/01/2021	INFORME SEMANAL No. 7 - LC-001-CO-001-2020
8/01/2021	INFORME SEMANAL No. 8 - LC-001-CO-001-2020
15/01/2021	INFORME SEMANAL No. 9 - LC-001-CO-001-2020
22/01/2021	INFORME SEMANAL No. 10 - LC-001-CO-001-2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

NUMERAL	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.10	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 DE 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 843.371.017,00) IVA INCLUIDO.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	NO. 86520, DEL 17 DE ABRIL DEL 2020
RP	NO. 575920, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	PÓLIZA No.	CUANTÍA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2021, Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión a los volúmenes de los estudios y diseños presentados por el contratista de obra.
- Una vez revisados los volúmenes de estudios y diseños, mediante oficio CSN-ANT-CTUMBO-105 de fecha 21/01/2021, la interventoría realiza observaciones a los estudios y diseños y está a la espera de que el contratista presente los ajustes a las observaciones.
- Se realizaron diferentes comités de obra con el contratista y el INVIAS, esta información queda registrada en las actas de comité de obra, las cuales

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

abordaron temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, ajustes a estudios y diseños.

- Se realiza seguimiento al contrato de obra por medio de informes semanales, solicitud de información requerida para el avance de la ejecución de la obra y redacción de oficios.
- Seguimiento a la implementación del Protocolo de Bioseguridad al contratista de obra, al igual que al grupo de trabajo que conforma la interventoría.
- Visitas técnicas a la obra con el fin de supervisar los inicios de actividades de ejecución del proyecto.
- Aniquitar revisión y programación del presupuesto y cantidades de obra para aprobación total de ajuste a los estudios y diseños.
- Verificación de planillas de seguridad social y afiliación al personal, entre otros.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la interventoría remitió al contratista de obra, el oficio CSN-ANT-CTUMBO-101 de fecha 19/01/2021, donde se realizan las observaciones de ajustes de estudios y diseños por el equipo de especialistas y profesionales de interventoría.

Mediante oficio CSN-EYD-CTUMBO-003 de fecha 25/01/2021, la interventoría da la aprobación parcial de estudios y diseños diligenciando el Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-5, Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños, para así dar inicio a las actividades de obra. (Se anexa formato en PDF).

Se anexa al presente informe mensual los informes emitidos para los estudios y diseños, por el equipo de especialistas de la Interventoría.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA **PLAZO:** 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00	1,12	4,00	1,12
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00	8,42	24,00	9,54
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203	$ 85.676.916	$ 82.997.287	20,00	10,16	44,00	19,70
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2021, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. Se realiza cambio de residente de interventoría una vez fue aprobada la hoja de vida de la nueva ingeniera residente. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se radicó al Instituto Nacional de Vías INVIAS, la póliza No. 96-44-10115578 actualizada de acuerdo a prórroga del contrato de interventoría No. 1278 de 2020, mediante oficio CSN-ANT-CTUMBO-097 de fecha 19 de enero de 2021 y se subió a la plataforma SECOP II la respectiva póliza. La interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde está registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021 se presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio Teorama y la información pertinente del contrato. (Se anexa registro fotográfico)



interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2021 se anexa el informe mensual correspondiente al seguimiento, control e implementación del protocolo de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a la circular externa N° 003 del 2020 emitida por el INVIAS en el marco de las medidas de prevención de la infección respiratoria aguda denominada COVID– 19.

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

NUMERAL	CONTENIDO	FORMATO
6.1	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-5
6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.4	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.5	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-18
6.7	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-3-FR-1
	INFORME DE REVISIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-3-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista debe realizar la actualización de la programación de obra y su plan de inversiones de recursos, posteriormente presentarla a la interventoría para su revisión y aval. Lo anterior, debido a que el programa original nunca tuvo en cuenta el periodo de pre-construcción que se tiene previsto en todos los proyectos de este tipo.

Se le solicitó, al contratista de obra, realizar entrega de cantidades finales para su respectiva revisión y aprobación.

El alcance definitivo del proyecto contempla 610 metros de placa huellas y seis (6) unidades de alcantarillas y la conformación de 9 km de vía.


Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se realice el 02 de febrero 2021.

Ya se inició el traslado de materiales, equipos, maquinaría y organización de campamento de Obra en sitio para continuar con ejecución de obras.

Se recomienda seguir normatividad de protocolo de bioseguridad y plan de calidad establecido para el contrato de obra, ya que se inician actividades de ejecución del proyecto.

Se recomienda al Municipio de Teorama, en el comité del día 28 de enero en las instalaciones del INVIAS - Territorial Ocaña, atender los temas de implementación de Emprendedores Rurales y Brindar informes sobre los rendimientos financieros de los recursos girados por medio del convenio.

Se recomienda al contratista, una vez sea aprobada la valla informativa radicada, producirla e instalarla.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMÍREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio como director de Interventoría, de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías terciarias del municipio de Teorama, Norte de Santander del Contrato de Obra No. LC-001-CO-001-2020, correspondientes al periodo del 1 al 31 del mes de enero de 2021, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

Se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización de los ajustes a los estudios y diseños, como de obra realizados por el contratista y las actividades ejercidas de interventoría, realizadas durante el mes de enero de 2021, incluyendo el ámbito técnico, administrativo y financiero de los avances de obra.

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2021, estas conciernen a los trabajos relacionados con el ajustes a los estudios y diseños.

Una vez, remitida la aprobación parcial de los mismos el pasado 25 de enero del 2021, se dan inicio a las ejecuciones de actividades en obra como los traslados de materiales, equipos y maquinarias a zona de ejecución del proyecto.

Se describe, en resumen, a continuación el estado actual de la ejecución vs. Programado a ejecutar:

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUIDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	% EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA	DICIEMBRE 2020	$ 42.100.156,52	4,00	$ 2.076.548	0.20

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ESTUDIOS Y DISEÑOS / INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 210.500.782,59	20,00	$ 7.787.054	0.74
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 315.751.173,88	30,00	-	0.00
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 326.276.213,01	31,00	-	0.00
EJECUCIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	$ 157.875.586,94	15,00	-	0,00
TOTAL		$ 1.034.686.823,00	100,00	-	0.94


Nota Aclaratoria: a la fecha el contratista no ha presentado Acta de Cobro ni Facturación para el contrato de Obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Los alcances de placa huellas presentados dentro de los ajustes a los diseños contemplan los siguientes tramos:


ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL	ÍTEM	CANTIDAD.
PLACA HUELLA	137	0+890	1+027	ALCANTARILLAS	6
PLACA HUELLA	119	3+430	3+549		
PLACA HUELLA	158	4+020	4+178		
PLACA HUELLA	176	4+930	5+106		
Total	590				

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

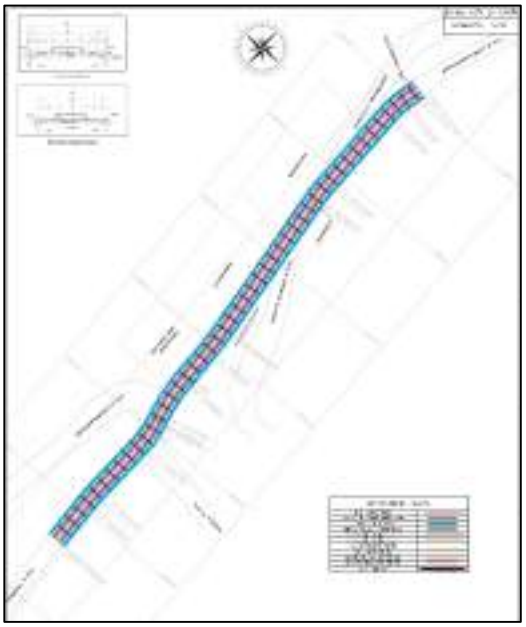

Tomada de Diseño geométrico Proyecto


Tramo 1: Atraviesa un pequeño caserío, en una longitud de 137.2 m de placa huella con ancho promedio de 5.00m. Hay un beneficio grande en cuanto a población atendida.

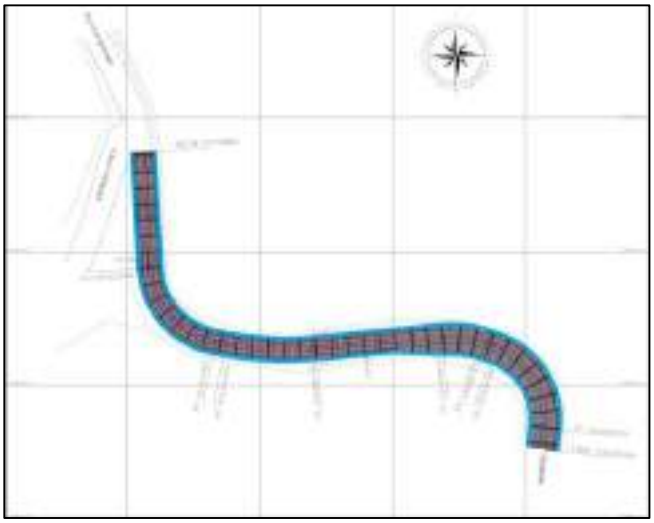

Tomada de Diseño geométrico Proyecto

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950


Tramo 2: Tiene una longitud de 118.9 m. En una de sus curvas se ha planteado todo el piso en concreto sin ciclópeo. El ancho promedio es de 5.5m.

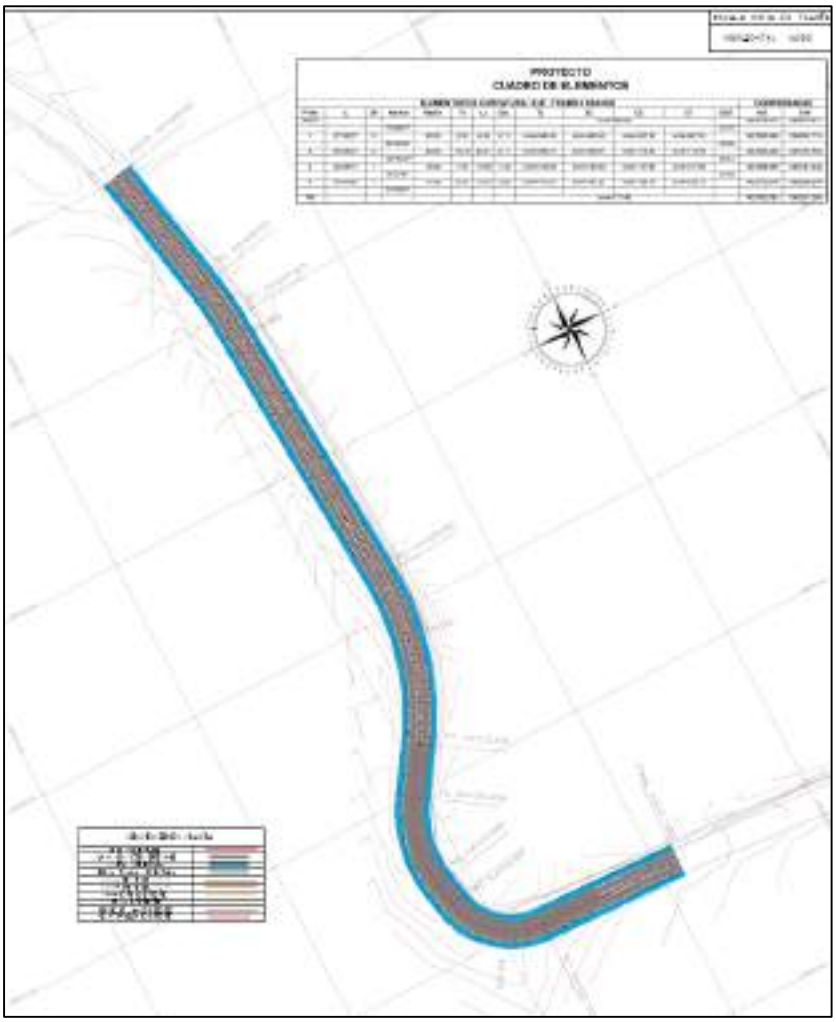

Tomada de Diseño geométrico Proyecto

Tramo 3, Longitud 158 m, incluye un sobreancho.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

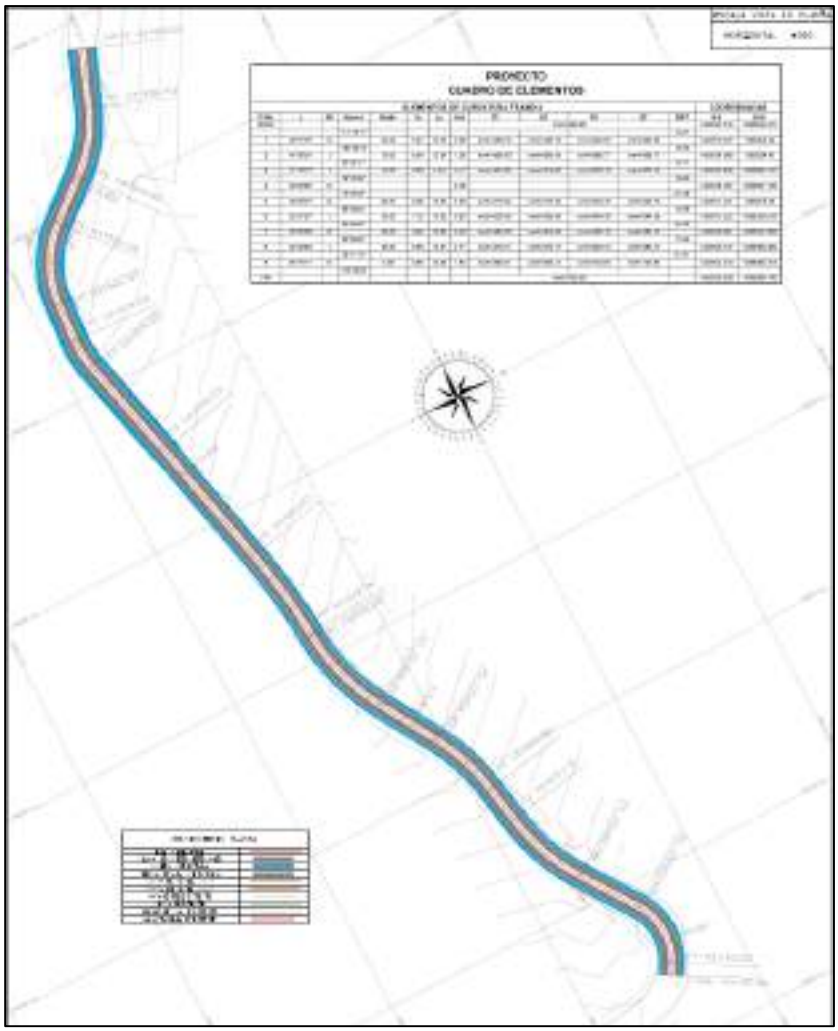

Tramo 4, longitud 176m y el ancho promedio es de 4.5m.

Dentro del proceso de ajuste a los diseños se presentaron modificaciones realizadas por la comunidad beneficiada del proyecto en visita de obra, el día 22 de enero, en donde se trataron los temas de incluir un nuevo tramo, con presencia de la interventoría, contratista de Obra y representación de la Alcaldía Municipal.

Es probable que el tramo 4, que ya se había revisado y ajustado, sea cambiado por lo que solicita la comunidad, un quinto tramo más adelante del punto denominado los ranchos, donde la vía o tramo vial presenta necesidad de intervención.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

Este proyecto tiene aprobación parcial de estudios al 95%, y ya se ha socializado con todos los actores del proceso los alcances del mismo, está en revisión cantidades y presupuesto ajustado con los cambios realizados a los diseños establecidos inicialmente.

La socialización del proyecto está programada para el 2 de febrero de 2021 en las instalaciones de la Escuela Vereda Micacotes, a la cual participará la comunidad beneficiada del proyecto, ART, Alcaldía Municipal, Contratista de Obra e Interventoría; de la cual quedará acta de reunión establecida y debidamente firmada por los participantes y se anexa al presente informe de Interventoría.

No aplica seguimiento al manejo del anticipo para este contrato.

INCONVENIENTES.

El mayor inconveniente que ha tenido este contrato es la falta de participación de la comunidad, la cual no asiste a las reuniones iniciales y ahora se presenta la inconformidad de no estar de acuerdo con los tramos y piden cambiar el tramo 4.

.

JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMÍREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

INVIAS - ENVIADOS			
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO**
7/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-074	INFORME SEMANAL NO. 7	ING. RODRIGO OSORIO
8/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-075	SOLICITUD CAMBIO FIRMAS CONVENIOS - CUENTAS CONJUNTAS	ING. ELIAS JAIMES
9/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-077	SOLICITUD CAMBIO FIRMAS CONVENIOS - CUENTAS CONJUNTAS	ING. JESUS EDGARDO VERGEL
14/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-089	INFORME SEMANAL NO. 8	ING. RODRIGO OSORIO
14/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-090	SOLICITUD CAMBIO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
19/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-096	SOLICITUD EXCEPCIÓN VALLA INFORMATIVA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - GRUPO COMUNICACIONES
19/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-097	RADICACIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - RODRIGO OSORIO
21/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-122	INFORME SEMANAL NO. 9	ING. RODRIGO OSORIO
21/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-123	SOLICITUD APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA EL CARMEN	GRUPO COMUNICACIONES - INVIAS
22/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-124	SOLICITUD APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA TIBÚ	GRUPO COMUNICACIONES - INVIAS
28/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-191	INFORME SEMANAL NO. 10	ING. RODRIGO OSORIO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

OFICIOS RECIBIDOS POR INVIAS			
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**	**ENVIA**
4-ene-21	276	INFORME SEMANAL NO. 06 COMPRENDIDO ENTRE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE DIC DE 2020.	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
7-ene-21		MINUTA FIRMADA POR LA DRA. CATALINA, PARA PROCEDER A RECOGER LA FIRMA DEL CONTRATISTA Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE	ING. RODRIGO OSORIO TOVAR /SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
8-ene-21	1251	INFORME SEMANAL NO. 07 COMPRENDIDO ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE ENERO DEL 2021.	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
13-ene-20	SRT 687	INFORMACION SOBRE CUENTA BANCARIA PARA COSGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
13-ene-20		CUADRO DE EXCEL PARA QUE SE DILIGENCIE DE MANERA SEMANAL EL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA INT. Y DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS.	ING. RODRIGO OSORIO TOVAR /SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
13-ene-20	SRT 697	RESPUESTA RADICADO 102332 DEL 31-12-202 HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATO 1278-2020	ING. RODRIGO OSORIO TOVAR /SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
14-ene-20		LINEAMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS	ING. RODRIGO OSORIO TOVAR /SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
15-ene-21	2768	NFORME SEMANAL NO. 8 - CTO INTERVENTORIA 1278 DE 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
15-ene-21	2806	HOJA DE VIDA RESIDENTE PARA SU OBSERVACIÓN Y FINES PERTINENTES.	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
19-ene-21	3775	VALLA INFORMATIVA A INSTALAR PARA LOS CONTRATOS EN REFERENCIA.	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
19-ene-21		INFORMARME SI YA SE RADICO LA PÓLIZA DE ACUERDO A LA PRORROGA	ING. RODRIGO OSORIO TOVAR /SUBDIRECCIÓN RED TER Y FERREA
19-ene-21	3662	PÓLIZAS ACTUALIZADAS - PRÓRROGA 1 CONTRATO 1278 DE 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
22-ene-21	4635	SOLICTUD REVISIÓN Y APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA - EL CARMEN NDS	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
22-ene-21	SRT 1973	APROBACION INGENIERA RESIDENTE	ING. RODRIGO OSORIO TOVAR /SUBDIRECCIÓN RED TER Y FERREA
22-ene-21	4654	SOLICTUD REVISIÓN Y APROBACIÓN VALLA INFORMATIVA - TIBÚ ND	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
22-ene-21	4734	INFORME SEMANAL NO. 9 - CTO INTERVENTORIA 1278 DE 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
27-ene-21	DT-NSA 2560	CAMBIO DE FIRMA EN CUENTAS BANCARIAS DE MANEJO CONJUNTO	ING.JESUS EDGARDO VERJEL LOPEZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATISTAS TEORAMA - ENVIADOS			
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO**
13/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-079	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2561 DEL 2019.	ALCALDIA DE TEORAMA
19/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-101	INFORME DE REVISIÓN DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
21/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-107	SOLICITUD DE PARAFISCALES CONTRATISTAS MES DE ENERO	U.T. MEJORAMIENTO VIAL
21/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-115	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS	U.T MEJORAMIENTO VIAL - ALCALDE DE TEORAMA
22/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-125	SOCIALIZACIÓN ALCANCES DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS PDET DE LA SUBREGIÓN CATATUMBO A COMUNIDAD BENEFICIADA.	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
22/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-127	SOLICITUD DE INFORME FINANCIERO CONVENIO	ALCADIA DE TEORAMA-ALCALDE Y SECRETARIO DE PALNEACION
23/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-141	RECORDATORIO EMPRENDEDORES RURALES	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
27/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-155	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE OBRA TEORAMA	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
28/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-167	REITERACION DE SOLICITUD DE ACTAS DE APROBACION DE POLIZA	ALCALDIA DE TEORAMA
28/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-175	RECORDATORIO EMPRENDEDORES RURALES	ALCALDIA DE TEORAMA
29/01/2021	CSN-ANT-CTUMBO-194	SOLICITUD DE COPIAS DE ASIGNACION DE SUPERVISOR PARA CONTRATO DE OBRA	ALCADIA DE TEORAMA-U.T. MEJORAMIENTO VIAL

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

OFICIOS RECIBIDOS TEORAMA		
FECHA	**ASUNTO**	**ENVIA**
13-ene-20	ANEXOS, APU CONTRACTUALES DISEÑO GEOMÉTRICO PLACA HUELLA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) PROGRAMA DE INVERSIONES ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICO DISEÑO DE MEZCLAS	U.T. MEJORAMIENTO VIAL
14-ene-20	DISEÑO DE PAVIMENTO DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A SOLICITUD INTERVENTORÍA,	U.T. MEJORAMIENTO VIAL
26-ene-21	RELACIONAR EL PERSONAL-PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA	U.T MEJORAMIENTO VIAL
29-ene-21	INICIO DE OBRAS CONTRATO LC-001 -CO-001-2020	U.T MEJORAMIENTO VIAL

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



SITIO A INTERVENIR PLACA HUELLA



SITIO A INTERVENIR PLACA HUELLA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



SITIO A INTERVENIR PLACA HUELLA



SITIO A INTERVENIR PLACA HUELLA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



VISITA CON LA COMUNIDAD AL SITIO A INTERVENIR PLACA HUELLA



VISITA CON LA COMUNIDAD AL SITIO A INTERVENIR PLACA HUELLA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950




TOPOGRAFÍA EN TRAMOS DE PLACA HUELLA




TOPOGRAFÍA EN TRAMOS DE PLACA HUELLA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



MAQUINARIA EN SITIO



MOTONIVELADORA EN ÁREA A INTERVENIR

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



CONTROL DE TEMPERATURA EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA



DESINFECCIÓN DE MANOS Y PIES DEL PERSONAL EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA



CONTROL DE TEMPERATURA DEL PERSONAL EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Ocaña, Enero 19 de 2021 **CSN-ANT-CTUMBO-101**

Señores

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
Atn.: R/L.LUIS CARLOS VILA
Representante Legal
luiscarlosvimon@hotmail.com
TEORAMA, NDS.

REF: CONTRATO DE OBRA No. LC_001_CO-001-2020, OBJETO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"".

ASUNTO: INFORME DE REVISIÓN DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Atento Saludo.

De manera muy atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar en la siguiente tabla la relación de observaciones realizadas, por nuestro equipo de especialistas y profesionales de interventoría, a la entrega de ajustes de estudios y diseños del proyecto del contrato en referencia:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
TRANSITO	No se encuentra informe de tránsito.
ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICO	1. Cambiar la fecha del informe ya que se debió realizar después de noviembre del 2020. 2. Anexar una imagen de localización de Google Earth donde se vea el trazo de la vía y se pueda referenciar con algún municipio. 3. No se menciona nada sobre la Geología Estructural y en el mapa se pueden observar algunos lineamientos dentro de la zona de interés. 4. Dentro de la Geología entra el área de la geomorfología, por favor agregar un poco de información al menos del relieve de la zona (mapa de pendientes de ser posible). 5. Evaluar – informar si se han presentado movimientos en masa sectoriales GEOLOGÍA – GEOTECNIA.

	6. En los anexos de los laboratorios: revisar el anexo de limite plástico y limite liquido del apique 1 y 4 (están vacíos), calibrar los resultados de % de humedad en el límite plástico del apique 2, recordando que la diferencia en los dos resultados debe ser de máximo 1%. 7. En estudios de suelos ciertos parámetros se definen informando que el numero de ejes es mayor a 1 millón. Revisar – Aclarar dado que no coincide información de estudio de tránsito. Ambos informes. 8. Se informa en el apique 4 que la principal composición en los resultados de granulometría es SM pero el estudio de suelos (perfiles) se clasifica principalmente como ML. Aclarar. 9. Enumerar tablas e imágenes y agregar a la tabla de contenido. 10. En conclusiones no hay nada sobre geología o sobre parámetros del relieve como la pendiente, aclara como pueden afectar las obras. 11. Mencionar el lugar de donde se va a proveer el material de relleno (triturado, arena, etc).
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	No se encuentra informe de topografía.
DISEÑO GEOMETRICO	1. En el ítem 1 del trazado de planta, faltan comentarios del tramo 4 sobre el estado de la vía y su adecuación. 2. Revisar el tercer renglón del párrafo inicial del ítem 4.3 SECCIÓN TRANSVERSAL, aparece un error que no permite terminar la idea. 3. No se encuentra información sobre señalizaciones, solo se nombra en la Introducción. 4. Enumerar tablas e imágenes y agregar a la tabla de contenido. 5. Ajustar las rasantes de manera que se ajuste lo mas posible a la rasante actual del nivel del terreno con el fin de disminuir la cantidad de relleno.

HIDRÁULICO	No se encuentra informe hidráulico.
PRESUPUESTO	Anexar un resumen del presupuesto total teniendo en cuenta las cantidades.

Atentos a sus entregas pertinentes,

Cordialmente,



Grupo de especialistas CSN

JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Matrícula No. 54202-35674 NTS
Director de Interventoría
Consultores Solano Navas Ltda.

c.c. Archivo
c.c. In.g Elías Jaimes , Sup. Contrato de Interventoría; Ing. Rodrigo Osorio Tovar – Gestor Técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CODIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-0		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 25 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN [ ] ACTUALIZACIÓN [ ] MODIFICACIÓN [ ] COMPLEMENTACIÓN [ ] AJUSTE [X] REVISIÓN [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ESTE MEJORAMIENTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y CARACTERIZACIÓN DE LA VIA

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

SE RECIBIERON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A LOS CUALES SE REALIZAN LA REVISIÓN RESPECTIVA, DESPUÉS DE REALIZAR AJUSTES A LOS DISEÑOS GEOMÉTRICOS Y A LAS CANTIDADES DE OBRA SE APRUEBAN Y QUEDAN EN REVISIÓN VOLÚMEN DE PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PARA SU POSTERIOR APROBACION.

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001 DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 (Día) DE 11 (Mes) DE 2020 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 29 (Día) DE 4 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA CONTRATO No. 1278 DE 2020

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
LC-001-CO-001-2020	5/11/2020	5 MESES	$ 1.052.503.912,93	$ 1.052.503.912,93

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

CARRETERA: MUNICIPIO DE TEORAMA
TRAMO: MIRACOTE - LOS RANCHOS
SECTOR: MIRACOTE - JABONERA - LOS RANCHOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-1-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	25	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Se deja constancia que la Interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos

ESTUDIO HIDRÁULICO
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
ESTUDIO GEOTÉCNICO - SUELOS
DISEÑO DE PAVIMENTO - ESTRUCTURAL
DISEÑO GEOMÉTRICO
TOPOGRAFÍA
2.Planos
PLANTA PERFIL: 4 UND
SECCIONES: 4 UND
3. Otros.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

QUIEN ENTREGA:

Firma: Luis Carlos Vila M

Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA
Director de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Solicitud con Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
PERIODO MES: ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: LC-001-CO-001-2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACION: 30 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.052.503.912,93
VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020
INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	Gestion social	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	1

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
En el mes:	$ 210.500.782,00	$ 7.875.452,00		$ 7.875.452,00	0,04	$ 85.676.916,00	1	10,879
Acumulado:	$ 252.600.938,52	$ 7.875.452,00		$ 7.875.452,00	0,03	$ 166.173.257,00	1	21,100
	42.100.157	19.320.460				80496342		

VIGENCIAS PRESUPUESTALES Año	Valor
2020	$ 1.052.503.913,00
Total	$ 1.052.503.913,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado.	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0075	2,00	0,4	3	$ 1.044.628.460,93	0		-
Interventor:	0,1970	2,00	0,4	3	$ 677.197.760,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.875.452,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	7.875.452,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA Desde	Hasta
Cumplimiento	5/11/2020	5/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5/11/2020	5/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años	

Seguro	VIGENCIA Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	05/11/202O	5/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Este proyecto aparentemente tiene atrasos. Los estudios y diseños no fueron tenidos en cuentra dentro de la programacion del contratista. Una vez aprobados por parte de la interventoria la revision y ajustes a los estudios diseños se solictara al contratista la reprogramcion de obra sobre la cual la interventoria relaizara el seguimeinto.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha revisado y realizado aprobacion parcial de diseños.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha iniciado la construccion de tuberia de 36". Esta inversion de obra no se cuantifica.

Firma
Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CONTRATO No.** LC-001-CO-001-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPOO DE TOPOGRAFICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HERRAMIENTA MENOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: YUNEIRY ORTIZ PEREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 54202-355872 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO DE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** LC-001-CO-001-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUIS CARLOS VILA MONTAÑO	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LEITON SEPULVEDA	INGENIERO AUXILIAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SAID HUMBERTO BAENE CARRASCAL	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: YUNEIRY ORTIZ PEREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 54202-355872 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	11061	MEJORAMIENTO,Y MANTENIMIENTODEL CORREDORPRODUCTIVO MIRACOTES- LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE		NACION	LP-002-2020	$ 1.034.686.823
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.034.686.823,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			7.875.452,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	22	24	739
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: YUNEIRY ORTIZ PEREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 54202-355872 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
LUIS CARLOS VILA MONTAÑO	DIRECTOR DE OBRA	DICIEMBRE DE 2020	31	79.954.920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9414530319	31		9414530319	31	9414530319	31	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL	SE VERIFICA QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRA ACTIVO EN AFILIACIONES. EL CONTRATISTA TIENE PLAZO DE PAGAR HASTA EL MES SIGUIENTE

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre : JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula N: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** **PERIODO MES:** ENERO DE 2021 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LC-001-CO-001-2020
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
FECHA DE INICIACIÓN: 30 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE ABRIL DEL 2021
SECTOR: MUNICIPIO DE TEORAMA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.052.503.912,93
VALOR ADICIONALES:
RUTA
VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:
TRAMO: MIRACOTES - LOS RANCHOS
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
PL-002-2020	5 MESES	2/03/2020	$ 1.034.686.823,00	1.034.686.823,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
ACTUAL	$ 1.052.503.912,93
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278	5 MESES	23-abr-21	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	210.500.782	7.875.452		7.875.452	0,04	85676916,00	1	10,879
Acumulado:	252.600.939	7.875.452		7.875.452	0,03	166173257,00	1	21,100

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses
Contratista:	0,0075	2,00	0,4	3	1.044.628.461	0		
Interventor:	0,1970	2,00	0,4	4	677.197.760	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.875.452,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE ABRIL DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93

VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.355.459,25

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.355.459,25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 105.250.391,20	5	8	2020	5	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 52.625.195,60	5	11	2020	5	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 105.250.391,20	5 AÑOS			Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000072639

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	4	2	2021	3	3	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 465-74-994000000458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 465-74-994000000458 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-CO-001-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 DE ABRIL DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1278 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI : X NO: APROBADO: SI: NO: X VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en ajustes del plan de calidad para ser presentado y aprobado por esta interventoria

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI: NO: X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI: NO: X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES: En cuanto al contratista no ha iniciado labores de actividades de ejecución de obra, no se realizó ni programó auditorias de calidad en el presente periodo

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI: NO: X APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI: NO:

OBSERVACIONES: En el presente periodo, solo se realizó conformación de la calzada, por tal motivo, no se realizó inspección, medición y ensayos en el presente periodo

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES: En cuanto al contratista no ha iniciado labores de actividades de ejecución de obra, no se presentaron reporte de no conformidades en el presente periodo

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES: En cuanto no se habia socializado a la comunidad el proyecto de la zona, no se presentaron quejas y reclamos en el presente periodo

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: Por la no aplicación de los objetivos anteriores del plan de calidad, no aplica este indice de gestión

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: En cuanto no hay ejecución de actividades de obra en el presente periodo no se realizó calibración de equipos de medición y ensayo

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO	Nombre:	0	Nombre:
Director de Obra	Especialista en Calidad de la Obra	0	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 54202086216	Matrícula No.:	0	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	1 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 7 del 1/01/21 al 7/01/21 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR: 0,73

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: ENERO/2020

VALOR FACTURA: $ 52.625.195,65 FECHA FACTURA: 7/01/21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 22.981.469,05

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: ENERO/2020

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 7/01/21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

54202127220 NTS

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO DOS EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal No.7 y el informe mensual correspondiente al mes de enero del municipio de Teorama.
Se firma prorroga No.1 al contrato de Interventoría hasta el 23 de Abril del 2021.
Radicación del informe No.2 de Interventoría, periodo: 1 al 31 de diciembre del 2020.
Se aprobaron las prorrogas al municipio de Teorama con vigencia del 2021.
Reunión por parte de interventoría con el contratista del contrato de obra. Información registrada en el Acta de Comité No. 2
Interventoría entrega y radica pólizas actualizadas con la prorroga al contrato de interventoría 1278 en la plataforma del secop II.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Interventoría programa la coordinación de visitas de comité semanales con el fin de continuar con el seguimiento al contrato de obra.
Realizar entrega, por parte del contratista, de los resultados de estudios y diseños del área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS




TOPOGRAFIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión por parte de interventoría con el contratista del contrato de obra. Información registrada en el Acta de Comité No. 2



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría, elaboración de informe mensual correspondiente al mes de enero, solicitud de documentación a contratistas, informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Teorama.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 14 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 8 (Numeración consecutiva) del 8/01/21 al 14/01/21

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,73 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: ENERO/2020
VALOR FACTURA: $ 52.625.195,65 FECHA FACTURA: 14/01/21
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 27.773.349,82


	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: ENERO/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 14/01/21
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO DOS EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.8 y el informe mensual correspondiente al mes de enero del municipio de Teorama.
Para el Contrato No. 1278, INVIAS aprueba el cargo como Ing. Residente de intervetoría a la Ing. Yuneiry Ortiz Perez, mediante el oficio SRT 697, el día 13/01/21.
Interventoría realiza la aplicación del protocolo de bioseguridad, de igual manera se trabaja en la elaboración de informe de protocolo de bioseguridad semanal y el correspondiente al mes de enero.
El contratista remite a interventoría estudios de suelos y geotécnico, diseño de mezclas, programa de inversiones, Plan de Adaptación Ambiental, Diseño Geométrico Placa Huella y APU Contractuales.
Interventoría remite oficio **CSN-ANT-CTUMBO-079**, con Asunto: **Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2561 del 2019**, el día 13/01/21.
Interventoría remite oficio **CSN-ANT-CTUMBO-086**, con Asunto: **Entrega paquetes de estudios y diseños**, el día 14/01/21.
Interventoría remite oficio **CSN-ANT-CTUMBO-087**, con Asunto: **Lineamientos para instalación de vallas informativas**, el día 14/01/21.
Interventoría remite oficio **CSN-ANT-CTUMBO-088**, con Asunto: **Solicitud de Protocolo de Bioseguridad – COVID 19 y Plan de Calidad**, el día 14/01/21.
Interventoría remite oficio **CSN-ANT-CTUMBO-090**, con Asunto: **Solicitud a Invias del cambio de Residente de Interventoría**, el día 14/01/21.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Interventoría programa la coordinación de visitas de comité semanales con el fin de continuar con el seguimiento al contrato de obra.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Apliacación de protocolos de bioseguridad en la oficina de interventoría, Ocaña.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría, elaboración de informe mensual correspondiente al mes de enero, solicitud de documentación a contratistas, informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Teorama.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	15 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 9 del 15/01/21 al 21/01/21 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,73 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: ENERO/2020
VALOR FACTURA: $ 52.625.195,65 FECHA FACTURA: 21/01/21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 27.773.349,82

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: ENERO/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 21/01/21


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO DOS EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.9 y el informe mensual correspondiente al mes de enero del municipio de Teorama.
Interventoría realiza la aplicación del protocolo de bioseguridad, de igual manera se trabaja en la elaboración de informe de protocolo de bioseguridad semanal y el correspondiente al mes de enero.
Interventoría aclara al contratista de obra que puede realizar modificaciones en el contrato de obra. Información registrada en el Acta de Comité No. 03.
Interventoría envía al contratista de obra informe de revisión mediante el oficio **CSN-ANT-CTUMBO-101**, con Asunto: **INFORME DE REVISIÓN DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**, el día 19/01/21.
Interventoría remite oficio **CSN-ANT-CTUMBO-107**, con Asunto: **SOLICITUD DE PARAFISCALES CONTRATISTAS MES DE ENERO**, el día 21/01/21.
interventoría asiste por medio de una reunión virtual al comité de seguimientos convenios Catatumbo, con INVIAS. El día 21 de Enero del 2021, a las 3:00 pm.
Interventoría revisa los estudios y diseños entregados por el contratista de obra.
Interventoría notifica el oficio CSN-ANT-CTUMBO-115, con Asunto: ACTA DE APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS, el día 21/01/21.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Interventoría programa la coordinación de visitas de comité semanales con el fin de continuar con el seguimiento al contrato de obra.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Apliacación de protocolos de bioseguridad en la oficina de interventoría, Ocaña.



Interventoría revisa los estudios y diseños entregados por el contratista de obra.



interventoría asiste por medio de una reunión virtual al comité de seguimientos convenios Catatumbo, con INVIAS. El día 21 de Enero del 2021, a las 3:00 pm

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: **10** del 22/01/21 al 28/01/21 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,62 | No. PUENTES: | OTROS: ALCANTARILLAS 6 UND, CONFORMACION 9,30 KM

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.326.400,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 10.382.739,25
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.709.139,25

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 80.496.342,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020


VALOR FACTURA: $ 71.040.989,00 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PENDIENTE** A LA ENTREGA DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN VISITAS TÉCNICAS EN LAS QUE PARTICIPAN INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, MUNICIPIO Y COMUNIDAD.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.9 y el informe mensual correspondiente al mes de enero del municipio de Teorama.
Interventoría realiza la aplicación del protocolo de bioseguridad, de igual manera se trabaja en la elaboración de informe de protocolo de bioseguridad semanal y el correspondiente al mes de enero.
Visita técnica por parte de interventoría socialización de los tramos a intervenir con el contratista de obra y la comunidad, realizada el día Viernes 22 de Enero del 2021.
Invias aprueba a interventoría la residente de obra Maryory Alejandra Castro Vasques, mediante el oficio SRT 1973 el día 22 de Enero del 2021.
Revisión de los tramos a intervenir, por parte de interventoría y contratista de obra, información registrada en el Acta de comité No. 04, el día 25/01/21.
El contratista de obra realiza ajustes de estudios y diseños, remitidas por interventoría.
Interventoría aprueba parcialmente estudios y diseños meidnate el oficio **CSN-EYD-CTUMBO-003**, el 25 de enero del 2021.
Interventoría solicita al contratista la actualización del plan de inversión y reprogramación de obra, mediante el oficio **CSN-ANT-CTUMBO-155**, el día 27/01/2021.
Reunión con ART,INVIAS, Municipio, Interventoría, Contratista de obra y comunidad solicitada por el gestor técnico Ing. Rodrigo Osorio Tovar, con el fin de revisar el estado actual de las obras y aspectos técnicos realizada el día viernes, 29 de Enero del 2021.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Interventoría programa la coordinación técnicas semanales con el fin de continuar con el seguimiento al contrato de obra. También se realiza el seguimiento al plan de inversión, solicitud de reprogramación de obra, remisión de oficios, solicitud de documentación legal requerida, seguimiento a las actividades de obra, solicitud de los documentos necesarios para la debida ejecución del contrato.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Trabajos de oficina por parte de interventoría



Visita técnica por parte de interventoría socialización de los tramos a intervenir con el contratista de obra y la comunidad, realizada el día Viernes 22 de Enero del 2021.



Reunión con ART,INVIAS, Municipio, Interventoría, Contratista de obra y comunidad, con el fin de revisar el estado actual de las obras y aspectos técnicos.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Visita tecnica a la obra con el fin de supervisar los inicios de actividades de ejecución del proyecto; Aniquilar revisión y programación del presupuesto y cantidades de obra para aprobación total de ajuste a los estudios y diseños, Verificación de planillas de seguridad social y afiliación al personal, entre otros.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INFORME MENSUAL ENERO 2021
COMPONENTE SST

CONTRATO No LC.001-CO-001-2020 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL - TEORAMA

INTERVENTOR:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

ELABORADO:

MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

INSPECTOR SISO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3

INFORME MENSUAL DE COMPONENTE SST No. 2

PERIODO: DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

INTRODUCCION

En el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del área de seguridad industrial y salud ocupacional durante este periodo.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una actividad de múltiples disciplinas enfocada a promover y proteger la salud de los trabajadores por medio de la prevención de riesgos y enfermedades laborales.

Se considera riesgo a todas aquellas situaciones que dentro del trabajo que pueden ocasionar daño a quien la desempeñe, por lo anterior es de vital importancia tomar medidas para poder garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Tanto para el empleador y empleados, es de mucha ventaja contar con un componente de salud y seguridad en el trabajo, ya que mejora el clima laboral, la motivación y la participación, también aumenta la productividad creciendo en conocimientos y así mismo, ayuda a disminuir la ansiedad.

Es necesario, asimismo, aplicar los protocolos de bioseguridad pertinentes para los trabajos de construcción, ya que es indispensable que se apliquen las medidas preventivas para poder frenar los contagios por la pandemia que sufre la región, brindando seguridad a los que trabajan y visitan las obras, contribuyendo igualmente al estado de emergencia en el que se encuentra el país.

NORMATIVIDAD

Regido y orientado desde la constitución política de Colombia, pasando por el código sustantivo del trabajo, la ley 100 de seguridad social, hasta los decretos y resoluciones los cuales obligan a los empleadores asegurar a sus empleados contra los riesgos profesionales.

La Resolución 666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19.

Circular 003 del 8 de abril de 2020, medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19

Con los protocolos de bioseguridad de cada uno de los contratistas aprobados por la interventoría.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud ocupacional, asimismo supervisar y transmitir los usos adecuados de los protocolos establecidos de bioseguridad ante el covid-19 del proyecto que tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances del área de seguridad industrial y salud en el trabajo.
- Hacer vigilancia en el cumplimiento por parte de las empresas contratistas del programa de salud ocupacional a la presentación del protocolo de bioseguridad.
- Capacitar al personal de interventoría sobre los protocolos de bioseguridad y sobre temas referentes a la salud y seguridad en el trabajo
- Reforzar y aplicar el protocolo de bioseguridad en la empresa encargada de la interventoría, CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
- Promulgar prácticas adecuadas que conlleven al cuidado integral de los trabajadores, en su entorno laboral, enfocadas a la protección y cuidado de la salud e integridad física de los mismos.
- Fomentar el orden e higiene personal

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO A LA CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

En control y seguimiento de la interventoría con la contratista, se verificó los certificados de los pagos de seguridad social y riesgos laborales de las personas afiliadas al contrato de obra.

Para el presente periodo diciembre – enero, por medio de las planillas de pago, se realizó los respectivos chequeos para verificaciones de los mismos. De igual manera se comprobó que el personal que ingresó al contrato de obra, cuente con la documentación al día y en regla.

Se le exige a la contratista el cumplimiento de la normativa vigente en este sentido, que es, el envío oportuno de los documentos requeridos y necesarios, que permanecen en el archivo de esta interventoría. Esta documentación es verificada para garantizar cumplir estrictamente con los requisitos de este contrato.

La interventoría ha vigilado el cumplimiento de las normas de seguridad integral y salud en el trabajo.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

En el municipio de Teorama la pandemia por covid-19 no ha sido ajena, a la fecha del 31 de enero de 2021, este municipio presenta 53 casos confirmados, 48 personas recuperadas, 3 fallecidos y 2 casos activo. Presentándose en el mes de enero 7 nuevos contagios. De tal manera es imperativo el uso de un protocolo de bioseguridad para mitigar la propagación del virus y cuidar del personal propio y externo de la obra.

UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL, a la fecha no ha realizado entrega del protocolo de bioseguridad.

En el presente periodo la contratista estuvo realizando labores de estudios y diseños, por tal motivo no han iniciado actividades de ejecución de obra.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

CAPACITACIONES

Es de importancia fomentar en el personal del proyecto conocimientos, habilidades y actividades relacionadas con la formación y capacitación, en temas de salud ocupacional, que permitan una mejor relación interpersonal y especialmente un buen rendimiento en la dimensión laboral, protegiendo además la integridad de los trabajadores en distintos temas que pueden afectar su salud a las exposiciones que hay en su labor.

En el presente periodo se realizaron las siguientes charlas de capacitación al personal de interventoría:

1. **Protocolos ante el covid-19 en visitas a obra:** Se establecieron y se compartieron al grupo de interventoría, los pasos a seguir al momento de realizar visitas a obra, como el uso constante de tapabocas en el transporte, el distanciamiento en el sitio de trabajo y un correcto uso de los elementos de protección personal
2. **Charla riesgos de levantamientos y caídas:** Al momento de realizar levantamientos, debemos tener cuidado en aspectos como el peso, el volumen, y el área donde nos encontramos, es indispensable poder tomar medidas preventivas ante una lesión
3. **Charla protección de la piel**: Nuestra piel es el órgano más grande y la que nos protege de agentes externos que pueden dañar nuestro organismo, por tal motivo es bueno cuidarla con una buena alimentación y barreras protectoras que nos protejan de rayos UVA, que son las consecuencias de envejecimiento prematuro y grandes enfermedades
4. **Inhalación pasiva de humo:** También conocido como el humo de segunda mano, es una mezcla del humo que proviene de donde se quema un cigarrillo, puro o pipa, y el humo exhalado por el fumador. Contiene más de siete mil sustancias químicas. Cientos de esos productos químicos son tóxicos y unos 70 pueden causar cáncer.

Se anexa registro de charlas realizadas en presente periodo al personal de la interventoría

	
Foto Nº 1: Charla 5 minutos sobre levantamiento y caídas, realizada el 20 de enero de 2021	Foto Nº 2: Folleto sobre recomendaciones al momento de visitas a obra, socializado el 14 de enero

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PEROSNAL (EPP)

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión seguridad industrial y salud en el trabajo la cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

La interventoría en compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, realizó entrega de 3 camisas de dotación el día 25 de enero de 2021, al personal profesional y técnico, esto para cumplimiento y uso en obra y oficina. El faltante de dotación y EPP, serán entregadas antes de inicio de obras de los contratistas.

Se anexa formatos de actas de entregas de dotación al personal de interventoría.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA adopta las medidas de bioseguridad establecidas en la resolución No. 666 del 24 de marzo del 2020 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, además de lo ordenado por INVIAS en la circular externa No. 003 del 08 abril del 2020.

Dentro de las actividades que se realizan para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad se encuentran:

- **Toma de temperatura al inicio y al final de cada jornada.**
  Al ingreso y salida de cada uno de los trabajadores y visitantes que se encuentran en las instalaciones de la interventoría, se le realiza la toma de temperatura pertinente al protocolo de bioseguridad. *(Se anexa registro diario de ingreso y temperatura)*
- **Uso de los elementos de bioseguridad.**
  Cada miembro de la interventoría, cuenta con los elementos necesarios para protección ante el covid-19 como, tapabocas, alcohol, toallas desechables, tapete desinfectante, entre otros.
- **Reporte diario de condiciones de salud.**
  Diariamente se diligencia un formato con las condiciones manifestadas de salud de cada uno de los trabajadores de la interventoría, donde se preguntan los síntomas más comunes sobre el covid-19. *(Se anexa registro diario de manifestación estado de salud)*
- **Desinfección de manos.**
  Se promueve internamente el constante lavado de manos, con abundante agua y jabón, con un lavado constante cada 3 horas, y alcohol y gel antibacterial para desinfección de las mismas.
- **Demarcaciones bioseguridad**
  La interventoría está comprometida con la bioseguridad, por tal motivo la oficina cuenta en su oficina con demarcaciones que ayudan a mantener las medidas de los protocolos y promover el autocuidado

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA viene cumpliendo a cabalidad con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en la resolución No. 666 del 24 de marzo del 2020 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social además de lo ordenado por INVIAS en la circular externa No. 003 del 08 abril del 2020.

A la fecha se presentó un contagio de covid-19 en la interventoría, el ingeniero director, Jairo Rafael Gamboa Ramírez, dio positivo el día 8 de enero y tuvo recuperación aislado desde su residencia. Se reintegró a sus labores luego de 18 días de teletrabajo. Su estado de salud es bueno.

A razón del contagio del director y por estar en contacto con 4 integrantes de la interventoría, CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA procedió a implementar la modalidad de teletrabajo desde el 8 de enero de 2021 hasta el 18 de enero de 2021, emitiendo además la realización de la prueba PCR al personal que estuvo en contacto directo con el ingeniero, resultados que fueron negativos en su totalidad. Cabe resaltar que la implementación del protocolo de bioseguridad dentro y fuera de las instalaciones, ayudó a que el virus no se propagara al resto de trabajadores de la interventoría

También se presentaron dos casos sospechosos de covid-19, quienes fueron la secretaria Estefanía Chinchilla Guerrero, que presentó síntomas el día 4 de enero, y se descartó mediante la prueba PCR con resultado negativo el día 18 de enero, y el inspector SISO Marlon Alejandro Caceres Navarro que presentó sintomatología el día 18 de enero y se descartó mediante la prueba PCR con resultado negativo el día 25 de enero de 2021

El estado de salud de los trabajadores de la interventoría es bueno y acorde para la realización de labores asignadas.

Se anexan pruebas de covid-19 realizadas al personal de interventoría y las bitácoras de seguimiento de estado de salud de los casos positivos y sospechosos descartados.

Se anexan informes semanales presentados en el mes de enero



Foto Nº 3: Elementos de aseo, limpieza y protección implementados ante la emergencia del Covid-19.



Foto Nº 4: Desinfección de manos y pies del director de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.





Foto Nº 5: Lectura de temperatura corporal del director de Interventoría con termómetro infrarrojo digital.	Foto Nº 6: Desinfección de manos y pies de la ingeniera residente de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	
Foto Nº 7: Lectura de temperatura corporal a la ingeniera residente de Interventoría con termómetro infrarrojo digital.	Foto Nº 8: Desinfección de manos y pies de la ingeniería coordinadora del proyecto de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	

Foto Nº 9: Lectura de temperatura corporal a la ingeniería coordinadora del proyecto de Interventoría con termómetro infrarrojo digital.	Foto Nº 10: Desinfección de manos y pies de la ingeniería auxiliar de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	
Foto Nº 11: Lectura de temperatura corporal a la ingeniería auxiliar de Interventoría con termómetro infrarrojo digital.	Foto Nº 12: Desinfección de manos y pies del inspector SISO de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	

Foto Nº 13: Lectura de temperatura corporal al inspector SISO de Interventoría con termómetro infrarrojo digital.	Foto Nº 14: Desinfección de manos y pies de la secretaria de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	
Foto Nº 15: Lectura de temperatura corporal a la secretaria de Interventoría con termómetro infrarrojo digital.	Foto Nº 16: jabón antibacterial, toalla para secado de manos y papel higiénico, ubicado en el baño de la oficina de interventoría
	

Foto Nº 17: Señalización de los puntos de rutas de evacuación de la oficina en caso de emergencia.	Foto Nº 18: Contenedor para riesgos biológicos implementado ante la emergencia de covid-19
	
Foto Nº 19: Vallas reglamentarias, sobre el uso de tapabocas y sobre el no uso de cigarrillos dentro de la oficina	Foto Nº 20: Desinfección de áreas de trabajo y objetos a utilizar con alcohol antiséptico al 70%
	

Foto Nº 21: Valla informativa acerca del correcto lavado de manos	Foto Nº 22: Valla informativa acerca del protocolo para la prevención del Covid-19 y el buen uso del tapabocas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se aconseja mantener los protocolos de bioseguridad dentro y fuera de las áreas de trabajo, debido a que se comprobó por medio del contagio del director de interventoría, que, al seguir las medidas establecidas, el virus no se propagó al resto de los trabajadores que mantuvieron contacto con el ingeniero.
- Se recomienda el uso de las medidas preventivas desde el inicio de obra hasta el día que se termine la misma, para proteger la salud de los trabajadores y de quienes visitan la obra.
- Se recomienda el envío oportuno de los formatos y registros fotográficos para un buen trabajo de la contratista y la interventoría.

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
CSN	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 19/enero/2021 METODO PDF via whatsapp

CAPACITACIÓN N° 4 LUGAR

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres CARGO Inspector Siso

TEMA CENTRAL

Protocolos ante el covid-19 en visitas a obra.

ASPECTOS TRATADOS

Se establecieron y se compartieron al grupo de interventoría los pasos a seguir al momento de realizar visitas a obra como el uso constante de tapabocas en el transporte, el distanciamiento en el sitio y correcto de los elementos.

OBSERVACIONES

Se compartió PPF a los trabajadores.

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector Siso	
2	Yuneiry Ortiz Perez	Residente	
3	Jairo Rafael Gamboa	Director	
4	Silvia Cardenas G	Ing Auxiliar	
5	Estefania Chinchilla G	Secretaria	
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
CSN	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 20 / enero / 2021 METODO Charla.

CAPACITACIÓN N° 5 LUGAR oficinas - Ocaña

RESPONSABLE Marlon Alejandro Caceres CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

Riesgos de levantamientos y caidas.

ASPECTOS TRATADOS

Al momentos de realizar levantamientos debemos tener cuidado en aspectos como el peso, volumen y el area donde nos encontramos, es indispensable tomar medidas ante una lesión cervical

OBSERVACIONES

la charla se realizó a satisfacción

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Yuneny Ortiz Perez	Residente	
3	Estefanies Chinchilla G	Secretaria	
4	Alejandra Castro Vasquez	Coordinadora	
5	Silvia Daniela Cardenas.	Ing Auxiliar	
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
CSN	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 26/enero/2021 METODO Charla

CAPACITACIÓN N° 6 LUGAR Oficina - Occaña

RESPONSABLE Marlon Cáceres Navarro CARGO Inspector - SISO

TEMA CENTRAL

la piel y sus cuidados

ASPECTOS TRATADOS

la piel es el órgano mas extenso del cuerpo humano y es importante tener un modelo de vida sano para poder cuidarla y fortalecerla a factores externos que la pueden alterar. Un buen cuidado ayuda y previene el envejecimiento prematuro y evitar grandes enfermedades.

OBSERVACIONES

la charla se realizó a satisfacción

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Estefanía Chinchilla G.	Secretaria.	
3	Yuneiry Ortiz Perez.	Ing. Residente.	
4	Alejandra Castro Vasquez.	Coordinadora	
5	Jairo Rafael Gamboa.	Director.	
6	Silvia Pamela Cardenas	Ing Auxiliar	
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
CSN	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 28/ enero / 2021 METODO Folleto

CAPACITACIÓN N° 7 LUGAR oficina - Ocaña

RESPONSABLE Marlon Alejandro Caceres CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

Inhalación pasiva de humo

ASPECTOS TRATADOS

tambien conocido como el humo de segunda mano es una mezcla del humo que proviene de donde se quema un cigarrillo puro o pipa. y el humo exhalado por el fumador, contiene toxicos causantes del cancer.

OBSERVACIONES

Se realizó un folleto con las especificaciones de la capacitación y se entregó en cada integrante de inventario

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Caceres	Inspector SISO	
2	Estefanies Chinchilla G	Secretaria	
3	Alejandra Castro Vasquez	coordinadora	
4	Silvia Daniela Cardenas	Ing Auxiliar.	
5	Yuneny Ortiz Perez	Residente	Yuneny Ortiz
6	Jairo Gamboa Ramirez	Director.	
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS	CODIGO: FO-107
CSN Consultores Solano Navas	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	VERSIÓN: 0
		FECHA: 25/01/ 2021

NOMBRE: ESTEFANIA CHINCHILLA GUERRERO

CARGO: SECRETARIA

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada **Elemento de protección personal** es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Primera Vez	Reposición	
CAMISA AZUL CLARA MANGA LARGA	2	ENE/25/2021	Stefania Ch.	X		
CAMISA BLANCA MANGA LARGA	1	ENE/25/2021	Stefania Ch.	X		

	CONSULTORES SOLANO NAVAS	CODIGO: FO-107
CSN Consultores Solano Navas	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	VERSIÓN: 0
		FECHA: 25/01/ 2021

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

CARGO: INSPECTOR SISO

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada **Elemento de protección personal** es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Primera Vez	Reposición	
CAMISA AZUL CLARA MANGA LARGA	1	ENE/26/2021		X		
CAMISA BLANCA MANGA LARGA	1	ENE/26/2021		X		
CAMISA 'JEAN' MANGA LARGA	1	ENE/26/2021		X		


	CONSULTORES SOLANO NAVAS	CODIGO: FO-107
CSN Consultores Solano Navas	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	VERSIÓN: 0
		FECHA: 25/01/ 2021

NOMBRE: SILVIA DANIELA CARDENAS GONZALEZ

CARGO: INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada **Elemento de protección personal** es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Primera Vez	Reposición	
CAMISA AZUL MANGA LARGA	1	ENE/25/2021		X		
CAMISA BLANCA MANGA LARGA	1	ENE/25/2021		X		
CAMISA 'JEAN' MANGA LARGA	1	ENE/25/2021		X		

	CONSULTORES SOLANO NAVAS	CODIGO: FO-107
CSN Consultores Solano Navas	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	VERSIÓN: 0
		FECHA: 25/01/ 2021

NOMBRE: YUNEIRY ORTIZ PEREZ

CARGO: INGENIERA RESIDENTE

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada **Elemento de protección personal** es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Primera Vez	Reposición	
CAMISA AZUL MANGA LARGA	1	ENE/25/2021	Yuneiry Ortiz	X		
CAMISA BLANCA MANGA LARGA	1	ENE/25/2021	Yuneiry Ortiz	X		
CAMISA 'JEAN' MANGA LARGA	1	ENE/25/2021	Yuneiry Ortiz	X		

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01 NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres Navarro **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 4 / enero / 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Cáceres	1091672056	26	3185841060	Inspector SISO	8:00	12:30	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
2	Alejandra Castro Vasquez	1091578616B	25	3108626875	coordinadora proyecto	8:00	12:30	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	35.8	
						INGRESO	SALIDA	
3	Silva Daniela Cardenas	1098810896	21	3102848745	Ing Auxiliar	8:00	12:30	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.3	
						INGRESO	SALIDA	
4	Yuneiry Ortiz Perez	1091670081	27	3176161085	Ingeniera	8:00	12:30	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01 NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres N **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 5/ enero /2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
1	Jairo Rafael Gamboa	13475323	56	3208334552	director	INGRESO 8:00 TEMPERATURA 36.1	SALIDA 6:00 TEMPERATURA 36.2	
2	Alejandra Castro Vasquez	1045786468	25	3108626875	coordinadora proyecto	INGRESO 8:00 TEMPERATURA 36.2	SALIDA 6:00 TEMPERATURA 36.2	
3	Silvia Daniela Cardenas	1098820896	21	3102848749	Ing Auxiliar	INGRESO 8:00 TEMPERATURA 36,2	SALIDA 6:00 TEMPERATURA 36.0	SilviaDanielaCar
4	Yomeiry Ortiz Perez	1091670081	27	3176161685	ingeniera	INGRESO 8:00 TEMPERATURA 36.2	SALIDA 6:00 TEMPERATURA 36.4	Yomeiry Ortiz
						INGRESO TEMPERATURA	SALIDA TEMPERATURA	
						INGRESO TEMPERATURA	SALIDA TEMPERATURA	
						INGRESO TEMPERATURA	SALIDA TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	NOVIEMBRE

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres N **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [X] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 6/ enero/2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Jairo Rafael Gamboa	73475323	56	3208534352	director	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.0	35.9	
						INGRESO	SALIDA	
2	Alejandra Castro Vasquez	1045788648	25	3108616875	coordinadora proyecto	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
3	Silvia Daniela Cardenas	1048870896	21	3102848749	ing Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.3	
						INGRESO	SALIDA	
4	Jhon Pacheco			3124584518	ingeniero Coordinador	12:00	4:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.6	36.0	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	NOVIEMBRE

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandra Cáceres Navarro **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [X] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 7/ enero / 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Cáceres	1001677056	26	3185841960	inspector SST	9.00	17.00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.5		
						INGRESO	SALIDA	
2	Juan Rafael Gamboa R.	13475323	56	3208334352	director	9.00	5.00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.0	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
3	Silvia Daniela Cardenas	1098820896	21	3102848769	ing Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.8	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
4	Alejandra Custo Vasquez	1045786468	25	3008620875	coordinadora proyectos	36.2	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						8:00	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
5	Yuneiry Ortiz Perez	1091870981	27	3176161685	ingeniera	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.8	36.4	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	NOVIEMBRE

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Caceres Navarro **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 19/ enero/ 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Caceres	1004677056	26	3185811960	Inspector SST	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						37.0	36.8	
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098820816	21	3108626815	Ing Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
3	Alejandra Castro Vasquez	1095386468	25	3102848360	Coordinadora	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	NOVIEMBRE

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Caceres N. **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [X] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 19 /enero/ 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Caceres N.	1091672056	26	3135891960	inspector SISO	36.9	36.5	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						8:00	12:00	
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098810896	21	3108626875	ing Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	36.0	
						INGRESO	SALIDA	
3	Alejandra Castro Vasquez	1095786468	25	3028487901	coordinadora	36.2	36.0	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						8:00	6:00	
						INGRESO	SALIDA	
4	Estefania Chinchilla G	1091674622	25	3002648838	Secretaria	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
5	Yuneiry Ortiz Perez	1091670081	27	3176161685	Residente	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	35.9	
						INGRESO	SALIDA	
6	Manuel Perez	1098757432	26	3502820646	ingeniero	10:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4		
						INGRESO	SALIDA	
7	Luis Carlos Vila				ingeniero residente	10:30	11:30	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1		

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	NOVIEMBRE

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Mailon Alejandro Cáceres N. **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 20/enero/2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Mailon Alejandro Cáceres	1001610056	26	inspector SISO 3185891060	inspector SISO	8:05	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.3		
						INGRESO	SALIDA	
2	Silva Daniela Cardenas	1058810896	21	3108626875	3102498749	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
3	Estefania Chinchilla G	1091674622	25	3002639386	Secretaria	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
5	Yunery Ortiz Perez	1091670081	27	3176161685	Residente.	8:05	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.3	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
6	Alejandra Castro Vasquez	1095786468	25	3108626875	coordinadora.	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.0	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
		NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres N. **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 21 / enero / 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Alejandra Castro Vasquez	1095786868	25	3108626875	Coordinadora	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.0	
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098810896	21	3102848364	Ing Auxiliar	8:00	6:00	Silvia Daniela C.
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.0	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
3	Yuneiry Ortiz Perez	1091670081	27	3176166 85	Ing Residente	8:00	6:00	Yuneiry Ortiz
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
4	Estefania Chinchilla G.	1091674672	25	3002634838	Secretaria	8:00	6:00	Estefania Chinchilla
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.8	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01 NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres Moreno **Registro de: Trabajadores** [x] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 22 / enero / 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Alejandra Castro Vasquez	1005786468	25	3109626875	coordinadora	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098820896	21	3103848709	ing Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
3	Yuneiry Ortiz Perez	1091670081	27	3176161685	ing Residente	8:00	6:00	Yuneiry Ortiz
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4	36.3	
						INGRESO	SALIDA	
4	Estefania Chinchilla G	1091679622	25	3002634888	secretaria	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
		NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Caceres N **Registro de: Trabajadores** ☐ **Visitantes** ☐ **Recepción de Insumos** ☐

Fecha: 23/enero/2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Alejandra Casto Vasquez	1095786868	25	3108626875	coordinadora	8:00	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098820896	21	3102848749	ing Auxiliar	8:00	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2		
						INGRESO	SALIDA	
3	Estefanny Chinchilla G.	1091674622	25	3002634898	secretaria	8:00	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.3		
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
		NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres Navarro **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 25/enero/2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Estefania Chinchilla G.	1091674622	25	3102483749	secretaria.	8:00	6:00	Estefania Chinchilla.
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098820896	21	3108626878	Ing Auxiliar	8:00	6:00	SilviaDanielaCa.
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
3	Alejandra Costo Vasquez	1095786968	25	3102498749	coordinadora.	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
4	Yuneiry Ortiz Perez	1091674622	27	3176161685	Ing Residente.	8:00	18:00	Yuneiry Ortiz
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36,2	36.3	
						INGRESO	SALIDA	
5	Jairo Rafael Gamboa	13475323	56	3708339352	director	8:30	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
6	Yesica Gomez	1091654657			Ingeniero Hocari	3:00	3:40	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4		
						INGRESO	SALIDA	
7	Ever Ramirez Arias				Ingeniero Hocari	3:00	3:40	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.3		

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01 NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres Navarro **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 26/ enero /2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Cáceres	1091672056	26	3185891960	Inspector SSO	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						37.0	37.2	
						INGRESO	SALIDA	
2	Estefanía Chachilla G	1091674622	25	3078487409	Secretaria	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.0	35.9	
						INGRESO	SALIDA	
3	Yuneiry Ortiz Perez	1061674622	27	3176161685	Residente	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.8	35.8	
						INGRESO	SALIDA	
4	Silvia Pineda Cardenas	1098610896	21	3108626875	Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.8	35.8	
						INGRESO	SALIDA	
5	Jairo Rafael Gamboa	13975323	56	3108339352	Director	8:30	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4	36.5	
						INGRESO	SALIDA	
6	Alejandra Castro Vasquez	1095786468	25	3108626875	Coordinadora	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	35.9	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01 NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres N **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 27/01/2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	1091672056	26	3185891160	inspector SST	INGRESO: 8:00	SALIDA:	
						TEMPERATURA: 36.2	TEMPERATURA:	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098870896	21	3017818749	Ing Ambiental	INGRESO: 8:00	SALIDA:	
						TEMPERATURA: 36.4	TEMPERATURA:	
3	Estefania Chinchilla G.	1091674622	25	3102848749	secretaria	INGRESO: 8:00	SALIDA:	
						TEMPERATURA: 36,7	TEMPERATURA:	
4	Alejandra Castro V	1095786968	25	3108626875	coordinadora	INGRESO: 3:45	SALIDA:	
						TEMPERATURA: 36.2	TEMPERATURA:	
5	Jairo Rafael Gamboa	13475373	56	3708339352	director	INGRESO: 3:45	SALIDA:	
						TEMPERATURA: 36.8	TEMPERATURA:	
6	Yuneiry Ortiz	1095786468	27	3176161685	Residente	INGRESO: 3:45	SALIDA:	
						TEMPERATURA: 35.9	TEMPERATURA:	
						INGRESO:	SALIDA:	
						TEMPERATURA:	TEMPERATURA:	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
		NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres Navarro **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 28/01/2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Cáceres N	1091672056	26	3185891960	Inspector SISO	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.6	
						INGRESO	SALIDA	
2	Estefanía Chinchilla G	1091674622	25	3012848940	secretaria	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
3	Silva Daniela Cardenas G	1018820896	21	3102548749	Ing Auxiliar	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.6	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
4	Alejandra Castro Vasquez	1095786968	25	3108626895	coordinadora	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	36.2	
						INGRESO	SALIDA	
5	Yuneiry Ortiz Perez	1095786968	27	3176161085	Ing Residente	2:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1		
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	NOVIEMBRE

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres N. **Registro de: Trabajadores** [X] **Visitantes** [ ] **Recepción de Insumos** [ ]

Fecha: 29/ enero/ 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Estefania Chinchilla G.	1091674622	25	3102848409	Secretaria	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1	36.7	
						INGRESO	SALIDA	
2	Yuneiry Ortiz Perez	1095786468	27	3946685	Docente	8:00	6:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						35.9	36.1	
						INGRESO	SALIDA	
3	Sluica Daniela Cardenas	1098820896	21	3107848961	Ing Ambiental	36.1		
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						8:00	6:	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 01
		NOVIEMBRE
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

REGISTRO DE INGRESO Y TEMPERATURA CORPORAL DIARIO

Responsable: Marlon Alejandro Cáceres N **Registro de: Trabajadores** ☐ **Visitantes** ☐ **Recepción de Insumos** ☐

Fecha: 30 / enero / 2021

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EDAD	TELEFONO	CARGO	PROTOCOLO		FIRMA
						INGRESO	SALIDA	
1	Marlon Alejandro Cáceres	1091672056	26	3185894960	Inspector SISO	8:00	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.1		
						INGRESO	SALIDA	
2	Silvia Daniela Cardenas	1098820896	21	3107848749	Ing Ambiental	8:00	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.4		
						INGRESO	SALIDA	
3	Yuneiry Ortiz Perez	1095786968	27	3176168885	Ing Residente	36.2		
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						8:00	12:00	
						INGRESO	SALIDA	
4	Jairo Rafael Gamboa	13475323	56	3208534352	Director	8:00	12:00	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						36.2		
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	
						INGRESO	SALIDA	
						TEMPERATURA	TEMPERATURA	

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Jairo Gamboa Ramirez	CÉDULA	13975323	CARGO	Director
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1001672056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		18		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?	X		X		X			X	X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X	X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Jairo Rafael Gamboa R.	Personal SST/Jefe inmediato:	Marlon Alejandro Cáceres N
C.C.	13975323	C.C.	1001672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CODIGO FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSION 0
		FECHA: 30/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Jairo Rafael Gamboa Ramirez	CÉDULA		CARGO	Piector
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091677056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																															
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab																					
DIA DEL MES:	25		26		27		28		29		30																					
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X																				
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X																				
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X																				
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X																				
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X																				
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X																				
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X																				
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X																				
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID-19?		X		X		X		X		X		X																				
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador: Jairo R Gamboa R.		Personal SST/Jefe inmediato: Marlon Alejandro Cáceres N
C.C. 13475323		C.C. 1091677056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Alejandra Castro Vasquez	CÉDULA	1091786465	CARGO	coordinadora
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Maiban Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672050	CARGO	inspector SISO.

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		18		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes sintomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X			X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Alejandra Castro Vasquez	Personal SST/Jefe inmediato	Maiban Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	109 1786465.	C.C:	1091672050
Firma del trabajador autoriza el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 sintomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Estefania Chinchilla Guevara	CÉDULA	1091674622	CARGO	Secretaria
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091692056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		18		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?	X		X		X		X		X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?	X			X	X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?	X			X	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	Estefanía		Estefanía		Estefanía		Estefanía		Estefanía		Estefanía																					
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Estefanía Chinchilla G.	Personal SST/Jefe inmediato:	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091674622	C.C:	1091674622 / 1091692056
Estefanía Chinchilla G.			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-134
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 28/1/2021
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Estefania Chinchilla Guerrero	CÉDULA	1091674622	CARGO	Secretaria
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres	CÉDULA	1091672056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES	ENERO																																	
DIA DE LA SEMANA	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab																							
DIA DEL MES	25		26		27		28		29		30																							
1.¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X																						
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X																						
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X																						
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X																						
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X																						
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X																						
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X																						
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X																						
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID-19?		X		X		X		X		X		X																						
FIRMA DEL TRABAJADOR	Esfan		Esfan		Esfan																													
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																		

Nombre trabajador:	Estefania chinchilla	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres
C.C:	1091674622	C.C	1091672056
Esfania chinchilla.			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Silvia Daniela Cardenas Gonzalez	CÉDULA	1098820896	CARGO	Ing Auxiliar
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		18		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X	X		X		X		X		X			X		X		X		X		X		X	
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Silvia Daniela Cardenas.	Personal SST/Jefe inmediato:	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091672056	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CODIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 28/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Silvia Daniela Cardenas Gonzalez	CÉDULA	1098820896	CARGO	Ing Auxiliar
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres N.	CÉDULA	1004672056	CARGO	Inspector SISO.

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGUN CORRESPONDA

MES	ENERO																													
DIA DE LA SEMANA	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab																			
DIA DEL MES	25		26		27		28		29		30																			
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X																		
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X																		
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X																		
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X																		
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X																		
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X																		
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X																		
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X																		
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID-19?		X		X		X		X		X		X																		
FIRMA DEL TRABAJADOR	SDC6		SDC6		SDC6		SDC6		SDC6		SDC6																			
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																														

Nombre trabajador:	Silvia Daniela Cárdenas Gonzalez	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres N.
C.C.	1098820896 Biga	C.C.	1004672056
Silvia Daniela Cárdenas Gonzalez.			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	FECHA: 26/11/2020

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Yuneiry Ortiz Perez	CÉDULA	1091670081	CARGO	Ingeniera
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091697056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		18		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X	X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Yuneiry Ortiz Perez	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091670081	C.C:	1091697056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CODIGO FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN 0
		FECHA 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Yuneiry Ortiz Perez	CÉDULA	1091670081	CARGO	Ing Residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES	ENERO																															
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab																					
DIA DEL MES:	25		26		27		28		29		30																					
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X																				
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X																				
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X																				
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X																				
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X																				
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X																				
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X																				
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X																				
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID-19?		X		X		X		X		X		X																				
FIRMA DEL TRABAJADOR	YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		Yo																	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Yuneiry Ortiz	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091670081	C.C:	1091672056
Yuneiry Ortiz			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	FECHA: 28/11/2020

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672056	CARGO	inspector SISO
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672056	CARGO	inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		18		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X			X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X		X		X	X	X			X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X		X			
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X		X		X			
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X		X			X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Marlon Alejandro Cáceres N	Personal SST/Jefe inmediato:	Marlon Alejandro Cáceres N
C.C:	1091672056	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CODIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 6
		FECHA: 28/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091677056	CARGO	Inspector SISO
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091677056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ENERO																															
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab																					
DIA DEL MES:	25		26		27		28		29		30																					
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X																				
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X																				
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X																				
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X																				
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X																				
F. Secreciones o esputo?		X		X		X		X		X		X																				
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X																				
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X																				
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X																				
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Marlon Alejandro Cáceres	PersonalSST/Jefeinmediato	Marlon Alejandro Cáceres N
C.C:	1091677056	C.C:	1091677056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respuesta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

BITACORA DE SEGUIMIENTO DE SALUD

ESTADO SALUD DIARIO

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO **CARGO:** INSPECTOR SISO

EDAD: 26 AÑOS

INICIO SINTOMAS: 18 DE ENERO DE 2021

CASO DESCARTADO

SEGUIMIENTO: PERSONAL

- **Lunes 18 de enero de 2021**
  El ingeniero alejandro presenta dolor de cabeza y ningún otro síntoma más, por lo cual manteniendo los protocolos de bioseguridad realiza sus labores asignadas. Además, pide ausentarse desde las 5:00 pm debido a su dolor

- **Martes 19 de enero de 2021**
  El dolor sigue persistiendo y mantiene las medidas necesarias, cumple con su jornada laboral completa

- **Miércoles 20 de enero de 2021**
  Por recomendación de la empresa el ingeniero Alejandro realiza sus labores desde su domicilio y aparta cita médica con su EPS, cita que será realizada el día 21 de enero. Sigue presentando dolor de cabeza constante y además congestión nasal

- **Jueves 21 de enero de 2021**
  El dolor de cabeza es constante y presenta además congestión nasal y tos. La cita fue realizada a las 8:30 de la mañana y fue asignada el medicamento necesario, incapacidad medica por 5 días y la solicitud de la prueba covid-19

- **Viernes 21 de enero de 2021**
  Sigue presentando dolor de cabeza, tos y congestión nasal, permanece en aislamiento, suministrándose el medicamento recomendado

- **Sábado 22 de enero de 2021**
  Se le realiza la prueba a las 12:00 del medio día, y sigue presentando dolor de cabeza y tos.

- **Domingo 23 de enero de 2021**
  Presenta dolor de cabeza menos fuerte y menos recurrente, la tos ha disminuido

El resultado de la prueba de covid-19 fue negativo, por lo cual se descarta el caso sospechoso. Los síntomas seguirán siendo tratado por el personal medico

CIADE I.P.S

20210123031

CACERES NAVARRO MARLON ALEJANDRO

Historia 1091672056
Sexo Masculino
Edad 26 Años

Cliente MEDIMAS
Sede CIADE OCAÑA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
COVID-19			
STANDARD Q COVID-19 Ag Test	NEGATIVO		

STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test, es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos para el SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe humana.

Dr. Wilmer A. Peñaloza M.
Bacteriólogo T.P 34-486 I.C
Universidad de Santander

BITACORA DE SEGUIMIENTO DE SALUD

ESTADO SALUD DIARIO

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ **CARGO:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDAD: 56 AÑOS

INICIO SINTOMAS: 4 DE ENERO DE 2021

CASO CERRADO

SEGUIMIENTO: Vía telefónica y mensajería instantánea

- **Martes 5 de enero de 2021**
  El ingeniero Jairo Gamboa se presenta a trabajar el día 5 de enero a la oficina, procedente de Curití Santander, y manifiesta verbalmente presentar síntomas como dolor de cabeza, malestar corporal y cansancio

- **Miércoles 6 de enero de 2021**
  Sigue con los síntomas por lo cual se solicitó que realizara sus labores fuera de la oficina, solicitud que no fue atendida. Se mantuvo los protocolos dentro de la oficina como uso de tapabocas, distanciamiento y lavado constante de manos

- **Jueves 7 de enero de 2021**
  El estado de salud del ingeniero Jairo sigue siendo el mismo, por lo cual viaja a la ciudad de Bucaramanga en horas de la tarde, posteriormente de haberse presentado en la oficina

- **Viernes 8 de enero de 2021**
  Procede a realizarse la prueba junto con su círculo familiar, dando positivo él tanto como su familia. Por lo cual se toman las medidas necesarias, como aislamiento de todos los integrantes de la interventoría que mantuvieron contacto con el ingeniero, realizando labores en la modalidad de teletrabajo.

  Se gestiona la prueba inmediata para todos los trabajadores de CSN, pero por recomendación de los profesionales en salud, se debía esperar de 5 a 8 días hábiles para realizarse la prueba luego de la cercanía con una persona positiva.

- **Sábado 9 de enero de 2021**
  El estado de salud del ingeniero no es del todo bueno, manifiesta tener malestar general, tos seca, desaliento y malestar estomacal, además de no poder dormir bien.
  Se noticia a la EPS el contagio por Covid-19 y se registra el caso en la aplicación de Coronapp

- **Domingo 10 de enero de 2021**
  El estado de salud sigue siendo igual, presentando los mismos síntomas

- **Lunes 11 de enero de 2021**
  El estado de salud sigue siendo igual, presentando los mismos síntomas

- **Martes 12 de enero de 2021**
  Le agendan cita al ingeniero por la EPS a la que pertenece, para el día 14 de enero, para medicación y seguimiento. Presenta leve mejoría, pero los síntomas permanecen

- **Miércoles 13 de enero de 2021**
  La empresa Consultores Solano Navas Ltda. a la cual trabaja Estefanía Chinchilla, gestionó a los trabajadores de la oficina, la prueba de covid-19 (hisopado) en el laboratorio especializado CIS en la ciudad de Ocaña, realizando la prueba a:

  Alejandra Castro Vásquez (coordinadora)
  Silvia Cárdenas González (Ingeniera Auxiliar)
  Yuneiry Ortiz Pérez (Ingeniera Residente)
  Manuel Pérez Pinto (Ingeniero CSN)

- **Jueves 14 de enero de 2021**
  A las 10:30 am el ingeniero Jairo Gamboa le realizan la cita médica por modalidad de tele consulta, la cual envía soporte médico, recentándole medicamento necesario para tratamiento y un aislamiento recomendado hasta el día 20 de enero de 2021. Además, el día de hoy presenta constate tos y malestar general.

- **Viernes 15 de enero de 2021**
  El estado de salud sigue mejorando, presenta síntomas, pero cada vez más leves

- **Sábado 16 de enero de 2021**
  El ingeniero manifiesta que sigue en mejoría su estado de salud, aunque sigue presentado malestar y tos

- **Domingo 17 de enero de 2021**
  El estado de Salud del ingeniero Jairo, sigue mejorando, pero manifiesta que presenta tos

- **Lunes 18 de enero de 2021**
  El estado de Salud del ingeniero Jairo, sigue mejorando, pero manifiesta que presenta tos, y que ha bajado en su peso corporal

- **Martes 19 de enero de 2021**
  El estado de salud del ingeniero Jairo sigue en recuperación, tan solo manifiesta presentar tos ocurrente

- **Miércoles 20 de enero de 2021**
  El ingeniero manifiesta presentar solo una tos leve y su estado de salud y de ánimo están bien

- **Jueves 21 de enero de 2021**
  Su estado de salud es bueno, no presenta ya sintomatología referente al virus

- **Viernes 21 de enero de 2021**
  El estado de salud del ingeniero es bueno, no presenta síntomas y solicitó realizarse la prueba para descartar la presencia del mismo

- **Sábado 22 de enero de 2021**
  Se realiza la prueba requerida por la empresa para reingreso a las labores presenciales, la cual arroja un resultado negativo, por lo cual, se certifica la ausencia del virus en el organismo del ingeniero y se reincorporará el día lunes a la oficina.

El caso queda cerrado, ya que el ingeniero Jairo en la segunda prueba arrojó negativo, además que no presenta sintomatología alguna

SALUD INTEGRAL SANTANDER I.P.S.
Servimos con Calidad
LABORATORIO CLINICO

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33-33 La Aurora
Bucaramanga - Santander
Cel. 315 374 8286 - Tel. 6942519
E-mail. saludintegralsantanderips@gmail.com

Código de Seguridad
W294C33I13090

DATOS PERSONALES

Orden de Servicio N°: 13090

Municipio: BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) **Fecha y Hora:** sábado, 23 de enero de 2021 11:21:49 a.m.

Nombres y Apellidos: GAMBOA RAMIREZ JAIRO RAFAEL **CC:** 13475323 **Género:** MASCULINO

F. Nacimiento: 02/07/1964 **Edad:** 56 AÑOS 6 MESES 22 DÍAS **Entidad:** PARTICULARES CONTADO

RESULTADOS DEL LABORATORIO

INMUNOLOGÍA

SARSCOV 2 (COVID-19) ANTICUERPOS IGM/ IGG PRUEBA RÁPIDA

INMUNOLOGIA

SARSCoV 2 (COVID-19) Anticuerpos IgM

RESULTADO : NEGATIVO

SARSCoV 2 (COVID-19) Anticuerpos IgG

RESULTADO : POSITIVO

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Resultado Negativo: Significa que hay ausencia de anticuerpos para Covid19, lo que supone mayor susceptibilidad del paciente a la exposición del virus. Esta prueba no tiene carácter diagnóstico. Sin embargo, es de recordar que algunas personas demoran en generar anticuerpos o seroconvertir, por lo que el resultado puede ser negativo para el momento de la prueba.

Si el resultado es **NEGATIVO** no se puede descartar la infección por SARS CoV-2 COVID -19, ya que la infección en el paciente puede estar en el periodo de ventana inmunológica* y no haya producido los anticuerpos necesarios para su detección.

Resultado Positivo: Significa que el paciente pudo haber estado en contacto con el virus previamente. Dado que esta prueba no tiene carácter diagnóstico, solo tamizaje se hace necesario que, para obtener un diagnóstico para Covid19, se realice una prueba molecular de tipo PCR.

Si el resultado es **POSITIVO** para uno de los dos Anticuerpos o para los dos (IgG/IgM), debe ser confirmado este resultado con la prueba molecular PT-PCR

(*) Ventana Inmunológica: es la cantidad de tiempo (horas, días o semanas que transcurre desde que la persona es expuesta a la infección o el virus hasta que aparecen los primeros síntomas)

Andrea Carolina Leal Diaz
Bacteriólogo(a) RP: 05182

BITACORA DE SEGUIMIENTO DE SALUD

REPORTE DIARIO FUNCIONARIOS CASOS POSITIVOS/ SOSPECHOSOS COVID-19

NOMBRE: ESTEFANIA CHINCHILLA GUERRERO **CARGO:** SECRETARIA

EDAD: 25 AÑOS

INICIO SINTOMAS: 4 DE ENERO DE 2021

CASO: DESCARTADO

SEGUIMIENTO: Vía telefónica y mensajería instantánea

- **Lunes 4 enero de 2021**
  Estefanía chinchilla se presenta a trabajar el día 4 de enero, con total normalidad, y presenta, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta y vomito, síntomas evidenciados en la noche y manifestados por medio telefónico al día siguiente

- **Martes 5 de enero de 2021**
  Sigue presentando los mismos síntomas, por lo cual se procede a aislamiento en su casa

- **Miércoles 6 de enero de 2021**
  Sigue con los síntomas por lo cual se solicitó que solicitara cita médica en su EPS (COMEVA), cita que fue dada para el día 8 de enero a las 10 de la mañana, para comprobar su condición frente al covid-19

- **Jueves 7 de enero de 2021**
  El estado de salud ha tenido una leve mejoría

- **Viernes 8 de enero de 2021**
  Se realiza la cita medica por parte de la EPS de manera telefónica, lo cual le solicita que debe dirigirse a urgencias, ya que es un posible caso sospechoso de covid-19. Estefanía se dirige a la 3 de la tarde a urgencias y se le realiza, una canalización, una radiografía y el examen de covid-19 (hisopado)
  Le dan incapacidad medica hasta el resultado de la prueba

- **Sábado 9 de enero de 2021**
  Los síntomas son menos fuertes, se manifiesta por parte de Estefanía una mejoría

- **Domingo 10 de enero de 2021**
  Se manifiesta por parte de Estefanía una mejoría

- **Lunes 11 de enero de 2021**
  El estado de salud de Estefanía sigue en mejoría y se mantiene en aislamiento

- **Martes 12 de enero de 2021**
  Se está a la espera de los resultados de la prueba covid-19 hecha por la EPS, mientras tanto el estado de salud de Estefanía es bueno

- **Miércoles 13 de enero de 2021**
  El estado de salud de Estefanía es cada vez mas positivo, pero no se tiene aun resultado de la prueba.
  La empresa Consultores Solano Navas Ltda. a la cual trabaja Estefanía Chinchilla, gestionó a los trabajadores de la oficina, la prueba de covid-19 (hisopado) en el laboratorio especializado CIS en la ciudad de Ocaña, realizando la prueba a:

  Alejandra Castro Vásquez (coordinadora)
  Silvia Cárdenas González (Ingeniera Auxiliar)
  Yuneiry Ortiz Pérez (Ingeniera Residente)
  Manuel Pérez Pinto (Ingeniero CSN)

- **Jueves 14 de enero de 2021**
  Aún no se tiene el resultado de la prueba covid-19, Estefanía sigue en aislamiento y el estado de salud sigue mejorando. Los síntomas se presentan recurrentemente y con menos intensidad

- **Viernes 15 de enero de 2021**
  Aún no se tiene el resultado de la prueba covid-19, Estefanía sigue en aislamiento, su estado de salud es bueno, ya no presenta síntomas.

- **Sábado 16 de enero de 2021**
  Estefanía sigue en aislamiento su estado de salud es bueno, ya no presenta síntomas

- **Domingo 17 de enero de 2021**
  Dia donde se vence la incapacidad y aislamiento, debido a la espera del resultado de la prueba que no llega. El estado de salud de Estefanía es bueno, no presenta síntomas

- **Lunes 18 de enero de 2021**
  El resultado de la prueba es negativo, por lo cual, se reintegra al día siguiente a trabajo presencial, sus síntomas y dictamen médico, no era correspondiente a covid-19, según resultados

Por tal motivo, se descarta cualquier sospecha de covid-19 y se reintegra totalmente a sus labores correspondientes

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA – INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA

SEMANA No. 1 DEL 8/01/2021 AL 14/01/2021

FECHA: 14 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

No CONTRARO Y CONTRATISTA:
- **CO-150-2020** CONSORCIO COLOMBIA RURAL
- **LC.001-CO-001-2020** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
- **LP 002-2020** CONSORCIO VIAS RURALES JCP
- **MT-LP-002-2020** UNION TEMPORALES VIAS RURALES EL TARRA 2020
- **0285-2020** CONSORCIO EMR TIBU
- **LP 008-350-2020** BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
- **212 2020** UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
- **125-2020** CONSORCIO SORAM

FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL 2020

No CONTRARO E INTERVENTOR: **1278 DE 2020** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO EJECUICÓN A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.003 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. CONTROL DE TEMPERATURA Y VERIFICACION DEL ESTADO DE SALUD

CADA VEZ QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS EN OFICINA SE REALIZA TOMA DE MUESTRA DE LOS FUNCIONARIOS PRESENTES AL MOMENTO DE SU LLEGADA Y A SU SALIDA, ASI MISMO SE REALIZA UN ENCUESTA DEL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL

2. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA INTERVENTORIA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA DISPONE Y HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA FUNCIONARIO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA: TAPABOCAS DESECHABLES, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%, TOALLAS DESECHABLES, AMONIO CUATERNARIO Y TERMOMETRO DIGITAL

3. MODALIDAD DE TELETRABAJO

EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, SE HA VENIDO DESARROLANDO LAS ACTIVIDADES POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INTERVENTORIA EN MODALIDAD DE TELETRABAJO

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA



LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL VEHICULO



LAVADO DE MANOS Y DESINFECCION PERSONAL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORIA CONSUTLROES SOLANO NAVAS LTDA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020, EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.003 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

SE PRESENTÓ EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA UN CASO POSITIVO Y UN CASO SOSPECHOSO POR CORONAVIRUS DENTRO DE LA INTERVENTORIA. SIENDO EL CASO POSITIVO EL DEL INGENIERO JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, EL CUAL DIO POSITIVO LA PRUEBA REALIZADA EL 8 DE ENERO DE 2021, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO Y AISLADO DESDE SU RESIDENCIA, SU ESTADO DE SALUD ES ESTABLE, AUNQUE PRESENTA ALGUNOS SINTOMAS COMO CANSANCIO, FIEBRE Y TOS. EL CASO SOSPECHOSO PRESENTADO ESTA SEMANA ES EL DE LA SECRETARIA ESTEFANIA CHINCHILLA GUERRERO, QUIEN EL DIA JUEVES 8 DE ENERO SE REALIZÓ LA PRUEBA PERTINENTE PARA COVID-19, RESULTADO QUE AUN ESTÁ A LA ESPERA, POR TAL MOTIVO ESTÁ EN AISLAMIENTO Y CON INCAPACIDAD MEDICA DADA POR LA EPS, HASTA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS, SU ESTADO DE SALUD ES ESTABLE Y PRESENTA SINTOMAS COMO MALESTAR GENERAL Y DIARREA.

CONSULTORES SOLANO NAVAS EN CUMPLIMIENTO Y EN RAZON DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATO 1278, REALIZÓ LA PRUEBA DE COVID-19 EL DIA 13 DE ENERO DE 2021, A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA INTERVENTORIA QUE MANTUVIERON CONTACTO CON EL CASO POSITIVO Y CASO SOSPECHOSO. LOS RESULTADOS FUERON EMITIDOS EL MISMO DIA, DANDO COMO RESULTADO DE LAS CUATRO PREUABS REALIZADAS, NEGATIVAS EN SU TOTALIDAD. CABE RESALTAR QUE ESTO DEBIDO A EL BUEN USO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

EL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ES BUENO

CUADRO RESUMEN

REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-35674NTS

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA – INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA

SEMANA No. **1** DEL **15/01/2021** AL **21/01/2021**

FECHA | 21 (Día) | 01 (Mes) | 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

No CONTRARO Y CONTRATISTA:
- **CO-150-2020** CONSORCIO COLOMBIA RURAL
- **LC.001-CO-001-2020** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
- **LP 002-2020** CONSORCIO VIAS RURALES JCP
- **MT-LP-002-2020** UNION TEMPORALES VIAS RURALES EL TARRA 2020
- **0285-2020** CONSORCIO EMR TIBU
- **LP 008-350-2020** BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
- **212 2020** UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
- **125-2020** CONSORCIO SORAM

FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL 2020

No CONTRARO E INTERVENTOR: **1278 DE 2020** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO EJECUICÓN A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.003 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. CONTROL DE TEMPERATURA Y VERIFICACION DEL ESTADO DE SALUD

SEGÚN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APLICADO POR LA EMPRESA PARA ESTE CONTRATO, CADA VEZ AL MOMENTO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL O VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE LA INTERVENTORIA, SE REALIZA LA TOMA DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO, ASI MISMO SE REALIZA UN ENCUESTA DEL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL AFILIADO AL CONTRATO.

2. DESINFECCIÓN DE MANOS Y CALZADO

APLICANDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS, SIEMPRE AL MOMENTO DE ENTRAR A LA OFICINA, SE DISPONE DE GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL AL 70% DE PUEREZA Y DE UN TAPETE DESINFECTANTE CON AMONIO CUATERNARIO, PARA DESINFECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE INGRESEN.

3. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA INTERVENTORIA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA DISPONE Y HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA FUNCIONARIO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA: TAPABOCAS DESECHABLES, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%, TOALLAS DESECHABLES, AMONIO CUATERNARIO Y TERMOMETRO DIGITAL

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA



LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANOS Y PIES



DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO Y SUPERFICIDES A UTILIZAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORIA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020, EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.003 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

EN LA PRESENTE SEMANA, EL CASO POSITIVO DEL INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ, PRESENTA RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO Y SU ESTADO DE SALUD SIGUE MEJORANDO, YA NO PRESENTA CASI SINTOMAS Y HA ESTADO LABORANDO EN MODALIDAD DE TELETRABAJO. Y EL CASO SOSPECHOSO DE LA SECRETARIA ESTEFANIA CHINCHILLA GUERRERO, QUIEN PERMANECIÓ EN AISLAMIENTO E INCAPACIDAD SEGUN EL PERSONAL MEDICO QUE LA ATENDIÓ, FUE DESCARTADO CON EL RESULTADO NEGATIVO DE LA PRUEBA DE COVID-19, PRUEBA ENTREGADA POR PARTE DE LA EPS EL DIA 18 DE ENERO

ADEMÁS EN LA PRESENTE SEMANA EL INSPECTOR SISO MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO PRESENTÓ CONSTANTE E INTENSO DOLOR DE CABEZA, MOTIVO POR EL CUAL DESDE EL DIA 20 DE ENERO DE 2021 REALIZÓ TELETRABAJO Y EL 21 DE ENERO DE 2021, SOLICITÓ DE MANERA PERSONAL CITA MEDICA ANTE SU EPS, LA CUAL LE ENVIÓ MEDICAMENTO PERTINENTE E INCAPACIDAD POR 5 DIAS Y LA SOLICITUD DE REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 AL DETERMINARSE UN CASO SOSPECHOSO

EL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ES BUENO Y ACORDE PARA REALIZACIÓN DE SUS LABORES ASIGNADAS

CUADRO RESUMEN

REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-35674NTS

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA – INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA

SEMANA No. **3** DEL **22/01/2021** AL **28/01/2021**

FECHA | 28 (Día) | 01 (Mes) | 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

No CONTRARO Y CONTRATISTA:
CO-150-2020 CONSORCIO COLOMBIA RURAL
LC.001-CO-001-2020 UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
LP 002-2020 CONSORCIO VIAS RURALES JCP
MT-LP-002-2020 UNION TEMPORALES VIAS RURALES EL TARRA 2020
0285-2020 CONSORCIO EMR TIBU
LP 008-350-2020 BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
212 2020 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
125-2020 CONSORCIO SORAM

FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL 2020

No CONTRARO E INTERVENTOR: **1278 DE 2020** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO EJECUICÓN A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.003 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. CONTROL DE TEMPERATURA Y VERIFICACION DEL ESTADO DE SALUD

SEGÚN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APLICADO POR LA EMPRESA PARA ESTE CONTRATO, CADA VEZ AL MOMENTO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL O VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE LA INTERVENTORIA, SE REALIZA LA TOMA DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO, ASI MISMO SE REALIZA UN ENCUESTA DEL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL AFILIADO AL CONTRATO.

2. DESINFECCIÓN DE MANOS Y CALZADO

APLICANDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS, SIEMPRE AL MOMENTO DE ENTRAR A LA OFICINA, SE DISPONE DE GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL AL 70% DE PUEREZA Y DE UN TAPETE DESINFECTANTE CON AMONIO CUATERNARIO, PARA DESINFECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE INGRESEN.

3. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA INTERVENTORIA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA DISPONE Y HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA FUNCIONARIO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA: TAPABOCAS DESECHABLES, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%, TOALLAS DESECHABLES, AMONIO CUATERNARIO Y TERMOMETRO DIGITAL

4. IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN SOCIALIZACIONES

EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN Y SAN CALIXTO SE REALIZARON SOCIALIZACIONES DONDE PARTICIPARON LA CONTRATISTA, LA ALCALDIA, LA INTERVENTORIA Y COMUNIDAD, CON EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, COMO EL USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, DESINFECCIÓN DE MANOS Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA



LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANOS Y PIES



DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO Y SUPERFICIDES A UTILIZAR



SOCIALIZACIÓN CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE TAPABOCAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN



TOMA DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN AL INGRESO DEL LUGAR DE SOCIALIZACIÓN EN EL CARMEN



SOCIALIZACIÓN CON DISNTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE TAPABOCAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORIA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020, EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020.

EN LA PRESENTE SEMANA, EN LA SEGUNDA PRUEBA REALIZADA AL INGENIERO DIRECTOR JAIRO RAFAEL GAMBOA, LUEGO DE NO PRESENTAR SINTOMAS Y CUMPLIR CON EL AISLAMIENTO RECOMENDADO, EL RESULTADO DIO NEGATIVO, POR TAL MOTIVO SE DESCARTA LA PRESENCIA DEL VIRUS EN EL ORGANISMO Y SE REINTEGRÓ AL TRABAJO PRESENCIAL PARA SUS LABORES ASIGNADAS. EL ESTADO DE SALUD DEL INGENIERO ES BUENO

EL CASO SOSPECHOSO DEL INSPECTOR SISO, MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO, SE DESCARTÓ CON EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COVID-19 TOMADA EL DIA 23 DE ENERO Y LA CUAL ARROJÓ UN RESULTADO NEGATIVO. POR TAL MOTIVO SE DESCARTA UN POSIBLE CONTAGIO Y SE REINCORPORARÁ A SUS LABORES ASIGNADAS DE MANERA PRESENCIAL .

EL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ES BUENO Y ACORDE PARA REALIZACIÓN DE SUS LABORES ASIGNADAS

CUADRO RESUMEN		
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-35674NTS
