

INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
NIT: 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL NO. 5
PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1. LOCALIZACIÓN 5

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8

2.4. POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO 8

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 10

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 14

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 14

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 14

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 14

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 14

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 14

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 15

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 15

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 15

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 15

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 15

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 15

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 16

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 16

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 16

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL 16

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 19

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 21

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 21

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 22

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 24

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 24

6.7.2. APLICATIVO CIFRA 24

6.7.3. INFORME MENSUAL DE CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 25

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 27

9. ANEXOS 31

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 31

9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS 33

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), estructuro el programa "COLOMBIA RURAL" que tiene como objetivo mantener y mejorar la transpirabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementan la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollan bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

Colombia Rural es un programa del Gobierno Nacional que busca mantener y mejorar la transpirabilidad de la red vial terciaria del país. Con una movilidad más segura y eficiente impulsando la reactivación de las economías locales, al facilitar la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, la promoción de destinos turísticos y el acceso a bienes y servicios.

El tramo de Miracote – Los Ranchos es una de las vías que más tráfico, movilidad y productividad está generando en el municipio y su desarrollo regional tiene que ver mucho con la estabilidad de la vía y la continua operación vehicular es indispensable para generar la producción y comercialización de productos agrícolas, comercialización de artículos de primera necesidad para sus poblaciones y la conexión directa entre el municipio y la vía principal que conecta con el departamento. Sin embargo, esta vía es destapada y en épocas de invierno, con el alto tráfico vehicular, viene mostrando en unos puntos críticos problemas de hundimiento de calzada, baches, deslizamientos que vienen elevando el riesgo de accidentalidad y se vienen aumentando los daños en los vehículos.

Con esta intervención no solo se ofrece una respuesta y reducción del riesgo de accidentalidad en estos sectores o tramos, sino que a su vez se permite una mejor movilidad y se incentiva la producción agrícola y comercial de la región. El mantenimiento de las obras de arte, mejora las condiciones de durabilidad de la vía y permite que se mantenga con mayor tiempo el tiempo óptimo de servicio.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,**

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA**, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO.

EL MUNICIPIO DE TEORAMA suscribió el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL CIENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

Este mejoramiento nace con el fin de brindar beneficio a la comunidad mejorando el estado de las vías en el municipio de Teorama, creando mejores condiciones de transitabilidad con el fin de permitir la movilidad de los habitantes y contribuyendo con el desarrollo socio económico. De igual forma mejorando la conectividad del territorio y de esta manera poder incrementar la productividad en el campo.

Adicionalmente, es de mencionar que las vías demás de la construcción de alcantarillas y placa huella, también cuentan con un mantenimiento rutinario de conservación que será ejecutado después de entregadas las obras, con el ánimo de conservar en perfecto estado la vía intervenida.
A continuación, se presenta el desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, el cuál elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2021.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Es de mencionar que las vías no solo requieren la construcción de alcantarillas y placa huella, también se requiere de un mantenimiento adicional de conservación que será después de entregadas las obras, con el ánimo de conservar en perfecto estado la vía intervenida.

Este mejoramiento inicialmente contemplaba la construcción de 730 metros lineales de placa huellas y 6 alcantarillas en concreto reforzado, en los sectores críticos según las condiciones iniciales de la vía. Una vez realizado el recorrido al área a intervenir e identificar las necesidades existentes de la vía y propuestas presentadas por la comunidad, fue modificado y ajustado el alcance del contrato de obra. Por lo tanto, de acuerdo a la entrega y revisión de los estudios y diseños entregados por el contratista de obra, interventoría avala el alcance y presupuesto ajustado, estableciendo la siguiente meta física: la construcción de 565 metros lineales de Placa Huella, 6 Alcantarillas, un disipador y Caracterización vial de 9,30 km

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. Ocaña Norte de Santander (fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña en Norte de Santander)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 Municipio de Teorama (fuente: Alcaldía Municipal de Teorama Norte de Santander)

El municipio de Teorama, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. Teorama es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. Su población asciende a 21 524 habitantes. Dista 238 km de Cúcuta, capital del departamento. La cabecera municipal se encuentra a una altitud media de 1.158 m s. n. m., y la temperatura promedio es de 21.4 °C.

La cabecera municipal se encuentra ubicada a 73° 17' 24" al oeste del meridiano de Greenwich (longitud) y a 8° 26' 18" al norte del paralelo ecuatorial (latitud), a una distancia de 274 km de Cúcuta, capital del departamento. El municipio de Teorama está localizado en la subregión occidental del departamento del Norte de Santander.

Limites:

- Norte: República Bolivariana de Venezuela y el municipio de Convención.
- Sur: Municipio de Ocaña.
- Oriente: Municipios de El Tarra, Tibú y San Calixto.
- Occidente: Municipio de Convención.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía hacia el corredor de MIRACOTES-LOS RANCHOS, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el tránsito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.

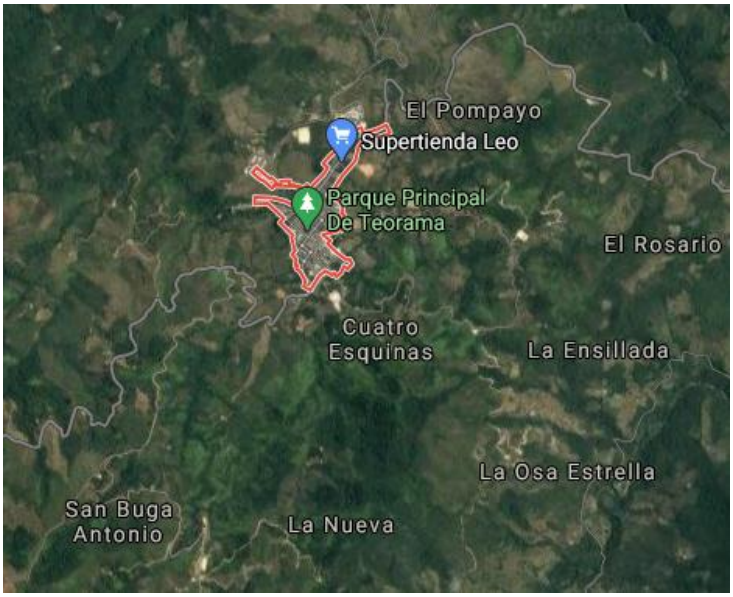


ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, el ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de Teorama, se identificó las condiciones iniciales de la vía, en la cual se observaron tramos deteriorado debido al invierno en la zona donde se realizará el mejoramiento de la vía con los diferentes tramos de placa huella. Se identificó que el sector, los tramos a intervenir y las abscisas fueran establecidos como fue determinado inicialmente, además se observó que en algunos tramos la vía no cumplía con los 5 m de ancho. Por lo cual, fue revisado y ajustado para posteriormente dar inicio a la topografía el 14 de diciembre del 2020. Una vez iniciada la etapa de localización y replanteo, la comunidad manifiesta la inclusión unos cuatro tramos, propuesta que es aceptada y aprobada por el contratista de obra.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Actualmente, en el municipio se identificó que presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de alcantarillas en tubería de polietileno PEAD, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de placa huella, y actividades de mantenimiento periódico. El estado de la red vial del municipio de Teorama, necesita mejorar las condiciones de transitabilidad para permitir la movilidad de los habitantes y contribuir con el desarrollo socio económico de los mismos, mejorando la conectividad del territorio y de esta manera poder incrementar la productividad en el campo.

El mejoramiento de la vía se realiza con la construcción de la placa huella debido a que en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención generando daños en las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía debido a que no hay un control del drenaje.

2.4. POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO

En el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, con objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL", la población beneficiada por el proyecto de obra son aquellas personas que pertenecen a la vereda MICORATES hasta Los Ranchos, dichas veredas cuentan con aproximadamente 125 habitantes. Este mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales, del presente municipio, nace como fin del Estado para servir a la comunidad, promoviendo la prosperidad general y garantizar la efectividad de los proyectos

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

de obra. El estado de las vías en el municipio de Teorama, busca mejorar las condiciones de transitabilidad con el fin de permitir la movilidad de los habitantes y contribuir con el desarrollo socio económico de los mismos, mejorando la conectividad del territorio y de esta manera poder incrementar la productividad en el campo.

Se pretende dar solución efectiva a los requerimientos de la población del municipio de Teorama

y el mejoramiento constante de sus vías tanto urbanas como rurales, las cuales es una de sus prioridades. Actualmente el municipio atraviesa por una difícil situación socioeconómica producto del creciente conflicto armado por grupos ilegales al margen de la ley que se encuentran asentados principalmente en la zona rural, dificultando aún más las condiciones de vida de campesinos de la región quienes son los más afectados por las consecuencias del conflicto. Es por esto que se busca la intervención de vías rurales que se encuentran en mal estado y que presentan alto deterioro, incomodidad e inseguridad al tránsito de vehículos y peatones, dificultad para acceder a servicios médicos y educativos, dificultad en el transporte y comercialización de productos agrícolas y muchos otros problemas que se desencadenan debido al mal estado de las vías.

Con la construcción de placa huella en esta vía tan deteriorada y la intervención de las alcantarillas, se desprenden grandes beneficios que impactan económica y socialmente a los habitantes de la comunidad, ya que su calidad de vida indiscutiblemente mejorará y en general a toda la población del departamento de Norte de Santander.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	NO. LC-001-CO-001-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	ALCALDÍA DE TEORAMA
NIT. No.	800017022-9
Contratista	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
NIT. No.	901424260-7
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	5 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Fecha de Acta de Inicio	30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Fecha de Terminación	29 DE ABRIL DEL 2021
CDP	NO. 1106-1, 11 DE JUNIO DE 2020
RP	0511-2, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		PÓLIZA NO.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		400-47-994000072639	$ 105.250.391,20	5/11/2020	5/08/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 52.625.195,60	5/11/2020	5/04/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 105.250.391,20	5 años	
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	400-74-994000018160	$ 175.560.600,00	5/11/2020	5/04/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se realizó visita al área a intervenir con la ART, interventoría y director de obra, fueron recorridos los cuatro tramos en los que se evidenció el inicio de la construcción de la placa huella en el tramo # 4, las 6 alcantarillas y la caracterización vial. Esta socialización fue desarrollada el 16 de marzo de 2021 en la vereda Miracotes y los Ranchos ubicadas en el municipio de Teorama, NDS.
- Se avanza en las actividades de obra realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2021, las actividades ejecutadas fueron las siguientes: inicio la construcción de la placa huella en el tramo # 4, ubicada en el abscisado K7+100-K7+280, se obtiene un porcentaje de avance del 95% en las actividades de construcción de las 6 alcantarillas a intervenir, el proceso constructivo del disipador se encuentra en un 50% y las actividades de mejoramiento periódico en las cuales se contempla los ítems de conformación vial, mejoramiento de la subrasante con adición de material y afirmado, se logra un avance de ejecución del 90%.
- Se realizan charlas y capacitaciones al personal de obra en los temas relacionados con los riesgos, seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de cada una de sus actividades, incentivar y concientizar a la práctica al protocolo de bioseguridad frente al COVID-19.
- En el mes de marzo, algunos días presentaron altas precipitaciones que retrasaron el avance de las actividades de obra. Es por esto que, las constantes lluvias modifican y alteran el estado inicial de la vía convirtiéndolo en un terreno altamente resbaladizo, generando problemas en el desplazamiento del personal, maquinaria y equipo a lo largo de la vía.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Construcción de obras de drenaje, en donde se contemplan seis (6), alcantarillas con Tubería en Polietileno de alta densidad con pared externa estructural e interna lisa-PEAD ADS DN 36". Se ejecutan actividades de conformación y nivelación de la subrasante para posteriormente realizar proceso constructivo de placa huella.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades de la ejecución del proyecto.
- Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividades ejecutadas por parte de interventoría para el contrato en ejecución del mes de febrero del año 2021.
- Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS por medio de la plataforma virtual, con el fin de que los supervisores y gestor técnico del contrato revise el estado actual de los contratos.
- Visitas técnicas y elaboración de comités de obra/reuniones con las partes (municipio, invias, contratista de obra y comunidad) requeridas en el desarrollo de la ejecución del contrato.
- Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector (acompañamiento diario en el avance de las actividades de obra) del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos técnicos establecidas en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural asignadas para los contratos PDET CATATUMBO-COLOMBIA RURAL)
- Seguimiento y control al protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, a cargo del personal profesional siso de la interventoría.
- Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
- Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

- Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo No. 0002561 que deriva el contrato de obra. En la que se obtiene respuesta por parte de la alcaldía municipal de Teorama, NDS radicando presupuesto de rocería, interventoría realiza revisión y remite sus respectivas observaciones con el fin de dar trazabilidad al seguimiento y cumplimiento de dicho programa.
- Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto.
- Desarrollo de comités técnicos semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoría y/o gestor técnico del contrato de interventoría, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.
- Elaboración de Informe trimestral que contiene la gestión ambiental y social implementada en cado uno de los convenios, con el objetivo de realizar seguimiento, control y verificación de los aspectos ambientales y sociales que impactan en la ejecución, dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas del INVIAS, específicamente a lo contenido en el Instructivo para el Seguimiento a La Gestión Ambiental y Social. Informe remitido al INVIAS - Subdirección del medio Ambiente y Gestión Social.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, se encuentra aprobados estudios y diseños ejecutados en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, la información se encuentra diligenciada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3, en el cual se presenta la relación del resumen mensual del estado general del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021 se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4, en el cual se encuentra la relación de la maquinaria contratada por el contratista de obra en la ejecución del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6, la relación del personal contratado por el contratista de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8, el cual presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se presentan días con altas precipitaciones algunos días provocando retraso en la ejecución y avance de las actividades de obra, esta información se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se registra seguimiento al estado general del tiempo tomando el registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, no se realizaron ensayos de laboratorio, debido a que fueron realizados en el mes de febrero.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12. Se verifica que el personal se encuentra activo en afiliaciones correspondiente al presente periodo y se anexa el formato de control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra diligenciado con la planilla de pago de seguridad social del mes anterior teniendo en cuenta que el contratista tiene plazo de realizar el pago hasta el mes siguiente. (Se anexa formato en PDF).

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14, el cual presenta el informe financiero del avance físico del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, donde se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra, con la respectiva ampliación de pólizas de acuerdo a la orden de inicio. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo 2021, en contratista hace entrega del Plan de Calidad, el cual se da aprobación por parte de la interventoría. Se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17, donde se registra el seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

El contratista de obra radicó entrega preliminar de la programación de obra. Sin embargo, se solicitó al contratista realiza respectivo ajuste de la reprogramación de obra, de acuerdo a la

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

aprobación definitiva de los Estudios y Diseños radicados a interventoría y a las fechas de inicio de las actividades de obra.

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó una entrega preliminar del programa de inversiones. Sin embargo, se solicitó al contratista la reprogramación del programa de inversiones, de acuerdo a los ajustes de los Estudios y Diseños que se realizaron y a las fechas de inicio de las actividades de obra el cual el contratista se encuentra elaborando.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

No se realizaron actas de comité de obra para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021.

4.11.4.1. ACTA DE AVANCE DE OBRA AL INVIAS

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se realizó comité de obra con los representantes del INVIAS, donde se socializó la visita de obra con la ART e interventoría en cada uno de los municipios del proyecto, así mismo el avance de los contratos de obra y distintos temas relacionados con la ejecución de la obra.
La información se encuentra registrada en el formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1, relacionados en la siguiente tabla:

(Se anexa formato en PDF).

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	
FECHA	**ACTA No.**
23/03/2021	ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, no se realizaron actas de reunión.

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, la interventoría realizó los respectivos informes semanales en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2. En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
1/03/2021	INFORME SEMANAL No. 15 - CTO. NO. LC_001_CO_001-2020
5/03/2021	INFORME SEMANAL No. 16 - CTO. NO. LC_001_CO_001-2020
12/03/2021	INFORME SEMANAL No. 17 - CTO. NO. LC_001_CO_001-2020
19/03/2021	INFORME SEMANAL No. 18 - CTO. NO. LC_001_CO_001-2020
26/03/2021	INFORME SEMANAL No. 19 - CTO. NO. LC_001_CO_001-2020

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra.

A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

NUMERAL	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.10	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 DE 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 843.371.017,00) IVA INCLUIDO.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	NO. 86520, DEL 17 DE ABRIL DEL 2020
RP	NO. 575920, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	PÓLIZA No.	CUANTÍA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Se realiza solicitud de prorroga en tiempo al contrato de interventoría con justificación de finalización de contratos de obra posterior a la fecha de contractual de interventoría, debido a los cambios climáticos de entrada al invierno presentados en la zona del Catatumbo donde se están ejecutando los contratos de obra derivados de los convenios, por otra parte, se viene evidenciando alteraciones en el orden público en la zona lo cual han retrasado el avance de la ejecución de los mismos. Por lo anterior, con la prorroga se solicita redistribución de recursos y actualización de plan de cargas, consecuente a esto se realiza acta modificatoria de cantidades la cual se encuentra en proceso de aprobación por los Supervisores del INVIAS.
- Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades de la ejecución del proyecto.
- Desarrollo de comités técnicos semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoría y/o gestor técnico del contrato de interventoría, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- Se realiza seguimiento al contrato de obra por medio de informes semanales, solicitud de información requerida para el avance de la ejecución de la obra y redacción de oficios.
- Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS por medio de la plataforma virtual, con el fin de que los supervisores y gestor técnico del contrato revise el estado actual de los contratos.
- Seguimiento a la implementación del Protocolo de Bioseguridad al contratista de obra, al igual que al grupo de trabajo que conforma la interventoría, seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las
- Se solicita al contratista de obra radicar programación de obra y plan de inversión de los recursos del proyecto ajustado.
- Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector (acompañamiento diario en el avance de las actividades de obra) del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos técnicos establecidas en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural asignadas para los contratos PDET CATATUMBO-COLOMBIA RURAL)
- Interventoría realiza el seguimiento del trámite de aprobación de vallas informativas con el grupo de comunicaciones y el ministerio de transporte, con el fin de agilizar el proceso de aprobación definitivo para el contrato de obra presentado y posteriormente notificar al contratista para posteriormente realizar su respectiva instalación.
- Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo No. 0002561 que deriva el contrato de obra. Adicionalmente, se realiza reunión virtual con el Ing. Sabier representante de la ART, donde participan gestores técnicos e ing. apoyo de supervisión del contrato de interventoría de INVIAS, Interventoría y secretario de planeación del municipio, en esta reunión se tratan los siguientes temas: Exposición de la presentación y contenido del Programa Emprendedores Rurales y Aclaración de dudas frente al tema del Programa Emprendedores Rurales.
- Se radica a INVIAS solicitud de prorroga al contrato de interventoría No. 1278 de 2020, siendo 68 días calendario con fecha de terminación el 30 de junio de 2021.
- Elaboración de Informe trimestral que contiene la gestión ambiental y social implementada en cado uno de los convenios, con el objetivo de realizar seguimiento,

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

control y verificación de los aspectos ambientales y sociales que impactan en la ejecución, dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas del INVIAS, específicamente a lo contenido en el Instructivo para el Seguimiento a La Gestión Ambiental y Social. Informe remitido al INVIAS - Subdirección del medio Ambiente y Gestión Social.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, interventoría contó con disponibilidad de su equipo de especialistas para ser resuelta cualquier inquietud en momento de requerirlo estableciendo apoyo especializado técnico para cada uno los proyecto en ejecución.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA **PLAZO:** 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00	1,12	4,00	1,12
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00	8,42	24,00	9,54
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203	$ 85.676.916	$ 82.997.287	20,00	10,16	44,00	19,70
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203	$ 140.864.194	$ 27.810.009	20,00	16,70	64,00	36,41
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203	$ 134.861.606	$ 33.812.597	20,00	15,83	84,00	52,24
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con cuatro Vehículos 4x4, cilindraje 2.000 y equipos de topografía.

Por otra parte, para cada inspector, en cada uno de los 8 frentes de trabajo, de Interventoría se asignó motocicletas 125 cc (c/u) para su transporte o traslado dentro y hacia sitio de ejecución de los proyectos.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. Se realiza cambio de residente de interventoría una vez fue aprobada la hoja de vida de la nueva ingeniera residente. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se radicó al Instituto Nacional de Vías INVIAS, la póliza No. 96-44-10115578 actualizada de acuerdo a prórroga del contrato de interventoría No. 1278 de 2020, mediante oficio CSN-ANT-CTUMBO-097 de fecha 19 de enero de 2021 y se subió a la plataforma SECOP II la respectiva póliza. La interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde está registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra ajustado el plan de calidad. Se encuentra diligenciado en el MINFRA-MN-IN-15-FR-18 (Se anexa formato en PDF).

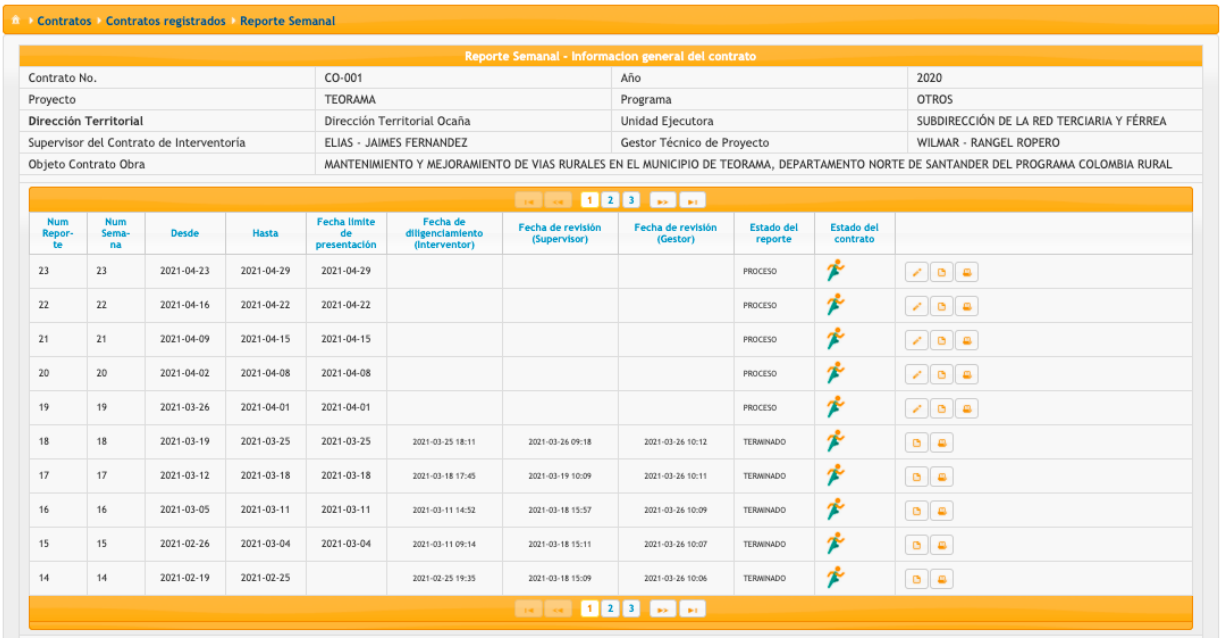
6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado Contrato de Interventoría y MINFRA-MN-IN-3-FR-2 Informe de Revisión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Interventoría, a la fecha se desembolso el tercer anticipo a la interventoría, se encuentra en espera de que entregue el banco los rendimientos financieros de la cuenta corriente correspondiente a este, para así realizar el cierre de la cuenta en conjunto de la supervisión para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021 presentó en el aplicativo CIFRA-INVIAS, cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio de Teorama y la información del contrato de obra. (Se anexa registro fotográfico)



Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	CO-001	Año	2020
Proyecto	TEORAMA	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Ocaña	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
Supervisor del Contrato de Interventoría	ELIAS - JAIMES FERNANDEZ	Gestor Técnico de Proyecto	WILMAR - RANGEL ROPERO
Objeto Contrato Obra	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		

1 2 3

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
23	23	2021-04-23	2021-04-29	2021-04-29				PROCESO		
22	22	2021-04-16	2021-04-22	2021-04-22				PROCESO		
21	21	2021-04-09	2021-04-15	2021-04-15				PROCESO		
20	20	2021-04-02	2021-04-08	2021-04-08				PROCESO		
19	19	2021-03-26	2021-04-01	2021-04-01				PROCESO		
18	18	2021-03-19	2021-03-25	2021-03-25	2021-03-25 18:11	2021-03-26 09:18	2021-03-26 10:12	TERMINADO		
17	17	2021-03-12	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-18 17:45	2021-03-19 10:09	2021-03-26 10:11	TERMINADO		
16	16	2021-03-05	2021-03-11	2021-03-11	2021-03-11 14:52	2021-03-18 15:57	2021-03-26 10:09	TERMINADO		
15	15	2021-02-26	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-11 09:14	2021-03-18 15:11	2021-03-26 10:07	TERMINADO		
14	14	2021-02-19	2021-02-25		2021-02-25 19:35	2021-03-18 15:09	2021-03-26 10:06	TERMINADO		

1 2 3

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.3. INFORME MENSUAL DE CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se anexa el informe mensual correspondiente al seguimiento, control e implementación del protocolo de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a la circular externa N° 003 del 2020 emitida por el INVIAS en el marco de las medidas de prevención de la infección respiratoria aguda denominada COVID– 19. (Se anexa formato en PDF).

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

NUMERAL	CONTENIDO	FORMATO
6.1	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-5
6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.4	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.5	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-18
6.7	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-3-FR-1
	INFORME DE REVISIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-3-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha, se obtiene un avance de ejecución de actividades de obra correspondientes a un 30% de lo ejecutado, se avanza en la construcción de 190 ml placa huella en el tramo # 3 y 4, se genera un avance del 90% en la construcción de las seis (6) alcantarillas intervenidas. Debido al estado del clima donde se presentaron días con lloviznas se retrasan actividades de obra, por el mal estado del terreno, provocando hundimiento en las motocicletas en las que el personal se desplaza ellos mismos y también los materiales. Sin embargo, durante el mes de marzo no se detienen las actividades, ya que son reemplazadas por otras. En tramo 1 y 2, se realiza replanteo manual de cunetas, excavación manual y figurado de acero de refuerzo para bordillos, la conformación vial ya se encuentra en un 100% ejecutada.

La ejecución de las actividades en obra se ha visto afectado por las intensas lluvias que se han presentado en la zona, sin embargo, el contratista adelanta trabajos de construcción de placa huella.

Se realiza visita de obra el día martes 16 marzo de 2021, en compañía de la ART con el fin de hacer inspección y seguimiento al avance en la ejecución de las actividades en obra.

Interventoría solicita al contratista de obra reprogramación y plan de inversión ajustado de acuerso a la fecha de inicio de las actividades de obra y la aprobación definitiva a los estudios y diseños.

El alcance definitivo del proyecto contempla 565 ml de placa huellas distribuidos en cuatro tramos viales y 6 alcantarillas, además, actividades de conformación de vía, como se socializó con el Municipio, ART, Invias, Contratista de Obra, Interventoría y comunidad beneficiada.

Se radicada valla informativa al contratista de obra, aprobada por el ministerio de transporte para su respectiva producción e impresión con las medidas establecidas según la resolución asignada.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
68202 03281 STD
DIRECTOR INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio como director de Interventoría, de la construcción de las obras de mantenimiento y mejoramiento en las vías terciarias del municipio de Teorama, Norte de Santander, correspondientes al periodo del 1 al 31 del mes de marzo de 2021, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental.

ALCANCE

Se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización de los ajustes a los estudios y diseños, como de obra realizados por el contratista y las actividades ejercidas de interventoría, realizadas durante el mes de marzo de 2021, incluyendo el ámbito técnico, administrativo y financiero de los avances de la ejecución del proyecto.

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2021, estas actividades de avance fueron en la construcción de placa huella en el tramo # 3 y 4 y la construcción con un avance del 90% en las seis (6) alcantarillas intervenidas. En tramo 1 y 2, se realiza replanteo manual de cunetas, excavación manual y figurado de acero de refuerzo para bordillos.

Se describe, en resumen, a continuación, el estado actual de la ejecución vs. Programado a ejecutar:

Nota Aclaratoria: A la fecha el contratista presentó Acta de recibo parcial No1. del contrato de Obra LC 001-CO-001-2020, en donde se describe las condiciones actualizadas del contrato y las cantidades ejecutadas a la fecha con corte al 18 de Marzo de 2021. Por un valor de $507.867.898.75.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUIDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	% EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 2020	$ 11.472.292,65	1,09%	$ 10.419.788,74	0,99%
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA	ENERO DE 2021	$ 38.205.892,04	3,63%	$ 47.046.924,91	4,47%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 332.064.984,53	31,55%	$ 81.042.801,30	7,70%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 555.195.814.07	52,75%	$ 421.001.565,17	40%
EJECUCIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	$ 115.564.929,64	10,98%		0,0%
TOTAL		$1.052.503.912,93	100%	$559.511.080,11	53,16%

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA

- Tramos correspondientes a la placa huella

No. PLACA HUELLA	ABSCISA Y LONGITUD	ACTIVIDADES	INTERVENCION	% DE EJECUCION
TRAMO 1	Abscisa: K0+890 – K1+025 (135ML)	✓ LOCALIZACION Y REPLANTEO ✓ CONFORMACION VIAL	NO	20%
TRAMO 2	Abscisa: K3+430 – K3+520 (90ml)	✓ LOCALIZACION Y REPLANTEO ✓ CONFORMACION VIAL	NO	20%
TRAMO 3	Abscisa: K4+0,20 – K4+180 (160ml)	✓ LOCALIZACION Y REPLANTEO ✓ CONFORMACION VIAL ✓ INSTALACION DE REFUERZO ✓ CONCRETO CICLOPEO ✓ CONCRETO REFORZADO	SI	45%
TRAMO 4	Abscisa: K7+100 – K7+280 (180ml)	✓ LOCALIZACION Y REPLANTEO ✓ INSTALACION DE SUB- BASE ✓ INSTALACION DE REFUERZO ✓ CONCRETO CICLOPEO ✓ CONCRETO REFORZADO	SI	90%

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- El estado de las seis (6) alcantarillas, se completa el proceso constructivo al 100%.

No. ALC	ABSCISA	TUBERIA	ENCOLE	DESCOLE	% DE EJECUCION
No. 1	Abscisa: K0+870	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 2	Abscisa: K4+140	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 3	Abscisa: K4+775	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 4	Abscisa: K7+150	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 5	Abscisa: K8+630	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 6	Abscisa: K2+080	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Los alcances de placa huellas presentados dentro de los ajustes a los diseños contemplan los siguientes tramos:

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA 1	135 ml	K0+890	K1+025
PLACA HUELLA 2	90 ml	K3+430	K3+520
PLACA HUELLA 3	160 ml	K4+020	K4+180
PLACA HUELLA 4	180 ml	K7+100	K7+280
ALCANTARILLA 1		K0+870	
ALCANTARILLA 2		K4+140	
ALCANTARILLA 3		K4+775	
ALCANTARILLA 4		K7+150	
ALCANTARILLA 5		K8+630	
ALCANTARILLA ADICIONAL		K2+080	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

Este proyecto tiene aprobación de ajuste a estudios y diseños al 100%, incluida el acta modificatoria de cantidades para el presupuesto acorde a las modificaciones del alcance del proyecto.

En este proyecto se presenta un porcentaje de ejecución de obra del 35%, se realizan actividades de construcción de placa huella en tramo #3 y #4, se realizan actividades de armado de acero de refuerzo, adaptación de formaleta y fundida de concreto en huella, sobre anchos y demás. Se realiza avance en los tramos #1 y #2 de replanteo manual de cunetas y excavación y armada de acero para bordillo. De igual forma, se avanza en la construcción de las seis (6) alcantarillas, donde 5 de ellas están terminadas en un 100%, se ejecutan actividades de conformación vial en un 100%.

Por parte la interventoría solicita a la Alcaldía Municipal, la conformación de las veedurías y la implementación del programa emprendedores rurales, se ha reiterado dicha solicitud y se está a la espera de dicha conformación.

La visita técnica se llevó a cabo con la ART y el equipo de la interventoría, se realizó satisfactoriamente, el pasado martes 16 de marzo del 2021, de la cual se realizó socialización con el invias mediante comité el día 23 de marzo de 2021, esta información fue diligenciada en el acta de comité No.6, que se encuentra en recolección de firmas por parte de los participantes.

No aplica seguimiento al manejo del anticipo para este contrato.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
68202 03281 STD
DIRECTOR INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

OFICIOS RECIBIDOS INVIAS				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	EMPRESA	REMITENTE
4/03/2021	CSN-ANT-CTUMBO-334	INFORME SEMANAL NO.15	ING. RODRIGO OSORIO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
11/03/2021	CSN-ANT-CTUMBO-338	INFORME SEMANAL NO.16	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
18/03/2021	CSN-ANT-CTUMBO-340	INFORME SEMANAL NO.17	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
19/03/2021	CSN-ANT-CTUMBO-341	SOLICTUD PRÓRROGA CTO INTERVENTORIA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
25/03/2021	CSN-ANT-CTUMBO-342	INFORME SEMANAL NO.18	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RELACIÓN OFICIOS RECIBIDOS TEORAMA		
FECHA	**ASUNTO**	**ENVIA**
3/03/2021	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN QUE SE REQUIERE EN HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDEDORES RURALES.	EDUARDO ALVAREZ ZUÑIGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE TEORAMA
3/03/2021	ENSAYOS DE DENSIDADES EN EL TERRENO DEL CONTRATO DE OBRA NO LC_001_CO_001-2020,	U.T MEJORAMIENTO VIAL
23/03/2021	ME PERMITO ADJUNTAR OFICIO PARA SOLICITAR ACTIVACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y SOLICITUD DE CHEQUERA PARA LA CUENTA CORRIENTE 31800000135	MARIA DIVI MORA BECERRA

OFICIOS ENVIADOS TEORAMA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITENTE**
16/03/2021	CSN-ANT-CTUMBO-339	INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCIÓN 223 DEL 2021 – MINISTERIO DE SALUD.	TODOS LOS CONTRATISTAS	ING. ALEJANDRO CACERES/SISO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

OFICIOS RECIBIDOS INVIAS			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIA
1-mar-21	16294	SOLICITUD VALLA INFORMATIVA CONTRATOS OBRA	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
1-mar-21	DG-GC 7580	RESPUESTA A ENTRADA NO. 11289 CON FECHA 15/02/2021 "CORREO ELECTRONICO - SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE ESTADO DEL PROCESO DE ELABORACION DE VALLAS - PROYECTO COLLOMBIA RURAL"	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES - INVIAS
2-mar-21		SOLICITUD VALLA INFORMATIVA CONTRATOS OBRA - COLOMBIA RURAL PDET CATATUMBO	JOAN STEVEN RICO LÓPEZ - GRUPO DE COMUNICACIONES
04-MAR.-21		SOLICITUD AVANCE DE OBRA PROGRAMADA Y EJECUTADA DE LOS 8 MUNICIPIOS A LA FECHA Y TAMBIÉN ASPECTOS TÉCNICOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO	ING. BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN - DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
05-MAR.-21	18122	INFORME SEMANAL NO. 15 - CTO INTERVENTORÍA 1278 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
9-mar-21		ARCHIVO ADJUNTO REMITO CUADRO A DILIGENCIAR.	ING. WILMAR RANGEL ROPERO - SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
12-mar-21	20520	INFORME SEMANAL NO. 16 - CTO INTERVENTORÍA 1278 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
12-mar-21		CUADRO DE AVANCES PARA DILIGENCIAR CON CORTE TODOS LOS 20 DE CADA MES. AGRADEZCO SU ATENCIÓN.	ING. WILMAR RANGEL ROPERO - SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
12-mar-21		REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE EL DÍA 17 DE MARZO A LAS 4:00 PM EN LAS INSTALACIONES DE INVIAS TERRITORIAL OCAÑA, PARA TRATAR TEMAS TALES COMO: BALANCES, PRORROGA Y ANTICIPO.	ING. BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN - DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
15-mar-21	DG-GC 11011	RESPUESTA A ENTRADA NO. 15109 CON FECHA 24/02/2021 "CORREO ELECTRONICO - RE: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE ESTADO DEL PROCESO DE ELABORACION DE VALLAS - PROYECTO COLLOMBIA RURAL"	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES
15-mar-21	DG-GC 10951	RESPUESTA A ENTRADA NO. 9417 CON FECHA 09/02/2021 "CORREO ELECTRONICO- SOLICITUD VALLA INFORMATIVA CONTRATOS OBRA - COLOMBIA RURAL PDET CATATUMBO (MUNICIPIO TIBU)"	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES
15-mar-21	DG-GC 11007	RESPUESTA A ENTRADA NO. 9769 CON FECHA 09/02/2021 "CORREO ELECTRONICO - SOLICITUD VALLA INFORMATIVA CONTRATOS OBRA - COLOMBIA RURAL PDET CATATUMBO (MUNICIPIO EL TARRA)"	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES
15-mar-21	DG-GC 10950	RESPUESTA A ENTRADA NO. 7675 CON FECHA 03/02/2021 - INFORMAMOS QUE LOS ARCHIVOS DE LAS VALLAS CON EL VISTO BUENO POR PARTE DEL MINISTERIO PARA SU PRODUCCIÓN, FUERON ENVIADOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2021.	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES
16-mar-21	DG-GC 10947	RESPUESTA A ENTRADA NO. 16294 CON FECHA 01/03/2021	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES
16-mar-21	DG-GC 11002	RESPUESTA A ENTRADA NO. 9578 CON FECHA 09/02/2021 "CORREO ELECTRONICO SOLICITUD VALLA INFORMATIVA CONTRATOS OBRA - COLOMBIA RURAL PDET CATATUMBO (MUNICIPIO EL HACARI)"	ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE - COORDINADORA GRUPO COMUNICACIONES
19-mar-21	23217	INFORME SEMANAL NO. 17 - CTO INTERVENTORÍA 1278 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
19-mar-21		ADJUNTO LA VALLA CON EL VISTO BUENO POR PARTE DEL MINISTERIO PARA SU PRODUCCIÓN.	SANDRA JEANNETTE CORTÉS MORA - GRUPO COMUNICACIONES
23-mar-21		RESPECTO AL FORMATO MINFRA-MN-IN-13-FR-1 EL NOMBRE DEL ABOGADO DE LA UNIDAD EJECUTORA ES RODRIGO ANDRES FRANCO ANGARITA Y EL NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA ES RICARDO ANTONIO CORREDOR MATRÍCULA NO.: 01106-0831 Y DEL GESTOR DE PROYECTO LA MATRÍCULA NO.: 54202176493 NTS, ADEMÁS SE DEBE DILIGENCIAR EL CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-16, LA REDISTRIBUCIÓN DEL RECURSO Y EL PLAN DE CARGAS.	ING. WILMAR RANGEL ROPERO - SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
24-mar-21		ME CORROBORAN LAS FECHAS DE INICIO, TERMINACIÓN Y PRORROGA.	OSCAR JAVIER VILLARREAL NEIRA
24-mar-21		ADJUNTO FORMATOS GUÍA FALTANTES PARA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA INTERVENTORÍA	ING. BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN - DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
24-mar-21	DG-GC 12743	RESPUESTA A ENTRADA NO. 9448 CON FECHA 09/02/2021 "CORREO ELECTRONICO - SOLICITUD VALLA INFORMATIVA CONTRATOS OBRA - COLOMBIA RURAL PDET CATATUMBO (MUNICIPIO EL CARMEN)"	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
25-mar-21		LA VALLA DE SAN CALIXTO AÚN ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO.	JOAN STEVEN RICO LÓPEZ - GRUPO DE COMUNICACIONES
25-mar-21		LE ENVÍO EL FORMATO MINFRA CORREGIDO, FIRMADO POR EL ING ELÍAS	ING. BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN - DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
26-mar-21	25154	INFORME SEMANAL NO. 18 - CTO INTERVENTORÍA 1278 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS
25-mar-21		LE ENVÍO EL FORMATO MINFRA CORREGIDO, FIRMADO POR EL ING ELÍAS	ING. BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN - DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
26-mar-21	25154	INFORME SEMANAL NO. 18 - CTO INTERVENTORÍA 1278 2020	SECRETARIA GENERAL - GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO INVIAS

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Excavación de alcantarilla #1 K0+870 5m largo, 2m ancho, 2,50m profundidad</td><td>Excavación de alcantarilla #1 K0+870 5m largo, 2m ancho, 2,50m profundidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Relleno y compactación manual con base granular en alcantarilla #1 K0+870</td><td>Retiro de material sobrante y replanteo manual para ubicación del tubo en alcantarilla #1 K0+870</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalación de tubería PEAD, relleno y compactación manual con base granular en alcantarilla #1 K0+870</td><td>Excavación manual para aletas, descole y muro pantalla en alcantarilla #1 K0+870</td></tr>
</table>

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Excavación manual para aletas, descole y muro pantalla en alcantarilla #1 K0+870	Replanteo manual de poceta y aletas para la alcantarilla #1 K0+870
	
Replanteo manual de poceta y aletas para la alcantarilla #1 K0+870	Replanteo manual de poceta y aletas para la alcantarilla #1 K0+870
	
Construcción de alcantarilla #1	Excavación manual para armado y fundición de zarpa en alcantarilla #1 K0+870


interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundida de solado para zarpa en alcantarilla #1 K0+870	Fundida de solado para poceta en alcantarilla #1 K0+870
	
Armado de acero para zarpa en alcantarilla #1, absc K0+870	Se realiza fundida de zarpa en alcantarilla #1, absc K0+870
	
Se realiza fundida de zarpa en alcantarilla #1, absc K0+870	Armado de acero para placa de descole en alcantarilla #1, absc K0+870

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundición de placa de descole de alcantarilla #1 K0+870	Armado de acero para aletas y muro pantalla en alcantarilla #1 K0+630
	
Armado de acero para poceta en alcantarilla #1, absc K0+870	Fundida de zarpa para poceta en alcantarilla #1 K0+870
	
Armado de formaleta para fundición de poceta en alcantarilla #1 K0+870	Fundida de poceta para alcantarilla #1, absc K0+870

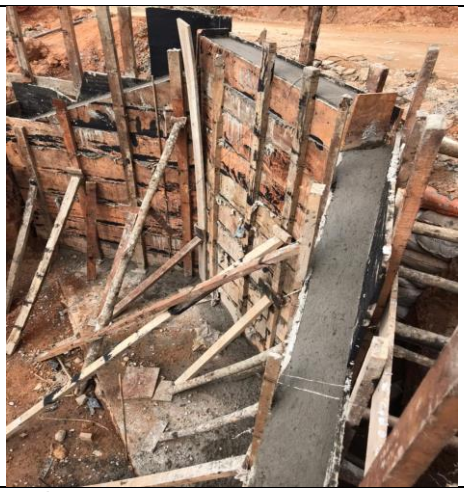interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Desencofrado de poceta en alcantarilla #1 K0+870	Armado de encofrado para fundición de muro pantalla y aletas en alcantarilla #1 K0+870
	
Fundición de muro pantalla y aletas para alcantarilla #1 K0+870	Construcción alcantarilla #1 K0+870

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Excavación manual para aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)	Armado de parrilla en acero para poceta en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)
	
Excavación para armado de zarpa en acero para fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140	Fundida de solado para placa de descole, aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3
	
Armado de acero para poceta en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)	Figurado de acero para aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de acero para zarpa en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)	Fundida de zarpa en alcantarilla #2, absc K4+140
	
Armado de parrilla para placa de descole en alcantarilla #2 K4+140	Armado de encofrado para fundición de poceta en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)
	
Desencofrado de poceta en alcantarilla #2 K4+140	Armado de formaleta para fundir aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 K4+020-K4+180

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Se funde aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 K4+020-K4+180	Desencofrado de muro pantalla y aletas en alcantarilla #2 K4+140, en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Construcción de alcantarilla #2, en tramo 3 k4 +020-k4+180	
	
Construcción de alcantarilla #2, en tramo 3 k4 +020-k4+180	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de acero para placa de descole en alcantarilla #3 absc K4+775	Armado de acero para placa de descole, muro pantalla y aletas en alcantarilla #3 K4+775
	
Fundida de base para aletas y muro pantalla en alcantarilla #3 K4+775	Armado de parrilla para fundición de placa de descole en alcantarilla #3 K4+775
	
Fundición de placa de descole en alcantarilla #3 K4+775	Armado de encofrado en madera para aletas y muro pantalla en alcantarilla #3 K4+775

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla # 3 K4+775



Fundida de poceta en alcantarilla #3, absc K4+775



Limpieza manual de poceta en alcantarilla #3 K4+775



Construcción de alcantarilla # 3 K4+775





Construcción de alcantarilla # 3 Estructura cole y descole, absc K4+775

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de acero para placa de descole, aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150.	Fundida de base para aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)
	
Armado de parrilla para placa de descole en alcantarilla #4 K7+150	Fundida de placa de descole en alcantarilla #4 K7+150
	
Armado de tableros para muro pantalla y aletas en alcantarilla #4 (K7+100-K7+280)	Fabricación de tableros para alcantarilla #4, absc K7+150

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de tableros para aletas en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4, absc K7+100-K7+280	Fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4, absc K7+100-K7+280
	
Desencofrado de aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150 ubicada en el tramo 4 K7+100-K7+280	Encofrado de poceta para fundición en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7-280)
	
Fundida de poceta en alcantarilla #4 K7+150	Desencofrado de poceta en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950





Construcción de alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)



Desencofrado de poceta en alcantarilla #5 K8+630



Armado de tableros para fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630



Fundida de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630, ubicada a 1,5 km del tramo 4 (k7+100-K7+280)



Desencofrado de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Excavación para alcantarilla adicional	Relleno y compactación manual para alcantarilla adicional
	
Replanteo manual para fundición de zarpa en alcantarilla adicional	Fundida de solado para poceta en alcantarilla adicional
	
Fundida de solado para muro pantalla en alcantarilla adicional	Armado de acero para poceta en alcantarilla adicional

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de zarpa para alcantarilla adicional K2+080	Armado de zarpa para poceta en alcantarilla adicional K2+080
	
Fundición de zarpa para muro pantalla en alcantarilla adicional K2+080	Fundición de zarpa para poceta en alcantarilla adicional K2+080
	
Armado de acero para placa de descole para alcantarilla adicional K2+080	Excavación manual para descole en alcantarilla adicional K2+080

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de encofrado para muro pantalla en alcantarilla adicional K2+080	Fundición de placa de descole en alcantarilla adicional K2+080
	
Fundición de muro pantalla en alcantarilla adicional K2+080	Fundición de poceta en alcantarilla adicional K2+080
	
Construcción de alcantarilla adicional abscisado k2+080	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Toma de apiques en tramo # 4	Toma de apiques en tramo # 4 para verificación de espesor de sub base.
	
Toma de apiques en tramo # 3	Toma de apiques en tramo # 3 para verificación de espesor de sub base.
	
Toma de apiques en tramo # 2	Toma de apiques en tramo # 2 para verificación de espesor de sub base.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Toma de apiques en tramo # 1	Toma de apiques en tramo # 1 para verificación de espesor de sub base.
	
Replanteo manual de cunetas en tramo 1, absc K0+890-K1+025	Excavación manual para bordillos en tramo 1 K0+890-K1+025
	
Replanteo manual de cunetas en tramo 1, absc K0+890-K1+025	Figurado de acero para bordillos en tramo 1 (K0+890-K1+025)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Replanteo manual de cunetas en tramo #2,absc K3+430-K3+520	Replanteo manual de cunetas en tramo 2 (K3+430-K3+520)
	
Replanteo manual de cunetas en el tramo 2 (K3+430-K3+520)	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Replanteo manual de cunetas en el tramo 3 (K4+020-K4+180)	Replanteo manual de cuneta en el tramo 3, absc K4+020-K4+180
	
Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 3, absc K4+020-K4+180	
	
Armado de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180	Armado de 21ml de formaleta para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de 21ml de huella izquierda en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Fundición de 21ml de huella izquierda en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de 36ml de huella derecha en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Fundición de 36ml de huella derecha en tramo 3 K4+020-K4+180	Armado de formaleta para huella derecha en tramo 3 K4+020-K4+180

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Amarre de vigas de acero para construcción de Placa Huella Tramo # 4	Colocación de vigas riostras en acero y trazo de ejes en el tramo #4 (K7+100-K7+280)
	
Inclusión de vigas riostras y trazo de ejes en el tramo 4(K7+100-K7+280)	Armado de acero longitudinal y transversal para huella en el tramo 4(K7+100-K7+280)
	
Armado de acero para huella en tramo #4, absc K7+100-K7+280	Armado de acero para huellas en tramo #4 K7+100-K7+280

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Encofrado de huellas en tramo #4 K7+100-K7+280	Fundida de placa huella en tramo #4, absc (K7+100-K7+280)
	
Fundición de 27 ml largo x 1,35 m ancho x 0,15m de espesor de huella derecha en el tramo 4, absc K7+100-K7+280	
	
Se funde placa huella en tramo 4 K7+100-K7+280, dimensiones 30ml largo x 0.9m ancho x 0.15 espesor.	Armado de formaleta para sobreancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de acero para huellas en tramo 4, absc K7+100-K7+280	Fundida de 39 ml de concreto ciclópeo en centro y sobreancho derecho, para placa huella tramo 4
	
Excavación para base de bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280	Fundida de 33ml de sobreanchos en concreto ciclópeo en el tramo 4 (K7+100-K7+280)
	
Formaleteo de huellas en el tramo 4, absc K7+100-K7+280	Fundición de 15ml de sobreancho izquierdo en piedra pegada, en el tramo 4 (K4+100-K4+280)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundición de 15ml de huella derecha en concreto reforzado en el tramo 4 (K4+100-K4+280)	Formaleteo de 15 metros de huella para fundición en el tramo 4 (K4+100-K4+280)
	
Fundición de 36ml de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280	Fundición de 36ml de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Fundida de 21ml de piedra pegada en el tramo 4, absc (K7+100-K7+280)	Fundida de 18ml x 0.45 ancho x 0.15 de espesor de sobreancho derecho en piedra pegada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundición de 30ml de base para bordillos en tramo 4 K7+100-K7+280	Fundición de 15ml de berma cuneta y bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Fundida de berma en cuneta y bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280	Armado de cuneta bordillo izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Fundición de 15ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280	Armado de formaleta para sobreancho derecho en tramo 4 K7+100-K7+280

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de acero para huella en tramo 4 K7+100-K7+280	Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Armado de acero para huella en tramo 4 K7+100-K7+280	Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Fundición de 24ml de huella en tramo 4(K7+100-K7+280)	Estado de vía hacia en tramo 4, difícil accesibilidad por constantes lloviznas

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Señalización cierre de vía



Campamento y material





Visita técnica al municipio de Teorama con la ART, esquipo de interventoría y director de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ΓA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. 05 **MES O PERIODO:** MARZO/2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas		X		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		
5.5	Información otros programas y aplicativos		X		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** MARZO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: LC-001-CO-001-2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACION: 30 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.052.503.912,93
VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción de placa huella	ML	565
Alcantarillas	UND	6
Actividades de mantenimiento periodico	ML	565
Caracterización	KM	9,3

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Construcción de placa huella	ML	150
Alcantarillas	UND	6
Actividades de mantenimiento periodico	ML	565
Caracterización	KM	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 555.195.814,07	$ 410.476.526,04		$ 410.476.526,04	0,74	$ 168.674.203,00	1	0,411
Acumulado:	$ 937.149.484,07	$ 421.001.565,17		$ 421.001.565,17	0,45	$ 708.431.654,00	1	1,683

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	$ 1.052.503.913,00
Total	$ 1.052.503.913,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado.	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,4000	4,00	0,8	1	$ 631.502.347,76	0	115.354.429	115.354.429
Interventor:	0,8400	4,00	0,8	1	$ 134.939.363,00	0	134.939.363	134.939.363

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.382.739,25
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 10.382.739,25
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 20.765.478,50

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	5/11/2020	5/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5/11/2020	5/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	5/11/2020	5/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 9/11/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A la fecha el contrato de obra no presenta multas ni sanciones.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	31	3	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CONTRATO No.** LC-001-CO-001-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR ELÉCTRICO	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRO A GASOLINA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: MARYORY ALEXANDRA CASTRO VASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-331774 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	11061	MEJORAMIENTO,Y MANTENIMIENTODEL CORREDORPRODUCTIVO MIRACOTES-LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE		NACION	LC-001-CO-001-2020	$ 1.052.503.913
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.034.686.823,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
														A LA FECHA LAS ACTAS DE COBRO NO SE HA FACTURADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA SU RESPECTIVA REVISION CON SOPORTES
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	1.022.686.895,25		$ 1.029.765.714,04
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.382.739,25	19%	$ 12.355.459,71
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	10.382.739,25		$ 10.382.739,25
VALOR TOTAL	$ 1.043.452.373,75		$ 1.052.503.913,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: MARZO DE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** LC-001-CO-001-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUIS CARLOS VILA	DIRECTOR DE OBRA			X				X		X					X	X	X	X				X		X	X	X					X	X
LEIDON SEPULVEDA	INGENIERO AUXILIAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X	X				X	X
JESÚS RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GUBER CARVAJALINO	OFICIAL DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUBEN MONTEJO	OFICIAL DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAYID ORTIZ	OFICIAL DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JHON A. MENESES G	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIONEL ALVAREZ P	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS GRANADOS	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE ANGARITA S	OBRERO	X	X	X	X			X							X							X										
JOSE DEL CARMEN TORO	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUSIANI CARRASCAL ASCANIO	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CRISTIAN E ARDILA	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
JUAN OMAR HERNANDEZ	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
ALIRIO ANGARITA	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JHON A. ANGARITA	OBRERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YEFREY JOSE DIAZ	OBRERO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
GABRIEL OVALLOS	OBRERO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
YEISON OVALLOS	OBRERO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
JESUS ALEJANDRO RINCON	OBRERO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
LUIS OVALLOS	OBRERO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
YORMAN OVALLOS A	OBRERO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
LUIS FERNANDO JAIME ARDILA	OBRERO																													X	X	X
EDIXON MANUEL ROMERO	OBRERO																													X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: MARYORY ALEXANDRA CASTRO VASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-331774 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	19	24	24	24	24	24	24	24	24	14	24	24	24	24	19	14	14	24	19	24	24	24	24	14	14	19	14	24	24	24	24	664
Lluvias moderadas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	10	6	0	5	0	0	0	0	10	10	5	10	0	0	0	0	76
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: MARYORY [illegible] CASTRO VASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-331774 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes	EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago	Observaciones
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
LUIS CARLOS VILA	DIRECTOR DE OBRA	FEBRERO/2021	30	88.141.440	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30			30		30	LUIS CARLOS VILA	VER NOTA
DIONEL ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA		15	1.005.018.012	X X X X X X X X X X X X X X X	9417368549	15		9417368549	15	9417368549	15	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL	
JORGE ANGARITA	AYUDANTE DE OBRA		8	5.519.172	X X X X X X X X		8			8		8		
GUBER CARVAJALINO	OFICIAL DE OBRA		15	5.519.587	X X X X X X X X X X X X X X X		15			15		15		
JUAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA		15	1.004.825.222	X X X X X X X X X X X X X X X		15			15		15		
RUBEN MONTEJO	OFICIAL DE OBRA		15	1.091.162.427	X X X X X X X X X X X X X X X		15			15		15		
JOHOSMAN OCHOA	AYUDANTE DE OBRA		8	1.003.204.243	X X X X X X X X		8			8		8		
PABLO PEDROZA	AYUDANTE DE OBRA		8	1.091.162.432	X X X X X X X X		8			8		8		
JESUS RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA		15	13.176.096	X X X X X X X X X X X X X X X		15			15		15		
LEIDON SEPULVEDA	ING. AUXILIAR RESIDENTE		30	1.091.678.091	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30			30		30		
JOSE TORO	AYUDANTE DE OBRA		15	1.004.825.573	X X X X X X X X X X X X X X X		15			15		15		
RAFAEL TORRADO	ING. RESIDENTE		30	88.140.626	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30			30		30		

NOTA: SE VERIFICA QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRA ACTIVO EN AFILIACIONES CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PERIODO Y SE DILIGENCIA EL FORMATO CON LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE PLAZO DE REALIZAR EL PAGO HASTA EL MES SIGUIENTE.

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** **PERIODO MES:** MARZO DE 2021 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LC-001-CO-001-2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
SECTOR: MUNICIPIO DE TEORAMA
RUTA:
TRAMO: MIRACOTES - LOS RANCHOS

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 30 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.052.503.912,93
VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE ABRIL DEL 2021
VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LC-001-CO-001-2020	5 MESES	29/04/2021	$ 1.052.503.912,93	$ 1.052.503.912,93

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	$ 1.052.503.913,00
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278	5 MESES	23-abr-21	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 555.195.814,07	###########		$ 410.476.526,04	0,74	$ 168.674.203,00	1	0,411
Acumulado:	$ 937.149.484,07	###########		$ 421.001.565,17	0,45	$ 708.431.654,00	1	1,683

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,4000	4,00	0,8	1	$ 631.502.347,76	0	115.354.429	$ 115.354.428,86
Interventor:	0,8400	4,00	0,8	1	$ 134.939.363,00	0	134.939.363	$ 134.939.363,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.382.739,25
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	10.382.739,25
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA DE ELABORACIÓN	31 (Día)	3 (Mes) 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0+870	PR 1+025	PR 3+400	PR 4+020	PR 4+180	PR 7+100	PR 7+280	PR 84+310	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA (565 ML)																	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (6 UND)																	
TRANSPORTES																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO																	
CARACTERIZACION VIAL																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE ABRIL DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93

VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.355.459,25

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.355.459,25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 105.250.391,20	5	11	2020	5	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 52.625.195,60	5	11	2020	5	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 105.250.391,20	5 AÑOS			Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000072639

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	5	11	2020	5	4	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400-74-994000018160 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

_____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

_____

_____

_____

Firma _____

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-CO-001-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 DE ABRIL DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1278 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI : X NO: ____ APROBADO: SI: X NO: ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 11/11/2020

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI: ____ NO: X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI: ____ NO: X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES: En el presente periodo no se presentaron auditorias de calidad

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI: X NO: APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI: ____ NO: ____

OBSERVACIONES: En el presente periodo no se reportaron ensayos de laboratorios

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: En el presente no se presentaron no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES: No se presentó quejas y reclamos en el presente periodo

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							

OBSERVACIONES: En el presente no se realizó calibración de equipos, inspección, medición o ensayos

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME SEMANAL

FECHA	4	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 15 del 26/02/2021 al 4/03/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,61 | No. PUENTES: | OTROS: ALCANTARILLAS 6 UND, CONFORMACION 9,30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93
ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 442.051.643,43
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.382.739,25
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 452.434.382,68

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 166.173.258,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: ENERO/2021
VALOR FACTURA: $ 85.676.916,00 FECHA FACTURA: 4/02/2021


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):					95%
KM CON CONFORMACIÓN (Km):					90%
KM MANTENIDOS (Km):					90%
KM BASE/SUBBASE (Km)					90%
KM PAVIMENTADOS (Km)					0
PUENTES (Un)					0
ALCANTARILLAS (UND)	1		1	3	95%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					0
Planta de trituración:		0			0
Motoniveladoras:		0			
Retrocargadores:		0			0
Vibrocompactadores (tipo rana):		0			
Volquetas:		0			
Retroexcavadora:	1				1
Rana:	1				1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes | TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras | TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos | TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	PLANTA DE OCAÑA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **ENTREGAGO**

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA EN LAS QUE PARTICIPAN INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA/ SE REALIZAN CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y LOS CUIDADOS QUE DEBE TENER EL TRABAJADOR FRENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.15 y el informe mensual correspondiente al mes de marzo del municipio de Teorama
Visita tecnica por parte del ing director e ing. residente de interventoria Ing. Marco Antonio Solano, con el fin de verificar el avance del proyecto de obra.
Desencofrado de poceta y armado de tableros para fundida de aletas, muro pantalla y tableros en alcantarilla #5, absc K8+630
Excavación, retiro de material sobrante, replanteo, relleno, compactación manual con base granular, excavacion manual para pocetas, aletas, descole y muro pantalla para alcantarilla #1 K0+870 5m largo, 2m ancho, 2,50m profundidad.
Armado de acero para placa de descole, aletas y muro pantalla en alcantarilla #3, absc K4+775 y #4, absc K7+150 unicada en el tramo 4 (K+100-K7+280).
Excavación manual para aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3, absc (K4+020-K4+180).
Toma de apiques en los 4 tramos para verificación de espesor de sub base.
Desencofrado de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630
fundida de base para aletas, muro y Armado de parrilla para fundida de placa de descole pantalla en alcantarilla #3 K4+775
Fundida de base para aletas y muro pantalla, armado de parrilla y fundida de placa de descole en alcantarilla #4, absc K7+150
Replanteo manual de poceta y aletas para la alcantarilla #1, absc K0+870
Figurado de acero para aletas y muro pantalla y Armado de parrilla en acero para poceta en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)
Visita tecnica por parte de la ing residente e ing auxiliar de interventoria al area a intervenir, se realiza la revision del avance de las actividades
Construcción finalizada de alcantarilla # 1
Excavación para armado de zarpa en acero para fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla #2, absc K4+140
Fundida de solado para placa de descole, aletas, muro pantalla y Armado de acero para poceta, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180) en alcantarilla #2, absc K4+140 ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)
Excavación manual para armado y fundición de zarpa en alcantarilla #1 K0+870
Replanteo manual de cunetas en el tramo 3 (K4+020-K4+180)
Armado de tableros para muro pantalla y aletas en alcantarilla #4 (K7+100-K7+280)
Colocación de vigas riotras en acero y trazo de ejes en el tramo #4 (K7+100-K7+280)
Fundida de solado para zarpa y poceta en alcantarilla #1 K0+870

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividaddes ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en elecución del mes de febrero del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva revision por los supervisores y gestor tecnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos tecnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural. Seguimiento protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acargo del personal profesional siso de la interventoría. Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratatda para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que deriva el contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comites tecnicos semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



AVANCE DE CONFORMACIÓN VIAL
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desencofrado de poseta en alcantarilla #5 K8+630



Armado de tableros para fundicion de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630



Excavación de alcantarilla #1 K0+870 5m largo, 2m ancho, 2,50m profundidad



Señalización cierre de vía



Excavación de alcantarilla #1 K0+870 5m largo, 2m ancho, 2,50m profundidad



Relleno y compactación manual con base granular en alcantarilla #1 K0+870



Retiro de material sobrante y replanteo manual para ubicación del tubo en alcantarilla #1 K0+870



Instalación de tubería PEAD, relleno y compactación manual con base granular en alcantarilla #1 K0+870



Excavacion manual para aletas, descole y muro pantalla en alcantrilla #1 K0+870



Armado de acero para placa de descole en alcantarilla #3 bsc K4+775



Excavacion manual para aletas, descole y muro pantalla en alcantrilla #1 K0+870



Excavacion manual para aletas, descole y muro pantalla en alcantrilla #1 K0+870



Fundida de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630, ubicada a 1,5 km del tramo 4 (k7+100-K7+280)



Armado de acero para placa de descole, aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150.



Armado de acero para placa de descole, muro pantalla y aletas en alcantarilla #3 K4+775



Excavación manual para aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Toma de apiques en los 4 tramos



Excavación y replanteo manual para poceta y aletas en alcantarilla #1 K0+870



Fundida de base para aletas y muro pantalla en alcantarilla #3 K4+775



Desencofrado de aletas y muro pantalla en alcantarilla #5 K8+630



Fundida de base para aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)



Replanteo manual de poseta y aletas para la alcantarilla #1 K0+870



Replanteo manual de poceta y aletas para la alcantarilla #1 K0+870



Armado de parrilla en acero para poseta en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Construccion de alcantarilla #1



Campamento y material



Amarre de vigas de acero



Armado de parrilla para fundición de placa de descole en alcantarilla #3 K4+775



Armado de parrilla para placa de descole en alcantarilla #4 K7+150



Fundida de placa de descole en alcantarilla #4 K7+150



Excavación para armado de zarpa en acero para fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140



Fundida de solado para placa de descole, aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3



Excavación manual para armado y fundición de zarpa en alcantarilla #1 K0+870



Armado de acero para poceta en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Figurado de acero para aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Replanteo manual de cunetas en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Armado de tableros para muro pantalla y aletas en alcantarilla #4 (K7+100-K7+280)



Colocación de vigas riotras en acero y trazo de ejes en el tramo #4 (K7+100-K7+280)



Fundida de solado para zarpa en alcantarilla #1 K0+870



Fundida de solado para poceta en alcantarilla #1 K0+870

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se esten destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.	FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS T. P 68202 03281 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME SEMANAL

FECHA: 11 (Día) / 3 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 16 (Numeración consecutiva) del 5/03/2021 al 11/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — A DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0,61 — No. PUENTES: — OTROS: ALCANTARILLAS 6 UND, CONFORMACION 9,30 KM

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL		INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS	
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)		INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL: $ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES: $ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO $ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO: $ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 442.051.643,43
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.382.739,25
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 452.434.382,68

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 166.173.258,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: ENERO/2021
VALOR FACTURA: $ 85.676.916,00 — FECHA FACTURA: 4/02/2021


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):					95%
KM CON CONFORMACION (Km):					90%
KM MANTENIDOS (Km):					90%
KM BASE/SUBBASE (Km)					90%
KM PAVIMENTADOS (Km)					0
PUENTES (Un)					0
ALCANTARILLAS (UND)	1		1	3	95%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					0
Planta de trituración:		0			0
Motoniveladoras:		0			
Retrocargadores:		0			0
Vibrocompactadores (tipo rana):		0			
Volquetas:		0			
Retroexcavadora:	1				1
Rana:	1				1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes — TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras — TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos — TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION:	PLANTA DE OCAÑA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTA	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTA	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **ENTREGAGO**

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:	
OTROS:	0	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA	

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA EN LAS QUE PARTICIPAN INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA/ SE REALIZAN CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA IMPLEMENTACION DE PROYOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y LOS CUIDADOS QUE DEBE TENER EL TRABAJADOR FRENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.16 y el informe mensual correspondiente al mes de marzo del municipio de Teorama
Se realizan actividades de Inlcusion de vigas riostras y trazo de ejes en el tramo 4, en el abscisado (K7+100-K7+280)
Se inician actividades de armado de 30ml de acero longitudinal y transversal para huella en el tramo 4, en abscisado (K7+100-K7+280)
Armado de acero para zarpa en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3, absc (K4+020-K4+180)
Se realiza Fabricación de formaleta de tableros para alcantarilla #4, absc K7+150
Armado de acero para zarpa y fundida, se armado de acero para placa de descole en alcantarilla #1, absc K0+870
Armado de 30ml de acero para huella en tramo #4, absc K7+100-K7+280
Se realiza visita tecnica por parte de interventoria, se realiza revisión de las actividades y toma de medidas para el calculo de las cantidades.
Se inician actividades de armar formaleta de huellas en tramo #4, absc K7+100-K7+280
Se realizan actividades de fundida de zarpa en alcantarilla #2, en abscisado K4+140
Replanteo manual de cunetas en tramo 1, absc K0+890-K1+025
Se funde aletas y muro pantalla, despues de fundida se realiza desencofrado de aletas y muro pantallaen alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4, absc K7+100-K7+280
Se realiza excavación, relleno y compactación manual para alcantarilla adicional, este es un valor agregado de contratista.
Desencofrado de aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150 ubicada en el tramo 4 K7+100-K7+280
Se realiza actividades de Armado de acero y encofrado para placa huellas en tramo #4 K7+100-K7+280
Replanteo manual de cunetas en tramo #2 K3+430-K3+520
Se funde placa de descole de alcantarilla #1 K0+870
Armado de parrilla para placa de descole en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3, absc K4+020-K4+180
Fundición de placa de descole en alcantarilla #3 K4+775
Se ejecutan actividades de Excavacion manual para bordillos en tramo 1, en absc K0+890-K1+025
Se realizan visitas tecnicas por parte de interventoria, se realiza revisión de las actividades y toma de medidas para el calculo de las cantidades.
Interventoria continua con las labores de revisión, el seguimiento y control de avance de las actividades de obra, diariamente por parte del ing inspector de interventoria en los tramos a intervenir
Nuevamente se solicita información del proceso de las vallas informativas para los convenios, a lo que responde el ing. Oscar Villareal, Coordinador Zona Centro Oriente Subdirección Red Terciaria y Férrea, que realizo solicitud de informacion y no ha obtenido respuesta.
Se encofra y funde poceta en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7-280)
Armado de encofrado en madera para aletas y muro pantalla en alcantarilla #3 K4+775
Armado de acero para aletas y muro pantalla en alcantarilla #1 K0+630
Se radica informe mensual y acta de costos No. 4 de interventoria correspondiente a febrero; Se realiza informe ambiental, social y de gestion trimestral para radicar a la superintendencia del medio ambiente y gestor ambiental; Se radica cambio del gestor vial por el ing. Wilmar Rangel Ropero
Desencofrado de poceta en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)
Armado de encofrado para fundición de poceta en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)
Fundición de 27 ml largo x 1,35 m ancho x 0,15m de espesor de huella derecha en el tramo 4 (K7+100-K7+280)
Se radican los registros fotograficos y reportes de informes diarios de intervenotoria, por parte de la supervision de los inspectores.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividaddes ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en ejecución del mes de febrero del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva revision por los supervisores y gestor tecnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos tecnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural. Sequimiento protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acargo del personal profesional siso de la interventoría. Realizar sequimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Sequimiento a las afiliaciones y planillas de sequridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma. sequimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Sequridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Sequridad Industrial. Sequimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que deriva el contrato de obra. Sequimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comites tecnicos semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA

PR 0+0000 PR 0+890 PR 1+025 PR 3+430 PR 3+520 PR 4+020 PR 4+180 PR 4+760 PR 4+940

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inlcusion de vigas riostras y trazo de ejes en el tramo 4(K7+100-K7+280)



Armado de 30ml de acero longitudinal y transversal para huella en el tramo 4(K7+100-K7+280)



Armado de 30ml de acero longitudinal y transversal para huella en el tramo 4(K7+100-K7+280)



Armado de acero para zarpa en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Fabricación de tableros para alcantarilla #4, absc K7+150



Armado de acero para zarpa en alcantarilla #1 K0+870



Armado de 30ml de acero para huella en tramo #4 K7+100-K7+280



Armado de tableros para aletas en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 K7+100-K7+280



Se realiza fundida de zarpa en alcantarilla #1, absc K0+870



Se realiza fundida de zarpa en alcantarilla #1, absc K0+870



Se realizan actividades de formaleteo de huellas en tramo #4, absc K7+100-K7+280



Armado de acero para placa de descole en alcantarilla #1 K0+870



Se funde zarpa en alcantarilla #2 K4+140



Replanteo manual de cunetas en tramo 1, absc K0+890-K1+025



Fundicion de aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150, unicada en el tramo 4 K7+100-K7+280



Excavación para alcantarilla adicional



Relleno y compactación manual para alcantarilla adicional



Desencofrado de aletas y muro pantalla en alcantarilla #4 K7+150 ubicada en el tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de acero para huellas en tramo #4 K7+100-K7+280



Encofrado de huellas en tramo #4 K7+100-K7+280



Replanteo manual de cunetas en tramo #2 K3+430-K3+520



Fundición de placa de descole de alcantarilla #1 K0+870



Armado de parrilla para placa de descole en alcantarilla #2 K4+140



Fundición de placa de descole en alcantarilla #3 K4+775



Excavacion manual para bordillos en tramo 1 K0+890-K1+025



Encofrado de poceta para fundición en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7-280)



Fundida de poceta en alcantarilla #4 K7+150



Armado de encofrado en madera para aletas y muro pantalla en alcantarilla #3 K4+775



Armado de encofrado en madera para aletas y muro pantalla en alcantarilla #3 K4+775



Armado de acero para aletas y muro pantalla en alcantarilla #1 K0+630



Desencofrado de poceta en alcantarilla #4 K7+150, ubicada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)



Armado de encofrado para fundición de poceta en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 (K4+020-K4+180)



Fundición de aletas y muro pantalla en alcantarilla # 3 K4+775







Fundición de 27 ml largo x 1,35 m ancho x 0,15m de espesor de huella derecha en el tramo 4 (K7+100-K7+280)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se esten destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.	FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS T. P 68202 03281 STD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	18	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 17 (Numeración consecutiva) del 12/03/2021 al 18/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

A DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,565 | No. PUENTES: | OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND, DISIPADOR 1 UND, CONFORMACION 9,30 KM

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 663.077.465,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 368.376.369,53
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 10.382.739,25
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.041.836.574,29

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 321.035.636,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: FEBRERO/2021
VALOR FACTURA: $ 154.862.378,00 FECHA FACTURA: 23/03/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):					95%
KM CON CONFORMACION (Km):					90%
KM MANTENIDOS (Km):					90%
KM BASE/SUBBASE (Km)					90%
KM PAVIMENTADOS (Km)					0
PLACA HUELLA (M)				30	5,31%
ALCANTARILLAS (UND)	1		1	3	85%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					0
Planta de trituración:		0			0
Motoniveladoras:		0			
Retrocargadores:		0			0
Vibrocompactadores (tipo rana):		0			
Volquetas:		0			
Retroexcavadora:					
Pulidora:					1
Plan electrica:					1
Mezcladoras	1		1	1	3
Vibro electrico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes | TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras | TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos | TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	PLANTA DE OCAÑA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTA	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTA	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **ENTREGAGO**

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:	0	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA	

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA, DONDE SE REALIZA REVISION DEL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA Y MEDICION PARA EL CALCULO DE LAS CANTIDADES.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.17 y el informe mensual correspondiente al mes de marzo del municipio de Teorama
Se realiza armado de acero y fundida placa huella en tramo 4 K7+100-K7+280, dimensiones 30ml largo x 0.9m ancho x 0.15 espesor, se realiza armado de formaleta para sobreancho izquierdo en tramo 4
Se realiza fundida y desencofrado de poceta; Armado de formaleta para fundir aletas y muro pantalla en alcantarilla #2, en absc K4+140 ubicada en el tramo 3 K4+020-K4+180
Se realizan actividades de excavación para base de bordillos en tramo 4, absc K7+100-K7+280
Fundida de poceta en alcantarilla #3, absc K4+775
Se realiza Armado de acero para poceta en alcantarilla #1,absc K0+870
Se realizan actividades de fundida de concreto ciclopeo en centro y sobreancho derecho para placa huella en el tramo 4
Replanteo manual de cuneta en el tramo 3, absc K4+020-K4+180
Replanteo manual de cunetas en tramo 1, absc K0+890-K1+025
Durante los dias del 12 al 15 de marzo se registra clima nublado, precipitaciones lo que genera difícil accesibilidad por la vía lisa.
La secretaria municipal de Teorama, radica presupuesto de roceria para la ejecución del programa de emprendedores rurales, este se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se avanza con fundida de 33ml de sobreanchos en concreto ciclopeo y formaleteo de huellas en el tramo 4, absc K7+100-K7+280
Se fundes aletas y muro pantalla en alcantarilla #2, absc K4+140, ubicada en el tramo 3, absc K4+020-K4+180
Replanteo manual para fundicion de zarpa y fundida de solado para poceta en alcantarilla adicional (sin absisado)
Armado de acero para poceta en alcantarilla #1, absc K0+870
El dia 16 de marzo de 2021, se realiza Visita técnica por parte del equipo de interventoría, ART e Ing. Luis Carlos Vila, director de la obra. En esta visita el ART verifica los tramos a intervenir e identifica el avance de las actividades de obra.
Se realiza seguimiento diario de las actividades de obra por parte del ing inspector de interventoria en sitio.
Se funden de 15ml adicionales de sobreancho izquierdo en piedra pegada, en el tramo 4 (K4+100-K4+280)
Se avanza en actividades de fundida de 15ml de huella derecha en concreto reforzado en el tramo 4 (K4+100-K4+280)
Formaleteo de 15 metros de huella para fundición en el tramo 4 (K4+100-K4+280)
Desencofrado de muro pantalla y aletas en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 K4+020-K4+180
Replanteo manual de cunetas en tramo 2 (K3+430-K3+520)
Se realiza fundida de solado para muro pantalla y se realizan actividades de armado de acero para poceta en alcantarilla adicional (sin absisado)
Figurado de acero para bordillos en tramo 1 (K0+890-K1+025)
Fundida de zarpa para poceta en alcantarilla #1 K0+870
El contratista de obra radica planillas de pago de seguridad social correspondientes al mes de febrero
Armado de zarpa para poceta en alcantarilla adicional, absc K2+080
Fundicion de zarpa para muro pantalla y poceta en alcantarilla adicional, absc K2+080

NOTA ACLARATORIA POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA SE MODIFICA VALOR DEL ACTA DE COSTOS No.4, CON EL FIN DE AMORTIZAR UN VALOR MÁS APTO AL ANTICIPO.

#¡REF!

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividaddes ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en ejecución del mes de marzo del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva
revision por los supervisores y gestor tecnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su
cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos tecnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural. Seguimiento
protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acargo del personal profesional siso de la interventoría. Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratalda para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma. seguimiento a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa
emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que deriva el contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comites tecnicos
semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA

PR 0+0000 PR 0+890 PR 1+025 PR 3+430 PR 3+520 PR 4+020 PR 4+180 PR 4+760 PR 4+940

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se funde placa huella en tramo 4 K7+100-K7+280, dimensiones 30ml largo x 0.9m ancho x 0.15 espesor.



Armado de formaleta para sobreancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Se realiza fundida de poceta en alcantarilla #2, en absc K4+140



Excavación para base de bordillos en tramo 4 K7+100-K7+280



Desencofrado de poceta en alcantarilla #2 K4+140



Fundida de poceta en alcantarilla #3, absc K4+775



Fundida de 39 ml de concreto ciclopeo en centro y sobreancho derecho, para placa huella tramo 4



Excavación para base de bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Replanteo manual de cuneta en el tramo 3, absc K4+020-K4+180



Armado de formaleta para fundir aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140 ubicada en el tramo 3 K4+020-K4+180



Replanteo manual de cunetas en tramo 1, absc K0+890-K1+025



Fundida de 33ml de sobreanchos en concreto ciclopeo en el tramo 4 (K7+100-K7+280)



Formaleteo de huellas en el tramo 4, absc K7+100-K7+280



Se funde aletas y muro pantalla en alcantarilla #2 K4+140, ubicada en el tramo 3 K4+020-K4+180



Replanteo manual para fundicion de zarpa en alcantarilla adicional



Fundida de solado para poceta en alcantarilla adicional



Armado de acero para poceta en alcantarilla #1, absc K0+870





Visita tecnica al municipio de teorama con la ART, esquipo de interventoria y director de obra.



Fundicion de 15ml de sobreancho izquierdo en piedra pegada, en el tramo 4 (K4+100-K4+280)



Fundición de 15ml de huella derecha en concreto reforzado en el tramo 4 (K4+100-K4+280)



Formaleteo de 15 metros de huella para fundición en el tramo 4 (K4+100-K4+280)



Desencofrado de muro pantalla y aletas en alcantarilla #2 K4+140, en tramo 3 K4+020-K4+180



Replanteo manual de cunetas en tramo 2 (K3+430-K3+520)



Fundida de solado para muro pantalla en alcantarilla adicional



Armado de acero para poceta en alcantarilla adicional



Figurado de acero para bordillos en tramo 1 (K0+890-K1+025)



Fundida de zarpa para poceta en alcantarilla #1 K0+870



Armado de zarpa para alcantarilla adicional K2+080



Armado de zarpa para poceta en alcantarilla adicional K2+080



Fundición de 36mlv de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 36mlv de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundicion de zarpa para muro pantalla en alcantarilla adicional K2+080



Fundicion de zarpa para poceta en alcantarilla adicional K2+080



Armado de formaleta para fundición de poceta en alcantarilla #1 K0+870

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se esten destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.	FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS T. P 68202 03281 STD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 23 (día) / 3 (mes) / 2021 (año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNCIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

PROYECTO/CARRETERA: TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 19/03/2021 al 25/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

A DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,565 No. PUENTES: OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND, DISIPADOR 1 UND, CONFORMACION 9,30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
INTEGRANTES: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)
CONTRATO No. LC-001-CO-001-2020 VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1278 DE 2020 VALOR INICIAL: $ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES VALOR ACUMULADO: $ 843.371.017,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 663.077.465,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 368.376.369,53
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 10.382.739,25
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.041.836.574,29

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: FECHA FACTURA:
VALOR FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 307.037.452,00


	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO/2021
VALOR FACTURA: $ 140.864.194,00 FECHA FACTURA: 25/03/2021
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	ACUMULADO PROYECTO TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):					100%
KM CON CONFORMACION (Km):					90%
KM MANTENIDOS (Km):					90%
KM BASE/SUBBASE (Km)					90%
KM PAVIMENTADOS (Km)					0
HUELLA HUELLA (Mt)			80		35%
ALCANTARILLAS (UND)	1		1	3	85%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					0
Planta de trituración:		0			0
Motoniveladoras:		0			
Retrocargadores:		0			0
Vibrocompactadores (tipo rana):		0			
Volquetas:		0			
Retroexcavadora:					
Pulidora:					1
Plan electrica:					1
Mezcladoras	1		1	1	3
Vibro electrico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes
TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras
TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos
TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PLANTA DE OCANA — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL SI X NO
UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI NO X — LICENCIA AMBIENTAL SI NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL.:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 20
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 1ªA No. 15a-18, OCANA

OBSERVACIONES:
SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA Y LA ART

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.18 y el informe mensual correspondiente al mes de marzo del municipio de Teorama
Se funde 21ml x 0,90 ancho x 0,15 de espesor de cortin en piedra pegada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)
Se funden 18ml x 0,45 ancho x 0,15 de espesor de sobrancho derecho en piedra pegada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)
Se realiza Replantieo manual de cunetas en el tramo 2 (K3+430-K3+520)
Excavacion manual y Armado de acero para placa de descole para alcantrilla adicional K2+080
Fundicion de poceta para alcantarilla #1 K0+870
El 19 de marzo de 2021, interventoria radica diseño aprobado, por el Ministerio de Transporte, de valla informativa al contratista de obra, para su respectiva produccion e instalacion de la misma.
El dia martes 23 de marzo, se realiza comité de socializacion de las visitas realizadas, a los municipios: Teorama, Carmen, Convecion y San calixto, con el Ing. Sabier de la ART,se aborda los temas de avance de las actividades de obra, el estado en el que se encuentran, las complicaciones y retrasos que han surgido. Se habla del estado en general de todos lo municipios y el tramite de mantenimiento rutinario con las alcaldias municipales.
Interventoria radica a INVIAS solicitud de prorroga al contrato No. 1278 de 2020, de interventoria con 68 dias calendario con fecha de terminacion el 30 de junio de 2021.
Se realiza seguimiento diario de las actividades de obra por parte del ing inspector de interventoria en sitio.
Desencofrado de poceta y Armado de encofrado para fundicion de muro pantalla y aletas en alcantarilla #1, absc K0+870
Fundición de 30ml de base para bordillos en tramo 4 K7+100-K7+280
Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 3 K4+020-K4+180
Armado de encofrado para muro pantalla y Fundición de placa de descole en alcantarilla adicional K2+080
Armado de acero para bordillos en tramo 4 K7+100-K7+280
Se realiza Limpieza manual de poceta en alcantarilla #3, absc K4+775
Fundición de muro pantalla y poceta en alcantarilla adicional K2+080
Armado de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180
Fundición de 15ml de barrra cuneta y bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
Se realiza armado de formaleta y acero de refuerzo para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180
Fundición de muro pantalla y aletas para alcantarilla #1 K0+870
Armado de cuneta y fundida en bordillo izquierdo en en tramo 4 K7+100-K7+280
NOTA ACLARATORIA POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA SE MODIFICA NUEVAMENTE EL VALOR DEL ACTA DE COSTOS No.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON EL FIN DE AMORTIZAR UN VALOR MÁS APTO AL ANTICIPO.
0

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (reprogramación avalada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividades ejecutadas por parte de interventoría para el contrato en ejecución del mes de marzo del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva
revisión por los supervisores y asesor técnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su
cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos técnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural. Seguimiento
protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acarreo del personal profesional ysio de la interventoría. Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma, seguimiento a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa
emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que deriva el contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comités tecnicos
semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoría y/o gestor técnico del contrato de interventoría, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS — CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

PR 0+0000 PR 0+690 PR 1+025 PR 3+430 PR 3+520 PR 4+020 PR 4+180 PR 4+760 PR 4+940

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundida de 21ml de piedra pegada en el tramo 4, absc (K7+100-K7+280)



Fundida de 18ml x 0.45 ancho x 0.15 de espesor de sobreancho derecho en piedra pegada en el tramo 4 (K7+100-K7+280)



Replanteo manual de cunetas en el tramo 2 (K3+430-K3+520)



Armado de acero para placa de descole para alcantarilla adicional K2+080



Excavacion manual para descole en alcantarilla adicional K2+080





Fundida de poceta para alcantarilla #1, absc K0+870



Desencofrado de poceta en alcantarilla #1 K0+870



Armado de encofrado para fundicion de muro pantalla y aletas en alcantarilla #1 K0+870



Fundición de 30ml de base para bordillos en tramo 4 K7+100-K7+280



Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 3 K4+020-K4+180





Armado de encofrado para muro pantalla en alcantarilla adicional K2+080



Armado de acero para bordillos en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de placa de descole en alcantarilla adicional K2+080



Limpieza manual de poceta en alcantarilla #3 K4+775



Fundición de muro pantalla en alcantarilla adicional K2+080



Fundición de poceta en alcantarilla adicional K2+080



Armado de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180




Fundición de 15ml de berma cuneta y bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 15ml de berma cuneta y bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de 21ml de formaleta para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de muro pantalla y aletas para alcantarilla #1 K0+870



Fundicion de 21ml de huella izquierda en tramo 3 K4+020-K4+180





Armado de cuneta bordillo izquierdo en en tramo 4 K7+100-K7+280

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se esten destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
T. P 68202 032921 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) / 4 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 19 del 26/03/2021 al 1/04/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

f/A DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,565 | No. PUENTES: | OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND. DISIPADOR 1 UND. CONFORMACION 9.30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
INTEGRANTES: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)

CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO	$ 1.052.503.912,93

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS
INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 663.077.465,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 368.376.369,53
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.382.739,25
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.041.836.574,29

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO $ 307.037.452,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO/2021
VALOR FACTURA: $ 140.864.194,00 FECHA FACTURA: 25/03/2021


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):					100%
KM CON CONFORMACION (Km):					90%
KM MANTENIDOS (Km):					90%
KM BASE/SUBBASE (Km)					90%
KM PAVIMENTADOS (Km)					0
PLACA HUELLA (Mt)				80	35%
ALCANTARILLAS (UND)	1		1	3	85%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					
Planta de trituracion:					
Motoniveladoras:					
Retrocargadores:					
Vibrocompactadores (tipo rana):					
Volquetas:					
Retroexcavadora:					
Pulidora:					1
Plan electrica:					1
Mezcladoras	1		1	1	3
Vibro electrico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes | TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras | TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos | TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION:	PLANTA DE OCAÑA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **ENTREGAGO**

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
OTROS:	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Elaboración del informe semanal No.19 y el informe mensual correspondiente al mes de marzo del municipio de Teorama
Fundición de 21ml de cuneta bordillo izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280
Excavación de zanjas para vigas riostras y Armado de acero para huella en tramo 4 K7+100-K7+280
Fundición de 30ml de huella derecha en tramo 3 K4+020-180
El día sabado 27 de marzo de 2021, se dificulta accesibilidad por constantes lloviznas en horas de la madrugada y parte de la mañana, generando mal estado en el tramo 4
Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 4 K7+100-K7+280
Fundición de 36ml de huella derecha en tramo 3 K4+020-K4+180
Armado de acero para zarpa en descole y fundición de solado para escalones de disipador K0+870
Excavación de zanjas para viga riostra e instalación del acero en tramo 3 (K4+020-K4+180)
Fundición de 24ml de huella en tramo 4(K7+100-K7+280)
Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 4 K7+100-K7+280
Excavación de zanjas para viga riostra e instalación del acero en tramo 3 K4+020-K4+180
Armado de formaleta para huella ezquierda en tramo 3 K4+020-K4+280
Amarre de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+280
Armado de acero para disipador K0+870
Se continuan actividades de seguimiento diario por parte del ingeniero inspector de interventoria.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividaddes ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en ejecución. del mes de marzo del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva
revision por los supervisores y gestor tecnico del contrato reyise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoria, con el fin de desempeñar las funciones de su
cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos tecnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural. Sesguimiento
protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acarao del personal profesional sico de la interventoria. Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratatda para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma, seguimiento a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa
emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que deriva el contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la vereda ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comites tecnicos
semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de 21ml de cuneta bordillo izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 21ml de cuneta bordillo izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280





Armado de acero para huella en tramo 4 K7+100-K7+280



Instalación de vigas riostras en tramo #3



Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 36ml de huella derecha en tramo 3 K4+020-K4+180





Fundición de 30ml de huella derecha en tramo 3 K4+020-180





Desencofrado de muro pantalla y aletas en alcantarilla 1 K0+870



El dia sabado 27 de marzo de 2021, se dificulta accesibilidad por constantes lloviznas en horas de la madrugada y parte de la mañana, generando mal estado en el tramo 4





Armado de acero para huella en tramo 4 K7+100-K7+280



Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 24ml de huella en tramo 4(K7+100-K7+280)



Fundición de 30ml de huella en tramo 3 (K4+020-K4+180)



Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 3 (K4+020-K4+180)



Armado de acero para zarpa en descole para disipador K0+870



Fundición de solado para escalones de disipador K0+870





Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 4 K7+100-K7+280



Excavación de zanjas para viga riostra e instalación del acero en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de formaleta para huella ezquierda en tramo 3 K4+020-K4+280



Amarre de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+280





Armado de acero para disipador K0+870

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto . Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se esten destinando para la ejecución del proyecto, entre otros.	FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS T. P 68202 03281 STD

INFORME MENSUAL MARZO 2021
COMPONENTE SST

CONTRATO No LC.001-CO-001-2020 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL - TEORAMA

INTERVENTOR:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

ELABORADO:

MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

INSPECTOR SISO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5

PERIODO: DEL 1 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

INTRODUCCION

En el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del área de seguridad industrial y salud ocupacional durante este periodo.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una actividad de múltiples disciplinas enfocada a promover y proteger la salud de los trabajadores por medio de la prevención de riesgos y enfermedades laborales.

Se considera riesgo a todas aquellas situaciones que dentro del trabajo que pueden ocasionar daño a quien la desempeñe, por lo anterior es de vital importancia tomar medidas para poder garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Tanto para el empleador y empleados, es de mucha ventaja contar con un componente de salud y seguridad en el trabajo, ya que mejora el clima laboral, la motivación y la participación, también aumenta la productividad creciendo en conocimientos y así mismo, ayuda a disminuir la ansiedad.

Es necesario, asimismo, aplicar los protocolos de bioseguridad pertinentes para los trabajos de construcción, ya que es indispensable que se apliquen las medidas preventivas para poder frenar los contagios por la pandemia que sufre la región, brindando seguridad a los que trabajan y visitan las obras, contribuyendo igualmente al estado de emergencia en el que se encuentra el país.

NORMATIVIDAD

Regido y orientado desde la constitución política de Colombia, pasando por el código sustantivo del trabajo, la ley 100 de seguridad social, hasta los decretos y resoluciones los cuales obligan a los empleadores asegurar a sus empleados contra los riesgos profesionales.

La Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico.

Circular 003 del 8 de abril de 2020, medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19

Con los protocolos de bioseguridad de cada uno de los contratistas aprobados por la interventoría

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud ocupacional, asimismo supervisar y transmitir los usos adecuados de los protocolos establecidos de bioseguridad ante el covid-19 del proyecto que tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances del área de seguridad industrial y salud en el trabajo.
- Hacer vigilancia en el cumplimiento por parte de las empresas contratistas del programa de salud ocupacional a la presentación del protocolo de bioseguridad.
- Capacitar al personal de interventoría sobre los protocolos de bioseguridad y sobre temas referentes a la salud y seguridad en el trabajo
- Reforzar y aplicar el protocolo de bioseguridad en la empresa encargada de la interventoría, CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
- Promulgar prácticas adecuadas que conlleven al cuidado integral de los trabajadores, en su entorno laboral, enfocadas a la protección y cuidado de la salud e integridad física de los mismos.
- Fomentar el orden e higiene personal

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO A LA CONTRATISTA

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en salud industrial y seguridad ocupacional (Siso). Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra.

En el presente documento se expone las distintas áreas donde se vigiló y supervisó las acciones de seguridad y salud en el trabajo para el contrato de referencia.

CAPACITACIONES

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de salud Ocupacional. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra sobre el uso de elementos de protección personal, los peligros en el trabajo, sobre la emergencia sanitaria que sufre la región y el mundo y temas relacionado en seguridad y salud en el trabajo.

	
Foto N°1: Realización de Charla de 5 minutos	Foto N°2: Realización de Charla de 5 minutos

MANEJO DE LOS RESIDUOS Y ASEO

Los frentes de trabajo deben permanecer en buen orden y limpios, esto debido a que ayuda a una mejor salud y mejorar la efectividad en el trabajo, evitar problemas de salud y en general, por mantener un entorno más seguro para toda la población del proyecto, además de garantizar que no se afecté el ecosistema de la zona

Para ello la contratista está garantizando en el área del proyecto y tiene conciencia de la debida separación de los residuos sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la clasificación en un punto de encuentro, contando además en cada frente bolsas de basura para luego hacer la respectiva separación

	
Foto N°3: Punto ecológico en zona de encuentro y desinfección	Foto N°4: Bolsas para recolección de residuos en los tramos, para posterior clasificación
	
Foto N°5: Campamento en el tramo 3 de la vía a intervenir	Foto N°6: Campamento en la vía donde se almacena el cemento

SEÑALIZACIÓN Y PREVENCION EN OBRA

En el presente periodo del mes de marzo, la señalización se fue adaptando según las actividades que se realizaban en obra, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de excavaciones correspondientes a alcantarillas. La señalización de inicio de obra se encuentra en el primer tramo a intervenir, al igual que la de maquinaria pesada en la zona. Así mismo cada frente de trabajo cuenta con cintas peligro para señalizar los trabajos que se realizan y señales verticales de obra que refuerzan la visión para quienes transiten por la vía. El sector no cuenta con un sendero peatonal



Foto N°7: Demarcación preventiva de obreros en la via



Foto N°8: Señalización para el cerramiento de la vía.



Foto N°9: Señalización en excavación de alcantarilla con su respectivo aislamiento en cinta peligro



Foto N°10: Valla informativa de buen uso de los elementos de protección personal

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección de personal (EPP) son requeridos para los trabajos de construcción y son de uso necesario, ya que es un componente que ayuda a minimizar los riesgos que puede sufrir el personal a la exposición que conlleva el trabajo. Estos EPP son de uso individual y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.

La contratista hizo entrega de los elementos de protección personal y cuenta con elementos tales como: cascos, botas, chalecos reflectivos.



Foto N°11: Buen uso de elementos de protección personal para actividades de compactación



Foto N°12: Buen uso de los elementos de protección personal en fundida de placa huella



Foto N°13: Uso de elementos de protección personal para mezcla de concreto



Foto N°14: Uso de elementos de protección personal para figurado de acero de alcantarillas

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el presente periodo en la ejecución de las obras se utilizó 1 (un) vibro compactador, 1 (una) motoniveladora, 1 (uno) carrotanque, 1 (un) retrocargador, volquetas, donde la interventoría ha evaluado de manera periódica el registro de maquinaria y equipos, y ha verificado la documentación de maquinaria y operarios

	
Foto N°15: Equipos utilizados en obra, mezcladora de concreto	Foto N°16: Equipos utilizados en obra

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

En control y seguimiento de la interventoría con la contratista, se verificó los certificados de los pagos de seguridad social y riesgos laborales de las personas afiliadas al contrato de obra.

Para el presente periodo febrero – marzo, por medio de las planillas de pago, se realizó los respectivos chequeos para verificaciones de los mismos. De igual manera se comprobó que el personal que ingresó al contrato de obra, cuente con la documentación al día y en regla.

Se le exige a la contratista el cumplimiento de la normativa vigente en este sentido, que es, el envío oportuno de los documentos requeridos y necesarios, que permanecen en el archivo de esta interventoría. Esta documentación es verificada para garantizar cumplir estrictamente con los requisitos de este contrato.

La interventoría ha vigilado el cumplimiento de las normas de seguridad integral y salud en el trabajo

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El municipio donde se realizan las obras también ha sido afectado por la pandemia, y en cumplimiento con lo establecido por el Ministerio de Salud, INVIAS y el protocolo de bioseguridad presentado por la contratista y aprobado por la interventoría, se vigila y controla las actividades para la ejecución de la obra.

- **Toma de temperatura**

De acuerdo a la resolución 223 del 25 de febrero del 2021, se adoptaron las medidas establecidas por el Ministerio de salud por parte de esta interventoría, y no es necesario para el presente periodo y los siguientes, la toma de temperatura para el ingreso a los establecimientos o sitios de obra.

- **Desinfección antes de la jornada laboral**

Lavar con frecuencia las manos reduce en un 50% el contagio del Covid 19. La contratista realiza este lavado con jabón y con agua al menos durante 20 a 30 segundos y desinfecta con alcohol y manos y calzado. Se cumple antes de la jornada laboral y es obligatorio sin excepción alguna.

	
Foto N°19: Desinfección de manos con alcohol antiséptico al 70%	Foto N°20: Desinfección de manos con alcohol antiséptico al 70%

- **Insumos y entrega de tapabocas**

Se hizo entrega de los elementos de protección, junto con un paquete de tapabocas que deben mantener durante la jornada laboral, e igualmente se instalaron vallas informativas para recordar mantener las medidas preventivas

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Foto N°21: Botiquín en punto de encuentro</td><td>Foto N°22: Entrega de tapabocas y comunicación del buen uso del mismo</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Foto N°23: Valla informativa de la zona de desinfección</td><td>Foto N°24: Zona de lavado de manos en el municipio de Teorama</td></tr>
</table>

- **Encuesta manifestaciones de salud y censo**

Diariamente se realiza una encuesta al personal que está asociado a la obra, donde cada personal manifiesta las condiciones de salud sobre los síntomas relacionados al covid-19, además se realiza un censo, para conocer las condiciones sociales y familiares de todo el personal, donde se expresa, si tiene personas a cargo, enfermedades, y nivel escolar, entre otros.

La contratista viene cumplimiento a cabalidad con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en La Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico, además de lo ordenado por el invias en la circular externa no.003 del 13 de abril del 2020.

Semanalmente se reportan las actividades en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, donde se evidencia el cumplimiento por parte de la contratista de las medidas restrictivas

No se han presentado a la fecha contagiados ni sospechosos con Covid -19. El estado de salud de los funcionarios de la contratista es bueno.

Se anexa los informes semanales de bioseguridad del contrato de obra.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA


CAPACITACIONES

Es de importancia fomentar en el personal del proyecto conocimientos, habilidades y actividades relacionadas con la formación y capacitación, en temas de salud ocupacional, que permitan una mejor relación interpersonal y especialmente un buen rendimiento en la dimensión laboral, protegiendo además la integridad de los trabajadores en distintos temas que pueden afectar su salud a las exposiciones que hay en su labor.

En el presente periodo se realizaron las siguientes charlas de capacitación al personal de interventoría:

1. **Conciencia ambiental:** Es de vital importancia cuidar el entorno donde vivimos y garantizar un equilibrio en el entorno nuestro. Se realizaron recomendaciones generales sobre las pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar el impacto ambiental
2. **Actividades físicas:** Las actividades físicas son de vital importancia para nuestra salud, ayuda a prevenir enfermedades y fortalece nuestro sistema inmune, además que sirve para mejorar nuestro estado de ánimo. Se hizo recomendaciones de cómo realizarlas y se realizó una pausa activa con todo el equipo de interventoría
3. **Charla capacitación inspectores**: El día 19 de marzo se convocó a una reunión virtual vía Zoom con todos los inspectores de obra, y se realizaron recomendaciones sobre las pausas activas en obra, además de eso se compartió información sobre la inspección de los EPP y de como realizar un buen registro fotográfico
4. **Cuidado con las escaleras:** Las escaleras son lugares donde a menudo se presentan accidentes, y debido al cambio de oficina donde es necesario el uso de escaleras, se realizó una charla para prevenir accidentes

Se anexa registro de charlas realizadas en presente periodo al personal de la interventoría

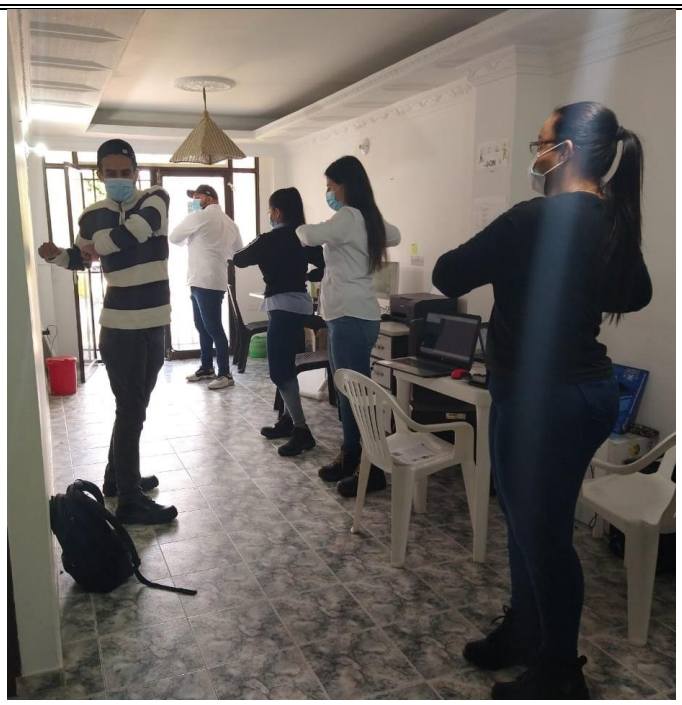	
Foto Nº 1: Actividad de pausa activa realizando movimientos con el equipo de interventoría en la oficina	Foto Nº 2: Charla de capacitación con los inspectores de obra para el proyecto de interventoría. Se realizaron actividades de estiramientos y se compartieron conocimientos

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión seguridad industrial y salud en el trabajo la cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

La interventoría en compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, realizó entrega de la dotación correspondiente a los funcionarios del contrato y así mismo realizó entrega al personal que se incorporaba al mismo.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA adopta las medidas de bioseguridad establecidas en La Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico, además de lo ordenado por INVIAS en la circular externa No. 003 del 08 abril del 2020.

Dentro de las actividades que se realizan para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad se encuentran:

- **Toma de temperatura al inicio y al final de cada jornada.**

  De acuerdo a la resolución 223 del 25 de febrero del 2021, se adoptaron las medidas establecidas por el Ministerio de salud por parte de esta interventoría, y no es necesario para el presente periodo y los siguientes, la toma de temperatura para el ingreso a los establecimientos o sitios de obra.
- **Uso de los elementos de bioseguridad.**

  Cada miembro de la interventoría, cuenta con los elementos necesarios para protección ante el covid-19 como, tapabocas, alcohol, toallas desechables, tapete desinfectante, entre otros.
- **Reporte diario de condiciones de salud.**

  Diariamente se diligencia un formato con las condiciones manifestadas de salud de cada uno de los trabajadores de la interventoría, donde se preguntan los síntomas más comunes sobre el covid-19. *(Se anexa registro diario de manifestación estado de salud)*
- **Desinfección de manos.**

  Se promueve internamente el constante lavado de manos, con abundante agua y jabón, con un lavado constante cada 3 horas, y alcohol y gel antibacterial para desinfección de las mismas.
- **Demarcaciones bioseguridad**

  La interventoría está comprometida con la bioseguridad, por tal motivo la oficina cuenta en su oficina con demarcaciones que ayudan a mantener las medidas de los protocolos y promover el autocuidado

En el presente periodo del mes de febrero, no se presentaron casos sospechosos o positivos en la interventoría y el estado de salud de los mismos, es buena para el cumplimiento de sus labores asignadas.

Se anexan informes semanales presentados en el mes de febrero

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad, es un plan que garantiza la calidad de los proyectos o procesos, este documento debe llevar a cabo los programas necesarios donde se especifiquen los encargados en distintas áreas para realizar con la mejor efectividad el proyecto

Se realizó en el presente periodo el seguimiento a los planes de calidad de los municipios, especificados en los formatos de planes de calidad



Foto Nº 3: Elementos de aseo, limpieza y protección implementados ante la emergencia del Covid-19.



Foto Nº 4: Desinfección de manos del inspector SISO de Interventoría con alcohol antiséptico al 70%



Foto Nº 5: Desinfección de manos de la ingeniera auxiliar de Interventoría con alcohol antiséptico al 70%



Foto Nº 6: Desinfección de la secretaria Interventoría con alcohol antiséptico al 70%

	
Foto Nº 7: Desinfección de manos del director de Interventoría con alcohol antiséptico al 70%	Foto Nº 8: Desinfección de manos y pies de la ingeniería coordinadora del proyecto de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	
Foto Nº 9: Desinfección de manos del inspector de Interventoría con alcohol antiséptico al 70%	Foto Nº 10: Limpieza y desinfección del vehículo afiliado a la empresa en prestación de sus servicios


	
Foto Nº 11: Desinfección de manos del personal visitante a la oficina de interventoría	Foto Nº 12: Uso correcto de los tapabocas en puestos de oficina de interventoría
	
Foto Nº 13: Señalización de los puntos de rutas de evacuación de la oficina en caso de emergencia.	Foto Nº 14: Contenedor para riesgos biológicos implementado ante la emergencia de covid-19



Foto Nº 15: Vallas reglamentarias, sobre el uso de tapabocas y sobre el no uso de cigarrillos dentro de la oficina



Foto Nº 16: Desinfección de áreas de trabajo y objetos a utilizar con alcohol antiséptico al 70%

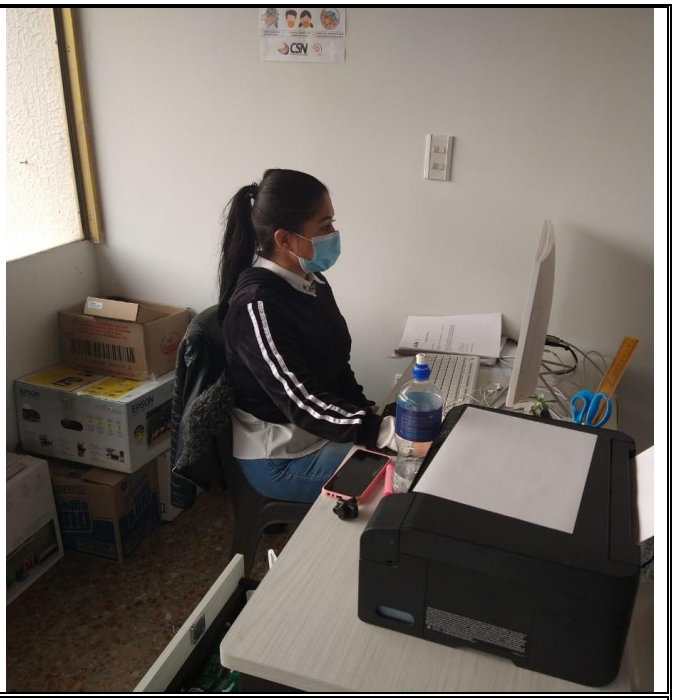

Foto Nº 17: Zona de desinfección, puesta en la entrada de la oficina de interventoría



Foto Nº 18: Valla informativa acerca del protocolo para la prevención del Covid-19 y el buen uso del tapabocas.

	
Foto Nº 19: Inspección en visita al municipio de El Tarra, haciendo control a las actividades ejecutadas y realizando observaciones a la señalización, protocolo de bioseguridad y normativas de seguridad y salud en el trabajo	Foto Nº 20: Seguimiento e indicaciones en obra para el encargado de SST, sobre las medidas de bioseguridad y medidas de seguridad y salud en el trabajo
	
Foto Nº 21: Inspección en el municipio de El Carmen en el orden y seguridad en la ejecución de actividades de fundida de placa huella	Foto Nº 22: Revisión e inspección en las excavaciones de alcantarillas para la seguridad en el trabajo, dando recomendaciones de señalización para prevenir accidentes

	
Foto Nº 23: Revisión del personal encontrado en obra para verificación de las respectivas afiliaciones enviadas	Foto Nº 24: Revisión del botiquín de emergencia móvil donde cumple con los requerimientos mínimos establecidos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se viene cumpliendo a cabalidad por parte de la contratista e interventoría con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en la Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico, además de lo ordenado por INVIAS en la circular externa No. 003 del 08 abril del 2020.
- Se recomienda seguir con la implementación y el uso de las medidas preventivas desde el inicio del proyecto, hasta el día que se termine el mismo, para proteger la salud de los trabajadores y de quienes visitan la obra.
- Se ha evidenciado la entrega oportuna y el buen uso de los elementos de protección personal por parte de la interventoría, así mismo se ha inspeccionado la entrega de EPP por parte de la contratista, pero un uso no constante por parte de los ayudantes de obra
- Se sugiere seguir capacitando y concientizando al personal asociado a la obra sobre la emergencia sanitaria que sufre la región, para que adopte las medidas preventivas dentro y fuera de la obra, así mismo sobre los peligros que se está expuesto y la prevención que brinda los elementos de protección personal.

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Maryory Alejandra Castro Vasquez	CÉDULA	1095786468	CARGO	Ing Residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																													
DIA DE LA SEMANA:	Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier									
DIA DEL MES:	19		20		22		23		24		25		26		27		29		30		31									
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
FIRMA DEL TRABAJADOR																														
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																														

Nombre trabajador:	M. Alejandra Castro	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1095786468	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Mailory Alejandra Castro Vasquez	**CÉDULA**	1095786468	**CARGO**	Ing Residente.
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12		13		15		16		17		18	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Y
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	M. Alejandra Castro V.	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1095786468.	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Estefania Chinchilla Guerrero	**CÉDULA**	1091674622	**CARGO**	Secretaria
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12		13		15		16		17		18	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania		Sefania	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Estefania Chinchilla.	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091674622	C.C:	1091672056
Sefania Chinchilla.			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Estefania Chinchilla Guerrero	**CÉDULA**	1091674622	**CARGO**	Secretaria.
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																													
DIA DE LA SEMANA:	Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier									
DIA DEL MES:	19		20		22		23		24		25		26		27		29		30		31									
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
FIRMA DEL TRABAJADOR																														
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																														

Nombre trabajador:	Estefania chinchilla	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091674622	C.C:	1091672056
Estefania Chinchilla			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Silvia Daniela Cardenas Gonzalez	**CÉDULA**	1098820896	**CARGO**	Ing Auxiliar
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Mailon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																													
DIA DE LA SEMANA:	Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier									
DIA DEL MES:	19		20		22		23		24		25		26		27		29		30		31									
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X										
FIRMA DEL TRABAJADOR																														
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																														

Nombre trabajador:	Silvia Daniela Cardenas	Personal SST/Jefe inmediato	Mailon Alejandro Cáceres N
C.C:	1098820896 Bogotá	C.C:	1091672056
Silvia Daniela Cárdenas G			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Silvia Daniela Cardenas	**CÉDULA**	1098820896	**CARGO**	Ing Auxiliar.
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12		13		15		16		17		18	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Y
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Silvia Daniela Cárdenas G.	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1098820896 Bga	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Yuneiry Ortiz Perez	**CÉDULA**	1091670081	**CARGO**	Ing Residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																									
DIA DE LA SEMANA:	Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier					
DIA DEL MES:	19		20		22		23		24		25		26		27		29		30		31					
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X									
FIRMA DEL TRABAJADOR	Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Y					
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Yuneiry Ortiz Perez	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091670081	C.C:	1091672056
Yuneiry Ortiz Pérez			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Yoneiry Ortiz Perez	**CÉDULA**	1091670081	**CARGO**	Ing residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres. Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12		13		15		16		17		18	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop		Yop	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Yoneiry Ortiz	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091670081	C.C:	1091672056
Yoneiry Ortiz.			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																					
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie	
DIA DEL MES:	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR																						
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																						

Nombre trabajador:	Marlon Alejandro Cáceres N	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091672056	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o sí la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Marlon Alejandro Caceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	MARZO																													
DIA DE LA SEMANA:	Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier									
DIA DEL MES:	19		20		22		23		24		25		26		27		29		30		31									
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X								
FIRMA DEL TRABAJADOR																														
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																														

Nombre trabajador:	Marlon Alejandro Cáceres	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres N
C.C:	1091672056	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 11 marzo 2021 METODO Actividad y Charla.

CAPACITACIÓN N° LUGAR oficina Ocaña.

RESPONSABLE Marlon Cáceres Navarro CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

los beneficios de la actividad fisica.

ASPECTOS TRATADOS

A lo largo de nuestro desarrollo se es necesario realizar actividades fisicas para prevenir y fortalecer nuestro organismo. Además se expuso las distintas formas de realizar actividades.

OBSERVACIONES

Se realizaron movimientos para ayudar a nuestro organismo y luego se realizó la charla a satisfacción

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Algandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Yuneiry Ortiz Perez	Ing Residente	Yuneiry Ortiz.
3	Diana. Santiago	Ingeniera.	Diana Santiago.
4	Silvia Daniela. Cardenas	Ing Auxiliar	
5	Estefania Chinchilla G.	Secretaria	Stefania Chin.
6	Sergio Castro	Ing Residente	
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 2/marzo/2021 METODO Lectura y opinión

CAPACITACIÓN N° _____ LUGAR oficina - Ocaña.

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres. CARGO inspector SISO

TEMA CENTRAL

Conciencia ambiental.

ASPECTOS TRATADOS

Es de vital importancia cuidar el entorno donde vivimos y garantizar un equilibrio en el entorno donde vivimos, se hizo recomendaciones generales

OBSERVACIONES

Se pasó una lectura al persona luego se hizo una socialización

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	WILMAR GALVIS ZAFRANCO	Inspector	
2	Karen lorena López	Inspector	
3	Alejandro Cáceres N	inspector siso	
4	Silvia Daniela Cardenas	Seg Auxiliar	
5	Estefania Chinchilla G	Secretaria	
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 30/ marzo /2021 METODO Charla

CAPACITACIÓN N° LUGAR oficina - Ocaña

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres CARGO inspector SISO

TEMA CENTRAL

Cuidado con las escaleras y sus riesgos

ASPECTOS TRATADOS

las escaleras son lugares donde se presentan muchos accidentes y son las entradas o salidas de emergencia para una evacuación

OBSERVACIONES

Se realizó a satisfacción la charla

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Silvia Daniela Cardenas	Ing Auxiliar	
3	Yuneiry ortiz Perez	Ing Residente	
4	Estefanía Chinchilla G.	secretaria	
5	Sergio Castro	Ingeniero	
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA: 19 de marzo de 2021 METODO: Video llamada .

CAPACITACIÓN N°_____ LUGAR: Zoom .

RESPONSABLE: Alejandro Caceres navarro CARGO: Inspector Siso .

TEMA CENTRAL

Por Cuestiones de distancia y tiempo, se realizó la charla en modalidad de video llamada, vía Zoom donde se trataron los siguientes temas: Pausas activas en obra, Inspección de elementos de protección personal y la importancia de un buen registro fotográfico

ASPECTOS TRATADOS








Pausas activas: Es de importancia en obra poder realizar pausas en medio de sus labores, realizando estiramientos, tomando agua y mantener buena postura para evitar cansancios y molestias físicas.

Inspección de EPP: Frecuentemente se debe inspeccionar los elementos de protección personal para garantizar el buen funcionamiento de ellos, deben estar en óptimas condiciones

Registros fotográficos: Las fotografías son importantes para las evidencias y los registros de avance de obra, se dieron consejos de como realizar unas buenas fotografías

OBSERVACIONES

Se realizó a satisfacción la charla

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Yuliana Guerrero Claro	Inspector San Calixto	
2	Lina Contreras	Inspectora Convención	
3	Fabian Baene	Inspector Teorama	
4	Wilmar Galvis	Inspector Hacarí	
5	Karen Lorena López	Inspectora El Tarra	
6	Elkin Javier Ochoa	Inspector Sardinata	
7	Sergio Castro	Inspector Tibú	
8	Juan Diego	Inspector El Carmen	
9	Marlon Alejandro Caceres Navarro	Inspector SISO	

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 8 DEL 26/02/2021 AL 4/03/2021

FECHA: 4 (Día) 03 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. TOMA DE TEMPERATURA

LA OBRA CUENTA CON TERMÓMETROS DIGITALES PARA LA TOMA DE TEMPERATURAS, CADA VEZ QUE SE USA EL TERMÓMETRO DIGITAL SE DESINFECTA CON ALCOHOL.
EN CASO DE PRESENTARSE UNA TEMPERATURA MAYOR O IGUAL A 38 °C DE UN TRABAJADOR SE ESPERA 15 MINUTOS Y REALIZAR UNA NUEVA TOMA PARA CONFIRMAR. SE LLEVA UN REGISTRO DEL PERSONAL ATENDIDO.

2. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

3. ENTREGA DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓNDEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

4. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



LAVADO DE MANOS AL INGRESO DE JORNADA LABORAL



TOMA DE TEMPERATURA A AYUDANTES DE OBRA



DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTA MENOR



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS RUTINARIA



AYUDANTES DE OBRA CON BUEN USO DE TAPABOCAS



VALLA INFORMATIVA SOBRE EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

CUADRO RESUMEN

EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS

FECHA	NOMBRE	Juan amay		Diana		Alvaro		Gober		Carolina		Leider					
	CÉDULA	1004825888		1000078072		55195 87		1091679809									
1/3/24	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA	36.5	38.4	36.7	38.5	38.5	36.2	36.3	36.2								
	FIRMA	Juan		Diana		Alvaro		Gober		Carolina		Leider					
FECHA	NOMBRE	Juan amay		Diana		Alvaro		Gober		Carolina		Leider					
	CÉDULA	1004825888		1000078072		55195 87		1091679809									
2/3/24	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA	36.2	36.1	38.7	38.5	38.4	36.1	36.6	36.7								
	FIRMA	Juan		Diana		Alvaro		Gober		Carolina		Leider					
FECHA	NOMBRE	Juan amay		Diana		Alvaro		Gober		Carolina		Leider					
	CÉDULA	1004825888		1000078072		55195 87		1091679809									
3/3/24	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA	36.8	38.2	36.5	38.2	38.6	36.2	36.3	36.5								
	FIRMA	Juan		Diana		Alvaro		Gober		Carolina		Leider					
FECHA	NOMBRE																
	CÉDULA																
	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA																
	FIRMA																
FECHA	NOMBRE																
	CÉDULA																
	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA																
	FIRMA																
FECHA	NOMBRE																
	CÉDULA																
	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA																
	FIRMA																

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS

FECHA	NOMBRE	Sesos Oficio		Jhon A		Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
	CÉDULA	13 279 169		1.193.217.586		55'191.72		1091762427		1004 823 573									
1/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA	36,6	36,3	36,2	36,2	36,5	36,3	36,5	36,2	36,3	36,1								
	FIRMA	Sesos Oficio				Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
FECHA	NOMBRE	Sesos Oficio		Jhon A		Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
	CÉDULA	13 279 169		1.193.217.586		55'191.72		1091762422		1004 823 573									
2/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA	36,3	36,1	36,5	36,2	36,7	36,2	36,5	36,2	36,3	36,3								
	FIRMA	Sesos Oficio				Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
FECHA	NOMBRE	Sesos Oficio		Jhon A		Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
	CÉDULA	13 279 169		1.193.217.586		55'191.72		1091762427		1004 823 573									
3/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA	36,7	36,2	36,6	36,5	36,2	36,1	36,3	36,1	36,7	36,2								
	FIRMA	Sesos Oficio				Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
FECHA	NOMBRE	Sesos Oficio		Jhon A		Jorge A		Ruben Montejo		Jose Toro									
	CÉDULA	13 279 169		1.193.217.586		55'191.72		1091762427		1004 823 573									
	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00					7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA																		
	FIRMA							Ruben Montejo		Jose Toro									
FECHA	NOMBRE							Ru											
	CÉDULA																		
	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA																		
	FIRMA																		
FECHA	NOMBRE																		
	CÉDULA																		
	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00
	TEMPERATURA																		
	FIRMA																		

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMINEO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE ENTREGA DE EPP

FECHA	NOMBRE	Sesar otiz	Jhon A	Jorge C A	Ruben Montejo	Jose Toro		
	CÉDULA	B 279 169	1.193.217.586	55/9/172	1091762427	1004 825573		
1/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/		
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/		
	FIRMA	Sesar otiz		Jorge C A	Ruben Montejo	Jose Toro		
FECHA	NOMBRE	Sesar otiz	Jhon A	Jorge C A	Ruben Montejo	Jose Toro		
	CÉDULA	B 279 169	1.193.217.586	55/9/172	1091762427	1004 825573		
2/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/		
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/		
	FIRMA	Sesar otiz		Jorge C A	Ruben Montejo	Jose Toro		
FECHA	NOMBRE	Sesar otiz	Jhon A	Jorge C A	Ruben Montejo	Jose Toro		
	CÉDULA	B 279 169	1.193.217.586	55/9/172	1091762427	1004 825573		
3/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/		
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/		
	FIRMA	Sesar otiz		Jorge C A	Ruben Montejo	Jose Toro		
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
	GUANTES							
	TAPABOCAS							
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
	GUANTES							
	TAPABOCAS							
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
	GUANTES							
	TAPABOCAS							
	FIRMA							

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE LAVADO DE MANOS (USO ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL)

FECHA	NOMBRE	Jesus ortiz	Jhon A	Ruben Montes	Jose Toro			
	CÉDULA	B 279169	1193217586	1091762427	1004825573			
1/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Jesus ortiz		Ruben Montes	Jose Toro			
FECHA	NOMBRE	Jesus ortiz	Jhon A					
	CÉDULA	B 279169	1193217586					
2/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Jesus ortiz		Ruben Montes	Jose Toro			
FECHA	NOMBRE	Jesus ortiz	Jhon A		Jose Toro			
	CÉDULA	B 279169	1193217586	1091762427	1004825573			
3/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Jesus ortiz		Ruben Montes	Jose Toro			
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 9 DEL 5/03/2021 AL 11/03/2021

FECHA: 11 (Día) 03 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. TOMA DE TEMPERATURA

LA OBRA CUENTA CON TERMÓMETROS DIGITALES PARA LA TOMA DE TEMPERATURAS, CADA VEZ QUE SE USA EL TERMÓMETRO DIGITAL SE DESINFECTA CON ALCOHOL.
EN CASO DE PRESENTARSE UNA TEMPERATURA MAYOR O IGUAL A 38 °C DE UN TRABAJADOR SE ESPERA 15 MINUTOS Y REALIZAR UNA NUEVA TOMA PARA CONFIRMAR. SE LLEVA UN REGISTRO DEL PERSONAL ATENDIDO.

2. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

3. ENTREGA DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓNDEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

4. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



LAVADO DE MANOS AL INGRESO DE JORNADA LABORAL



TOMA DE TEMPERATURA A AYUDANTES DE OBRA



DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTA MENOR



DESINFECCIÓN DE PERSONAL CON GEL ANTIBACTERIAL



AYUDANTES DE OBRA CON BUEN USO DE TAPABOCAS



PERSONAL DE OBRA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

CUADRO RESUMEN

EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

FECHA	NOMBRE	Gober		Juan Omar		Cristian A		Daniel A		Alirio		Carlos			
	CÉDULA	5518582		1004878222		1007354321		1005018062		5599284		5514229			
9/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		cristian E A		Daniel A.		No firma		No firma			

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app [3024546329] Línea nacional [018000511414] [018000941414] opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE	Gober		Juan Omar		Cristian A		Daniel A		Alirio		Carlos G			
	CÉDULA	5518582		1004878222		1007354321		1005018062		5514229		5514229			
10/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		cristian E A		Daniel A.		No firma		No firma			

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app [3024546329] Línea nacional [018000511414] [018000941414] opción cero para asistencia

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE LAVADO DE MANOS (USO ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL)

FECHA	NOMBRE	Gubey C.	Dionel	Alirio	Juan Omar	Cristian A.	Carlos	
	CÉDULA	5519582	1005018012	5519229	1004825222	1007359324	5519229	
4/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Gubey Carrizal	Dionel	No Firma	JUAN O	Cristian E	No Firma	
FECHA	NOMBRE	Gubey C.	Dionel	Alirio	Juan Omar	Cristian A	Carlos	
	CÉDULA	5519582	1005018012	5519229	1004825222	1007359324	5519229	
5/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Gubey Carrizal	Dionel Alva	No Firma	JUAN O		No Firma	
FECHA	NOMBRE	Gubey Ca	1005018012	Alirio	1004825222	Cristian A	Carlos	
	CÉDULA	5519582	1005018012	5519229	1004825222	1007359324	5519229	
6/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Gubey Carrizal	Dionel Al.	No Firma	JUAN O		No Firma	
FECHA	NOMBRE	5519582	Dionel	Alirio	1004825222	Cristian A	Carlos	Alejandro Rincon
	CÉDULA	Gubey Carr	1005018012	No Firma	Juan Omar	1007359324	5519229	1065679452
8/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Gubey Carrizal	Dionel Al.	No Firma	JUAN O		No Firma	Alejandro
FECHA	NOMBRE	Gubey Ca	Dionel	Alirio	Juan Omar	Cristian A	Carlos	Alejandro
	CÉDULA	5519582	1005018012	No Firma	1004825225	1007359324	5519229	1065679452
9/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Gubey Carrizal	Dionel Al.	No Firma	JUAN O		No Firma	Alejandro
FECHA	NOMBRE	Gubey C	Dionel	Alirio	Juan Omar	Cristian A	Carlos	Alejandro
	CÉDULA	5519582	1005018012	5519229	1004825225	1007359324	5519229	1065679452
10/3/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Gubey Carrizal	Dionel Al.	No Firma	JUAN O		No Firma	Alejandro

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS

FECHA																			
	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875 222		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
4/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,1	36,3	36,5	36,3	36,5	36,2	36,5	36,3	36,5	36,4	36,8	36,1						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875 222		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
5/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,3	36,5	36,6	36,5	36,5	36,9	36,3	36,2	36,8	36,2	36,4	36,5						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875222		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
6/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,2	36,8	36,7	36,1	36,8	36,5	36,7	36,2	36,5	36,2	36,7	36,6						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875224		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
8/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,5	36,7	36,8	36,9	36,5	36,1	36,7	36,6	36,7	36,3	36,7	36,4						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 83		1004875221		1007359321		1005018012		5819289		55 19229							
9/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,2	36,6	36,5	36,5	36,1	36,3	36,7	36,2	36,3	36,5	36,2	36,1						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875222		1007359321		1005018012		5819289		55 19229							
10/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,5	36,9	36,9	36,1	36,3	36,5	36,5	36,2	36,5	36,9	36,8	36,2						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS

FECHA																			
	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875 222		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
4/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,1	36,3	36,5	36,3	36,5	36,2	36,5	36,3	36,5	36,4	36,8	36,1						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875 222		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
5/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,3	36,5	36,6	36,5	36,5	36,9	36,3	36,2	36,8	36,2	36,4	36,5						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875222		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
6/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,2	36,8	36,7	36,1	36,8	36,5	36,7	36,2	36,5	36,2	36,7	36,6						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875224		1007359329		1005018012		5819289		55 19229							
8/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,5	36,7	36,8	36,9	36,5	36,1	36,7	36,6	36,7	36,3	36,7	36,4						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel A		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 83		1004875221		1007359321		1005018012		5819289		55 19229							
9/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,2	36,6	36,5	36,5	36,1	36,3	36,7	36,2	36,3	36,5	36,2	36,1						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian E. Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							
FECHA	NOMBRE	Gober C		Juan Oma		Cristian A		Dionel		Alirio		Carlos							
	CÉDULA	88195 82		1004875222		1007359321		1005018012		5819289		55 19229							
10/3/21	HORA	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00		
	TEMPERATURA	36,5	36,9	36,9	36,1	36,3	36,5	36,5	36,2	36,5	36,9	36,8	36,2						
	FIRMA	Gober Carvajalino		JUAN O H		Cristian Ardila		Dionel A.		No firma		No firma							

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 10 DEL 12/03/2021 AL 18/03/2021

FECHA: 18 (Día) 03 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. TOMA DE TEMPERATURA

LA OBRA CUENTA CON TERMÓMETROS DIGITALES PARA LA TOMA DE TEMPERATURAS, CADA VEZ QUE SE USA EL TERMÓMETRO DIGITAL SE DESINFECTA CON ALCOHOL.
EN CASO DE PRESENTARSE UNA TEMPERATURA MAYOR O IGUAL A 38 °C DE UN TRABAJADOR SE ESPERA 15 MINUTOS Y REALIZAR UNA NUEVA TOMA PARA CONFIRMAR. SE LLEVA UN REGISTRO DEL PERSONAL ATENDIDO.

2. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

3. ENTREGA DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓNDEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

4. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL ANTISEPTICO



DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL DE OBRA



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD TOMADAS EN VISITAS CON INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y ART



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR



CHARLAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE OBRA



PERSONAL DE OBRA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

SE REALIZÓ UN COMUNICADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORIA A TODOS LOS CONTRATISTAS PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE LA RESOLUCIÓN 0223 DE 2021 DONDE SE ELIMINA LA TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANOS Y FORMATOS DE INGRESO. DE TAL MANERA DICHAS MEDIDAS YA NO SERAN EXCLUSIVAMENTE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DELOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

CUADRO RESUMEN

EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

FECHA	NOMBRE	Cristian		Diuner		Juan Oma		Jesus		Yormen A.		Gabe Carvajal			
	CÉDULA	1007394327		1005018017		1004825222		1065679452		1091163523		53195887			
13/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Cristian E.		Diuner Alvarez		Juan O H		Jesus		Yormen E		Gabe Carvajal			

Nota: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE	Cristian E. Ardila		Diuner		Juan Oma		Alejandro		Yormen A.		Gabe Carvajal			
	CÉDULA	1007394327		1005018017		1004825222		1065679452		1091163523		53195887			
15/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Cristian E. Ardila		Diuner Alvarez		Juan O H		Jesus		Yormen E		Gabe Carvajal			

Nota: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

HA	NOMBRE	Jhon		Yeison Ovalles		Alexander		Jose Toro							
	CÉDULA	1193217586		1004825381		1091163351		1004825573							
15/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Jhon A		Yelson OVA		Alexander O		Jose Toro							

i: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

HA	NOMBRE	Jhon		Yeison Ovalles		Alexander		Jose Toro							
	CÉDULA	1193217586		1004825381		1091163351		1004825573							
16/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Jhon A		Yelson OVA		Alexander O		Jose Toro							

i: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

FECHA	NOMBRE	Cristian		Diana		Juan Omar		Alejandro		Yorman		Guber			
	CÉDULA	1007354327		1005018012		1004822727		1065674452		1091163823		5519587			
16/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Cristian E Andrés Sandoval Muñoz				JUAN O H		Jesús		Yorman E		Guber Carvajalino			

Nota: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE	Cristian		Diana		Juan Omar		Alejandro		Yorman		Guber			
	CÉDULA	1007354327		1005018012		1004822727		1065674452		1091163823		5519587			
17/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Cristian E Andrés Sandoval Muñoz				JUAN O H		Jesús		Yorman E		Guber Carvajalino			

Nota: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

HA	NOMBRE	Jhon Angel		Yeison Ovalles		Alexander		Jose Toro							
	CÉDULA	1093217588		1004825381		1091163351		1004825573							
13/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	x: Jhon Angel		Yeison Ovalles		Alexander		Jose Toro							

x: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

HA	NOMBRE	Jhon Angel		Yeison Ovalles		Alexander		Jose Toro							
	CÉDULA	1093217588		1004825381		1091163351		1004825573							
15/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	x: Jhon Angel		Yeison Ovalles		Alexander		Jose Toro							

x: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 11 DEL 19/03/2021 AL 25/03/2021

FECHA: 25 (Día) 03 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. TOMA DE TEMPERATURA

LA OBRA CUENTA CON TERMÓMETROS DIGITALES PARA LA TOMA DE TEMPERATURAS, CADA VEZ QUE SE USA EL TERMÓMETRO DIGITAL SE DESINFECTA CON ALCOHOL.
EN CASO DE PRESENTARSE UNA TEMPERATURA MAYOR O IGUAL A 38 °C DE UN TRABAJADOR SE ESPERA 15 MINUTOS Y REALIZAR UNA NUEVA TOMA PARA CONFIRMAR. SE LLEVA UN REGISTRO DEL PERSONAL ATENDIDO.

2. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

3. ENTREGA DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓNDEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

4. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL ANTISEPTICO



DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL DE OBRA



ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DE USO PERSONAL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

SE REALIZÓ UN COMUNICADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORIA A TODOS LOS CONTRATISTAS PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE LA RESOLUCIÓN 0223 DE 2021 DONDE SE ELIMINA LA TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANOS Y FORMATOS DE INGRESO. DE TAL MANERA DICHAS MEDIDAS YA NO SERAN EXCLUSIVAMENTE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DELOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

CUADRO RESUMEN

EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: MARLON ALEJANDRO CACERES NAVARRO

No. MAT: 54202-422843 NTS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMINEO VIAL

TABLA DE ENTREGA DE EPS

FECHA									
	NOMBRE	Luis Arr	Luis Ovalle	Jose Toro	Jesús Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	55194380	55194204	1004825573	13279169	1143217586	1004825381	1091183381	1091627427
22/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Lusiany carrasca	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Lusiany	Luis Ovalle	Jose Toro	Jesús Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	55194380	55194204	1004825573	13279169	1143217586	1004825381	1091183381	1091627427
23/2/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Lusiany carrasca	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Lusiany carrasca	Luis ovalle	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	55194380	55194204	1004825573	13279169	1143217586	1004825381	1091183381	1091627427
29/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Lusiany carrasca	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE								
	CÉDULA								
	GUANTES								
	TAPABOCAS								
	FIRMA								
FECHA	NOMBRE								
	CÉDULA								
	GUANTES								
	TAPABOCAS								
	FIRMA								

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMINEO VIAL

TABLA DE ENTREGA DE EPS

FECHA	NOMBRE	Luis ovallos	Luis O	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	5514380	5514204	1004828573	13279169	1193217586	1004825381	1091183351	1091624927
16/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Luis ovallos	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Luis ovallos	Luis O	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	5514380	5514204	1004828573	13279169	1193217586	1004825381	1091183351	1091624927
17/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Luis ovallos	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Luis ovallos	Luis Ovalle	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	5514380	5514204	1004828573	13279169	1193217586	1004825381	1091183351	1091624927
18/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Luis ovallos	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Luis ovallos	Luis Ovalle	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	5514380	5514204	1004828573	13279169	1193217586	1004825381	1091183351	1091624927
19/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Luis ovallos	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Luis ovallos	Luis Ovalle	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben
	CÉDULA	5514380	5514204	1004828573	13279169	1193217586	1004825381	1091183351	1091624927
20/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Luis ovallos	Luis ovallos	Jose Toro	Jesus Ortiz	Jhon A	Yerson	Alexander	Ruben Eduardo

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

FECHA	NOMBRE	Luisana		Jose		Luis		Neyid		Jhon A		Yerson		Alexander	
	CÉDULA	55193[illegible]		1004828573		5519209		13779168		1.193217.586		1004075381		0911883[illegible]	
18/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Luisana Carrasco		Jose Toro		Luis Ovalles		Neyid Ortiz		Jhon A		Yerson		Alexander	

Nota: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE	Luisana		Jose Toro		Luis Ovalles		Neyid Ortiz		Jhon A.		Yerson		Alexander	
	CÉDULA	55193[illegible]		1004828573		5519209		13779168		1193217586		1004075381		0911883751	
19/3/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Luisana Carrasco		Jose Toro		Luis Ovalles		Neyid Ortiz		Jhon A		Yerson		Alexander	

Nota: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia
