

INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
NIT: 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL NO. 6
PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1. LOCALIZACIÓN 5

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8

2.4. POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO 8

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 10

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 13

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 14

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 14

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 14

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 14

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 14

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 15

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 15

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 15

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 15

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 16

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 16

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 16

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 16

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 16

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL 17

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 20

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 21

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 21

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 22

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 23

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 23

6.7.2. APLICATIVO CIFRA 24

6.7.3. INFORME MENSUAL DE CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 24

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 27

9. ANEXOS 31

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 31

9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS 33

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), estructuro el programa "COLOMBIA RURAL" que tiene como objetivo mantener y mejorar la transpirabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementan la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollan bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

Colombia Rural es un programa del Gobierno Nacional que busca mantener y mejorar la transpirabilidad de la red vial terciaria del país. Con una movilidad más segura y eficiente impulsando la reactivación de las economías locales, al facilitar la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, la promoción de destinos turísticos y el acceso a bienes y servicios.

El tramo de MIRACOTES-LOS RANCHOS es una de las vías que más tráfico, movilidad y productividad está generando en el municipio y su desarrollo regional tiene que ver mucho con la estabilidad de la vía y la continua operación vehicular es indispensable para generar la producción y comercialización de productos agrícolas, comercialización de artículos de primera necesidad para sus poblaciones y la conexión directa entre el municipio y la vía principal que conecta con el departamento. Sin embargo, esta vía es destapada y en épocas de invierno, con el alto tráfico vehicular, viene mostrando en unos puntos críticos problemas de hundimiento de calzada, baches, deslizamientos que vienen elevando el riesgo de accidentalidad y se vienen aumentando los daños en los vehículos.

Con esta intervención no solo se ofrece una respuesta y reducción del riesgo de accidentalidad en estos sectores o tramos, sino que a su vez se permite una mejor movilidad y se incentiva la producción agrícola y comercial de la región. El mantenimiento de las obras de arte, mejora las condiciones de durabilidad de la vía y permite que se mantenga con mayor tiempo el tiempo óptimo de servicio.

Las vías terciarias deben mejorar para que los campesinos puedan sacar sus productos a los mercados locales, regionales y nacionales. El estado actual de las mismas hace que los productos se encarezcan dejando la menor porción de la cadena de comercio en manos de nuestros campesinos.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**, el cual fue adjudicado a **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA**, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo acumulado para la ejecución del contrato de SIETE (7) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO.

EL MUNICIPIO DE TEORAMA suscribió el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL CIENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

Este mejoramiento nace con el fin de brindar beneficio a la comunidad mejorando el estado de las vías en el municipio de Teorama, creando mejores condiciones de transitabilidad con el fin de permitir la movilidad de los habitantes y contribuyendo con el desarrollo socio económico. De igual forma mejorando la conectividad del territorio y de esta manera poder incrementar la productividad en el campo.

Adicionalmente, es de mencionar que las vías demás de la construcción de alcantarillas y placa huella, también cuentan con un mantenimiento rutinario de conservación que será ejecutado después de entregadas las obras, con el ánimo de conservar en perfecto estado la vía intervenida.

A continuación, se presenta el desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, el cuál elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2021.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Es de mencionar que las vías no solo requieren la construcción de alcantarillas y placa huella, también se requiere de un mantenimiento adicional de conservación que será después de entregadas las obras, con el ánimo de conservar en perfecto estado la vía intervenida.

Este mejoramiento inicialmente contemplaba la construcción de 730 metros lineales de placa huellas y 6 alcantarillas en concreto reforzado, en los sectores críticos según las condiciones iniciales de la vía. Una vez realizado el recorrido al área a intervenir e identificar las necesidades existentes de la vía y propuestas presentadas por la comunidad, fue modificado y ajustado el alcance del contrato de obra. Por lo tanto, de acuerdo a la entrega y revisión de los estudios y diseños entregados por el contratista de obra, interventoría avala el alcance y presupuesto ajustado, estableciendo la siguiente meta física: la construcción de 565 metros lineales de Placa Huella, 6 Alcantarillas y Caracterización vial de 9,30 km.

2.1. LOCALIZACIÓN



interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ILUSTRACIÓN 1. Ocaña Norte de Santander (fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña en Norte de Santander)



ILUSTRACIÓN 2 Municipio de Teorama (fuente: Alcaldía Municipal de Teorama Norte de Santander)

El municipio de Teorama, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. Teorama es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. Su población asciende a 21 524 habitantes. Dista 238 km de Cúcuta, capital del departamento. La cabecera municipal se encuentra a una altitud media de 1.158 m s. n. m., y la temperatura promedio es de 21.4 °C.

La cabecera municipal se encuentra ubicada a 73° 17' 24" al oeste del meridiano de Greenwich (longitud) y a 8° 26' 18" al norte del paralelo ecuatorial (latitud), a una distancia de 274 km de Cúcuta, capital del departamento. El municipio de Teorama está localizado en la subregión occidental del departamento del Norte de Santander.

Limites:

- Norte: República Bolivariana de Venezuela y el municipio de Convención.
- Sur: Municipio de Ocaña.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- Oriente: Municipios de El Tarra, Tibú y San Calixto.
- Occidente: Municipio de Convención.

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía hacia el corredor de MIRACOTES-LOS RANCHOS, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el tránsito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.

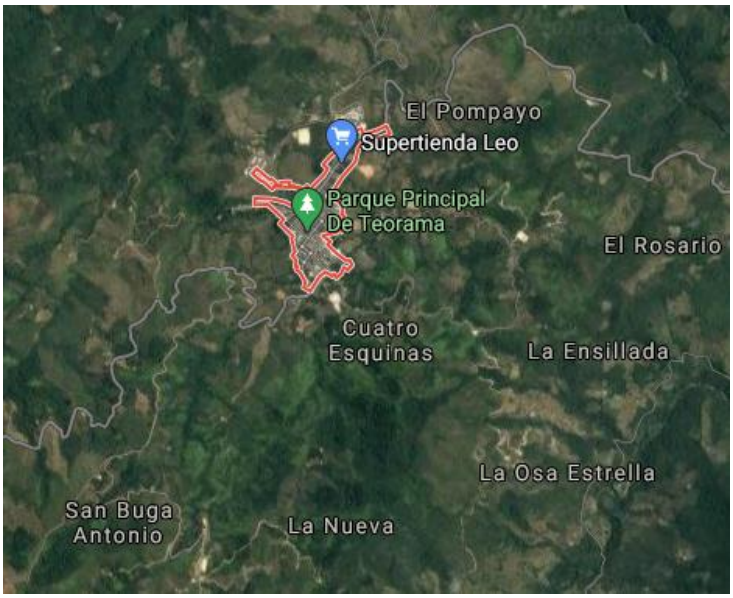


ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, el ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de Teorama, se identificó las condiciones iniciales de la vía, en la cual se observaron tramos deteriorado debido al invierno en la zona donde se realizará el mejoramiento de la vía con los diferentes tramos de placa huella. Se identificó que el sector, los tramos a intervenir y el abscisado fueran establecidos como fue determinado inicialmente, además se observó que en algunos tramos la vía no cumplía con los 5 m de ancho. Por lo cual, fue revisado y ajustado para posteriormente dar inicio a la topografía el 14 de diciembre del 2020. Una vez iniciada la etapa de localización y replanteo, la comunidad manifiesta la inclusión un cuarto tramo, propuesta que es aceptada y aprobada por el contratista de obra.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Actualmente, en el municipio se identificó que presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de alcantarillas en tubería de polietileno PEAD, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de placa huella, y actividades de mantenimiento periódico. El estado de la red vial del municipio de Teorama, necesita mejorar las condiciones de transitabilidad para permitir la movilidad de los habitantes y contribuir con el desarrollo socio económico de los mismos, mejorando la conectividad del territorio y de esta manera poder incrementar la productividad en el campo.

El mejoramiento de la vía se realiza con la construcción de la placa huella debido a que en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención generando daños en las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía debido a que no hay un control del drenaje.

2.4. POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO

En el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, con objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL", la población beneficiada por el proyecto de obra son aquellas personas que pertenecen a la vereda MICORATES-LOS RANCHOS, dichas veredas cuentan con aproximadamente 125 habitantes. Este mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales, del presente municipio, nace como fin del Estado para

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

servir a la comunidad, promoviendo la prosperidad general y garantizar la efectividad de los proyectos de obra. El estado de las vías en el municipio de Teorama, busca mejorar las condiciones de transitabilidad con el fin de permitir la movilidad de los habitantes y contribuir con el desarrollo socio económico de los mismos, mejorando la conectividad del territorio y de esta manera poder incrementar la productividad en el campo.

Se pretende dar solución efectiva a los requerimientos de la población del municipio de El Tarra y el mejoramiento constante de sus vías tanto urbanas como rurales, las cuales es una de sus prioridades. Actualmente el municipio atraviesa por una difícil situación socioeconómica producto del creciente conflicto armado por grupos ilegales al margen de la ley que se encuentran asentados principalmente en la zona rural, dificultando aún más las condiciones de vida de campesinos de la región quienes son los más afectados por las consecuencias del conflicto. Es por esto que se busca la intervención de vías rurales que se encuentran en mal estado y que presentan alto deterioro, incomodidad e inseguridad al tránsito de vehículos y peatones, dificultad para acceder a servicios médicos y educativos, dificultad en el transporte y comercialización de productos agrícolas y muchos otros problemas que se desencadenan debido al mal estado de las vías.

Con la construcción de placa huella en esta vía tan deteriorada y la intervención de las alcantarillas, se desprenden grandes beneficios que impactan económica y socialmente a los habitantes de la comunidad, ya que su calidad de vida indiscutiblemente mejorará y en general a toda la población del departamento de Norte de Santander.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	NO. LC-001-CO-001-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor inicial del Contrato	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Valor acumulado	MIL SETENTA Y OCHOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.078.087.033,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	ALCALDÍA DE TEORAMA
NIT. No.	800017022-9
Contratista	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
NIT. No.	901424260-7
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	5 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Fecha de Acta de Inicio	30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Número del OTROSÍ	No. LC_001_CO_001-2020 No.002
Plazo Adicional	Cuarenta y seis (46) días calendario
Fecha de Suscripción del OTROSI	27 de abril de 2021
Fecha de Terminación	15 DE JUNIO DEL 2021
CDP	NO. 1106-1, 11 DE JUNIO DE 2020
CDP ADICIONAL	NO. 2704-3, 27 DE ABRIL DE 2021
RP	0511-2, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020
RP ADICIONAL	NO. 2704-1, 27 DE ABRIL DE 2021

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		PÓLIZA NO.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		400-47-994000072639	$ 107.808.703,30	30/11/2020	09/11/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 53.904.351,65	30/11/2020	10/07/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 107.808.703,30	5 años	
CALIDAD DEL SERVICIO			$ 5.799.138,00	30/11/2020	15/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	400-74-994000018160	$ 175.560.600,00	30/11/2020	15/06/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se avanza en las actividades de obra realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2021, las actividades ejecutadas para el presente periodo fueron las siguientes: finalización del proceso constructivo de placa huella en los siguientes tramos: mejoramiento de 180ml de placa huella en tramo # 4, ubicado en el abscisado K7+100-K7+280 y mejoramiento de 160ml de placa huella en tamo # 3 ubicado en el abscisado K4+020-K4+180. Por otra parte, se inicia proceso constructivo de placa huella en tramo # 2, interviniendo 50 ml correspondiente al abscisado K3+430-K3+520 y finalmente, se finaliza ejecución en un 100% la construcción de las seis (6) alcantarillas.
- Se finalizan las actividades de mejoramiento periódico en las cuales se contempla los ítems de conformación vial, mejoramiento de la subrasante con adición de material y afirmado, se obtiene un avance de ejecución del 100%.
- Instalación de valla informativa aprobada por el ministerio de transporte, en tramo vial intervenido con el mejoramiento del sistema constructivo de placa huella.
- Se realizan charlas y capacitaciones al personal de obra en los temas relacionados con los riesgos, seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de cada una de sus actividades, incentivar y concientizar a la práctica al protocolo de bioseguridad frente al COVID-19.
- El contratista de obra, radica solicitud de adición en tiempo cuarenta y seis (46) días calendario para el contrato de obra, con el objetivo de continuar con la ejecución de las actividades de obra, dicha solicitud fue avalada por la interventoría y la Alcaldía Municipal, incrementando el periodo de ejecución designando una fecha de terminación del 15 de junio de 2021 para el contrato de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- En el mes de abril, se presentaron algunos días con altas precipitaciones que atrasaron el avance de las actividades de obra. Es por esto que, las constantes lluvias varían y alteran el estado inicial de la vía convirtiéndolo en un terreno altamente resbaladizo, generando problemas en el desplazamiento del personal, maquinaria y equipo a lo largo del tramo vial.
- El contratista de obra radica diseño de construcción de disipador, presenta solicitud de adicional presupuestal derivada del mantenimiento del corredor productivos Miracotes-Los Ranchos a la alcaldía municipal de la cual se obtiene como respuesta aprobación del mismo por un valor de $ 25.583.121,00 IVA incluido.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Construcción de obras de drenaje, en donde se contemplan seis (6), alcantarillas con Tubería en Polietileno de alta densidad con pared externa estructural e interna lisa-PEAD ADS DN 36".

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades de la ejecución del proyecto.
- Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividades ejecutadas por parte de interventoría para el contrato de obra en ejecución correspondientes al mes de abril del presente año.
- Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS por medio de la plataforma virtual, con el fin de que los supervisores y gestor técnico del contrato revise el estado actual de los contratos.
- Visitas técnicas y elaboración de comités de obra/reuniones con las partes (Municipio, Invias, Contratista de obra y Comunidad), requeridas durante el desarrollo del contrato.
- Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector acompañamiento diario en el avance de las actividades de obra, desempeñando funciones de su cargo: supervisión, revisión, seguimiento y control en la ejecución y el avance de las actividades de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas y lineamientos técnicos establecidas en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural asignadas para los contratos PDET CATATUMBO-COLOMBIA RURAL)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- Seguimiento y control a la implementación del protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por el contratista, en obra con el personal presente, dicho seguimiento es realizado por parte del ingeniero inspector y el profesional siso de la interventoría.
- Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato ajustados de acuerdo a la ampliación de plazo acordada.
- Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
- Seguimiento, apoyo y reiteración a la entidad contratante para la implementación del programa emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo No. 0002561 que deriva el contrato de obra, la cual se encuentra en trámite por parte de la Alcaldía.
- Se celebra la conformación de la veeduría ciudadana del proyecto, se realiza seguimiento y control de dicha conformación.
- Desarrollo de comités técnicos semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoría y/o gestor técnico del contrato de interventoría, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.
- El Instituto Nacional de Vías-INVIAS, aprueba solicitud por parte de la interventoría de adicionar tiempo al contrato No. 1278, para continuar con el seguimiento del contrato de obra se radica aprobación, con fecha de terminación del 30 de junio del 2021.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se obtiene un avance en la construcción de placa huella en tres (3) de los tramos viales equivalentes a 390 metros lineales, se culmina construcción de seis (6) alcantarillas y se finalizan actividades de conformación vial en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3, se encuentra diligenciada la información que presenta la relación, el estado y el avance del estado general del proyecto, en el formato anteriormente mencionado se presenta el resumen mensual. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se ejecutaron actividades de construcción de alcantarillas, construcción de placa huella y mejoramiento periodo vial, el registro de la relación y el estado de la maquinaria, los equipos y herramienta menor contratada por el contratista de obra, se encuentran diligenciados en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se diligenció formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6, el cual presenta la relación del personal contratado que ejecuta las actividades de obra, por parte del contratista de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8, el cual presenta un informe financiero y presupuestal de acuerdo a la administración y distribución de los recursos asignados para el contrato de obra. Adicionalmente, se registra acta de costos No.1 presentada, aprobada y cobrada por el contratista de obra (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se presentan días con altas precipitaciones, generando atrasos en la ejecución y avance de las actividades de obra debido a que se dificulta el tránsito vehicular y/o motocicletas en el tramo vial, también atrasa las actividades de fundida de placa huella, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, se registra el estado general del tiempo tomando el registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, no se realizaron ensayos de laboratorio, debido a que fueron realizados y presentados a la interventoría anteriormente en el mes de febrero.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12. Se verifica que el personal se encuentra activo en afiliaciones correspondiente al presente periodo y se anexa el formato de control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra diligenciado con la planilla de pago de seguridad social del mes anterior (marzo) teniendo en cuenta que el contratista tiene plazo de realizar el pago hasta el mes siguiente. (Se anexa formato en PDF).

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14, el cual presenta el informe financiero del avance físico del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, en el cual se registra las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual actualizadas y ajustadas, de acuerdo a la ampliación de plazo para el contrato de obra, en dicho anexo se evidencia el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 2021, no se presentan modificaciones en el plan de calidad debido a que no se realizaron: auditorias, ensayos de laboratorio, quejas ni reclamos, se diligenció reporte por medio del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17. (Se anexa formato en PDF).

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 2021, se relaciona otros documentos entregados por el contratista de obra.

- OTROSÍ NO.2 AL CONTRATO DE OBRA No. LC_001_CO_001-2020 con fecha 27 de abril de 2021, con un tiempo adicional de cuarenta y seis (46) días calendario contados a partir de la fecha de orden de inicio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 2021, el contratista de obra radicó entrega de la programación de obra y plan de inversión ajustada de acuerdo a la adición en tiempo del contrato de obra. Dicha programación se anexa por medio del diagrama de Gantt y flujo de inversión. (Se anexa formato en PDF).

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 2021, el contratista de obra radicó entrega del plan de inversión ajustada de acuerdo a la adición en tiempo del contrato de obra. Dicha programación se anexa por medio del flujo de inversión. (Se anexa formato en PDF).

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, no se realizaron actas de comité.

4.11.4.1. ACTA DE AVANCE DE OBRA AL INVIAS

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, no se realizaron actas de comité de obra con INVIAS, para el contrato de obra presente.

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, no se realizaron actas de reunión.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, la interventoría realizó los respectivos informes semanales en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2. En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**
2/04/2021	INFORME SEMANAL No. 20 - CTO. No. LC_001_CO-001-2020
9/04/2021	INFORME SEMANAL No. 21 - CTO. No. LC_001_CO-001-2020
16/04/2021	INFORME SEMANAL No. 22 - CTO. No. LC_001_CO-001-2020
23/04/2021	INFORME SEMANAL No. 23 - CTO. No. LC_001_CO-001-2020

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

NUMERAL	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.10	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 DE 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 843.371.017,00) IVA INCLUIDO.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
Número del OTROSÍ	No. 002
Plazo Adicional	2 MESES Y 7 DÍAS CALENDARIO
Fecha de Aprobación	15 DE ABRIL DE 2021
Nueva Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2021
CDP	NO. 86520, DEL 17 DE ABRIL DEL 2020
RP	NO. 575920, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

Garantía única de cumplimiento exigida según contrato principal

RIESGO ASEGURADO	PÓLIZA No.	CUANTÍA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

Garantía única de cumplimiento exigida ajustada de acuerdo a prorroga al contrato No. 1278 de interventoría

RIESGO ASEGURADO	PÓLIZA NO.	CUANTÍA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788 Anexo 3	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/12/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/12/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	30/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Se realiza aprobación de prórroga por los Supervisores del INVIAS, en tiempo al contrato de interventoría hasta el 30 de junio de 2021, con justificación de finalización de contratos de obra posterior a la fecha contractual de interventoría, debido a los cambios climáticos de entrada al invierno presentados en la zona del Catatumbo donde se están ejecutando los contratos de obra derivados de los convenios, por otra parte, las alteraciones en el orden público en la zona lo cual han retrasado el avance de la ejecución de los mismos.
- Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades de la ejecución del proyecto.
- Se realiza seguimiento al contrato de obra por medio de informes semanales, solicitud de información requerida para el avance de la ejecución de la obra y redacción de oficios.
- Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS por medio de la plataforma virtual, con el fin de que los supervisores y gestor técnico del contrato revise el estado actual de los contratos.
- Seguimiento a la implementación del Protocolo de Bioseguridad al contratista de obra, al igual que al grupo de trabajo que conforma la interventoría, seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
- Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos técnicos establecidas en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural asignadas para los contratos PDET CATATUMBO-COLOMBIA RURAL)
- Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo No. 2584-2019 que deriva el contrato de obra. Adicionalmente, se realiza reunión virtual con el Ing. Sabier representante de la ART, donde participan gestores técnicos e ing. apoyo de supervisión del contrato de interventoría de INVIAS,

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Interventoría y secretario de planeación del municipio, en esta reunión se tratan los siguientes temas: Exposición de la presentación y contenido del Programa Emprendedores Rurales y Aclaración de dudas frente al tema del Programa Emprendedores Rurales.

- Se celebra la conformación de la veeduría ciudadana del proyecto, se realiza seguimiento y control de dicha conformación.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, la interventoría no cuenta con disponibilidad de su equipo de especialistas.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA **PLAZO:** 7 MESES Y 7 DÍAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JUNIO DE 2021

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROG	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$23.201.403	$9.455.353,00	-$13.746.050	2,75%	1,12%	2,75%	1,12%
2	1 AL 31 DE DIC DE 2020	$117.167.088	$71.040.989,00	-$46.126.099	13,89%	8,42%	16,64%	9,54%
3	1 AL 31 DE ENE DE 2021	$117.167.088	$85.676.916,00	-$31.490.172	13,89%	10,16%	30,54%	19,70%
4	1 AL 28 DE FEB DE 2021	$117.167.088	$140.864.194,00	$23.697.106	13,89%	16,70%	44,43%	36,41%
5	1 AL 31 DE MAR DE 2021	$117.167.088	$134.861.606,00	$17.694.518	13,89%	15,84%	58,32%	52,24%
6	1 AL 30 DE ABR DE 2021	$117.167.088	$132.122.226,00	$14.955.138	13,89%	15,67%	72,21%	68,06%
7	1 AL 31 DE MAY DE 2021	$117.167.088						
8	1 AL 30 DE JUN DE 2021	$117.167.088						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con cuatro Vehículos 4x4, cilindraje 2.000 y equipos de topografía.
Por otra parte, para cada inspector, en cada uno de los 8 frentes de trabajo, de Interventoría se asignó motocicletas 125 cc (c/u) para su transporte o traslado dentro y hacia sitio de ejecución de los proyectos. También se cuenta con comisión topográfica.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9, el cual registra el personal que labora diariamente, en relación con lo establecido en la presente acta de costos para el presente periodo. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9, en el cual se presenta informe financiero y presupuestal para el contrato No. 1278 de interventoría que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13, en el cual se relaciona el personal afiliado y registrado en las planillas de seguridad social y parafiscal para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se radicó al Instituto Nacional de Vías INVIAS, la póliza No. 96-44-101155788 Anexo 3, actualizada de acuerdo a la prórroga No. 2 del contrato de interventoría No. 1278 de 2020, se actualiza en plataforma SECOP II con fecha 19/04/2021. Se suministro la póliza y el pago de la misma al Gestor Técnico, para tramite con la dirección jurídica. La interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde está registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza ajustada de acuerdo a la ampliación de plazo. (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra ajustado el plan de calidad. Se encuentra diligenciado en el MINFRA-MN-IN-15-FR-18 (Se anexa formato en PDF).

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES


6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado Contrato de Interventoría y MINFRA-MN-IN-3-FR-2 Informe de Revisión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Interventoría, a la fecha se desembolso el tercer anticipo a la interventoría, se encuentra en espera de que entregue el banco los rendimientos financieros de la cuenta corriente correspondiente a este, para así realizar el cierre de la cuenta en conjunto de la supervisión para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021 se presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio Tarra y la información pertinente del contrato. (Se anexa registro fotográfico)

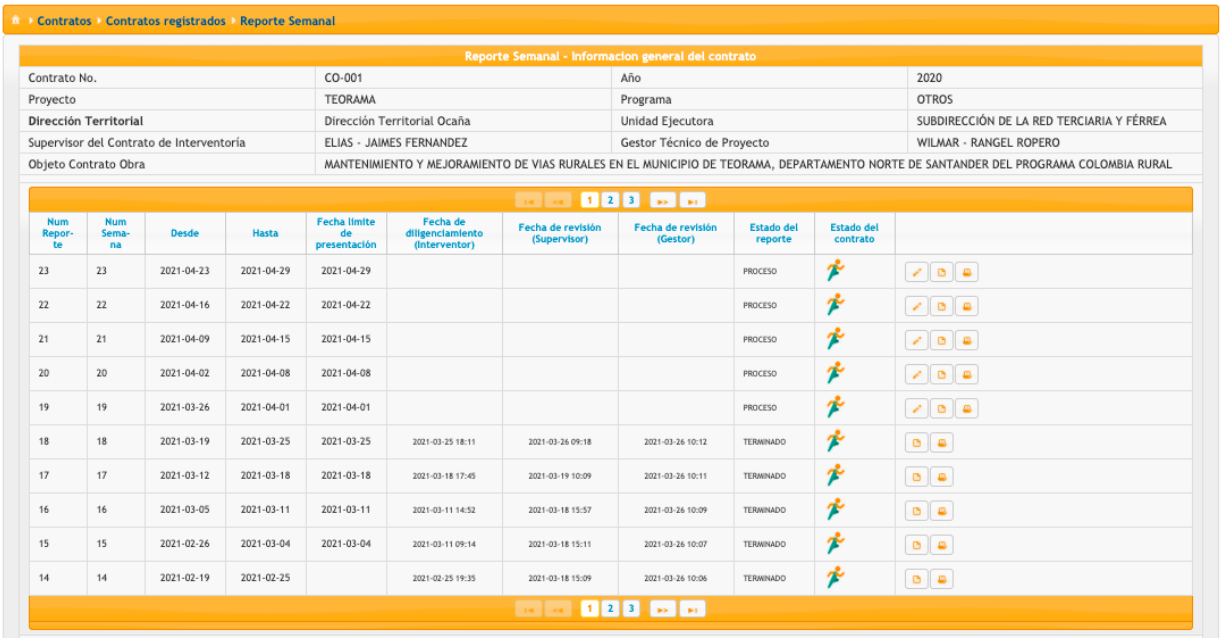

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	CO-001	Año	2020
Proyecto	TEORAMA	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Ocaña	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
Supervisor del Contrato de Interventoría	ELIAS - JAIMES FERNANDEZ	Gestor Técnico de Proyecto	WILMAR - RANGEL ROPERO
Objeto Contrato Obra	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		

1 2 3

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
23	23	2021-04-23	2021-04-29	2021-04-29				PROCESO		
22	22	2021-04-16	2021-04-22	2021-04-22				PROCESO		
21	21	2021-04-09	2021-04-15	2021-04-15				PROCESO		
20	20	2021-04-02	2021-04-08	2021-04-08				PROCESO		
19	19	2021-03-26	2021-04-01	2021-04-01				PROCESO		
18	18	2021-03-19	2021-03-25	2021-03-25	2021-03-25 18:11	2021-03-26 09:18	2021-03-26 10:12	TERMINADO		
17	17	2021-03-12	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-18 17:45	2021-03-19 10:09	2021-03-26 10:11	TERMINADO		
16	16	2021-03-05	2021-03-11	2021-03-11	2021-03-11 14:52	2021-03-18 15:57	2021-03-26 10:09	TERMINADO		
15	15	2021-02-26	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-11 09:14	2021-03-18 15:11	2021-03-26 10:07	TERMINADO		
14	14	2021-02-19	2021-02-25		2021-02-25 19:35	2021-03-18 15:09	2021-03-26 10:06	TERMINADO		

1 2 3

6.7.3. INFORME MENSUAL DE CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se anexa el informe mensual correspondiente al seguimiento, control e implementación del protocolo de bioseguridad, presentado por el contratista de obra, en el informe se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del área de seguridad industrial y salud ocupacional durante el presente periodo, dicho informe está fundamentado bajo la constitución política de Colombia, basándose el código sustantivo del trabajo, la ley 100 de seguridad social, decretos y resoluciones los cuales obligan a los empleadores asegurar a sus empleados contra los riesgos profesionales, resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social, resolución 666 del 2020 y Circular 003 del 8 de abril de 2020, que fundamenta las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

NUMERAL	CONTENIDO	FORMATO
6.1	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-5
6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.4	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.5	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-15-FR-18
6.7	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-3-FR-1
	INFORME DE REVISIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINFRA-MN-IN-3-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para concluir, se obtiene un avance en la ejecución de las actividades de obra del 26,68% correspondiente al mes de abril de 2021, frente a un porcentaje programado del 25,10%; se finalizó proceso constructivo de placa huella siendo intervenidos 160 ml en tramo # 3 y 180 ml en tramo #4; también se inicia construcción de 50ml de placa huella en tramo #2; la conformación vial ya se encuentra en un 100% ejecutada y se realizan actividades de replanteo manual de cunetas, excavación manual y figurado de acero de refuerzo para bordillos en tramo # 1 y #2.

Se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 79,84% frente a un porcentaje acumulado programado del 66,11%. Se obtiene un buen rendimiento en la ejecución de avance de las actividades de obra, aunque se han presentado lluvias que atrasan las actividades y el desplazamiento a los tramos intervenidos.

Se obtiene un avance en la construcción de la placa huella en un 70% con la intervención de 390 ml relacionados con el alcance definitivo y en la construcción de las seis (6) alcantarillas un 100%.

El contratista de obra radicó reprogramación y plan de inversión ajustado de acuerdo a la fecha de terminación 15 de junio de 2021, para el contrato de obra No. LC_001_CO-001-2020.

El alcance definitivo del proyecto contempla 565 ml de placa huellas distribuidos en cuatro tramos viales: tramo # 1 absc K0+890 - K1+025 (135M), tramo # 2 absc K3+430 - K3+520 ((90M), tramo 3 absc K4+020 - K4+180 (160M) y tramo 4 absc K7+100 - K7+280 (180M); también la construcción de 6 alcantarillas y actividades de conformación de vial.

El contratista de obra, instaló valla informativa aprobada por el ministerio de transporte en tramo vial intervenido MIRACOTES-LOS RANCHOS con las medidas establecidas según la resolución asignada.

Interventoría recomienda a la Alcaldía Municipal de Teorama, atender los temas de implementación de Emprendedores Rurales y brindar informes sobre los rendimientos financieros de los recursos girados por medio del convenio, ya que a la fecha no se ha tenido respuesta por la entidad a los requerimientos hechos por la interventoría.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
68202 03281 STD
DIRECTOR INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio como director de Interventoría, de la construcción de las obras de mantenimiento y mejoramiento en las vías terciarias del municipio de Teorama, Norte de Santander, correspondientes al periodo del 1 al 30 del mes de abril de 2021, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental.

ALCANCE

Se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización de los ajustes a los estudios y diseños, como de obra realizados por el contratista y las actividades ejercidas de interventoría, realizadas durante el mes de abril de 2021, incluyendo el ámbito técnico, administrativo y financiero de los avances de la ejecución del proyecto.

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril del 2021, estas actividades de avance fueron en la construcción de placa huella en el tramo # 2, 3 y 4 y la construcción con un avance del 100% en las seis (6) alcantarillas intervenidas. En tramo 1 y 2, se realiza replanteo manual de cunetas, excavación manual y figurado de acero de refuerzo para bordillos.

Se describe, en resumen, a continuación, el estado actual de la ejecución vs. Programado a ejecutar:

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	%EJECUTADO REAL DE OBRA	VALOR EJECUTADO REAL DEL CONTRATO (IVA INLUÍDO)	VALOR DE SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	% POR EJECUTAR DEL CONTRATO
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	$ 6.360.010,84	0,59%	0,99%	$ 10.671.831,12	$ 1.071.602.728,09	99%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 9.894.485,51	0,92%	4,47%	$ 48.184.934,43	$ 1.068.068.253,42	98%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 182.744.399,12	16,95%	7,70%	$ 83.003.130,90	$ 895.218.339,81	82%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 243.083.108,85	22,55%	40,00%	$ 431.185.095,57	$ 834.879.630,08	59%
EJECUCIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	$ 270.587.217,30	25,10%	26,68%	$ 287.600.458,75	$ 807.375.521,63	34%
EJECUCIÓN DE OBRA	MAYO DE 2021	$ 287.017.232,90	26,63%	0,00%	$ -	$ 790.945.506,03	7%
EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA	JUNIO DE 2021	$ 78.276.284,41	7,26%	0,00%	$ -	$ 999.686.454,52	0%
	TOTAL	$ 1.077.962.738,93	100,00%	79,84%	$ 860.645.450,76		

A la fecha el contratista de obra presentó Acta de Cobro No. 01 por una inversión de $ 507.867.898,75 equivalente a un 47,11%, comprendido en el periodo del 30 noviembre de 2020 hasta el 18 de marzo 2021.

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA


- Tramos correspondientes a la placa huella

PLACA HUELLA	ABSCISA Y LONGITUD	ACTIVIDADES	INTERVENCIÓN	% DE EJECUCIÓN
TRAMO 1	K0+890 - K1+025 (135M)	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONFORMACIÓN VIAL	SI	10%
TRAMO 2	K3+430 - K3+520 ((90M)	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONFORMACIÓN VIAL EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS RIOSTRAS, CORTE, ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN PLACA HUELLA, ENCOFRADO Y FUNDIDA	SI	55%
TRAMO 3	K4+020 - K4+180 (160M)	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONFORMACIÓN VIAL EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS RIOSTRAS, CORTE, ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN PLACA HUELLA, ENCOFRADO Y FUNDIDA	SI	100%
TRAMO 4	K7+100 - K7+280 (180M)	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONFORMACIÓN VIAL EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS RIOSTRAS, CORTE, ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN PLACA HUELLA, ENCOFRADO Y FUNDIDA	SI	100%

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- El estado de las seis (6) alcantarillas, se completa el proceso constructivo al 100%.

No. ALC	ABSCISA	TUBERIA	ENCOLE	DESCOLE	% DE EJECUCION
No. 1	Abscisa: K0+870	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 2	Abscisa: K4+140	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 3	Abscisa: K4+775	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 4	Abscisa: K7+150	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 5	Abscisa: K8+630	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%
No. 6	Abscisa: K2+080	INSTALADA	TERMINADO	TERMINADO	100%

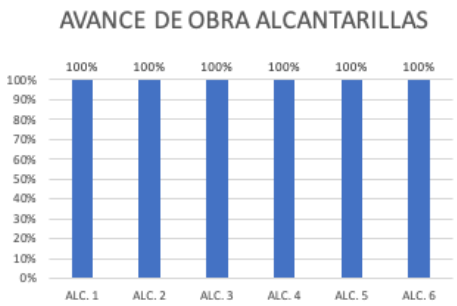

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Los alcances de placa huellas presentados dentro de los ajustes a los diseños contemplan los siguientes tramos:

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA 1	135 ml	K0+890	K1+025
PLACA HUELLA 2	90 ml	K3+430	K3+520
PLACA HUELLA 3	160 ml	K4+020	K4+180
PLACA HUELLA 4	180 ml	K7+100	K7+280
ALC1 CON DISIP		K0+870	
ALC # 2		K2+010	
ALC # 3		K4+140	
ALC # 4		K4+775	
ALC # 5		K7+150	
ALC # 6		K8+630	

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

Para concluir, se obtiene un avance en la ejecución de las actividades de obra del 26,68% correspondiente al mes de abril de 2021, frente a un porcentaje programado del 25,10%; se finalizó proceso constructivo de placa huella siendo intervenidos 160 ml en tramo # 3 y 180 ml en tramo #4; también se inicia construcción de 50ml de placa huella en tramo #2; la conformación vial ya se encuentra en un 100% ejecutada y se realizan actividades de replanteo manual de cunetas, excavación manual y figurado de acero de refuerzo para bordillos en tramo # 1 y #2.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 79,84% frente a un porcentaje acumulado programado del 66,11%. Se obtiene un buen rendimiento en la ejecución de avance de las actividades de obra, aunque se han presentado lluvias que atrasan las actividades y el desplazamiento a los tramos intervenidos.

Se obtiene un avance en la construcción de la placa huella en un 70% con la intervención de 390 ml relacionados con el alcance definitivo y en la construcción de las seis (6) alcantarillas un 100%.

El contratista de obra radicó reprogramación y plan de inversión ajustado de acuerdo a la fecha de terminación 15 de junio de 2021, para el contrato de obra No. LC_001_CO-001-2020.

El alcance definitivo del proyecto contempla 565 ml de placa huellas distribuidos en cuatro tramos viales: tramo # 1 absc K0+890 - K1+025 (135M), tramo # 2 absc K3+430 - K3+520 ((90M), tramo 3 absc K4+020 - K4+180 (160M) y tramo 4 absc K7+100 - K7+280 (180M); también la construcción de 6 alcantarillas y actividades de conformación de vial.

El contratista de obra, instaló valla informativa aprobada por el ministerio de transporte en tramo vial intervenido MIRACOTES-LOS RANCHOS con las medidas establecidas según la resolución asignada.

Interventoría recomienda a la Alcaldía Municipal de El Teorama, atender los temas de implementación de Emprendedores Rurales y brindar informes sobre los rendimientos financieros de los recursos girados por medio del convenio, ya que a la fecha no se ha tenido respuesta por la entidad a los requerimientos hechos por la interventoría.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
68202 03281 STD
DIRECTOR INTERVENTORÍA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

OFICIOS ENVIADOS AL INVIAS				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	EMPRESA	REMITENTE
1/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-346	INFORME SEMANAL NO.19	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO / DIRECTOR DE INTERVENTORIA
6/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-348	RADICACIÓN TRIMESTRAL A SMA-- INVIAS	INVIAS - JAIRO ARGUELLO SMA	R/L MARIA ELVIRA PINTO JAIMES
6/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-349	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL Y SOCIAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA, ENTREGADO A LA INTERVENTORIA AL INICIO DEL PROYECTO.	TODOS LOS CONTRATISTAS	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
8/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-352	INFORME SEMANAL NO.20	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO / DIRECTOR DE INTERVENTORIA
15/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-356	INFORME SEMANAL NO.21	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	ING. MARCO ANTONIO SOLANO / DIRECTOR DE INTERVENTORIA
22/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-358	INFORME SEMANAL NO.22	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	R/L MARIA ELVIRA PINTO JAIMES
29/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-365	INFORME SEMANAL NO.23	ING. WILMAR RANGEL ROPERO	R/L MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

OFICIOS ENVIADOS AL CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	EMPRESA	REMITENTE
6/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-349	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL Y SOCIAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA, ENTREGADO A LA INTERVENTORIA AL INICIO DEL PROYECTO.	TODOS LOS CONTRATISTAS	ING. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS/ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
26/04/2021	CSN-ANT-CTUMBO-363	AVAL PRÓRROGA No.1 TEORAMA	ALCALDIA DE TEORAMA	R/L MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

OFICIOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIA
19-abr-21		Entrega Planilla de seguridad social Mes de marzo. CONTRATOS DE OBRA No. LC.001.CO-001-2020	U.T MEJORAMIENTO VIAL
21-abr-21		DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION - -Diseño disipador: (cantidades de obra, Informe Hidráulico, Planos, presupuesto y oficio de entrega del diseño de disipador) - diagrama de GANTT. - Plan de contingencia. - Flujo de caja. -Programación actualizada con solicitud de prórroga. - Oficio solicitud de prorroga termino contractual.	U.T MEJORAMIENTO VIAL
29-abr-21		POLIZAS ACTUALIZADAS	U.T MEJORAMIENTO VIAL

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

OFICIOS RECIBIDOS INVIAS			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIA
5-abr-21	27182	INFORME SEMANAL No. 19	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
6-abr-21	27917	INFORME TRIMESTRAL SMA - CTO INTERVENTORIA 1278 DE 2	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
6-abr-21	27917	INFORME TRIMESTRAL SMA - CTO INTERVENTORIA 1278 DE 2	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	SRT 15665 copia	Primer aviso por Incumplimiento, convenio 2559 de 2019.	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	SRT 15667 copia	Primer aviso. Incumplimiento, contratación Mantenimiento Rutinario Convenio 2584 de 2019.	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	SRT 15683 copia	Primer aviso. Incumplimiento, contratación Mantenimiento Rutinario Convenio 2564-2019	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	SRT 15684	Primer aviso. Incumplimiento, contratación Mantenimiento Rutinario Convenio 2561-2019	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	SRT 15685	Primer aviso. Incumplimiento, contratación Mantenimiento Rutinario Convenio 2604-2019	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	SRT 15686	Primer aviso. Incumplimiento, contratación Mantenimiento Rutinario Convenio 2558-2019	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
7-abr-21	DO 10558	Contrato 312 de 2021. Designación de Gestor de Proyectos de convenios y/o de contrato en ejecución.	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
8-abr-21		Comités de Seguimiento Convenio INVIAS-ART	Tatiana Cabrera Barrios. Subdirección de Financiamiento
12-abr-21		INFORMACIÓN VALLA SAN CALIXTO - COLOMBIA RURAL PDET	Joan Steven Rico López. Grupo de Comunicaciones
14-abr-21		FICHA DE SEGUIMIENTOS CONVENIOS	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
14-abr-21		INFORME PRORROGA CONTRATO 1278	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
19-abr-21		SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN APROBACIÓN ACTA MODIFICATORIA	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
19-abr-21		acta modificatoria firmada y aprobada	Ing. Brayan Camilo Criado Sanjuán Dirección Territorial Ocaña
19-abr-21		modelo de convenio solidario para la actividad de mantenimiento rutinario.	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
19-abr-21		CIRCULAR EXTERNA 016	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
19-abr-21		RENDIMIENTOS FINACIEROS	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
19-abr-21		CIRCULAR 016	Mgtr. ELIAS JAIMES FERNANDEZ DT OCAÑA
20-abr-21	DG-GC 17268	Respuesta a Entrada No. 9810 con Fecha 09/02/2021- valla san calixto	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
22-abr-21		INSTRUCTIVO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS	Mgtr. ELIAS JAIMES FERNANDEZ DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA
22-abr-21		Capacitación facturación electronica por personal del SIFF NACION 22 de Abril 2 pm	Ing. Brayan Camilo Criado Sanjuán Dirección Territorial Ocaña
23-abr-21	34031	INFORME SEMANAL No. 22 - CTO INTERVENTORÍA 1278 2020	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano INVIAS
24-abr-21		OFICIO EL TARRA	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea
26-abr-21		solicito un informe sencillo en relación a los porcentajes de ejecución y fecha de terminación, incluida posibles prorrogas.	Ing. Oscar Javier Villarreal N. coordinador Zona Centro Oriente
27-abr-21		CUADRO SIRECI ABRIL, PARA DILIGENCIAR	Ing. Wilmar Rangel Ropero Subdirección de Red Terciaria y Férrea

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.

	
Excavación de zanjas para vigas Riostras e inclusión del acero en tramo 1 K0+890-K1+025	Armado de acero y formaleta para huellas en tramo 1 K0+890-K1+025
	
Fundición de sobreancho izquierdo y 27ml de sobreancho derecho en tramo 1 K0+890-K1+025	Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 1 K0+890-K1+025
	
Fundición de centro en piedra pegada en tramo 1 K0+890-K1+025	Construcción de placa huella tramo #1

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de formaleta para huellas en tramo 2 K3+430-K3+520	Fundición de huella izquierda en tramo 2 K3+430-K3+520
	
Aplicación de Antisol en huella en tramo 2 K3+430-K3+520	
	
Fundición de huella izquierda en tramo 2 K4+430-K4+520	Fundición de huellas en tramo 2 K3+430-K3+520

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950




Construcción de placa huella




Construcción de placa huella tramo #2



Construcción de placa huella tramo #2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950





Fundición de huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Amarre de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de sobre ancho derecho en piedra pegada en tramo 3 K4+020-K4+180





Fundición de huellas derecha en tramo 3 K4+020-K4+180.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundición de huellas en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de centro en concreto ciclópeo en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Armado de encofrado para sobreancho derecho en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de sobreancho izquierdo en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Fundición de centro en piedra pegada en ancho 0,45 x 0,15 espesor en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de centro en piedra pegada en ancho 0,90 x 0,15 espesor en tramo 3 K4+020-K4+180

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundición de sobreancho derecho en tramo 3 K4+020-K4+180	Excavación de zanja para base de bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de sobreancho izquierdo en piedra pegada en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Armado de acero para bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180	Adecuación y relleno de vacíos en la parte posterior de bordillos en tramo 3 K4+020-K4+180

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de parrilla en acero para acceso de placa huella, 5m x 1,5m en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de rampa de acceso 5m x 1,5m para placa huella en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Fundición de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180	Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180
	
Fundición de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950




Armado de acero y formaleta para huella en tramo 4 K7+100-K7+280




Fundición de huella derecha en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de huella en el tramo 4 K7+100-K7+280

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundición de huella en el tramo 4 K7+100-K7+280	Formaleteo para fundición de sobre ancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Excavación de zanjas para viga riostra en tramo 4 K7+100-K7+280	Fundición de sobreancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Corte, armado y figurado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280	Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Armado de encofrado para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280	Fundición de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Fundición de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280	Fundición de centro en piedra pegada en tramo 4 K4+020-K4+180
	
Fundición de centro en piedra pegada en tramo 4 K4+020-K4+180	Fundición de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Fundida de rampa de acceso a placa huella con dimensiones 5.50m largo y 1.50m ancho	Fundición de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
	
Armado de acero para cuneta bordillo en tramo 4 K4+020-K4+180	Fundición de sobreancho izquierdo en tramo 4
	
Construcción de placa huella tramo # 4	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **STA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. 06 **MES O PERIODO:** ABRIL/2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas		X		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		
5.5	Información otros programas y aplicativos		X		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** ABRIL DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: LC-001-CO-001-2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

PLAZO INICIAL:	5 MESES	PLAZO ACUMULADO:	6.53 (MESES)
FECHA DE INICIACION:	30 NOVIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:			
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.052.503.912,93	VALOR ADICIÓNALES:	$ 25.583.121,00
VALOR ACUMULADO:	$ 1.078.087.033,93	AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA 8423571017 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción de placa huella	ML	565
Alcantarillas	UND	6
Actividades de mantenimiento periodico	ML	565
Caracterización	KM	9,3

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Construcción de placa huella	ML	415
Alcantarillas	UND	6
Actividades de mantenimiento periodico	ML	565
Caracterización	KM	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 270.587.217,30	$ 287.600.458,75		$ 287.600.458,75	1,06	$ 138.690.431,00	1	0,482
Acumulado:	$ 712.669.221,62	$ 860.645.450,76		$ 860.645.450,76	1,21	$ 580.589.489,00	1	0,675

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2021	$ 1.052.503.912,93
2021	$ 25.583.121,00
Total	$ 1.078.087.033,93

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado.	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,7983	5,00	0,8	0	$ 217.441.583,17	1,53	339.834.691	222.114.177
Interventor:	0,6884	5,00	0,7	0	$ 262.781.528,00	2	262.781.528	131.390.764

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.382.739,25
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 10.382.739,25
VALOR TOTAL	$ 20.765.478,50

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	30/11/2020	9/11/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30/11/2020	10/07/2024
Calidad del Servicio	30/11/2020	15/01/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	5/11/2020	15/06/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 29/04/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A la fecha el contrato de obra no presenta multas ni sanciones.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

No se recomienda ninguna otra accion que seguir con lo programado.

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021 **CONTRATO No.** LC-001-CO-001-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MEZCLADORA 1	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
MEZCLADORA 2	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VIBRADOR A GASOLINA	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VIBRADOR ELÉCTRICO	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
MEZCLADORA 3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
MEZCLADORA 4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-331774 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ABRIL DE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** LC-001-CO-001-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUIS CARLOS VILA	DIRECTOR DE OBRA					X								X			X			X		X		X					X			
LEIDON SEPULVEDA	INGENIERO AUXILIAR									X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	
JESÚS RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
GUBER CARVAJALINO	OFICIAL DE OBRA					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
RUBEN MONTEJO	OFICIAL DE OBRA					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
NAYID ORTIZ	OFICIAL DE OBRA					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
JHON A. MENESES G	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
DIONEL ALVAREZ P	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
CARLOS GRANADOS	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ELKIN ARLEY CONTRERAS	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
JOSE DEL CARMEN TORO	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
LUSIANI CARRASCAL ASCANIO	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
CRISTIAN E ARDILA	OBRERO					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
JUAN OMAR HERNANDEZ	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ALIRIO ANGARITA	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
JHON A. ANGARITA	OBRERO					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-331774 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	11061	MEJORAMIENTO,Y MANTENIMIENTODEL CORREDORPRODUCTIVO MIRACOTES-LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE		NACION	LC-001-CO-001-2020	$ 1.078.087.033,93
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.078.087.033,93

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	ACTA DE COBRO No.1	mar-21	$ 505.895.178,29	$ 1.972.720,46	$ 507.867.898,75				$ 507.867.898,75	$ 570.219.135,18		X		
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 505.895.178,29	$ 1.972.720,46	$ 507.867.898,75
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.382.739,25	19%	$ 12.355.459,71
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL			$ 520.223.358,46

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	18	18	24	24	24		21	24	22	24	24	24		24	24	24	24	24	24	0	24	17	12	24	24		612
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0		5
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0		31
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: MARYORY [illegible] CASTRO VASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-331774 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																												EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
LUIS CARLOS VILA	DIRECTOR DE OBRA	MARZO/2021	30	88.141.440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9418737962	30	SURA	9418737962	30	9418737962	30	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL	VER NOTA
ALVAREZ DIONEL	AYUDANTE DE OBRA		30	1.005.018.012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
ANGARITA ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA		16	5.519.284															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		16			16		16		
ARDILA CRISTIAN	AYUDANTE DE OBRA		16	1.007.354.327															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		16			16		16		
CARRASCAL LUSTANY	AYUDANTE DE OBRA		19	5.519.380												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19			19		19		
CARVAJALINO GUBER	OFICIAL DE OBRA		30	5.519.587	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
DIAZ YEFREY	AYUDANTE DE OBRA		19	1.007.279.834												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19			19		19		
GRANADOS CARLOS	AYUDANTE DE OBRA		16	5.519.229															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		16			16		16		
HERNANDEZ JUAN	AYUDANTE DE OBRA		30	1.004.825.222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
MENESES JHON	AYUDANTE DE OBRA		19	1.091.162.344												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19			19		19		
MONTEJO RUBEN	OFICIAL DE OBRA		30	1.091.162.427	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
ORTIZ JESUS	OFICIAL DE OBRA		16	13.279.169															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		16			16		16		
OVALLOS ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA		3	1.091.163.351																											X	X		3			3		3		
OVALLOS GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA		19	5.519.452												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19			19		19		
OVALLOS LUIS	AYUDANTE DE OBRA		19	5.519.204												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19			19		19		
OVALLOS YEISON	AYUDANTE DE OBRA		19	1.004.825.381												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19			19		19		
RODRIGUEZ JESUS	AYUDANTE DE OBRA		30	13.176.096	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
SEPULVEDA LEIDON	ING. AUX RESIDENTE		30	1.091.678.091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
TORO JOSE	AYUDANTE DE OBRA		30	1.004.825.573	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
TORRADO RAFAEL	ING. RESIDENTE		30	88.140.626	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		

NOTA: SE VERIFICA QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRA ACTIVO EN AFILIACIONES CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PERIODO Y SE DILIGENCIA EL FORMATO CON LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE PLAZO DE REALIZAR EL PAGO HASTA EL MES SIGUIENTE.

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) / 4 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 1,00 **PERIODO MES:** ABRIL DE 2021 **VALOR BÁSICO ACTA: $** 505.895.178,29

CONTRATO DE OBRA No : LC-001-CO-001-2020
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 6.53 (MESES)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
FECHA DE INICIACIÓN: 30 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE JUNIO DE2021

SECTOR: MUNICIPIO DE TEORAMA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.052.503.912,93
VALOR ADICIONALES: $ 25.583.121,00

RUTA
VALOR ACUMULADO: $ 1.078.087.033,93
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: MIRACOTES - LOS RANCHOS
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LC-001-CO-001-2020	6.53 (MESES)	29/04/2021	$ 1.052.503.912,93	$ 1.052.503.912,93

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	$ 1.078.087.033,93
Total	$ 1.078.087.033,93

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278	7 MESES	30-jun-21	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 270.587.217,30	############		$ 287.600.458,75	1,06	$ 138.690.431,00	1	0,482
Acumulado:	$ 712.669.221,62	############		$ 860.645.450,76	1,21	$ 580.589.489,00	1	0,675

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,7983	5,00	0,765696784	0	$ 217.441.583,17	1,53	339.834.691	$ 222.114.177,33
Interventor:	0,6884	5,00	0,714285714	0	$ 262.781.528,00	2	262.781.528	$ 131.390.764,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.382.739,25
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA DE ELABORACIÓN	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA (565 ML)																	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (6 UND)																	
TRANSPORTES																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO																	
CARACTERIZACION VIAL																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE JUNIO DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93

VALOR ACUMULADO: $ 1.078.087.033,93 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.355.459,73

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.355.459,73

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 105.250.391,20	5	11	2020	5	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 52.625.195,60	5	11	2020	5	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 105.250.391,20	5 AÑOS			Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000072639

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	5	11	2020	5	4	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400-74-994000018160 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 107.808.703,30	30	11	2020	9	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 53.904.351,65	30	11	2020	10	7	2024
Calidad del Servicio		$ 5.779.138,00	30	11	2020	15	1	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 107.808.703,30	30	11	2020	30	11	25

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000072639

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	30	4	2021	15	6	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400-74-994000018160 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2021, ANEXO:2

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-CO-001-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 DE JUNIO DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1278 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI : X NO: ____ APROBADO: SI: X NO: ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 11/11/2020

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI: NO: X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI: NO: X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES: En el presente periodo no se presentaron auditorias de calidad

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI: NO: X APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI: NO: ____

OBSERVACIONES: En el presente periodo no se reportaron ensayos de laboratorios

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: En el presente no se presentaron no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES: No se presentó quejas y reclamos en el presente periodo

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: En el presente no se realizó calibración de equipos, inspección, medición o ensayos

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No.: 54202086216

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202 03281 STD

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	8 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 20 (Numeración consecutiva) del 2/04/2021 al 8/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — IA DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0.565 — No. PUENTES: — OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND. DISIPADOR 1 UND. CONFORMACION 9.30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL				
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGENIEROS S.A.S (20%)				
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -		
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1279 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -		
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 937.044.233,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA IB1	$ 391.952.457,18
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.382.739,25
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.339.379.430,50

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI — NO X

MES FACTURADO: — FECHA FACTURA: —

VALOR FACTURA: —

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO $ 307.037.452,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI X — NO

MES FACTURADO: FEBRERO/2021


VALOR FACTURA: $ 140.864.194,00 — FECHA FACTURA: 25/03/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)					100%
KM CON CONFORMACION (Km)					100%
KM MANTENIDOS (Km)					100%
KM BASE/SUBBASE (Km)					100%
KM PAVIMENTADOS (Km)					
PLACA HUELLA (Mt)			50	80	45%
ALCANTARILLAS (UND)	1	1	1	4	100%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfaltico					
Planta de trituracion:					
Motoniveladoras:					
Retrocargadores:					
Vibrocompactadores (tipo rana):					1
Volquetas:					
Retrocargadores:					
Pulidora:					1
Plan electrica:					1
Mezcladoras			1	1	2
Vibro electico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes — TRAMO Y/O SECTOR 2: Jabonerias — TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos — TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: PLANTA DE OCAÑA — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL SI X NO

UBICACION: N/A — PERMISO MINERO: SI — NO X — LICENCIA AMBIENTAL SI — NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI —	NO —	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI —	NO —	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI —	NO —	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI —	NO —	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI —	NO —	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI —	NO —	N/A	X
EMISIONES:	SI —	NO —	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI —	NO —	N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGAGO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALIOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:
SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Elaboración del informe semanal No.20 y el informe mensual correspondiente al mes de marzo del municipio de Teorama
Se realizan actividades de armado de acero y formaletico para huella en tramo 4 K7+100-K7+280, Fundición de 12ml de huella derecha en tramo 4
Fundición de 45ml de huellas en tramo 3, abscr. K4+020-K4+180
Se relizan actividades de construccion de disipador armado de acero para disipador K0+970
Amarre de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180
Fundición de 33ml de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280
Se realiza Visita tecnica por parte del equipo de la interventoria se toman medidas de placa huella tramo 3 - 4 y cada una de las alcantarillas, con el fin de calcular las cantidades de obra.
Fundición de 15ml de huella izquierda en tramo 3 K4+020-K4+180
Armado de encofrado para fundición de escalas en disipador K0+870
Para la presente semana se obtiene un porcentaje ejecutado del 7,81% para una inversión de $ 82.200.555,60 frente un porcentaje programada del 5,34% para una inversion $ 56.203.708,95 (iva incluido)
Se obtiene un porcentaje ejecutado acumulado del 37,24% para una inversión de $ 391.952.457,18 frente un porcentaje programada acumulada del 89,03% para una inversion $ 937.044.233,68 (iva incluido)
Se realiza excavación de zanjas para viga riostra, fundición de 24ml de huella y formaletes para fundición de sobre ancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280.
Fundición de 2ml de sobre ancho derecho en pecho pegada, Fundición de 42ml de huellas, 21ml izquierda y 21ml derecha en tramo 3 K4+020-K4+180.
Se continua con el seguimiento por parte del ing. Inspector de la interventoria diariamente en obra
INVIAS radica designacion de gestor de proyectos de convenio y/o contrato no. 1278 de interventoria, con numero de radicado DO 10558
INVIAS emite radicado SRT 15684, con Asunto: Primer aviso, incumplimiento, contratacion Mantenimiento Rutinario Convenio 2561-2018
Se radica Informe 7 trimestral para el contrato de Interventoria No. 1278 de 2020, el cual se radica a la Subdirección de Medio Ambiente, periodo comprendido del 24 de noviembre de 2020 al 24 de febrero de 2021.
Armado de acero para huellas y Fundicion de 33ml de sobreancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280
Fundición de 21ml de centro en concreto ciclopeo y Fundición de 42ml de huellas en tramo 3 K4+020-K4+180
Armado de encofrado para escalas en disipador K0+870

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividades ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en ejecución del mes de marzo del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva
revision por los supervisores y gestor tecnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de desempeñar las funciones de su
cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos tecnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras, viales Colombia Rural. Seguimiento
protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acuerdo del personal profesional sino de la interventoría. Realizar seguimiento a la programación de obra y el plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratista para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma, seguimiento a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa
emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que dentra el contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comités tecnicos
semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS — CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de acero y formaleteo para huella en tramo 4 K7+100-K7+280





Fundición de 12ml de huella derecha en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 12ml de huella derecha en tramo 4 K7+100-K7+280





Fundición de 45ml de huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para disipador K0+970



Amarre de acero para huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 33ml de huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Visita tecnica por parte del equipo de la interventoria



Fundición de 15ml de huella izquierda en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de encofrado para fundición de escalas en disipador K0+870



Fundición de 24ml de huella en el tramo 4 K7+100-K7+280





Formaleteo para fundición de sobre ancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280



Excavación de zanjas para viga riostra en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundicion de 24ml de sobre ancho derecho en piedra pegada en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 42ml de huellas, 21ml izquierda y 21ml derecha en tramo 3 K4+020-K4+180.



Fundición de 42ml de huellas, 21ml izquierda y 21ml derecha en tramo 3 K4+020-K4+180.



Fundición de 42ml de huellas en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundicion de 33ml de sobreancho izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 21ml de centro en concreto ciclopeo en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de encofrado para escalas en disipador K0+870

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se esten destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

T. P: 66202-22261 STO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 15 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 21 (Numeración consecutiva) del 9/04/2021 al 15/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,565 | No. PUENTES: | OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND, DISIPADOR 1 UND, CONFORMACION 9,30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
INTEGRANTES: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGENIEROS S.A.S (20%)
CONTRATO No. LC-001-CO-001-2020 | VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES | VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1278 DE 2020 | VALOR INICIAL: $ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES | VALOR ACUMULADO: $ 843.371.017,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1.049.451.651,58
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 700.336.103,66
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 10.382.739,25
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.760.170.495,18

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI X | NO
MES FACTURADO: 30 NOV 2020-18 MARZO 2021
VALOR FACTURA: $ 507.867.898,75 | FECHA FACTURA: 18/03/2021
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 307.037.452,00


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI X | NO
MES FACTURADO: FEBRERO/2021
VALOR FACTURA: $ 140.864.194,00 | FECHA FACTURA: 25/03/2021
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):					100%
KM CON CONFORMACION (Km):					100%
KM MANTENIDOS (Km):					100%
KM BASE/SUBBASE (Km):					100%
KM PAVIMENTADOS (Km):					100%
PLACA HUELLA (M):			100	60	30%
ALCANTARILLAS (UND):	1	1	1	4	100%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					
Planta de trituracion:					
Motoniveladoras:					
Retrocargadores:					
Vibrocompactadores (tipo rana):					1
Volquetas:					
Retroexcavadora:					
Pulidora:					1
Plan electrica:					1
Mezcladoras			1	1	2
Vibro electrico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes | TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras | TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos | TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: PLANTA DE OCAÑA — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL SI X NO
UBICACION: N/A — PERMISO MINERO: SI NO X — LICENCIA AMBIENTAL SI NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 22
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN VISITAS TÉCNICA POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Elaboración del informe semanal No.21 y el informe mensual correspondiente al mes de abril del municipio de Teorama
Armado de encofrado para huellas, fundición de 42ml de centro en piedra pegada y fundición de 60ml de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
Armado de encofrado para sobreancho derecho en tramo 3 K4+020-K4+180
Fundición de 30ml de huellas derecha e izquierda, 60ml de base para bordillo, Fundición de losa de aproximación en placa huella y Fundición de 42ml de sobre ancho derecho en piedrapegada en tramo 4 K7+100-K7+280.
Fundida de rampa de acceso a placa huella con dimensiones 5.50m largo y 1.50m ancho
El contratista de obra radica acta de costos No.1 del contrato de obra $ 507.867.898,75, durante el perido comprendido entre 30 NOV 2020-18 MARZO 2021.
El ing. Inspector de la interventoria continua realizando seguimiento diario en las actividades en ejecucion del contrato de obra.
Fundición de 9ml de cuneta bordillo y Formaletreo de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
Fundición de 42ml de sobreancho izquierdo en tramo 3 K4+020-K4+180
Armado de formaleta para disipador de energia K0+870
El dia lunes 12 de abril se suspenden actividades en horas de la tarde debido a fuertes y prolongadas lluvias.
Fundición de zarpa y muros pantalla laterales en disipador de energia K0+870
Fundición de 24ml de centro en piedra pegada en ancho 0,45 x 0,15 espesor en tramo 3 K4+020-K4+180
Fundición de 12ml de centro en piedra pegada en ancho 0,90 x 0,15 espesor en tramo 3 K4+020-K4+180
Fundición de 24ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
Se retira solicitud al contratista de obra de produccion e instalación en obra de valla informativa aprobada por el Ministerio de Transporte.
Fundición de 15ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
Excavación de zanjas para riostras en tramo 4 K7+100-K7+280
Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280
Armado de encofrado para cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280
Fundición de 33ml de centro en piedra pegada en el tramo 3 K4+020-K4+180
Para la presente semana se obtiene un porcentaje ejecutado del 5,50% para una inversión de $ 57.887.715,21 frente un porcentaje programada del 5,34% para una inversion $ 56.203.708,95 (Iva Incluido)
Se obtiene un porcentaje ejecutado acumulado del 66,54% para una inversión de $ 700.336.103,66 frente un porcentaje programada acumulada del 99,71% para una inversion $ 1.049.451.651,58 (Iva Incluido)
Se encuentra en aprobacion acta modificatoria de interventoria, para posteriormente definir valor en acta de costos No.5 correspondiente al mes de marzo 2021. INVIAS radica aprobación de poliza de la interventoria hasta el 30 de junio de 2021.
Fundición de 24ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280, Fundición de 15ml de sobreancho derecho en tramo 3 K4+020-K4+180

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficios y correspondencia la documentación necesaria (programación ajustada, avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, entre otros) al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividades ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en ejecución del mes de marzo del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva
revision por los supervisores y vestor tecnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoria, con el fin de desarrollar las funciones de su
cargo (supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos tecnicos establecidas en la cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales Colombia Rural. Seguimiento
protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acargo del personal profesional siso de la interventoria. Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra.
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma, seguimiento a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Seguimiento y apoyo a la entidad contratante para la implementación del programa
emprendedores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que deriva el contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comites tecnicos
semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor tecnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de encofrado para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 60ml de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 60ml de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de encofrado para sobreancho derecho en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 42ml de centro en piedra pegada en tramo 4 K4+020-K4+180



Fundición de 42ml de centro en piedra pegada en tramo 4 K4+020-K4+180



Fundición de 30ml de huellas derecha e izquierda en tramo 4 K7+100-K7+280.





Fundición de 60ml de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundida de rampa de acceso a placa huella con dimensiones 5.50m largo y 1.50m ancho



Fundición de 42ml de sobre ancho derecho en piedrapegada



Fundición de 9ml de cuneta bordillo en tramo 4 k7+100-k7+280



Fundición de 9ml de cuneta bordillo en tramo 4 k7+100-k7+280



Formaleteo de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 42ml de sobreancho izquierdo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 42ml de sobreancho izquierdo en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de formaleta para disipador de energia K0+870



Fuertes lluvias en la zona a partir de las 2:30pm hasta las 4:00pm



Fundición de 24ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280





Fundición de 24ml de centro en piedra pegada en ancho 0,45 x 0,15 espesor en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 12ml de centro en piedra pegada en ancho 0,90 x 0,15 espesor en tramo 3 K4+020-K4+180





Fundición de zarpa y muros pantalla laterales en disipador de energia K0+870



Fundición de 15ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Excavación de zanjas para riostras en tramo 4 K7+100-K7+280



Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 33ml de centro en piedra pegada en el tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 24ml de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 15ml de sobreancho derecho en tramo 3 K4+020-K4+180

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se estan destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.	FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS T. P 68202 05281 STD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO		MANUAL-MN-IN-GUI-PR-2	
VERSIÓN		1	
Periodo	1	de	1
FECHA:	22	4	2021
	Día	Mes	Año

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 22 del 16/04/2021 al 22/04/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — # DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0.565 — No. PUENTES: — OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND. DISIPADOR 1 UND. CONFORMACION 0.30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
INTEGRANTES: 1 LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (50%) - A & E INGENIEROS S.A.S (50%)
CONTRATO No.: LC-001-CO-001-2020 — VALOR INICIAL: $ 1.052.939.912,81 — VALOR ACTUAL: $ 1.052.939.912,81
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES — ADICIONES: $ - — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES — VALOR ACUMULADO: $ 1.052.939.912,81 — VALOR ACUMULADO: $ 1.052.939.912,81

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS
INTEGRANTES: 1
CONTRATO No.: 1278 DE 2020 — VALOR INICIAL: $ 443.373.017,96
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES — VALOR ACUMULADO: $ 443.373.017,96

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.939.912,81	$ 1.052.939.912,81	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.052.954.145,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.052.939.912,81
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($):	$ 772.643.122,68
AVANCE DE OBRA EN % (E/A):	73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 10.282.739,26
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.305.635.005,81

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI: — NO: X
MES FACTURADO: MONDY 2020-18 MARZO, 2021 — FECHA FACTURA: 18/03/2021
VALOR FACTURA: $ 307.867.866,76
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $

"En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite"

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 307.697.492,00


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI: X — NO:
MES FACTURADO: FEBRERO/2021
VALOR FACTURA: $ 140.864.198,00 — FECHA FACTURA: 25/03/2021
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $

"En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite"

III. AVANCE FISICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTORES	1	2	3	4	TOTAL
PRELIMINARES Y OBRAS DE ART.					100%
EXCAVACIÓN CONFORMACIÓN (E/A)					100%
PAVIMENTO RÍGIDO (E/A)					100%
SEÑALIZACIÓN VIAL (E/A)					100%
PAVIMENTO RÍGIDO (E/A)					
ML CUNETAS (E/A)	85	120	120	45	45%
ML CAN ARRLLAN (E/A)	1	1	1	1	100%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTORES	1	2	3	4	TOTAL
Pisón de retroceso manual					
Planta de trituración					
Retroexcavadora					
Motoniveladora					
Retrocargadora (tipo oruga)					1
Volqueta					
Vibrador motores					
Rodillos					1
Compactadora					1
Herramientas	2		2	2	6
Otros mecanico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes — TRAMO Y/O SECTOR 2: Jobomeras — TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos — TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PLANTA DE OCAÑA — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	NA	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	X
EMISIONES:	SI	NO	NA	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 22
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 17A No. 11a-18, OCAÑA

OBSERVACIONES:
SE REALIZA SEGUIMIENTO DIARIO POR PARTE DEL ING INSPECTOR DE INTERVENTORIA, DONDE SE REALIZA REVISION DEL AVANCE DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA / VISITAS TECNICAS POR PARTE DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Aclaración del informe semanal No.22 y el informe mensual correspondiente al mes de abril del municipio de Teorama
Fundición de losa de cuneta bordillo en tramo 4 K7+000 A 7+080
Excavación de zanja para base de bordillo y Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180
Fundición de losa de sobrancho izquierdo en piedra pegada en tramo 3 K4+520-K4+180
Encofrado, fundida y Desencofrado de muros pantalla en entrada de disipador K0+879
Fundición de 2d del bordillo derecho en tramo 4 K7+280-K7+360
Desencofrado y limpieza de disipador K0+870
Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180
Excavación de zanja para base de bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180
Armado de acero y red.sección de losa para huellas en tramo 2 K4+760-K4+180
Fundición de losa de huella derecha en concreto reforzado en tramo 4 K7+000-K7+080
Fundición de losa de huella izquierda en tramo 4 K7+000-K7+080
Excavación de zanja para apy.bases de tramo 2 K3+520-K3+520
Armado de acero para huellas y bordillos en tramo 4 K7+160-K7+280
Fundición de losa de cuneta bordillo izq. sec. servicios en tramo 2 K4+520-K4+180
Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+160-K7+280
Se realiza visita técnica por parte del interventoria en tramo vias a intervenir se sugerimos que se ejecute conjuntamente el sistema construccion de la plaza huella
Armado de formaleta para fundición de cuneta bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180
Fundición de losa de cuneta bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180, Armado de parrilla en acero para acceso de plaza huella, Sin x 1,3m en tramo 2 K4+520-K4+180
Fundición de losa de huella derecha en tramo 4 K7+160-K7+280
Fundición de losa de huella izquierda en tramo 4 K7+160-K7+280
Armado de formaleta para huellas en tramo 2 K3+520-K3+520
Fundición de losa de huella derecha en el tramo 2 K3+520-K3+520
Se realiza seguimiento diario en la ejecución de las actividades de obra por parte del ing. Inspector de la intervención.
El contratista de obra radica planilla pagada de seguridad social y beneficiarios del personal de obra y adjunta relacion de personal.
El contratista de obra radica los soportes documentos (hoja de seguridad, inspección de obra, informe diario/ats, Planos, presentación y otros de avance del diseño de obra(apy), especios de GANTT, mas de constancias, Hub de vias, Programación actualizada con soporte de cronicas y tiempo contractual.
Para la presente semana se obtiene un porcentaje ejecutado del 6,87% para una inversión de $ 72.337.018,32 frente un porcentaje programada del 0,3% para una inversión $ 3.157.919,76 (No incluido)
Se realiza visita técnica por parte del interventoria en tramo vias a intervenir se sugerimos que se ejecute conjuntamente el sistema construccion de la plaza huella
Fundición de losa de cuneta bordillo en tramo 2 K3+520-K3+520, Armado de acero para huellas y bordillos en tramo 2 K3+520-K3+520

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar ver medio de oficios y comprometiéndose a dar presentación reiterando, programación ajustada, suponer de informes, relación de personal, certificados de matrículas, seres cercal, el contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a los actividades.
Solicitar informes cada semana, verificando correspondientes a las actividades ejecutadas, por parte de maestro del año 2021, Actualización personal del utilizador PETX - INVIAL para su respectiva.
revisión por los supervisores y gestor técnico del contrato, evalúe el estado actual de las compras, Asistencia in sitio de ejecución del proyecto por parte del ingeniero residente e inspector del equipo de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento las funciones de su
cargo supervisión y revisión de la ejecución de actividades y avance del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos técnicos establecidos en la cartilla de obras menores de tercer y manual rural Colombia Rural, Seguimiento
posición de licorosidad del estadístico para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acuerdo del personal profesional bajo de la intervención, Realizar seguimiento a la programación de obra y el plan de inversión de los recursos del contrato de obra,
Seguimiento a las actividades y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada vinculados para la ejecución del proyecto, Adicional, verificar que la empresa de suministro y el uso de la misma cumplan con la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Seguimiento y acceso a la entidad contratante para la implementación del programa
aprovechadores rurales, de conformidad con lo establecido dentro del contrato interadministrativo que forma el contrato de obra, Seguimiento y control de la conformación de la empresa o cooperativa para el proyecto, Reporte de cambios de personal
especialista/mensualidad, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de adoptar temas relacionados con el ambiente y socializar las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO AL CIERRE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS — CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

PR 0+000 PR 0+660 PR 1+025 PR 3+430 PR 3+520 PR 4+000 PR 6+180 PR 7+100 PR 7+260

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Excavación de zanja para base de bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180


Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+520-K4+180


Fundición de losa de sobrancho izquierdo en piedra pegada en tramo 3 K4+520-K4+180


Fundición de 2da losa de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280




Encofrado y dundida de muros pantalla en entrada de disipador K0+879


Desencofrado de disipador K0+870




Fundición de base para bordillo en tramo 2 K4+520-K4+180



Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180





Fundición de 15 ml de huella derecha en tramo 4 K7+150-K7+280



Excavación de zanjas para base de bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180





Desencofrado y limpieza de disipador K4+070



Armado de acero y excavación de riostras para huellas en tramo 2 K4+760-K4+180



Fundición de 15ml de huella derecha en concreto reforzado en tramo 4 K7+150-K7+280



Armado de formaleta para cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para huellas en tramo 4 K7+150-K7+280



Excavación de zanjas para viga riostra en tramo 2 K3+020-K3+120



Fundición de 18ml de cuneta bordillo 8ml izq, 8ml derecha en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para bordillo en tramo 4 K7+150-K7+280



Armado de formaleta para fundición de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 27ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180





Fundición de 26ml de huella derecha en tramo 4 K7+150-K7+280



Fundición de 26ml de huella derecha en tramo 4 K7+150-K7+280



Armado de acero para cuneta bordillo en tramo 4 K4+020-K4+180



Armado de formaleta para huellas en tramo 3 K3+030-K3+120



Fundición de 32ml de huella derecha en el tramo 2 K3+020-K3+120



Instalacion de Valla informativa



Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 4 K7+150-K7+280



Armado de parrilla en acero para aceros de placa huella, 5m x 1,5m en tramo 3 K4+020-K4+180



Adecuación y relleno de vacios en la parte posterior de bordillos en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de acero para huellas e inclusión de vigas riostras en tramo 2 K3+030-K3+120

NOTA Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

EL DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma, seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se estén destinando para la ejecucion del proyecto, entre otros.	FIRMA NOMBRE MARCO ANTONIO SOLANO CORDERO C. P. 68282-355661 STD

Anulo - Dirección Publica con Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MAN-PIN-MN-IN-11-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	29 (DÍA)	4 (MES)	2021 (AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
SEMANA No.: 23 (Numeración consecutiva) del 23/04/2021 al 29/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
A DE INICIO: 30/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,565 | No. PUENTES: | OTROS: ALCANTARILLAS 5 UND. DISIPADOR 1 UND. CONFORMACION 9.30 KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.C.E INGENIEROS S.A.S (20%)
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020
VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,59
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5.0) MESES
VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,59

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	1276 DE 2020
VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES
VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ 1.052.503.913	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 717.545.148,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$40.003.372,90
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)	$ 10.383.736,25
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.562.931.262,08
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI: X NO:
MES FACTURADO:	30 NOV 2020-18 MARZO 2021
VALOR FACTURA:	$ 507.867.896,25
FECHA FACTURA:	19/03/2021
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIE NACION:	$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:	$ 307.027.452,00
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI: NO: X
MES FACTURADO:	FEBRERO/2021
VALOR FACTURA:	$ 140.964.194,00
FECHA FACTURA:	25/03/2021
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIE NACION:	$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	3	4	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)					100%
KM CON CONFORMACION (Km):					100%
KM MANTENIDOS (Km):					100%
KM BASE/SUBBASE (Km)					100%
KM PAVIMENTADOS (Km)					100%
PLACA HUELLA (M)	25	50	160	180	73%
ALCANTARILLAS (UND)	1	1	1	4	100%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Planta de concreto asfáltico					
Planta de trituración:					
Motoniveladoras:					
Retrocargadores:					
Vibrocompactadores (tipo rana)					1
Volquetas:					
Retroexcavadora:					
Pulidora:					1
Plan electrica:					1
Mezcladoras					1
Vibro electrico					1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Miracotes | TRAMO Y/O SECTOR 2: Jaboneras | TRAMO Y/O SECTOR 3: Los ranchos | TRAMO Y/O SECTOR 4: Los ranchos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PLANTA DE OCAÑA — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTA: SI X NO

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI NO X — LICENCIA AMBIENTA: SI NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite de asignación zona de deposito.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
OTROS:	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 37A No. 15a-18, OCAÑA

OBSERVACIONES:
SE REALIZA SEGUIMIENTO DIARIO POR PARTE DEL ING INSPECTOR DE INTERVENTORIA, DONDE SE REALIZA REVISION DEL AVANCE DIARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA / VISITAS TECNICAS POR PARTE DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No 23 y el informe mensual correspondiente al mes de abril del municipio de Teorama
Fundición de sobreancho izquierdo en tramo 4, Fundición de rampa de acceso 5m x 1,5m para placa huella, Fundición de 21ml de cuneta bordillo y bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180, Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 2 K3+430-K3+520
Aplicación de Antisol en huella en tramo 2 K3+430-K3+520 y tramo 3 K4+020-K4+180
Excavación de zanjas para vigas Riostras e inclusión del acero en tramo 1 K0+890-K1+025 y tramo 3 K4+020-K4+180
Fundida de huellas, piedra pegada, bordillo y cunetas tramo 1, 2 K4+430-K4+520 y tramo 3 K4+020-K4+180
Se finaliza proceso constructivo en tramo 4
Armado de acero y formaleta para huellas en tramo 1 K0+890-K1+025, tramo 2 K4+430-K4+520, y tramo 3 K4+020-K4+180
Durante los días lunes, martes, miercoles y jueves se presentan lluvias constantes en el tramo vial, dificultando la accesibilidad en los 4 tramos, lo que atrasa el avance de las actividades programadas de obra.
Se realiza visita tecnica por parte del equipo de la interventoria, se realiza revision del proceso constructivo de placa huella
Se realiza inactivacion de empresa para que el contrato de obra sea extendido hasta el 15 de junio de 2021
Se realiza seguimiento diario en las actividades de obra por parte del ing inspector de la interventoria, revision y supervision del proceso constructivo de placa huella
Para la presente semana se obtiene un porcentaje ejecutado del 6,50% para una inversión de $ 68.412.754,34 frente un porcentaje programada del 6,4% para una inversión $ 67.360.250,43 (Iva Incluido)
Se obtiene un porcentaje ejecutado acumulado del 79,81 % para una inversión de $ 840.003.372,9 frente un porcentaje programada acumulada del 67,71 % para una inversion $ 712.545.149,1 (Iva Incluido)
Interventoria radica, a la alcaldía municipal, aval de prorroga para la ampliacion del plazo del contrato de obra en ejecucion

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar por medio de oficio y correspondencia la documentación necesaria faltante para el avance de informes, relación de personal, certificados de materiales, antes otrosí al contratista de obra, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades.
Elaborar informes semanales, mensuales y ejecutivos correspondientes a las actividades ejecutadas por parte de interventoria para el contrato en ejecución, del mes de marzo del año 2021. Actualización semanal del aplicativo CIFRA – INVIAS, para su respectiva revision por los supervisores y gestor tecnico del contrato revise el estado actual de los contratos. Asistencia al sitio de ejecución del proyecto por parte del residente y residente del equipo de la interventoria, con el fin de desempeñar las funciones de su cargo, supervisión y ejecución de actividades y avance del proyecto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los lineamientos técnicos establecidos en la cartilla de obras menores de Invias y adicionales viales "Carretera Rural. Secundaria y terciaria" y protocolo de bioseguridad establecido para el proyecto presentado por los contratistas de obra, acarreo del personal profesional idoneo de la interventoria. Realizar seguimiento a la programación de obra y al plan de inversión de los recursos del contrato de obra. Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma, seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, implementación de los temas y los instrumentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Seguimiento y apoyo a la unidad contratada para la implementación del programa gerenciadores sociales, de conformidad con lo establecido dentro del convenio interadministrativo que dieron origen al contrato de obra. Seguimiento y control de la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. Desarrollo de comites tecnicos semanales/mensuales, con supervisor del contrato de interventoria y/o gestor técnico del contrato de interventoria, con el fin de abordar temas relacionados con el estado y avance las actividades de obra del municipio.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS — CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

PR 0+000 PR 0+890 PR 1+025 PR 3+430 PR 3+520 PR 4+020 PR 4+180 PR 7+100 PR 7+280

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de 39ml de sobreancho izquierdo en tramo 4





Fundición de rampa de acceso 5m x 1,5m para placa huella en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 21ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 2 K3+430-K3+520



Aplicación de Antisol en huella en tramo 2 K3+430-K3+520





Excavación de zanjas para vigas Riostras e inclusión del acero en tramo 1 K0+890-K1+025



Fundición de 18ml de huella izquierda en tramo 2 K4+430-K4+520



Armado de acero para cunetabordillo y fundición de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 21ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Excavación de zanjas para viga riostra en tramo 1 K0+890-K1+025



Armado de acero y formaleta para huellas en tramo 1 K0+890-K1+025



Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 2 K4+430-K4+520



Fundición de 24ml de huella izquierda en tramo 2 K4+430-K4+520



Fundición de 21ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Armado de formaleta para de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 21ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 18ml de cunetabordillo izquierdo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de base para bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 6ml de cunetabordillo en tramo 3 K4+020-K7+180



Fundición de base para bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 27ml de huella izquierda en tramo 2 K3+430-K3+520



Armado de formaleta para cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 18ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 18ml de cuneta bordillo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundicion de 21ml de huella izquierda en tramo 2 K3+430-K3+520



Fundición de 27ml de sobreancho izquierdo y 27ml de sobreancho derecho en tramo 1 K0+890-K1+025



Fundición de 27ml de sobreancho izquierdo y 27ml de sobreancho derecho en tramo 1 K0+890-K1+025



Fundida y armado de cuneta bordillo en tramo 4 K7+100-K7+280



Fundición de 18ml de cuneta bordillo izquierdo en tramo 3 K4+020-K4+180



Fundición de 21ml de centro en piedra pegada en tramo 2 K3+430-K3+520



Fundición de 32ml de huella en tramo 2 K3+430-K3+520



Fundición de 27ml de centro en piedra pegada en tramo 1 K0+890-K1+025



Excavación de zanjas para vigas riostras en tramo 1 K0+890-K1+025

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social y parafiscales del personal profesional y mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto. Adicional, verificación de la entrega de dotación y el uso de la misma; seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS, implementación de las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Aportes de seguridad y parafiscales, verificar que los recursos reales se estén destinando para la ejecución del proyecto, entre otros.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO ARANGAS

T. P


FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 0.00	$ 0.00	$ 1,077,962,738.93	$ 1,077,962,738.93

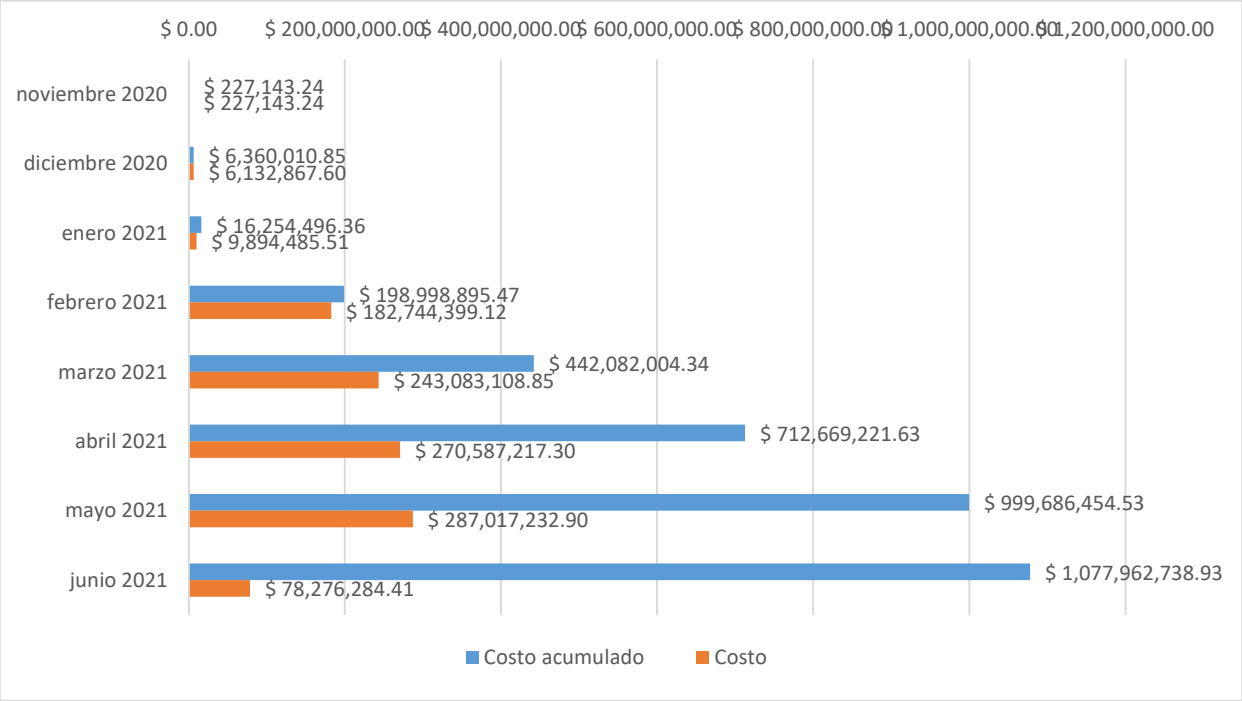


Nombre	Costo restante	Costo real	Costo
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	$ 882,219,051.86	$ 0.00	$ 882,219,051.86
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 76,505,913.30	$ 0.00	$ 76,505,913.30
item no contemplados	$ 53,579,181.39	$ 0.00	$ 53,579,181.39
Items adicionales	$ 25,458,826.00	$ 0.00	$ 25,458,826.00
Caracterización vial	$ 5,861,344.90	$ 0.00	$ 5,861,344.90
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS	$ 10,382,739.25	$ 0.00	$ 10,382,739.25
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,382,739.25	$ 0.00	$ 10,382,739.25
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3,086,375.98	$ 0.00	$ 3,086,375.98
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 10,486,567.00	$ 0.00	$ 10,486,567.00

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
0	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**	**170 días**	**lun 30/11/20**
1	**SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO**	**100 días**	**lun 15/02/21**
2	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS**	**92 días**	**lun 22/02/21**
3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	21 días	lun 22/02/21
4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	62 días	mar 23/03/21
5	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	60 días	lun 15/03/21
6	Sub - Base Granular clase C	10 días	mié 3/03/21
7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	62 días	mié 24/03/21
8	Sello de Juntas	15 días	sáb 22/05/21
9	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo	62 días	sáb 27/03/21
10	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (6) UND**	**18 días**	**lun 15/02/21**
11	Excavaciones Varias Sin Clasificar	5 días	lun 15/02/21
12	Concreto Resistencia 21MPa (D)	11 días	mar 23/02/21
13	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	7 días	mié 17/02/21
14	Rellenos Para Estructura con material de excavación	4 días	mié 3/03/21
15	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	0 días	
16	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	6 días	sáb 20/02/21
17	**TRANSPORTES**	**6 días**	**jue 18/03/21**

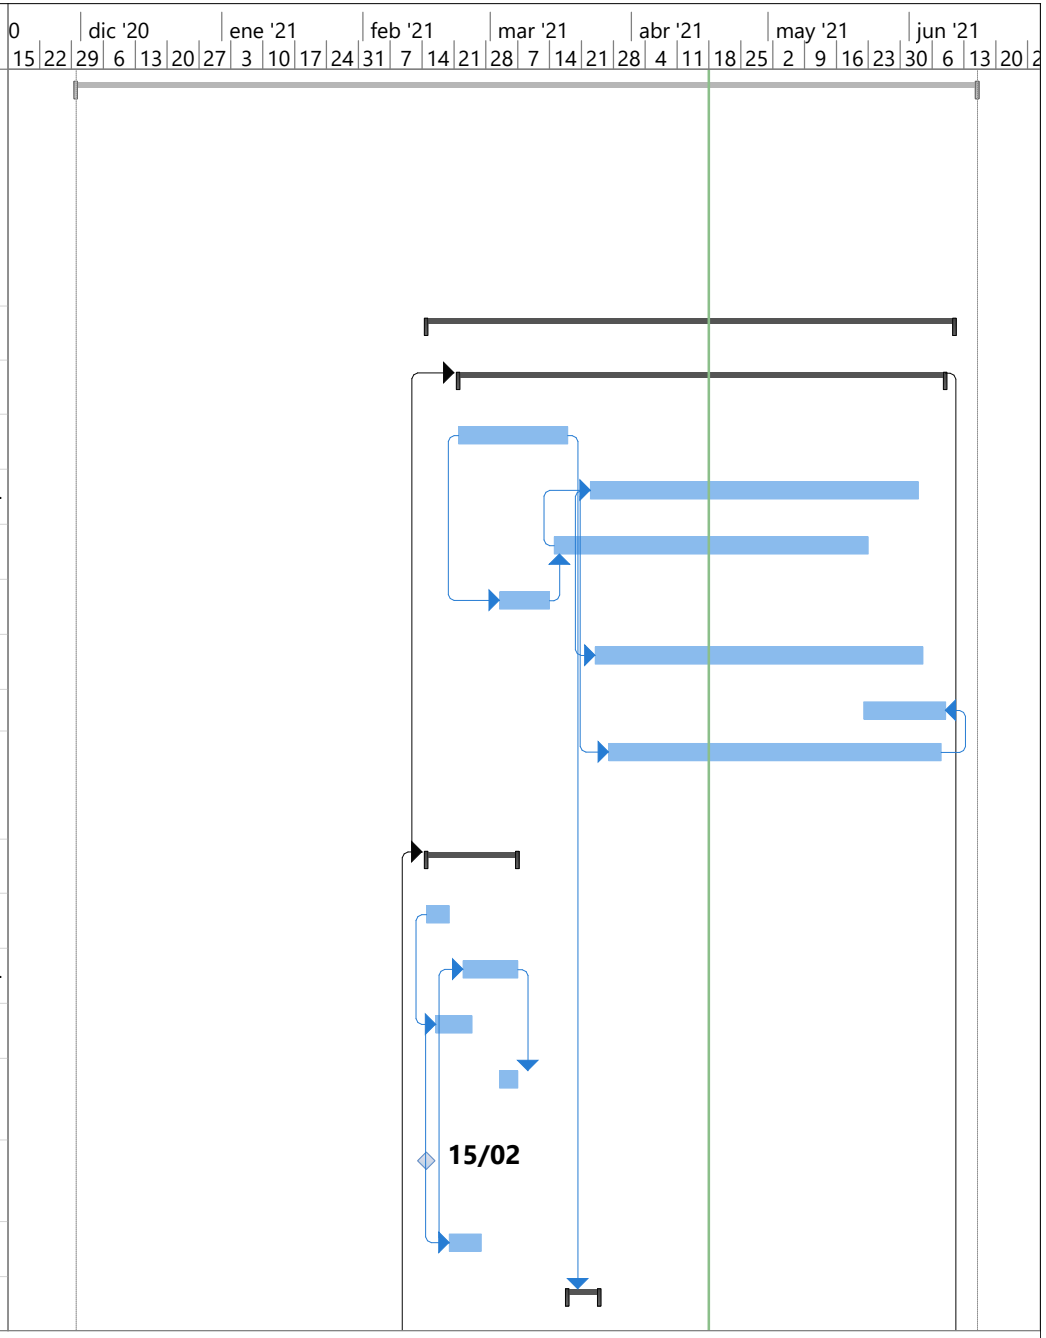

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
18	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	6 días	jue 18/03/21
19	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**2 días**	**mié 9/06/21**
20	Postes de referencia	2 días	mié 9/06/21
21	**SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO**	**21 días**	**jue 28/01/21**
25	**item no contemplados**	**7 días**	**sáb 20/02/21**
28	**Items adicionales**	**40 días**	**vie 30/04/21**
29	Excavaciones manual en material común	16 días	vie 30/04/21
30	Solado de limpieza	5 días	mié 19/05/21
31	Concreto de 21MPa para disipador	11 días	jue 3/06/21
32	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa para disipador	8 días	mar 25/05/21
33	Caracterización vial	8 días	vie 4/06/21
34	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS	80 días	jue 28/01/21
35	COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	51 días	lun 30/11/20
36	VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL	131 días	lun 30/11/20
37	PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	80 días	jue 28/01/21

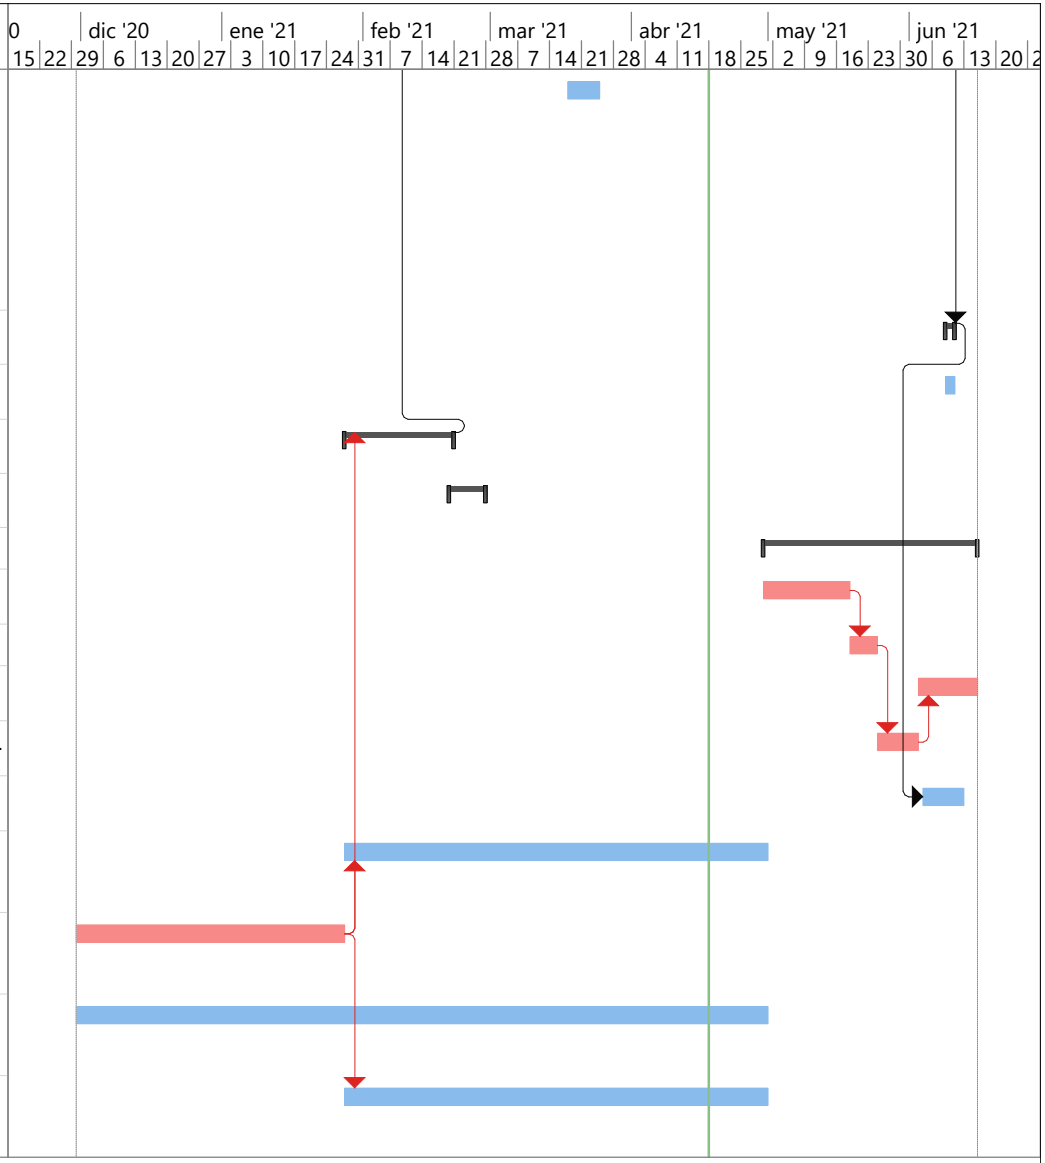

INFORME MENSUAL ABRIL 2021
COMPONENTE SST

CONTRATO No LC.001-CO-001-2020 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL - TEORAMA

INTERVENTOR:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

ELABORADO:

JORGE LEONARDO JARAMILLO FORERO

INSPECTOR SISO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6

PERIODO: DEL 1 ABRIL AL 31 DE ABRIL DE 2021

INTRODUCCION

En el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del área de seguridad industrial y salud ocupacional durante este periodo.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una actividad de múltiples disciplinas enfocada a promover y proteger la salud de los trabajadores por medio de la prevención de riesgos y enfermedades laborales.

Se considera riesgo a todas aquellas situaciones que dentro del trabajo que pueden ocasionar daño a quien la desempeñe, por lo anterior es de vital importancia tomar medidas para poder garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Tanto para el empleador y empleados, es de mucha ventaja contar con un componente de salud y seguridad en el trabajo, ya que mejora el clima laboral, la motivación y la participación, también aumenta la productividad creciendo en conocimientos y así mismo, ayuda a disminuir la ansiedad.

Es necesario, asimismo, aplicar los protocolos de bioseguridad pertinentes para los trabajos de construcción, ya que es indispensable que se apliquen las medidas preventivas para poder frenar los contagios por la pandemia que sufre la región, brindando seguridad a los que trabajan y visitan las obras, contribuyendo igualmente al estado de emergencia en el que se encuentra el país.

NORMATIVIDAD

Regido y orientado desde la constitución política de Colombia, pasando por el código sustantivo del trabajo, la ley 100 de seguridad social, hasta los decretos y resoluciones los cuales obligan a los empleadores asegurar a sus empleados contra los riesgos profesionales.

La Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico.

Circular 003 del 8 de abril de 2020, medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19

Con los protocolos de bioseguridad de cada uno de los contratistas aprobados por la interventoría

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud ocupacional, asimismo supervisar y transmitir los usos adecuados de los protocolos establecidos de bioseguridad ante el covid-19 del proyecto que tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances del área de seguridad industrial y salud en el trabajo.
- Hacer vigilancia en el cumplimiento por parte de las empresas contratistas del programa de salud ocupacional a la presentación del protocolo de bioseguridad.
- Capacitar al personal de interventoría sobre los protocolos de bioseguridad y sobre temas referentes a la salud y seguridad en el trabajo
- Reforzar y aplicar el protocolo de bioseguridad en la empresa encargada de la interventoría, CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
- Promulgar prácticas adecuadas que conlleven al cuidado integral de los trabajadores, en su entorno laboral, enfocadas a la protección y cuidado de la salud e integridad física de los mismos.
- Fomentar el orden e higiene personal

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO A LA CONTRATISTA

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en salud industrial y seguridad ocupacional (Siso). Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra.

En el presente documento se expone las distintas áreas donde se vigiló y supervisó las acciones de seguridad y salud en el trabajo para el contrato de referencia.

CAPACITACIONES

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de salud Ocupacional. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra sobre el uso de elementos de protección personal, los peligros en el trabajo, sobre la emergencia sanitaria que sufre la región y el mundo y temas relacionado en seguridad y salud en el trabajo.

	
Foto N°1: Realización de Charla de 5 minutos	Foto N°2: Realización de Charla de 5 minutos

MANEJO DE LOS RESIDUOS Y ASEO

Los frentes de trabajo deben permanecer en buen orden y limpios, esto debido a que ayuda a una mejor salud y mejorar la efectividad en el trabajo, evitar problemas de salud y en general, por mantener un entorno más seguro para toda la población del proyecto, además de garantizar que no se afecté el ecosistema de la zona

Para ello la contratista está garantizando en el área del proyecto y tiene conciencia de la debida separación de los residuos sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la clasificación en un punto de encuentro, contando además en cada frente bolsas de basura para luego hacer la respectiva separación

	
Foto N°3: Punto para recolección de residuos	Foto N°4: Punto ecológico en zona de encuentro y desinfección
	
Foto N°5: Campamento en el tramo 2 de la vía a intervenir	Foto N°6: Campamento en la vía donde se almacena el cemento

SEÑALIZACIÓN Y PREVENCION EN OBRA

En el presente periodo del mes de Abril, la señalización se fue adaptando según las actividades que se realizaban en obra, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de excavaciones correspondientes a alcantarillas. La señalización de inicio de obra se encuentra en el primer tramo a intervenir, al igual que la de maquinaria pesada en la zona. Así mismo cada frente de trabajo cuenta con cintas peligro para señalizar los trabajos que se realizan y señales verticales de obra que refuerzan la visión para quienes transiten por la vía. El sector no cuenta con un sendero peatonal



Foto N°7: Demarcación preventiva de vía cerrada



Foto N°8: Señalización para el cierre de la vía.



Foto N°9: Señalización en acopio de material con su respectivo aislamiento en cinta peligro



Foto N°10: Valla informativa de buen uso de los elementos de protección personal

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección de personal (EPP) son requeridos para los trabajos de construcción y son de uso necesario, ya que es un componente que ayuda a minimizar los riesgos que puede sufrir el personal a la exposición que conlleva el trabajo. Estos EPP son de uso individual y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.

La contratista hizo entrega de los elementos de protección personal y cuenta con elementos tales como: cascos, botas, chalecos reflectivos.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto N°11: Buen uso de elementos de protección personal para actividades de Vibrado de concreto</td><td>Foto N°12: Buen uso de los elementos de protección personal para amarre de acero.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto N°13: Uso de elementos de protección personal para preparación de mezcla de concreto</td><td>Foto N°14: Uso de elementos de protección personal para figurado de acero en viga riostra.</td></tr>
</table>

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el presente periodo en la ejecución de las obras se utilizó 1 (un) vibro compactador, 1 (una) motoniveladora, 1 (uno) carrotanque, 1 (un) retrocargador, volquetas, donde la interventoría ha evaluado de manera periódica el registro de maquinaria y equipos, y ha verificado la documentación de maquinaria y operarios

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Foto N°15: Equipos en obra, mezcladora de concreto, vibrador para concreto eléctrico</td>
<td>Foto N°16: Equipos utilizados en obra</td>
</tr>
</table>

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

En control y seguimiento de la interventoría con la contratista, se verificó los certificados de los pagos de seguridad social y riesgos laborales de las personas afiliadas al contrato de obra.

Para el presente periodo marzo y Abril, por medio de las planillas de pago, se realizó los respectivos chequeos para verificaciones de los mismos. De igual manera se comprobó que el personal que ingresó al contrato de obra, cuente con la documentación al día y en regla.

Se le exige a la contratista el cumplimiento de la normativa vigente en este sentido, que es, el envío oportuno de los documentos requeridos y necesarios, que permanecen en el archivo de esta interventoría. Esta documentación es verificada para garantizar cumplir estrictamente con los requisitos de este contrato.

La interventoría ha vigilado el cumplimiento de las normas de seguridad integral y salud en el trabajo

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El municipio donde se realizan las obras también ha sido afectado por la pandemia, y en cumplimiento con lo establecido por el Ministerio de Salud, INVIAS y el protocolo de bioseguridad presentado por la contratista y aprobado por la interventoría, se vigila y controla las actividades para la ejecución de la obra.

- **Toma de temperatura**

De acuerdo a la resolución 223 del 25 de febrero del 2021, se adoptaron las medidas establecidas por el Ministerio de salud por parte de esta interventoría, y no es necesario para el presente periodo y los siguientes, la toma de temperatura para el ingreso a los establecimientos o sitios de obra.

- **Desinfección antes de la jornada laboral**

Lavar con frecuencia las manos reduce en un 50% el contagio del Covid 19. La contratista realiza este lavado con jabón y con agua al menos durante 20 a 30 segundos, desinfecta con alcohol, manos y calzado esto se cumple antes de la jornada laboral y es obligatorio sin excepción alguna.

	
Foto N°19: Desinfección de manos con alcohol antiséptico al 70%	Foto N°20: Punto de Desinfección de manos con alcohol antiséptico al 70%

- **Insumos y entrega de tapabocas**

Se hizo entrega de los elementos de protección, junto con un paquete de tapabocas que deben mantener durante la jornada laboral, e igualmente se instalaron vallas informativas para recordar mantener las medidas preventivas

	
Foto N°21: Desinfección de herramienta menor	Foto N°22: Entrega de tapabocas y comunicación del buen uso del mismo

	
Foto N°23: Valla informativa de la zona de desinfección	Foto N°24: Zona de lavado de manos

- **Encuesta manifestaciones de salud y censo**

Diariamente se realiza una encuesta al personal que está asociado a la obra, donde cada personal manifiesta las condiciones de salud sobre los síntomas relacionados al covid-19, además se realiza un censo, para conocer las condiciones sociales y familiares de todo el personal, donde se expresa, si tiene personas a cargo, enfermedades, y nivel escolar, entre otros.

La contratista viene cumplimiento a cabalidad con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en La Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico, además de lo ordenado por el invias en la circular externa no.003 del 13 de abril del 2020.

Semanalmente se reportan las actividades en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, donde se evidencia el cumplimiento por parte de la contratista de las medidas restrictivas

No se han presentado a la fecha contagiados ni sospechosos con Covid -19. El estado de salud de los funcionarios de la contratista es bueno.

	
Foto N°25: Realización de encuesta estado de salud del trabajador de la obra.	Foto N°26: Realización de Encuesta Personal

Se anexa los informes semanales de bioseguridad del contrato de obra.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA


CAPACITACIONES

Es de importancia fomentar en el personal del proyecto conocimientos, habilidades y actividades relacionadas con la formación y capacitación, en temas de salud ocupacional, que permitan una mejor relación interpersonal y especialmente un buen rendimiento en la dimensión laboral, protegiendo además la integridad de los trabajadores en distintos temas que pueden afectar su salud a las exposiciones que hay en su labor.

En el presente periodo se realizaron las siguientes charlas de capacitación al personal de interventoría:

1. **Presencia vibración en el cuerpo:** se define vibración transmitida a un cuerpo como la vibración mecánica que conlleva riesgos para la salud en particular lesiones de columna y lumbalgias
2. **Características y cuidados con el ruido:** El ruido es un problema para la salud, trae diversas consecuencias. Se trato el tema sobre los sonidos que oímos y su nivel de intensidad y se aconsejó cuidar los oídos de ruidos fuertes.
3. **Calor y frio en el ambiente mientras realizo mi labor:** Los extremos de la temperatura son peligrosos ya que son condiciones no aptas para el ser humano realice labores, por ende, se dieron recomendaciones para estas situaciones
4. **Ejercicios de elongación para manos y muñecas:** con las manos realizamos el 85% de las actividades diarias por tal motivo toca cuidarlas y evitar sobrecarga ya que son delicadas y hacer ejercicios o estiramientos ayuda a prevenir enfermedades.
5. **Agotamiento por calor:** Este se da debido a la exposición directa a altas temperaturas, y puede causar estrés, desmayos, mareos y sudoración excesiva. Se recomienda tener ropa holgada, uso de protector solar, e hidratarse constantemente, buscar sobra y accesorios que acompañen y no estorben los elementos de protección personal.
6. **La visión nuestra:** Se realizó una charla motivacional para ayudar el estado anímico de los trabajadores de interventoría, para tener una visión personal con expectativas

Se anexa registro de charlas realizadas en presente periodo al personal de la interventoría

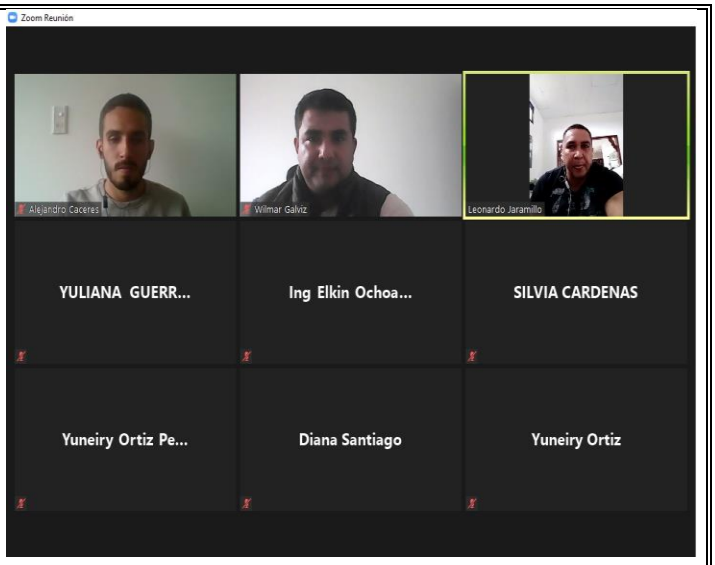	
Foto Nº 1: Realización de charla de 5 minutos al personal de interventoría. Se acompañó además con una pausa activa	Foto Nº 2: Charla de capacitación con los inspectores de obra para el proyecto de interventoría. Se realizaron actividades de estiramientos y se compartieron conocimientos

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión seguridad industrial y salud en el trabajo la cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

La interventoría en compromiso con la seguridad y salud en el trabajo hace respectivo uso de los elementos de protección personal en obra, así como en trabajos de oficina.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA adopta las medidas de bioseguridad establecidas en La Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico, además de lo ordenado por INVIAS en la circular externa No. 003 del 08 abril del 2020.

Dentro de las actividades que se realizan para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad se encuentran:

- **Uso de los elementos de bioseguridad.**

  Cada miembro de la interventoría, cuenta con los elementos necesarios para protección ante el covid-19 como, tapabocas, alcohol, toallas desechables, tapete desinfectante, entre otros.
- **Reporte diario de condiciones de salud.**

  Diariamente se diligencia un formato con las condiciones manifestadas de salud de cada uno de los trabajadores de la interventoría, donde se preguntan los síntomas más comunes sobre el covid-19. *(Se anexa registro diario de manifestación estado de salud)*
- **Desinfección de manos.**

  Se promueve internamente el constante lavado de manos, con abundante agua y jabón, con un lavado constante cada 3 horas, y alcohol y gel antibacterial para desinfección de las mismas.
- **Demarcaciones bioseguridad**

  La interventoría está comprometida con la bioseguridad, por tal motivo la oficina cuenta en su oficina con demarcaciones que ayudan a mantener las medidas de los protocolos y promover el autocuidado

En el presente periodo del mes de febrero, se presentó un caso sospechoso de covid-19, quien fue la secretaria Estefanía Chinchilla Guerrero, se descartó con la prueba PCR y estuvo aislada e incapacitada en su domicilio mientras se conocía el resultado de la prueba. El estado de salud es bueno para el cumplimiento de sus labores asignadas.

Se anexan informes semanales presentados en el mes de febrero

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad, es un plan que garantiza la calidad de los proyectos o procesos, este documento debe llevar a cabo los programas necesarios donde se especifiquen los encargados en distintas áreas para realizar con la mejor efectividad el proyecto

Se realizó en el presente periodo el seguimiento a los planes de calidad de los municipios, especificados en los formatos de planes de calidad



Foto Nº 3: Elementos de aseo, limpieza y protección implementados ante la emergencia del Covid-19.



Foto Nº 4: Desinfección de manos de ingeniera con alcohol antiséptico al 70%



Foto Nº 5: Desinfección de manos de la ingeniera auxiliar de Interventoría con alcohol antiséptico al 70%



Foto Nº 6: Desinfección de la secretaria Interventoría con alcohol antiséptico al 70%

	
Foto Nº 7: Desinfección de manos del inspector siso de interventoría con alcohol antiséptico al 70%	Foto Nº 8: Desinfección de manos y pies de la ingeniería residente de Interventoría con alcohol antiséptico al 70% y amonio cuaternario.
	
Foto Nº 9: Desinfección de manos del inspector SISO de interventoría	Foto Nº 10: Zona de desinfección, puesta en la entrada de la oficina de interventoría

	
Foto Nº 11: Uso correcto de los tapabocas en puestos de oficina de interventoría	Foto Nº 12: Uso correcto de los tapabocas en puestos de oficina de interventoría
	
Foto Nº 13: Señalización de los puntos de rutas de evacuación de la oficina en caso de emergencia.	Foto Nº 14: Contenedor para riesgos biológicos implementado ante la emergencia de covid-19

	
Foto Nº 15: Vallas reglamentarias, sobre el uso de tapabocas y sobre el no uso de cigarrillos dentro de la oficina	Foto Nº 16: Desinfección de áreas de trabajo y objetos a utilizar con alcohol antiséptico al 70%
	
Foto Nº 17: Zona de desinfección, puesta en la entrada de la oficina de interventoría	Foto Nº 18: Valla informativa acerca del protocolo para la prevención del Covid-19 y el buen uso del tapabocas.

	
Foto Nº 19: Inspección de interventoría, en visita al municipio de Tibú, donde se toma muestra para el material de la base estabilizada, y se mantienen las medidas de protocolo de bioseguridad	Foto Nº 20: Inspección técnica de interventoría, en visita al municipio de San Calixto, y se mantienen las medidas de protocolo de bioseguridad
	
Foto Nº 21: Inspección técnica de interventoría, en visita al municipio de San Calixto, y se mantienen las medidas de protocolo de bioseguridad	Foto Nº 22: Revisión e inspección en las actividades de obra en el municipio de El Carmen, donde se hace seguimiento y se mantiene el protocolo de bioseguridad

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se viene cumpliendo a cabalidad por parte de la contratista e interventoría con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en la Resolución 223 del 25 de febrero del 2021 del ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se modifica la resolución 666 del 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico, además de lo ordenado por INVIAS en la circular externa No. 003 del 08 abril del 2020.
- Se recomienda seguir con la implementación y el uso de las medidas preventivas desde el inicio del proyecto, hasta el día que se termine el mismo, para proteger la salud de los trabajadores y de quienes visitan la obra.
- Se ha evidenciado la entrega oportuna y el buen uso de los elementos de protección personal por parte de la interventoría, así mismo se ha inspeccionado la entrega de EPP por parte de la contratista, pero un uso no constante por parte de los ayudantes de obra
- Se sugiere seguir capacitando y concientizando al personal asociado a la obra sobre la emergencia sanitaria que sufre la región, para que adopte las medidas preventivas dentro y fuera de la obra, así mismo sobre los peligros que se está expuesto y la prevención que brinda los elementos de protección personal.

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 7/ abril / 2021 METODO Entrega folletos

CAPACITACIÓN N° 17 LUGAR oficina Ocaña

RESPONSABLE Leonardo Jaramillo CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

Presencia de vibración de todo cuerpo cuando mango el equipo

ASPECTOS TRATADOS

Se define vibración transmitida a un cuerpo como la vibración mecanica que conlleva riesgos para la salud, en particular lesiones de columna y lumbalgias

OBSERVACIONES

Se realizó un folleto y se entregó a cada integrante de interventoria para lectura.

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Jaramillo	Inspector SISO	
2	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
3	Yuneiry Ortiz Perez	Ing Residente	Yuneiry Ortiz
4	Diana Santigo	Ingeniera	Diana S Santigo
5	Alejandra Castro	Ing Residente.	
6	Sergio Castro	Ingeniero	
7	Silvia Daniela Cardenas	Ing Auxiliar.	
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 15 / abril / 2021 METODO Charla

CAPACITACIÓN N° 18 LUGAR oficina - Oraña.

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

Caracteristicas y cuidados con el ruido

ASPECTOS TRATADOS

El ruido es un problema para la salud, trae diversas consecuencias. Se hablo sobre los sonido que oimos y su nivel de intensidad y se aconsejó cuidar los oidos de ruidos fuerte con distintas maneras.

OBSERVACIONES

Se realizó la charla a satisfacción

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Diana Santiago	Ingeniera	
3	Silvia Daniela Cardenas	Ing Auxiliar	
4	Sergio Castro	Ingeniero	
5			
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 16/04/2021 METODO Charla oficina

CAPACITACIÓN N° 19 LUGAR Ocaña

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

Charla sobre el calor y frio en el ambiente mientras realizo mi labor

ASPECTOS TRATADOS

los extremos de la temperatura son peligrosos ya que son condiciones no aptas para el ser humano realice labores. Por ende se dieron recomendaciones para estas situaciones

OBSERVACIONES

Se realizó la charla a satisfacción

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Yuneiry Ortiz Perez	Ing Residente	Yuneiry Ortiz
3	Diana Santiago	Ingeniera	Diana J. Santiago J.
4	Silvia Daniela Cardenas	Ing Auxiliar	
5			
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
CSN	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 20 / Abril / 2021 METODO Charla

CAPACITACIÓN N° 20 LUGAR oficina

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

Ejercicios de enlogación para manos y muñecas

ASPECTOS TRATADOS

Con las manos realizamos el 85 % de nuestras actividades de todos los días por tal motivo toca cuidarlas y evitar la sobrecarga ya que so delicadas hacer ejercicios previenen enfermedades

OBSERVACIONES

Se realizó la charla y ejercicios para fortalecer las manos y muñecas

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	Inspector SISO	
2	Sergio Castro	Ingeniero	
3	Silvia Daniela Cardenas	Ing Auxiliar	
4	Estefania Chinchilla Gomez	Secretaria	
5	Yuneiry Ortiz Perez	Ing Residente	Yuneiry Ortiz
6	Diana Santiago	Ingeniera.	Diana Santiago T
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA: 17 de abril de 2021 METODO: Video llamada .

CAPACITACIÓN N° 21 LUGAR: Zoom .

RESPONSABLE: Alejandro Caceres navarro CARGO: Inspector Siso .

TEMA CENTRAL

Por Cuestiones de distancia y tiempo, se realizó la charla en modalidad de video llamada, vía Zoom donde se trataron los siguientes temas: Agotamiento por calor y cuidados para trabajos que hagan uso necesario de estar expuesto al sol




ASPECTOS TRATADOS

Agotamiento por Calor: Este se da debido a la exposición a altas temperaturas y no tomar medidas para controlar estos factores, puede causar estrés, desmayos, mareos y sudoración excesiva

Cuidados: Se recomienda estar con ropa holgada en los trabajos, poder usar protector solar e hidratarse constantemente, acompañándolo de una buena alimentación. Buscar sombra o utilizar accesorios que acompañen y no estorben su protección personal

OBSERVACIONES

Se realizó a satisfacción la charla, pero no se pudo contar con todo el personal de interventoría debido a conexiones inestables de internet en los municipios donde se encontraban

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lina Contreras	Inspector Convención	
4	Wilmar Galvis	Inspector Hacarí	
6	Leonardo Jaramillo	Inspector SISO	
7	Sergio Castro	Inspector Tibú	
8	Juan Diego	Inspector El Carmen	
9	Marlon Alejandro Caceres Navarro	Inspector SISO	

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CONTRATO 1278
	REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Líder SST	Aprobación: Gerente General	

FECHA 23 / abril / 2024 METODO Charla

CAPACITACIÓN N° 22 LUGAR Oficina - Oraña

RESPONSABLE Marlon Alejandro Cáceres CARGO Inspector SISO

TEMA CENTRAL

la visión el mejor tesoro

ASPECTOS TRATADOS

proyectarse a grandes cosas porque aunque vengan duros momentos, Dios tiene grandes cosas, nunca nos ha dejado ni nos dejará solos, atrevase a soñar y tenga una buena visión de si mismo

OBSERVACIONES

se les hizo pequeños consejos al prisonal y se realzó a satisfacción

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Alejandro Cáceres	1091677056	
2	Yuneiry Ortiz Perez	Ing Residente	Yuneiry Ortiz
3	Silvia Daniela Cadenas	Ing Auxiliar	
4	Diana Santiago	Ingeniera	Diana J. Santiago T.
5	Estefania Chinchilla G.	Secretaria	
6			
7			
8			
9			
TOTALPARTICIPANTES:			

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Estefania Chinchilla Guevara	**CÉDULA**	1091674622	**CARGO**	Secretaria
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?	X		X		X			X	X			X		X	X		X			X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?	X		X		X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?	X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?	X		X		X		X			X	X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?	X		X		X		X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	Stefania Ch.		Stefania Ch.		Stefania Ch.		Stefania Ch.		Stefania Ch.																							
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO	M. C.		M. C.		M. C.		M. C.		M. C.																							

Nombre trabajador:	Estefania chinchilla g.	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C: 1091674622		C.C:	1091672056
Stefania Chinchilla Guevara		M. C.	
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Yuneiry Ortiz Perez	**CÉDULA**	1091670091	**CARGO**	Ing Residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SST

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Yuneiry Ortiz Pérez	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091.670.081	C.C:	1091672056
Yuneiry Ortiz Pérez			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Yuneiry Ortiz Perez	CÉDULA	1091670091	CARGO	Ing Residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091672056	CARGO	Inspector SST

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP		YoP	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Yuneiry Ortiz Pérez	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1091.670.081	C.C:	1091672056
Yuneiry Ortiz Pérez			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Diana lizbeth Santiago Jimenez	**CÉDULA**	37331240	**CARGO**	Ingeniera.
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091692050	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																											
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR	Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.		Diana S.	
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Diana J. Santiago T.	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres N
C.C:	37.331.240	C.C:	1091692050
Diana Lisbeth Santiago T.			
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Maryory Alejandra Castro Vasquez	**CÉDULA**	1095	**CARGO**	Ing Residente
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091672056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	M. Alejandra Castro	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	1095785468	C.C:	1091672056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
CSN	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091677056	**CARGO**	Inspector SISO
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	**CÉDULA**	1091677056	**CARGO**	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Marlon Alejandro Cáceres N.	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres N
C.C:	1091677056	C.C:	1091677056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

CSN	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CÓDIGO: FO-124
	CHEQUEO DIARIO PREVENTIVO DE CONDICIONES DE SALUD FRENTE AL COVID-19	VERSIÓN: 0
		FECHA: 26/11/2020
Responsable: Líder del área	Aprobación: Gerencia General	

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	Jorge leonardo Jaramillo Forero	CÉDULA	88226077	CARGO	Inspector SISO
NOMBRE COMPLETO QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Marlon Alejandro Cáceres Navarro	CÉDULA	1091677056	CARGO	Inspector SISO

Este formato será diligenciado exclusivamente por personal de SST y/o el jefe inmediato

MARQUE CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

MES:	ABRIL																													
DIA DE LA SEMANA:	Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Lun		Mar		Mier		Jue	
DIA DEL MES:	5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		19		20		21		22	
1 ¿Presenta actualmente alguno de los siguientes síntomas?	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
A. Fiebre mayor a 38 grados		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
B. Tos seca?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
C. Dolor de cabeza?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
D. Dolor de garganta?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
E. Dificultad para respirar?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
F. Secreciones nasales?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
G. Malestar general?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
H. Congestión nasal?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2. Ha estado cerca de alguien diagnosticado con COVID- 19?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
FIRMA DEL TRABAJADOR																																
FIRMA DEL PERSONAL SST / JEFE INMEDIATO																																

Nombre trabajador:	Jorge Leonardo Jaramillo	Personal SST/Jefe inmediato	Marlon Alejandro Cáceres Navarro
C.C:	88226077	C.C:	1091677056
Firma del trabajador autorizando el uso de esta información de forma confidencial por la empresa		Firma del empleador garantizando la confidencialidad del presente documento	

NOTA: Si existen 2 síntomas de la pregunta 1 o si la respueta a la pregunta 2 es SI, se considera CASO SOSPECHOSO

BITACORA DE SEGUIMIENTO DE SALUD

REPORTE DIARIO FUNCIONARIOS CASOS POSITIVOS/ SOSPECHOSOS COVID-19

NOMBRE: ESTEFANIA CHINCHILLA GUERRERO **CARGO:** SECRETARIA

EDAD: 25 AÑOS

INICIO SINTOMAS: 5 DE ABRIL DE 2021

CASO: DESCARTADO PRUEBA PCR

SEGUIMIENTO: Vía telefónica y mensajería instantánea

- **Lunes 5 DE abril de 2021**
  Se presentan los síntomas desde este día, lo cual acude a cita médica donde se le ordena reposo en casa por 2 días, la cual presenta, malestar general, dolor de cabeza dolor de garganta y tos seca, síntomas con alta intensidad

- **Martes 6 de abril de 2021**
  Manifiesta seguir con los mismos síntomas, (Dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y malestar general) lo cual sigue estando en reposo desde su casa.

- **Miércoles 7 de abril de 2021**
  Se presenta a laboral en su horario normal, pero sigue presentando síntomas y manifiesta no sentirse en situaciones ideales para trabajar. Se le indica dirigirse a Urgencias para ser tratado por el personal médico, el cual ordena realizarse prueba de covid-19 por ser un caso sospechoso y se le da una incapacidad medica por 10 contando desde el 7 de abril de 2021 hasta 16 de abril de 2021

- **Jueves 8 de abril de 2021**
  Sigue presentando los mismos síntomas en una intensidad menos fuerte, el dolor de garganta ha disminuido pero la congestión sigue igual. Permanece en aislamiento y con incapacidad en casa

- **Viernes 9 de abril de 2021**
  Los síntomas presentados anteriormente persisten, exceptuando el dolor de garganta, manifiesta no tener fiebre y no perder gusto y olfato. Se mantiene en aislamiento en su casa

- **Sábado 10 de abril de 2021**
  Ya no presenta tos, pero sigue presentando malestar general, congestión y secreciones nasales. El dolor de cabeza es recurrente y sigue estando en aislamiento desde su casa.

- **Domingo 11 de abril**
  A la fecha no se ha entregado el resultado de la prueba del covid-19, y se mantiene en incapacidad y aislamiento. Presenta síntomas de congestión, malestar general y secreciones generales

- **Lunes 12 de abril**
  Sigue con malestar general, el dolor de cabeza es leve, pero se presenta y sigue con congestión y secreciones nasales. Permanece en aislamiento y en incapacidad médica. Aunque presenta síntomas dice sentirse mejor

- **Martes 13 de abril**
  Se conoció el resultado de la prueba la cual fue negativa, se le recomendó a Estefanía por parte del personal médico, que permaneciera en reposo y en su incapacidad. El resultado físico es entregado cuando termine la incapacidad médica. Sigue presentados síntomas de gripe leve

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 13 DEL 5/04/2021 AL 8/04/2021

FECHA: 8 (Día) 04 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

2. ENTREGA DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓNDEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

3. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL ANTISEPTICO



DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL DE OBRA





DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

SE REALIZÓ UN COMUNICADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORIA A TODOS LOS CONTRATISTAS PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE LA RESOLUCIÓN 0223 DE 2021 DONDE SE ELIMINA LA TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANOS Y FORMATOS DE INGRESO. DE TAL MANERA DICHAS MEDIDAS YA NO SERAN EXCLUSIVAMENTE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DELOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

CUADRO RESUMEN		
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: JORGE LEONARDO JARAMILLO FORERO

No. MAT: 092064-0538770 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

HA	NOMBRE	Nogid O.		Yeison O		Fernando		Jhon Alexis		Jhon A		Jose Toro		Yefrey	
	CÉDULA	13279169		1004825381		1041627710		1041162346		1043217586		1004825573		1007279831	
14/5/20	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA														

: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

HA	NOMBRE	Nogid		Yeison O		Fernando		Jhon Alexis		Jhon A		Jose Toro		Yefrey	
	CÉDULA	13279169		1004825381		1041627710		1041162346		1043217586		1004825573		1007279831	
14/5/20	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA														

: Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

HA	NOMBRE	Nayid O		Yerson O		Fernando		Jhon Alexis		Jhon A		Jose Toro		Yefrey	
	CÉDULA	132794169		1004825381		1091162710		1091162346		1004327586		1004825573		1007279834	
7/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Yerson		Yerson		Fernando		Jhon Alexis		Jhon A		Jose Toro		Yefrey	

Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

HA	NOMBRE	Nayid O		Yerson O		Fernando		Jhon Alexis		Jhon A		Jose Toro		Yefrey	
	CÉDULA	132794169		1004825381		1091162710		1091162346		1004327586		1004825573		1007279834	
8/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Yerson		Yerson		Fernando		Jhon Alexis		Jhon A		Jose Toro		Yefrey	

Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMINEO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE ENTREGA DE EPP

FECHA								
	NOMBRE	Nayid O	Yerson O	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey
	CÉDULA	1372791 69	1004821381	1091162710	1091162346	1004321 7586	1004825 73	1007279 624
30/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Firma	Yelson	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey Jose
FECHA	NOMBRE	Nayid O	Yerson O	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey
	CÉDULA	1372791 69	1004821381	1091162710	1091162346	1004321 7586	1004825 73	1007279 624
31/3/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Firma pl.2	Yelson	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey Jose
FECHA	NOMBRE	Nayid O	Yerson Ovalle	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey
	CÉDULA	1372791 69	1004821381	1091162710	1091162346	1004321 7586	1004825 73	1007279 624
5/4/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Firma pl.2	Yelson	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey Jose
FECHA	NOMBRE	Nayid O	Yerson Ovalle	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey
	CÉDULA	1372791 69	1004821381	1091162710	1091162346	1004321 7586	1004825 73	1007279 624
6/4/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Firma pl.2	Yelson	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey Jose
FECHA	NOMBRE	Nayid O	Yerson Ovalle	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey
	CÉDULA	1372791 69	1004821381	1091162710	1091162346	1004321 7586	1004825 73	1007279 624
7/4/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Firma pl.2	Yelson	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey Jose
FECHA	NOMBRE	Nayid O	Yerson O	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey
	CÉDULA	1372791 69	1004821381	1091162710	1091162346	1004321 7586	1004825 73	1007279 624
8/4/21	GUANTES	/	/	/	/	/	/	/
	TAPABOCAS	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA	Firma pl.2	Yelson	Fernando	Jhon Alexis	Jhon A	Jose Toro	Yefrey Jose

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 14 DEL 9/04/2021 AL 15/04/2021

FECHA | 15 (Día) | 04 (Mes) | 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

2. ENTREGA DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓNDEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

3. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL ANTISEPTICO



PERSONAL AYUDANTE DE OBRA CON EL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN



ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DE USO PERSONAL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

SE REALIZÓ UN COMUNICADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORIA A TODOS LOS CONTRATISTAS PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE LA RESOLUCIÓN 0223 DE 2021 DONDE SE ELIMINA LA TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANOS Y FORMATOS DE INGRESO. DE TAL MANERA DICHAS MEDIDAS YA NO SERAN EXCLUSIVAMENTE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DELOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

CUADRO RESUMEN		
TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: JORGE LEONARDO JARAMILLO FORERO

No. MAT: 092064-0538770 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL
NIT 901424260-7
TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

FECHA	NOMBRE	Ruben G		Yeison Ovalle		Yelson Ruiz		Elkin		Fernando		Luis Perez		Luis Ovalle	
	CÉDULA	1091	62427	1091796012		1007229824		1004819362		1091	62740	5519380		5519204	
8/9/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTION NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA														

Nota: Si marcaste SI en una o mas de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas sintomas de COVID-19. Comunicate telefónicamente con tu EPS o con las lineas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la linea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema

Lineas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Linea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE	Ruben G		Yeison Ovalle		Yelson Ruiz		Elkin		Fernando		Luis Perez		Luis Ovalle	
	CÉDULA	1091	62427	1091796012		1007229824		1004819362		1091	62740	5519380		5519204	
9/14/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA														

Nota: Si marcaste SI en una o mas de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas sintomas de COVID-19. Comunicate telefónicamente con tu EPS o con las lineas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la linea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Lineas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Linea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MEJORAIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE SIMTOMALOGÍA

FECHA	NOMBRE	Ruben eduardo		Yeison Ovalle		Yelvy Tec		Elkin		Fernando		Luis O		Luis O	
	CÉDULA	1091662427		1091796012		1007279824		1004816387		1091677210		55193206		55193204	
10/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Ruben eduardo		Yeison ovalle		Yelvy Tec		Elkin		Fernando Luis quiroz carrascal		Luis o vallos			

Nota: Si marcaste SI en una o mas de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546379) Línea nacional (018[illegible]) opción 2 para urgencias

FECHA	NOMBRE	Ruben		Yeison		Yelvy		Elkin		Fernando		Luis quiroz		Luis O.	
	CÉDULA	1091662427		1091796012		1007279824		1004816387		1091677210		55193206		55193204	
12/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Ruben eduardo		Yeison ovalle		Yelvy Tec		Elkin		Fernando Luis quiroz carrascal		Luis o vallos			

Nota: Si marcaste SI en una o mas de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546379) Línea nacional (018[illegible]) opción 2 para urgencias

Escaneado con CamScanner

FECHA	NOMBRE	Ruben E.		Yeison O.		Yefrey J.		Elkin		Fernando		Luciano		Luis O.	
	CÉDULA	1091624221		1091796012		1007279834		1004816353		1091627710		55149380		55149201	
13/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Ruben Eduardo		Yeison Ovalle		Yefrey Jaramillo		Elkin		Fernando		Luciano		Luis Ovalles	

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024545329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE	Ruben E.		Yeison		Yefrey		Elkin		Fernando		Luciano		Luis O.	
	CÉDULA	1091624221		1091796012		1007279834		1004816353		1091627710		55149380		55149201	
14/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA	Ruben Eduardo		Yeison Ovalle		Yefrey Jaramillo		Elkin		Fernando		Luciano		Luis Ovalles	

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024545329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE LAVADO DE MANOS (USO ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL)

FECHA	NOMBRE	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben
	CÉDULA	1091786012	1007279824	1004918383	1091621 10	55199 20	55199 204	1091162 927
9/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben
	CÉDULA	1091786012	1007279824	1004918383	1091621 10	55199 20	55199 204	1091162 927
9/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben
	CÉDULA	1091786012	1007279824	1004918383	1091621 10	55199 20	55199 204	1091162 927
10/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben
	CÉDULA	1091786012	1007279824	1004918383	1091621 10	55199 20	55199 204	1091162 927
12/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben
	CÉDULA	1091786012	1007279824	1004918383	1091621 10	55199 20	55199 204	1091162 927
13/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben Eduardo
FECHA	NOMBRE	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben
	CÉDULA	1091786012	1007279824	1004918383	1091621 10	55199 20	55199 204	1091162 927
14/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA	Yeison	Yeiry	Elkin	Fernando	Luciany	Luz O	Ruben Eduardo

Escaneado con CamScanner

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL CATATUMBO

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA CATATUMBO

SEMANA No. 15 DEL 16/04/2021 AL 22/04/2021

FECHA: 22 (Día) 04 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2020

CONTRATO No. LC.001-CO-001-2020

FECHA DE TERMINACION: 29 de abril de 2021

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y A LA CIRCULAR EXTERNA No.002 EXPEDIDA POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

1. DESINFECCION ANTES DE LA JORNADA LABORAL

CADA FRENTE DE TRABAJO CUENTA CON UN CAMPAMENTO DONDE SE ENCUENTRA UN PUNTO DE DESINFECCIÓN, DONDE SE DESINFECTA LAS MANOS CON ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL. SE CUMPLE AL INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

2. ENTREGA USO DE LOS EPP Y TAPABOCAS

SE HIZO ENTREGA DE LOS ELÉMENTOS DE PROTECCIÓN, JUNTO CON UN PAQUETE DE TAPABOCAS QUE DEBEN MANTENER DURANTE LA JORNADA LABORAL, PARA EVITAR CONTAGIO DEL VIRUS A TRAVÉS DE LAS PARTICULAS DE GOTAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE LOS TRABAJADORES EXPULSAN CUANDO TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

3. CHARLAS DE AUTOCUIDADO

SEMANALMENTE SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADOS Y SE LES CONCIENTIZA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

II. REGISTRO FOTOGARAFICO



DESINFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS CON ALCOHOL ANTISEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL



PERSONAL AYUDANTE DE OBRA CON EL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN



CHARLA DE AUTOCUIDADO E INDUCCIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 666 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Y LA No.679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDOS, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROYECCION SOCIAL ADEMAS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No.002 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATISTA E INTERVENTORIA ES BUENO.

SE REALIZÓ UN COMUNICADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORIA A TODOS LOS CONTRATISTAS PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE LA RESOLUCIÓN 0223 DE 2021 DONDE SE ELIMINA LA TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANOS Y FORMATOS DE INGRESO. DE TAL MANERA DICHAS MEDIDAS YA NO SERAN EXCLUSIVAMENTE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DELOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

CUADRO RESUMEN		
TRABAJO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: JORGE LEONARDO JARAMILLO FORERO

No. MAT: 092064-0538770 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

No. MAT: 68202 03281 STD

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE LAVADO DE MANOS (USO ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL)

FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
12/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
13/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
14/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
15/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
19/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
20/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
21/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							

Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

NIT 901424260-7

TABLA DE CONTROL DE LAVADO DE MANOS (USO ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL)

FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
18/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7.00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
19/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
17/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
19/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
20/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							
FECHA	NOMBRE							
	CÉDULA							
21/4/21	HORA	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m	7:00 a.m
	HORA	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m	12:00 p.m
	HORA	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m	1:00 p.m
	HORA	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m	5:00 p.m
	FIRMA							

Escaneado con CamScanner

FECHA	NOMBRE															
	CÉDULA															
15/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIRMA															

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia.

FECHA	NOMBRE															
	CÉDULA															
16/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIRMA															

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia.

Escaneado con CamScanner

FECHA	NOMBRE														
	CÉDULA														
17/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA														

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas all. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024545329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE														
	CÉDULA														
19/4/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	FIRMA														

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas all. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024545329) Línea nacional (018000511414) (018000941414) opción cero para asistencia

Escaneado con CamScanner

FECHA	NOMBRE															
	CÉDULA															
20/7/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIRMA															

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Líneas de atención ARL SURA Whats app (3024546329) Línea nacional (018000511414) (018000954115) opción cero para asistencia

FECHA	NOMBRE															
	CÉDULA															
21/7/21	DOLOR DE GARGANTA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	MALESTAR GENERAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FATIGA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIEBRE (+38°)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	TOS SECA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	CONGESTIÓN NASAL	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	PERIDA DE OLFATO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN INFECTADO POR COVID - 19	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	FIRMA															

Nota: Si marcaste SI en una o más de las respuestas, por favor quédate en casa y utiliza tapabocas allí. Es posible que tengas síntomas de COVID-19. Comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL SURA. No acudas a tu sitio de trabajo hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes ir sin problema.

Escaneado con CamScanner
