

Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTI	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% comple	Costo total
1			**COMUNIDAD DEL CUIDADO DE BELLO HORIZONTE**			**77,38 días**	**mié 15/01/25**	**mar 15/04/25**			**$0**	**0%**	**$320.175.408**
2			INICIO DE OBRA			0 días	mié 15/01/25	mié 15/01/25		5;4	$0	0%	$0
3		**1**	**PRELIMINARES**			**7,38 días**	**mié 15/01/25**	**jue 23/01/25**			**$0**	**0%**	**$19.006.287**
4		1.1.3	REPLANTEO	M2	261.54	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	2	6CC	$1.925.064	0%	$1.925.064
5		1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	54,68	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	2	6CC	$421.566	0%	$421.566
6		1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	33.78	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	5CC;4CC	8CC;30	$759.540	0%	$759.540
7		1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	M2	262.7	5 días	vie 17/01/25	jue 23/01/25	8CC	32CC+2 días;30	$10.436.331	0%	$10.436.331
8		1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.53	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	6CC	7CC;30	$5.463.786	0%	$5.463.786
9		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**24 días**	**sáb 15/03/25**	**vie 11/04/25**			**$0**	**0%**	**$35.056.130**
10		5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	30	2 días	sáb 15/03/25	mar 18/03/25	22	11CC;12CC	$2.064.245	0%	$2.064.245
11		5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	40	3 días	sáb 15/03/25	mié 19/03/25	10CC	13	$996.184	0%	$996.184
12		5.1.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	M	200	5 días	sáb 15/03/25	vie 21/03/25	10CC	13	$1.477.732	0%	$1.477.732
13		5.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONE	UN	6,00	4 días	vie 21/03/25	mié 26/03/25	11;12	29	$2.022.803	0%	$2.022.803
14		5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	UN	33.78	5 días	jue 3/04/25	mié 9/04/25	25	15CC+1 día;16CC+2 días;17CC+1 día	$14.307.313	0%	$14.307.313
15		5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	14CC+1 día	29	$8.098.642	0%	$8.098.642
16		5.169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	5 días	sáb 5/04/25	vie 11/04/25	14CC+2 días	29	$664.255	0%	$664.255
17		5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	24,00	7 días	vie 4/04/25	vie 11/04/25	14CC+1 día	29	$5.424.955	0%	$5.424.955
18		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**30 días**	**jue 27/02/25**	**jue 3/04/25**			**$0**	**0%**	**$18.181.485**
19		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	33.78	30 días	jue 27/02/25	jue 3/04/25	21	29	$18.181.485	0%	$18.181.485
20		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**44 días**	**jue 23/01/25**	**vie 14/03/25**			**$0**	**0%**	**$46.938.912**
21		13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	89.44	12 días	jue 13/02/25	jue 27/02/25	34CC+1 día	22;19	$1.624.840	0%	$1.624.840
22		13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	89.44	14 días	jue 27/02/25	vie 14/03/25	21	25;10	$1.292.945	0%	$1.292.945
23		13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	909	12 días	jue 23/01/25	jue 6/02/25	33CC+2 días	27CC+2 días	$44.021.128	0%	$44.021.128
24		**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 días**	**sáb 15/03/25**	**jue 3/04/25**			**$0**	**0%**	**$46.308.970**
25		14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	235.53	16 días	sáb 15/03/25	jue 3/04/25	22	14	$46.308.970	0%	$46.308.970
26		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**sáb 25/01/25**	**mié 12/02/25**			**$0**	**0%**	**$79.710.753**
27		17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	262.70	15 días	sáb 25/01/25	mié 12/02/25	23CC+2 días	34	$79.710.753	0%	$79.710.753
28		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**70 días**	**jue 23/01/25**	**mar 15/04/25**			**$0**	**0%**	**$25.431.436**
29		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	262.70	2 días	sáb 12/04/25	mar 15/04/25	13;15;16;17;19	35	$1.744.973	0%	$1.744.973
30		20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	4507.7	20 días	jue 23/01/25	vie 14/02/25	6;7;8	35	$23.686.463	0%	$23.686.463
31		**21**	**NO PREVISTOS**			**22 días**	**lun 20/01/25**	**vie 14/02/25**			**$0**	**0%**	**$49.541.435**

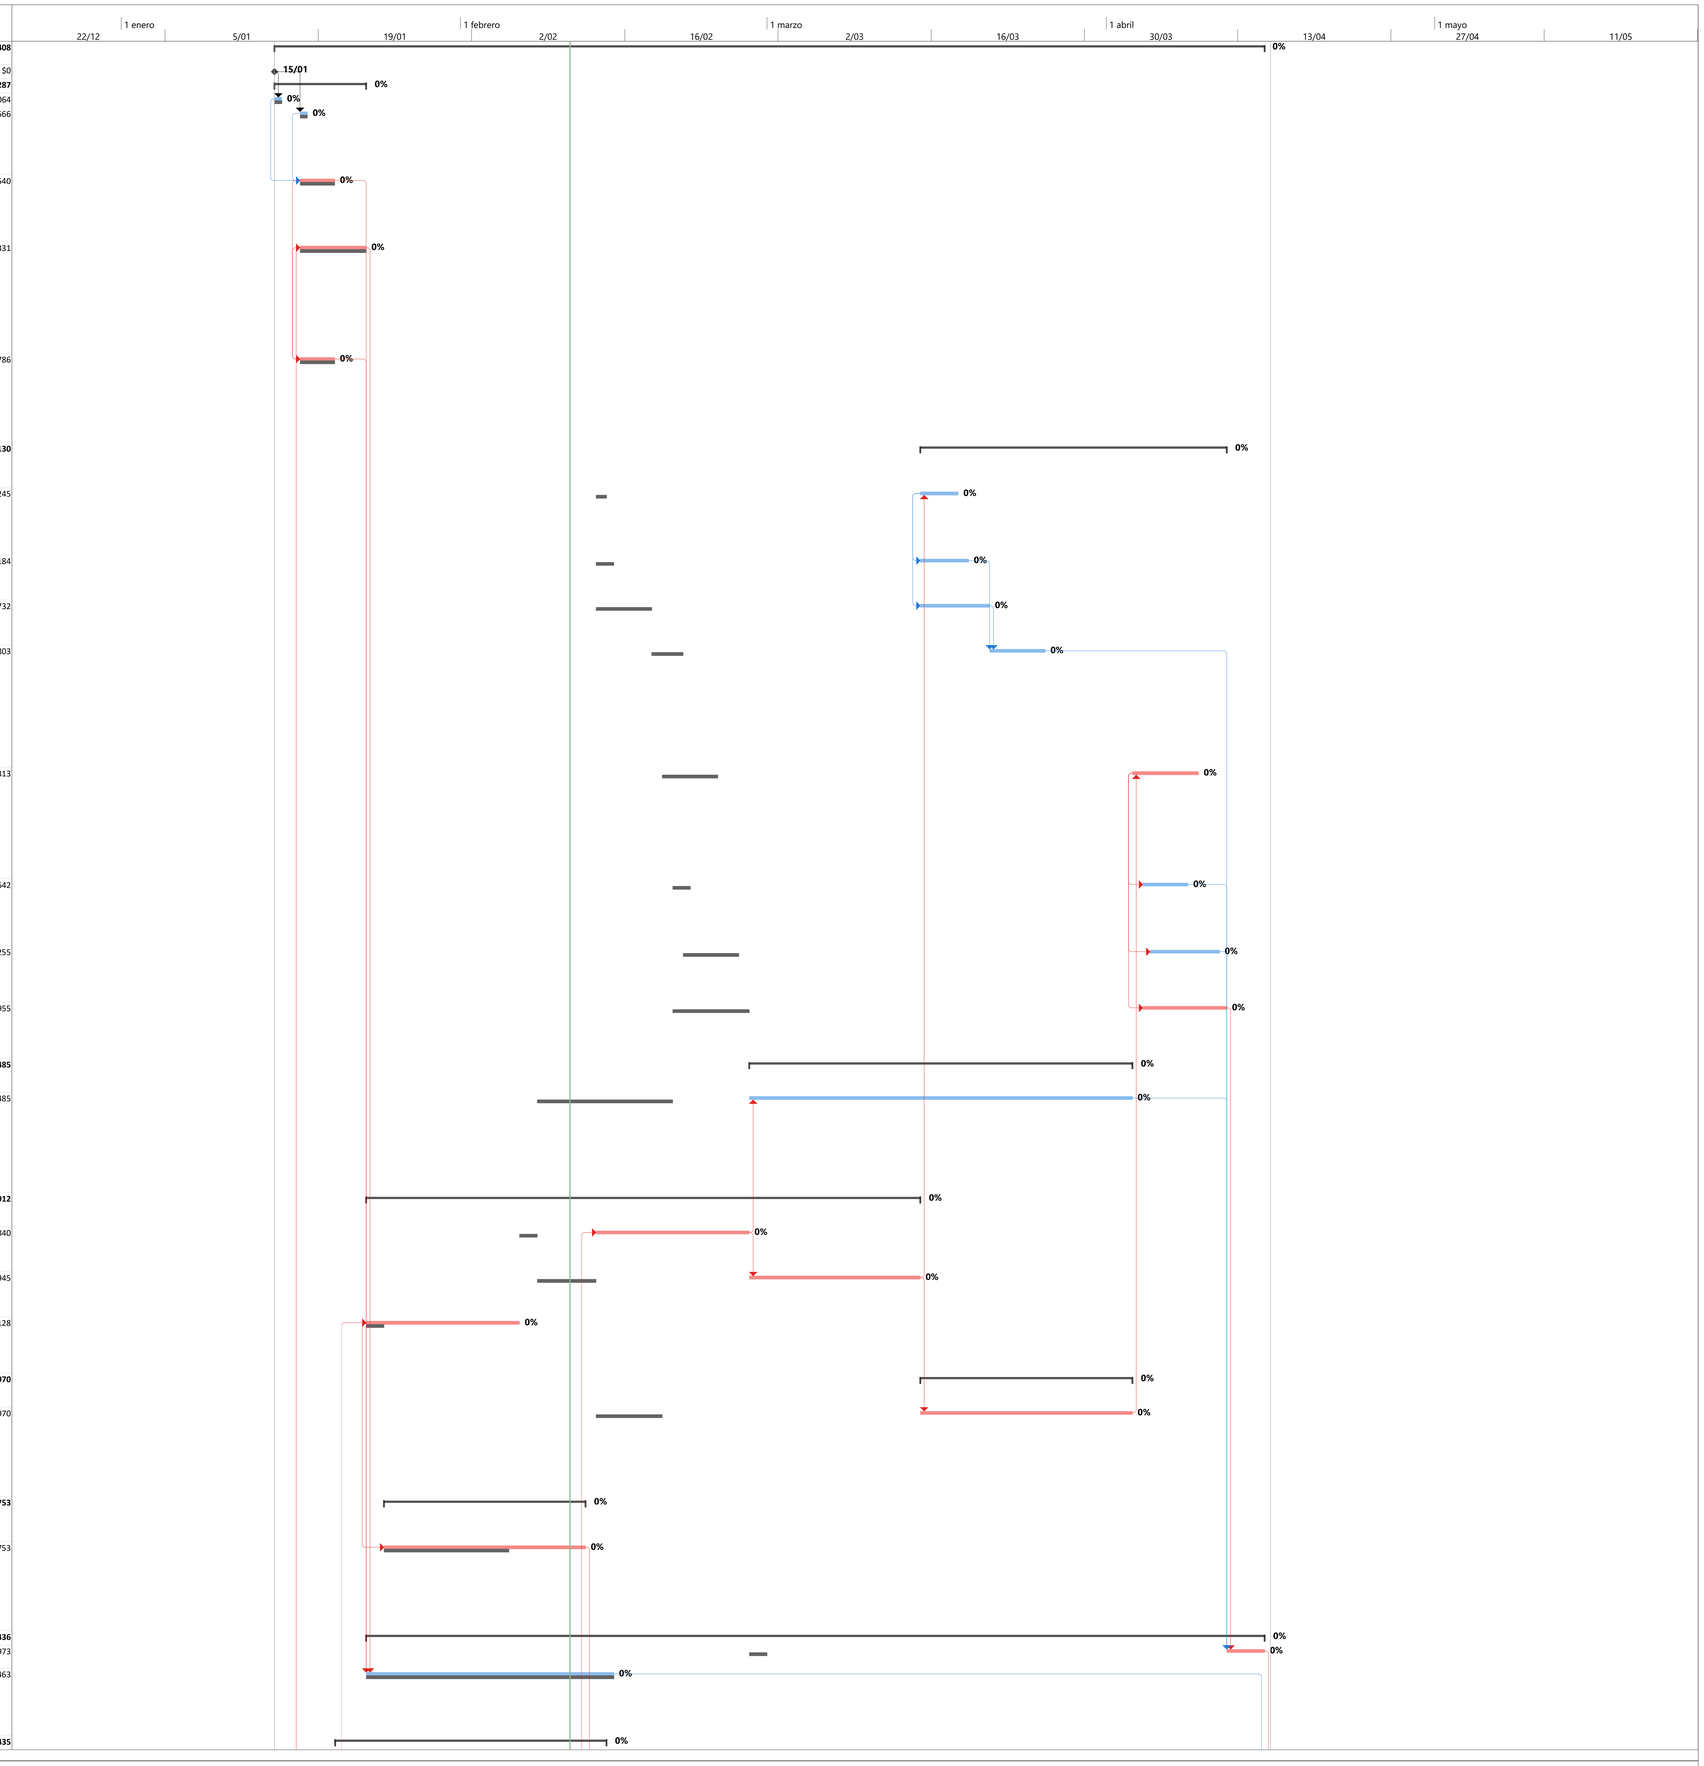


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% comple	Costo total
32		21,1	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR	KG	1046.3	15 días	lun 20/01/25	jue 6/02/25	7CC+2 días	33CC+1 día	$41.854.771	0%	$41.854.771
33		21.2	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE DE CUBIERTA	M2	254.52	5 días	mar 21/01/25	lun 27/01/25	32CC+1 día	23CC+2 días	$4.954.229	0%	$4.954.229
34		21.4	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.45 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	18.18	2 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	27	21CC+1 día	$2.732.434	0%	$2.732.434
35			FIN DE OBRA			0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	29;30		$0	0%	$0



Jofan Vicente Villa Orjuela
Diretor de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria

Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDADES	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% completado	Costo total
1			**CDC SAN BLAS**			**lun 3/02/25**	**61 días**	**mar 15/04/25**			**$0**	**0%**	**$339.851.818**
2			INICIO DE OBRA			lun 3/02/25	0 días	lun 3/02/25		4	$0	0%	$0
3		**1.2**	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**			**lun 3/02/25**	**2 días**	**mar 4/02/25**			**$0**	**0%**	**$421.566**
4		1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	10.25	lun 3/02/25	2 días	mar 4/02/25	2	6CC	$421.566	0%	$421.566
5		**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**lun 3/02/25**	**30 días**	**sáb 8/03/25**			**$0**	**0%**	**$26.776.021**
6		1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	M2	674	lun 3/02/25	30 días	sáb 8/03/25	4CC	8CC+2 días	$26.776.021	0%	$26.776.021
7		**13.3**	**PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mar 4/02/25**	**15 días**	**vie 21/02/25**			**$0**	**0%**	**$50.257.179**
8		13.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LÁMINA LLENA MADERA SOBRE FACHADAS. INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	674	mar 4/02/25	15 días	vie 21/02/25	6CC+2 días	11CC+2 días	$50.257.179	0%	$50.257.179
9		**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**jue 6/02/25**	**55 días**	**lun 14/04/25**			**$0**	**0%**	**$257.920.055**
10		17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79.68	mié 26/03/25	15 días	lun 14/04/25	12	14	$11.975.818	0%	$11.975.818
11		17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	674,00	jue 6/02/25	15 días	lun 24/02/25	8CC+2 días	12	$113.222.994	0%	$113.222.994
12		17.1.29	TEJA DE BARRO NATURAL	M2	674	lun 24/02/25	25 días	mié 26/03/25	11	10	$132.721.243	0%	$132.721.243
13		20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			lun 14/04/25	2 días	mar 15/04/25			$0	0%	$4.476.997
14		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	674	lun 14/04/25	2 días	mar 15/04/25	10	15	$4.476.997	0%	$4.476.997
15			FIN DE OBRA			mar 15/04/25	0 días	mar 15/04/25	14		$0	0%	$0

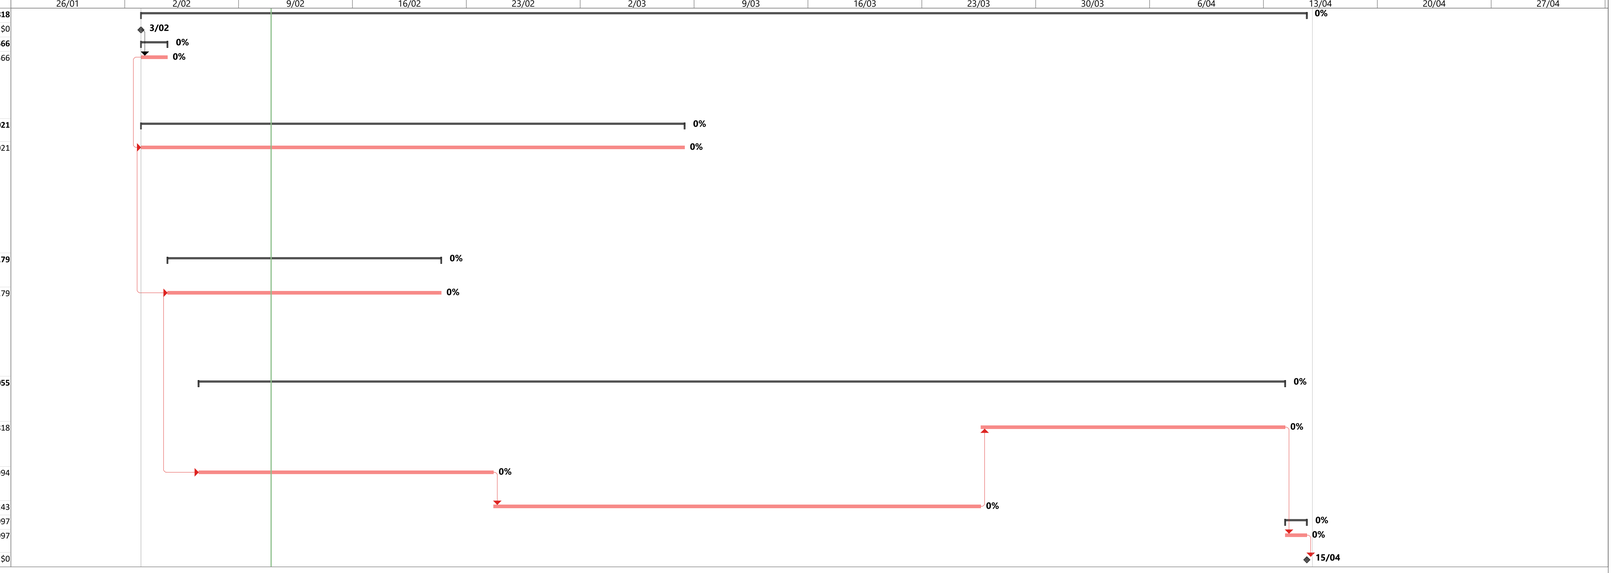

Johan Vicente Villa Orjuela
Diretor de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDADES	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% completado
1			**CDC BALCANES**			**lun 10/02/25**	**18 días**	**sáb 1/03/25**			**$0**	**0%**
2			INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		5	$0	0%
3		**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 10/02/25**	**18 días**	**sáb 1/03/25**			**$0**	**0%**
4		5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2	jue 27/02/25	2 días	sáb 1/03/25	5	6	$1.799.698	0%
5		21.4	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.45 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	163.86	lun 10/02/25	16 días	jue 27/02/25	2	4	$24.627.981	0%
6			FIN DE OBRA			sáb 1/03/25	0 días	sáb 1/03/25	4		$0	0%

sep | tri 4, 2023: oct, nov, dic | tri 1, 2024: ene, feb, mar | tri 2, 2024: abr, may, jun | tri 3, 2024: jul

ING. JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
DIRECTOR CONTRATISTA

ING. NESTOR ORLANDO CORREAL
DIRECTOR INTERVENTORIA


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UNI	CANTID	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% completado
1			**CELEBRA LA VIDA**			**18 días**	**lun 10/02/25**	**sáb 1/03/25**			**$0**	**0%**
2			INICIO DE OBRA			1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25		4;12	$0	0%
3		**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**2 días**	**lun 10/02/25**	**mié 12/02/25**			**$0**	**0%**
4		1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	27,5	2 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	2	6	$618.317	0%
5		**3.2.12**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**mié 12/02/25**	**lun 17/02/25**			**$0**	**0%**
6		3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21,5	4 días	mié 12/02/25	lun 17/02/25	4	8	$570.756	0%
7		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**lun 17/02/25**	**sáb 22/02/25**			**$0**	**0%**
8		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	27,5	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	6	10	$14.800.949	0%
9		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**lun 24/02/25**	**vie 28/02/25**			**$0**	**0%**
10		13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	223.55	5 días	lun 24/02/25	vie 28/02/25	8	14	$5.891.521	0%
11		**15.1.3**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**lun 10/02/25**	**sáb 15/02/25**			**$0**	**0%**
12		15.1.3	CERROJO O TIPO TEJO	UN	3	5 días	lun 10/02/25	sáb 15/02/25	2	15	$269.480	0%
13		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**1 día**	**vie 28/02/25**	**sáb 1/03/25**			**$0**	**0%**
14		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	223.55	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	10	15	$1.484.915	0%
15			FIN DE OBRA			0 días	sáb 1/03/25	sáb 1/03/25	12;14		$0	0%

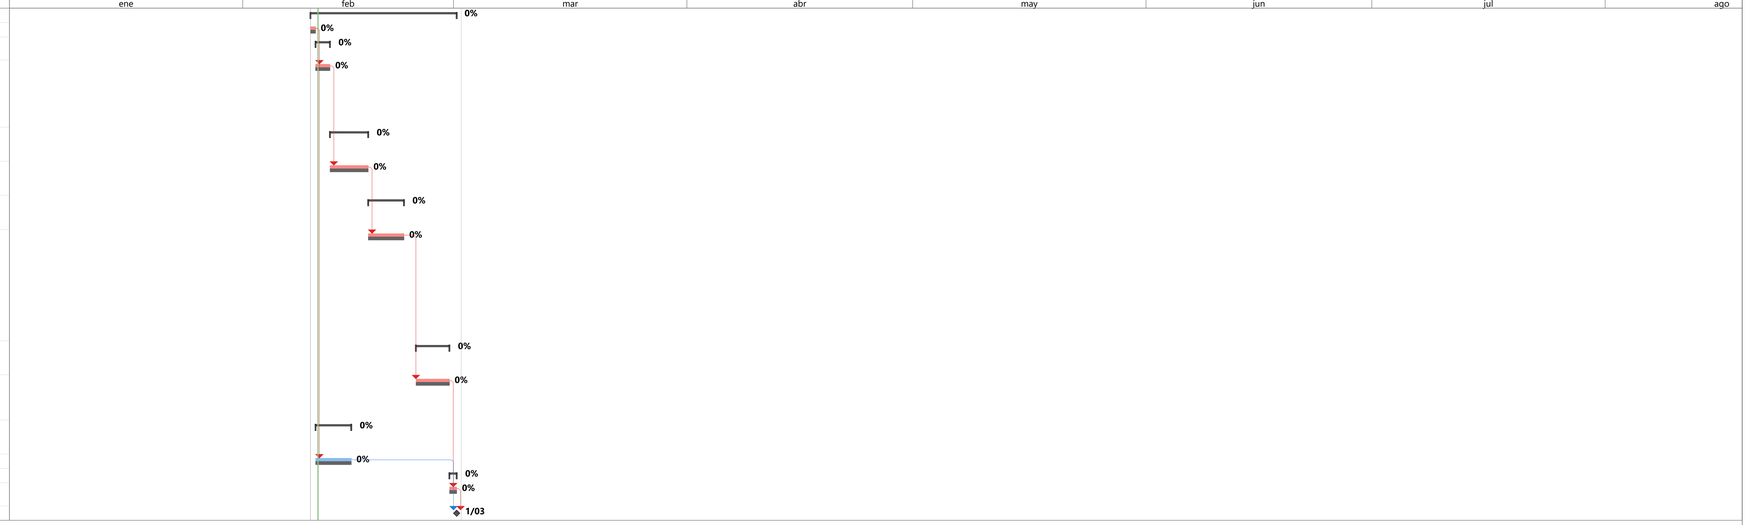

Johan Vicente Villa Orjuela
Diretor de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoría


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% comple	Costo total	Variación
1			**JARDIN INFANTIL ESPERANZA OLIVARES**			**76,38 días**	**mié 15/01/25**	**mar 15/04/25**				**$0** **0%**	**$343.896.971**	**$343.896.971**
2			INICIO DE OBRA			0 días	mié 15/01/25	mié 15/01/25		4;5		$0 0%	$0	$0
3		**1**	**PRELIMINARES**			**8,38 días**	**mié 15/01/25**	**vie 24/01/25**				**$0** **0%**	**$19.006.287**	**$19.006.287**
9		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**8 días**	**lun 10/03/25**	**mié 19/03/25**				**$0** **0%**	**$35.056.130**	**$35.056.130**
18		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**45 días**	**lun 17/02/25**	**vie 11/04/25**				**$0** **0%**	**$18.181.485**	**$18.181.485**
19		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	33.78	45 días	lun 17/02/25	vie 11/04/25	22	30	$18.181.485	0%	$18.181.485	$18.181.485
20		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**20,25 días**	**jue 23/01/25**	**lun 17/02/25**				**$0** **0%**	**$66.295.617**	**$66.295.617**
24		**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**25 días**	**vie 7/02/25**	**lun 10/03/25**				**$0** **0%**	**$46.308.970**	**$46.308.970**
25		14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	235.53	25 días	vie 7/02/25	lun 10/03/25	28CC+10 días	14;10	$46.308.970	0%	$46.308.970	$46.308.970
26		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**35 días**	**mar 28/01/25**	**lun 10/03/25**				**$0** **0%**	**$82.442.963**	**$82.442.963**
27		17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	42.896	5 días	mar 4/03/25	lun 10/03/25	28	30	$2.732.210	0%	$2.732.210	$2.732.210
28		17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	262.70	30 días	mar 28/01/25	mar 4/03/25	23CC+3 días	25CC+10 días;27	$79.710.753	0%	$79.710.753	$79.710.753
29		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**70,25 días**	**mié 22/01/25**	**mar 15/04/25**				**$0** **0%**	**$76.605.520**	**$76.605.520**
30		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	262.70	3 días	vie 11/04/25	mar 15/04/25	27;19;16;17;15;.	33	$1.744.973	0%	$1.744.973	$1.744.973
31		**21**	**NO PREVISTOS**			**25 días**	**mié 22/01/25**	**mié 19/02/25**				**$0** **0%**	**$74.860.547**	**$74.860.547**
32		21.1	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR	KG	1826.3	25 días	mié 22/01/25	mié 19/02/25	7CC+2 días	23CC+2 días	$74.860.547	0%	$74.860.547	$74.860.547
33			FIN DE OBRA			0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	30		$0	0%	$0	$0

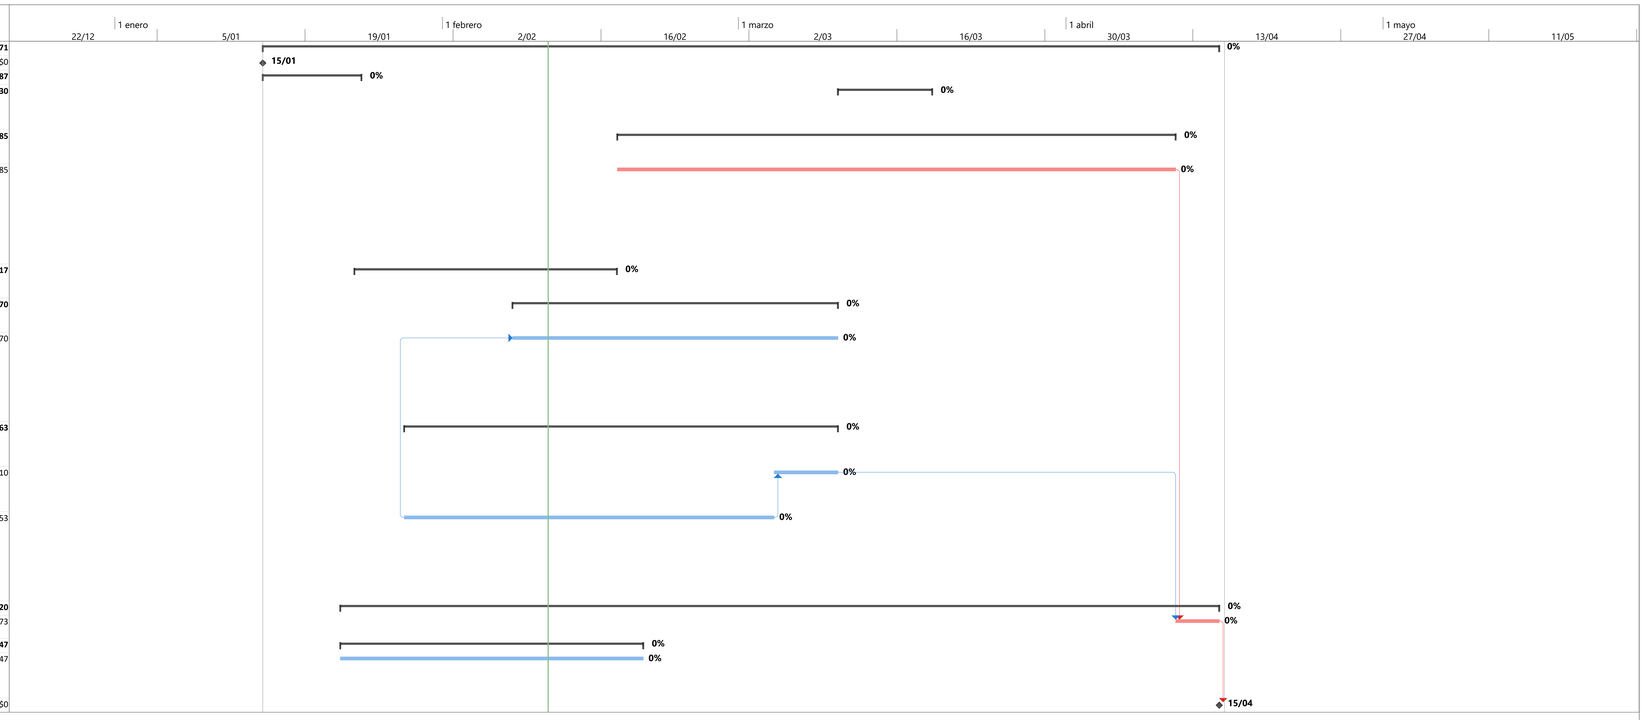


Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria

Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTI	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% comple	Costo total	Variación
1			**JI OASIS**			**jue 16/01/25**	**75 días**	**mar 15/04/25**				**$0** **0%**	**$232.332.436**	**$232.332.436**
2			INICIO DE OBRA			jue 16/01/25	0 días	jue 16/01/25		4		$0 0%	$0	$0
3		**1**	**PRELIMINARES**			**jue 16/01/25**	**5 días**	**mié 22/01/25**				**$0** **0%**	**$16.203.500**	**$16.203.500**
4		1.1.3	REPLANTEO	M2	193.92	jue 16/01/25	1 día	jue 16/01/25	2	5;6	$1.437.477	0%	$1.437.477	$1.437.477
5		1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	54,68	jue 16/01/25	1 día	vie 17/01/25	4	9	$2.901.148	0%	$2.901.148	$2.901.148
6		1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,77	jue 16/01/25	1 día	vie 17/01/25	4	13;14	$646.821	0%	$646.821	$646.821
7		1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	M2	195,30	vie 17/01/25	3 días	mié 22/01/25	8CC	37	$7.758.699	0%	$7.758.699	$7.758.699
8		1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	128	vie 17/01/25	2 días	mar 21/01/25	9CC	7CC	$2.969.279	0%	$2.969.279	$2.969.279
9		1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,85	vie 17/01/25	2 días	mar 21/01/25	5	8CC	$490.076	0%	$490.076	$490.076
10		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 5/03/25**	**15 días**	**vie 21/03/25**				**$0** **0%**	**$1.024.556**	**$1.024.556**
11		3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	29,19	mié 5/03/25	15 días	vie 21/03/25	27	23	$1.024.556	0%	$1.024.556	$1.024.556
12		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**vie 17/01/25**	**15 días**	**mié 5/02/25**				**$0** **0%**	**$29.740.727**	**$29.740.727**
13		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓ	UN	13,00	vie 17/01/25	3 días	mié 22/01/25	6	15	$3.591.996	0%	$3.591.996	$3.591.996
14		5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	vie 17/01/25	3 días	mié 22/01/25	6	15	$2.245.746	0%	$2.245.746	$2.245.746
15		5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15	mié 22/01/25	3 días	vie 24/01/25	13;14	16	$1.032.122	0%	$1.032.122	$1.032.122
16		5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	15	vie 24/01/25	3 días	mié 29/01/25	15	17	$373.569	0%	$373.569	$373.569
17		5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	UN	29,00	mié 29/01/25	3 días	vie 31/01/25	16	18;19	$12.573.093	0%	$12.573.093	$12.573.093
18		5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	vie 31/01/25	3 días	mié 5/02/25	17	35	$4.499.246	0%	$4.499.246	$4.499.246
19		5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	24,00	vie 31/01/25	3 días	mié 5/02/25	17	35	$5.424.955	0%	$5.424.955	$5.424.955
20		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 5/03/25**	**31 días**	**jue 10/04/25**				**$0** **0%**	**$15.483.272**	**$15.483.272**
21		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	28,77	mié 5/03/25	31 días	jue 10/04/25	27	23	$15.483.272	0%	$15.483.272	$15.483.272
22		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**jue 20/02/25**	**45 días**	**mar 15/04/25**				**$0** **0%**	**$52.915.327**	**$52.915.327**
23		13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	57,54	vie 11/04/25	3 días	mar 15/04/25	11;21	35	$1.045.237	0%	$1.045.237	$1.045.237
24		13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	57,54	mié 5/03/25	3 días	vie 7/03/25	27	35	$831.733	0%	$831.733	$831.733
25		13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1053,9	jue 20/02/25	3 días	lun 24/02/25	37	33;32	$51.038.357	0%	$51.038.357	$51.038.357
26		**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 3/03/25**	**2 días**	**mié 5/03/25**				**$0** **0%**	**$6.728.415**	**$6.728.415**
27		14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	34,22	lun 3/03/25	2 días	mié 5/03/25	31	24;11;21	$6.728.415	0%	$6.728.415	$6.728.415
28		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 26/02/25**	**1 día**	**mié 26/02/25**				**$0** **0%**	**$194.623**	**$194.623**
29		15.1.1	CERRADURA CILÍNDRICA	UN	3,00	mié 26/02/25	1 día	mié 26/02/25	32	35	$194.623	0%	$194.623	$194.623
30		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 24/02/25**	**6 días**	**lun 3/03/25**				**$0** **0%**	**$71.897.883**	**$71.897.883**
31		17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1053.9	vie 28/02/25	1 día	lun 3/03/25	33	27	$7.877.478	0%	$7.877.478	$7.877.478

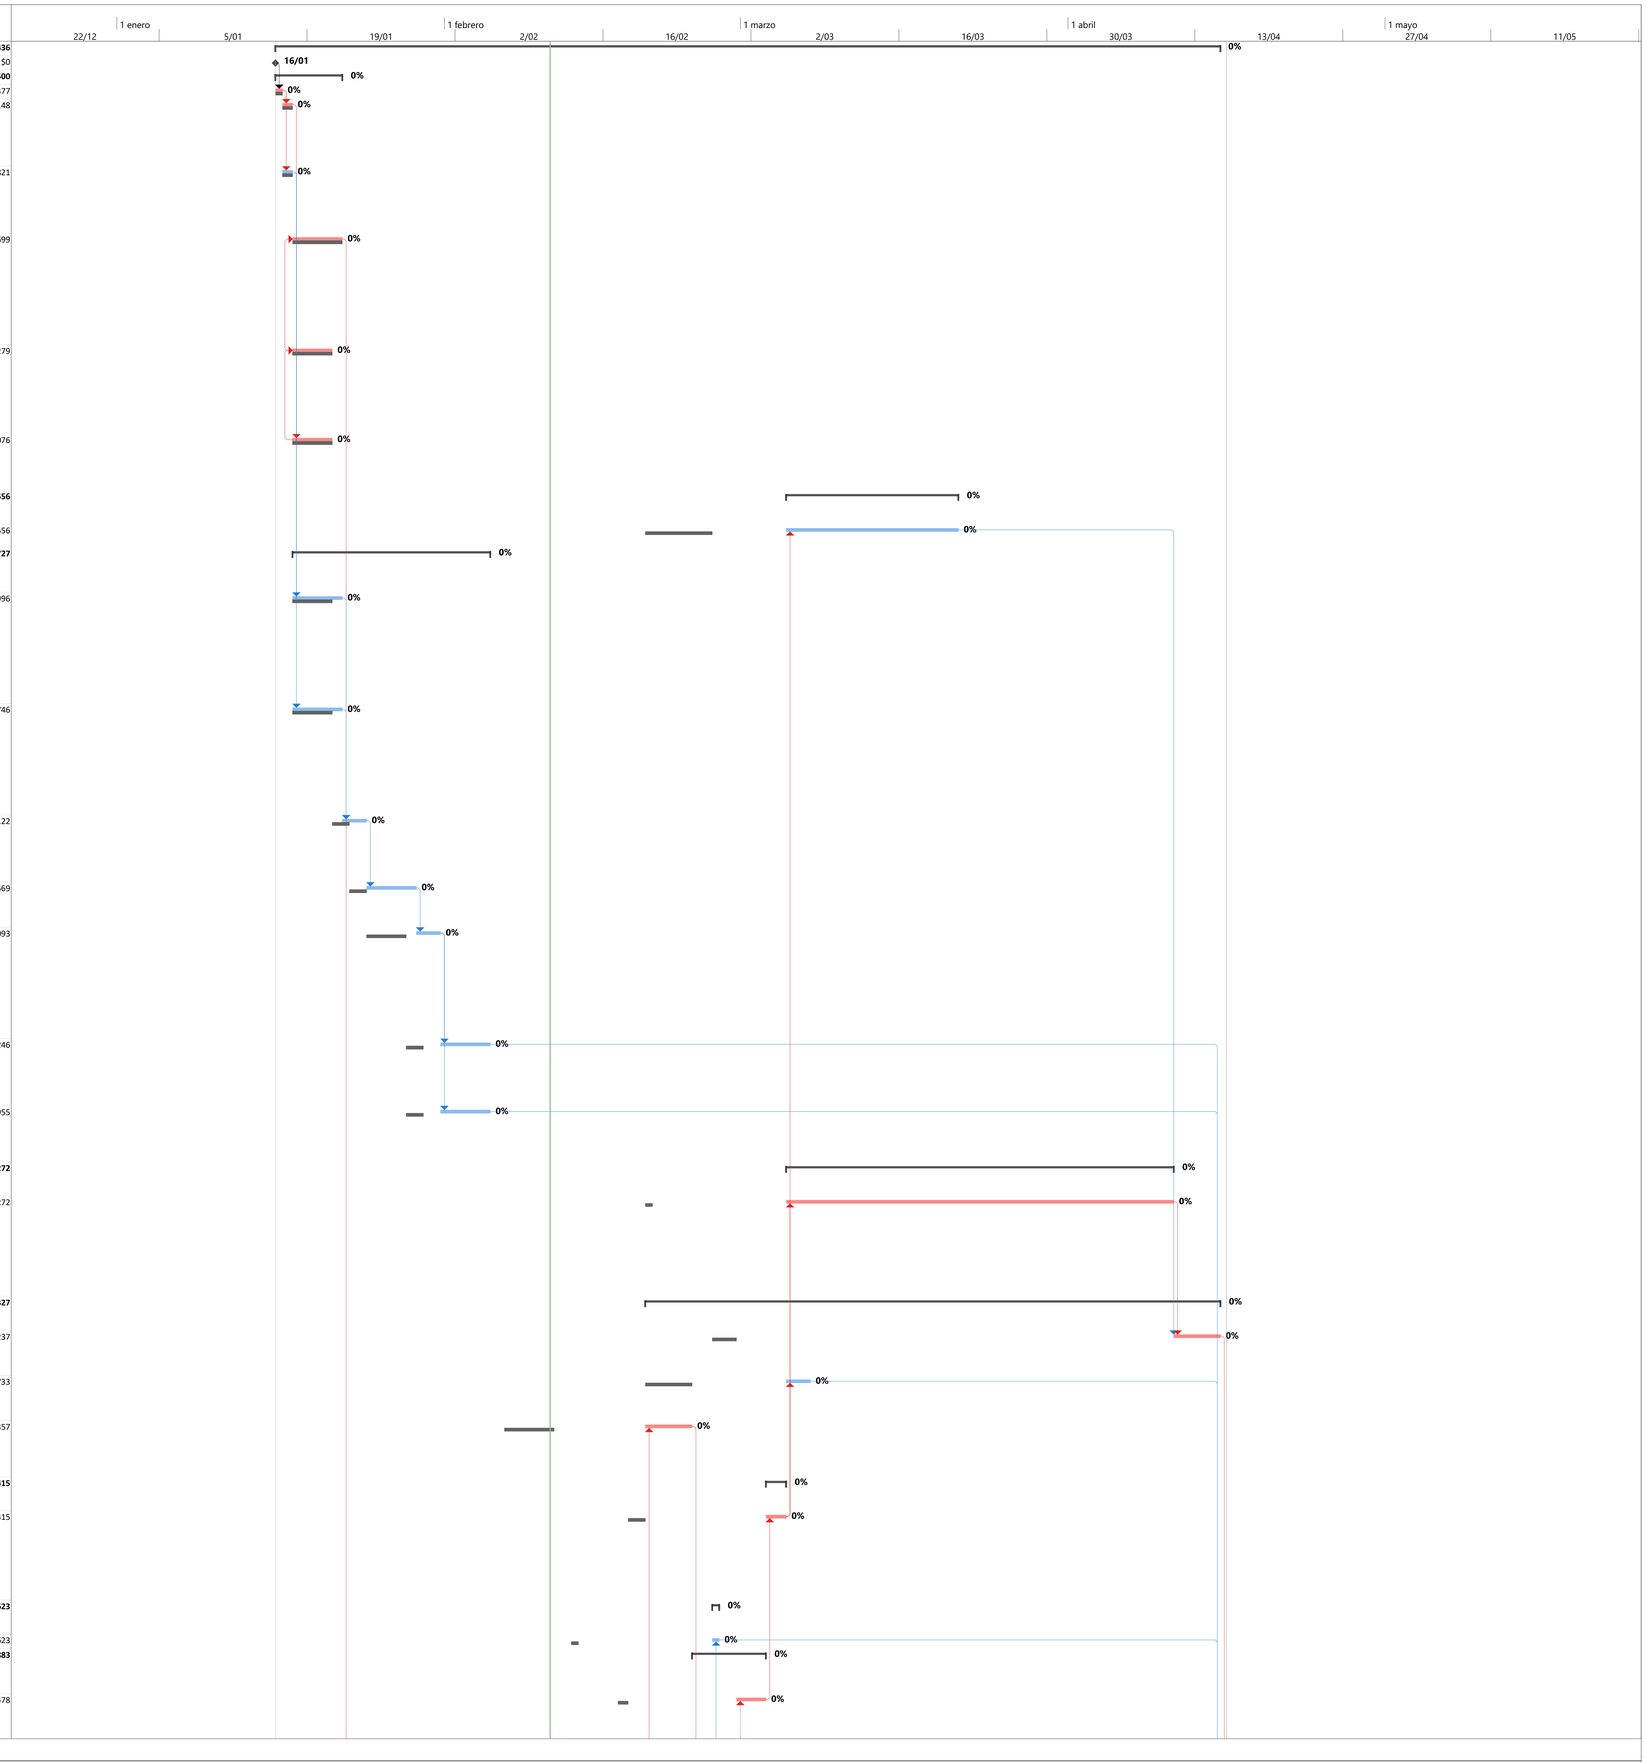


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTI	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% comple	Costo total	Variación
32		17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	19,85	lun 24/02/25	2 días	mié 26/02/25	25	29	$3.334.871	0%	$3.334.871	$3.334.871
33		17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	200	lun 24/02/25	5 días	vie 28/02/25	25	31	$60.685.535	0%	$60.685.535	$60.685.535
34		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**mar 15/04/25**	**0 días**	**mar 15/04/25**			**$0**	**0%**	**$1.441.407**	**$1.441.407**
35		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	217	mar 15/04/25	0 días	mar 15/04/25	18;19;23;24;29	38	$1.441.407	0%	$1.441.407	$1.441.407
36		**21**	**NO PREVISTOS**			**mié 22/01/25**	**25 días**	**mié 19/02/25**			**$0**	**0%**	**$36.702.726**	**$36.702.726**
37		21.1	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR	KG	917.80	mié 22/01/25	25 días	mié 19/02/25	7	25	$36.702.726	0%	$36.702.726	$36.702.726
38			FIN DE OBRA			mar 15/04/25	0 días	mar 15/04/25	35		$0	0%	$0	$0

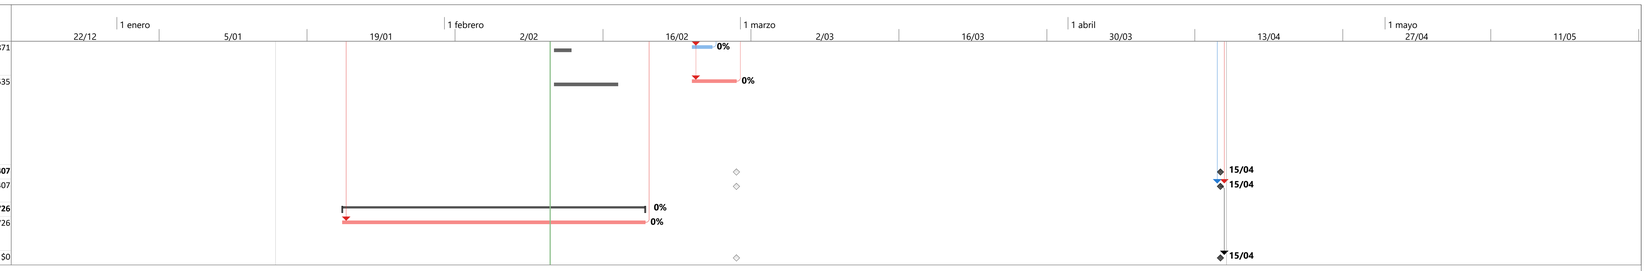

Johan Vicente Villa Orjuela
Diretor de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTI	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo fijo	% comple	Costo total	Variación
1			**JARDIN INFANTIL SAMORE**			**20,88 días**	**jue 16/01/25**	**lun 10/02/25**			**$0 0%**	**$337.355.510**	**$337.355.510**
2			INICIO DE OBRA			0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25			$0 0%	$0	$0
3		**1**	**PRELIMINARES**			**16,88 días**	**jue 16/01/25**	**mar 4/02/25**			**$0 0%**	**$159.145.425**	**$159.145.425**
13		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mar 21/01/25**	**mié 22/01/25**			**$0 0%**	**$1.827.710**	**$1.827.710**
15		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**jue 23/01/25**	**mar 28/01/25**			**$0 0%**	**$1.898.160**	**$1.898.160**
26		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**jue 16/01/25**	**mié 29/01/25**			**$0 0%**	**$19.817.840**	**$19.817.840**
38		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**vie 7/02/25**	**lun 10/02/25**			**$0 0%**	**$2.001.879**	**$2.001.879**
40		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**vie 7/02/25**	**lun 10/02/25**			**$0 0%**	**$824.468**	**$824.468**
42		**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**vie 7/02/25**	**lun 10/02/25**			**$0 0%**	**$1.387.974**	**$1.387.974**
44		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15,88 días**	**lun 20/01/25**	**jue 6/02/25**			**$0 0%**	**$55.641.695**	**$55.641.695**
47		**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mar 28/01/25**	**mié 29/01/25**			**$0 0%**	**$32.230.784**	**$32.230.784**
49		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**jue 6/02/25**	**vie 7/02/25**			**$0 0%**	**$61.489.699**	**$61.489.699**
52		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**0 días**	**lun 10/02/25**	**lun 10/02/25**			**$0 0%**	**$1.089.877**	**$1.089.877**
53		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	164.08	0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	3;13;26;40;44;4	$1.089.877	0%	$1.089.877	$1.089.877
54			FIN DE OBRA			0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	3;13;26;40;44;4	$0	0%	$0	$0

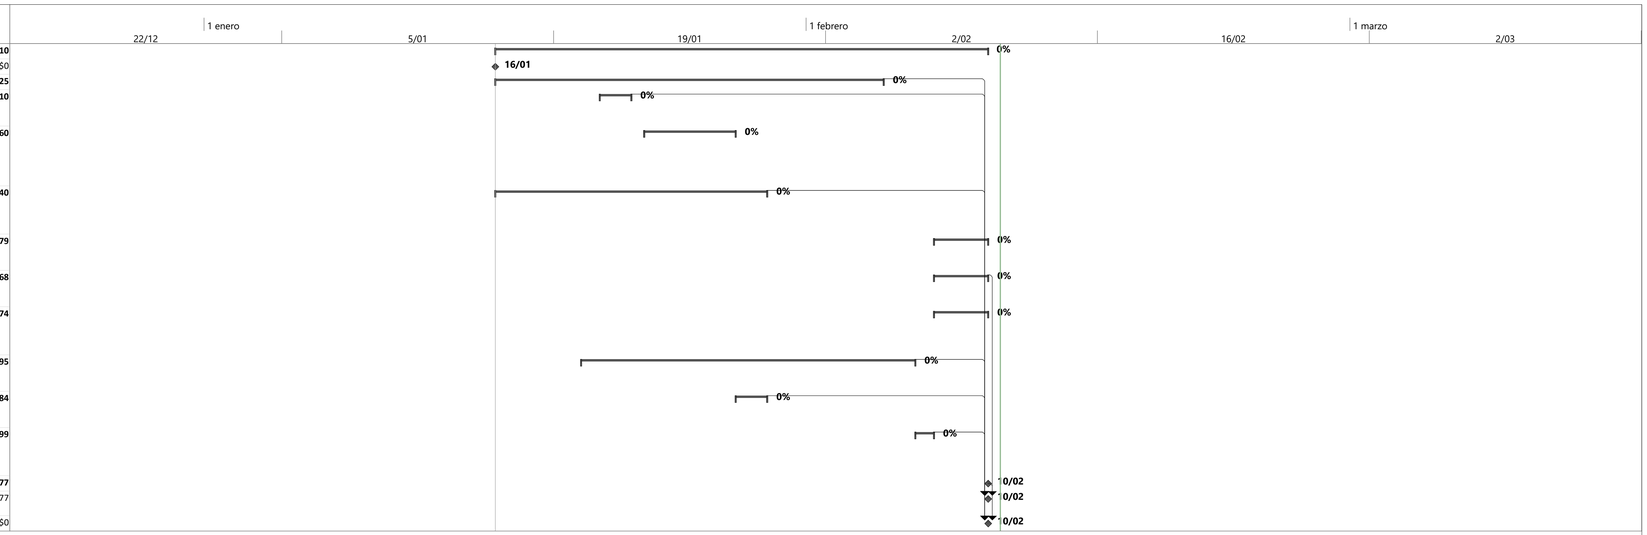

Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director Interventoria


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTI	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% comple
1			**JULIO CESAR SANCHEZ**			**16 días**	**mié 22/01/25**	**lun 10/02/25**			**$0**	**0%**
2			INICIO DE OBRA			0 días	mié 22/01/25	mié 22/01/25	4;5		$0	0%
3		**1**	**PRELIMINARES**			**3 días**	**mié 22/01/25**	**vie 24/01/25**			**$0**	**0%**
4		1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	M2	147.99	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	2	11	$5.879.204	0%
5		1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	4,00	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	2	7	$91.623	0%
6		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**8 días**	**vie 24/01/25**	**mar 4/02/25**			**$0**	**0%**
7		5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	UN	4,00	3 días	vie 24/01/25	mar 28/01/25	5	9	$1.734.220	0%
8		5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	4,00	4 días	mié 29/01/25	mar 4/02/25	9	15	$906.924	0%
9		5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	7	8	$236.257	0%
10		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**vie 24/01/25**	**jue 30/01/25**			**$0**	**0%**
11		13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	633.80	5 días	vie 24/01/25	jue 30/01/25	4	14	$30.693.719	0%
12		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**jue 30/01/25**	**vie 7/02/25**			**$0**	**0%**
13		17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	20	2 días	mié 5/02/25	vie 7/02/25	14	15	$3.005.978	0%
14		17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	147,99	5 días	jue 30/01/25	mié 5/02/25	11	13	$37.305.386	0%
15		20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL			1 día	vie 7/02/25	lun 10/02/25	8;13	16	$0	0%
16			FIN DE OBRA			0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	15		$0	0%

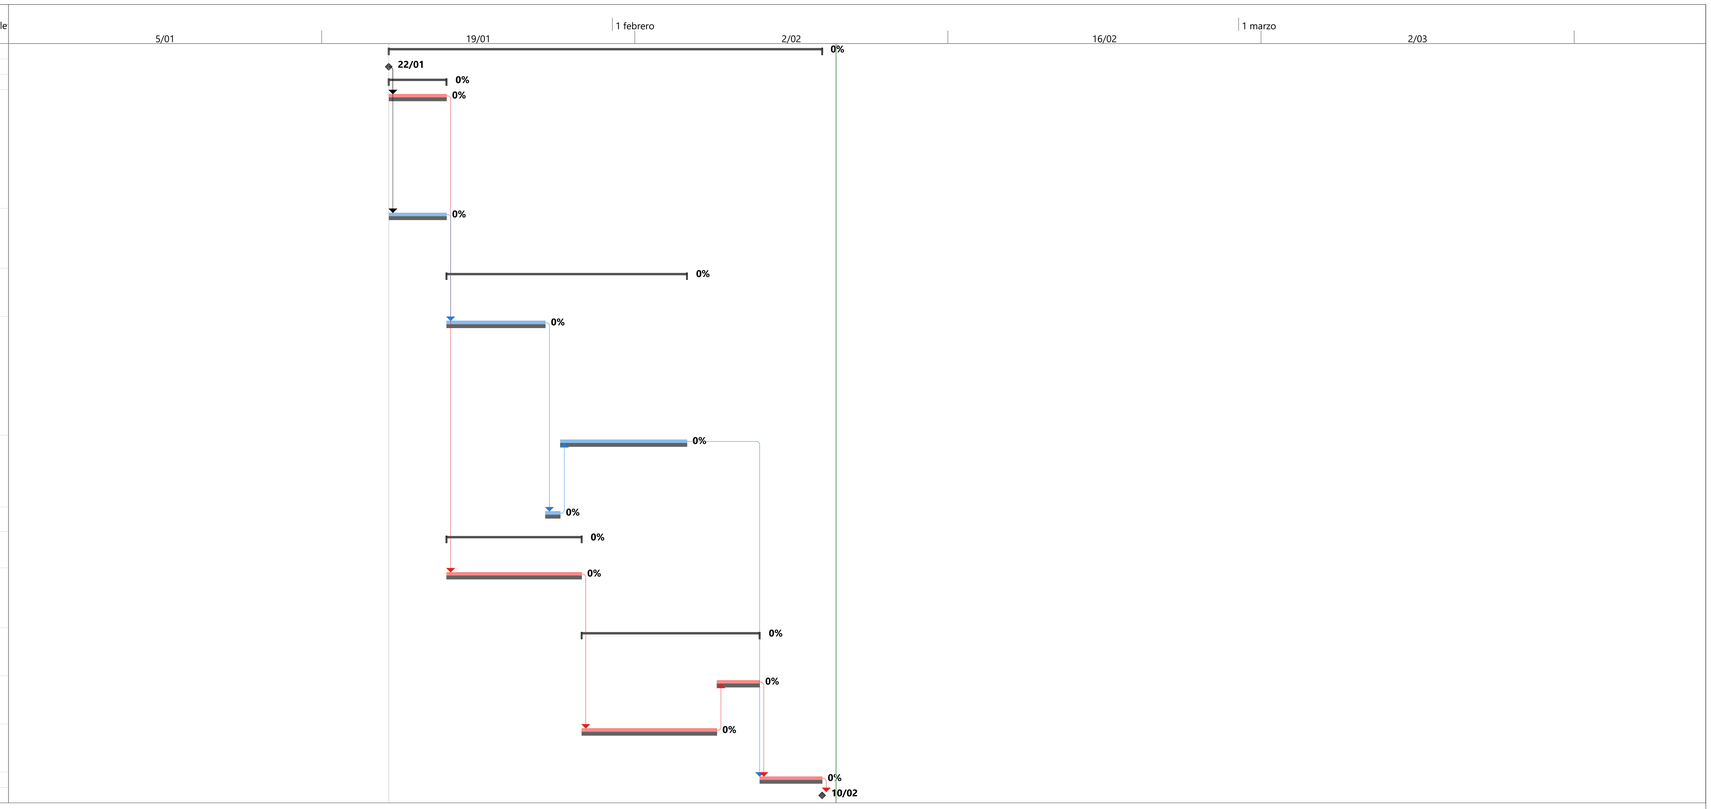


Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria

Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTI	Comienzo	Duración	Fin	Pre	Costo fijo
1			**CENTRO DIA MONTAÑA DEL SABER**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**		$0
2			INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		$0
3		**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**		$0
4		1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	216.27	lun 10/02/25	5 días	vie 14/02/25	2	$6.266.314
5			FIN DE OBRA			vie 14/02/25	0 días	vie 14/02/25	2;4	$0


mar 11/02
mié 12/02
jue 13/02
vie 14/02
6
12
6
12
6
12


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDA	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo
1			**CENTRO DIA MONTAÑA DEL SABER**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**			**$0**
2			INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		4;6	$0
3		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**			**$0**
4		5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3	lun 10/02/25	5 días	vie 14/02/25	2	7	$678.119
5		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**		**7**	**$0**
6		15.1.1	CERRADURA CILÍNDRICA	UN	4	lun 10/02/25	5 días	vie 14/02/25	2		$259.497
7			FIN DE OBRA			vie 14/02/25	0 días	vie 14/02/25	4;5		$0



Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria

Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UNI	CANTID	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo
1			**JI BELLO HORIZONTE**			**jue 23/01/25**	**69 días**	**mar 15/04/25**			**$0**
2			INICIO DE OBRA			jue 23/01/25	0 días	jue 23/01/25		4;5;7	$0
3		**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**jue 23/01/25**	**5 días**	**mié 29/01/25**			**$0**
4		1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	3	jue 23/01/25	5 días	mié 29/01/25	2	14	$78.471
5		1.3.7	SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	59.10	jue 23/01/25	5 días	mié 29/01/25	2	14	$1.328.758
6		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**jue 23/01/25**	**28 días**	**mar 25/02/25**			**$0**
7		5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4 HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA	UN	16	jue 23/01/25	8 días	sáb 1/02/25	2	8;9;10	$6.263.383
8		5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2	lun 3/02/25	7 días	lun 10/02/25	7	9	$1.799.698
9		5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15	lun 10/02/25	7 días	mar 18/02/25	7;8	10	$3.390.597
10		5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	2	mar 18/02/25	6 días	mar 25/02/25	7;9	19	$130.673
11		**9**	**CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**			**jue 23/01/25**	**40 días**	**mar 11/03/25**			**$0**
12		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	59.1	jue 23/01/25	40 días	mar 11/03/25		19	$31.808.584
13		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 29/01/25**	**47 días**	**mié 26/03/25**			**$0**
14		13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	59.10	mié 29/01/25	25 días	mié 26/02/25	4;5	15	$1.073.659
15		13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	59.10	jue 27/02/25	22 días	mié 26/03/25	14	17	$854.350
16		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 26/03/25**	**15 días**	**vie 11/04/25**			**$0**
17		17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15,00	mié 26/03/25	15 días	vie 11/04/25	15	19	$955.541
18		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**vie 11/04/25**	**2 días**	**mar 15/04/25**			**$0**
19		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.10	vie 11/04/25	2 días	mar 15/04/25	17;12;10	20	$392.568
20			FIN DE OBRA			mar 15/04/25	0 días	mar 15/04/25	19		$0

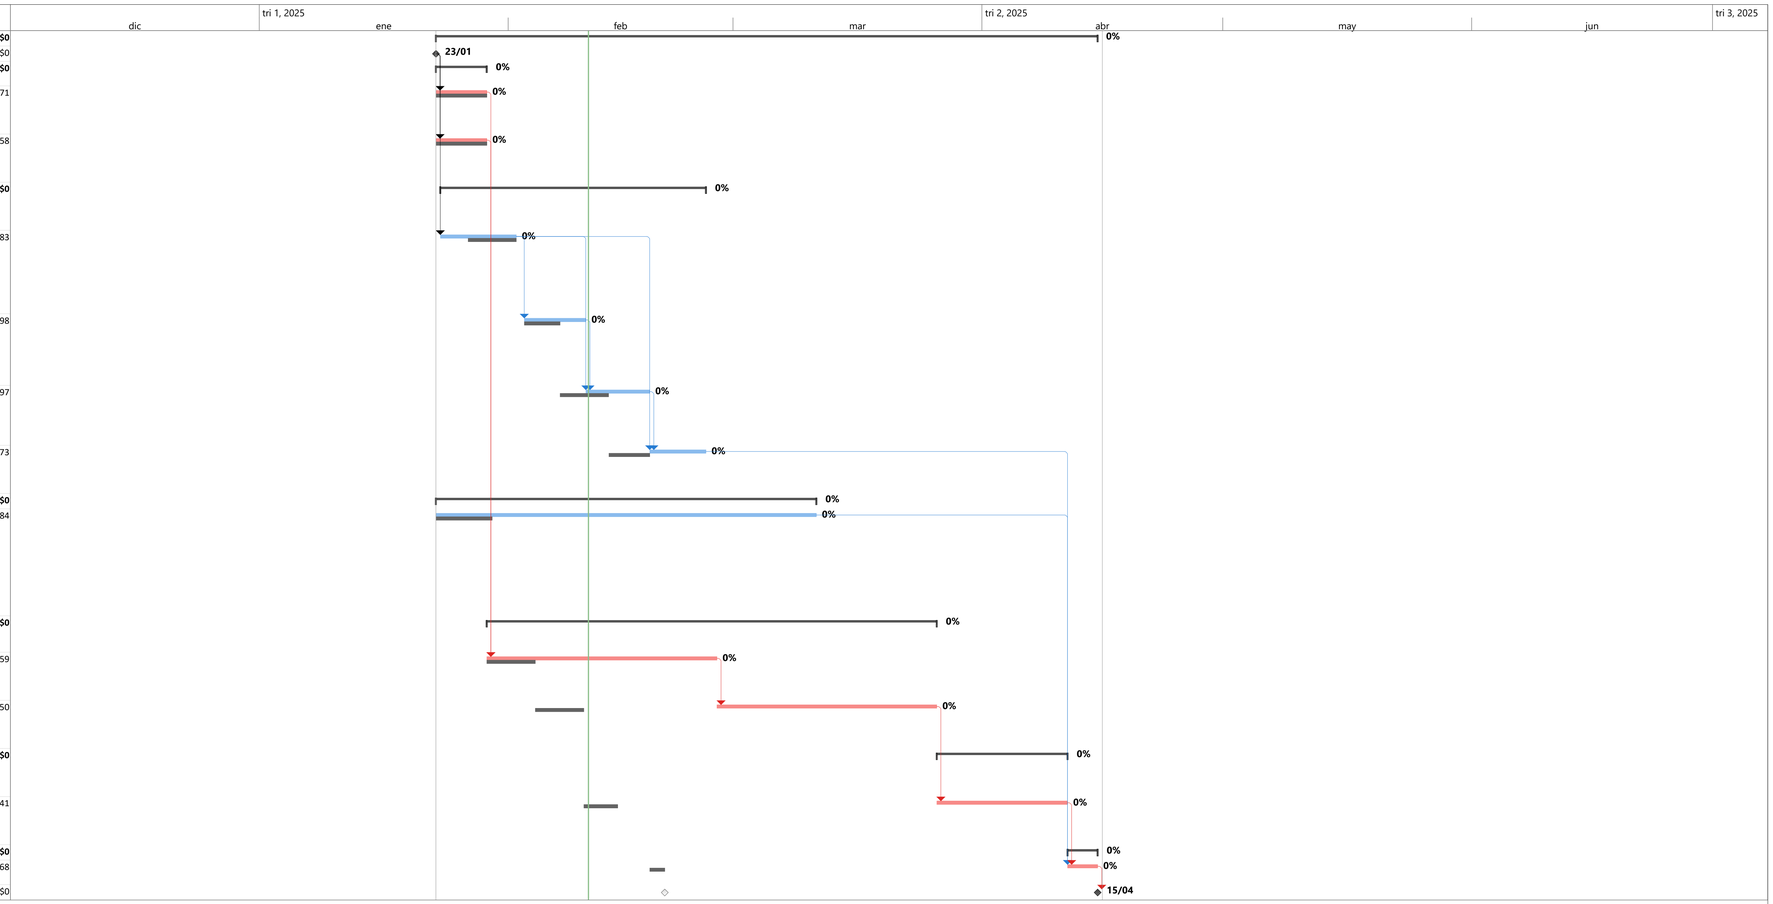

Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria

Id	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDA	Comienzo	Duración	Fin	Predec	Costo fijo	% completado	Costo total
1		**CD JI LAS FLOREZ**			**lun 10/02/25**	**18 días**	**sáb 1/03/25**		**$0**	**0%**	**$75.257.116**
2		INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		$0	0%	$0
3	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES**			**lun 10/02/25**	**1 día**	**lun 10/02/25**		**$0**	**0%**	**$256.081**
4	1.1.3	REPLANTEO	M2	34,792	lun 10/02/25	1 día	lun 10/02/25	2	$256.081	0%	$256.081
5	**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**lun 10/02/25**	**3 días**	**mié 12/02/25**		**$0**	**0%**	**$7.479.001**
6	1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	M2	183,65	lun 10/02/25	2 días	mar 11/02/25	2	$7.295.755	0%	$7.295.755
7	1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	8,00	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	$183.247	0%	$183.247
8	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**jue 20/02/25**	**5 días**	**mié 26/02/25**		**$0**	**0%**	**$5.276.758**
9	5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	UN	8,00	jue 20/02/25	3 días	lun 24/02/25	17	$3.468.440	0%	$3.468.440
10	5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	lun 24/02/25	2 días	mié 26/02/25	9	$1.808.318	0%	$1.808.318
11	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mar 11/02/25**	**3 días**	**vie 14/02/25**		**$0**	**0%**	**$13.395.207**
12	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	276,60	mar 11/02/25	3 días	vie 14/02/25	6	$13.395.207	0%	$13.395.207
13	**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 17/02/25**	**2 días**	**mié 19/02/25**		**$0**	**0%**	**$194.623**
14	15.1.1	CERRADURA CILÍNDRICA	UN	3	lun 17/02/25	2 días	mié 19/02/25	2FC+7	$194.623	0%	$194.623
15	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**vie 14/02/25**	**8 días**	**lun 24/02/25**		**$0**	**0%**	**$46.621.500**
16	17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6	jue 20/02/25	3 días	lun 24/02/25	17	$327.657	0%	$327.657
17	17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	183,65	vie 14/02/25	5 días	jue 20/02/25	6;12	$46.293.843	0%	$46.293.843
18	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**mié 26/02/25**	**3 días**	**sáb 1/03/25**		**$0**	**0%**	**$2.033.945**
19	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	306,21	mié 26/02/25	3 días	sáb 1/03/25	3;5;8;1	$2.033.945	0%	$2.033.945
20		FIN DE OBRA			sáb 1/03/25	0 días	sáb 1/03/25	3;5;8;1	$0	0%	$0


septiembre | octubre | noviembre | diciembre

P M F | P M F | P M F | P M

ING. JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
DIRECTOR CONTRATISTA

ING. NESTOR ORLANDO CORREAL
DIRECTOR INTERVENTORÍA


Id	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDA	Comienzo	Duración	Fin	Prede	Costo fijo	% completado	Costo total	Variación
1		**CD SAN DAVID**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**		**$0**	**0%**	**$3.931.661**	**$3.931.661**
2		INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		$0	0%	$0	$0
3	1	PREMILINARES			lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25		$0	0%	$0	$0
4	1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y QUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	$52.314	0%	$52.314	$52.314
5	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 10/02/25**	**3,38 días**	**mié 12/02/25**		**$0**	**0%**	**$2.874.636**	**$2.874.636**
6	5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	UN	4	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	$1.734.220	0%	$1.734.220	$1.734.220
7	5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	$904.159	0%	$904.159	$904.159
8	5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	$236.257	0%	$236.257	$236.257
9	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 10/02/25**	**5 días**	**vie 14/02/25**		**$0**	**0%**	**$1.004.712**	**$1.004.712**
10	12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PISO SEGURIDAD	UN	2,00	lun 10/02/25	5 días	vie 14/02/25	2	$1.004.712	0%	$1.004.712	$1.004.712
11		FIN DE OBRA			vie 14/02/25	0 días	vie 14/02/25	5;9	$0	0%	$0	$0



Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de Interventoria


Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDA	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo
1			**JI YUSTES**			**lun 10/02/25**	**6 días**	**sáb 15/02/25**			**$0**
2			INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		4	$0
3		**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**lun 10/02/25**	**2 días**	**mar 11/02/25**			**$0**
4		1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,78	lun 10/02/25	2 días	mar 11/02/25	2	6	$241.434
5		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mar 11/02/25**	**1 día**	**mié 12/02/25**			**$0**
6		13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26	mar 11/02/25	1 día	mié 12/02/25	4	8	$652.204
7		**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 12/02/25**	**2 días**	**vie 14/02/25**			**$0**
8		17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	9,78	mié 12/02/25	2 días	vie 14/02/25	6	10	$1.642.909
9		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**vie 14/02/25**	**1 día**	**sáb 15/02/25**			**$0**
10		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	9,78	vie 14/02/25	1 día	sáb 15/02/25	8	11	$64.963
11			FIN DE OBRA			sáb 15/02/25	0 días	sáb 15/02/25	10		$0

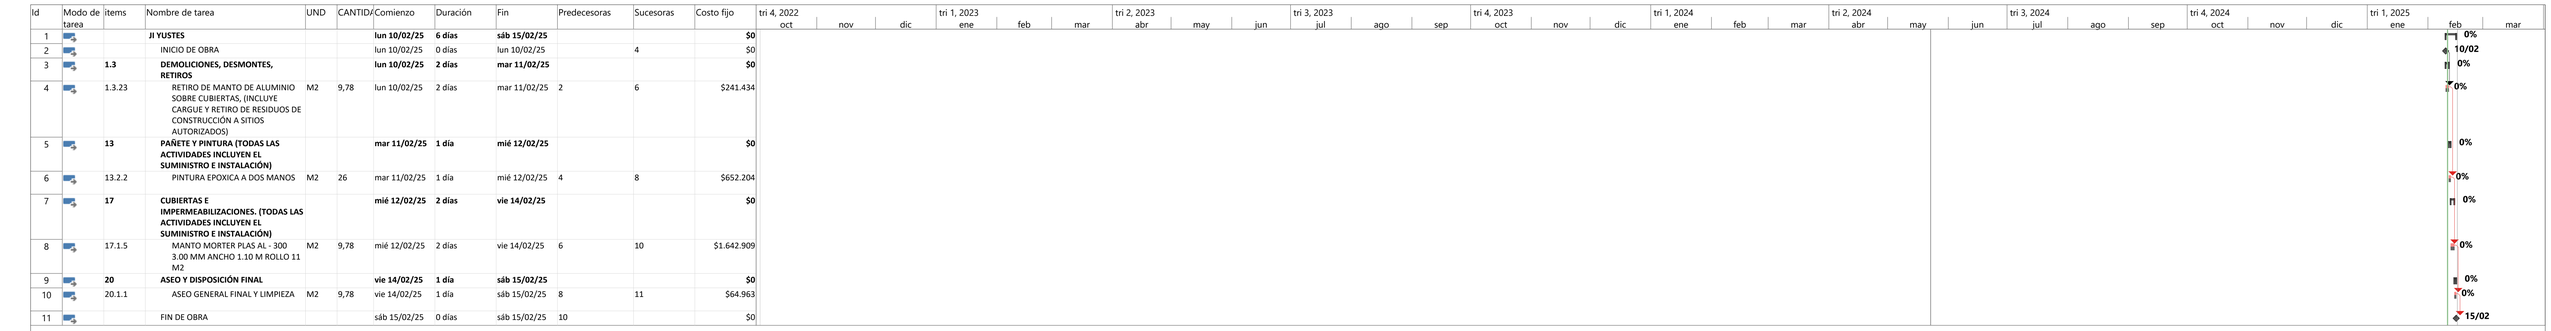

johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director de interventoria

Id	Modo de tarea	items	Nombre de tarea	UND	CANTIDA	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo fijo	% completado	Costo total	Variación
1			**AM VERDEGAL**			**lun 10/02/25**	**17 días**	**vie 28/02/25**			**$0**	**0%**	**$31.952.824**	**$31.952.824**
2			INICIO DE OBRA			lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25		4;6	$0	0%	$0	$0
3		**1**	**PRELIMINARES**			**lun 10/02/25**	**3 días**	**mié 12/02/25**			**$0**	**0%**	**$114.529**	**$114.529**
4		1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	5,00	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	8	$114.529	0%	$114.529	$114.529
5		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**lun 10/02/25**	**3 días**	**mié 12/02/25**			**$0**	**0%**	**$2.994.477**	**$2.994.477**
6		3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	112,8	lun 10/02/25	3 días	mié 12/02/25	2	13	$2.994.477	0%	$2.994.477	$2.994.477
7		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 12/02/25**	**11 días**	**mar 25/02/25**			**$0**	**0%**	**$9.176.467**	**$9.176.467**
8		5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6	mié 12/02/25	3 días	sáb 15/02/25	4	9	$2.245.746	0%	$2.245.746	$2.245.746
9		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	4	lun 17/02/25	3 días	mié 19/02/25	8	10	$1.962.378	0%	$1.962.378	$1.962.378
10		5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5	mié 19/02/25	2 días	vie 21/02/25	9	11	$4.499.246	0%	$4.499.246	$4.499.246
11		5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	5	vie 21/02/25	3 días	mar 25/02/25	10	17	$469.097	0%	$469.097	$469.097
12		**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**mié 12/02/25**	**9 días**	**sáb 22/02/25**			**$0**	**0%**	**$18.918.085**	**$18.918.085**
13		13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	112,80	mié 12/02/25	3 días	sáb 15/02/25	6	14	$2.972.774	0%	$2.972.774	$2.972.774
14		13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A=0.6M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	120.30	lun 17/02/25	3 días	mié 19/02/25	13	15	$2.160.257	0%	$2.160.257	$2.160.257
15		13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120.30	mié 19/02/25	3 días	sáb 22/02/25	14	17	$13.785.054	0%	$13.785.054	$13.785.054
16		**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**mar 25/02/25**	**3 días**	**vie 28/02/25**			**$0**	**0%**	**$749.266**	**$749.266**
17		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	9,78	mar 25/02/25	3 días	vie 28/02/25	11;15	18	$749.266	0%	$749.266	$749.266
18			FIN DE OBRA			vie 28/02/25	0 días	vie 28/02/25	17		$0	0%	$0	$0

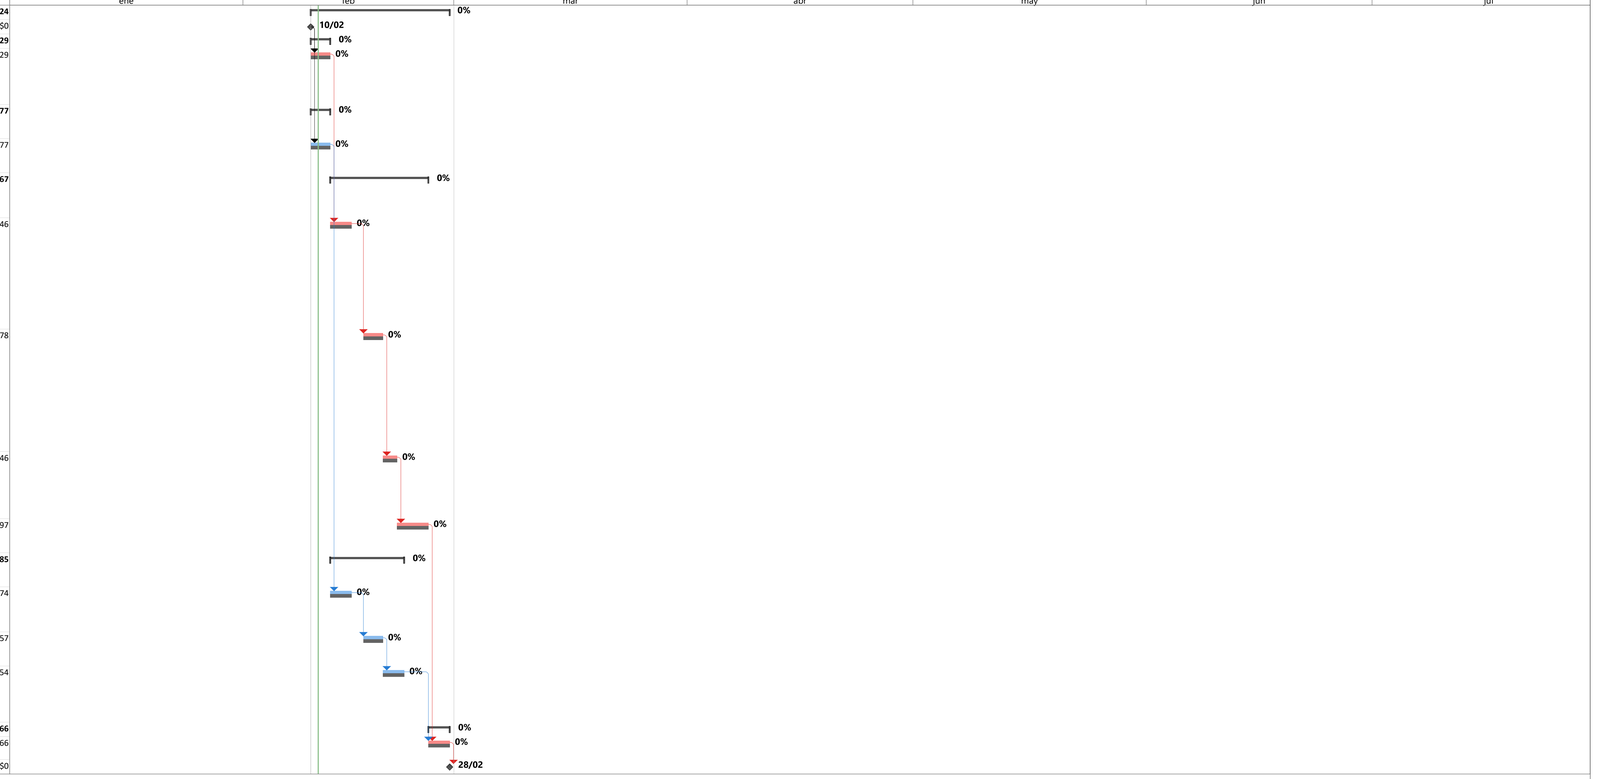

Johan Vicente Villa Orjuela
Director de Obra

Nestor Orlando Correal
Director Interventoria
