
ONTROL DE ASENTAMIENTO “VOLADOS SEGUNDO PISO”

Se materializan puntos de referencia para chequeos y control de asentamiento estructural en andén occidental. Estos con la finalidad de revisar los movimientos del mismo.






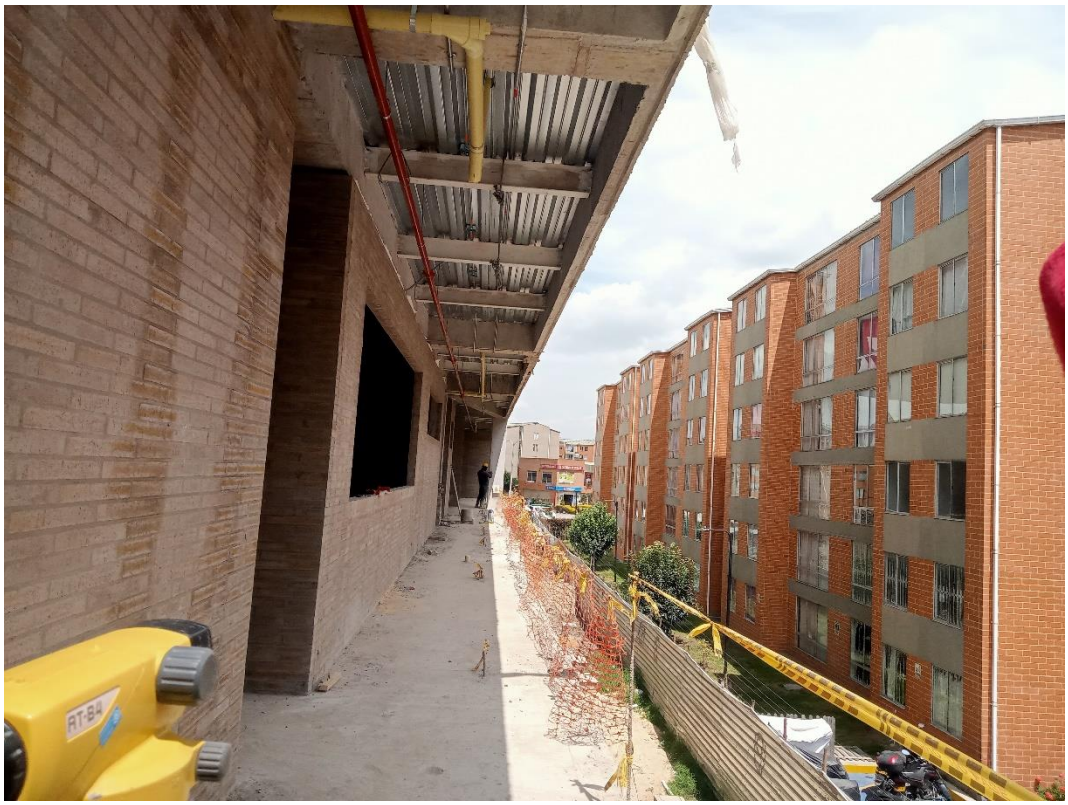


RT-64



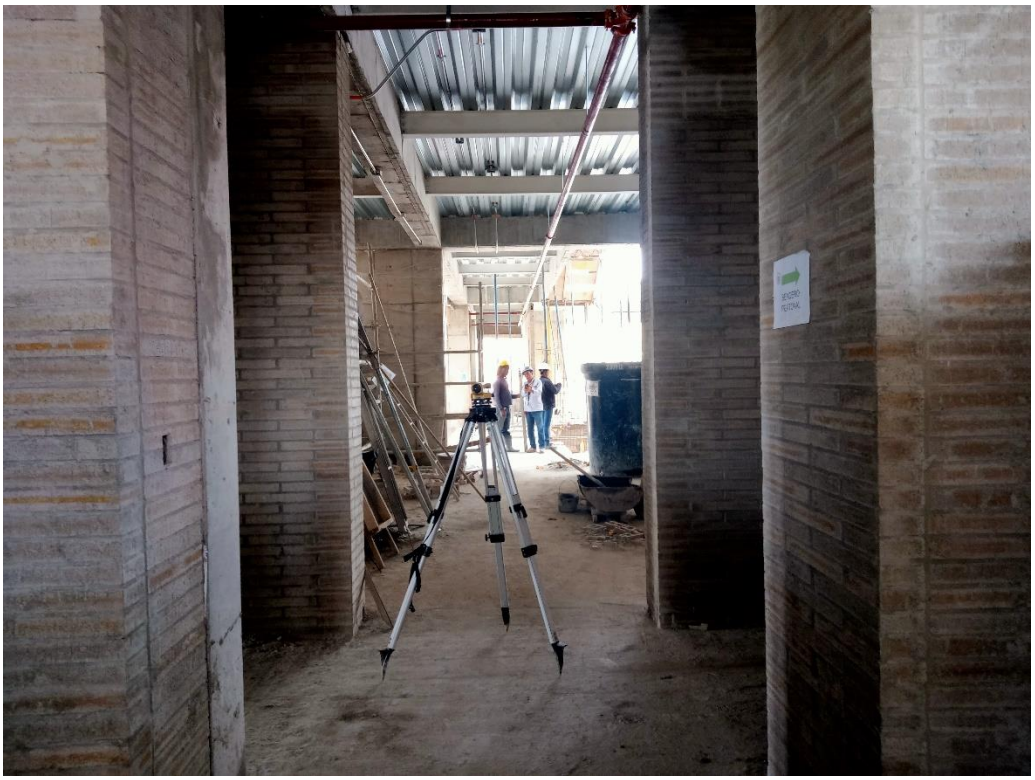

ASENTAMIENTO VOLADOS "SEGUNDO PISO"(09-11-2022)				
PUNTO	**V+**	**VI**	**ALT. INST**	**COTA**
NIVELETA	*1.430*		*2545.300*	*2543.870*
P-1		1.417		2543.883
P-2		1.407		2543.893
P-3		1.399		2543.901
P-4		1.419		2543.881
P-5		1.419		2543.881
P-6		1.439		2543.861
P-7		1.430		2543.870
P-8		1.430		2543.870
P-9		1.425		2543.875
P-10		1.418		2543.882
P-11		1.425		2543.875
P-12		1.429		2543.871
P-13		1.434		2543.866
P-14		1.425		2543.875
P-15		1.426		2543.874
P-16		1.423		2543.877

ASENTAMIENTO VOLADOS "SEGUNDO PISO" (01-03-2023)				
PUNTO	***V+***	***VI***	***ALT. INST***	***COTA***
NIVELETA	***1.430***		**2545.300**	**2543.870**
P-1		1.416		2543.884
P-2		1.406		2543.894
P-3		1.390		2543.910
P-4		1.416		2543.884
P-5		1.415		2543.885
P-6		1.436		2543.864
P-7		1.428		2543.872
P-8		1.427		2543.873
P-9		1.423		2543.877
P-10		1.415		2543.885
P-11		1.423		2543.877
P-12		1.428		2543.872
P-13		1.432		2543.868
P-14		1.423		2543.877
P-15		1.424		2543.876
P-16		1.421		2543.879

PUNTO	*DIFERENCIA*
P-1	-0.001
P-2	-0.001
P-3	-0.006
P-4	-0.003
P-5	-0.004
P-6	-0.003
P-7	-0.002
P-8	-0.003
P-9	-0.002
P-10	-0.003
P-11	-0.002
P-12	-0.001
P-13	-0.002
P-14	-0.002
P-15	-0.002
P-16	-0.002

GEOREFERENCIACION

