CONTROL DE ASENTAMIENTO Y VERTICALIDAD MURO OCCIDENTAL UE3

Se materializan puntos de referencia para chequeos de verticalidad y control de asentamiento estructural en muro occidental UE3. Esto con la finalidad de revisar los movimientos del mismo.







HI-TARGET


HI-TARGET


HI-TARGET

GEOREFERENCIACION

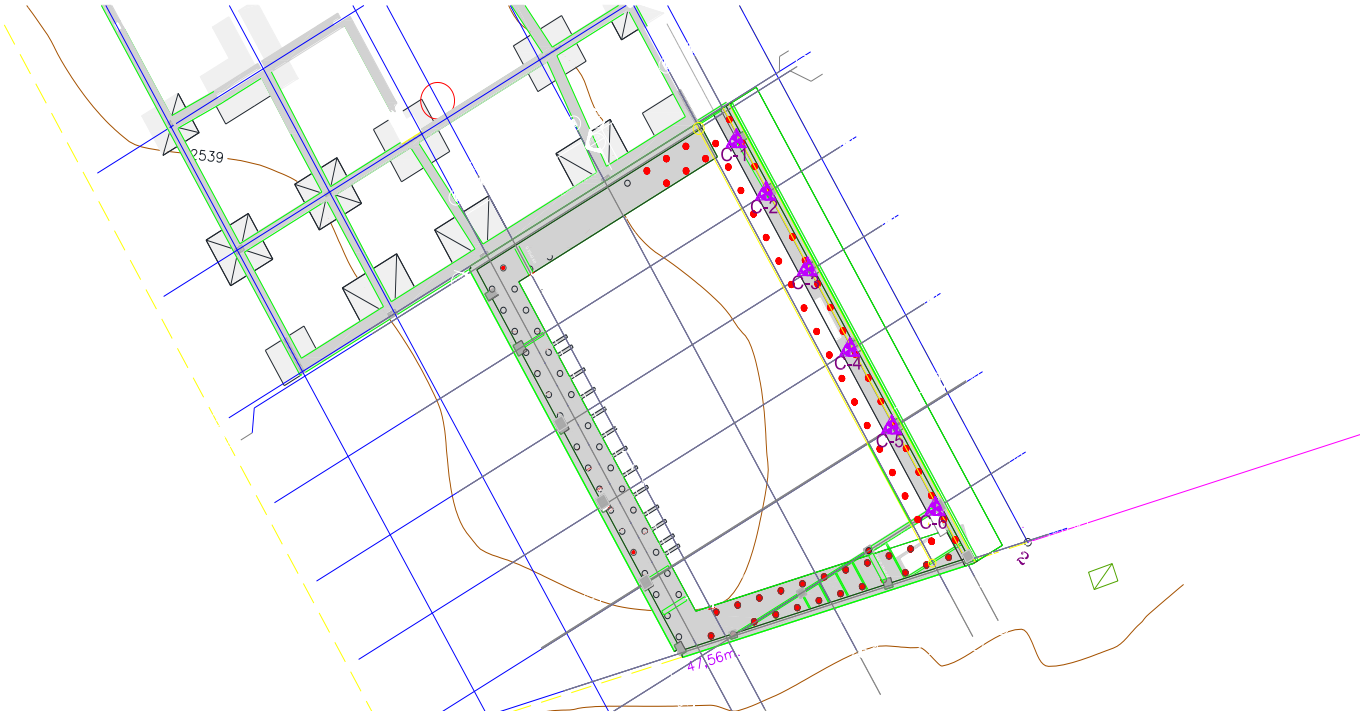

CONTROL DE ASENTAMIENTO Y VERTICALIDAD MURO OCCIDENTAL.
01 MARZO DE 2023

VERTICALIDAD Y ASENTAMIENTO "MURO" (28-11-2022)

DESCRIPCION	NORTE	ESTE	COTA
COLUMNA -1	101093.960	84278.916	2539.912
COLUMNA -2	101090.364	84281.129	2539.891
COLUMNA -3	101085.245	84284.134	2539.869
COLUMNA -4	101080.239	84287.005	2539.851
COLUMNA -5	101074.850	84290.139	2539.864
COLUMNA -6	101069.476	84293.308	2539.941

VERTICALIDAD Y ASENTAMIENTO "MURO" (01-03-2023)

DESCRIPCION	NORTE	ESTE	COTA
COLUMNA -1	101093.960	84278.916	2539.912
COLUMNA -2	101090.358	84281.128	2539.889
COLUMNA -3	101085.238	84284.130	2539.867
COLUMNA -4	101080.236	84287.002	2539.849
COLUMNA -5	101074.853	84290.135	2539.850
COLUMNA -6	101069.481	84293.305	2539.931

CUADRO DE COMPARACION

DESCRIPCION	NORTE	ESTE	COTA
COLUMNA -1	0.000	0.000	0.000
COLUMNA -2	0.006	0.001	0.002
COLUMNA -3	0.007	0.004	0.002
COLUMNA -4	0.003	0.003	0.002
COLUMNA -5	-0.003	0.004	0.014
COLUMNA -6	-0.005	0.003	0.010
