CONTROLES DE ASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO ANDEN OCCIDENTAL

Se materializa puntos de referencia para chequeos y control de asentamiento estructural en andén occidental. Estos con la finalidad de revisar los movimientos del mismo.














CONTROL ASCENTAMIENTO ANDEN OCCIDENTAL (28-10-2022)

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
REF: 1	101095.623	84283.399	2539.285
REF: 2	101091.202	84285.976	2539.313
REF: 3	101086.493	84288.714	2539.319
REF: 4	101081.754	84291.470	2539.355
REF: 5	101077.926	84293.705	2539.363
REF: 6	101074.033	84295.992	2539.392

GEOREFERENCIACION

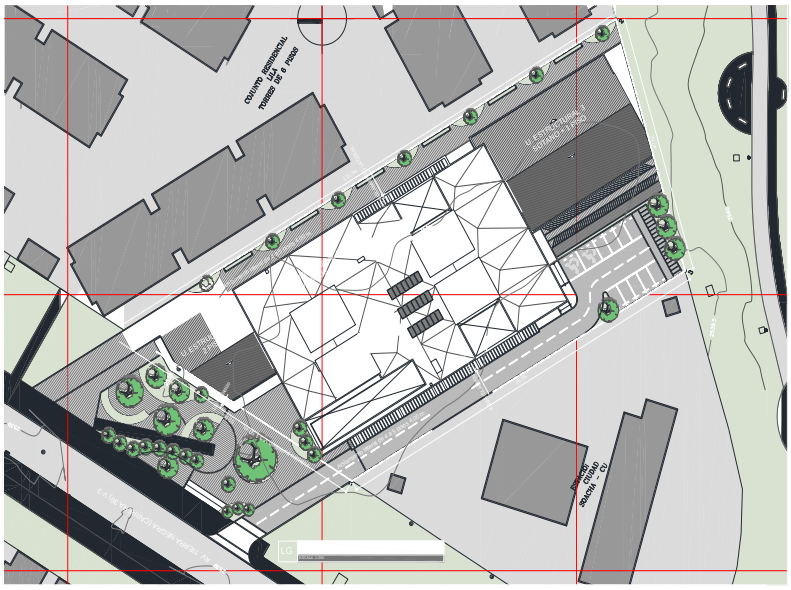



CONTROL DE ASCENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO ANDEN OCCIDENTAL.







CONTROL ASCENTAMIENTO ANDEN OCCIDENTAL (28-10-2022)

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
REF: 1	101095.623	84283.399	2539.285
REF: 2	101091.202	84285.976	2539.313
REF: 3	101086.493	84288.714	2539.319
REF: 4	101081.754	84291.470	2539.355
REF: 5	101077.926	84293.705	2539.363
REF: 6	101074.033	84295.992	2539.392

CONTROL ASCENTAMIENTO ANDEN OCCIDENTAL (05-11-2022)

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
REF: 1	101095.618	84283.403	2539.285
REF: 2	101091.196	84285.978	2539.310
REF: 3	101086.487	84288.718	2539.317
REF: 4	101081.745	84291.468	2539.353
REF: 5	101077.919	84293.707	2539.360
REF: 6	101074.025	84295.990	2539.390

CUADRO DE COMPARACION (28-10/05-11) DE 2022

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
REF: 1	0.005	-0.004	0.000
REF: 2	0.006	-0.002	0.003
REF: 3	0.006	-0.004	0.002
REF: 4	0.009	0.002	0.002
REF: 5	0.007	-0.002	0.003
REF: 6	0.008	0.002	0.002
