CONTROLE DE ASENTAMIENTO MODULO 2

30 DE NOVIEMBRE 2022

Se materializan puntos de referencia para control de asentamiento estructural en edificio Unidad Estructural 2, con la finalidad de revisar los movimientos del mismo.









2.000 IT
AGUA NO POTABLE
AHORRAR AGUA, CADA GOTA CUENTA



GEOREFERENCIACION

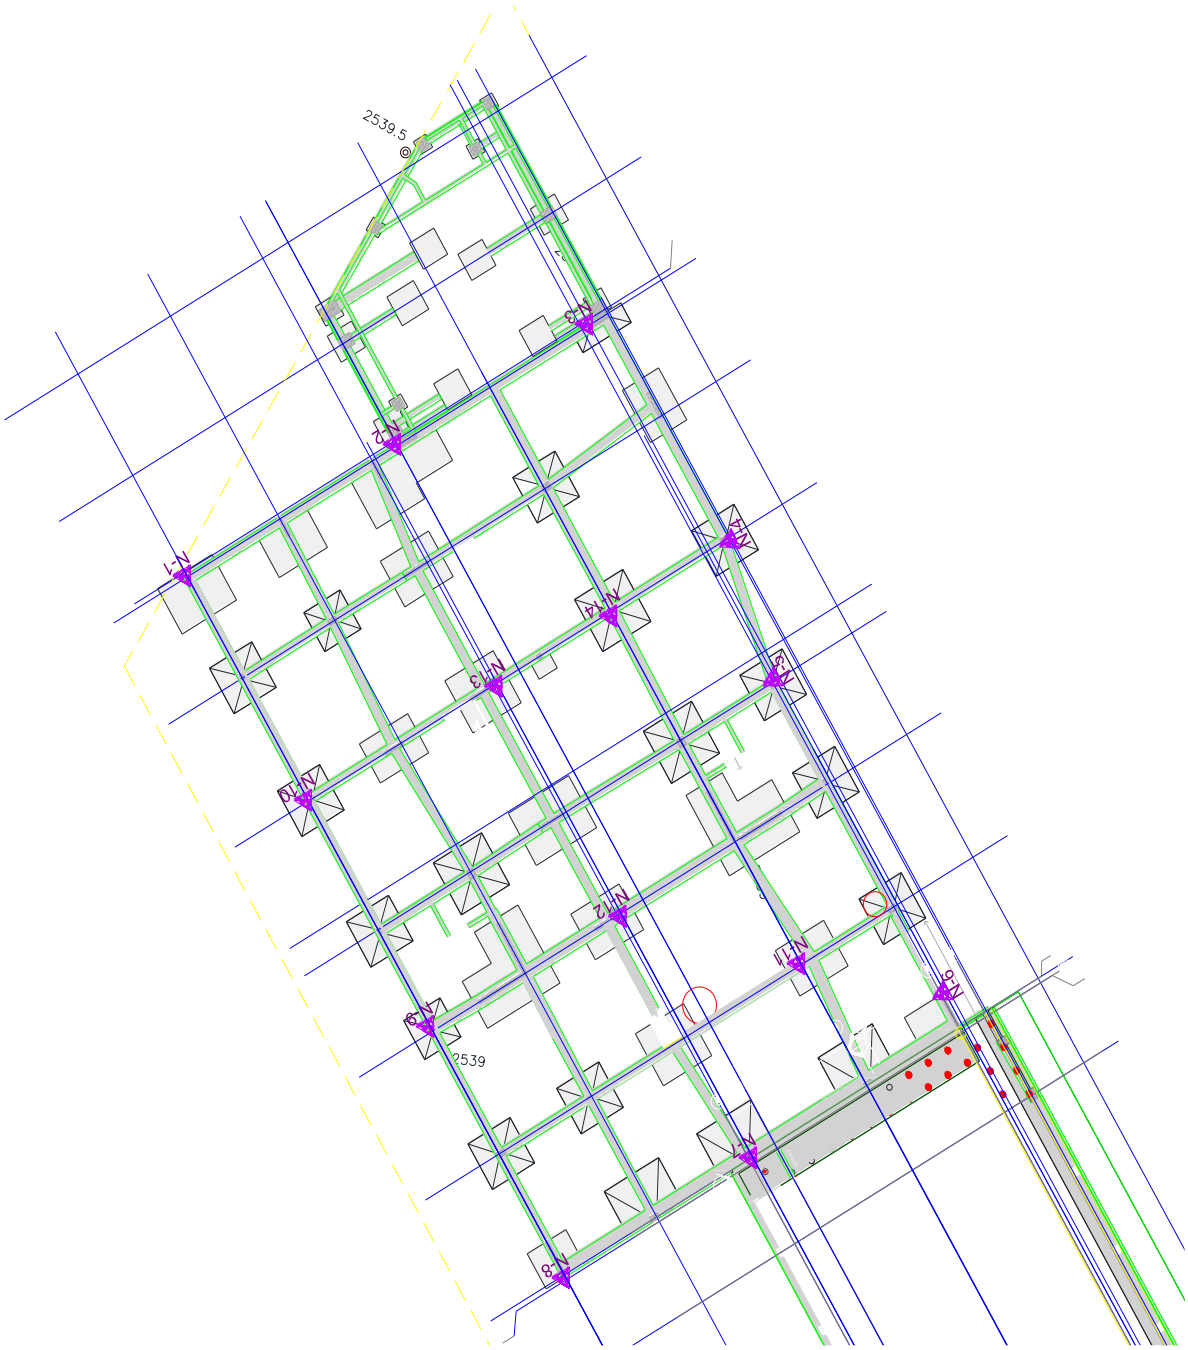

CONTROL ASENTAMIENTO MODULO-2 (2540.80)

DESCRIPCION	*V+*	*ALTURA INST.*	*V- INTERMEDIA*	*COTA*
GPS - 1	1.688	2540.800		2539.112
NIVELETA 1			0.000	2540.800
NIVELETA 2			0.000	2540.800
NIVELETA 3			0.000	2540.800
NIVELETA 4			0.000	2540.800
NIVELETA 5			0.000	2540.800
NIVELETA 6			0.000	2540.800
NIVELETA 7			0.000	2540.800
NIVELETA 8			0.000	2540.800
NIVELETA 9			0.000	2540.800
NIVELETA 10			0.000	2540.800
NIVELETA 11			0.000	2540.800
NIVELETA 12			0.000	2540.800
NIVELETA 13			0.000	2540.800
NIVELETA 14			0.000	2540.800
