
CONTROLES DE ASENTAMIENTO Y VERTICALIDADS MURO OCCIDENTAL MODULO 3

Se materializan puntos de referencia para chequeos de verticalidad y control de asentamiento estructural en muro occidental modulo 3. Estos con la finalidad de revisar los movimientos del mismo.





GEOREFERENCIACION

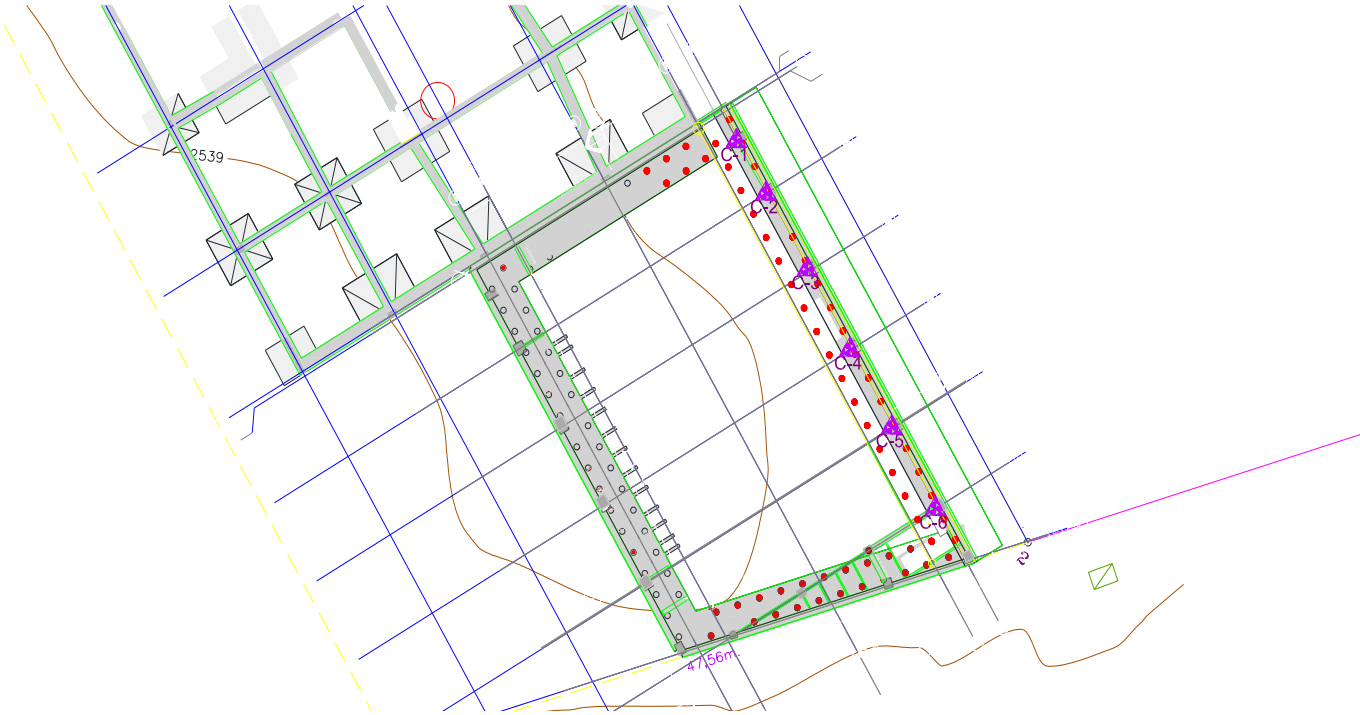

CONTROL DE ASCENTAMIENTO Y VERTICALIDAD MURO OCCIDENTAL.
28 DE NOVIEMBRE DE 2022

VERTICALIDAD Y ASENTAMIENTO "MURO"

DESCRIPCION	NORTE	ESTE	COTA
COLUMNA -1	101093.960	84278.916	2539.912
COLUMNA -2	101090.364	84281.129	2539.891
COLUMNA -3	101085.245	84284.134	2539.869
COLUMNA -4	101080.239	84287.005	2539.851
COLUMNA -5	101074.850	84290.139	2539.864
COLUMNA -6	101069.476	84293.308	2539.941
