CONTRATO 1619 DEL 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMB IA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.





INFORME MENSUAL No. 3

JULIO DEL 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LC-003-CO-007-2023 **Contratista:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

Contrato de Interventoría No. 1619 del 2022 **Interventoría:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** jul-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIOS
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	X		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	X		
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización		X		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		X		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.4	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	X		
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	X		
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14			
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1			
		MEPI-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1			
		MEPI-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1			
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2			
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas y profesionales				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Informe matriz de riesgos.				
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría				
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	X		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15			
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1			
		MEPI-MN-IN-3-FR-2			
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2			
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3			
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**		X		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		X		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		X		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ **de fecha** _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 3	**FECHA: Del 01 al 31 de julio de 2023.**
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	11/08/2023 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CO-007-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/05/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2023
PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 475.175.326,50
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1619 del 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Subbase	Extensión		
	Compactación	M3	237
Estructuras	Muros de contencion		
	Alcantarillas	UNIDAD	1
	Pontones		
Mantenimiento		M2	12084,59
Otros (Especificar cuales)	Concreto	M3	173

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Subbase	Extensión			
	Compactación			
Estructuras	Muros de contencion			
	Alcantarillas			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.455,00		812.455,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.827.893,00	11.448.385,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		**475.175.326,50**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			292.715.461,77	292.715.461,77
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00			9.620.492,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	9.620.492,00			**302.335.953,77**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 475.175.326,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 292.715.461,77
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 61,60%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FUNDICION DE CUNETA ENTRE EL K38+100 AL K38+220




PLACA HUELLA TERMINADA ENTRE EL K38+100 AL K38+220


PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 3
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	11/08/2023	Jesús Orlando Vivas	
Revisión			
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Elías Jaimes Fernández	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1		
2		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 8
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 9
2.1 LOCALIZACION 9
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 10
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 10
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 11
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
3.1.1 Información contractual 11
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 12
3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 12
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato 12
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. 12
3.4.3 Estado de pólizas 13
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 14
4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 15
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 21
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 22
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 24
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 25
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 26
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 28
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 28
5.1.1 Aspectos legales del contrato 28
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 30
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 31
6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 31

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 32

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 33

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 34

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA 35

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 35

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 35

8. ANEXOS 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 11
Tabla 2. Póliza de cumplimiento..... 13
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría..... 28
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 29
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 32
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida..... 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada..... 39

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 9

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 43

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2023, para el proyecto **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al contrato No. LC_003_CO_007-2023 cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de recorridos conjuntos con funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander y especialistas, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e inspector de Obra e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 01946 de 2019 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

El presente informe se remite a INVÍAS, a la Dirección Territorial Ocaña, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría N° 1110 de 2022, Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION



Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada El municipio de Teorama forma parte de la subregión occidental departamento Norte de Santander. en el departamento de Norte de Santander, En la actualidad la vía que comunica la Cabecera Municipal de Teorama con el corregimiento de San Juancito se encuentra deterioradas, en muy mal estado, afectando la movilidad de tránsito vehicular. Algunas de los tramos de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura. Otros factores que influyen en el deterioro, son las fuertes lluvias que generan grandes torrentes de agua que se extiendena lo largo del ancho de la vía, arrastrando todo tipo de sedimentos y materiales sólidos, que van eliminando la superficie de rodadura. Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje lo que conlleva al amento de los costos de transporte de carga y pasajeros, inoportuno acceso a los servicios médicos e incremento en el riesgo de deserción escolar, igualmente, tiene efectos en la baja comercialización de productos del municipio, lo que incide en el bajo desarrollo socioeconómico de la zona por el incremento en los precios de los alimentos y perdidas de las cosechas, al existir una deficiencia en el intercambio de productos y víveres, la economía se ve afectada, incrementando los índices de pobreza y las malas condiciones de bienestar de la población.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía Teorama con el corregimiento de San Juancito, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola que se encuentran en la zona, además de condiciones de inestabilidad en la banca que conducen a un aumento de tiempos de viaje, altos fletes de carga y excesivos costos de operación vehicular.

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento y conformación de la calzada y construcción de una placa. La Carretera Teorama con el corregimiento de San Juancito tiene una longitud de 45 KM que se encuentran en muy mal estado por las condiciones de su superficie de rodadura que en parte está constituida parcialmente de base estabilizada con emulsión asfáltica y afirmado. Además de la inestabilidad de la calzada, lo cual se complica aún más, en los tiempos de lluvia. Esta situación genera altos costos de operación y aumento en los tiempos de recorrido.

El departamento norte de Santander realiza inversiones con periodicidad anual en mantenimiento, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía secundaria comprendida entre los municipios de teorama y convención y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños entregados por la gobernación de norte de Santander.

Los estudios y diseños contienen capítulos estructurales, hidráulicos, geotécnicos, pavimentos, diseño geométrico, que determinan la ejecución de las obras contempladas en el alcance del proyecto.

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del contrato

CONTRATO No.	LC-003-CO-007-2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Planeación e Infraestructura
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023
C.C. o N.I.T.	901710090-8
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
C.C. o N.I.T	1.052.948.815
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.24.008
CDP No.	1602-1
VALOR DEL CONTRATO	$ 75.175.326,50
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) meses.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TEORAMA-SAN JUANCITO
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO PALLAREZ PRADO secretario de Planeación e Infraestructura – Supervisor del Contrato por parte del municipio
INTERVENTOR (Externo)	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
FECHA ACTA DE INICIO	Mayo 24 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	Agosto 23 de 2023

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 01 al 31 de julio del 2023 de ejecución del contrato LC_003_CO_007-2023, luego de su reanudación, el pasado 24 de mayo de 2023. El Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023, realizó las siguientes actividades.

- Entrega de pólizas actualizadas con la fecha de reinicio.
- Programación de obra actualizada con la fecha de reinicio.

Se adelantan las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Figurado y armado de cero para la placa huella
- ✓ Fundición de cuneta, piedra pegada y placa huella
- ✓ Excavación para la alcantarilla

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se no han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la actualización de la póliza de cumplimiento No 21-44-101412163 y la póliza ESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS No. 21-40101210629 con respecto a la fecha de reinicio, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la alcaldía Municipal de Teorama. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

DESCRIPCION GARANTIAS PRESENTADAS	NO. DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
	21 44 101412163	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2023	08/02/2024	$47.517.532,65
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPATA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$47.517.532,65
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2023	08/08/2026	$23.758.766,33
	21-40-101210629	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	08/05/2023	08/08/2023	$232.000.000,00
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/05/2023	08/08/2023	$232.000.000,00
			VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/05/2023	08/08/2023	$232.000.000,00

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 al 31 julio de 2023, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CO-007-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/05/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2023
PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 475.175.326,50
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1619 del 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Subbase	Extensión		
	Compactación	M3	237
Estructuras	Muros de contencion		
	Alcantarillas	UNIDAD	1
	Pontones		
Mantenimiento		M2	12084,59
Otros (Especificar cuales)	Concreto	M3	173

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Subbase	Extensión			
	Compactación			
Estructuras	Muros de contencion			
	Alcantarillas			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.455,00		812.455,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.827.893,00	11.448.385,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		**475.175.326,50**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			292.715.461,77	292.715.461,77
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00			9.620.492,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	9.620.492,00			**302.335.953,77**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 475.175.326,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 292.715.461,77
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 61,60%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FUNDICION DE CUNETA ENTRE EL K38+100 AL K38+220




PLACA HUELLA TERMINADA ENTRE EL K38+100 AL K38+220

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el Director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°6

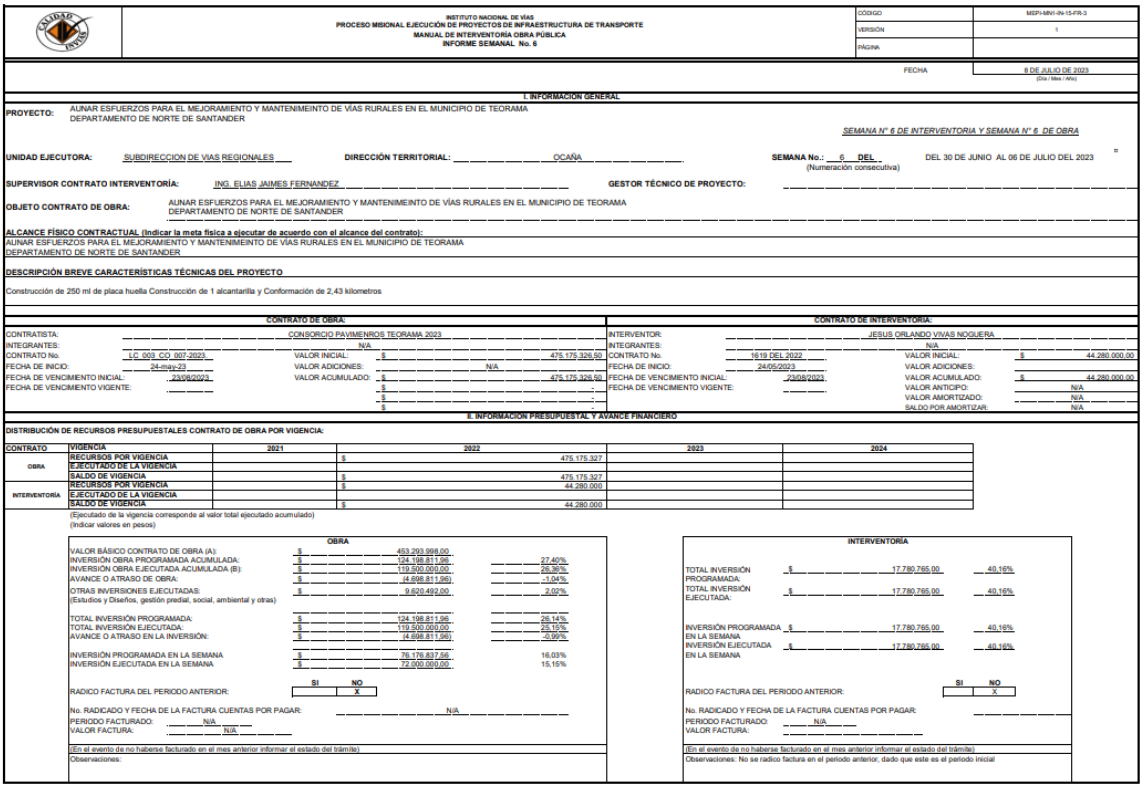

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL No. 6

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 8 DE JULIO DE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SEMANA N° 6 DE INTERVENTORIA Y SEMANA N° 6 DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 6 DEL (Numeración consecutiva) DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 250 ml de placa huella Construcción de 1 alcantarilla y Conformación de 2,43 kilometros

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023			INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	LC_008_CO_007-2023	VALOR INICIAL:	$ 475.175.326,60	CONTRATO No.	1619 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 44.280.000,00
FECHA DE INICIO:	24-may-23	VALOR ADICIONES:	$ - N/A	FECHA DE INICIO:	24/05/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 475.175.326,60	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 44.280.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 475.175.327		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 475.175.327		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 44.280.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 44.280.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 453.293.998,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 124.198.811,96	27,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 119.500.000,00	26,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.698.811,96)	-1,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.620.492,00	2,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.198.811,96	26,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119.500.000,00	25,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.698.811,96)	-0,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 76.176.837,56	16,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.000.000,00	15,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 17.780.765,00	40,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17.780.765,00	40,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.780.765,00	40,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.780.765,00	40,16%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se radico factura en el periodo anterior, dado que este es el periodo inicial

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,25
Acumulado:	0,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 26,14%
Meta Física Ejecutada % 25,15%
Avance o Atraso Físico % -0,99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (H)
Obra Física y otros	Unidad	1	30-jun	6-jul

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog	$ 124.198.811,96			$ 124.198.811,96	26,14%
Ejec	$ 119.500.000,00			$ 119.500.000,00	96,22%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K38+100 AL K38+350
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		
Motoniveladora		
Vibrocompactador 7 ton mínimo		
Volquetas		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TRITURADORA GUAYABAL	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	CHAPINERO Y OROPOMA MUNICIPIO ABREGO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	———	NO	———	N/A	———
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	———	NO	———	N/A	———
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	———	NO	———	N/A	———
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	———	NO	———	N/A	———
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	———	NO	———	N/A	———
VERTIMIENTOS:	SI	———	NO	———	N/A	———
EMISIONES:	SI	———	NO	———	N/A	———
OTROS (Especificar cual)	SI	———	NO	———	N/A	———

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la etapa de obra, el equipo de de trabjo del contratisa ha estado en la zona o via realizando las siguientes actividades:

* Se realiza figura y armado de acero de las vigas riostras
*Se realiza fundicion de piedra pegada y placa huella
*Llegada de material granular
* se realiza figurado de hierro para la placa huella y cuneta
*La Interventoría ha mantenido revisando los trabajos realizados por el contratista asi como estudiando la informacion suministrada por la entidad para comparar con la recolectada en campo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con los trabajos de figurado de hierro y construccion de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRUCCION DE PLACA HUELLA PIEDRA PEGADA ENTRE EL K38+100 AL K38+140



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y FUNDICION DE CUNETA K38+100 AL K38+140



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y FUNDICION DE CUNETA K38+100 AL K38+140

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer acompañamiento y seguiento a las actividades del contratista orientando y recomendando las labores a realizar de acuerdo a la ruta crítica del proyecto
2. Acompañamiento en los ajustes y diseños de acuerdo a los trabajos de campo y la informacion del proyecto
3. Exigir que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades
4. Realizar acompañamiento en campo para la supervision de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haya lugar.
5. Solicitar la informacion semanalmente recolectada en campo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matricula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL No. 7

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15 DE JULIO DE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SEMANA N° 7 DE INTERVENTORIA Y SEMANA N° 7 DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **SEMANA No.:** 7 DEL (Numeración consecutiva) DEL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 250 ml de placa huella Construcción de 1 alcantarilla y Conformación de 2,43 kilometros

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023			INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	1 C 093 CO 007-2023	VALOR INICIAL:	$ 475.175.326,50	CONTRATO No.	1619 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 44.280.000,00
FECHA DE INICIO:	24-may-23	VALOR ADICIONES:	N/A	FECHA DE INICIO:	24/05/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 475.175.326,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 44.280.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 475.175.327		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 475.175.327		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 44.280.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 44.280.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 453.293.998,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 209.866.015,23	46,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.430.500,00	40,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.435.515,23)	-5,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.620.492,00	2,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 209.866.015,23	44,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185.430.500,00	39,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.435.515,23)	-5,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 85.667.203,27	18,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 58.678.000,00	12,35%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.186.918,00	47,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.186.918,00	47,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.186.918,00	47,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.186.918,00	47,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: may-23
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se radico factura en el periodo anterior, dado que este es el periodo inicial

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,36
Acumulado:	0,11

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 44,17%
Meta Física Ejecutada % 39,02%
Avance o Atraso Físico % -5,14%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Obra Física y otros	Unidad	1	7-jul	13-jul	Prog	$ 209.866.015,23			$ 209.866.015,23	44,17%
					Ejec	$ 185.430.500,00			$ 185.430.500,00	88,36%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K38+100 AL K38+350
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		
Motoniveladora		
Vibrocompactador 7 ton mínimo		
Volquetas		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	TRITURADORA GUAYABAL	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	CHAPINERO Y OROPOMA MUNICIPIO ABREGO	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la etapa de obra, el equipo de de trabjo del contratista ha estado en la zona o via realizando las siguientes actividades:

* Se realiza figura y armado de acero de las vigas riostras
*Se realiza fundicion de piedra pegada y placa huella
*Llegada de material granular
* se realiza figurado de hierro para la placa huella y cuneta
*La Interventoria ha mantenido revisando los trabajos realizados por el contratista así como estudiando la informacion suministrada por la entidad para comparar con la recolectada en campo
* Se solicita al contratista aumentar el rendimiento de obra para terminar en el tiempo contractual

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con los trabajos de figurado de hierro y construccion de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRUCCION DE PLACA HUELLA PIEDRA PEGADA ENTRE EL K38+140 AL K38+180



CONTRUCCION DE PLACA HUELLA PIEDRA PEGADA ENTRE EL K38+140 AL K38+180



CONTRUCCION DE PLACA HUELLA PIEDRA PEGADA ENTRE EL K38+140 AL K38+180

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer acompañamiento y seguiento a las actividades del contratista orientando y recomendando las labores a realizar de acuerdo a la ruta crítica del proyecto
2. Acompañamiento en los ajustes y diseños de acuerdo a los trabajos de campo y la informacion del proyecto
3. Exigir que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades
4. Realizar acompañamiento en campo para la supervision de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haya lugar.
5. Solicitar la informacion semanalmente recolectada en campo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL No. 8

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	21 DE JULIO DE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SEMANA N° 8 DE INTERVENTORIA Y SEMANA N° 8 DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **SEMANA No.:** 8 **DEL** DEL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 250 ml de placa huella Construcción de 1 alcantarilla y Conformación de 2,43 kilometros

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023			INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	LC_003_CO_007-2023	VALOR INICIAL:	$ 475.175.326,50	CONTRATO No.	1619 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 44.280.000,00
FECHA DE INICIO:	24-may-23	VALOR ADICIONES:	N/A	FECHA DE INICIO:	24/05/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 475.175.326,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 44.280.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 475.175.327		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 475.175.327		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 44.280.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 44.280.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 453.293.998,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 251.499.738,50	55,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 221.928.060,00	48,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.571.738,50)	-6,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9.620.492,00	2,02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 251.499.738,50	52,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 221.928.060,00	46,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (29.571.738,50)	-6,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.633.723,27	8,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 58.678.000,00	12,35%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.593.071,00	55,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.593.071,00	55,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.593.071,00	55,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.593.071,00	55,54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se radico factura en el periodo anterior, dado que este es el periodo inicial

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,42
Acumulado:	0,11

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Fisica Programada % 52,93%
Meta Fisica Ejecutada % 46,70%

Avance o Atraso Fisico % -6,22%

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (m)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Obra Fisica y otros	Unidad	1	14-jul	20-jul	Prog	$ 251.499.738,50			$ 251.499.738,50	52,93%
					Ejec	$ 221.928.000,00			$ 221.928.000,00	88,24%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K38+100 AL K38+350
TRAMO Y/O SECTOR 3:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		
Motoniveladora		
Vibrocompactador 7 ton mínimo		
Volquetas		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TRITURADORA GUAYABAL	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	CHAPINERO Y OROPOMA MUNICIPIO ABREGO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la etapa de obra, el equipo de de trabjo del contratisa ha estado en la zona o via realizando las siguientes actividades:

* Se realiza figura y armado de acero de las vigas riostras
*Se realiza fundicion de piedra pegada y placa huella
*Llegada de material granular
* se realiza figurado de hierro para la placa huella y cuneta
*La Interventoria ha mantenido revisando los trabajos realizados por el contratista asi como estudiando la informacion suministrada por la entidad para comparar con la recolectada en campo
* Se solicita al contratista aumentar el rendimiento de obra para terminar en el tiempo contractual
* Se solicita un plan de contigencia debido al atraso de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con los trabajos de figurado de hierro y construccion de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ARMADO Y FIGURADO HIERRO ENTRE EL K38+140 AL K38+200



CONTRUCCION DE PLACA HUELLA PIEDRA PEGADA ENTRE EL K38+140 AL K38+200



CONTRUCCION DE PLACA HUELLA PIEDRA PEGADA ENTRE EL K38+140 AL K38+200

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


1. Hacer acompañamiento y seguiento a las actividades del contratista orientando y recomendando las labores a realizar de acuerdo a la ruta critica del proyecto
2. Acompañamiento en los ajustes y diseños de acuerdo a los trabajos de campo y la informacion del proyecto
3. Exigir que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades
4. Realizar acompañamiento en campo para la supervision de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haya lugar.
5. Solicitar la informacion semanalmente recolectada en campo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matricula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°9

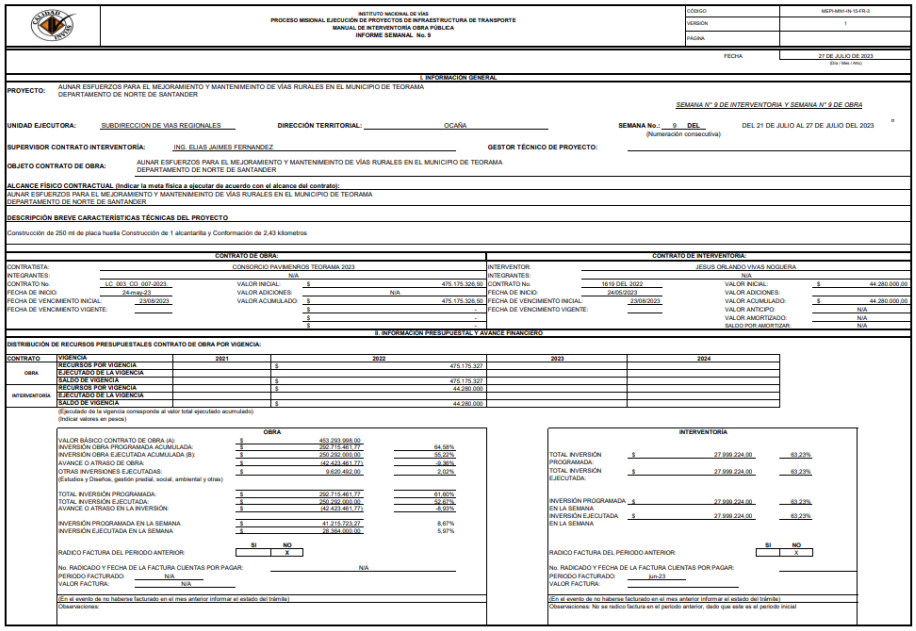

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL No. 9

CÓDIGO: MEPI-MINT-IN-15-FR-3
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 27 DE JULIO DE 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SEMANA N° 9 DE INTERVENTORIA Y SEMANA N° 9 DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 9 DEL (Numeración consecutiva) DEL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO DEL 2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 250 ml de placa huella Construcción de 1 alcantarilla y Conformación de 2,43 kilometros

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023			INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	LC_083_CO_007-2023_	VALOR INICIAL:	$ 475.175.326,50	CONTRATO No.	1619 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 44.280.000,00
FECHA DE INICIO:	24-may-23	VALOR ADICIONES:	N/A	FECHA DE INICIO:	24/05/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 475.175.326,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/08/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 44.280.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 475.175.327		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 475.175.327		
INTERVENTORIA:	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 44.280.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 44.280.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 453.293.999,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 292.715.461,77	64,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 250.292.000,00	55,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -42.423.461,77	-9,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.620.462,00	2,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 292.715.461,77	61,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 250.292.000,00	52,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -42.423.461,77	-8,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.215.723,37	8,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38.364.000,00	5,97%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.999.224,00	63,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.999.224,00	63,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.999.224,00	63,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.999.224,00	63,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-23
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se radico factura en el periodo anterior, dado que este es el periodo inicial

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,99
Acumulado:	0,11

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 61,60% — Avance o Atraso Físico %: -8,93%
Meta Física Ejecutada %: 52,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (M)
Obra Física y otros	Unidad	1	21-jul	27-jul

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog.	$ 292.715.461,77			$ 292.715.461,77	61,60%
Ejec.	$ 250.292.000,00			$ 250.292.000,00	85,51%
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K38+100 AL K38+350
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		
Motoniveladora		
Vibrocompactador 7 ton mínimo		
Volquetas		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TRITURADORA GUAYABAL	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	CHAPINERO Y OROPOMA MUNICIPIO ABREGO	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:


OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

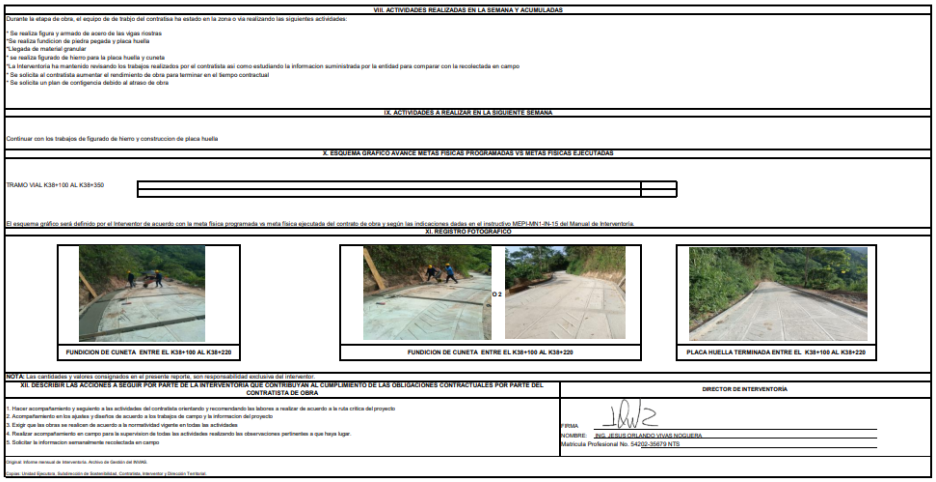

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la etapa de obra, el equipo de de trabjo del contratista ha estado en la zona o via realizando las siguientes actividades:

* Se realiza figura y armado de acero de las vigas riostras
*Se realiza fundicion de placa pegada y placa huella
*Llegada de material granular
* se realiza figurado de hierro para la placa huella y cuneta
*La Interventoría ha mantenido revisando los trabajos realizados por el contratista asi como estudiando la informacion suministrada por la entidad para comparar con la recolectada en campo
* Se solicita al contratista aumentar el rendimiento de obra para terminar en el tiempo contractual
* Se solicita un plan de contingencia debido al atraso de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con los trabajos de figurado de hierro y construccion de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FUNDICION DE CUNETA ENTRE EL K38+100 AL K38+220

FUNDICION DE CUNETA ENTRE EL K38+100 AL K38+220

PLACA HUELLA TERMINADA ENTRE EL K38+100 AL K38+220

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer acompañamiento y seguiento a las actividades del contratista orientando y recommendando las labores a realizar de acuerdo a la ruta critica del proyecto
2. Acompañamiento en los ajustes y diseños de acuerdo a los trabajos de campo y la informacion del proyecto
3. Exigir que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades
4. Realizar acompañamiento en campo para la supervision de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haya lugar.
5. Solicitar la informacion semanalmente recolectada en campo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Matricula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo en el periodo comprendido entre 01 al 31 de julio de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado anexo “Maquinaria y Equipo Del Contratista”. En el presente informe no se reporta maquinaria y equipos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO 2023 — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. LC-003-CO-007-2023 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1619 del 2022 — **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	MITSUBISHI MG300	1,2 M3	OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 121D	8 TON	OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETAS (2)	DODGE	7M3	OBRA	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
TOTAL EN REPARACIÓN
TOTAL INACTIVO

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **LUIS CARLOS VILA MONTAÑO**
Director de obra
Matrícula Profesional No.:54202 – 086216 NDS

Firma
Nombre: **JEISON ANWAR RINCON VERGEL**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145216NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra en el periodo comprendido entre 01 al 31 de julio de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado “Personal del contratista de obra”.

En el presente período se reporta solo el personal mínimo requerido.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LC-003-CO-007-2023 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mes de julio del 2023 — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1619 del 2022 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base ab Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ACOSTA ALVAREZ RODRIGO ALFONSO	15.170.693		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	SANITAS	27121846	$ 46.400	COLPENSIONES	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
2	ANGARITA JAIME JESUS HELI	5.506.266		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	S.A. MOV NUEVA E.P.S.	27121846	$ 46.400	PORVENIR	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
3	ASCANIO ACOSTA ADINAIL	1.090.984.357		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	COMFIORIENTE	27121846	$ 46.400	PORVENIR	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
4	FLOREZ QUINTERO MIGUEL ANGEL	1.005.074.416		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	COMFIORIENTE	27121846	$ 46.400	PORVENIR	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
5	ORTIZ MENDEZ JESUS NAYID	13.279.169		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	COMFIORIENTE	27121846	$ 46.400	PORVENIR	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
6	RODRIGUEZ RIOBO EUDER	1.111.922.793		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	VALLE EPS COMFENALCO	27121846	$ 46.400	PROTECCION	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
7	SALAZAR OVALLOS JEAN CARLOS	1.193.362.203		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S.	27121846	$ 46.400	PORVENIR	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
8	VELASQUEZ BUITRAGO MARTIN ELIAS	1.091.164.231		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	COMFIORIENTE	27121846	$ 46.400	PORVENIR	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
9	VILA MONTAÑO LUIS CARLOS	88.141.440		$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	SANITAS	27121846	$ 46.400	COLPENSIONES	27121846	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **LUIS CARLOS VILA MONTAÑO**
Director de obra
Matrícula Profesional No.:54202 – 086216 NDS

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-356791NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra”. Adicionalmente se resalta que no se generaron actas parciales en el periodo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LC-003-CO-007-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

MES INFORME MENSUAL: JULIO 2023
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 del 2022
INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 475.175.326,50

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
NO SE PASADO ACTA DE COSTO POR PARTE CONTRATISTA															
TOTALES															

NO SE HAN TRAMITADO ACTAS POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA FECHA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 453.293.994,50	$ -	$ 453.293.994,50
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 9.620.492,00	$	$ 9.620.492,00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 9.620.492,00	$ 1.827.893,00	$ 11.448.385,00
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 812.455,00		$ 812.455,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 473.347.433,50	$ 1.827.893,00	$ 475.175.326,50

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023
Contratista
Matricula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679INTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el el 01 al 31 de julio de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LC-003-CO-007-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1619 del 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	20	20	20	24	24	20	20	20	24	20	24	24	20	24	24	20	20	24	24	20	696
Lluvias moderadas										4		4	4	4			4	4	4		4			4			4	4			4	48
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **LUIS CARLOS VILA MONTAÑO**
Director de obra
Matrícula Profesional No.:54202 – 086216 NDS

Firma
Nombre: **JEISON ANWAR RINCON VERGEL**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145216NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, se realizó la toma de muestras cilíndricas de concreto de acuerdo a las actividades a ejecutar, Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CO-007-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL JULIO 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:1619 del 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29-jul-23	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS	NTC 673 / INV E 410-13	OBRA	3	3000 PSI	3185	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: **LUIS CARLOS VILA MONTAÑO**
Director de obra
Matrícula Profesional No.:54202 – 086216 NDS

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS del contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 14 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 24/05/2023
PLAZO ACTUAL: TRES (3) MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE AGOSTO DEL 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 475.175.326,50
VALOR ACUMULADO: $ 475.175.330,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 47.517.532,65	8 5 2023	8 2 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 47.517.533,00	8 5 2023	8 8 2026
Calidad de Estudios y Diseños	0%	$ -		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5%	$ 23.758.766,50	2 6 2023	2 6 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101412163

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	49%	$ 232.000.000,00	8 5 2023	8 8 2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49%	$ 232.000.000,00	8 5 2023	8 8 2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49%	$ 232.000.000,00	8 5 2023	8 8 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101210629 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se está revisando los documentos del plan de calidad presentado por el contratista de obra a la anterior interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

• Seguimiento a la inversión de anticipo N/A

N/A debido a que no se realiza anticipo.

Formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1y MEPI-MN-IN-2-FR-2

• Seguimiento programa de obra

• Seguimiento programa de inversiones

En este periodo por ser tan corto no se realizaron comités de obra.

Durante el presente mes no se realizaron socializaciones con la comunidad

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 3. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	1619 DEL 2022
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIP IO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMB IA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	21 DICIEMBRE 2022
FECHA REINICIO:	24 DE MAYO 2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	23 DE AGOSTO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.280.000

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la el anexo modificatorio N°5 de la póliza seguro de cumplimiento N° CCT-100004493 de Mundial de Seguros S.A fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 4. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA							
			Desde				Hasta			
Cumplimiento	10%	$ 4.428.000,00	20	12	2022		12	01	2023	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 8.856.000,00	20	12	2022		12	01	2025	
Calidad del servicio	30%	$ 13.284.000,00	12	1	2023		12	01	2028	

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra N° 01946 de 2019.

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✓ Elaboración Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✓ Comités de seguimiento de la ejecución del contrato de obra.
- ✓ Revisión de las cantidades ejecutadas en obra, en base a los diseños y documentos técnicos.
- ✓ Realización y revisión de avance de acuerdo a la programación presentada y flujo de intraversiones.
- ✓ Control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Se realizaron recorridos periódicos por el corredor vial intervenido y toma de registro fotográfico a los sitios del proyecto y de las actividades ejecutadas.

- ✓ Se hace control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro “EQUPO Y VEHICULOS DE INTERVENTORIA”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Julio -2023 **PROYECTO:** ALINAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1619 del 2022 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA	Pulsar Placa YMT 95C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.


Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro “PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

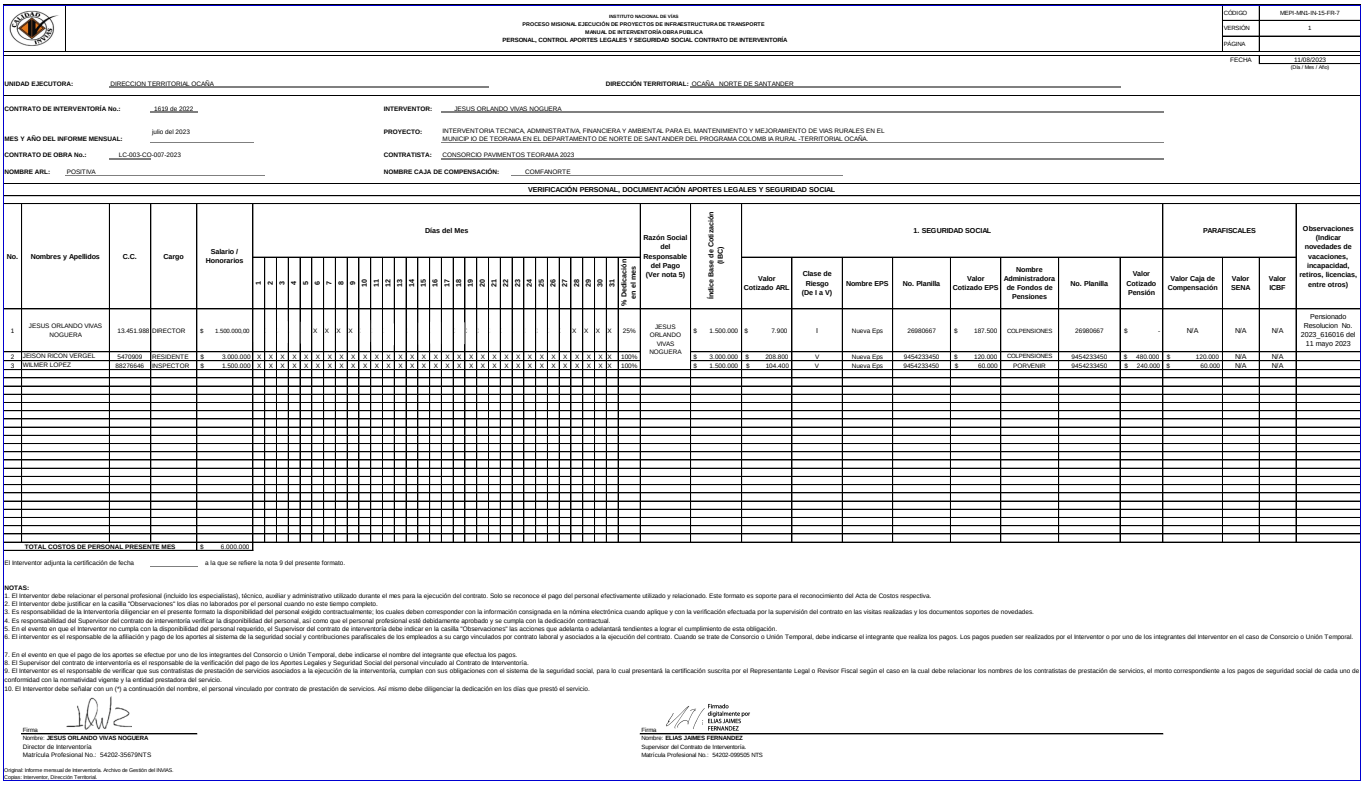

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 11/08/2023 [Día / Mes / Año]

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 de 2022 — INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: julio del 2023 — PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIP IO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMB IA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CO-007-2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	13.451.988	DIRECTOR	$ 1.500.000,00						X	X	X																		X	X	X	X	25%	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	$ 1.500.000	$ 7.900	I	Nueva Eps	26980667	$ 187.500	COLPENSIONES	26980667	$ -	N/A	N/A	N/A	Pensionado Resolucion No. 2023_616016 del 11 mayo 2023
2	JEISON RICON VERGEL	5470909	RESIDENTE	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.000.000	$ 209.800	V	Nueva Eps	9454233450	$ 120.000	COLPENSIONES	9454233450	$ 480.000	$ 120.000	N/A	N/A	
3	WILMER LOPEZ	88276646	INSPECTOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.500.000	$ 104.400	V	Nueva Eps	9454233450	$ 60.000	PORVENIR	9454233450	$ 240.000	$ 60.000	N/A	N/A	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 6.000.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional está debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta y adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679INTS

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-095505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Tabla 5. Personal Activo de la Interventoría.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jesús Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría	25%
Jeison Rincon Vergel	Residente de Interventoría	100%
Wilmer Lopez	Inspector	100%

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Cuadro “Información financiera del contrato de interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se presentan los movimientos a nivel mensual de costos de la interventoría, del saldo de contrato y del saldo del registro presupuestal.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11-ago-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 DE 2022 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MES INFORME MENSUAL: 03 — **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-003-CO-007-2023 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Indicar si es Contrato Principal o No. De	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1278722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACION	Contrato Principal	$ 44.280.000,00	$ 21.565.200
						$ -	
						$ -	
			TOTAL			$ 44.280.000,00	$ 21.565.200

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 44.280.000 — 28,82%

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo	Valor Total Pagado	Saldo Anticipo por	No. de Registro y	Saldo Registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Observaciones
01	Del 19 al 20 de Dic. de 2022 y del 24 al 31 de Mayo de 2023	$ 634.800,00	$ -	$ 634.800,00	N.A.	N.A.	N.A.	1278722/ 2021-12-30	$ 43.645.200	$ 43.645.200	RADICADO 58508 14JUN2023	
02	del 01 al 30 de junio 2023	$ 9.320.000,00	$ -	$ 9.320.000,00	N.A.	N.A.	N.A.	1278722/ 2021-12-30	$ 34.325.200	$ 34.325.200	RADICADO 70454 20JUL2023	
03	1 al 31 de julio del 2023	$ 12.760.000,00		$ 12.760.000,00	N.A.	N.A.	N.A.	1278722/ 2021-12-30	$ 21.565.200	$ 21.565.200		
TOTALES		$ 22.714.800	$ -	$ 12.760.000	$ -	$ -	$ -		$ 21.565.200	$ 21.565.200		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 44.280.000,00	$ -	$ 44.280.000,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
*			
VALOR TOTAL	$ 44.280.000,00	$ -	$ 44.280.000,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Firma — Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 14/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 del 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIP IO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMB IA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

FECHA DE INICIO: 24/05/2022
PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/08/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 44.280.000,00
VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 4.428.000,00	20/12/2022	12/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 8.856.000,00	20/12/2022	12/01/2025
Calidad del servicio	30%	$ 13.284.000,00	12/1/2023	12/01/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004493
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 4.428.000,00	24/5/2023	23/2/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 8.856.000,00	24/5/2023	23/8/2026
Calidad del servicio	30%	$ 13.284.000,00	23/8/2023	23/8/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004493
Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 7/06/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: **ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 1619-2022 no pactó anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra No. LC_003_CO_007-2023, completa al finalizar este primer período luego del reinicio, comprendido entre el 01 al 31 julio del 2023, presenta una inversión del presente periodo se llega al 10,11 % de ejecución.

El CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023, respecto de la programación mensual para el periodo 3 obtuvo el siguiente rendimiento en obra:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	292.715.461,77	61,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	250.292.000,00	52,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(42.423.461,77)	-8,93%

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega de oportuna de la documentación solicitada, con el fin de evitar inconvenientes que desenfunden en multas y sanciones, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de obra


Se recomienda al contratista continuar con la entrega de soportes de la afiliación del personal y toda la información relacionada con pagos de seguridad social.

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 6. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					
RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESDE El 01 al 31 de julio 2023					
FECHA	**CORREO**	**REMITENTE**	**ENTIDAD**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
04 DE JULIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	DENSIDAD DE SUBBASE
24 DE JULIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	SOLICITUD RECURSOS ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA LC_03_CO_007-2023

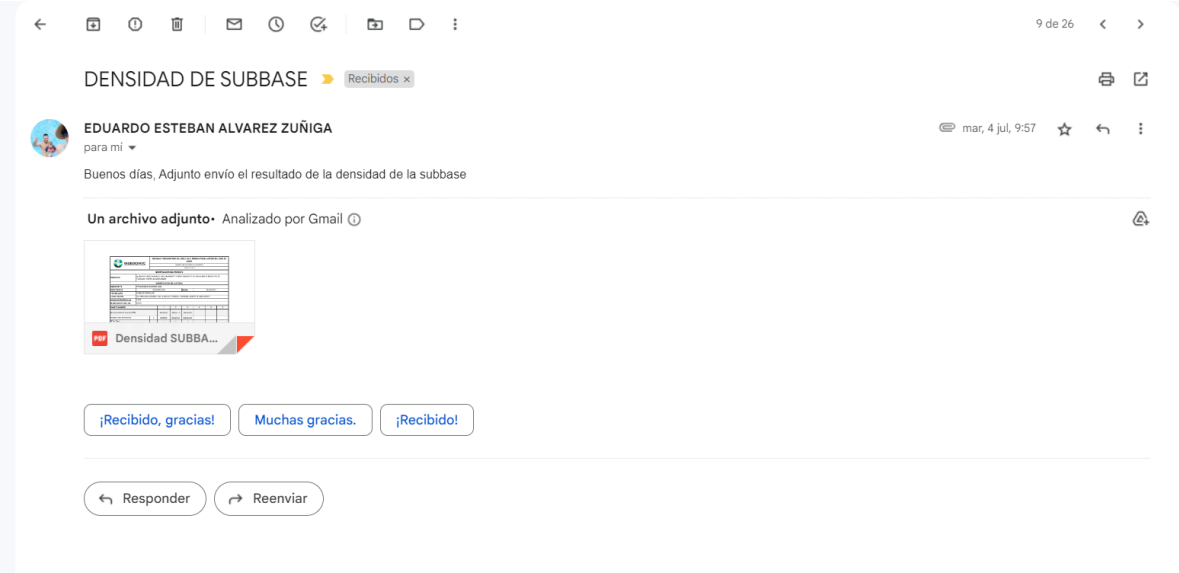
9 de 26
DENSIDAD DE SUBBASE
Recibidos
EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA
para mí
mar, 4 jul, 9:57
Buenos días, Adjunto envío el resultado de la densidad de la subbase
Un archivo adjunto• Analizado por Gmail
Densidad SUBBA...
¡Recibido, gracias!
Muchas gracias.
¡Recibido!
Responder
Reenviar

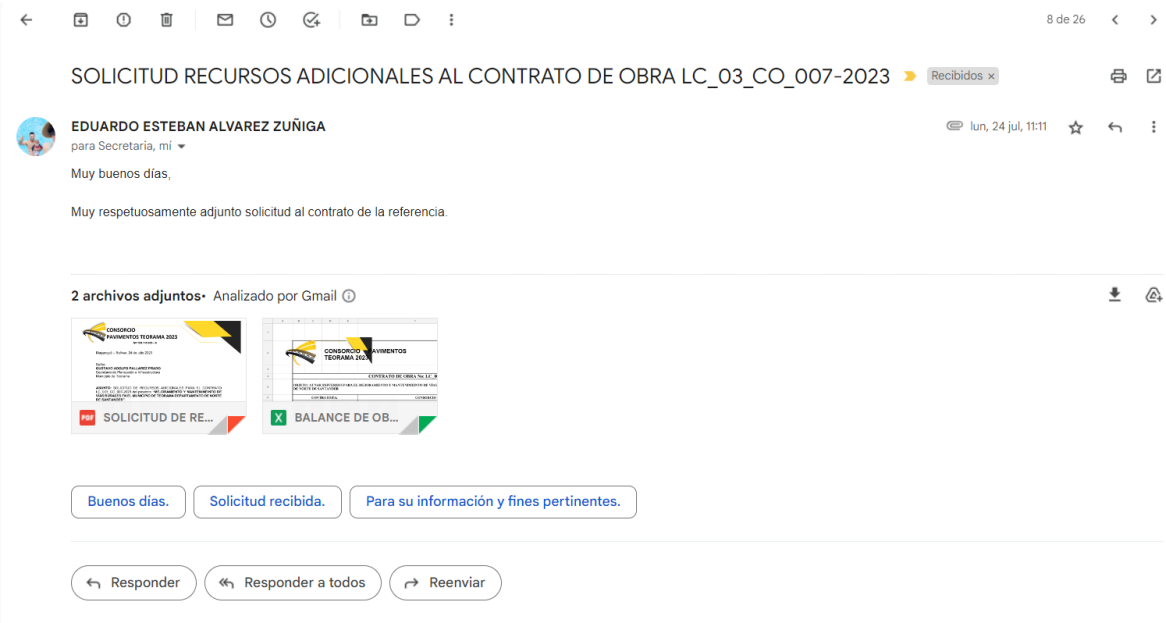

8 de 26
SOLICITUD RECURSOS ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA LC_03_CO_007-2023
Recibidos
EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA
para Secretaria, mí
lun, 24 jul, 11:11
Muy buenos días,
Muy respetuosamente adjunto solicitud al contrato de la referencia.
2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
SOLICITUD DE RE...
BALANCE DE OB...
Buenos días.
Solicitud recibida.
Para su información y fines pertinentes.
Responder
Responder a todos
Reenviar

Tabla 7. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIP IO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMB IA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.				
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2023				
FECHA	**No DE OFICIO**	**DESTINATARIO**	**ENTIDAD/EMPRESA**	**ASUNTO**
8 DE JULIO DE 2023	Oficio-013-2023	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ	CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL	solicitud de pago de seguridad del mes junio 2023
11 DE JULIO DE 2023	Oficio-014-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	solicitud de revisión y aprobación para acta de costos n° 2
19 DE JULIO DE 2023	Oficio-015-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	entrega del informe mensual no. 2 del contrato de obra lc-003-co007-2023 municipio de teorama norte de Santander.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-013-2023

San José de Cúcuta, 8 de julio de 2023

Ingeniera
MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
Representante Legal del
CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023
CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023, TIENE COMO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: solicitud de pago de seguridad del mes junio 2023

Cordial saludo,

De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control en la ejecución del proyecto derivado del contrato en referencia me permito solicitar solicitud de pago de seguridad del mes junio del 2023, del personal que está laborando en obra.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

Cordialmente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-014-2023

San José de Cúcuta, 11 de julio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION PARA ACTA DE COSTOS N° 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero, comedidamente remitimos a usted la SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION PARA ACTA DE COSTOS N° 2 correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes junio 2023, el cual están debidamente diligenciados.

Anexo:

1. Acta de Costos N° 02 del periodo del 01 al 30 de junio 2023

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-015-2023

San José de Cúcuta, 19 de julio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: Entrega del informe mensual No. 2 del periodo del mes junio del contrato de obra LC-003-CO-007-2023 municipio de Teorama Norte de Santander.

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero la presente es la entrega del informe mensual No. 2 del periodo del mes junio del contrato de obra LC-003-CO-007-2023 municipio de Teorama Norte de Santander, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en EstructurasDirector de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras









Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS
