INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 13 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 20

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 22

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 23

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 25

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 29

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 42

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 47

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 48

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 48

3.1.1.1. Actividades Administrativas. 48

3.1.1.2. Actividades Técnicas 50

3.1.1.3. Actividades ambientales. 52

3.1.1.4. Actividades Sociales. 64

3.1.1.5. Actividades SST. 64

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos 68

3.1.3. Estado de avance del proyecto. 68

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 68

3.1.3.2. Etapa de Construcción. 69

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 71

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 71

3.2.1.1. Actividades Administrativas. 71

3.2.1.1.1. Actividades Técnicas. 72
3.2.1.2. Actividades ambientales. 76
3.2.1.3. Actividades Sociales. 86
3.2.1.4. Actividades SST. 86
3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos 89
3.2.3. Estado de avance del proyecto. 90
3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 90
3.2.3.2. Etapa de Construcción. 91
3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 92
3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 92
3.3.1.1. Actividades Administrativas. 92
3.3.1.2. Actividades Técnicas 93
3.3.1.3. Actividades ambientales. 95
3.3.1.4. Actividades Sociales 96
3.3.1.5. Actividades SST 97
3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos 97
3.3.3. Estado de avance del proyecto. 97
3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 97
3.3.2.2. Etapa de Construcción. 98
3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 99
3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 99
3.4.1.1. Actividades Administrativas. 99

3.4.1.2. Actividades Técnicas..... 101
3.4.1.3. Actividades ambientales..... 101
3.4.1.4. Actividades Sociales 101
3.4.1.5. Actividades SST..... 102
3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos..... 103
3.4.3. Estado de avance del proyecto. 103
3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 103
3.4.3.2. Etapa de Construcción. 104
3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO..... 105
3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 105
3.5.1.1. Actividades Administrativas. 105
3.5.1.2. Actividades Técnicas..... 106
3.5.1.3. Actividades ambientales..... 109
3.5.1.4. Actividades Sociales. 117
3.5.1.5. Actividades SST..... 124
3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos..... 127
3.5.3. Estado de avance del proyecto. 127
3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 127
3.5.3.2. Etapa de Construcción. 128
3.6. CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 130
3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 130
3.6.1.1 Actividades Administrativas. 130

3.6.1.2. Actividades Técnicas..... 131
3.6.1.3. Actividades ambientales..... 133
3.6.1.4. Actividades Sociales. 140
3.6.1.5. Actividades SST..... 142
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos..... 145
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 145
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 145
3.6.3.3. Etapa de Construcción. 146
3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA..... 148
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 148
3.7.1.1. Actividades Administrativas. 148
3.7.1.2. Actividades Técnicas..... 149
3.7.1.3. Actividades ambientales..... 151
3.7.1.4. Actividades Sociales. 159
3.7.1.5. Actividades SST..... 160
3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos..... 163
3.7.3. Estado de avance del proyecto. 163
3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 163
3.7.3.2. Etapa de Construcción. 164
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943..... 166
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 166
3.8.1.1. Actividades Administrativas. 166
3.8.1.2. Actividades Técnicas..... 167

3.8.1.3. Actividades ambientales. 169
3.8.1.4. Actividades Sociales. 176
3.8.1.5. Actividades SST 178
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 181
3.8.3. Estado de avance del proyecto. 181
3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 181
3.8.3.2. Etapa de Construcción. 189
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 191
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 191
3.9.1.1. Actividades Administrativas. 191
3.9.1.2. Actividades Técnicas 192
3.9.1.3. Actividades ambientales 194
3.9.1.4. Actividades Sociales. 198
3.9.1.5. Actividades SST 199
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 199
3.9.3. Estado de avance del proyecto. 199
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 199
3.9.3.2. Etapa de Construcción. 200
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 201
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 201
3.10.1.1. Actividades Administrativas. 201
3.10.1.2. Actividades Técnicas 202
3.10.1.3. Actividades ambientales 206

3.10.1.4. Actividades Sociales. 207
3.10.1.5. Actividades SST 209
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 212
3.10.3. Estado de avance del proyecto. 212
3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 212
3.10.3.2. Etapa de Construcción. 214
3.11. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 216
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA: 217
4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 217
4.1.1. Reporte Informe Semanal. 217
4.1.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 217
4.1.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 218
4.1.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 220
4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo 220
4.1.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 220
4.1.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 221
4.1.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 222
4.1.8. Seguimiento Programa de Inversiones 222
4.1.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 222
4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN. 222
4.2.1. Reporte Informe Semanal. 222
4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 223

4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 223

4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 224

4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 224

4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 224

4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 225

4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 225

4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 226

4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 226

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758. 226

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 226

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA..... 228

4.4.1. Reporte Informe Semanal. 228

4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 228

4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 228

4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 228

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 229

4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 229

4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 229

4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 230

4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 230

4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 230

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO. 231

4.5.1. Reporte Informe Semanal. 231

4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 231

4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 232

4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 233

4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo 233

4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 233

4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 234

4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 234

4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones 235

4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 235

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA. 235

4.6.1. Reporte Informe Semanal. 235

4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 236

4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 236

4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 236

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo 237

4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 237

4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 237

4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 237

4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones 238

4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 238

4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 238

4.7.1. Reporte Informe Semanal. 238
4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 239
4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 239
4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 240
4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo 240
4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 240
4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 240
4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 241
4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones 241
4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 241
4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 241
4.8.1. Reporte Informe Semanal. 242
4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 242
4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 242
4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 244
4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo 244
4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 244
4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 244
4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 245
4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones 245
4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 245
4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 245

4.9.1. Reporte Informe Semanal. 245
4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 246
4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 246
4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 246
4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo 246
4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 246
4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 247
4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 247
4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones 247
4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 247
4.10. PROYECTO OCAÑA 1814 248
4.10.1. Reporte Informe Semanal. 248
4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 248
4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 248
4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 249
4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo 249
4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 249
4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 250
4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 250
4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones 250
4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 250
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 251

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 251
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 251
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 251
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 253
5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 256
5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 256
5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 257
5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 260
5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 261
5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 264
5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 268
5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 270
5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 271
5.2.10. Actividades administrativas 273
5.2.11. Actividades técnicas 274
5.2.12. Actividades financieras 275
5.2.13. Informes especialistas y profesionales. 275
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 276
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 276
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 276
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 277
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 278

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 278
6.6. Bitácora de Obra 278
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 279
8. ANEXOS 282

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 24
Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 27
Tabla 3 Meta Fisica Final de los Municipios a ejecutar 27
Tabla 4 Caracteristicas Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 46
Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 47
Tabla 6 Condiciones Iniciales Municipio de Santiago 48
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 49
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 52
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 69
Tabla 10 Condiciones Iniciales Municipio de Herrán 71
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 72
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herran 75
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 90
Tabla 14 Condiciones Iniciales Municipio de Ocaña-1758 92
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 93
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 94
Tabla 17 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758 98

Tabla 18 Condiciones Iniciales Municipio de Cáchira 99
Tabla 19 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 100
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 103
Tabla 21 Condiciones Iniciales Municipio de Abrego 105
Tabla 22 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 106
Tabla 23 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 108
Tabla 24 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 128
Tabla 25 Condiciones Iniciales Municipio de La Playa 130
Tabla 26 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa 130
Tabla 27 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 133
Tabla 28 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 146
Tabla 29 Condiciones Iniciales Municipio de Pamplonita 148
Tabla 30 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita 149
Tabla 31 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 151
Tabla 32 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 164
Tabla 33 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 1943 166
Tabla 34 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 167
Tabla 35 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 188
Tabla 36 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2052 191
Tabla 37 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 192
Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052 200
Tabla 39 Condiciones Iniciales Cto. Municipio de Ocaña 1814 201
Tabla 40 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814 202

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 205
Tabla 42 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 214
Tabla 43 Reporte informes semanales Municipio de Santiago 217
Tabla 44 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago. 218
Tabla 45 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago 219
Tabla 46 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Santiago 220
Tabla 47 Ensayos de Laboratorio Municipio de Santiago 220
Tabla 48 Garantías Municipio de Santiago 221
Tabla 49 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago 222
Tabla 50 Reporte informes semanales Municipio de Santiago 222
Tabla 51 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Herrán 223
Tabla 52 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Herran 224
Tabla 53 Garantías Municipio de Herrán 225
Tabla 54 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Herrán 226
Tabla 55 Garantías Municipio de Ocaña 227
Tabla 56 Reporte informes semanales Municipio de Cachira 228
Tabla 57 Garantías Municipio de Cáchira 229
Tabla 58 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira 230
Tabla 59 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 231
Tabla 60 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 231
Tabla 64 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Abrego – Junio -2023 232
Tabla 62 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 233

Tabla 63 Ensayos de Laboratorio Municipio de Abrego 233
Tabla 64 Garantías Municipio de Cáchira 234
Tabla 65 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 235
Tabla 66 Reporte informes semanales Municipio de Playa 235
Tabla 67 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa 236
Tabla 68 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de La Playa 236
Tabla 69 Ensayos de Laboratorio Municipio de La Playa 237
Tabla 70 Garantías Municipio de La Playa 237
Tabla 71 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa 238
Tabla 72 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita 238
Tabla 73 Maquinaría y Equipo Municipio de Pamplonita 239
Tabla 74 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplonita 240
Tabla 75 Ensayos de Laboratorio Municipio de Pamplonita 240
Tabla 76 Garantías Municipio de Pamplonita 241
Tabla 77 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita 241
Tabla 78 Reporte informes semanales Gobernación 1943 242
Tabla 79 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 242
Tabla 80 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 244
Tabla 81 Garantías Gobernación 1943 244
Tabla 82 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 245
Tabla 83 Reporte informes semanales Gobernación 2052 246
Tabla 84 Garantías Gobernación 2052 247
Tabla 85 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052 247

Tabla 86 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814 248

Tabla 87 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814 248

Tabla 88 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814 249

Tabla 89 Ensayos de Laboratorio del Municipio de Ocaña 1814 249

Tabla 90 Garantías Municipio de Ocaña 1814 250

Tabla 91 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814 250

Tabla 92 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 251

Tabla 93 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 275

Tabla 94 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 276

Tabla 95 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 277

Tabla 96 Seguimiento Financiero Interventoría 277

Tabla 97 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 278

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander. 24

Ilustración 13 Cartelera informativa y buzón satélite. 118

Ilustración 3 Información y Divulgación de inicio de tramos 119

Ilustración 4 Elementos de prevención y charla a motociclista. 121

Ilustración 5 Soportes de la NO conformación de la veeduría ciudadana. 122

Ilustración 6 Charlas y/o capacitaciones a empleados. 123

Ilustración 7 Actas de Vecindad, corredor número dos (2). 141

Ilustración 8 Reporte cifras de contratación agosto de 2023. 177

Ilustración 9 Socialización del proyecto..... 207

Ilustración 10 Acta de Compromiso. 209

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago..... 29

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 30

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 31

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 32

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cachira..... 33

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 34

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 35

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 36

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña-1814 37

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 38

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 39

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 40

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 41

Fotografía 14 Instalación de acero de 1/2” y 3/8” 51

Fotografía 15 Verificación del cumplimiento de EPP Santiago. 65

Fotografía 16 Verificación de maquinaria Santiago. 66

Fotografía 16 Verificación Equipos de Emergencia Santiago. 66

Fotografía 19 vista del Director de Interventoría 73
Fotografía 18 Instalación de tubería de 36”..... 73
Fotografía 20 Avance de huella y piedra pegada 73
Fotografía 22 instalación de acero y formaleta para el vaciado del concreto..... 74
Fotografía 21 Excavación para la instalación de las vigas riostras..... 74
Fotografía 24 Viga riostra..... 74
Fotografía 23 Encofrado para fundida de..... 74
Fotografía 25 Verificación del cumplimiento de EPP Herran. 87
Fotografía 26 Verificación de maquinaria Herran. 88
Fotografía 27 Verificación Equipos de Emergencia Herran. 88
Fotografía 28 actividades corredor 1 chorro2 del mes de septiembre 107
Fotografía 29 Entregas de EPP - Abrego..... 125
Fotografía 30 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 126
Fotografía 31 Entregas de EPP – La Playa..... 143
Fotografía 32 Maquinaria La Playa 143
Fotografía 33 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa 144
Fotografía 34 Entregas de EPP – Pamplonita..... 161
Fotografía 35 Maquinaria Pamplonita 161
Fotografía 36 Equipos de Emergencia Municipio de Pamplonita..... 162
Fotografía 37 Entrega de EPP – Gobernación 1943 179
Fotografía 30 Maquinaria y Equipos Gobernación 1943 179
Fotografía 39 Equipos de Emergencia Gobernación 1943..... 180
Fotografía 40 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814 210

Fotografía 41 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814 211

Fotografía 42 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814 211

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 69

Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herran 91

Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 98

Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Abrego 129

Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de La Playa 147

Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 165

Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 189

Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 214

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.314.324.054,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.203.091.392,61. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 16.898.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente

- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

- Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
- Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CUCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato

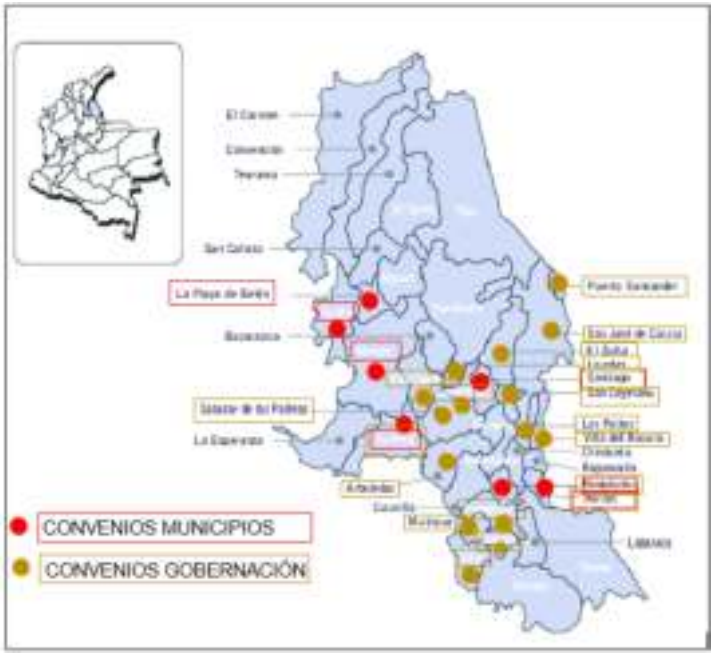


Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyaca – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la Interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios Interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herran, Pamplonita, La Playa y Cachira se tiene la siguiente meta física a ejecutar:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 14 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 520 mts de placa huella, 1 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 23 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.790 mts de Placa Huella y 7 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.

Tabla 3 Meta Fisica Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de

crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, HERRAN, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLOITA, GOBERNACIÓN 1943 y GOBERNACIÓN 2052. A la fecha se encuentra terminado 1 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758 el cual se encuentra en liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto
	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.

	
Tramo K3+000 hasta el K3+100 vereda el Ramal.	Tramo K6+600 hasta el K6+800 vereda el Ramal.
	
Tramo K6+900 hasta el K6+700 vereda el Ramal.	Tramo K9+400 hasta el K9+700 vereda el Ramal.

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.

	
PR 01+420, Calle 2 21B-123, municipio de Ocaña	PR 01+0510 Calle 2 22A – 38, municipio de Ocaña
	
PR 01+0690 Calle 2 18B-1-18B-7, municipio de Ocaña	PR 01+0710 Calle 2 16-14, municipio de Ocaña

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrinson hasta el punto PR 18+0200.

	
PR 13+900, Corredor la Samaritana	PR 14+700, Corredor la Samaritana
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.

	
Sector el Lucero, municipio de Cachira	Sector La Caramba, municipio de Cachira
	
Sector La Caramba, municipio de Cachira	Sector La Carrera, municipio de Cachira

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cachira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.

	
Sector la vega el tigre, municipio de Abrego	Sector los Milagros, municipio de Abrego
	
Sector el chorro, municipio de Abrego	Sector la sabana, municipio de Abrego

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	
Corredor 2 - Clavelinas	Corredor 1 Corral Viejo – Llano Grande

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.



Tramo 1 Avicola



Tramo 2 Plak Huella Extt



Tramo 3 Alto Grande



Tramo 4 Buenavista



Tramo 5 Bosquecito



Tramo 7 Curvon

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña-1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.






Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.






Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.



Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.



Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, HERRAN, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943 Y 2052 y terminado el convenio con el municipio de OCAÑA-1758. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CACHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VIA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyaca – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.

Tabla 4 Caracteristicas Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En Ejecución	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Terminado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En Ejecución	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado En Ejecución	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado En Ejecución	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En Ejecución	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En Ejecución	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En Ejecución	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos que a la fecha de corte del presente informe se encuentran en ejecución.

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Final:	31 de diciembre de 2023

Tabla 6 Condiciones Iniciales Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el Contratista está realizando actividades de subsanación al PAGA observado por la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de septiembre de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-785-22 del 13-Jul-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago

Por otra parte, en la solicitud realizada por el contratista por conceto del ajuste a los APUs del proyecto, manifestando desequilibrio económico, esta Interventoría una vez revisada los documentos soportes entregados por el Contratista y con la verificación in-situ de las posibles afectaciones financieras en la ejecución del proyecto; mediante oficio No. GIC-INVIAS-NTS-720-22 de asunto: "ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-520-22 de fecha 10 de mayo de 2023 - Evaluación de la Interventoría al respecto de la solicitud del contratista de obra UNION TEMPORAL PLACAHUELLAS SANTIAGO 2022, contrato LP-OP-01-2022 realizada por oficio PHS2022 – 052 – 2022 de fecha abril 17 de 2023 cuyo asunto es: "ENTREGA BALANCE N 02", se pronuncia *"(…)…teniendo en cuenta que, a más de la necesidad de disminuir el alcance físico del contrato basados en los resultados de LA COMPLEMENTACION O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el alcance físico proyectado disminuiría aún más en atención a la situación evaluada en el presente comunicado, esta interventoría respetuosamente se permite solicitar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS*

emita pronunciamiento al respecto, basado en el concepto de la interventoría, a fin de conocer su análisis, posición e instrucciones sobre la manera en que deberá proceder la interventoría respecto de la situación presentada. (…)", el cual la Territorial del Norte de Santander emite un comunicado mencionando la no objeción del mismo y traslada la solicitud a la Subdirección de vías Regionales para que se permita dar sus comentarios respectivos como unidades ejecutoras del contrato, mediante su comunicación SVR 37336 de 29 de junio de 2023 da viabilidad a la solicitud del contratista.

Por otra parte, se continua con los comités virtuales los viernes de cada semana para hacer seguimiento al contrato de obra No. LP-OP-01- 2022, allí se plasman los compromisos de entrega de los diferentes documentos solicitados por la Interventoría, municipio o Invias, de esta manera se realiza la trazabilidad del estado del contrato en temas de entrega documental. y adicional a esto se va informando cómo va el avance físico de la obra en ejecución.

3.1.1.2. Actividades Técnicas.

Durante la ejecución del contrato para el mes de septiembre se realizan las siguientes actividades:

Se continua con la instalación de la subbase granular, humectación de la misma y compactación, actividades de figurado de acero de refuerzo, Fundida de Huellas en concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo, fundida de cunetas y bordillos en concreto de 3000 PSI y actividades de transporte interno de los materiales granular, y actividades de topografía del contratista realiza actividades de chequeo de niveles. Entre otras actividades se realizaron las siguientes:

- Se ejecutan actividades de excavación para las vigas riostras
- Se realiza la actividad de la excavación para los bordillos.
- Se realiza la instalación del acero de refuerzo en las huellas.
- Se instala acero de refuerzo en las vigas riostras.
- Se inicia con la actividad de la instalación del acero de refuerzo en los bordillos.
- Instalación del acero de refuerzo en cunetas.
- Vaciado de concreto de 3000 psi para las huellas.
- Vaciado de concreto para vigas riostras.
- Inicia la fundida del concreto para bordillo.
- Vaciado de concreto de 21 mpa para las cunetas.
- Se realizan las actividades de la fundida de piedra pegada.
- Se realizan viajes de transporte interno material pétreo
- Se realizan viajes de transporte Interno material de peso.

El día 06 de septiembre de 2023 se evidencio que el contratista no está cumpliendo con los diseños aprobados por la interventoría debido a que en la instalación del acero de refuerzo longitudinal en las huellas están instalando 3 varillas de ½" y 3 varillas de 3/8" en todo el tramo, y lo que el diseño estipula son 6 varillas de ½". Por lo anterior la Interventoría solicita al Contratista haga las aclaraciones técnicas pertinentes de porque se está realizando la instalación de un acuantia menor a la aprobada





Fotografía 14 Instalación de acero de 1/2" y 3/8"

Se realizan la toma de densidades en la instalación de la subbase granular para determinar el porcentaje de compactación del terreno.

El Contratista ha realizado tomas de concreto para ensayos de resistencia a la compresión, la Interventoría y el Contratista han realizado la toma de densidades de la subbase granular instalada para determinar la compactación, se solicitó una validación estructural al contratista del tramo comprendido entre el K2+400 al K2+753, la Interventoría solicita al contratista realizar la compactación de los hombros y contrahuella antes de la instalación del acero y el vaciado del concreto.

En el desarrollo del presente proyecto se evidencio la presencia de fisuras en las huellas y contrahuellas, por lo que la Interventoría solicita al Contratista la entregar de un protocolo para reparar y sellar dichas fisuras, así como la utilización del antisol para el curado del concreto en todo el ancho de la vía

En el procedimiento constructivo la Interventoría solicita que el acero instalado sea ubicado en la mitad de la placa huella, así mismo la Interventoría solicita al contratista la instalación de las panelas que garanticen el recubrimiento y posición final del acero.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2023.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-SEPTIEMBRE-2023		
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**			
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	89.90	7,310,308.40	
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	562.83	410,474,733.15	
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	38114.87	313,221,522.13	
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	991.50	162,355,150.50	
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	223.55	85,084,024.20	
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	978,445,738.38	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**			
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00			
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00			
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00			
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,015.00	$ 10,196,368.00			
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	6.00	$ 4,912,482.00	
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00			
					SUB TOTAL	**$ 434,791,095.00**	$	4,912,482.00	
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00			
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00			
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**			
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS									
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00			
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00			
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**			
TOTAL EJECUTADO							**$**	**983,358,220.38**	

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 06/09/2023: Se realiza visita de campo en la vereda Cuperena y zul alto del municipio de Santiago, para realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de cada uno de los proyectos contemplados en los programas del documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), donde se logró evidenciar que el contratista subsano las observaciones que fueron enviadas por la interventoría

- 12/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1038-22, aprobación de informes mensuales.

- 5/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1040-22, observaciones informes mensuales.

- 15/09/2023. Se recibe oficio N°PHS2022-080-2022, entrega documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental).

- 27/09/2023: Se realiza visita de campo en la vereda Cuperena y zul alto del municipio de Santiago, para realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de cada uno de los proyectos contemplados en los programas del documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), donde se logro evidenciar que el contratista subsano las observaciones que fueron enviadas por la interventoría.

- 30/09/2023: Se recibe informe mensual correspondiente al mes de septiembre.

Durante la ejecución del contrato la UT estará obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la legislación ambiental vigente, se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente primordiales para la idónea ejecución de la obra.

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambientaly Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El día viernes 26 de mayo del presente año siendo las 9:05am se conforma el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 3; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas:

Se realiza capacitación ambiental al personal de obra y administrativo en: Hallazgo de fauna

PLAN DE CAPACITACIONES									
N°	TEMA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	Inducción componente ambiental								
2	PAGA y plan de contigencias de obra								
3	Manejo de Residuos sólidos y Regla 3R								
4	Hallazgo de fauna								
5	Disponibilidad de agua en el planeta y Tips para ahorrar agua								
6	Manejo de derrames de sustancias químicas								
7	Contaminación del aire								
8	Cierre Ambiental								
		Ejecutado							
		Sin Ejecutar							

Fuente contratista



Fuente contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Santiago, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta.

Se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza.

Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa CTZ El Zulia SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con la versión 3 del documento PAGA.

Con respecto a la aprobación del documento PAGA, la versión N°4 se encuentra en revisión y ajuste.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Actividades ejecutadas: Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS

Fuente de materiales

Localización	Volumen a extraer	Tipo de fuente	Estado Legal		
			Con Licencia ambiental	En trámite	Vigencia de la licencia
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra.

PERIODO (1 al 30 de septiembre)	MATERIALES EN OBRA (m3)			
	Arena	Triturado	Piedra	Subbase
Llego a obra	1128,33	1110,5	341,53	1201,52
Usado	825	768	135,5	1120

Fuente. Contratista



Fuente interventoría

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se mantiene en buen estado cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de la obra con malla sintética para el tránsito vehicular y peatonal.



Fuente contratista

Se cuenta con señalización y manejo de tránsito



Fuente Interventoría

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos están siendo solicitados como material de relleno en zonas donde se ha presentado socavación por las fuertes lluvias, a la medida que avance el proyecto y se generen más escombros estos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Santiago,se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Durante este mes se evidencia la instalación del punto ecológico

para la segregación de residuos según la normativa vigente.



Fuente: Interventoría

Durante este periodo no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario ya que la cantidad generada no es significativa.

Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo



Fuente: Interventoría

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas:

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Para el abastecimiento de agua, se cuenta con el permiso del señor Alexander Cáceres Suarez propietario de predio Finca La Vega ubicada en la vereda de Zul Alto del municipio de Santiago, para que la UT tome agua de su predio necesaria para las actividades constructivas. (Ver anexo 6. Permiso de abastecimiento de agua).



Fuente: Contratista

Se instala baño sanitario cerca al campamento, garantizando así las condiciones mínimas de higiene para el personal de obra.



Fuente: Interventoría

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena, en recipientes hermético, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.



Fuente: Interventoría

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. **PBSE-4.1-11**

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente.

Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no intervenir la vegetación existente fuera del área autorizada.

Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre los procedimientos de preservación de la fauna y de la prohibición de realizar actividades de extracción o afectación de la fauna.

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a el hogar de paso de Corponor ubicado en la vereda Las Piedras del municipio El Zulia.

En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna.

Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores. (Ver Anexo 3. Permiso campamento, almacén y baño).



Fuente: Interventoría.

Proyecto 2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisióntécnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT.

Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema dedirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

El operario cuenta con todos los elementos de protección personal (EPP), que son necesariospara realizar su trabajo.

Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes deobra.

La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.


En el periodo no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra, se sugiere mitigar los derrames de aceites encontrados en la ejecución de obra e implementar el programa de manejo de derrames de combustible, grasas y aceites.



Fuente interventoría

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental

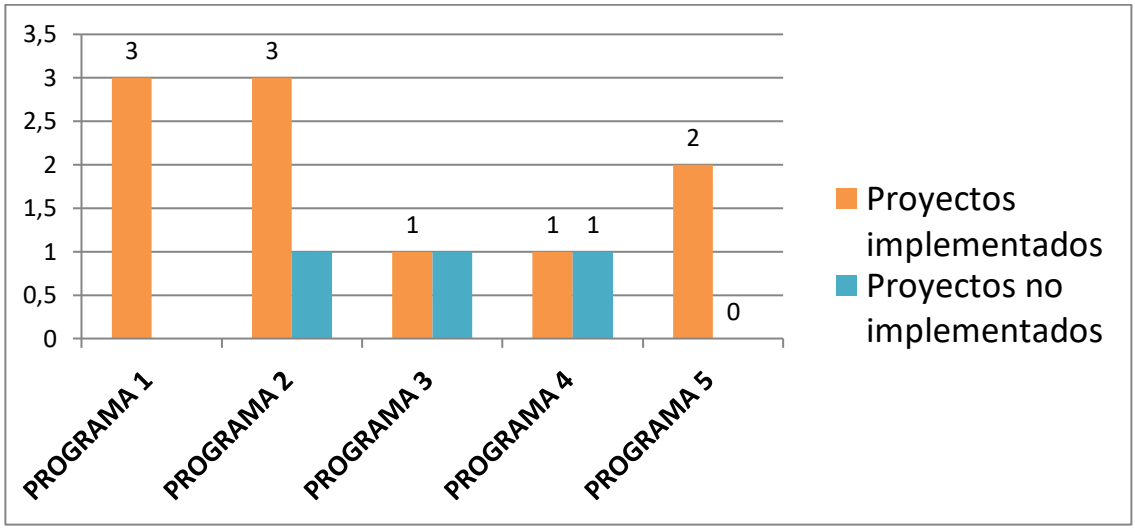

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5)Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentadorelación alguna en el avance del proyecto.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

El consorcio U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, hasta la fecha ha realizado el debido cumplimiento a todas las solicitudes realizadas por la interventoría.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.1.1.4. Actividades Sociales.

La Interventoría en visitas realizadas en el periodo del presente informe, pudo evidenciar que, la Unión Temporal Placa Huellas Santiago 2022, NO se encuentra implementando en el área de influencia del proyecto, los distintos proyectos (Programas) sociales, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); los proyectos son cinco (5):

1. Atención a la Comunidad.
2. Información y Divulgación.
3. Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.
4. Cultura Vial y Participación Ciudadana.
5. Contratación Mano de Obra.

Por lo anterior, esta Interventoría en los comités de obra celebrados en el periodo a solicitado al Contratista implementar los programas de Gestión Social, los cuales deben de ser implementados dentro del área de influencia del proyecto, durante el periodo de ejecución de la obra, también se le ha recordado al Contratista la entrega de la documentación Social pendiente que a la fecha no han sido entregados o se 3encuentran pendientes de subsanar.

3.1.1.5. Actividades SST.

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	MANUEL ACONCHA CONTRERAS	88.176.344	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5/09/2023	IPS MEDCARE	CONSTRUCIONES JARP
2.	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	1.120.564.035	OFICIAL DE OBRA	26/09/2023	IPS MEDCARE	CONSTRUCIONES JARP
3.	RUBEN DARIO CARDENAS NUNCIRA	1.094.859.065	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	6/09/2023	IPS MEDCARE	UT PLACA HUELLA DE SANTIAGO

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto de Santiago.

4. Dotación elementos de protección personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 15 Verificación del cumplimiento de EPP Santiago.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.

Fotografía 16 Verificación de maquinaria Santiago.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos con maquinaria amarilla, se evidencian los elementos de emergencias en campo.

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

Fotografía 17 Verificación Equipos de Emergencia Santiago.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de septiembre 2023 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	Septiembre	3	26

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	Septiembre	0

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear los siguientes ítems No Previstos que corresponden a los costos asociados al transporte de materiales en vehículos de carga tipo camioneta de platón de 1 m3 de capacidad:

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PETREOS	m3	4,630.96	$ 69,400.00	$ 321,388,624.00
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE METERIALES DE PESO	kg	275,588.51	$ 648.00	$ 178,581,354.00

Los cuales han sido avalados por la territorial Norte de Santander en su concepto con radicado 20233802 de fecha 28 de junio de 2023 y del INVIAS en Planta Central en su oficio SVR 37336 de 29 de junio de 2023.

3.1.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales, de las cuales se describe su avance a continuación.

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de Estudios y Diseños acumulado es del 98.32% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 51.619.190,22 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 52.501.570,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-210-22 del 24-Ene-23 - **APROBADO**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, El contratista continúa actividades de obra, el contratista ha realizado actividades de instalación de la subbase granular, instalación de concreto de 3000 PSI y Ciclópeo, actividad de obra para viga riostra, huella, bordillos y cunetas.

Con corte al 30 de septiembre de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 22.19% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $983.356.582,91 vs un programado del 55.79% que equivale en pesos a $2.471.779.134,50.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

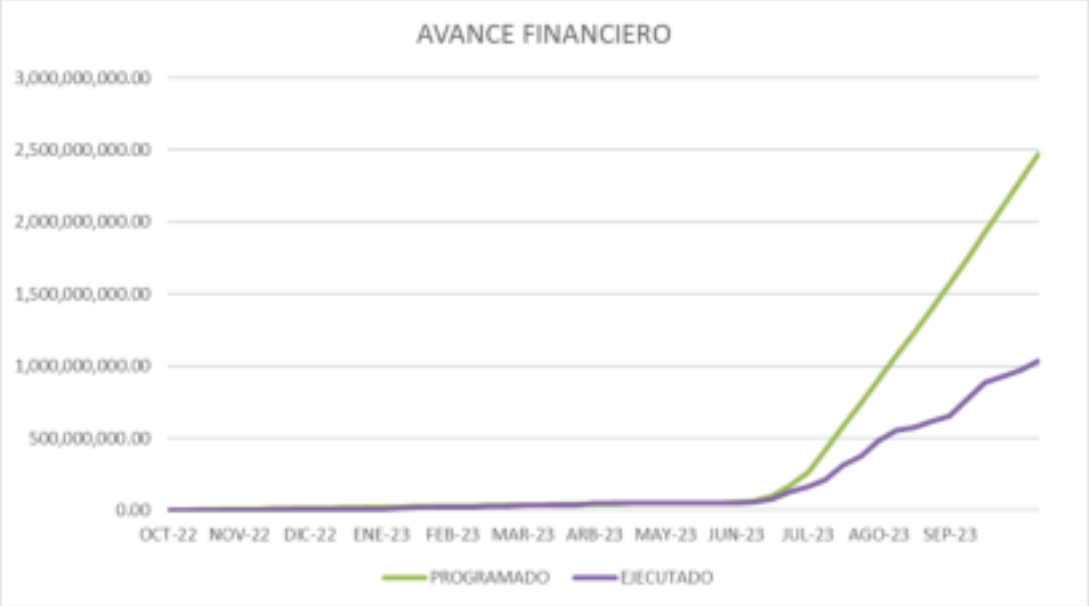


Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 33.59%, lo anterior se debe a que de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado 1.808 ml de Placa

Huella correspondiente al 54.8% del valor de ese actividad y, 13 Alcantarillas correspondientes a un 58.10% la construcción de esa actividad.

Por medio de comités de obra, se le ha solicitado al contratista mejorar el aseo y orden de la obra en ejecución ya que se evidencia material granular mal acopiado, herramienta menor regada por el corredor y basura generada de las actividades de elaboración de la mezcla de concreto.

Por otra parte, se le ha solicitado la entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso presentado a la fecha, lo anterior teniendo en cuenta que se ha construido 1.000 ml de placa huella completa quedando un total de 2.300 ml por terminar y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 31.50 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Prorroga 1:	4 meses
Prorroga 2:	5 meses
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones Iniciales Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.2.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción. A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de septiembre de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-999-22 del 05-Sept-23
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-999-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-289-22 del 21-Feb-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán

Se continua con los comités virtuales cada viernes para hacerle seguimiento al contrato de obra No. 146 de 2022, allí se plasman los compromisos de entrega de los documentos de la etapa de pre- construcción y de estudios y diseños, de esta manera se lleva la trazabilidad de cómo se encuentra el contrato a la fecha en cuestión de entrega documental.

3.2.1.1.1. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de acopio de materiales, perfilado de la vía existente e instalación de subbase granular.

Por otra parte, la contratista continua con actividades de corte y figurado del acero para la Placa Huella, cunetas y bordillos, Instalación y compactación de subbase granular, instalación de formaletas y vaciado de concreto en huellas y vigas.

Durante la ejecución de obra se presentaron lloviznas sectorizadas y parciales en horas de la tarde.



Fotografía 19 Instalación de tubería de 36”



Fotografía 18 vista del Director de Interventoría





Fotografía 20 Avance de huella y piedra pegada



Fotografía 22 Excavación para la instalación de *las vigas riostras*



Fotografía 21 instalación de acero y formaleta para el vaciado del concreto



Fotografía 24 Encofrado para fundida de Poceta en concreto de 3000 psi.



Fotografía 23 Viga riostra.

Se realizan recorridos de obra para realizar la respectiva revisión en campo del proceso constructivo que viene ejecutando el contratista de obra, se evidencia la ejecución de una alcantarilla en el PR0+550 en donde se observó la formaleta en la poceta para la posterior fundida en concreto de 3000 psi, se evidencio alcantarilla en el K0+950 con 6 tubos de 36" ya construida en su totalidad, se observa la fundida de huellas en concreto de 3000 psi, en donde instalaron 6 varillas de ½" longitudinales y varillas de ¼" transversales, y continúan con la excavación para las vigas riostras en el sector del ramal.

Continúan con la actividad del corte y figurado del acero de refuerzo para las vigas riostras y corte de acero transversal para las huellas.

En el sitio de obra no se encuentra el ingeniero residente aprobado por la Interventoría, hay una persona encargada de la obra de nombre Álvaro Rodríguez, se le hicieron las observaciones pertinentes encontradas en campo, deben maquillar la alcantarilla que está terminada en su totalidad.

De todos estos hallazgos evidenciados en campo, se realiza un acta en obra y se dejan plasmados los compromisos que el contratista debe cumplir.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2023.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-SEPTIEMBRE-2023	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.00	42,047.00	$ 16,146,048.00	262.64	11,043,224.08
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	886.39	857,957.00	$ 760,484,505.00	141.67	121,546,768.19
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	48,718.87	7,255.89	$ 353,498,762.00	9934.85	72,086,178.77
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	920.00	274,215.00	$ 252,277,800.00	836.55	229,394,558.25
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	276.97	494,679.00	$ 137,011,243.00	40.55	20,059,233.45
					SUB TOTAL	**$ 1,519,418,358.00**	$	454,129,962.74
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	236.50	42,047.00	$ 9,944,116.00	191.98	8,072,183.06
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	34.56	857,957.00	$ 29,650,994.00		
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.48	650,737.00	$ 2,264,565.00		
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	58.24	33,094.00	$ 1,927,395.00		
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$ 19,498,176.00		
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,315.60	7,255.89	$ 16,801,739.00		
					SUB TOTAL	**$ 80,086,985.00**	$	8,072,183.06
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	2,413.32	2,249.00	$ 5,427,557.00		
					SUB TOTAL	**5,427,557.00**	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$ 8,563,464.00		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$	-
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,421.90	39,871.64	$ 96,565,125.00		
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	64,738.47	445.65	$ 28,850,699.00		
					SUB TOTAL	**125,415,824.00**	$	-
TOTAL EJECUTADO							**$**	**462,202,145.80**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herran

3.2.1.2. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 13/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1041-22, observaciones informes mensuales.
- 15/09/2023: Se recibe oficio N° PHE2022-055-2022, entrega documentación PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).
- 28/09/2023: Se realiza visita a campo, donde se evidencia que está implementando algunos de los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).
- 30/09/2023: Se recibe informe mensual correspondiente al mes de septiembre.

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambientaly Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se programa reunión para el viernes 25 de agosto con el fin de conformar el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA.

Se sugiere al contratista incluir en el informe el listado de las personas que hacen parte del grupo de gestión socio ambiental, ya que no se evidencia.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción del componente ambiental a todo el personal nuevo de obra y administrativo.

Se realiza capacitación sobre Programas del PAGA, manejo de residuos sólidos y regla de las 3R. Se solicita la instalación del punto ecológico al director de obra, ya que este se encuentra almacenado dentro de la bodega.



Fuente contratista

PLAN DE CAPACITACIONES				
N°	TEMA	MES 1	MES 2	MES 3
1	Inducción componente ambiental			
2	PAGA y cuidado de los Recursos Naturales			
3	Manejo de Residuos sólidos y Regla 3R			
4	Hallazgo de fauna			
5	Disponibilidad de agua en el planeta y Tips para ahorrar agua			
6	Manejo de derrames de sustancias químicas			
7	Contaminación del aire			
8	Cierre Ambiental			
		EJECUTADO		

Fuente contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso

agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque. A la fecha no se ha requerido de este servicio.

Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto.

Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

Con respecto a la aprobación del documento PAGA, la versión N°3 fue presentada ante la interventoría.

Realizando el debido cumplimiento a la normatividad vigente que compete el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y de acuerdo con lo establecido en el marco legal colombiano, se reciben observaciones vía correo electrónico en borrador a ser subsanadas en documento PAGA Vr3.

Con respecto a la aprobación del documento PAGA, la versión N°3 fue presentada ante la interventoría.

El documento PAGA Versión 4, se encuentra en revisión y ajuste al momento de la presentación de este informe.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

El contratista hace entrega de los EPP a todo el personal.



Fuente contratista.

Durante el presente informe no se generó material sobrante.

Fuente de materiales

Localización	**Tipo de fuente**	**Estado Legal**		
		Con Licencia ambiental	**En trámite**	**Vigencia de la licencia**
Bochalema, Norte de Santander	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0934 del 19 de octubre de 2009		Vida útil del proyecto.

Materiales de obra

PERIODO (1 al 30 septiembre)	**MATERIALES EN OBRA (m3)**			
	Arena	**Triturado**	**Piedra**	**Subbase**
Llego a obra	588	580	24	1524
Usado				1524



Fuente interventoría

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se cuenta con señalización y manejo de tránsito, sin embargo, se le solicita al contratista la instalación, ya que esta se encuentra dentro del almacén donde guardan todos los materiales de construcción.





Fuente interventoría

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Herrán, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Durante este mes se evidencia la instalación del punto ecológico para la segregación de residuos según la normativa vigente.

Se le sugiere al contratista instalar el punto ecológico en los frentes de obra, ya que este se encuentra almacenado donde tienen los materiales de construcción.



Fuente de interventoría

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el abastecimiento de agua, se está solicitando el permiso con el propietario(a) del predio, para que la UT tome agua de su predio necesaria para las actividades constructivas.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón, se esta solicitando el permiso con el propietario(a).



Fuente Contratista

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación.

Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente.

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Herrán.

Se sugiere al contratista en caso de realizar algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se cuenta con el alquiler de una casa que funciona como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y definir el área de oficina para labores administrativas.



Fuente interventoría

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17


Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOA. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente. Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización, que aún no ha sido instalada por el contratista. En este mes no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra.



Fuente Contratista

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental

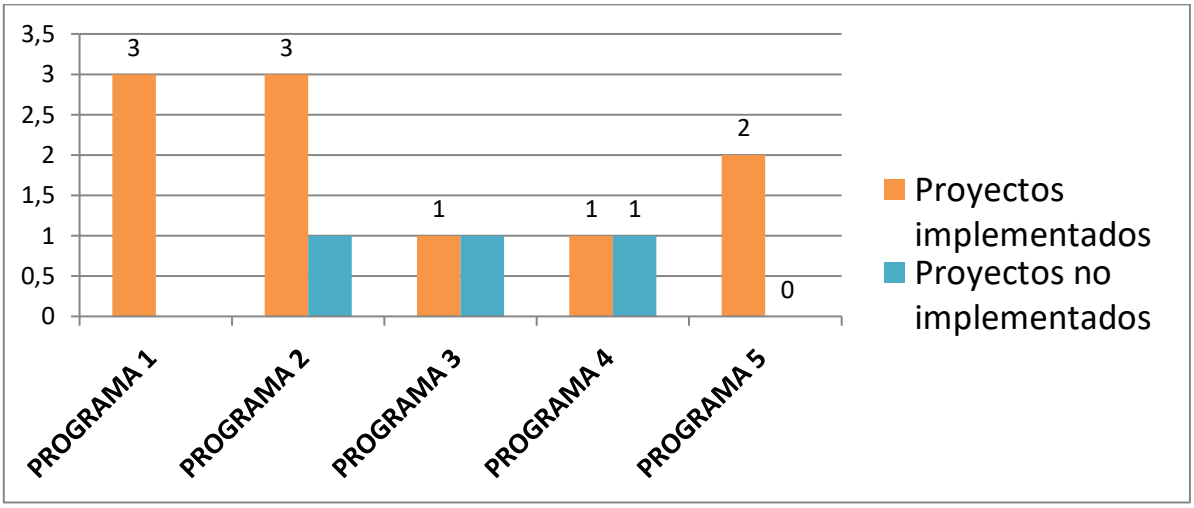

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

La interventoría le sugirió al contratista entregar anexos correspondientes a cada mes, para evaluar los indicadores de cumplimiento en cada uno de los programas.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA HERRAN 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.2.1.3. Actividades Sociales.

La Interventoría en visitas realizadas en el periodo del presente informe, pudo evidenciar que la Unión Temporal Placa Huellas Herran 2022, NO se encuentra implementando en el área de influencia del proyecto, los distintos proyectos (Programas) sociales, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); los proyectos son cinco (5):

1. Atención a la Comunidad.
2. Información y Divulgación.
3. Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.
4. Cultura Vial y Participación Ciudadana.
5. Contratación Mano de Obra.

Por lo anterior, esta Interventoría en los comités de obra celebrados en el periodo a solicitado al Contratista implementar los programas de Gestión Social, los cuales deben de ser implementados dentro del área de influencia del proyecto, así mismo, se le recuerda nuevamente a la profesional social que, no han enviado las diferentes Actas de Vecindad, Actas de Compromiso y Certificados de Territorialidad, los cuales debieron de ser presentados antes de comenzar los respectivos trabajos físicos de obra; esta Interventoría sobre el tema, ha enviado distintos oficios, los cuales no han sido respondidos por parte del Contratista.

3.2.1.4. Actividades SST.

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

El contratista Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	JESUS ANTONIO PABON PEÑALOZA	1.094.367.614	OBRERO	22/09/2023	GESISALUD	UT PLACA HUELLA DE HERRAN-2022
2.	JOSE ANIBAL SANCHEZ CARRILLO	5.470.121	OBRERO	22/09/2023	GESISALUD	UT PLACA HUELLA DE HERRAN-2022
3.	RAFAEL AFRANIO ESPITIA CONTRERAS	5.455.500	OBRERO	21/09/2023	GESISALUD	UT PLACA HUELLA DE HERRAN-2022

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto de Herran, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. Dotación elementos de protección personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 25 Verificación del cumplimiento de EPP Herran.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.

Fotografía 26 Verificación de maquinaria Herran.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se tiene en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

Fotografía 27 Verificación Equipos de Emergencia Herran.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de agosto de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de septiembre 2023 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	Septiembre	3	1

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	Septiembre	0

3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear los siguientes ítems No Previstos que corresponden a los costos asociados al transporte de materiales en vehículos de carga tipo camioneta de platón de capacidad de 1 m3:

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PETREOS	m3	2,421.90	$ 39,871.64	$ 96,565,125.00

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE METERIALES DE PESO	kg	64,738.47	$ 445.65	$ 28,850,699.00

Los cuales han sido avalados por la territorial Norte de Santander en su concepto con oficio DT-NSA 50619 de 5 de julio de 2023 y del INVIAS en Planta Central en si oficio SVR 41761 de 20 de julio de 2023.

3.2.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación:

3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de Estudios y Diseños acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 20.486.185,83 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 20.693.117,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista ha realizado actividades de Figurado, armado, acopio de materiales, Instalación de Subbase granular, instalación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo en el tramo a ejecutar.

El contratista continuo con las actividades de obra física en el mes de septiembre de 2023. reprogramación de acuerdo a Prorroga 2 observada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-999-22 del 05 de septiembre de 2023, por lo anterior, para el seguimiento financiero se realiza seguimiento con ese cronograma hasta que hagan la entrega definitiva, para el presente informe se presenta un avance programado del 53.23% Vs Un ejecutado del 25.94%.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herran

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 27.29%, lo anterior se debe a que, de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado 588 ml de Placa Huella correspondiente al 49% del valor de esa actividad y, 4 Alcantarillas correspondientes a un 100% la construcción de esa actividad.

Por otra parte, se le ha solicitado la entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso presentado a la fecha, lo anterior teniendo en cuenta que se ha construido 165 ml de placa huella completa quedando un total de 612 ml por terminar y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 8 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones Iniciales Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas que ha venido adelantando el Contratista se encuentra en etapa de liquidación del contrato, a continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de julio de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-676-22 del 13-Jun-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

La Interventoría está a la espera de la entrega de los documentos del PAGA definitivo para ser radicado a la subdirección de Sostenibilidad del INVIAS y proceder con su aprobación definitiva, por otra parte, se ha solicitado la entrega de los informes trimestrales del componente Ambiental y Social, para proceder con el cierre de estos componentes, además de la entrega del acta final de obra y la entrega en físico de los Estudios y Diseños para su posterior radicación en el INVIAS.

3.3.1.2. Actividades Técnicas.

Para el mes de septiembre de 2023 el contratista se encuentra realizando ajustes en campo de las observaciones realizadas a las obras terminadas por parte de la Interventoría y el INVIAS.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra. Es de aclarar que las cantidades presentadas no son las

definitivas ya que el contrato se encuentra en liquidación y pueden surgir ajustes a las cantidades.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55	$ 527,302,694.55	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72	$ 17,263,520.72	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00	$ 0.00	
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91	$ 945,773,864.30	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00	$ 0.00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00	$ 0.00	
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS						$ 1,603,662,424.42	

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña

3.3.1.3. Actividades ambientales.

El día 30 de julio de 2023, el Contratista termina la ejecución del proyecto Ocaña-Límites-Morrison, siendo los sectores intervenidos, barrio El Lago, Juan XXIII y vereda La Samaritana.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 07/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1022-22, con la solicitud versión final del documento PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental).

- 12/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1045-22, observación lista de chequeo, entrega de documentación final ambiental.

- 22/09/2023: Se realiza mesa de trabajo con la documentación final que debe ser entregada por el contratista.

Documentación pendiente de entrega

- VERSIÓN FINAL PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental)
  FORMATOS CON SUS ANEXOS:
- MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PAGA
- MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS.
- MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO.
- MASPS-MN1-IN-1-FR-3 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION AMBIENTAL.
- MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.
- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS.

La documentación anteriormente mencionada fue entregada por el contratista, pero se enviaron observaciones que deben ser subsanadas, por lo tanto, no se ha podido radicar el documento PAGA, ni entregar los formatos del componente ambiental ante el INVIAS por atraso por parte del contratista.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación final para cierre del componente ambiental, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

La documentación ambiental no ha sido entregada a tiempo como la versión final del documento PAGA, los formatos trimestrales e informe mensual, la interventoría a solicitado esta información que hasta la fecha no ha sido entregada.

3.3.1.4. Actividades Sociales

El día 30 de julio de 2023, el Contratista termina la ejecución del proyecto Ocaña-Límites-Morrison, siendo los sectores intervenidos, barrio El Lago, Juan XXIII y vereda La Samaritana.

Durante el periodo del proyecto, el Consorcio Ok, implemento de una forma eficiente los diferentes proyectos (Programas) del Plan de Gestión Social descrito en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), tal y como se puede evidenciar en los diferentes informes presentados por esta Interventoría y enviados por el Contratista, ya que se atendió de manera oportuna cada uno de los interrogantes y peticiones que se presentaron durante el desarrollo del mismo; así mismo, mantuvo informada apropiadamente a la comunidad, dándoles a conocer los distintos números de contacto, oficinas de atención al ciudadana, correo electrónico y cierres viales realizados, esto mediante folletos los cuales fueron repartidos dentro del área de influencia del proyecto casa a casa; de igual forma de cumplieron a cabalidad con los proyectos de Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Públicos, Cultura Vial y Participación Comunitaria y Contratación de Mano de Obra.

Igualmente, se elaboraron las respectivas Actas de Vecindad; Actas de Compromiso; Solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior; Certificados de Territorialidad del personal de Mano de Obra No Calificada contratada, los cuales pertenecen al área de influencia del proyecto; se conformó el Comité de Veeduría Ciudadana y se Socializó pertinentemente el inicio de los trabajos físicos, entregando un alcance final del proyecto y manifestando las diferentes fichas ambientales y sociales que se implementarían durante el proyecto.

Es de mencionar que, el Contratista remite a la Interventoría lo correspondiente a actas de reunión con el comité de veeduría ciudadana, acta de reunión realizada en la “Vuelta del primo”, además de enviar los informes mensuales y trimestrales para que sean revisados por la Interventoría, NO se ha presentado el respectivo PAGA con las respectivas subsanaciones; no pudiéndose dar aun cierre al componente social.

3.3.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista culmino sus actividades de obra.

En cuanto a la documentación SST el contratista se encuentra al día, sin pendientes.

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Teniendo en cuenta el estudio Geotécnico realizado en el sector de Juan XXII donde se han adelantado actividades de Parcheo y Bacheo, en el cual para realizar mejoramiento a la subrasante del sector se planteó la instalación de Material de Terraplén para mejorar el CBR de la zona a ejecutar, por lo anterior, nace la necesidad de crear un Ítem No Previsto para el contrato en el cual se incluye las actividades de instalación de Terraplén como se relaciona a continuación:

ítem	Cant.	Valor Unitario
TERRAPLEN	1087.47	$ 106.535,00

3.3.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-796-22 del 17-Jul-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-317-22 del 28-Feb-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla)

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - Hace entrega con el Comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 - cuneta samaritana - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 - **OBSERVACIONES**


Tabla 17 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758

3.3.2.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 30 de julio de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 90.68% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $1.603.662.424,24 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $1.711.146.620,00.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

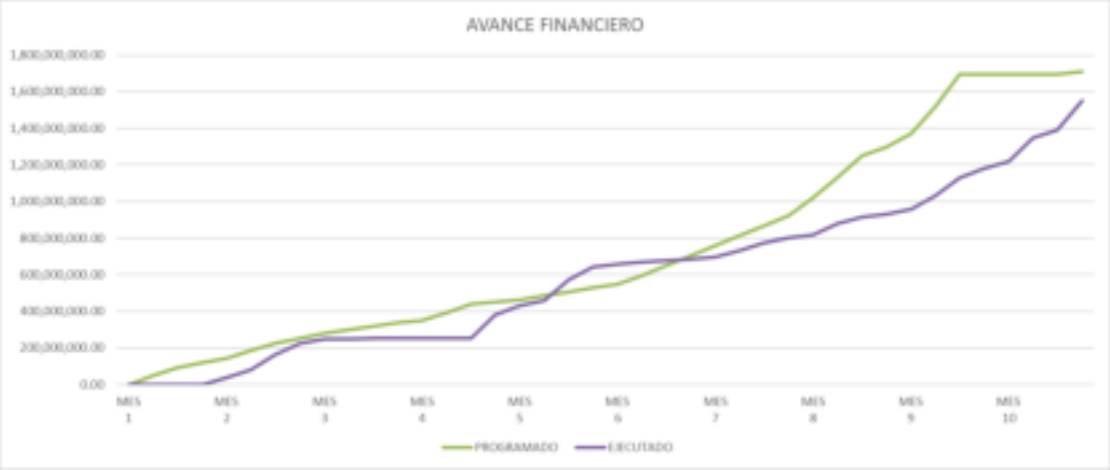

El contrato de obra a la fecha se encuentra en etapa de liquidación, el contratista ha cobrado el 90% del valor del contrato correspondiente a $1.540.030.406,73, una vez recibidas las obras ejecutadas a conformidad y sean entregados la totalidad de documentos para el cierre ambiental, social y técnico se liquidará el 10% faltante del valor del contrato y se realizara el reporte ante la entidad.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Final:	10 de noviembre de 2023

Tabla 18 Condiciones Iniciales Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se está a la espera del inicio de obras físicas del proyecto, el Contratista no ha iniciado pese a tener aprobación a los Estudios y Diseños.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de septiembre de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NST-1033-22 del 11-Sep-2023
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NST-1033-22 del 11-Sep-2023
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-309-22 del 23-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NST-411-22 del 28-Mar-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 19 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

Se da viabilidad para inicio de obra física desde el 09 de agosto de 2023, a lo cual el contratista no ha realizado las gestiones pertinentes para dar inicio a las obras.

Por otra parte, el contrato se prorrogo por un término de cuatro (4) meses, el plazo inicial establecido en la cláusula sexta del contrato principal, esta prórroga inicia a partir del 11 de julio de 2023, para un total de ocho (8) meses plazo contractual.

Por otra parte, se le solicito al contratista presentar un Plan de Contingencia que mitigue el atraso presentado a la fecha de corte del presente informe, además de entregar de manera inmediata la Programación de obra y el Flujo de caja del proyecto con el fin de hacer el control y seguimiento oportuno del proyecto.

Teniendo en cuenta el atraso presentado en el contrato de obra, la Interventoría elabora un informe del estado actual del contrato con el fin de que el municipio realice las gestiones

pertinentes y llame al orden al Contratista de obra con el fin de saber si va a ejecutar las obras contratadas o por el contrario va a desistir del contrato con el fin de liquidar el contrato de obra y sacar una nueva licitación.

3.4.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de entrega de los documentos ajustados de estudios y diseños. Se da viabilidad de inicio de obra física el 09 de agosto de 2023, pero el contratista no ha realizado las gestiones correspondientes.

3.4.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 15/09/2023: Se recibe oficio N° MATICCES-CACHI-063-2022, entrega de documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).
- 24/09//2023: Se realiza mesa de trabajo donde se le solicita nuevamente enviar documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) al contratista, ya que el documento enviado no contemplaba la parte ambiental.
- 28/09/2023: Se recibe oficio N° MATICCES-CACHI-064-2022, entrega de documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

Se pudo evidenciar que el contratista MATICCES P&B LTDA, no está realizando el debido cumplimiento en cuanto a la entrega documental del componente ambiental. La interventoría se encuentra a la espera de recibir informes mensuales y trimestrales que hasta la fecha no se ha recibido ninguno.

3.4.1.4. Actividades Sociales

El Contratista no han enviado las diferentes Actas de Vecindad, Actas de Compromiso y Certificados de Territorialidad, los cuales debieron de ser presentados antes de comenzar los respectivos trabajos físicos de obra; esta Interventoría sobre el tema, ha enviado distintos oficios, los cuales no han sido respondidos por parte del Contratista.

La Constructora Maticces P&B LTDA, no envío a esta Interventoría el correspondiente informe mensual del mes de septiembre de 2023.

3.4.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista no reporta inicio de actividades de obra física, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Durante el mes no se registran ingreso de personal.

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

4. **Dotación elementos de Protección Personal**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

5. **Maquinaria y Equipo**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

6. **Equipos de Emergencia**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

7. **Estadísticas SST**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

8. **Inducciones y Capacitaciones**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

9. **Implementación Protocolo de Bioseguridad**

Para el periodo del presente informe no se ha dado inicio a la obra física del proyecto.

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista ya tiene aprobados los estudios y diseños, para lo cual se espera se inicien las actividades físicas del Proyecto.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 12.372.333,93 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 12.487.307,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	Se solicita con el Comunicado GIC-INVIAS-NTS-070-22 del 28/11/2022
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

3.4.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, la Interventoría por medio de comités de obra ha solicitado al contratista el inicio de actividades físicas a lo cual el contratista no ha dado inicio a la ejecución.

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Prorroga 1:	15 de diciembre de 2023
Fecha Nueva de terminación:	16 de septiembre de 2023

Tabla 21 Condiciones Iniciales Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de septiembre de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-329-22 del 06-Mar-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 02-Feb-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-260-22 del 08-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-348-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 22 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de septiembre por parte del contratista están:

Se ejecutan actividades en el CORREDOR 1 SANTA LUCIA – CANOAS tramo del chorro 2 en placa huella, conformación manual de cunetas y sobre anchos, figurado de acero, encofrado de huellas y cunetas, excavación manual de viga riostra de 5mx20cmx.25cm e instalación de acero, en huellas 3mx0,90cmx0,15cm se instaló acero, se fundió concreto ciclópeo de 14 Mpa en contra huella central de 3mx0,90cmx0,15cm y laterales de 3mx0,45cmx0,15cm, fundida de huella en concreto 21Mpa de 3mx0,90cmx0,15cm, fundida de cunetas 3mx0,55cmx0,15cm y bordillo de 3mx0,30cmx0,15cm y Fundida de sobre anchos en concreto de 21Mpa,un total en paño completo de placa huella de 130ml.

Se inicio con la construcción de dos alcantarillas de 36” con disipadores tramo el chorro 2, excavación manual y con maquinaria (pajarita), fundida de solado, instalación de tubería de concreto reforzado y su respectivo atraque, relleno con material seleccionado, instalación de acero en pantalla, aletas, encofrado y fundida en concreto reforzado de 21 Mpa. Alcantarillas terminadas a la fecha.

Se ejecutan actividades de transporte de materiales (cemento)

Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.

Fotografía 28 actividades corredor 1 chorro2 del mes de septiembre



Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2023.

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					**EJECUTADO A 30-SEPTIEMBRE-2023**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**1,178,572,847**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	479.60	$ 24,159,370
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	521.77	$ 376,331,830
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	41,711.11	$ 339,027,902
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	1,725.00	$ 258,856,950
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	215.20	$ 86,275,617
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	6,330.20	$ 93,921,177
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**88,014,661**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	220.53	$ 11,108,978
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	33.71	$ 24,313,675
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	72.83	$ 2,596,608
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	27.00	$ 22,490,757
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	16.69	$ 8,926,229
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	2,285.73	$ 18,578,413
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**-**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	-	$ -
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 589,641,797.00	-	$ -
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	-	$ -
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 350,791,532.00	-	$ -
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 127,143,361.00	-	$ -
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	-	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**-**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	-	$ -
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 101,000,921.00	-	$ -
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	-	$ -
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diamet	m	$ 832,991.00	$ 90,709,094.00	-	$ -
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 9,343,118.00	-	$ -
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	-	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					**$**	**-**
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	-	$ -
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					**$**	**-**
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	-	$ -
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$**	**1,266,587,507**

Tabla 23 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

3.5.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 04/09/2023: Se recibe oficio N°OFC-CADV-GIC-131-2023 entrega de informe mensual correspondiente al mes de agosto.
- 05/09/2023: Se envia oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1010-22, con las observaciones encontradas en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).
- 18/09/2023: Se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por el contratista, mediante oficio N°OFC-CADV-GIC-138-2023.
- 18/09/2023: Se recibe oficio N° OFC-CADV-GIC-136-2023, tramites solicitud de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición)
- 19/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1090-22, con aprobación de los informes mensuales.
- 20/09/2023: Se realiza mesa de trabajo sobre las observaciones que deben ser subsanadas en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental)
- 28/09/2023: Se recibe borrador del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental)
- 29/09/2023: Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-1118-22, con aprobación al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).
- 30/08/2023: Se recibe informe mensual del mes de septiembre mediante oficio N° OFC-CADV-GIC-143-2023

A continuación, se presenta los diferentes programas contenidos en el PAGA con sus respectivos proyectos, los cuales fueron implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso

constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.

El equipo de profesionales contratados en la fase inicial de proyecto y el cual conforman parte del grupo de gestión socio ambiental, viene cumpliendo con las dedicaciones definidas por el proyecto. Para la gestión ambiental del periodo del presente informe se continua con el profesional en el área ambiental.

El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio AD Vías cuanta con la participación de los profesionales seleccionados al inicio del proyecto, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
YORDANO NIZ SANCHEZ	INSPECTORDE OBRA	316 5393629
NALLELYT GARAY GUERRERO	TRABAJADORA SOCIAL	310 2150679
DUAY FERNANDO LOPEZ FERIZOLA	PROFESIONAL AMBIENTAL	300 4347225
SOL MERY ANGARITA	PROFESIONAL SST	318 5364271
CLAUDIA LILIANA RANGEL	DIRECTORA DE OBRA	321 3257189

Actividades ejecutadas:

Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos. • Se realizo una reunión del grupo socio-ambiental con la finalidad de establecer el avance y temas relacionados a la implementación y cumplimiento del PAGA. (Ver Anexo 1) • La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría. • se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos. - Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente. - Suministro de agua. - Predio para la disposición de residuos sólidos y radicación para la certificación ante la secretaría de planeación y obras públicas. (Anexo 1).

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo del Chorro 2, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A

continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas**:**

En el mes de septiembre se desarrolló las capacitaciones al personal nuevo, con el fin de proporcionarles conocimientos en materia ambiental. (Anexo 3 y Anexo 4 Registro No.2)

Tramo el Chorro 2

Tema	Fecha	Duración	Expositor	Evidencia
Manejo de materiales de construcción	12/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 4** (Registro No.1)
Manejo integral de residuos líquidos, Material de excavación, residuos reciclables y basuras	18/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Deberes de los trabajadores y autocuidado	29/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Relación con la comunidad	21/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Metodología y procedimientos para el rescate y localización de especies faunísticas	07/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Medidas de manejo Ambiental	27/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Manejo seguro de equipos y maquinaria	25/08/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información

Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento.

A continuación, y a manera informativa se identifican los permisos y la aplicabilidad en el proyecto

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Concretos & Triturados Algodonal: Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR. Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería

Baterías sanitarías provisionales: Se verifico el acta de permiso con viviendas cerca de la zona de trabajo con la finalidad de utilizarlas como baños para uso del personal de trabajo de obra, se realiza acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sr. Luis Jesús Ozario Ropero. (Anexo 5)

Se realizo en obra el almacenamiento ene l centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el mes de septiembre, esto debido a la dificultad de entrega ante la Unidad de servicios públicos de Abrego y la cantidad generada, en el mes de octubre se entrega a la Unidad de servicios públicos de Abrego lo generado en los dos meses. Certificado de recolección por parte de USPA mes correspondiente a junio, julio y agosto Anexo 6

El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de un predio en el área de intervención en el tramo del Chorro #2.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado. (Anexo 4. Registro No. 3)

- No se realizó el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.

- Durante la manipulación del cemento y la preparación de la pasta de cemento, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto.

- La mezcla de concreto se realiza en la máquina mezcladora y, el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras. (Anexo 4. Registro No. 3)

- Se cuenta con un kit antiderrame en el frente de obra del Chorro 2. (Anexo 4. Registro No. 3)

Anexo 7 Planilla de control de materiales de construcción

Anexo 8 Autorización bodega

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 9)

-Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el mes de septiembre se generó la cantidad total de 53 m3 de material de excavación, de los cuales:

Tramo el Chorro 2

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	53	Frente de obra
Donado	0	Vereda el Chorro San Miguel
Disposición final	0	
TOTAL	53	

En el mes de septiembre se reutilizo todo el material de excavación, el cual fue requerido para el relleno de alcantarillas, cunetas y demás, esto se debe a que el estado de la vía lo requería, debido al proceso de erosión generado por la lluvia al borde la vía, fue necesario rellenar estos espacios. (Anexo 4. Registro No. 5)

El municipio de Abrego no cuenta con escombrera, por lo cual se realizó un acta de autorización con un predio en la vereda del chorro con el Sr. Miguel Torrado para la disposición de sobrantes de excavación. (Anexo 10)

Se radico (Rad 3075 del 28/09/2023) ante la secretaría de planeación y obras públicas de la alcaldía de Ábrego la solicitud de certificación del uso del suelo para la disposición de sobrantes de excavación. (Anexo 10)

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas:
En el mes de septiembre se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto. (Anexo 9 – Anexo 4. Registro No. 6).

Almacenamiento y entrega
- Se recibió el certificado de recolección por parte de la Unidad de Servicios Publicas de Ábrego correspondiente al mes de junio, julio y agosto del presente año. (Anexo 6)

- Durante el mes de septiembre se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas. (Anexo 4. Registro No. 6)

- Se realizará la entrega de los residuos sólidos de septiembre juntos con los residuos generados en el mes de octubre, esto a la cantidad generada, la dificulta de trasportarlos por el estado de la vía.

A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (Anexo 6), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como peligroso, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la USPA para la disposición final en rellenos sanitarios.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
El Chorro 2	No aprovechable	2	Negro
	Aprovechable	1	Blanco
	Orgánico aprovechable	0	Verde
	Peligrosos	8,9	Rojo

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Dentro del área de ejecución del proyecto en el mes de septiembre, no hubo presencia de aguas superficiales, las cuales requirieren manejo, cabe

resalta que en todo el proyecto no hay fuentes de aguas superficiales cerca, las cuales pueden verse afectadas.

El suministro de agua para la ejecución de las actividades se realiza por medio de un predio para el uso de la obra. (Anexo 12)

- Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.

- Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

- No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (Anexo 5)

Recomendaciones generales
1. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo. 2. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos. 3. Durante el periodo no se presentaron derrames
• Se realizó las inspecciones del baño fijo (Anexo 9)
• Los frentes de obra cuentas con el kit antiderrames, no se han presentado derrame de sustancias químicas en el mes de septiembre. (Anexo 4. Registro No. 3)

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Los trabajos de descapote se limitaron solamente en las áreas requeridas para las obras del proyecto y aprobadas previamente por la interventoría

- No se realizaron las labores de descapote y limpieza (remoción de la capa vegetal existente), debido a que los tramos de la ejecución de las obras ya fueron intervenidos, no existe gran presencia de vegetación arbustiva.

-No se arrojó basuras ni escombros en el perímetro del proyecto

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: Se realiza diariamente la inspección del área de intervención antes del inicio y durante las labores, con la finalidad de verificar la existencia de fauna. • En el mes de septiembre en el tramo del Chorro 2 no se encontró presencia de animales, esto se debe a que esta zona ya ha sido intervenida y tienen flujo vehicular, generado que existiera un ahuyentamiento de la fauna.

- Se prohibió la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se cuenta con una (1) bodega en total, la cual se le realizo la inspección de las instalaciones, orden, y aseo. (Anexo 9 – Anexo 4 Registro No. 7)

• Se alquilaron baños para el uso del personal de trabajo (Anexo 5), de igual manera se inspeccionaron para verificar el aseo, cuidado y mantenimiento (Anexo 9).

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: En el mes de septiembre se utilizó la mezcladora (Anexo 4 Registro No. 3).

• El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla. (Anexo 4 Registro No. 3).
• Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.
• El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del CONSORCIO AD VIAS, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) y entrega de informes.

Se puede evidenciar que el CONSORCIO AD VIAS, hasta la fecha ha realizado el debido cumplimiento a todas las solicitudes realizadas por la interventoría.

3.5.1.4. Actividades Sociales.

El consorcio AD VIAS, mediante el contrato de obra No. 252 de 2022 y de objeto "Mejoramiento de vías rurales en el Municipio de Ábrego, Departamento de Norte de Santander del Programa Colombia Rural – Nacional", presento una serie de programas de gestión social a implementar en la ejecución del proyecto, para lo cual su implementación debe ser permanente y transversal a todas las etapas del proyecto, desde las actividades previas, hasta el cierre y desmantelamiento de obras, y la etapa de construcción, por ello, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2023, llevaron a cabo la implementación de los cinco (5) programas de gestión social descritos a continuación:

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

El programa tiene como objetivo el brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos que sean elevadas por la comunidad perteneciente al área de influencia directa e indirecta del proyecto, para de esta forma generar confianza y lazos de amistad, evitando rechazo e inconformismo por desconocimiento de los beneficios que traerá el proyecto.

Por ello, el Consorcio AD VÍAS estableció un punto de atención al usuario en el municipio de Ocaña; Norte de Santander, en la calle 11#15-94 Edf. Ferrer; de igual forma, hay un lugar de atención en el campamento (Punto de obra), donde el Ingeniero Residente atenderá y responderá si así se requiere, las distintas solicitudes o PQRS realizadas por la comunidad en general; otro punto de atención se encuentra en la Alcaldía Municipal de Abrego, Norte de Santander, oficina de Planeación; por último, se encuentra establecido un punto de atención a la comunidad en el punto de obra "La Yee".

Igualmente, en las carteleras informativas dispuestas en los puntos de atención anteriormente mencionados, se encuentra información del contrato de obra, correo electrónico y número telefónico para conocimiento de la comunidad en general que lo requiera, así mismo, se encuentra un buzón de sugerencia donde podrán dejar sus diferentes PQRS.


Puntos de atención a la comunidad.

OFICINA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Oficina Fija 1	Abrego	Alcaldía Municipal, oficina de Planeación
Oficina Fija 2 (Punto de Atención en Obra)	Abrego	Campamento

Oficina Fija 3	Ocaña	Calle 11#15-94 Edificio Ferrer
Oficina 4 (Punto de obra La Yee)	Abrego	Punto de obra

Fuente: Consorcio AD VÍAS.

Ilustración 2 Cartelera informativa y buzón satélite.

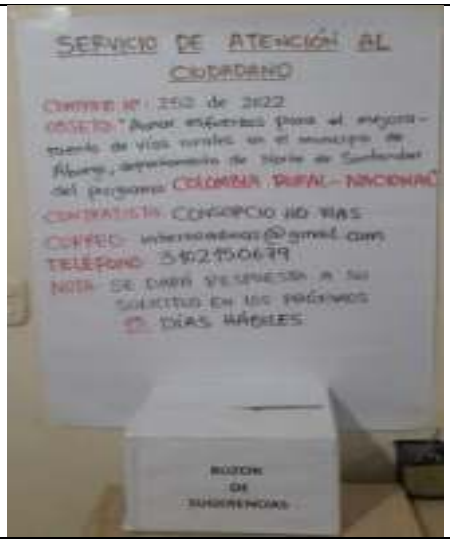

Cartelera y buzón satélite en la Calle 11#15-94 Edificio Ferrer.



Cartelera y buzón satélite en el punto de obra, frente Santa Lucía



Cartelera y buzón satélite en el punto de obra, frente La Yee.

Fuente: Consorcio AD VÍAS.

Es de resaltar que, en el mes de septiembre de 2023, no fue recibida ninguna PQRS por los distintos medios implementados y divulgados por el Consorcio AD VÍAS, como son el buzón satélite, correo electrónico, línea telefónica, o de manera física en las oficinas dispuestas por el Contratista.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

El proyecto de Información y divulgación es un mecanismo de interrelación con los diferentes actores sociales del área de influencia del proyecto, a partir del cual, se diseñan e implementan diversas estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, que apuntan al posicionamiento del proyecto y a un ambiente favorable de información y aceptación en la comunidad que coadyuva al menor impacto social posible y desarrollo normal de la obra.

Por parte del Consorcio no se llevaron a cabo reuniones con la comunidad, sin embargo, se llevó a cabo actividades de información y divulgación del proyecto, dando a conocer a la Comunidad del sector aledaño al proyecto los avances y hallazgos del proyecto, de igual forma se informa acerca de los inicios de los trabajos en los demás tramos, por lo que se recomienda tener en cuenta las rutas alternas habilitadas para el paso.

Ilustración 3 Información y Divulgación de inicio de tramos







CONSORCIO AD VÍAS | **ACTA DE REGISTRO**

Contrato No:
Objeto:
Contrato No:
Tramo:

DESCRIPCION: ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD

No. DE ATENCIÓN	NOMBRE	VEREDA/SECTOR/ URBANIZACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA
1	Noel Tarazo Tarazo	V. El Tigre	Finca Sueño Dorado	3107293480	
2	Cesar Tarazo Tarazo	V. La Esperanza	Finca Paz	3104568844	
3	Delia Barajas Barajas	V. La Esperanza	Finca Mar	3104568844	
4	Socorro Gonzalez	V. El Tigre	Finca Paulonia	3105059674	
5	Victor Mora	V. El Tigre	Finca Paulonia	3105059674	
6	Wilson Tarazo Mejia	V. El Tigre	Finca los Naranjos	3104589056	
7	Amanda Arias Paez	V. La Soledad	Finca la soledad	3125789944	
8	Karla Paez Gonzalez	V. La soledad	Finca la soledad	3104589056	
9	Ramon El Roble Ortiz	V. El Quebrachal	Finca Gonzalez	3104568993	
10	Ana Isabel Barajas Paez	V. La Soledad	Finca la soledad	3125789944	
11	Fernando Guevara G.	V. El Tigre	Finca el alto Paez	3108946961	
12	Miguel Angel Tarazo	Barrio Bolivar	Avenida Central	3104560591	
13	Nelson Alonso Leon	V. San Antonio	Avenida Central	3104560744	
14	Luis Maria Fernandez	V. El Chorro	Finca quebradita	3104594045	
15	Rodrigo Jose Tarazo G.	V. El Tigre	Casa 25 # 13-60	3104594045	
16	Carmen Paez Paez	V. Nuevo Viaje	Finca la Isabel	3133095201	
17	Eduardo Ortiz Chacon	V. El Chorro	Finca el pozo de Ortiz	3133159415	
18	Alvaro Andres Maldonado	V. El Chorro	Finca el Chorro	3103030967	
19	Orangel Ortiz Ortiz	V. El Chorro	Finca los Limones	3102602275	
20	Jaime Ortiz Perez	V. El Chorro	Finca los Limones	3103594470	

Fuente: Consorcio AD VÍAS.

PROGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

En el programa de la infraestructura de predios y de servicios públicos, el Contratista contempla las medidas para establecer una línea base de las infraestructuras sociales y de uso productivo en predios aledaños a las obras de construcción del proyecto, así como de los equipamientos sociales y las redes de servicios públicos (energía, acueducto,

telecomunicaciones) que por su cercanía a las obras puedan verse alterados o afectados de manera temporal o permanente.

Durante el mes de septiembre de 2023, El Contratista ha realizado en conformidad del presente programa las siguientes actividades:

1. Realización de actas de vecindad: Se realizaron las respectivas actas de vecindad del Corredor en ejecución antes de iniciar las obras físicas del proyecto, las cuales se realizaron entrega a la empresa Interventora GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, en su debido momento.

2. Levantamiento de Actas de compromiso: En este periodo no se levantaron actas de compromiso, ya que se habían elaborado en el periodo anterior.

PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

La ejecución del programa de Cultura Vial y Participación Comunitaria se ha desarrollado de manera acorde a lo establecido en la ficha del Plan de Gestión Social, puesto que, el Contratista a diseñado un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el tráfico, durante la etapa de construcción del proyecto.

Es por ello que, durante el mes de septiembre de 2023, el Consorcio Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.

Ilustración 4 Elementos de prevención y charla a motociclista.



Fuente: Consorcio AD VÍAS.

Es de resaltar que, en lo concerniente a la conformación del comité de veeduría ciudadana, el Contratista y la Alcaldía Municipal de Abrego, por medio de su Secretaría de Planeación, han dado a conocer la constante negativa de la comunidad beneficiaria del proyecto del corredor uno (1) Santa Lucía - Canoas, en crear la Veeduría Ciudadana.

Esta situación fue dada a conocer por parte del Consorcio a esta Interventoría mediante oficio No OFC-CADVGIC-092-2023 de fecha 15 de junio de 2023; así mismo, mediante comunicación de la Alcaldía del municipio del día 13 de junio de 2023, con asunto “Soportes invitación conformación Veeduría Ciudadana”.

Ilustración 5 Soportes de la NO conformación de la veeduría ciudadana.



Documento enviado por la Alcaldía Municipal de Abrego.




Comunicación enviada por el Contratista.


Fuente: Consorcio AD VÍAS y Alcaldía Municipal de Abrego.

Por último, el Consorcio llevo a cabo a través de su profesional social, cinco (5) charlas y/o capacitaciones con los empleados vinculados que adelantan trabajos constructivos en los frentes de obra, esto con el fin de generar un ambiente cordial, amable, comunicativo y en equipo, evitando de esta forma, el caer en malos tratos entre compañeros, irrespeto o discordias que pudiesen generarse.

Ilustración 6 Charlas y/o capacitaciones a empleados.

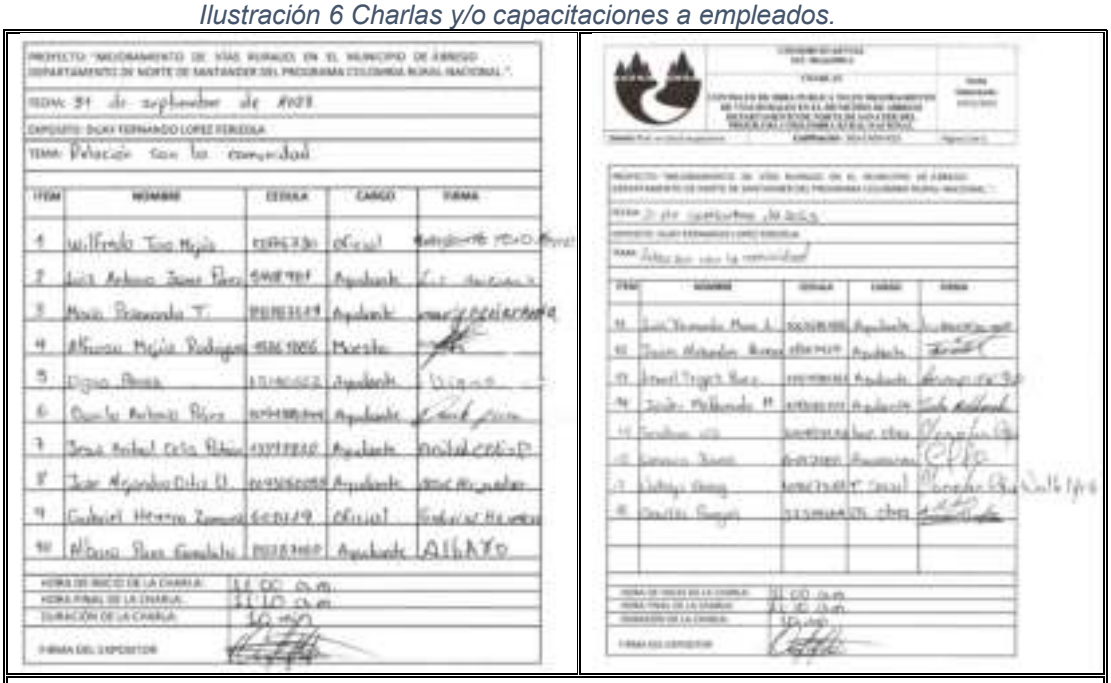

Charla y/o capacitación “Relación con la Comunidad”.

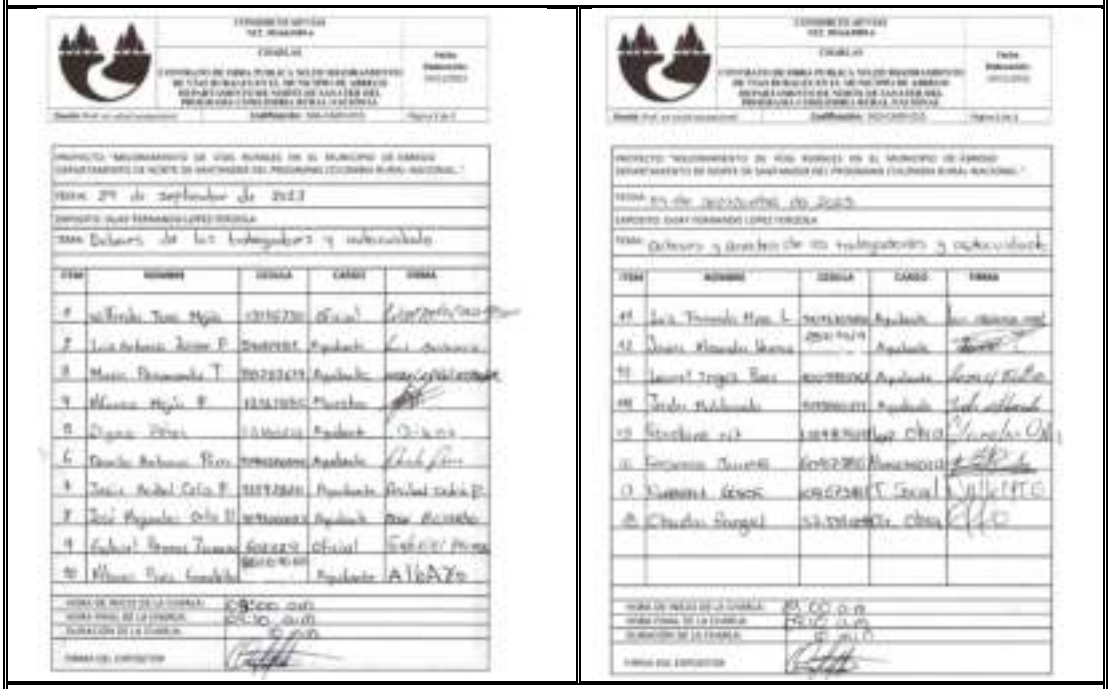

Charla y/o capacitación “Actitud con los compañeros”

Fuente: Consorcio AD VÍAS.

PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

El objetivo de este programa es el de no generar migración de población residente en otros municipios al Área de Influencia Directa (AID) para vincularse laboralmente al proyecto, puesto que el incremento de población foránea puede generar impactos de naturaleza negativa, puesto que tendrán como resultado el desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes de los sectores donde se ejecuta la obra. La línea de base del componente socioeconómico y cultural realizado por el Contratista, indica la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales que hay en el área y conocen la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, estableciendo de esta forma el porcentaje de mano de obra a contratar para el desarrollo del proyecto.

A continuación, se relaciona el personal contratado la cual incluye Mano de obra Calificada y No calificada.
PERSONAL CONTRATADO DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA CON EL CONSORCIO AD VIAS:

Hasta la fecha del presente informe mensual 01 al 30 de septiembre del 2023 se tiene contratado el siguiente personal.

Personal contratación Directa: 24%
Personal contratación Indirecta: 76%
Personal Área de Influencia Directa: 80%
Personal Área de Influencia Indirecta: 20%
Mano de Obra Calificada: 36%
Mano de Obra No Calificada: 64%

3.5.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1	JESUS ANIBAL CELIS PABON	OBRERO	13.392.820	ACTIVO
2	JAVIER ALEXANDER HERRERA ZAMORA	OBRERO	6.511.671	ACTIVO
3	DIGNO AREVALO PEREZ	OBRERO	13.140.622	ACTIVO
4	DANILO ANTONIO PEREZ ORTIZ	OBRERO	1.094.580.344	ACTIVO

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 29 Entregas de EPP - Abrego

5. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de septiembre no realizo trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 30 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

7. Estadísticas SST

Durante este periodo se presentó un incidente en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	1	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizo 4 inducciones y 8 capacitaciones a los trabajadores.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VIAS	4	8

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	Septiembre	0

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear el siguiente ítem No Previsto que corresponden a los costos asociados al ajuste de la distancia de la cantera que suministra los materiales pétreos del contrato a los tramos de ejecución de acuerdo a la variación de la contractual que no presentaba licencia ambiental, esta nueva cantera se encuentra avalada y aprobada por el Municipio y posteriormente por la Interventoría.

	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTE A DISTANCIA ADICIONAL A LA CONTRACTUAL	m3	$ 409.487.845,00

3.5.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 17.849.397,06 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 18.029.694,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 – PERSISTEN OBSERVACIONES **CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2**

Tabla 24 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

3.5.3.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 30 de septiembre de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 28.19% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 1.266.651.637,30 vs un programado del 46.27% que equivale en pesos a $ 2.079.396.078,54.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Abrego

A la fecha se ha ejecutado el corredor 1 del proyecto dentro del cual se ha ejecuta 771 ml de placa huella y 4 alcantarillas, en cuanto al corredor 2, no se ha podido dar inicio a los trabajos teniendo en cuenta la emergencia del Rio tarra que ha impedido el ingreso de materiales al punto de acopio.

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 18.09%, lo anterior se debe a que, de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado 1087 ml de Placa Huella correspondiente al 45.30% del valor de esa actividad y, 8 Alcantarillas correspondientes a un 43.4% la construcción de esa actividad.

Por otra parte, se le ha solicitado la entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso presentado a la fecha, lo anterior teniendo en cuenta que se ha construido 771 ml de placa huella completa quedando un total de 1630 ml por terminar y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 27 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

3.6. CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,61 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Prorroga 1:	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Final:	21 de diciembre de 2023

Tabla 25 Condiciones Iniciales Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de agosto de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-364-22 del 14-Mar-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-452-22 del 17-Abr-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-452-22 del 17-Abr-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-984-22 del 04-Sept-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 GIC-INVIAS-NTS-467-22 del 25-Abr-23

Tabla 26 Estado Documentos pre construcción Municipio de la Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado el balance del contrato en el cual se determinará el alcance físico del proyecto para continuar con las actividades de obra teniendo en cuenta que ya se tienen aprobados los estudios y diseños el cual se encuentra en ajuste por parte del Contratista.

Se ejecutan actividades de compactación con maquinaria de subbase en el corredor vial Corredor 2 Clavellinos Tramo 1 y 2, Municipio de La Playa de Belén, actividades de transporte de materiales procedentes de perfilado y adecuación de taludes, adecuación de anchos curvas con el fin de garantizar el acceso, transporte de materiales (cemento, acero) al corredor vial intervenido.

Durante el periodo se inician actividades de conformación de la estructura de vía a intervenir Corredor 1 y Corredor 2, Municipio de La Playa de Belén. Se da inicio a actividades a la instalación de acero, encofrado, fundida de placa huella, viga riostra, contra huella y cunetas, según diseños aprobados.

Se da inicio a actividad de alcantarilla de 36” en el Corredor 2 Clavellinos Tramo 2, en excavación manual y con maquinaria (pajarita), fundida de solado, instalación de tubería de concreto reforzado y su respectivo atraque, relleno con material seleccionado, instalación de acero en pantalla, aletas, encofrado y fundida en concreto reforzado de 21 Mpa. Una alcantarilla terminada a la fecha.

Se ejecutan actividades en el CORREDOR 2 Esperancita – Clavellinos, tramo de Clavellinos tramo 2 en placa huella, conformación manual de cunetas y sobre anchos, figurado de acero, encofrado de huellas y cunetas, excavación manual de viga riostra de 5mx20cmx.25cm e instalación de acero, en huellas 3mx0,90cmx0,15cm se instaló acero, se fundió concreto ciclópeo de 14 Mpa en contra huella central de 3mx0,90cmx0,15cm y laterales de 3mx0,45cmx0,15cm, fundida de huella en concreto 21Mpa de 3mx0,90cmx0,15cm, fundida de cunetas 3mx0,55cmx0,15cm y bordillo de 3mx0,30cmx0,15cm y Fundida de sobre anchos en concreto de 21Mpa,un total en paño completo de placa huella de 50ml.

Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2023.

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

CONVENIO No.	1863 de 2021	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						**CANT**	**VALOR TOTAL**
No	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UNID**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
CORREDOR 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE						**EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE-2023**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS						**$**	**268,503,043**
1	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 67,021,995.00	1,503.45	$ 66,753,313.20
2	**630.4**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 371,137,041.00		$ -
3	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 282,882,833.00		$ -
4	**320.3**	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 203,173,262.00	1,003.73	$ 201,749,730.00
5	**630.7**	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 30,734,235.00		$ -
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 71,979,600.00		$ -
				SUB TOTAL	**$ 1,026,928,966.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND						**$**	**-**
7	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 4,425,628.00		$ -
8	**630.4**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 14,326,495.00		$ -
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 842,472.00		$ -
10	**661.2**	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 11,900,000.00		$ -
11	**630.4**	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,243,440.00		$ -
12	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 9,119,702.00		$ -
				SUB TOTAL	**$ 41,857,737.00**		$ -
CORREDOR 2: ESPERANCITA - CLAVELLINOS							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 545 MTS						**$**	**301,013,957**
1	**600.1.1-2**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 58,382,826.00	1,340.99	$ 59,539,956.00
2	**630.4 - 2**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 330,726,047.00	39.33	$ 30,480,750.00
3	**640.1-2**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 318,202,756.00	2,913.57	23366831.4
4	**320.3-2**	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 181,581,636.00	922.62	$ 185,446,620.00
5	**630.7-2**	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 32,108,076.00	5.19	$ 2,179,800.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 62,797,680.00		$ -
				SUB TOTAL	**$ 983,799,021.00**		

CONVENIO No.	1863 de 2021	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						**CANT**	**VALOR TOTAL**
No	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UNID**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
CORREDOR 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE						**EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE-2023**	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND						**$**	**28,204,443**
7	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 6,638,442.00	64.93	$ 2,882,892.00
8	**630.4 - 3**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 21,489,743.00	9.26	$ 7,176,500.00
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 1,417,725.00	14.74	$ 442,200.00
10	**661.2-2**	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 17,850,000.00	14.00	$ 11,900,000.00
11	**630.4**	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,865,160.00	2.26	$ 1,243,000.00
12	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 13,679,554.00	568.56	$ 4,559,851.20
				SUB TOTAL	**$ 62,940,624.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**$**	**-**
13	720.8	Postes de referencia corredor1	und	350,000.00	$ 2,450,000.00		$ -
14	720.8	Postes de referencia corredor 2	und	350,000.00	$ 2,100,000.00		$ -
ITEMS NO PREVISTO:						**$**	**-**
		Transporte a distancia adicional a la contractual	gl	56,782,110.00	$ 56,782,110.00		$ -
				SUB TOTAL	**56,782,110.00**	**$**	**597,721,444**

Tabla 27 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 04/09/2023: Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-984-22, observaciones al documento PAGA (Plan Guía a las Adaptación Ambiental).
- 15/09/2023: Se recibe documento PAGA (Plan Guía a las Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por el contratista.
- 28/09/2023: Se recibe informes mensuales correspondiente a los meses: marzo, abril, mayo, junio, julio, mediante oficio N° OFC-CLP-ALP-067-2023
- 30/09/2023: Se recibe informe mensual del mes de septiembre mediante oficio N° OFC-CLP-ALP-067-2023

A continuación, se presenta los diferentes programas contenidos en el PAGA con sus respectivos proyectos, los cuales fueron implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

• El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.

• El equipo de profesionales contratados en la fase inicial de proyecto y el cual conforman parte del grupo de gestión socio ambiental, viene cumpliendo con las dedicaciones definidas por el proyecto. Para la gestión ambiental del periodo del presente informe se continua con el profesional en el área ambiental.

Actividades ejecutadas: • Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos. • La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría. • Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio la Playa 2022 (Anexo 1), cuenta con la participación de los profesionales seleccionados al inicio del proyecto, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
NALLELYT GARAY GUERRERO	TRABAJADORA SOCIAL	310 2150679
DUAY FERNANDO LOPEZ FERIZOLA	PROFESIONAL AMBIENTAL	300 4347225
SERGIO ANDRES ARIAS	DIRECTOR DE OBRA	-

Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos. - Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente. - Suministro de agua. - Predio para la disposición de residuos sólidos.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo 1 Clavellinos, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas.

Tema	Fecha	Duración	Expositor	Evidencia
Manejo de materiales de construcción	12/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 4** (Registro No.1)
Manejo integral de residuos líquidos, Material de excavación, residuos reciclables y basuras	18/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Deberes de los trabajadores y autocuidado	29/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Relación con la comunidad	21/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Metodología y procedimientos para el rescate y localización de especies faunísticas	07/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Medidas de manejo Ambiental	27/09/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	
Manejo seguro de equipos y maquinaria	25/08/2023	10 min	Duay Fernando Lopez	

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información

Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento.

A continuación, y a manera informativa se identifican los permisos y la aplicabilidad en el proyecto

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Concretos & Triturados Algodonal: Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR. Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería

Baterías sanitarías provisionales: Se verifico el acta de permiso con viviendas cerca de la zona de trabajo con la finalidad de utilizarlas como baños para uso del personal de trabajo de obra, se realiza acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Ana Pérez de Martínez. (Anexo 5)

Se realizo en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el mes de septiembre, esto debido a la dificultad de entrega ante la Unidad de servicios públicos de la Playa de Belén y la cantidad generada, en el mes de octubre se entrega a la Unidad de servicios públicos lo generado en los dos meses.

El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de un predio en el área de intervención en el tramo 1 Clavellinos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado. (Anexo 4. Registro No. 3)

- No se realizó el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.

- Durante la manipulación del cemento y la preparación de la pasta de cemento, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto.

- La mezcla de concreto se realiza en la máquina mezcladora y, el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras. (Anexo 4. Registro No. 3)

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 9)

-Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Tramo 1 Clavellinos.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el mes de septiembre se generó la cantidad total de 129,86 m3 de material de excavación, de los cuales:

Tramo 1 Clavellinos

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	129,86	Frente de obra
Donado	0	Por definir
Disposición final	0	
TOTAL	129,86	

En el mes de septiembre se reutilizo todo el material de excavación, el cual fue requerido para el relleno de alcantarillas, cunetas y demás, esto se debe a que el estado de la vía lo requería, debido al proceso de erosión generado por la lluvia al borde la vía, fue necesario rellenar estos espacios. (Anexo 4. Registro No. 5)

El municipio de la Playa no cuenta con escombrera, lo que se está buscando un predio con las condiciones adecuadas para la disposición de sobrantes de excavación

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas:
En el mes de septiembre se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto. (Anexo 9 – Anexo 4. Registro No. 6).

Almacenamiento y entrega
Durante el mes de septiembre se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas. (Anexo 4. Registro No. 6)

- Se realizará la entrega de los residuos sólidos de septiembre juntos con los residuos generados en el mes de octubre, esto a la cantidad generada, la dificulta de trasportarlos por el estado de la vía.

• A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (Anexo 6), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como peligroso, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la Unidad de Servicios Públicos de la Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
1 Clavellinos	No aprovechable	1.4	Negro
	Aprovechable	0.8	Blanco
	Orgánico aprovechable	0	Verde
	Peligrosos	7.8	Rojo

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Dentro del área de ejecución del proyecto en el mes de septiembre, no hubo presencia de aguas superficiales, las cuales requirieren manejo, cabe resalta que en todo el proyecto no hay fuentes de aguas superficiales cerca, las cuales pueden verse afectadas.

- El suministro de agua para la ejecución de las actividades se realiza por medio de un predio para el uso de la obra. (Anexo 11)

- Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.

- Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

- No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (Anexo 5 – Anexo 4 Registro No. 8)

Recomendaciones generales
1. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo. 2. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos. 3. Durante el periodo no se presentaron derrames.
• Se realizó las inspecciones del baño fijo (Anexo 9)
• Los frentes de obra cuentas con el kit antiderrames, no se han presentado derrame de sustancias químicas en el mes de septiembre.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Los trabajos de descapote se limitaron solamente en las áreas requeridas para las obras del proyecto y aprobadas previamente por la interventoría

- No se realizaron las labores de descapote y limpieza (remoción de la capa vegetal existente), debido a que los tramos de la ejecución de las obras ya fueron intervenidos, no existe gran presencia de vegetación arbustiva.

• No se arrojó basuras ni escombros en el perímetro del proyecto.

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: Se realiza diariamente la inspección del área de intervención antes del inicio y durante las labores, con la finalidad de verificar la existencia de fauna. • En el mes de septiembre en el tramo 1 Clavellinos no se encontró presencia de animales, esto se debe a que esta zona ya ha sido intervenida y tienen flujo vehicular, generado que existiera un ahuyentamiento de la fauna.

- Se prohibió la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: • Se cuenta con una (1) bodega en total, la cual se le realizo la inspección de las instalaciones, orden, y aseo. (Anexo 9 – Anexo 4 Registro No. 7)

• Se alquilaron baños para el uso del personal de trabajo (Anexo 5), de igual manera se inspeccionaron para verificar el aseo, cuidado y mantenimiento (Anexo 9).

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: •En el mes de septiembre se utilizó la mezcladora (Anexo 4 Registro No. 3).
• El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla. • Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.
• El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del CONSORCIO LA PLAYA 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) y entrega de informes.

Se puede evidenciar que el CONSORCIO LA PLAYA 2022, hasta la fecha ha realizado el debido cumplimiento a todas las solicitudes realizadas por la interventoría.


3.6.1.4. Actividades Sociales.


Durante el mes de septiembre de 2023, el Consorcio La Playa 2022, llevo a cabo el levantamiento de las respectivas Actas de Vecindad, correspondientes a unidades sociales que están dentro del corredor número dos (2) a intervenir; pudiéndose evidenciar la presencia de dos (2) viviendas al lado y lado de la vía.

El Consorcio desarrolla el respectivo recorrido con su residente de obra y profesional social, donde describen las condiciones físicas de las viviendas encontradas; así mismo, capturan el correspondiente registro fotográfico de las áreas que requiere el formato.

Es de destacar que, el Contratista realiza dicho levantamiento de las actas de manera oportuna, puesto que, las elabora antes de dar comienzo a las obras físicas del proyecto; igualmente, avisa con anterioridad a los propietarios de las viviendas por medio del presidente de Junta de Acción Comunal que, se ejecutaran las visitas, para de esta forma diligenciar los formatos el día previsto.

Ilustración 7 Actas de Vecindad, corredor número dos (2).

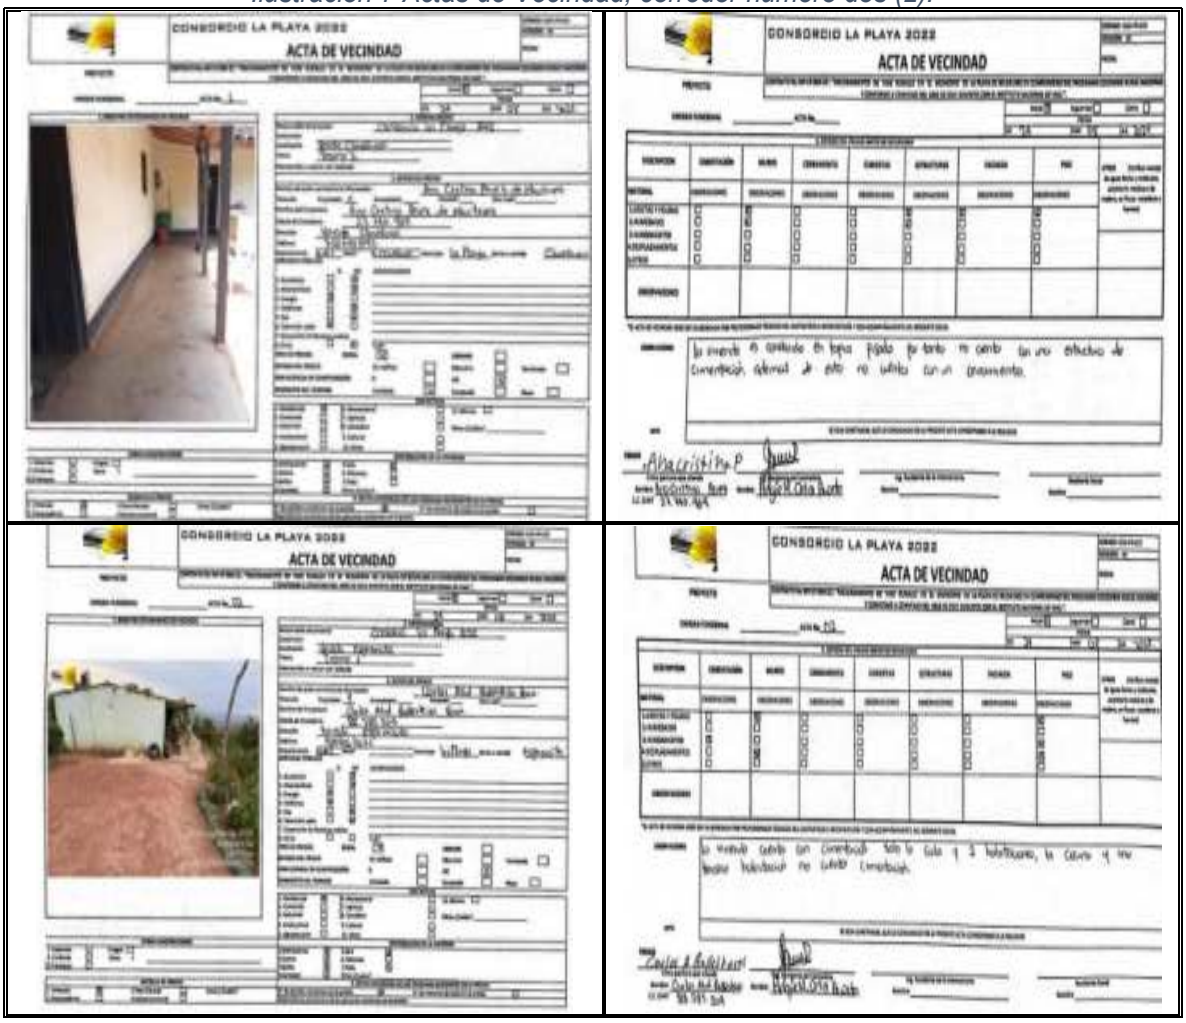

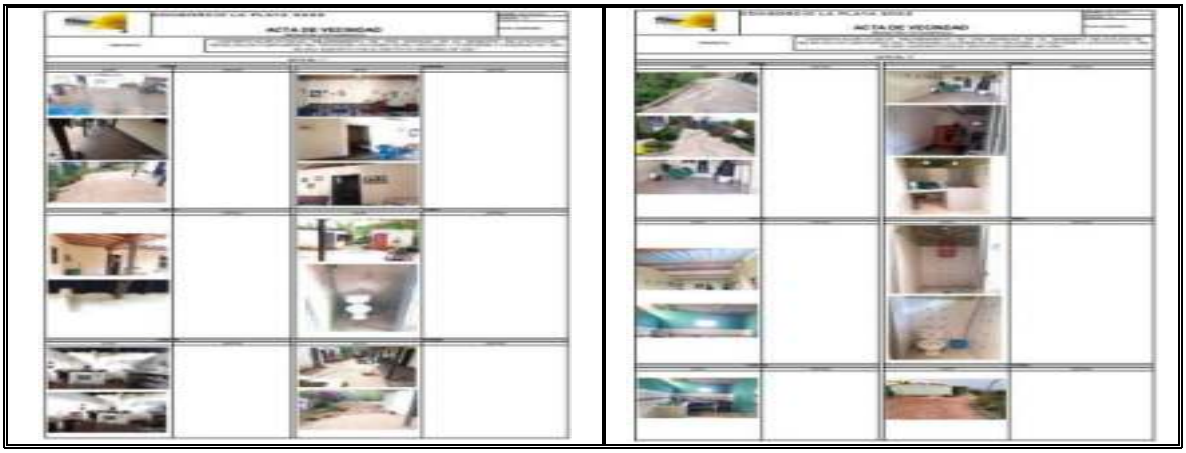

Fuente: Consorcio La Playa 2022.

3.6.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1	URIEL MARINEZ CORONEL	OBRERO	88.183.921	12/09/2023
2	JOSE DE DIOS TORO MARTINEZ	OBRERO	1.091.596.228	12/09/2023
3	JESUS EMIRO TORO MARTINEZ	OBRERO	1.091.596.228	12/09/2023
4	JHON ALEXANDER CAÑIZARES	MAESTRO	1.091.670.140	12/09/2023
5	JHAN CARLOS BALLESTEROS	OBRERO	1.005.075.100	12/09/2023
6	YAMID DEL CARMEN BALLESTEROS	OBRERO	88.183.977	12/09/2023
7	JAIRO SALAZAR BALLESTROS	OBRERO	88.183.472	11/09/2023
8	JOSE LUIS VEGA ROPERO	OBRERO	1.005.328.679	14/09/2023

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 31 Entregas de EPP – La Playa

5. Maquinaria y Equipo

La Interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.



Fotografía 32 Maquinaria La Playa

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.

- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 33 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa

7. Estadísticas SST

Durante este periodo se ha presentado 1 incidente en la ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO LA PLAYA	1	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizo 7 inducciones y 4 capacitaciones a los trabajadores.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO LA PLAYA	7	4

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO LA PLAYA	Septiembre	0

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista realizo las respectivas subsanaciones de los componentes los cuales fueron aprobados por esta Interventoría en el mes de junio, salvo el componente de Diseño Geométrico el cual se aprobó con observaciones a considerar y que deben subsanar y/o justificar todas y cada una de las observaciones realizadas punto a punto a fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación definitiva por parte de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 99.16% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 12.175.852,42 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 12.279.038,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 **- APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 28 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, se da inicio a la etapa de construcción, toda vez que el Contratista ya cuenta con la aprobación de los Estudios y Diseños del proyecto, y se esta en revisión del balance del contrato.

Con corte al 30 de septiembre de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 27.13% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 597.719.978,60 vs un programado del 33.35% que equivale en pesos a $ 734.631.904,56.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

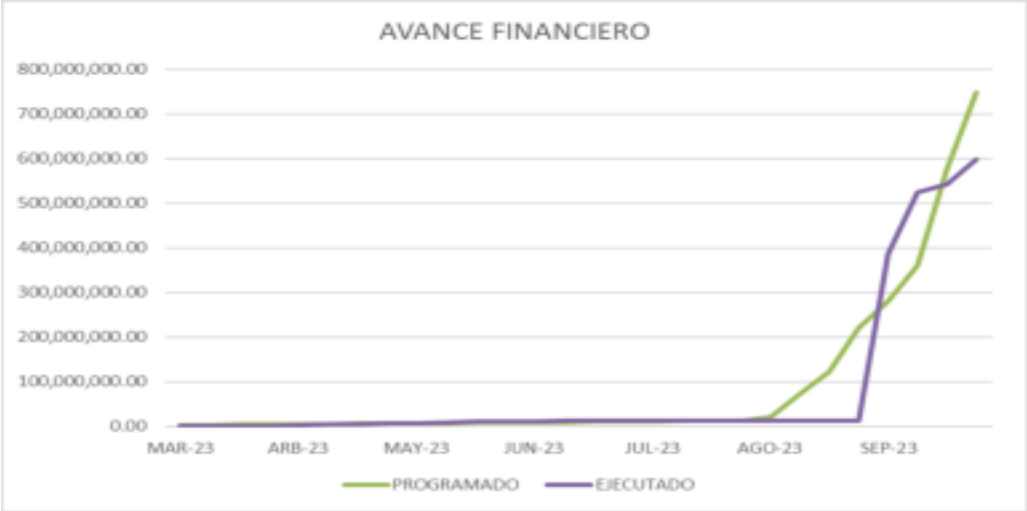


Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de La Playa

A la fecha se ha ejecutado el corredor 1 y 2 del proyecto dentro del cual se ha ejecutado actividades de perfilado e instalación de Subbase granular de placa huella.

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 6.21%, lo anterior se debe a que, de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado 390 ml de Placa Huella correspondiente al 33.20% del valor de esa actividad y, 2 Alcantarillas correspondientes a un 39.40% la construcción de esa actividad. Lo anterior teniendo en cuenta que se ha construido 50 ml de placa huella completa quedando un total de 1125 ml por terminar y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 17 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	13 de octubre de 2023

Tabla 29 Condiciones Iniciales Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Hojas de Vida	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL PERSONAL AL MUNICIPIO GIC-INVIAS-NTS-570-22 del 24-May-23
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-May-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-May-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-757-22 del 05-Jul-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 30 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

Se continua con los comités virtualmente cada jueves para hacerle seguimiento al contrato de obra No. 202 de 2022, se crean compromisos de entrega de los documentos de la etapa de pre construcción faltantes de aprobación.

3.7.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista da inicio a la ejecución física del proyecto, durante este periodo se han realizado las siguientes actividades:

En las técnicas tenemos la descripción de los ítems ejecutados a fecha del presente informe.

-Instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal para posteriormente encofrar y luego el vaciado en las huellas en concreto de 3000 psi.

-Instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal en cunetas y bordillos para posterior a ello encofrar y fundir en concreto de 3000 psi.

-Vaciado de concreto de 2000 psi en los sobreanchos de piedra pegada franja central y laterales.

-Excavación mecánica para la instalación de los tubos en concreto reforzado para las alcantarillas.

-Excavación para la instalación de las canastas de las vigas riostras

-Fundida de las vigas riostras en concreto de 3000 psi.

El día 07 de septiembre de 2023 se realiza recorrido de obra en donde se evidencia que el contratista no está cumpliendo con el diseño aprobado por la interventoría, se observo en campo la instalación en las huellas de 3 varillas longitudinales de ½" y 3 varillas de 3/8" y lo que realmente deberían haber instalado seria 6 varillas longitudinales de ½" por lo que esta interventoría solicita al contratista un informe con una validación estructural que garantice la cuantía que le están instalando a las huellas en concreto de 3000 psi.

Adicional a esto se evidencio la instalación de varilla de 3/8" en la parte superior e inferior de las vigas riostras, cuando el diseño aprobado indica que son varillas de ½" en la parte superior e inferior de la viga, así mismo nos evidencian los bastones de ½" en los cuales entran en el bordillo.

Para continuar con la inspección realizada en campo se evidencio que el acero principal del bordillo lo están instalando de 3/8", lo que indica que no está cumpliendo con el diseño aprobado, están instalando acero de 3/8", la sección del bordillo aprobada en planos es de 0,30x 0,15 y en terreno se evidencio que la están fundiendo de 0,25 x 0.15.

Se pudo evidenciar que el recubrimiento del acero y disposición no está cumpliendo con el plano aprobado, debido a que el acero está ubicado en la parte inferior de la placa huella y el plano obliga a que este en medio de la placa huella.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2023.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-SEPTIEMBRE-2023	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	6.31	208,230.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	112.13	75,127,100.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	1694.06	14,060,698.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1168.00	140,160,000.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	23.90	8,604,000.00
					SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	238,160,028.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00		
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00		
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00		
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00		
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00		
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00		
					SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**		
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		
					SUB TOTAL	**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00		
					SUB TOTAL	**4,200,000.00**		
						TOTAL EJECUTADO	$	**238,160,028.00**

Tabla 31 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 01/09/2023: Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-986-22, con observaciones en la implementación en los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

- 12/09/2023: Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1042-22, Aprobación de informes mensuales.

- 14/09/2023: Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1043-22, observaciones informe mensual mes de agosto.

- 15/09/2023: Se recibe oficio N° PHP2022-032-2023, con documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

- 28/09/2023: Se realiza visita de campo en la vereda Bataga, del municipio de Pamplonita, para realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de cada uno de los proyectos contemplados en los programas del documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), donde se logró evidenciar que el contratista no está implementando ninguno de los proyectos.

- 30/09/2023: Entrega de informe mensual del mes de septiembre.

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambientaly Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El día jueves 24 de agosto del presente año siendo las 8:10am se conforma el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 0; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Se sugiere al contratista incluir en el informe el listado de las personas que hacen parte del grupo de gestión socio ambiental, ya que no se evidencia.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo en:

- Inducción en Cumplimiento de la Ley 1333 de 2009.

- Inducción Presentación programas PAGA.

PLAN DE CAPACITACIONES							
N°	TEMA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	Inducción componente ambiental						
2	PMA y plan de contigencias de obra						
3	Manejo de Residuos sólidos y Regla 3R						
4	Hallazgo de fauna						
5	Disponibilidad de agua en el planeta y Tips para ahorrar agua						
6	Manejo de derrames de sustancias químicas						
7	Contaminación del aire						
8	Cierre Ambiental						
		Ejecutado					
		Sin Ejecutar					



Fuente contratista.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente. La UT debe

realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, unidades sanitarias, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta. No se generarán residuos peligrosos en obra. Los mantenimientos de las maquinaria, equipos y vehículos se realizarán en un lugar externo y que cumpla con los requerimientos para prestar el servicio. El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque. A la fecha no se ha requerido de este servicio. Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza y mantener papel higiénico y jabón para lavado de manos. Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA. Con respecto a la aprobación del documento PAGA, de acuerdo con las obligaciones contractuales, y con la finalidad de dar seguimiento a lo establecido en el pliego de condiciones para el componente ambiental, una vez revisado la documentación del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA, versión 0, la interventoría emite observaciones ambientales a ser subsanadas, mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-757-22. A la fecha de entrega del presente informe se encuentra en revisión, ajuste y elaboración la Versión 01 del documento PAGA teniendo en cuenta las observaciones emitidas por la interventoría.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

El contratista hace entrega de los EPP a todo el personal

Durante el presente informe no se generó material sobrante.

Se solicita instalación de almacén para el resguardo de los materiales. Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra.

Tabla. Fuente de materiales

Localización	Tipo de fuente	Estado Legal		
		Con Licencia ambiental	En trámite	Vigencia de la licencia
Bochalema, Norte de Santander	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0934 del 19 de octubre de 2009		Vida útil del proyecto.

Tabla. Materiales en obra.

NO	PROVEEDOR	FECHA	UNION TEMPORAL	CONCEPTO	TIPO DE GASTO	ARENA TRITU	ARENA LAVADA	TRITU 3/4	EXTRA FINO	SUB BASE	BASE
1	AGREGADOS PAMPLONITA S.A.S.	11-ago-23	UNION TEMPORAL COLOMBIA	SUB BASE - ARENA LAVADA- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4	MATERIALES	30	0	30	0	735	0
2	AGREGADOS PAMPLONITA S.A.S.	19-sep-23	UNION TEMPORAL COLOMBIA	SUB BASE - ARENA LAVADA- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4	MATERIALES	24	0	30	0	0	0
3	AGREGADOS PAMPLONITA S.A.S.	4-sep-23	UNION TEMPORAL COLOMBIA	SUB BASE - ARENA LAVADA- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4	MATERIALES	18	0	6	0	6	0
4	AGREGADOS PAMPLONITA S.A.S.	15-sep-23	UNION TEMPORAL COLOMBIA	SUB BASE - ARENA LAVADA- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4	MATERIALES	56	0	14	0	0	0



Fuente interventoría

Se le sugirió al residente de obra que debe instalar un campamento provisional, para guardar los materiales de construcción, y delimitar con cinta amarilla todo el material triturado que será utilizado.

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06Actividades ejecutadas: Se solicita la instalación al residente de obra de la señalización y manejo de tránsito según lo establecido en el documento PAGA, y lo contemplado dentro de este proyecto.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Pamplonita, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

Según información suministrada por el contratista durante este periodo no se generó material de excavación

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente. Se instalarán 4 contendores uno de color verde para residuos orgánicos, uno color negro para residuos no aprovechables, uno color blanco para residuos aprovechables y uno color rojo para residuos peligrosos como son las bolsas de cemento.

Hasta la fecha de entrega de este informe no se evidencia la instalación del punto del ecológico, no se esta realizando el manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos.



Fuente de interventoría

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Hasta la fecha de entrega de este informe no se ha implementado este proyecto.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza.

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

El contratista realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación.

Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente.

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Herrán.

Se sugiere al contratista en caso de realizar algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15


Actividades ejecutadas: Se realiza recorrido de obra para definir el sitio estratégico para la instalación del campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, de la bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y definir el área de oficina para labores administrativas.

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOA. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente. Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización, que aún no ha sido instalada por el contratista. En este mes no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra.

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental

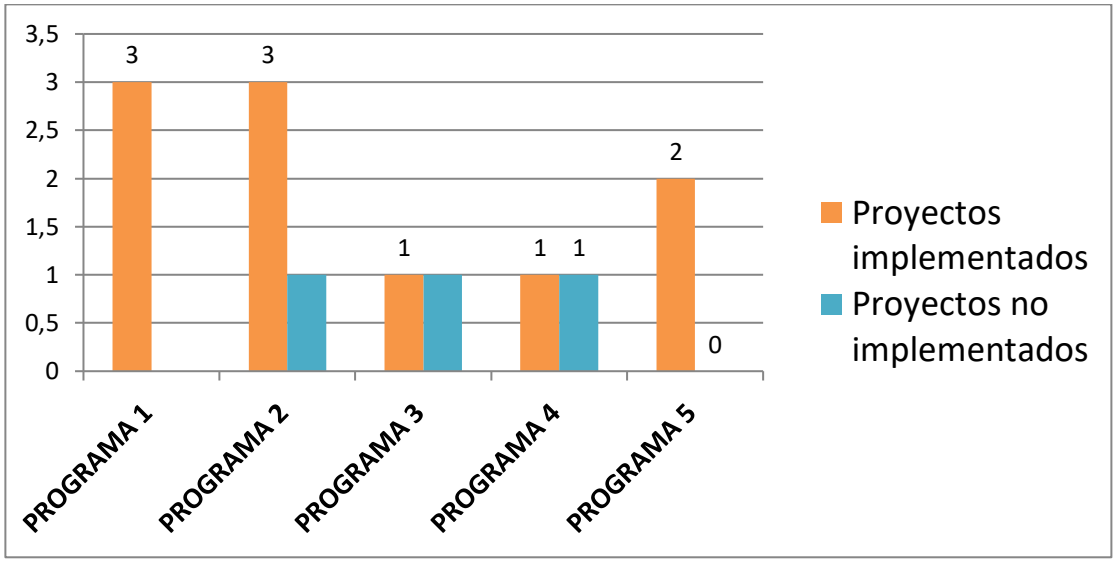

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

3.7.1.4. Actividades Sociales.

La Unión Temporal Colombia, NO se encuentra ejecutando en el área de influencia del proyecto, ninguno de los distintos proyectos (Programas) sociales, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); los proyectos son cinco (5):

1. Atención a la Comunidad.
2. Información y Divulgación.
3. Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.
4. Cultura Vial y Participación Ciudadana.
5. Contratación Mano de Obra.

Descrito una vez lo anterior, esta Interventoría ha solicitado al contratista la implementación de los programas de Gestión Social, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), los cuales fueron concertados en distintas mesas de trabajo con la profesional social del Contratista; estos programas deben de ser implementados dentro del área de influencia del proyecto por la Unión Temporal durante el periodo de ejecución de la obra.

La Interventoría no ha recibido por parte del Contratista, los distintos documentos de preconstrucción solicitados tales como las Actas de Vecindad, Certificados de Territorialidad, Actas de Compromiso, solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior, conformación del Comité de Veeduría Ciudadana y Cifras de Empleabilidad.

La Unión Temporal Colombia, no envío a esta Interventoría el correspondiente informe mensual del mes de septiembre de 2023.

3.7.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	OFICIAL	88.035.343	2/09/2023
2	FERNEY ALEXANDER CONTRERAS CONTRERAS	OBRERO	1.094.241.559	7/09/2023
3	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	OFICIAL	1.094.552.339	7/09/2023
4	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	OBRERO	5.479.176	12/09/2023
5	PEDRO LION SUAREZ PARADA	OBRERO	5.478.682	12/09/2023
6	EDINSON ALEXIS CONTRERAS CONTRERAS	OBRERO	1.007.618.358	12/09/2023
7	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	OBRERO	5.478.647	12/09/2023
8	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	OBRERO	1.094.552.142	13(09/2023
9	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	OBRERO	88.160.653	11(09/2023
10	CÉSAR ORLANDO SUÁREZ CAICEDO	OBRERO	1.005.012.045	20/09/2023

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas. se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 34 Entregas de EPP – Pamplonita

5. Maquinaria y Equipo

La Interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.



Fotografía 35 Maquinaria Pamplonita

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 36 Equipos de Emergencia Municipio de Pamplonita

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL COLOMBIA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizo 10 inducciones y 25 capacitaciones a los trabajadores.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL COLOMBIA	10	25

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL COLOMBIA	Agosto	0

3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.7.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, a la fecha han sido aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, Informe Hidráulico y Estructural, los componentes de Diseño Geométrico se encuentra aprobado con observaciones y el componente de Diseño de Pavimentos/ Incluye Diseño de Tránsito se encuentran con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 96% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 23.270.532,48 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 20.902.728,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 32 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

Pese a no tener aprobado el diseño de Pavimentos, se da inicio a la ejecución de las obras teniendo en cuenta que las observaciones realizadas corresponden a realizar aclaraciones respecto a unos muros que no se van a construir y se solicita sea retirado del documento para no generar confusiones al momento de su ejecución.

3.7.3.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 30 de septiembre de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 13.89% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 238.193.628,00 vs un programado del 80.22% que equivale en pesos a $ 1.366.534.453,48.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A la fecha se han ejecutado actividades en el tramo vial dentro de las actividades ejecutadas se encuentran excavaciones, perfilado he instalación y compactación de subbase granular, armado y figurado de acero, fundida de Huellas con concreto de 3000 PSI. El atraso presentado con corte al 30 de septiembre de 2023 es de 66.24% esto se debe a que el contratista de obra a la fecha debería de llevar ejecutado 1526 ml de Placa huella Completa y la construcción de 14 alcantarillas. A la fecha se han construido 294 ml de Placa Huella quedando pendiente por ejecutar para terminar y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 136 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

Mediante comités de seguimiento y en los que el contratista ha hecho presencia y a través de llamadas telefónicas se le ha solicitado aumentar la mano de obra no calificada para poder terminar la obra en los tiempos establecidos, adicional se le ha solicitado la entrega de un plan de contingencia para minimizar el atraso que se presenta.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de Abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de Diciembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	09 de Diciembre de 2023

Tabla 33 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Observado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-475-22 del 28-Abr-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23-May-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23-May-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Generación de Empleo		No ha presentado
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-982-22 del 01-SEPT-23
Plan de Manejo de Transito - PMT		No ha presentado
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1067-22 del 18-Sep-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-766-22 del 07-Jul-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-864-22 del 04-Ago-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 34 Estado Documentos pre construcción
Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de septiembre por parte del contratista están:

- Se ejecutan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de subrasante) y compactación de la misma en el municipio de gramalote, corredor vial vereda Boyacá puntos de intervención Pr 6+400 hasta Pr4+566.

- Se continúan actividades de mantenimiento periódico (Conformación de la calzada existente) en el corredor vial Vereda corozal – california Municipio de los patios.

- Teniendo en cuenta que actualmente se van a intervenir tramos de vía con obras de drenaje existentes se realiza limpieza de alcantarillas que actualmente se encuentran colmatadas a lo largo del corredor vía Vereda Corozal – California, Municipio de los Patios con el fin de mejorar su funcionalidad.

- Durante el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para los diferentes frentes de trabajo que se tienen actualmente Municipio de Arboledas, Gramalote y los patios.

- Se realizan actividades de excavación de taludes y adecuación de anchos de vía a lo largo del corredor vial a intervenir actualmente PR4+450 con el fin de dar cumplimiento a anchos de vía y curvas proyectadas en los diseños de placa huella a ejecutar vereda Corozal – California Municipio de los Patios.

- Durante el periodo se ejecutan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial Vereda la Rinconada, Municipio de Arboledas punto de intervención Pr 4+60 hasta Pr 7+144.

- Se realizan actividades de topografía por parte de la interventoría para la verificación de anchos existentes y cumplimiento de parámetros en curvas a intervenir de los diferentes tramos Municipio de Arboledas (Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan Bueno, Helechar), Municipio de Gramalote (Boyacá, San isidro, Santa Anita), Municipio de Los Patios (Corozal – California).

- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo para placa huella a ejecutar en la Vereda Rinconada del Municipio de Arboledas, Tramos a intervenir 2-2 y 2-1.

- Se realiza armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos) tramo 2-1 y tramo 2-2 de acuerdo a diseños establecidos.

- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en sitio para elementos de placa huella (huellas, viga riostra, cuneta y bordillo) tramo de placa huella ejecutado 2-1 y en ejecución 2-2 Vereda Rinconada, Municipio de Arboledas de acuerdo a diseño de mezclas.


- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en sitio para franja central en concreto ciclópeo y sobreancho de placa huella tramos ejecutado 2-1 y en ejecución 2-2 en el Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada de acuerdo a diseño de mezclas.

- Se realiza riego de aditivo antisol para curado de concreto de los diferentes elementos fundidos (Viga riostra, Huellas, cuneta y bordillo) en placa huella ejecutada tramo 2-2 y en ejecución tramo 2-1.

Reunión realizadas en campo para seguimiento del contrato, Municipio de Arboledas.





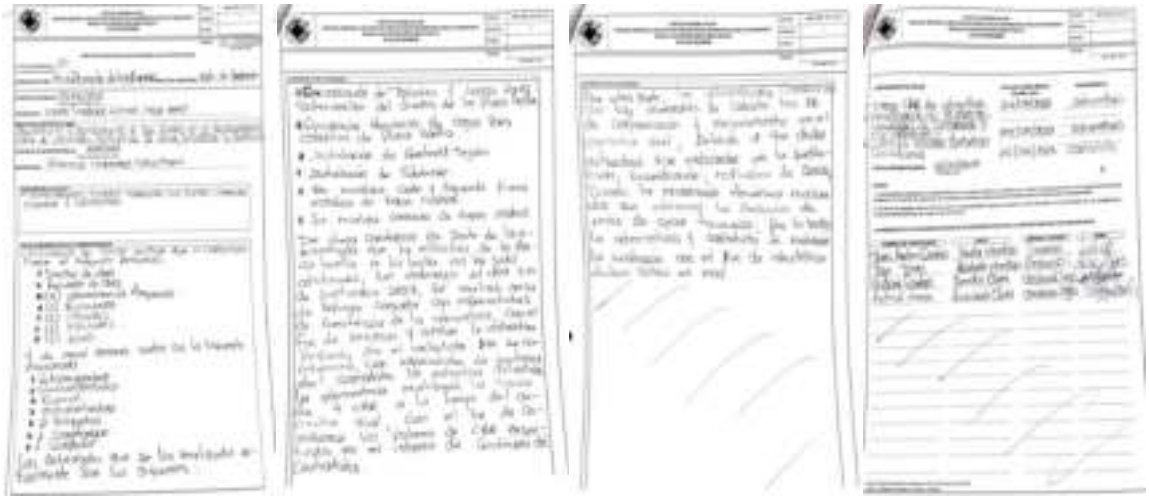

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores.

3.8.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 05/09/2023: Se realiza visita a campo, a la vereda Boyacá, municipio de Gramalote, donde se evidencia que está implementando algunos de los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).



Fuente Interventoría

- 06/09/2023: Se recibe oficio No UTET-02590-108, entrega de documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

- 12/09/2023: Se recibe oficio No UTET-02590-114, lineamientos lugar disposición del material.

- 15/09/2023: Se envía oficio No GIC-INVIAS-NTS-1063-22, respuesta lineamientos lugar disposición del material.

- 15/09/2023: Se envía oficio No GIC-INVIAS-NTS-1067-22, observaciones al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

- 21/09/2023: Se realiza visita a campo, a la vereda La Rinconada, municipio de Arboledas, donde se evidencia que está implementando algunos de los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).



Fuente Interventoría

A continuación, se presenta el seguimiento que esta realizando la interventoría con el fin de verificar que se esté cumplimiento los diferentes programas contenidos en el PAGA, los cuales fueron implementados durante el mes de septiembre:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Cuentan con el material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto.



Fuente Interventoría

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se logro evidenciar con la visita que cuentan con la señalización en el frente de obra, esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes.







Fuente Interventoría

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas:
En el mes de septiembre se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas.



Fuente Interventoría

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se logra evidenciar que cuentan con maquinaria en el frente de obra, que cumple con todos los requerimientos de ley**.**



Fuente Interventoría

29/09/2023: Se realiza visita a la vereda California – Corozal, del municipio de los Patios, donde se evidencia que está implementando algunos de los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Cuentan con el material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto.



Fuente Interventoría

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se logro evidenciar con la visita que cuentan con la señalización en el frente de obra, esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes.



Fuente Interventoría

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas:
En el mes de septiembre se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas.



Fuente Interventoría

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se logra evidenciar que cuentan con maquinaria en el frente de obra, que cumple con todos los requerimientos de ley**.**



Fuente Interventoría

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

En las visitas realizadas en obra se pudo evidenciar que algunos de los proyectos contemplados en los programas del PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), se están realizando de la manera correcta como: Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04, Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06, Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08, Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17, falta implementar los demás programas.

La documentación ambiental no está siendo entregada a tiempo como los informes mensuales, que, hasta la fecha de la firma de acta de inicio realizada en el mes de abril, y a partir de esa fecha debe ser entregado informes mensuales y los formatos a la interventoría, hasta la presente no se ha recibió documentación por parte del contratista

3.8.1.4. Actividades Sociales.

Esta Interventoría realiza visita a obra, en los tres muncipios que hacen parte del convenio 1943 firmado con la Gobernación de Norte de Santander; evidenciándose que, la Unión Temporal Edivial-Troja, NO se encuentra ejecutando en el área de influencia del proyecto, ninguno de los distintos proyectos (Programas) sociales, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); los proyectos son cinco (5):

1. Atención a la Comunidad.
2. Información y Divulgación.
3. Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.

4. Cultura Vial y Participación Ciudadana.
5. Contratación Mano de Obra.

Descrito una vez lo anterior, esta Interventoría en los próximos días oficiará al Contratista respecto al incumplimiento en la no implementación de los programas de Gestión Social, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), los cuales fueron concertados en distintas mesas de trabajo con la profesional social del Contratista; estos programas deben de ser implementados dentro del área de influencia del proyecto por la Unión Temporal durante el periodo de ejecución de la obra.


Tabla Reporte cifras de contratación, septiembre 2023.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
29	3	32	11	21	20	12

Fuente: Unión Temporal Edivial-Troja.

Personal contratación Directa: 90.6%
Personal contratación Indirecta: 9.4%
Personal Área de Influencia Directa: 34.4%
Personal Área de Influencia Indirecta: 65.6%
Mano de Obra Calificada: 62%
Mano de Obra No Calificada: 38%

Ilustración 8 Reporte cifras de contratación agosto de 2023.

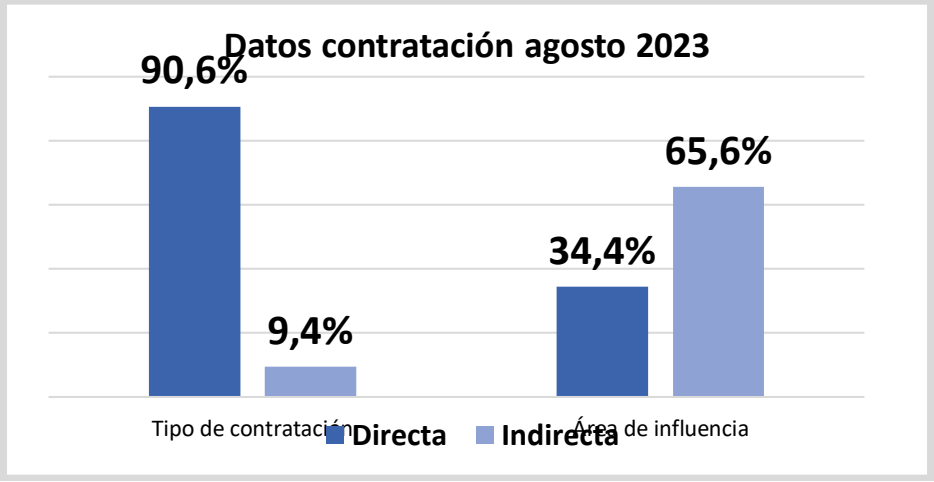

Fuente: Unión Temporal Edivial-Troja.

La Interventoría se encuentra a la espera sea enviado el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

En las diferentes visitas realizadas en los tres municipios del convenio de la Gobernación 1943, no se ve la implementación del Plan de Gestión Social descrito en el PAGA.

La Unión Temporal Edivial-Troja, no remitió a la Interventoría el respectivo informe mensual del mes de agosto, componente social.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FECHA INGRESO
1	NELSON EDUARDO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1005037995	1/09/2023
2	ESTHER BELTRAN	RESIDENTE SISO PATIOS	1090508130	19/09/2023
3	GEOVANNY ROJAS SANCHEZ	ALMACENISTA PATIOS	1090515100	19/09/2023
4	ANGIE STELLA DUARTE SANCHEZ	AUXILIAR CONTABLE	1090508619	23/09/2023
5	BRAYAN ALBERTO AVELLANEDA FUENTES	RESIDENTE DE OBRA	1094427498	23/09/2023
6	BRAYAN FABIAN OROZTEGUI	CONDUCTOR	1116810907	20/09/2023
7	DARWIN JOSE MORA GARCIA	CONDUCTOR	1093772039	21/09/2023
8	CAROLINA SANDOVAL ACEVEDO	ALMACENISTA	1094427375	28/09/2023
9	HENRY AGUILLON	AYUDANTE OBRA	5455903	18/09/2023
10	WILMER BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092343929	6/09/2023
11	JOSE HELI MENDEZ BELTRAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093885115	13/09/2023
12	JAIME ALBERTO SOTO VEGA	AYUDANTEDE OBRA	1004923979	12/09/2023
13	JACKSON DAVID SUAREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005028380	6/09/2023

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 37 Entrega de EPP – Gobernación 1943

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 38 Maquinaria y Equipos Gobernación 1943

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 39 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	1	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizo 13 inducciones y 50 capacitaciones a los trabajadores.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	13	50

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	septiembre	0

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.8.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entrega de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (El contratista presento solo un documento entregado para la totalidad de corredores a intervenir, el cual fue observado), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada). donde se continúan emitiendo observaciones por los especialistas de la interventoría y hasta la fecha la subsanación de los mismo no ha sido concurrente por parte del contratista, lo cual continúa generando retrasos en la etapa de estudios y diseños, por tanto, esta actividad corresponde a un 65,3% de acuerdo a las presentaciones parciales entregadas de los mismos.

Por parte de la interventoría se espera que el contratista le dé celeridad a la entrega oportuna de los documentos subsanados con el fin avanzar en esta etapa y darle finalidad a la misma, a la fecha de acuerdo a la totalidad de componentes a entregar que son 72 unidades entre Topografía, Diseño Geométrico, Estudio de Suelos, Diseño de Pavimentos, Diseño Estructural, Diseño Hidráulico para las 12 Veredas, solo se tiene 47 de los mismos, de los cuales solamente 8 Topografía se tiene aprobada y 2 Diseños geométricos aprobados con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 41.40% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 84.672.368,18 vs un programado del 64.45% que equivale en pesos a $ 131.819.052,59.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 - BOYACA
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS

Tabla 35 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.3.2. Etapa de Construcción.

En el presente periodo el contratista ejecuta actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante, perfilado y adecuación de anchos de vía) en los corredores viales Vereda Rinconada, Municipio de Arboledas y Vereda Boyacá del Municipio de Arboledas con el fin de tener un mejor acceso a los diferentes puntos de intervención, de igual manera se culminan actividades de conformación de la calzada existente en el Municipio de Los Patios, Vereda Corozal – California.

Durante el periodo se inician actividades Excavaciones varias sin clasificar, Corte, figura y armado de acero de refuerzo para elementos, viga riostra, huellas, cunetas y bordillos, Armado de formaleta en madera (cajones) para elementos en concreto, vaciado de concreto de 21 Mpa (D) elaborado en obra, Vaciado de concreto de 14 Mpa (G) ciclópeo elaborado en obra para elementos de placa huella franja central y sobreanchos, para placa huella en ejecución Vereda Rinconada, del Municipio de Arboledas.

Actualmente ya tiene terminado el Tramo 2-2 de longitud de 38,55 m y se encuentra en ejecución Tramo 2-1 a la fecha del presente informe.

Con corte al 30 de septiembre de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 1.67% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 282.294.106,32 vs un programado del 32.19% que equivale en pesos a $ 5.439.153.389,24.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 30.52%, lo anterior se debe a que, de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado en el municipio de Arboledas 2581 ml de Placa Huella Correspondiente al 37% del valor de esa actividad y, 14

Alcantarillas correspondientes a un 29% la construcción de esa actividad. Con corte al 30 de septiembre lleva ejecutado un total de 65 ml de Placa Huella, quedando aún pendiente por ejecutar 6905 ml, y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 121 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

En el municipio de Gramalote el Contratista debería tener ejecutado 1653 ml de Placa Huella Correspondiente al 36% del valor de esa actividad y, 4 Alcantarillas correspondientes a un 24.9% la construcción de esa actividad. Con corte al 30 de septiembre lleva ejecutado un total de 0 ml de Placa Huella, quedando aún pendiente por ejecutar 4543 ml, y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 80 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

En el municipio de Los Patios el Contratista debería tener ejecutado 822 ml de Placa Huella Correspondiente al 18% del valor de esa actividad. Con corte al 30 de septiembre lleva ejecutado un total de 0 ml de Placa Huella, quedando aún pendiente por ejecutar 4500 ml, y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 79 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

Por otra parte, se le ha solicitado la entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso presentado a la fecha.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de Mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de Noviembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	10 de Noviembre de 2023

Tabla 36 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-862-22 del 04-Ago-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-862-22 del 04-Ago-2023
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1143-22- 06-Oct-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-756-22- 05-Jul-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952- 22- 28-Ago-23
Caracterización Material Granular	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952- 22- 28-Ago-23

Tabla 37 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas.

Durante el periodo el contratista realiza netamente actividades administrativas que tiene que ver con la subsanación de algunos componentes de estudios y diseños, por lo cual el presente contrato continua si ejecución de actividades en campo. debido a lo mismo las comunidades de la vereda La Garita – La Mutis han venido manifestando su preocupación ante la entidad contratante Gobernación de Norte de Santander, donde mediante reunión realizada el día 27 de septiembre de 2023, se estableció como compromiso por parte del contratista de obra, dar inicio a actividades de conformación de la calzada existente a lo largo del corredor vial el día 02 de octubre de 2023.

De igual manera se realiza recorrido a lo largo del corredor vial, donde se les indica a las comunidades cuales son los puntos que se tienen establecidos a intervenir en el presente proyecto.

Reunión realizada con la entidad contratante Gobernación Norte de Santander, Comunidades, Contratista de obra e Interventoría.







Fuente: Gavino Ingenieros Consultores.

Recorrido con las comunidades Veredas La Garita – La Mutis a puntos de intervención.





3.9.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 15/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1061-22, aprobación informe mensual de los meses junio, julio, agosto.

- 25/08/2023. Se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N°PHM2022-038-2022.

- 29/09/2023: Se realiza visita a la vereda la Mutis del municipio de los Patios, de los tramos donde se ejecutará la obra



Fuente interventoría.

- 30/08/2023: Se recibe por parte del contratista informe mensual del mes de septiembre.

Durante la ejecución del contrato la UT estará obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

La U.T está obligada a adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que pueda estar expuesto su propia salud, la de sus empleados y la de terceros.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó las siguientes actividades desde el área ambiental:

SUBSANACIÓN DOCUMENTO PAGA VR 0

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales, y con la finalidad de dar seguimiento a lo establecido en el pliego de condiciones para el componente ambiental, una vez revisado la documentación del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA, versión 0, la interventoría emite observaciones ambientales a ser subsanadas con respecto al presupuesto PAGA, mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-756-22:
Presupuesto y/o costo del PAGA

Con el fin de realizar una implementación, evaluación y monitoreo del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA), se pone en las herramientas necesarias para un buen funcionamiento de la ejecución del presupuesto y del cronograma.

Alcance.

El presente presupuesto y costos contemplados en el desarrollo de las actividades del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) del contrato LPOP-001-2022 con objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, el proceso de documentación e implementación de este Plan incluye de manera exclusiva las definiciones y controles a que se debe dar continuidad y/o implementar de los siguientes aspectos:

Manejo de los Residuos Sólidos. Uso y ahorro eficiente del Agua. Suministro de Combustible a las maquinarias amarilla y demás parque automotor Reducción del Peligro por Fauna en las Áreas de intervención vial. Control de Erosión y Manejo Paisajístico

La elaboración del Plan Ambiental con sus respectivo costos y cronograma de ejecución, se estima que uno de los propósitos es describir e identificar las infraestructuras vial existentes para las operaciones y actividades que conforman el proceso de control y atención a los aspectos ambientales y de seguridad de la zona de área indirecta de la vía, a través de la descripción de las áreas y procesos que se desarrollan para su adecuada atención y control.

Definir, documentar e implementar procedimientos que aseguren el adecuado control y prevención de aspectos ambientales y de seguridad, que representan potenciales riesgos de impactos negativos en el entorno, de tal manera que se pueda dar cumplimiento a los requerimientos establecidos de programas de seguimiento y monitoreo, como herramientas de control ambiental, en concordancia con la Legislación Ambiental aplicable vigente.

Costos de implementación y operación PAGA

La implementación en tiempo real de las acciones y fichas contempladas en el PAGA del contrato, en campo y mediante la asignación de recursos, permite determinar cuáles son las fuentes de contaminación primarias existentes en la obra y de esta manera, mitigar el impacto negativo que se desarrollan en los ecosistemas presentes en el área de influencia directa e indirecta de la zona de trabajo, para ello, se desarrolla la tabla de costos de implantación existente es la obra que se puede ver en la siguiente Tabla.

Tabla “Presupuesto PAGA” PROGRAMA AMBIENTAL PROYECTOS AMBIENTALES COSTO.

PROGRAMA AMBIENTAL	PROYECTOS AMBIENTALES	COSTO ($ Col) / AÑO
1. GESTIÓN Integral del RESIDUOS	1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	$ 400.000
	2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS RCD (Cargue y Transporte)	$ 2.000.000
2. GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS	1. Diagnóstico del sistema de conducción de las Aguas Residuales y aguas lluvias.	$ 1.000.000
3. GESTION ZONAS VERDES	1. MANEJO PAISAJISTICO	$ 500.000

4.MANEJO AMBIENTAL	1. CONTROL DE DERRAMES EN EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.	$ 1.000.000
	2. MANEJO DE TALUDES Y AREAS INESTABLES.	$ 0
	3. MANEJO CORTES, RELLENOS Y ZODMES	$ 0
	4. MANEJO AGUAS LLUVIAS Y DRENAJES NATURALES	$ 0
	5. CONTROL DE CONTAMINACION EN LA CONSTRUCCION	$ 1.500.000
	8. SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE CONSTRUCCION	$ 500.000
	9. RETIRO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	$ 300.000
	10. Control y mitigación de impactos por RESPEL	$ 1.000.000
	11. Talleres de educación Ambiental	$ 1.000.000
5. PLAN GESTIÓN SOCIAL	1. CONFORMACION COMITÉ COORDINADOR COMUNITARIO	$ 100.000
	2. INFORMACION A LA COMUNIDAD de actividades sociales	$ 2.000.000
	3. VISITAS PEDAGOGICAS AREA DE INFLUENCIA DIRECTA	$ 1.000.000
	5.TALLER SOBRE TRAFICO DE PERSONAS	$ 1.000.000

	6.SOCIALIZACION DEL PGR RCDS	$ 1.000.000
	7.CONTRATACION PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	$ 1.000.000
	8. PROMOCION DE LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CLAIFICADA	$ 1.000.000
6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1. Herramientas de Monitoreo y evaluación.	$ 2.500.000
COSTO TOTAL PAGA		$ 17.800.000

A la fecha de entrega del presente informe se encuentra en revisión, ajuste y elaboración la Versión 01 del documento PAGA teniendo en cuenta las observaciones emitidas por la interventoría

3.9.1.4. Actividades Sociales.

Durante este periodo se evidencia que, la Unión Temporal Placa Huella La Mutis 2022, NO se encuentra ejecutando en el área de influencia del proyecto, ninguno de los distintos proyectos (Programas) sociales, pertenecientes al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); los proyectos son cinco (5):

1. Atención a la Comunidad.
2. Información y Divulgación.
3. Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.
4. Cultura Vial y Participación Ciudadana.
5. Contratación Mano de Obra.

La Unión Temporal Placa Huella La Mutis 2022, no ha remitido a esta Interventoría el respectivo Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), con las subsanaciones al documento presentado.

La Interventoría no ha recibido por parte del Contratista, los distintos documentos de preconstrucción solicitados tales como las Actas de Vecindad, Certificados de

Territorialidad, Actas de Compromiso, solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior, conformación del Comité de Veeduría Ciudadana y Cifras de Empleabilidad.
La Unión Temporal Placa Huella La Mutis 2022, no envío a esta Interventoría el correspondiente informe mensual del mes de septiembre de 2023.

3.9.1.5. Actividades SST

A la fecha de corte del informe no se ha dado inicio a las actividades físicas del proyecto, por otra parte, ya se da aprobación al SG-SST y al Protocolo de Bioseguridad.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.9.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista de obra durante el periodo continua sin entregar las subsanaciones a los diferentes componentes de estudios y diseños, lo cual continúa generando atrasos en el plazo de ejecución del proyecto.

A la fecha del presente informe solo se tienen aprobados 2 de los 6 componente (Estudio geológico, geotécnico e informe de suelos) y el componente de Diseño geométrico continúa aprobado con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 61% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 38.311.153,70 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 62.805.170,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	NO HA PRESENTADO

Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052

3.9.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que el Contratista no ha realizado entrega de manera completa a los Estudios y Diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobados todos los documentos de Estudios y Diseños.

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de Mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de Septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	17 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Final:	17 de diciembre de 2023

Tabla 39 Condiciones Iniciales Cto. Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-769-22 del 07-Jul-23
Programa de Obra	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1020-22 del 08-Sept-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de septiembre por parte del contratista están:

- Se realiza reunión de socialización del avance que se tiene a la fecha el contratista de obra en la etapa de estudios y diseños en el municipio de Ocaña, teniendo en cuenta la solicitud realizada por la comunidad de Buenavista se informar y se dará inicio a la ejecución física del proyecto.
- Se ejecutan actividades de cajeo en 420m en el tramo 5, Pr 07+0110 corredor vial de Buenavista, Municipio de Ocaña.
- Se ejecutan actividades de transporte de materiales procedentes de perfilado y adecuación de taludes, adecuación de sobre anchos en curvas con el fin de garantizar los diseños aprobados del corredor vial intervenido.
- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes de estudios y diseños.

Reunión comunidad Socialización.







GDE

Fecha: 1 de septiembre 2023	Hora de inicio: 3:00 p.m.	Hora de finalización: 03:30 p.m.
Lugar: Casa cural del corregimiento Buenavista	Responsable de la reunión: Unión Temporal GBE – Ocaña	
Tipo de Reunión: Socialización de inicio obras físicas para el mejoramiento del corredor vial Ocaña – Buenavista por medio del Programa Colombia Rural, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander		Acta No. 001

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo e intervención de la profesional social por parte del contratista Unión Temporal GBE Laura Bandonino
2. Participación de la ingeniera auxiliar Aura Torres por parte del contratista
3. Palabras de la ingeniera residente Adriana Gutiérrez por parte de la interventoría GAVINCO.
4. Cierre/fin

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo e intervención de la profesional social por parte del contratista Unión Temporal GBE Laura Bandonino.

Es importante agradecer a la comunidad por el acompañamiento en esta reunión y por estar al tanto de esta intervención vial; además, se realiza la presentación del equipo por parte del contratista e interventoría las cuales van a estar al tanto de cualquier inquietud, sobrino sobre la intervención; por otro lado, como profesional social, es importante recalcar que durante este proceso se contemplan los programas sociales, donde la comunidad es el factor más importante y por esta razón, se cuenta con el acompañamiento por parte del contratista y establecer los canales de comunicación con nuestro equipo, en este caso, el buzón sugerencias donde ustedes pueden escribir aquellas sugerencias, quejas o peticiones que tengan, para la respuesta son 15 días hábiles, es importante aclarar que este buzón estará ubicando por cada uno de los tramos esto con el objetivo que todos tengan acceso y se comenzara en la casa del señor Edinson donde se encuentra en tramo 5.

Ahora bien, ya se han realizado el levantamiento de las actas de vecindad para cada uno de los tramos establecidos, esto se hizo con el propósito de describir y describir como se encuentra el inmueble antes y después del proceso constructivo. Por último, cualquier situación que sea observada por ustedes y necesiten mi intervención estaré al tanto para colaborarles y encontrar una solución.



2. Participación de la ingeniera auxiliar Aura Torres por parte del contratista

Como se manifestaba la auxiliar nuestro equipo de trabajo, esta a la disposición de la población para estar al tanto de sus inquietudes; por otra parte es importante contarle a la comunidad que el proceso constructivo son cinco tramos los cuales comienzan desde la vivienda del señor Edinson, para que conozcan sobre la intervención el presidente de Buenavista Arbey Cisneros especificara donde son los tramos de cuales fueron aprobados y socializados con la vereduría, además las 10 escombreras que se realizaran, a continuación escribo la ubicación y longitud de cada uno de los tramos a intervenir:

Tramo	Abscisa PR 0 (Glorieta)	PR/ PR a intervenir	DIMENSIONES	
			LONGITUD(m)	ANCHO (m)
1	PR 31 + 0000	PR 31 + 0700	700,00	6,00 y sobreanchos
4	PR 30 + 0000	PR 30 + 0000	200,00	6,00 y sobreanchos
6	PR 30 + 0000	PR 30 + 0000	200,00	6,00 y sobreanchos
7	PR 30 + 0400	PR 30 + 0940	465,00	6,00 y sobreanchos
8	PR 27 + 0110	PR 27 + 0440	330,00	6,00 y sobreanchos
TOTAL TRAMOS A INTERVENIR			1515 m	

Dicho lo anterior, se puede evidenciar que la intervención serán 5 tramos para un total de 1515m, Así mismo, se realizo un mejoramiento de la vía la abscisa (vía abierta) para que las habitantes puedan transitar. Por otra cada, la construcción de la rampa de obra en forma un tramos de tejas de vida, donde se las puedan entregar al componente social o en caso de presente, esto con el objetivo de empezar a la población beneficiada de este proyecto.

3. Palabras de la ingeniera residente Adriana Gutiérrez por parte de la interventoría GAVINCO.

Por parte de la interventoría, el equipo de trabajo está dispuesta a ayudarles y orientarles en este proceso vial, para garantizar que este proyecto sea un beneficio para la comunidad, asimismo, cualquier consulta estamos a su disposición y como lo mencionaron los integrantes del contratista son 5 tramos que se van a intervenir para un total de 1515 m.


Por último, los residentes tienen mi contacto para cualquier información que necesiten sobre este proceso y proyecto vial.

COMPROMISOS

1. El equipo de trabajo del contratista se compromete a estar al tanto de cada una de las situaciones referente al proyecto y las inquietudes de la comunidad para garantizar la comunicación.
2. La población presentara un oficio como sugerencia para que el tramo de las 100 se pueda mover a otro por su beneficiación.





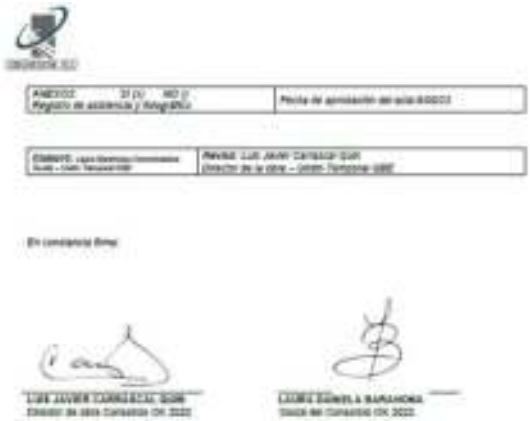







Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2023.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 30-SEPTIEMBRE-2023	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	1,120.00	$ 44,842,560.00
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00		
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00		
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00		
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00		
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00		
SUB TOTAL					**$ 2,275,884,754.00**	$	44,842,560.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00		
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00		
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00		
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diame	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00		
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00		
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00		
SUB TOTAL					**$ 172,645,113.00**	$	-
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		
SUB TOTAL					**$ 21,920,020.00**	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00		
					TOTAL	$	44,842,560.00

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 08/09/2023: Se envía oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1020-22, con las observaciones al documento PAGA (Plan Adaptación Guía Ambiental)

- 20/09/2023: Se recibe documento PAGA (Plan Adaptación Guía Ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

- 14/09/2023: Se realiza comité en donde se mencionó que se le envía al contratista oficio con observaciones encontradas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental). La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con observaciones subsanadas por el profesional ambiental del contratista, informes mensuales de los meses abril, mayo, junio y julio, ya que solo se ha recibido informe del mes de agosto.

- 21/09/2023: Se realiza comité en donde se mencionó que la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con observaciones subsanadas por el profesional ambiental del contratista, informes mensuales de los meses abril, mayo, junio y julio, ya que solo se ha recibido informe del mes de agosto.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación pre constructiva para dar inicio a la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El consorcio UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022, debe empezar a implementar todos los proyectos que aplican durante la ejecución de la obra, ya que la etapa constructiva esta próxima a iniciar.


La documentación ambiental no esta siendo entregada a tiempo como los informes mensuales, que, hasta la fecha de la firma de acta de inicio realizada en el mes de marzo, y a partir de esa fecha debe ser entregado informes mensuales y los formatos a la interventoría, hasta la presente solo se recibe el informe del mes de agosto, quedando pendientes los demás, para el septiembre no se recibió documentación por parte del contratista.

3.10.1.4. Actividades Sociales.

Es enviado por parte del Contratista durante el mes de agosto de 2023, la respectiva acta de reunión número 02, con objeto “Socialización del alcance final de los tramos a intervenir del corredor vial Ocaña-Buenavista, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander”, donde se informó a las personas presentes, sobre el alcance final del proyecto a ejecutarse y las fichas sociales y ambientales que serán empleadas durante el periodo de construcción.

Ilustración 9 Socialización del proyecto.



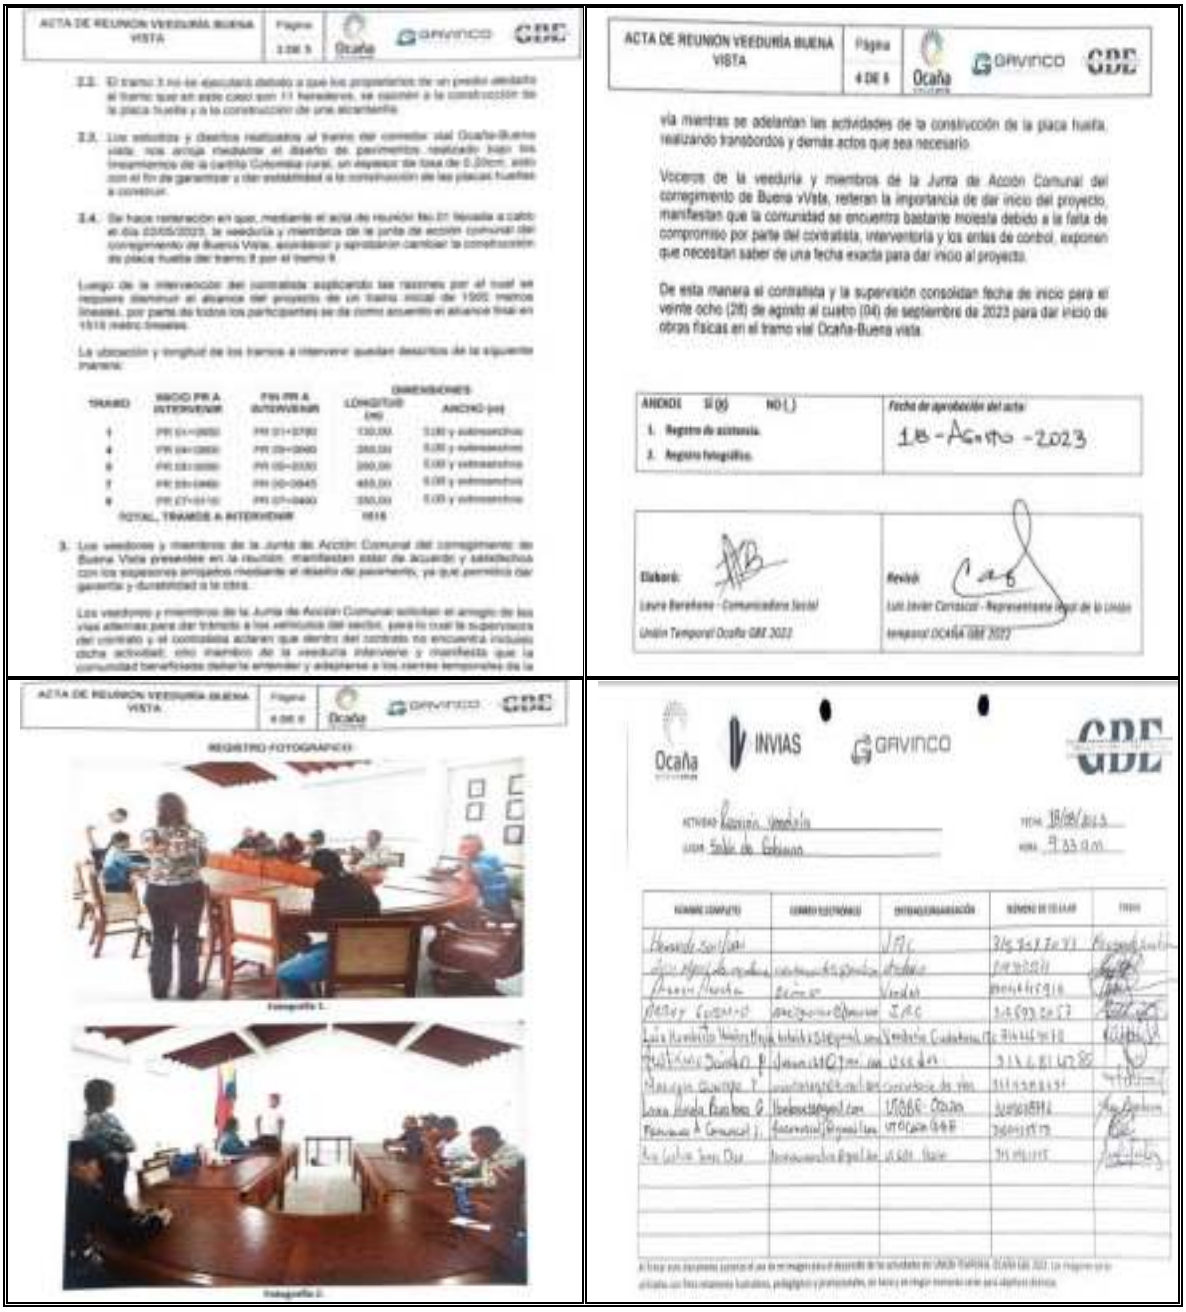

ACTA DE REUNION VEEDURÍA BUENA VISTA

Página 3 DE 5

Ocaña

GAVINCO

GBE

2.2. El tramo 3 no se ejecutará debido a que los propietarios de un predio aledaño al tramo que en este caso son 11 herederos, se opusieron a la construcción de la placa huella y a la construcción de una alcantarilla.

2.3. Los estudios y diseños realizados al tramo del corredor vial Ocaña-Buena vista nos arroja mediante el diseño de pavimentos realizado bajo los lineamientos de la cartilla Colombia rural, un espesor de losa de 0.20cm, esto con el fin de garantizar y dar estabilidad a la construcción de las placas huellas a construir.

2.4. Se hace ratificación en que, mediante el acta de reunión No.01 llevada a cabo el día 03/05/2023, la veeduría y miembros de la junta de acción comunal del corregimiento de Buena Vista, acordaron y aprobaron cambiar la construcción de placa huella del tramo 8 por el tramo 9.

Luego de la intervención del contratista explicando las razones por el cual se requiere disminuir el alcance del proyecto de un tramo inicial de 1500 metros lineales, por parte de todos los participantes se da como acuerdo el alcance final en 1515 metros lineales.

La ubicación y longitud de los tramos a intervenir quedan descritos de la siguiente manera:

TRAMO	INICIO PR A INTERVENIR	FIN PR A INTERVENIR	DIMENSIONES LONGITUD (m)	DIMENSIONES ANCHO (m)
1	PR 01+(0052)	PR 01+0792	130,00	3,00 y sobreanchos
4	PR 04+(0800)	PR 05+0040	200,00	3,00 y sobreanchos
6	PR 05+(0000)	PR 05+0320	280,00	3,00 y sobreanchos
7	PR 05+(0460)	PR 05+0845	405,00	3,00 y sobreanchos
9	PR 07+(0410)	PR 07+0460	300,00	3,00 y sobreanchos
TOTAL, TRAMOS A INTERVENIR			1515	

3. Los veedores y miembros de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Buena Vista presentes en la reunión, manifiestan estar de acuerdo y satisfechos con los espesores arrojados mediante el diseño de pavimento, ya que permitirá dar garantía y durabilidad a la obra.

Los veedores y miembros de la Junta de Acción Comunal solicitan el arreglo de las vías aledañas para dar tránsito a los vehículos del sector, para lo cual la supervisora del contrato y el contratista aclaran que dentro del contrato no encuentra incluido dicha actividad; otro miembro de la veeduría interviene y manifiesta que la comunidad beneficiaria debería entender y adaptarse a los riesgos temporales de la

ACTA DE REUNION VEEDURÍA BUENA VISTA

Página 4 DE 5

Ocaña

GAVINCO

GBE

vía mientras se adelantan las actividades de la construcción de la placa huella, realizando transbordos y demás actos que sea necesario.

Voceros de la veeduría y miembros de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Buena vVsta, reteran la importancia de dar inicio del proyecto, manifiestan que la comunidad se encuentra bastante molesta debido a la falta de compromiso por parte del contratista, interventoría y los entes de control, exponen que necesitan saber de una fecha exacta para dar inicio al proyecto.

De esta manera el contratista y la supervisión consolidan fecha de inicio para el veinte ocho (28) de agosto al cuatro (04) de septiembre de 2023 para dar inicio de obras físicas en el tramo vial Ocaña-Buena vista.

ANEXOS SI (X) NO ( )	Fecha de aprobación del acta:
1. Registro de asistencia.	18-Agosto-2023
2. Registro fotográfico.	

Elaboró:
Laura Barahona - Comunicadora Social
Unión Temporal Ocaña GBE 2022

Revisó
Luis Javier Carrascal - Representante legal de la Unión temporal OCAÑA GBE 2022

ACTA DE REUNION VEEDURÍA BUENA VISTA

Página 4 DE 5

Ocaña

GAVINCO

GBE

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografía 1.

Fotografía 2.

Ocaña

INVIAS

GAVINCO

GBE

ACTIVIDAD Reunión Veeduría

FECHA 18/08/2023

LUGAR Salón de Eventos

HORA 9:33 a.m.

NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRONICO	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	NÚMERO DE CELULAR	FIRMA

Fuente: Unión Temporal GBE.

De igual forma, son remitidos a esta Interventoría cinco (5) Certificados de Territorialidad del personal contratado del área de influencia del proyecto, ítem Mano de Obra No Calificado.

También es enviado por parte de la Unión Temporal, un Acta de Compromiso, levantada a la propiedad del señor Arbet Guerrero, quien firma el acta, otorgando el correspondiente permiso al Consorcio de utilizar los respectivos espacios de su propiedad, para el acopio de materiales pétreos y herramientas de construcción.

Ilustración 10 Acta de Compromiso.



Fuente: Unión Temporal GBE.

Lo anteriormente recibido por parte de la Unión Temporal GBE, se da gracias a las diferentes mesas de trabajo y comités realizados de manera conjunta con esta Interventoría, llegando a acuerdos para la apropiada y oportuna ejecución del Plan de Gestión Social, además de realizar la presentación de documentos de preconstrucción, para que, de esta forma, la obra inicie sin ningún inconveniente.

Esta Interventoría se encuentra a la espera que sean enviadas las correspondientes Actas de Vecindad de las diferentes unidades sociales, placa huellas existentes y unidades productivas que puedan estar dentro del corredor vial a intervenir.

3.10.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FECHA INGRESO
1	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	PROFESIONAL SST	91541702	1/08/2023
2	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1091673791	1/08/2023
3	LAURA DANIELA	PROFESIONAL SOCIAL	1091676848	1/08/2023
4	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	ING AMBIENTAL	13176940	1/08/2023
5	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE	1007912734	1/09/2023
6	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE	1091683385	1/09/2023

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 40 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 41 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 42 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizo 5 inducciones y 11 capacitaciones a los trabajadores.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	5	11

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	septiembre	0

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.10.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, se está a la espera de la subsanación de los componentes de

Geotecnia y Diseño de Pavimentos, aprobado el Diseño Hidráulico y Topografía, aprobado con observaciones el Diseño Geométrico, por otra parte, se encuentra en revisión el componente Estructural, se espera sean entregados los diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 85% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 10.747.279,15 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 12.710.317,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-007-2022 del 23-May-2023 - GIC-INVIAS-NTS-588-22 del 26-May-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-008-2022 del 29-May-2023 T1, 2, 3, 5, 7 Y 9 - Hace entrega con comunicado GBE-016-2022 del 05-Jun-2023 - T4 - GIC-INVIAS-NTS-638-22 del 08-Jun-23 - **OBSERVACIONES T1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 9** - Hace entrega con comunicado GBE-018-2022 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-722-22 del 26-Jun-23 - **OBSERVACIONES T1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 9** - Hace entrega con comunicado GBE-030-2022 del 27-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-874-22 del 09-Ago-23 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-040-2022 del 10-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-910-22 del 15-Ago-23 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-044-2022 del 17-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-945-22 del 24-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-052-2022 del 31-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1004-22 del 06-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-008-2022 del 29-May-2023 - T1, 2, 5 Y 7 - Hace entrega con comunicado GBE-016-2022 del 05-Jun-2023 - T9 - Hace entrega con comunicado GBE-017-2022 del 07-Jun-2023 - T4 - GIC-INVIAS-NTS-698-22 del 20-Jun-23 - **OBSERVACIONES T1, 2, 4, 5, 7 Y 9** - Hace entrega con comunicado GBE-026-2022 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-793-22 del 17-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-030-2022 del 27-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-874-22 del 09-Ago-23 **- OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-043-2022 del 14-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-936-22 del 18-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1082-22 del 18-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-004-2022 del 16-MaY-2023 - GIC-INVIAS-NTS-551-22 del 19-May-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23- **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-020-2022 del 22-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-730-22 del 27-Jun-23 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Hace entrega con comunicado GBE-028-2022 del 11-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-791-22 del 14-Jul-23 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-045-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-969-22 del 31-Ago-23 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 42 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción.

En el presente periodo el contratista ejecuta actividades en el tramo 5, PR 07+0110 de excavación con maquinaria (pajarita) de 0,70cm en 420m, instalación de terraplén con maquinaria (motoniveladora) en 230m, y compactación de la misma (vibro compactador), se realizan actividades de topografía, conformación de sobre anchos del corredor según diseño y liberación de capa de terraplén por densidades en el corredor vial de Buenavista Municipio de Ocaña.

Teniendo en cuenta que a la fecha se tiene la totalidad de estudios y diseños, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas).

Con corte al 30 de septiembre de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 2% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 44.842.560,00 vs un programado del 2.23% que equivale en pesos a $ 55.822.485,30.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 0.44%, lo anterior se debe a que, de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado 46 ml de Placa Huella Correspondiente al 2.5% del valor de esa actividad. Con corte al 30 de septiembre lleva ejecutado un total de 0 ml de Placa Huella, quedando aún pendiente por ejecutar 1890 ml, y mirando los tiempos que tiene el contrato se deberá construir un promedio de 31 ml diarios para llegar a los tiempos establecidos con la obra terminada al 100%.

3.11. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.
2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.
3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.
4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.
5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.
6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 10 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el Invias, de los cuales a la fecha para los municipios de Cachira, Ocaña 1814, Gobernación 1943 y Gobernación 2052 se encuentran en etapa de actualización a los Estudios y Diseños y los municipios de Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita y la Playa de Belén se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de Construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

En cuento al convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Santiago, Abrego, La Playa, Pamplonita, Ocaña 1814, Gobernació-1943, Gobernació-2052, Cachira y Herrán.

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.1.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
47	01/09/2023 al 07/09/2023
48	08/09/2023 al 14/09/2023
49	15/09/2023 al 21/09/2023
50	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 43 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.1.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos solicitada en el anexo técnico del contrato, el Contratista está usando en campo la maquinaría que se relaciona en la Tabla 44.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA 416D	CATERPILLAR 2005	-
COMPACTADOR	CATERPILLAR 2005	-
VOLQUETA VIS 104	HINO	6 m3
VOLQUETA VIS 105	HINO	6 m3
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	
CAMIONETA TRITON		

Tabla 44 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.1.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1.	MELISA CARDENAS REMOLINA	INGENIERA AUXILIAR	1090386915	ACTIVO
2.	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.005.085.614	ACTIVO
3.	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.093.293.685	ACTIVO
4.	FELIPE ANTONIO ARAQUE ACEVEDO	VIGILANTE	53.995.532	ACTIVO
5.	EUDES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	OPERADOR	1.094.166.681	ACTIVO
6.	MARLON SAUL REALES	OPERADOR	1.090.472.764	ACTIVO
7.	CRISTIAN FERNANDO CELIS	OPERADOR	1.092.156.255	ACTIVO
8.	ANYI YULIANA URBINA	AUXILIAR SST	1.005.035.950	ACTIVO
9.	JORGE ENRIQUE LATORRE	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.489.858	ACTIVO
11.	JUAN CARLOS CAMAÑO ROJAS	OFICIAL	1.093.750.998	ACTIVO
12.	LUIS ALBERTO TORRES	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.489.492	ACTIVO
13.	DAYAN ANDRES RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.091.809.209	ACTIVO
14.	FELIX GARCIAS ROJAS	OFICIAL	1.063.483.429	ACTIVO
15.	ONAEL GARCIA ROJAS	MAESTRO	7.152.840	ACTIVO

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
16.	CESAR ADRIAN PEÑARADA	CONDUCTOR	5.497.850	ACTIVO
17.	HECTOR LUIS IBARRA PINTO	ALMACENISTA	1.094.346.711	ACTIVO
18.	LUIS ALFONSO GARCIA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.007.246.565	ACTIVO
19.	OSCAR PEÑARANDA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.398.337	ACTIVO
20.	YILMER ALEXANDER ACEVEDO PRIETO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.858.928	ACTIVO
21.	VICTOR MANUEL CONTRERAS ARIAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.859.085	ACTIVO
22.	EZEQUIEL HERRERA DUARTE	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.489.639	ACTIVO
23.	DIEGO FERNANDO RIVERA PEÑA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.348.673	ACTIVO
24.	LUIS ARURO PRIETO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1094858063	ACTIVO
26	YEISON BRAYAN CAMACHO ROMERO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1091679293	ACTIVO
27	YONATHAN DAVID ARIAS BERNAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1094858027	ACTIVO
28	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL DE OBRA	11202858	ACTIVO
29	JAVIER ALFONSO CASTRO BERNAL	AYUDANTE DE OBRA	1094858979	ACTIVO
30	NAHÚN REMOLINA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	13197639	ACTIVO
31	ALEXANDER CÁCERES	CONDUCTOR	23391380	ACTIVO
32	JULIO CESAR SILVA RODRÍGUEZ	VIGILANTE	5497939	ACTIVO
33	JUAN PABLO GUZMÁN ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	13393229	ACTIVO
34	MANUEL ACONCHA CONTRERAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	88.176.344	ACTIVO
35	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL DE OBRA	1.120.564.035	ACTIVO
36	RUBEN DARIO CARDENAS NUNCIRA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.859.065	ACTIVO

Tabla 45 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.1.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de Julio de 2023.

En la tabla No. 456, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 12.17% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	OBRA	jul-23	$539,282,813.00		$ 539,282,813.00	$ -	$ 539,282,813	0	431	$ 3,891,596,842.00	$ 3,891,596,842.00
TOTALES			**$539,282,813.00**	**$0.00**	**$ 539,282,813**					**$ 3,891,596,842**	**$ 3,891,596,842**

Tabla 46 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y cortos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.1.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de septiembre de 2023, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, al presente se adjuntan los laboratorios realizados por el contratista.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	6/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	K2+090 Via Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago	1	>95%	99.43%	SI	
2	6/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	K2+160 Via Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago	2	>95%	100.65%	SI	
3	6/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	K2+030 Via Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago	3	>95%	99.67%	SI	

Tabla 47 Ensayos de Laboratorio Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.1.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024

Tabla 48 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.1.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.1.8. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.1.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
22	15/09/2023
23	27/09/2023

Tabla 49 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN.

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.2.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
39	01/09//2023 al 07/09/2023
40	08/09/2023 al 14/09/2023
41	15/09/2023 al 21/09/2023
42	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 50 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA 12 H	CATERPILLAR 2006	-
VOLQUETA VIS -106	HINO 2009	6 m3
VOLQUETA VIS-107	HINO 2009	6 m3
VIBROCOMPACTADOR CS44B	CATERPILLAR 2018	-
RETROEXCAVADORA 416	CATERPILLAR-2022	-

Tabla 51 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Herrán

4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1.	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	INGENIERO RESIDENTE	88251179	Activo
2.	LUIS BERNARDO LEON SIERRA	OBRERO	91.270.029	Activo
3.	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR MOTONIVELADORA	1.090.472.764	Activo
4.	JOSE ANGEL LAGUADO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	88.249.668	Activo
5.	PEDRO ELIAS GUALDRON CASTRO	MAESTRO DE OBRA	7.231.467	Activo
6.	JOSE LUIS SUAREZ MONTAÑEZ	OBRERO	1.094.506.433	Activo
7.	JOSE OLINTO RIVERA OLAYA	OBRERO	5.454.943	Activo
8.	MARLON MAURICIO ANGARITA VEGA	OBRERO	1.092.524.972	Activo
9.	MANUEL PABON GAFARO	OBRERO	5.455.063	Activo
10.	CARLOS EDUARDO GOMEZ SANTANDER	OBRERO	5.455.898	Activo
11.	CARMEN TEREZA DELGADO OCHOA	OBRERO	1.094.507.084	Activo

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
12.	GERSON FABIAN VEGA TORRES	OBRERO	1.004.926.733	Activo
13.	ELIAS PABON GAFARO	OBRERO	5.455.092	Activo
14.	JOSE LUIS SANCHEZ MOLINA	OBRERO	5.608.082	Activo
15.	ALVARO ENRIQUE JAIMES TORRES	OPERADOR RETROCARGADOR	88.033.628	Activo
16.	EVA SANDRIT RODRIGUEZ	AUXILIAR SST	1.093.796.994	Activo
17.	LUIS ALBERTO PIMIENTO GUALDRON	MAESTRO DE OBRA	1.993.796.994	Activo
18.	JESUS ANTONIO PABON PEÑALOZA	OBRERO	1.094.367.614	Activo
19.	JOSE ANIBAL SANCHEZ CARRILLO	OBRERO	5.470.121	Activo
20.	RAFAEL AFRANIO ESPITIA CONTRERAS	OBRERO	5.455.500	Activo

Tabla 52 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Herran

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y cortos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de septiembre de 2023, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo no se presentan ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023

Tabla 53 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
21	15/09/2023
22	28/09/2023

Tabla 54 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Herrán

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, se finalizan actividades en la construcción de Placa Huella sector la Samaritana y actividades de Parcheo y Bacheo en Juan 23. A la fecha el contratista se encuentra en proceso de liquidación del contrato.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023

Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 55 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA.

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.4.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
27	01/09/2023 al 07/09/2023
28	08/09/2023 al 14/09/2023
29	15/09/2023 al 21/09/2023
30	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 56 Reporte informes semanales Municipio de Cachira

4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tiene maquinaria y equipos en obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se ha presentado mayor tiempo seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	19/10/2022	19/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	10/11/2023

Tabla 57 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24 de enero de 2023. Se ha solicitado en el marco de los comités de obra la entrega de la Programación de acuerdo a la Prorroga 1 del contrato.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
15	07/09/2023
16	29/09/2023

Tabla 58 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO.

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, en este periodo se han realizado actividades construcción en el corredor 1 con actividades de placa huella.

4.5.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
34	01/09/2023 al 07/09/2023
35	08/09/2023 al 14/09/2023
36	15/09/2023 al 21/09/2023
37	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 59 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 60 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el Contratista ha entregado la seguridad social de los siguientes trabajadores que hacen parte de las actividades que se están ejecutando en el proyecto

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	SERGIO ARIAS	1091668650	REPRESENTANTE LEGAL
2	CLAUDIA LILIANA RANGEL PACHECO	37.334.004	ING. DIRECTOR DE OBRA
3	ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ	1.094.322.102	ING. RESIDENTE
4	JESUS YORDANO	1.064.839.591	INSPECTOR DE OBRA
5	ARBEY AURELIO MENESES	1.091.667.473	ING. RESIDENTE
6	NALLELYT GARAY G.	1.091.673.181	PROF SOCIAL
7	ANDRES ALONSO MONTAÑA	1.091.673.273	TOPOGRAFO
8	YESENIA JAIME PEREZ	60.417.386	ALMACENISTA
9	ALONSO MEJIA RODRIGUEZ	13.361.886	MAESTRO
10	WILFREDO TORO MEJIA	13.176.730	OBRERO
11	GABRIEL JOSE HERRERA ZAMORA	6.031.129	OBRERO
12	JOSE ALEJANDRO ORTIZ	1.093.060.053	OBRERO
13	JAIDER MALDONADO MORA	1.093.060.213	OBRERO
14	MARIO PEÑARANDA TORRADO	88.287.629	OBRERO
15	LUIS FERNANDO MORA LEON	1.007.670.488	OBRERO
16	YESENIA JAIME PEREZ	60.417.386	OBRERO
17	JESUS YORDANO NIZ SANCHEZ	1.064.839.591	OBRERO
18	ANDRES ALONSO MONTAÑA	1.091.673.273	OBRERO
19	ARBEY AURELIO BALLESTEROS MENESES	1.091.667.473	OBRERO
20	CLAUDIA LILIANA RANGEL PACHECO	37.334.004	OBRERO
21	NALLELYT GARAY GUERRERO	1.091.673.181	OBRERO
22	ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ	1.094.322.102	OBRERO
23	LUIS ANTONIO JAIME PEREZ	5408981	OBRERO
24	SAUL RANGELRINCON	1.005.076.476	OBRERO
25	ALVARO PAEZ GARAVITO	88287060	OBRERO
26	JESUS ANIBAL CELIS PABON	13.392.820	OBRERO
27	JAVIER ALEXANDER HERRERA ZAMORA	6.511.671	OBRERO
28	DIGNO AREVALO PEREZ	13.140.622	OBRERO
29	DANILO ANTONIO PEREZ ORTIZ	1.094.580.344	OBRERO

Tabla 61 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de Julio de 2023.

En la tabla No. 62, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 18.47% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,345,012,229	$ 3,345,012,229
TOTALES			$969,311,825.50	$0.00	$ 969,311,826					$ 3,345,012,228.5	$ 3,345,012,228.5

Tabla 62 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de septiembre de 2023, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella en el corredor 1, a continuación, se presenta el cuadro de los ensayos realizados por el Contratista.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	14/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS 3000 PSI	1	70%	73.76%	SI	Resistencia a los 7 dias
2	21/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS 3000 PSI	1	80%	101.38%	SI	Resistencia a los 14 dias
3	20/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS , CUNETAS , BORDILLO 3000 PSI	1	70%	76.63%	SI	Resistencia a los 7 dias
4	27/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS , CUNETAS , BORDILLO 3000 PSI	1	80%	85.07%	SI	Resistencia a los 14 dias
5	21/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	CICLOPEO 2000 PSI	1	70%	72.20%	SI	Resistencia a los 7 dias
6	28/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	CICLOPEO 2000 PSI	1	80%	81.57%	SI	Resistencia a los 14 dias
7	25/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS 3000 PSI	1	70%	127.08%	SI	Resistencia a los 7 dias
8	27/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS , CUNETAS , BORDILLO 3000 PSI	1	70%	76.55%	SI	Resistencia a los 7 dias
9	28/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	CICLOPEO 2000 PSI	1	70%	73.99%	SI	Resistencia a los 7 dias
10	29/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	ALCANTARILLA 3000 PSI	1	70%	71.09%	SI	Resistencia a los 7 dias

Tabla 63 Ensayos de Laboratorio Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	16/01/2023	16/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	16/01/2023	16/01/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	16/01/2023	15/09/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	16/01/2023	15/09/2023

Tabla 64 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-265-22 del 14 de febrero de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
25	15/09/2023
26	29/09/2023

Tabla 65 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA.

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. en este periodo se han realizado actividades de construcción de Placa huellas y Alcantarillas.

4.6.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
27	01/09/2023 al 07/09/2023
28	08/09/2023 al 14/09/2023
29	15/09/2023 al 21/09/2023
30	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 66 Reporte informes semanales Municipio de Playa

4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA		-
VIBROCOMPACTADOR		10 TON
MOTONIVELADORA		-
VOLQUETAS SENCILLAS	-	-

Tabla 67 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	SERGIO ARIAS	1091668650	DIRECTOR DE OBRA
2	ANNGE MARCELA ORTIZ	1004860671	INGENIERA RESIDENTE
3	URIEL MARINEZ CORONEL	88.183.921	OBRERO
4	JOSE DE DIOS TORO MARTINEZ	1.091.596.228	OBRERO
5	JESUS EMIRO TORO MARTINEZ	1.091.596.228	OBRERO
6	JHON ALEXANDER CAÑIZARES	1.091.670.140	MAESTRO
7	JHAN CARLOS BALLESTEROS	1.005.075.100	OBRERO
8	YAMID DEL CARMEN BALLESTEROS	88.183.977	OBRERO
9	JAIRO SALAZAR BALLESTROS	88.183.472	OBRERO
10	JOSE LUIS VEGA ROPERO	1.005.328.679	OBRERO

Tabla 68 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha se han realizado ensayos de laboratorio en la ejecución de actividades de Placa Huella.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/10/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>70%	78.76%	SI	Resistencia a los 7 dias Huellas
2	10/10/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>80%	92.92%	SI	Resistencia a los 14 dias Huellas
3	26/08/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>70%	71.38%	SI	Resistencia a los 7 dias Cunetas
4	2/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>80%	84.92%	SI	Resistencia a los 14 dias Cunetas

Tabla 69 Ensayos de Laboratorio Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 70 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 de abril de 2023. Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
19	07/09/2023
20	22/09/2023

Tabla 71 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huellas.

4.7.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
21	01/09/2023 al 07/09/2023
22	08/09/2023 al 14/09/2023
23	15/09/2023 al 21/09/2023
24	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 72 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita

4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 73 Maquinaría y Equipo Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	CIRO ALFONSO SIERRA JAIMES	5414762	OFICIAL
2	CARLOS RAFAEL GELVEZ PARADA	5.478.540	OBRERO
3	ANTONIO JOSE PARADA JAIMES	5.478.596	MAESTRO DE OBRA
4	CESAR DANIEL SALAZAR CONTRERAS	1.094.552.614	OBRERO
5	LEYDA MARCELA DUARTE LEAL	1.094.552.541	AUXILIAR CIVIL DE OBRA
6	ROSA LIANA HERNANDEZ MARTINEZ	1.093.786.400	AUXILIAR SST
7	CARLOS JULIO CONDE DURAN	5.418.326	OBRERO
8	LUIS HUMERTO JAIMES SIERRA	5.479.015	OBRERO
9	JOSE ABELINO MANTILLA PORTILLA	88.154.443	OBRERO
10	SAMUEL VEGA ACERO	1.094.552.218	OBRERO
11	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	88.035.343	OFICIAL
12	FERNEY ALEXANDER CONTRERAS CONTRERAS	1.094.241.559	OBRERO
13	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	1.094.552.339	OFICIAL
14	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	5.479.176	OBRERO
15	PEDRO LION SUAREZ PARADA	5.478.682	OBRERO
16	EDINSON ALEXIS CONTRERAS CONTRERAS	1.007.618.358	OBRERO
17	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	5.478.647	OBRERO
18	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	1.094.552.142	OBRERO
19	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	88.160.653	OBRERO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
20	CÉSAR ORLANDO SUÁREZ CAICEDO	1.005.012.045	OBRERO

Tabla 74 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado ensayos de laboratorio en las actividades de Obra física.

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
1	28/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	Tramo 4 - AK0+250 Pamplonita	1	>95%	92.97%	NO
2	28/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	Tramo 3 - AK0+140 Pamplonita	2	>95%	94.45%	NO
3	28/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	Tramo 3 - AK0+210 Pamplonita	3	>95%	93.84%	NO

Tabla 75 Ensayos de Laboratorio Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	29/03/2023	29/09/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	29/03/2023	29/09/2026
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	29/03/2023	29/09/2023

Tabla 76 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-789-22 el 14 de julio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones

La programación queda aprobada por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
11	07/09/2023
12	15/09/2023
13	28/09/2023

Tabla 77 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños, levantamiento topográfico, actividades de geotecnia, actividades de mejoramiento y Construcción de Placa Huella.

4.8.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
22	01/09/2023 al 07/09/2023
23	08/09/2023 al 14/09/2023
24	15/09/2023 al 21/09/2023
25	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 78 Reporte informes semanales Gobernación 1943

4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 79 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo
1	HECTOR FABIO ACOSTA GARCIA	1090423766	AUXILIAR CONTABLE
2	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	1090393766	RESIDENTE DE OBRA
3	FRANKLYN AARON GIRALDO COLLANTES	79685180	COORDINADOR DE LOGISTICA
4	LEIDY YULIANA JAIME TRILLOS	1091664068	INGENIERA AUXILIAR
5	LUIS RAMÓN NUÑEZ SILVA	1094426602	INSPECTOR DE OBRA
6	WILLIAM PABÓN QUINTERO	13278653	DIRECTOR DE OBRA
7	ANDREY ALEXIS CALDERON RODRIGUEZ	888219891	RESPONSABLE SST
8	LEIDY PAOLA GALVIS DIAZ	1004941599	AUXILIAR SST
9	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	88261502	OPERADOR DE MAQUINARIA
10	NELSON ENRIQUE MENDOZA	1094426430	OPERADOR DE MAQUINARIA
11	EDGAR CAMILO PRADO	1193215481	OPERADOR DE MAQUINARIA
12	LUISA FERNANDA OCHOA SERRANO	1091183372	INGENIERA AUXILIAR
13	ALFONSO PEREZ	1094858016	CLASIFICADOR DE MATERIAL
14	JORGE OLIVO	1092335326	CLASIFICADOR DE MATERIAL
15	JESUS ROMARIO CARDENAS	1094427851	MECANICO
16	DANIEL FERNANDO MANCIPE JAIMES	1092647041	AYUDANTE DE OBRA
17	LEYDI ROCIO DIAZ	1094506728	CONTROLADOR VIAL
18	JOSE GREGORIO MONCADA	596983	AYUDANTE DE OBRA
19	ASTRID LEON	60372439	RESIDENTE DE OBRA
20	FELIX ANTONIO VARGAS	91207328	OPERADOR DE MAQUINARIA
21	JORGE ELIECER CASTRILLON	88312144	ALMACENISTA
22	JOSE ALFREDO VEGA	1092154858	AYUDANTE DE OBRA
23	HENRY HOMERO SILVA	1098819129	OPERADOR DE MAQUINARIA
24	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	1005057039	OPERADOR DE MAQUINARIA
25	JUNIOR ANTONIO LIZARAZO	1092349589	OPERADOR
26	WILLIAN CANANCIA	1090464619	OPERADOR
27	JOSE ALGEMIRO ROZO	13412947	AYUDANTE DE OBRA
28	JESUS ROMARIO CARDENAS	88269870	AYUDANDE DE OBRA
29	JESUS MARIA BOTELLO	88269870	AYUDANTE DE OBRA
30	HENRY AGUILLON	5455903	AYUDANTE DE OBRA
31	JUAN CARLOS IBARRA	88168951	AYUDANTE DE OBRA
32	WILLIAM BAUTISTA	1005543179	AYUDANTE DE OBRA
33	NELSON EDUARDO HERNANDEZ	1005037995	AYUDANTE DE OBRA
34	ESTHER BELTRAN	1090508130	RESIDENTE SISO PATIOS
35	GEOVANNY ROJAS SANCHEZ	1090515100	ALMACENISTA PATIOS
36	ANGIE STELLA DUARTE SANCHEZ	1090508619	AUXILIAR CONTABLE
37	BRAYAN ALBERTO AVELLANEDA FUENTES	1094427498	RESIDENTE DE OBRA
38	BRAYAN FABIAN OROZTEGUI	1116810907	CONDUCTOR
39	DARWIN JOSE MORA GARCIA	1093772039	CONDUCTOR
40	CAROLINA SANDOVAL	1094427375	ALMACENISTA
41	HENRY AGUILLON	5455903	AYUDANTE DE OBRA
42	WILMER BARBOSA	1092343929	OPERADOR DE MAQUINARIA

No.	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo
43	JOSE HELI MENDEZ BELTRAN	1093885115	OPERADOR DE MAQUINARIA
44	JAIME ALBERTO SOTO VEGA	1004923979	AYUDANTEDE OBRA
45	JACKSON DAVID SUAREZ	1005028380	OPERADOR DE MAQUINARIA

Tabla 80 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023

Tabla 81 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra observado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25 de Julio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
14	07/09/2023
15	25/09/2023
16	28/09/2023

Tabla 82 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños.

4.9.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
17	01/09/2023 al 07/09/2023
18	08/09/2023 al 14/09/2023
19	15/09/2023 al 21/09/2023
20	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 83 Reporte informes semanales Gobernación 2052

4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-728-22 del 27 de junio de 2023. No se ha dado inicio a obra física.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, ya que no se ha iniciado ejecución física del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023

Tabla 84 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el plan de calidad presentada por el contratista se encuentra aprobado con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09 de junio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra observada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-810-22 del 19 de julio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
9	07/09/2023
10	22/09/2023

Tabla 85 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052

4.10. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER., en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se da inicio de obra física.

4.10.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
18	01/09/2023 al 07/09/2023
19	08/09/2023 al 14/09/2023
20	15/09/2023 al 21/09/2023
21	22/09/2023 al 28/09/2023

Tabla 86 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023. El contratista está realizando actividades de excavación e instalación de Terraplen.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		

Tabla 87 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	13363842	1/08/2023
2	EINER JESUS CAMAÑO	1065821078	1/08/2023
3	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	91541702	1/08/2023
4	LUIS CARLOS TAMAYO OCHOA	1091654453	25/08/2023
5	FERNANDO ALFONSO CARRASCAL	1091671813	25/08/2023
6	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	1091673791	1/08/2023
7	LAURA DANIELA	1091676848	1/08/2023
8	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	13176940	1/08/2023
9	CARLOS ALBERTO NAVARRO	1007912734	1/09/2023
10	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	1091683385	1/09/2023

Tabla 88 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha se inician actividades de Obra física el 28 de agosto, por lo tanto, se han realizado los siguientes ensayos de laboratorio por parte del Contratista.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	25/09/2023	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	TRAMO 5	1	>95%	96,3%	SI	PR 07+475
2	25/09/2023	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	TRAMO 5	1	>95%	99,4%	SI	PR 07+380

Tabla 89 Ensayos de Laboratorio del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 90 Garantías Municipio de Ocaña 1814

4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de Mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista no ha presentado Programación de obra.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
14	15/09/2023
15	22/09/2023

Tabla 91 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Valor Adición:	-
Valor Total:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 92 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-979-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la interventoría hace observaciones de acuerdo a la visita realizada referente al área SST.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría da respuesta al comunicado enviado por el contratista en el cual indican la justificación técnica de la no instalación de Subbase granular, dentro del cual la Interventoría manifiesta no estar de acuerdo con este cambio, sin embargo, dado que ya se encuentra construida la Placa Huella este tramo en mención se dejará en observación.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1029-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría envía informe técnico respecto a la no instalación de Subbase Granular en el tramo entre las abscisas K2+710 al K2+753.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1032-22 del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la Implementación de los proyectos sociales en el área de Influencia.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1038-22 del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a los Informes mensuales del componente Ambiental de los periodos de Noviembre de 2022 a Mayo de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1040-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría hace Observaciones a los informes mensuales ambientales de los periodos de Junio a agosto de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1060-22 del pasado 14 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al municipio y contratista la asistencia a los comités de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1065-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita se entregue un plan de contingencia teniendo en cuenta el atraso en la ejecución de las obras contratadas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1077-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al municipio la entrega de las actas de aprobación de las Pólizas del contrato de obra.

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha solicitado al INVIAS la aprobación para ingresar a laborar del Inspector de Obra con dedicación del 100% mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1114-22 del 27 de septiembre de 2023 quien a la fecha no ha dado respuesta a esta solicitud.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen

detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-985-22 del pasado 01 septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PAGA presentado por el Contratista de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-991-22 del pasado 02 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Contratista la Entrega de los ensayos de laboratorio realizados como seguimiento al Plan de Calidad del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-999-22 del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a la programación de Obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1014-22 del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Balance de obra presentado.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1035-22 del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Contratista la Implementación de los programas sociales en el área de influencia del proyecto.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1039-22 del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a los informes ambientales de los periodos de noviembre de 2022 a mayo de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1041-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a los informes ambientales de los periodos de junio a agosto de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1071-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la programación de obra del proyecto.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1092-22 del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Balance de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1108-22 del pasado 25 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Contratista la entrega de planillas de seguridad social de agosto de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1120-22 del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría envía aprobada el Acta Modificatorio 1 del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1031-22 del pasado 25 de septiembre de 2023, la Interventoría envío incumplimiento por la no entrega de informes mensuales SST.

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1096-22 del pasado 07 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la entrega inmediata del PAGA.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-899-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Municipio la entrega de las actas de aprobación de pólizas y las pólizas del contrato.

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1012-22 del pasado 06 septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Balance presentado por el Contratista de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1023-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría remite al Municipio el informe del estado actual del contrato de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1033-22 del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista el cumplimiento en la entrega de la documentación referente a la programación de obra del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1058-22 del pasado 14 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Municipio y Contratista la asistencia a los comités de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1079-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Municipio la entrega de las actas de aprobación de las pólizas y entrega de la misma.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1096-22 del pasado 20 de septiembre de 2023, la Interventoría remite nuevamente al Municipio el informe del estado actual del contrato de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-1112-22 del pasado 20 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita por segunda vez la entrega de la programación se obra y flujo de caja.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: E**l Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado entregas de los componentes de Topografía y Diseño Geométrico que se encuentra aprobado con observaciones, el componente Hidráulico, Estructural, Geotecnia y Pavimentos se encuentra aprobado, se da orden de inicio a las obras el 10 de agosto de 2023, pero a la fecha el contratista no ha iniciado la ejecución de las mismas.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-981-22 del pasado 01 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación al Plan de Contingencia presentado por el Contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-990-22 del pasado 01 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a la programación de ora de acuerdo a la prórroga 1 y adicción 1 del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1010-22 del pasado 09 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PAGA del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1080-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Municipio la entrega de las actas de aprobación de las pólizas y entrega de la misma.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1088-22 del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de la alcantarilla del Pr 7+410.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1090-22 del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a los informes mensuales ambientales del periodo del Enero a agosto de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1098-22 del pasado 22 de septiembre de 2023, la Interventoría da su concepto sobre la entrega de RCD a la comunidad.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del pasado 22 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a la Topografía del corredor 1.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1105-22 del pasado 22 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al cambio de estructura de la Alcantarilla del chorro 1 y 2.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del pasado 25 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación al cambio de estructura de la Alcantarilla del chorro 1 y 2.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación al PAGA del proyecto.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado entregas de los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2, Estudio de suelos y Diseño de Pavimentos del Corredor 1 y 2, y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, de los cuales se tienen aprobados con observaciones, aprobados Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Bitácora con reportes diarios.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-984-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PAGA.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-993-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al municipio su concepto referente a la prórroga del contrato de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1016-22 del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría da concepto aprobatorio a la prórroga solicitada por el Contratista y el Municipio.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1055-22 del pasado 14 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a la programación y flujo de caja de acuerdo a la prórroga 1.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1081-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Municipio la entrega de las actas de aprobación de las pólizas y entrega de la misma.

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el estado de los diseños es el siguiente; aprobados con observaciones Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha solicitado al INVIAS la aprobación para ingresar a laborar del Inspector de Obra con dedicación del 100% mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1103-22 del 22 de septiembre de 2023 quien a la fecha no ha dado respuesta a esta solicitud.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-980-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a la implementación del SG-SST de acuerdo a visita realizada.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-986-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PAGA.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-989-22 del pasado 01 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación al SG-SST

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-995-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la entrega de certificación de presencia o no de grupos étnicos o afrodescendientes en el área de influencia del proyecto, obra o actividad.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-994-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la entrega de información y programación de contratación de mano de obra

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-996-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al Contratista la entrega de los informes mensuales y trimestrales de seguimiento al PAGA.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1013-22 del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Balance de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1028-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría envía informe técnico de acuerdo a la visita realizada a campo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1036-22 del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la implementación de los programas sociales en la zona de influencia del proyecto.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1042-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a los informes ambientales del periodo de mayo a julio de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1043-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a los informes ambientales del periodo de agosto de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1059-22 del pasado 14 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita el cumplimiento de asistencia a los comités de seguimiento al contrato de obra 202 de 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1066-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la entrega de un Plan de Contingencia teniendo en cuenta los atrasos presentados en la ejecución del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1078-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita pólizas del contrato de obra y actas de aprobación de pólizas por parte del Municipio.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1089-22 del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación al SG-SST.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado entregas de los componentes de Topografía, Estudio de suelos, Estructural y Diseño Hidráulico se encuentran aprobados, Diseño Geométrico se encuentra aprobado con observaciones, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Bitácora con reportes diarios.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la Interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-982-22 del pasado 01 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a las instalaciones provisionales del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-997-22 del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la entrega de memorias técnicas iniciales y puntos de intervención para los ítem de conformación de la calzada y mejoramiento de la subrasante.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de pavimentos de la vereda Chicagua Bajo presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de pavimentos de la vereda Potreros presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de pavimentos de la vereda Volcan presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de pavimentos de la vereda Corozal California presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de pavimentos de la vereda Boyaca presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del pasado 07 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Diseño de Geométrico de la vereda Chicagua Alto presentado por el contratista

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del pasado 07 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a la Topografía de la vereda Chicagua presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a la Topografía de la vereda Rinconada presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a la Topografía de la vereda Potreros presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a la Topografía de la vereda Helechar presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1027-22 del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría presenta la relación del estado actual del componente de revisión y/o complementación Estudios y Diseños y solicitud de entrega de plan de contingencia.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Diseño de Geométrico de la vereda Corozal California presentado por el contratista

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del pasado 14 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Diseño Hidráulico de la vereda Chicagua Bajo presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de Pavimentos de la vereda Corozal California presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de Pavimentos de la vereda San Isidro presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de Pavimentos de la vereda Santa Anita presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1067-22 del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PAGA del proyecto.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1069-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PMT del municipio de los Patios.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1070-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PMT del municipio de Gramalote.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1074-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita a la gobernación las pólizas del contrato de obra y actas de aprobación de pólizas por parte del municipio.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño de Pavimentos de la vereda Santo Domingo y Rinconada presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1087-22 del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la localización de puntos de referencia en tramos a intervenir y verificación de diseños.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1091-22 del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la ubicación de obra de drenaje tipo alcantarillas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del pasado 25 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la entrega de memorias técnicas iniciales y puntos de intervención para los ítems de conformación de la calzada y mejoramiento de la subrasante.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del pasado 26 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Diseño Geométrico de la Vereda Santo Domingo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del pasado 22 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación con observaciones al Diseño Geométrico de la Vereda Boyaca.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del pasado 22 de septiembre de 2023, la Interventoría envía observaciones al Diseño Estructural entregado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1110-22 del pasado 25 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la entrega de memorias técnicas iniciales y puntos de intervención para los ítems de conformación de la calzada y mejoramiento de la subrasante.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del pasado 26 de septiembre de 2023, la Interventoría realiza observaciones a la ejecución de las obras en la vereda Corozal California.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones a la Topografía de la vereda Helechar.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación con observaciones al Diseño Geométrico de la vereda Rinconada.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1123A-22 del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Diseño Geométrico de la vereda Helechar.

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El contratista a la fecha ha realizado entrega de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (El contratista presento solo un documento entregado para la totalidad de corredores a intervenir, el cual fue observado), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada). donde se continúan emitiendo observaciones por los especialistas de la interventoría y hasta la fecha la subsanación de los mismo no ha sido concurrente por parte del contratista, lo cual continúa generando retrasos en la etapa de estudios y diseños, por tanto, esta actividad corresponde a un 65,3% de acuerdo a las presentaciones parciales entregadas de los mismos.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-983-22, del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al SG-SST.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1030-22, del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación con observaciones del Diseño Geométrico.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1048-22, del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita la entrega de los demás componentes de estudios y diseños al contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1049-22, del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría envía al contratista el estado actual de estudios y diseños.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1056-22, del pasado 14 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la presencia en los comités de seguimiento de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1061-22, del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría aprueba los informes mensuales del componente ambiental.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1062-22, del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al Diseño de Pavimentos.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1075-22, del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita a la Gobernación las pólizas del contrato de obra y actas de aprobación de pólizas por parte del municipio.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1095-22, del pasado 25 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita al contratista la localización de puntos de referencia en tramos a intervenir y verificación de diseños.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía se encuentran observados en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Hidráulico no ha sido presentado a la fecha.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1000-22, del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación al flujo de caja.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1004-22, del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación con observaciones a la Topografía del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1020-22, del pasado 08 de septiembre de 2023, la Interventoría hace observaciones al PAGA.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22, del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación a la topografía.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1073-22, del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría Solicita al Municipio las pólizas del contrato de obra y actas de aprobación de pólizas por parte del Municipio.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1082-22, del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría da aprobación con observaciones al Diseño Geométrico.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1094-22, del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría da viabilidad al cambio de los tramos 1 y 5 de acuerdo a la solicitud del contratista baso en la solicitud de la comunidad.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1099-22, del pasado 26 de septiembre de 2023, la Interventoría envía recomendaciones para la entrega del informe mensual SST.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el

periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Topografía, Hidráulico y Geotécnico se encuentran aprobados, Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-978-22, del pasado 01 de septiembre de 2023, la Interventoría remite los informes semanales de interventoría del 18 de agosto al 24 de agosto de 2023.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-987-22, del pasado 01 de septiembre de 2023, la Interventoría Solicita ingreso a laborar director de Interventoría.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-998-22, del pasado 04 de septiembre de 2023, la Interventoría hace remisión de la Hoja de Vida Ingeniero Auxiliar de Interventoría – Ing. Diego Camargo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1002-22, del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría remite los informes semanales de Interventoría.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1015-22, del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría remite informe ejecutivo trazabilidad municipio de Cachira.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1017-22, del pasado 06 de septiembre de 2023, la Interventoría hace solicitud ingreso a laborar inspectores de Cachira y Pamplonita.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1018-22, del pasado 05 de septiembre de 2023, la Interventoría da Alcance al Acta de costos he Informe mensual No. 10 de Interventoría correspondientes al periodo de JUNIO de 2023, atendiendo observaciones realizadas por la Territorial Nte de Santander.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1031-22, del pasado 11 de septiembre de 2023, la Interventoría da respuesta a oficio 2023S-VNSA-002851, recibido el 07 septiembre de 2023, con asunto reiteración acciones contrato de obra no. 02590 del 2022 - INVIAS

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1050-22, del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría da respuesta al radicado 2023S-VNSA-002850 del 07 septiembre de 2023 – Cachira.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1053-22, del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría remite los informes semanales de Interventoría.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1054-22, del pasado 13 de septiembre de 2023, la Interventoría solicita ingreso inspector municipio de los patios y arboledas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1068-22, del pasado 15 de septiembre de 2023, la Interventoría remite Acta de costos he Informe mensual No. 11 de Interventoría correspondientes al periodo de JULIO de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1083-22, del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría hace remisión de devolución de rendimientos financieros periodo agosto 2023 – municipio de Abrego – Convenio 1791 de 2021.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1085-22, del pasado 18 de septiembre de 2023, la Interventoría hace remisión de devolución de rendimientos financieros periodo de diciembre 2021 a abril 2023 – Gobernación 1943 – Convenio 1943 de 2021

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1093-22, del pasado 19 de septiembre de 2023, la Interventoría hace Remisión Hoja de Vida Residente de Interventoría – Ing. Rafael Carrero y Profesional Social – Melissa Rojas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1097-22, del pasado 20 de septiembre de 2023, la Interventoría remite los informes semanales de interventoría.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1103-22, del pasado 22 de septiembre de 2023, la Interventoría hace solicitud ingreso inspector municipio de la playa.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1114-22, del pasado 27 de septiembre de 2023, la Interventoría hace solicitud ingreso inspector municipio de la Santiago.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1115-22, del pasado 27 de septiembre de 2023, la Interventoría hace remisión informes semanales de interventoría.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1117-22, del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría hace reiteración oficios GIC-INVIAS-NTS-332-22 y GIC-INVIAS-NTS-521-22; entrega plan de inversión del anticipo para el Cto.1053 de 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1117-22, del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría remite Acta de costos he Informe mensual No. 12 de Interventoría correspondientes al periodo de AGOSTO de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1141-22, del pasado 29 de septiembre de 2023, la Interventoría remite informes semanales de interventoría.

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.

- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.

- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Ocaña 1814, Pamplonita, La Playa de Belén, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago y Gobernación 1943.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña en las actividades de Parcheo y Bacheo, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, La Playa de Belén y Herrán en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.

- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.

- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al Invias las cuentas que se describen en la Tabla No. 93.

CONTROL FINANCIERO						
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA
1	sep-22	$ -	-	-		-
2	oct-22	$ 18,224,516.80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023
3	nov-22	$ 21,768,789.00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-
5	ene-23	$ 133,892,136.00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023
6	feb-23	$ 143,926,977.60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (notacredito)- 24/05/2023 FE516 (RADICADA)- 26/05/2023
7	mar-23	$ 188,412,604.80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023
8	abr-23	$ 143,904,748.40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023
9	may-23	$ 127,024,217.60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023
10	jun-23	$ 152,688,662.00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023
11	jul-23	$ 163,215,045.00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	FACTURA DEFINITIVA	FE599 del 24/10/2023
12	ago-23	$ 165,630,388.00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	FACTURA DEFINITIVA	FE603 del 27/10/2023

Tabla 93 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales.

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster OROCH	JNL 995	DT-NSA 41796 - 20-07-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%

Tabla 94 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

Profesional	Especialidad	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Jairo Andres Quintero Gómez	Director de Interventoría	2023S-VNSA-002845 -07-09-2023	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	SVR 55685 - 15-09-2022	100%
Rosana del Pilar Mattos Parra	Residente Interventoría	SVR 55685 - 15-09-2022	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	SVR 31130 - 31-05-2023	100%
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Residente Auxiliar De Interventoría	SVR 15670 - 17-03-2023	100%
Katherine Navarro Carrascal	Profesional Ambiental	SVR 7374 - 13-02-2023	100%
Anuar Jesith Cabarcas Carrascal	Profesional Social	SVR 7374 - 13-02-2023	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	SVR 68051 - 03-11-2022	95%
Felipe Stand	Especialista en Estructuras	SVR 74180 - 01-12-2022	26%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	SVR 77764 - 16-12-2022	26%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	SVR 77764 - 16-12-2022	16%
Jairo Zorro	Especialista Hidráulico	SVR 60514 - 04-10-2022	14%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	SVR 15670 - 17-03-2023	24%

Profesional	Especialidad	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Diana Aponte	Especialista de Pavimentos	SVR 36953 - 28-06-2023	28%
Rubiela Molina Cortes	Inspectora SST	DT-NSA 76487 - 12-12-2022	100%
Fanny Amaya Gómez	Secretaria	DT-NSA 65465 - 24-10-2022	100%
Wilmer Salazar García	Conductor	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
William Luna Melo	Conductor	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Jesus Manuel Silva Martinez	Conductor	DT-NSA 41796 - 20-07-2023	100%
Luis Eduardo Estupiñán González	Inspector de Intv. Ocaña 1758	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Nicolas Mazo Rodriguez	Inspector de Intv. Abrego	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector de Intv. Herran	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%

Tabla 95 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
Acta No.	**Mes/Año de Ejecución**	**Valor Acta sin IVA**	**Valor IVA**	**Valor Total Ejecutado Acumulado Acta**	**Saldo Registro Presupuestal**	**Saldo del Contrato**	**No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS**
1	sep-22	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ 4.288.164.910,00	-
2	oct-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	$ 21.775.483,20	$ 4.269.940.393,20	135914 de 13/12/2022
3	nov-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	$ 6.694,20	$ 4.248.171.604,20	138491 de 16/12/2022
4	Dic-22	$ -	$ -	$ -	$ 6.694,20	$ 4.248.171.604,20	30405 de 28/03/2023
5	Ene-23	$ 5.625.38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	$ -	$ 4.248.164.910,00	30405 de 28/03/2023
5	Ene-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	$ 1.636.114.558,20	$ 4.114.279.468,20	30405 de 28/03/2023
6	Feb-23	$ 120.947.040,00	$22.979.937,60	$143.926.977,60	$ 1,492,187,580.60	$ 3,970,352,490.60	51262 del 24/05/2023
7	Mar-23	$ 158.329.920	$ 30.028684,80	$ 188.412.604.80	$ 1,303,774,975.80	$ 3,781,939,885.80	80426 de 22/08/2023
8	Abr-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,00	$ 1,159,870,227.40	$ 3,638,035,137.40	80425 de 22/08/2023
9	May-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$127.024.217,60	$ 1,032,846,009.80	$ 3,511,010,919.80	81576 de 13/09/2023
10	Jun-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	$ 880,157,347.80	$ 3,358,322,257.80	82864 el 10/10/2023
11	Jul-23	$ 137.403.300,00	$ 26.106.627,00	$ 163.215.045,00	$ 716,942,302.80	$ 3,195,107,212.80	83561 el 24/10/2023
12	Ago-23	$ 139.610.000,00	$ 26.525.900,00	$ 166.135.900,00	$ 550,806,402.80	$ 3,028,971,312.80	83750 el 27/10/2023
TOTALES		**$ 782.464.180,00**	**$ 148.668.194,20**	**$ 931.132.374,20**	**$ 550.806.402,80**	**$ 3.028.971.312.80**	

Tabla 96 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029

Tabla 97 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán y Pamplonita por lo cual se anexa la Bitácora que se relaciona a continuación:

1. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de Santiago.
2. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de Abrego.
3. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de Herran.
4. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de Pamplonita.
5. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de La Playa de Belén.
6. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de Gobernación 1943.
7. Bitácora mes de Septiembre de 2023 Municipio de Ocaña 1814.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el presente periodo que representa el mes No. 12 de obra, dentro del contrato se ha logrado dar orden de inicio a 10 de los 11 convenios interadministrativos, correspondientes a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943 y Gobernación 2052. Se encuentran adjudicado el convenio Interadministrativo de Gobernación 2033 el cual se encuentran a la espera de la orden de inicio del contrato.

En el municipio de Ocaña 1758 se firmó acta de inicio el pasado 01 de noviembre de 2022, contrato finalizado el 31 de julio de 2023 con la construcción de 1 Alcantarilla y 520 ml de Placa Huella, además se realzaron actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII, en el periodo de septiembre el contratista se encuentra realizando actividades de liquidación del contrato.

En cuanto a los municipios que se encuentran en ejecución, el Municipio de Santiago firmo acta de inicio el pasado 18 de octubre de 2022, ya se cuenta con aprobación de la actualización de estudios y diseños, quedando pendiente por subsanar el componente de Topografía el cual está aprobado con observaciones; a la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 33.70% esto se debe al atraso en el inicio de las actividades de la etapa de construcción de Placa Huellas y Alcantarillas del Proyecto. Por otra parte, la Territorial del Norte de Santander emite un comunicado mencionando la no objeción frente a la solicitud del reconocimiento de los acarreos y traslada la solicitud a la Subdirección de vías Regionales para que se permita dar sus comentarios respectivos como unidades ejecutoras del contrato, durante el periodo el contratista ha realizado actividades de construcción de Placa Huellas pero no al ritmo deseado por lo cual se le solicita al contratista en comités de obra mejorar los rendimientos y la calidad de los terminados, además de remitir a la interventoría un plan de contingencia para mitigar los atrasos presentados.

En el municipio de Herrán se encuentra en ejecución, el Municipio de Herran firmo acta de inicio el pasado 19 de octubre de 2022, ya se cuenta con aprobación de la actualización de estudios y diseños, quedando pendiente por subsanar el componente de Topografía y Diseño Geométrico el cual está aprobado con observaciones; reinicio el pasado 10 de junio de 2023 luego de superados los inconvenientes que dieron lugar a la misma, a la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 27.29% esto se debe al atraso en el inicio de las actividades por parte del contratista. Durante la ejecución del proyecto se ha realizado seguimiento en campo a las actividades ejecutadas, así como la inspección de los componentes ambientales, sociales y SST. Por otra parte, se ha solicitado la entrega de un plan de contingencia para mitigar los atrasos presentados.

En el municipio de Cáchira se encuentra en ejecución, el Municipio de Cachira firmo acta de inicio el pasado 16 de noviembre de 2022, ya se cuenta con aprobación de la mayoría de los componentes de la actualización de estudios y diseños, quedando pendiente por

subsanar el componente de Topografía y Diseño Geométrico el cual está aprobado con observaciones; a la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 58.46% esto se debe al atraso en el inicio de las actividades por parte del contratista y a la no entrega de la reprogramación de acuerdo a la Prorroga 1 del contrato.

En el municipio de Abrego se firmó acta de inicio el pasado 16 de enero de 2023, el contratista ya cuenta con aprobación de los Estudios y Diseños, los cuales se encuentran en el siguiente estado; Topografía y Diseño Geométrico Aprobado con Observaciones, Geotecnia, Estructural, y Diseño Hidráulico Aprobado y Diseño de Pavimentos se encuentra Observado. a la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 18.09%, esto se debe a la falta de ejecución de obras en el corredor 2 debido a la emergencia del Rio Tarra, además el contratista realizó la ejecución en la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas de los tramos del corredor 1. Durante la ejecución del proyecto se ha realizado seguimiento en campo a las actividades ejecutadas, así como la inspección de los componentes ambientales, sociales y SST.

En el municipio de la Playa de Belén se firmó acta de inicio el pasado 06 de marzo de 2023, el contratista ya cuenta con aprobación de los Estudios y Diseños, los cuales se encuentran en el siguiente estado; Diseño Geométrico Aprobado con Observaciones, Topografía, Geotecnia, Estructural, Diseño Hidráulico y Diseño de Pavimentos se encuentran Aprobado. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 6.12%, esto se debe a la falta de inicio de obra física del proyecto, además el contratista y tendría que tener en ejecución la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas del corredor 1 y 2. Se ha solicitado en comités de obra la entrega de un Plan de Contingencia con el fin de minimizar el atraso presentado.

En el municipio de Pamplonita se firmó acta de inicio el pasado 14 de abril de 2023, el contratista ya cuenta con aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños, los cuales se encuentran en el siguiente estado; Diseño Geométrico Aprobado con Observaciones, Topografía, Geotecnia y Estructural se encuentran Aprobados y Diseño Hidráulico y Diseño de Pavimentos presentan observaciones. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 66.24%, esto se debe a que el contratista y tendría que tener en ejecución la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas. Durante la ejecución del proyecto se ha realizado seguimiento en campo a las actividades ejecutadas, así como la inspección de los componentes ambientales, sociales y SST.

En el contrato de la Gobernación 1943 se firmó acta de inicio el pasado 10 de abril de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 30.52%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto que a la fecha ya tendrían que estar en un avance del 100%. Además, no se ha dado inicio a la ejecución de Placa Huellas y Alcantarillas.

En el contrato de la Gobernación 2052 se firmó acta de inicio el pasado 11 de mayo de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños los cuales han sido observados. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 55.55%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto que a la fecha ya tendrían que estar en un avance del 100%. Además, no se ha dado inicio a la ejecución de Placa Huellas y Alcantarillas.

En el municipio de Ocaña 1814 se firmó acta de inicio el pasado 02 de mayo de 2023, el contratista ya cuenta con aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños, los cuales se encuentran en el siguiente estado; Geotecnia y Diseño Hidráulico se encuentran Aprobados, Topografía y Diseño Geométrico aprobado con observaciones, Diseño de Pavimentos, Estructural presentan observaciones. Es importante mencionar que la interventoría durante el mes realizo actividades de toma de ensayos de CBR para verificar los resultados del contratista encontrando CBR mayores y que cumplen para estructuras inferiores a la propuesta, por lo cual la interventoría solicita al contratista el ajuste del diseño de pavimentos de acuerdo a estos resultaos. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 0.44%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto que a la fecha ya tendrían que estar en un avance del 100%. Además, al lento inicio en la ejecución de Placa Huellas y Alcantarillas.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033 se espera dar inicio a su ejecución en el mes de septiembre de 2023, toda vez que sea superado el proceso de legalización de contratos de obra y entrega de pólizas a las entidades municipales.

Para la Interventoría es importante la entrega de los documentos de estudios y diseños de los municipios que a la fecha se encuentran en ejecución, y recomienda a los contratistas tomar medidas que permitan agilizar las actividades correspondientes a esta etapa, para dar cumplimiento con la fecha de terminación estipulada en los contratos de obra. De igual manera se ha realizado seguimiento a los contratos que se encuentran adjudicados con el fin de que se dé su inicio de ejecución en los tiempos establecidos y sin contratiempo.

Por otra parte, se ha solicitado a los contratistas de obra que a la fecha presentan atrasos en sus contratos la entrega de planes de contingencia con el fin de minimizar los atrasos presentado y poder terminar el contrato en los términos establecidos por las entidades municipales.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 12 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 18/10/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 438,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.430.879.655,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.430.879.655,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	4497
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	12
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	440	1000
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas			
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.430.879.655,00		$ 4.430.879.655,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 443.087.966,00	84.186.713,54	$ 527.274.679,54
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 443.087.966,00		$ 443.087.966,00
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.317.055.587,00	$ 84.186.713,54	**$ 5.401.242.300,54**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 978.444.100,91		$ 978.444.100,91	$ 978.444.100,91
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 43.377.470,77	$ 8.241.719,45	$ 51.619.190,22	$ 51.619.190,22
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.030.063.291,13**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 5.401.242.300,54
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.030.063.291,13
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 19,07%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **35**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA PAÑO COMPLETO



FUNDIDA DE HUELLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. LP-OP-01-2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA 416 D	CATERPILLAR 200 5		SANTIAGO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR-2005		SANTIAGO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA VIS 104	HINO	6M3	SANTIAGO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA VIS 105	HINO	6M3	SANTIAGO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		SANTIAGO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
CAMIONETA TRIPTON			SANTIAGO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	
TOTAL ACTIVO				6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	156	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	156	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma

Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	MELISA CARDENAS REMOLINA	1090386915	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27873194	$ 46.400	PROTECCIÓN	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
2.	YORDAN ALEXANDER CACERES RONDON	1.005.058.758	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
3.	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	1.005.085.614	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS	27873194	$ 46.400	PROTECCIÓN	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
4.	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	1.093.293.685	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COMFAORIENTE	27873194	$ 46.400	PROTECCIÓN	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
5.	FELIPE ANTONIO ARAQUE ACEVEDO	53.995.532	VIGILANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD	27873194	$ 46.400	PROTECCIÓN	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
6.	EUDES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	1.094.166.681	OPERADOR	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXPONENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD	71483234	$ 46.400	PORVENIR	71483234	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
7.	MARLON SAUL REALES	1.090.472.764	OPERADOR	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXPONENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	71483234	$ 46.400	PORVENIR	71483234	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
8.	CRISTIAN FERNANDO CELIS	1.092.156.255	OPERADOR	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXPONENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	71483234	$ 46.400	PORVENIR	71483234	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
9.	ANYI YULIANA URBINA	1.005.035.950	AUXILIAR SST	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27873194	$ 46.400	PORVENIR	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
10.	JORGE ENRIQUE LATORRE	5.489.858	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS	7898638393	$ 46.400	PROTECCIÓN	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
11.	JUAN CARLOS CAMAÑO ROJAS	1.093.750.998	OFICIAL	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 60.000	PORVENIR	7898638393	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
12.	LUIS ALBERTO TORRES	5.489.492	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	COLPENSIONES	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
13.	DAYAN ANDRES RODRIGUEZ	1.091.809.209	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
14.	FELIX GARCIAS ROJAS	1.063.483.429	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PROTECCIÓN	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
15.	ONAEL GARCIA ROJAS	7.152.840	MAESTRO	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 60.000	PORVENIR	7898638393	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
16.	CESAR ADRIAN PEÑARADA	5.497.850	CONDUCTOR	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EXPONENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD	71483234	$ 46.400	COLPENSIONES	71483234	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
17.	HECTOR LUIS IBARRA PINTO	1.094.346.711	ALMACENISTA	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS	27873194	$ 46.400	PROTECCIÓN	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
18.	LUIS ALFONSO GARCIA	1.007.246.565	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD	7898638393	$ 46.400	PROTECCION	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
19.	OSCAR PEÑARANDA	5.398.337	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
20.	YILMER ALEXANDER ACEVEDO PRIETO	1.094.858.928	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PROTECCIÓN	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
21.	VICTOR MANUEL CONTRERAS ARIAS	1.094.859.086	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	7898638393	$ 46.400	PROTECCION	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
22.	EZEQUIEL HERRERA DUARTE	5.489.639	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	COLPENSIONES	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
23.	DIEGO FERNANDO RIVERA PEÑA	1.094.348.673	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
24.	LUIS ARTURO PRIETO PEREZ	1.094.858.063	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
25.	YEISON BRAYAN CAMACHO ROMERO	1.091.679.293	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
26.	YONATAN DAVID ARIAS BERNAL	1.094.858.027	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
27.	DANIEL RAMOS ROJAS	11.202.858	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.700.000,00	$ 118.400,00	V	COOSALUD	7898638393	$ 68.000	PORVENIR	7898638393	$ 272.000	$ 68.000	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
28.	JAVIER ALFONSO CASTRO BERNAL	1.094.858.979	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
29.	NAHUN REMOLINA RIVERA	13.197.639	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 60.000	PORVENIR	7898638393	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
30.	ALEXANDER CACERES	13.391.380	CONDUCTOR	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27873194	$ 46.400	COLPENSIONES	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
31.	JULIO CESAR SILVA RODRIGUEZ	5.497.939	VIGILANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27873194	$ 46.400	COLPENSIONES	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
32.	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	13.393.229	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 46.400	PORVENIR	7898638393	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
33.	MANUEL ACONCHA CONTRERAS	88.176.344	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.126.667,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	$ 1.126.667,00	$ 78.500,00	V	NUEVA EPS	7898638393	$ 45.100	COLFONDOS	7898638393	$ 180.300	$ 45.100	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
34.	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	1.120.564.035	OFICIAL DE OBRA	XXXXXXXX	X X X X	CONSTRUCCIONES JAEP	XXXXXX	XXXXX	V	SANITAS	XXXXX	XXXX	PROTECCIÓN	XXXXX	XXXX	XXXXX	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
35.	RUBEN DARIO CARDENAS NUNCIRA	1.094.859.065	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 996.667,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	$ 996.667,00	$ 67.300,00	V	NUEVA EPS	27873194	$ 38.700	PORVENIR	27873194	$ 154.700	$ 38.700	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-287073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901616707	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 0E 94 CC VENTURA PLAZA OF 4 120		571000000			HUGOPEREZALVAREZ16@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27873194	E	2023-10-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.558.200	26.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	27873194	2023-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 5399532	ACEVEDO ARAQUE FELIPE ANTONIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
2	CC 1093293685	AGUILAR MELO JESUS RUBIEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
3	CC 13391380	CACERES SUAREZ ALEXANDER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
4	CC 88225082	CAMPOS LIZARAZO NELSON EDUARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
5	CC 1094859065	CARDENAS NUNCIRA RUBEN DARIO	1.160.000	F	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	966.667	154.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	966.667	38.700	COMFANORTE-CCF37	966.667	38.700	966.667	67.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	299.400	S	5429001
6	CC 1090386915	CARDENAS REMOLINA MELISA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
7	CC 1094346711	IBARRA PINTO HECTOR LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5422001
8	CC 1005085614	RODRIGUEZ PEREZ WILSON ORLANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
9	CC 5497939	SILVA RODRIGUEZ JULIO CESAR	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
10	CC 1005035950	URBINA RODRIGUEZ ANYI YULIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901616707	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 0E 94 CC VENTURA PLAZA OF 4 120		571000000			HUGOPEREZALVAREZ16@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27873194	E	2023-10-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.558.200	26.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	27873194		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.406.667	11.406.667	11.406.667	11.406.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	1.825.100	0	13.400	0	1.838.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	371.200	0	2.700	0	373.900
PROTECCION	230201	800229739	0	5	928.000	0	6.800	0	934.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	525.900	0	3.900	0	529.800
EPS(Administradoras: 5)				10	456.300	0	3.500	0	459.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	46.400	0	400	0	46.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.800	0	700	0	93.500
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	2	92.800	0	700	0	93.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	46.400	0	400	0	46.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	177.900	0	1.300	0	179.200
ARP(Administradoras: 1)				10	794.500	0	5.800	0	800.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	794.500	0	5.800	0	800.300
CCF(Administradoras: 1)				10	456.300	0	3.300	0	459.600
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	10	456.300	0	3.300	0	459.600
Gran Total					3.532.200	0	26.000	0	3.558.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN 15E- 148	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	013 - OBRA SANTIAGO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7898638393**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		207187358

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	14	$ 2.669.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.600	$ 0	$ 2.669.400	$ 16.600	$ 2.686.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 185.600	$ 1.200	$ 186.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 180.300	$ 1.200	$ 181.500
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 1.113.600	$ 7.000	$ 1.120.600
SUBTOTALES:										**$ 4.148.900**	**$ 26.000**	**$ 4.174.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.400	$ 0	$ 700	$ 0	$ 106.400	$ 700	$ 0	$ 107.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 630.900	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 630.900	$ 4.000	$ 0	$ 634.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 46.400	$ 300	$ 0	$ 46.700
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 68.000	$ 500	$ 0	$ 68.500
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 185.600	$ 1.200	$ 0	$ 186.800
SUBTOTALES:													**$ 1.037.300**	**$ 6.700**	**$ 0**	**$ 1.044.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.806.000	$ 1.806.000	$ 11.200	$ 0	$ 1.817.200
SUBTOTALES:									**$ 1.806.000**	**$ 11.200**	**$ 0**	**$ 1.817.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	22	$ 1.037.300	$ 6.500	$ 1.043.800
SUBTOTALES:			**$ 1.037.300**	**$ 6.500**	**$ 1.043.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN 15E- 148	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	013 - OBRA SANTIAGO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7898638393**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	207187358

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1094348673	RIVERA PEÑA DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1094858027	ARIAS BERNAL YONATAN DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1094858063	PRIETO PEREZ LUIS ARTURO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1094858928	ACEVEDO PRIETO YILMER ALEXADER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1094858979	CASTRO BERNAL JAVIER ALFONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1094859085	CONTRERAS ARIAS VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 11202858	RAMOS ROJAS DANIEL	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000	1	$ 118.400	30	$ 1.700.000	CCF37-COMFANORTE	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 13197639	RIVERA REMOLINA NAHUM	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 13393229	GUZMAN ROJAS JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 5398337	PENARANDA RODRIGUEZ OSCAR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 5489492	TORRES JAIMES LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		30														25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5489639	HERRERA DUARTE EZEQUIEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 5489858	LATORRE SANDOVAL JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 7152840	GARCIA ROJAS ONAEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN 15E- 148	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	013 - OBRA SANTIAGO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7898638393**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	207187358

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
21	CC 85470890	SALGADO CUETO SENON RAFAEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	21	21															230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.334	1	$ 3.100	1	$ 43.334	CCF37-COMFANORTE	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 88176344	ACONCHA CONTRERA MANUEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	05																231001-COLFONDOS	26	$ 1.126.667	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.300	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 45.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.126.667	1	$ 78.500	26	$ 1.126.667	CCF37-COMFANORTE	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 8.079.900**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890505648-1	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA.	Calle 10 0E-94 C. de Negocios Ventura Plaza Of1120	5754958	exporienterepresentaciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERADORES MA	26	NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	05/10/2023	71483234	$5.926.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	440.800	0		0		0	0	0	0	440.800	10
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.484.800	0	0	0	0	0	0		1.484.800	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.020.800	0	0	0	0	0	0		1.020.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.333.200				1.333.200	0	0	1.333.200			13.332	1.333.200	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	765.600	0	0	765.600	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	765.600	765.600
Pensión	3	3.062.400	3.062.400
Riesgos Laborales	1	1.333.200	1.333.200
CCF	1	765.600	765.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.926.800	5.926.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	890505648-1	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA.	Calle 10 0E-94 C. de Negocios Ventura Plaza Of1120	5754958	exporienterepresentaciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERADORES MA	26	NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					17	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-10	2023-09	E	05/10/2023	71483234	$5.926.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1090413797	RODRIGUEZ TORRES JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1090472764	REALES ALMENDRALES MARLON SAUL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1093750881	BETANCUR MARIÑO JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1094166681	PEÑARANDA BARAJAS EUDES BLADIMIR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	13388186	PEÑARANDA ACERO OSCAR ABEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	13487636	GALVIS ALVAREZ NEMESIO DAVID	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	5497850	PEÑARANDA ACERO CESAR ADDRIAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	88217223	PARRA MADARIAGA FRANCISCO ERNESTO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	88256554	HERRERA OSPINA LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	1092156255	CELIS SANDOVAL CRISTIAN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	88232654	CAMPO MEDINA GABRIEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1093764297	ORTIZ FLOREZ ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	88249668	LAGUADO JOSE ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	13278180	ALVAREZ URIBE CLEMENTE	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	1101783415	SIERRA ALVAREZ MANUEL DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	13487533	MORENO VERA AUGUSTO	1	0			S	X																25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF37	580.000	23.200	0	0	0	0	0
17	CC	13498730	HERRERA PABLO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.		INVIAS Y MUNICIPIO	LP-OP-01-2022	$ 4.430.879.655	
			TOTAL			$ 4.430.879.655	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.430.879.655,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jul-23	$539.282.813,00		$ 539.282.813,00	$ -	$ 539.282.813	0	431	$ 3.891.596.842,00	$ 3.891.596.842,00				
TOTALES			**$539.282.813,00**	**$0,00**	**$ 539.282.813**					**$ 3.891.596.842**	**$ 3.891.596.842**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 492.031.401,00		$ 492.031.401,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 39.707.069,00	$ 7.544.343,00	$ 47.251.412,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 531.738.470,00	$ 7.544.343,00	**$ 539.282.813,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24		716
Lluvias moderadas							1					2																	1			4
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma
Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/09/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	6/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	K2+090 Vía Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago	1	>95%	99,43%	SI	
2	6/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	K2+160 Vía Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago	2	>95%	100,65%	SI	
3	6/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	K2+030 Vía Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago	3	>95%	99,67%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: LA-H-031	
	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	VERSIÓN: 02	FECHA : 16/12/2022
	NORMA INV E-161-13	PÁGINA 1 DE 1	

Informe No.: OS2718-23-PU-01

PROYECTO*:	Construcción Pavimento en Placa Huella en la Vía Rural Cuperena Zul Alto del Municipio de Santiago Norte de Santander	**FECHA TOMA*:**	6/09/2023
SOLICITANTE*:	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.	**FECHA RECIBIDO:**	6/09/2023
CONTACTO*:	Ing. Rosana del Pilar Mattos	**FECHA ENSAYO:**	6/09/2023
MATERIAL*:	Sub-Base Granular	**FECHA INFORME:**	7/09/2023
PROCEDENCIA*:	Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - CTZ	**No. ORDEN:**	OS-2718
MUESTRA:	1		

K cono (gr.)	1673	**Densidad Arena (gr./cm³)**	1,449	**Peso Tara gr.**	160

Densidad N°	**1**	**2**	**3**							
Localización (abscisa)	K2+090	K2+160	K2+030							
N° capa/ Espesor (m.)	2/0,15	2/0,15	2/0,15							
Peso Tara (gr.)	160	160	160							
Peso tara + suelo húmedo (gr.)	4524	4448	4594							
Peso inicial frasco + arena (gr.)	6482	6436	6390							
Peso final frasco + arena (gr.)	2028	2076	1876							
Humedad material in situ (%)	2,10	2,60	2,70							
Peso ret. T N° ¾" in situ (gr.)	1120	1252	676							
Retenido T ¾" in situ (%)	25,7	29,2	15,2							
Peso Unitario Agre. 3/4" (gr/cm³)	2,50	2,50	2,50							
Densidad Máxima Seca (gr/cm³)	2,172	2,172	2,172							
Humedad Óptima (Proctor) (%)	6,45	6,45	6,45							
Volumen de hueco (cm³)	1471,25	1353,58	1690,26							
Densidad Húmeda (gr/cm³)	2,205	2,243	2,223							
Densidad Seca in Situ (gr/cm³)	2,160	2,186	2,165							
Peso Unitario Seco (KN/m³)	21,18	21,44	21,23							
Compactación de la Capa (%)	99,43	100,65	99,67							

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*). Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó:
Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó:
Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRAN COLOMBIA No. 4E-28 B. POPULAR , CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022
PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29/7/2022	29/3/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/7/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18/6/2023	3/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/1/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6 .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

FECHA DE INICIO: 18/10/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **13/12/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRAT: 18/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.430.879.655,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.430.879.655,00

PLAZO ACUMULADO: 439,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	19 DE NOVIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE DE 2022	20 DE DICIEMBRE DE 2022 A 20 DE ENERO DE 2023	21 DE ENERO A 21 DE FEBRERO DE 2023	22 DE FERBERO A 22 DE MARZO DE 2023	23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2023	24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2023	25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2023	25 DE JUNIO A 02 DE JULIO DE 2023	Indicar mes y año N…
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$4.029.530	90,94%		% P	0,00%	0,00%	0,92%	11,65%	19,83%	19,88%	19,88%	17,72%	10,12%	
				$ P	**$0**	$0	$37.222	$469.317	$799.077	$801.053	$801.053	$713.864	$407.945	
				$ E										
				% E										
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	$251.306	5,67%		% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

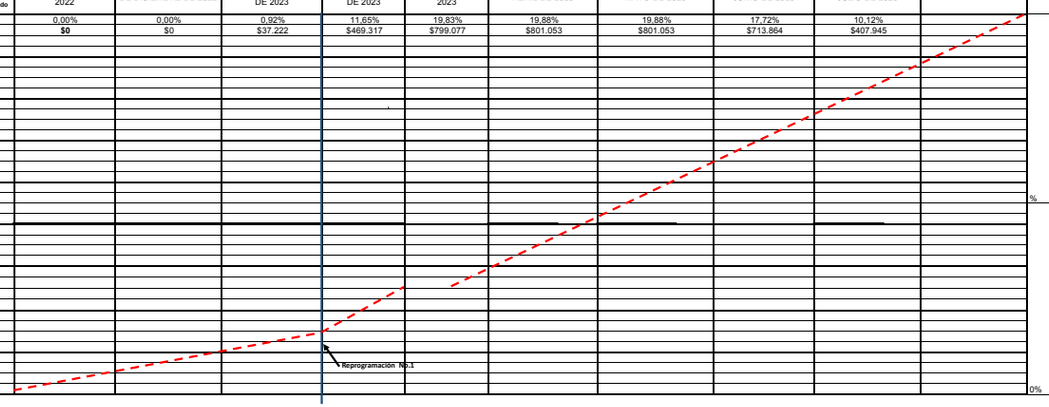

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andreia Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,430,879,655.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,430,879,655.00

PLAZO ACUMULADO: 439.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

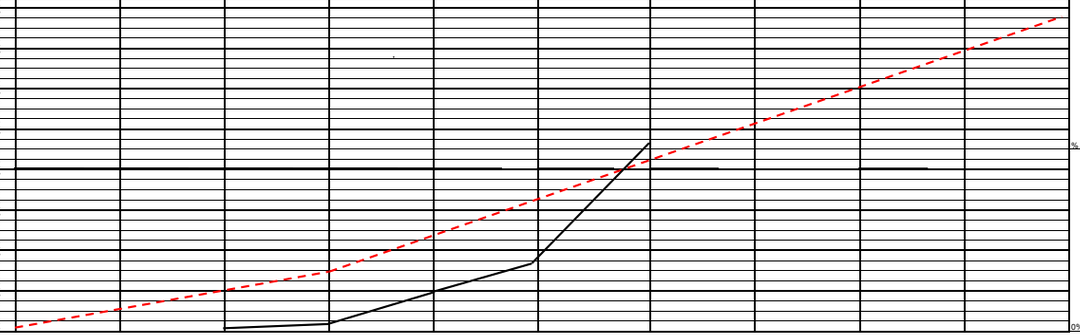

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 146 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 19/10/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 437,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.781.999.648,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.781.999.648,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1717
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	6
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	20	165
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2	2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.738.917.357,00		$ 1.738.917.357,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.389.174,00	3.303.943,00	$ 20.693.117,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 17.389.174,00		$ 17.389.174,00
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.773.695.705,00	$ 3.303.943,00	**$ 1.776.999.648,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 462.202.145,80		$ 462.202.145,80	$ 462.202.145,80
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.215.282,21	$ 3.270.903,62	$ 20.486.185,83	$ 20.486.185,83
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 482.688.331,63**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.776.999.648,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 482.688.331,63
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 27,16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 15
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Huellas fundidas en concreto de 3000 psi



Huellas fundidas en concreto de 3000 psi

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

La Interventoria envia oficio a la Alcaldia Municipal sobre un proceso sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, que se relaciona a continuacion:

GIC-INVIAS-NTS-297-22 RECOMENDACIÓN INICIO PROCESO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora 12H	CATERPILLAR-2006		Herran	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Volqueta VIS-106	HINO-2009	6 m3	Herran	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Volqueta VIS-107	HINO-2009	6 m3	Herran	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Vibrocompactador CS44B	CATERPILLAR-2018		Herran	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Retroexcavadaora 416	CATERPILLAR-2022		Herran	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	135	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	135	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CIRO ALONSO NAVARRO DIAZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-248804 NTS

Firma

Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	88251179	INGENIERO RESIDENTE	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	EPS SANITAS	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
2.	LUIS BERNARDO LEON SIERRA	91.270.029	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
3.	LUIS ALBERTO PIMIENTO GUALDRON	1.993.796.994	MAESTRO DE OBRA	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 580.000,00	$ 67.300,00	V	COMPENSAR	27854349	$ 23.200	SURA	27854349	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	RETIRADO
4.	PEDRO ELIAS GUALDRON CASTRO	7.231.467	MAESTRO DE OBRA	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
5.	JOSE LUIS SUAREZ MONTAÑEZ	1.094.506.433	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
6.	JOSE OLINTO RIVERA OLAYA	5.454.943	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
7.	MARLON MAURICIO ANGARITA VEGA	1.092.524.972	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
8.	MANUEL PABON GAFARO	5.455.063	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
9.	CARLOS EDUARDO GOMEZ SANTANDER	5.455.898	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
10.	CARMEN TEREZA DELGADO OCHOA	1.094.507.084	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
11.	GERSON FABIAN VEGA TORRES	1.004.926.733	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
12.	ELIAS PABON GAFARO	5.455.092	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
13.	JOSE LUIS SANCHEZ MOLINA	5.608.082	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 46.400	SURA	27854349	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
14.	JESUS ANTONIO PABON PEÑALOZA	1.094.367.614	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 348.000,00	$ 24.300,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 14.000	SURA	27854349	$ 55.700	$ 14.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
15.	JOSE ANIBAL SANCHEZ CARRILLO	5.470.121	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 348.000,00	$ 24.300,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 14.000	SURA	27854349	$ 55.700	$ 14.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
16.	RAFAEL AFRANIO ESPITIA CONTRERAS	5.455.500	OBRERO	1.160.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	$ 386.667,00	$ 27.000,00	V	CONFAORIENTE	27854349	$ 15.500	SURA	27854349	$ 61.900	$ 15.500	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra: LUIS EDUARDO BLANCO
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901637702	5	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 0E 94 OF 4 121		5710000			PLACAHUELLAHERRAN@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27854349	E	2023-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.841.300	15.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	27854349	2023-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1092524972	ANGARITA VEGA MARLON MAURICIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
2	CC 1094507084	DELGADO OCHOA CARMEN TERESA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
3	CC 5455500	ESPITIA CONTRERAS RAFAEL AFRANIO	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	386.667	61.900	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	386.667	15.500	COMFANORTE-CCF37	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5429001
4	CC 5455898	GOMEZ SANTANDER CARLOS EDUARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
5	CC 7231467	GUALDRON CASTRO PEDRO ELIAS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
6	CC 91270029	LEON SIERRA LUIS BERNARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002
7	CC 5455092	PABON GAFARO ELIAS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
8	CC 5455063	PABON GAFARO MANUEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
9	CC 1094367614	PABON PEÑALOZA JESUS ANTONIO	1.160.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	348.000	55.700	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	348.000	14.000	COMFANORTE-CCF37	348.000	14.000	348.000	24.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	108.000	S	5429001
10	CC 1093800354	PIMIENTO GIALDRON LUIS ALBERTO	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	580.000	92.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	580.000	23.200	COMFANORTE-CCF37	580.000	23.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	179.600	S	5429001
11	CC 5454943	RIVERA OLAYA JOSE OLINTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
12	CC 88251179	RODRIGUEZ CASTRO ALVARO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002
13	PT 5470121	SANCHEZ CARRILLO JOSE ANIBAL	1.160.000	F	X															0			9	9	9	9	COLPENSION ES-25-14	348.000	55.700	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	348.000	14.000	COMFANORTE-CCF37	348.000	14.000	348.000	24.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	108.000	S	5429001
14	PT 5608082	SANCHEZ MOLINA JOSE LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
15	CC 1094506433	SUAREZ MONTAÑEZ JOSE LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
16	CC 1004926733	VEGA TORRES GERSON FABIAN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901637702	5	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 0E 94 OF 4 121		5710000			PLACAHUELLAHERRAN@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27854349	E	2023-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.841.300	15.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	27854349		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.582.667	15.582.667	15.582.667	15.582.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	2.493.300	0	7.900	0	2.501.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	798.100	0	2.500	0	800.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	61.900	0	200	0	62.100
PROTECCION	230201	800229739	0	2	371.200	0	1.200	0	372.400
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.262.100	0	4.000	0	1.266.100
EPS(Administradoras: 5)				16	623.500	0	2.100	0	625.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	23.200	0	100	0	23.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.400	0	200	0	46.600
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	11	414.700	0	1.300	0	416.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	200	0	46.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	92.800	0	300	0	93.100
ARP(Administradoras: 1)				16	1.085.600	0	3.400	0	1.089.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	1.085.600	0	3.400	0	1.089.000
CCF(Administradoras: 1)				16	623.500	0	2.000	0	625.500
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	16	623.500	0	2.000	0	625.500
Gran Total					4.825.900	0	15.400	0	4.841.300

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		INVIAS Y MUNICIPIO	146 DE 2022	$ 1.781.999.648	
			TOTAL			$ 1.781.999.648	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.781.999.648,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra:
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	24	21	22	23	23	24	23	23	24	23	23	24	24	24	24	24	24	23	23	23	23	24	24	22	23	23	23	24		699
Lluvias moderadas				3		1			1				1							1	1		1				1	1				11
Lluvias intensas	1				2		1			1		1										1				2			1			10
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: CIRO ALONSO NAVARRO DIAZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-248804 NTS



Firma
Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27 9 2022	27 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27 9 2022	27 12 2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27 9 2022	30 12 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

FECHA DE INICIO: 19/10/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **14/11/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Luis Eduardo Blanco
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ii

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 146 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.781.999.648,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.781.999.648,00


PLAZO ACUMULADO: 437,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 10/06/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

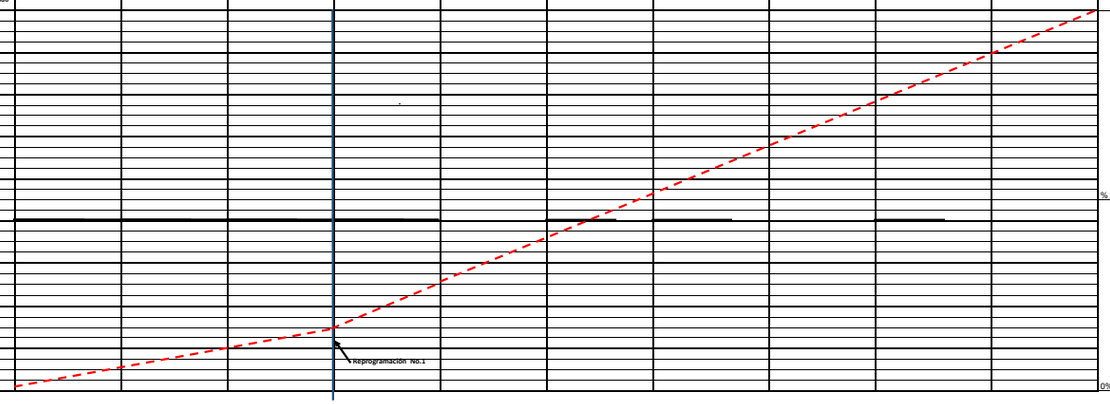

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 146 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.781.999.648,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.781.999.648,00

PLAZO ACUMULADO: 437,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 10/06/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

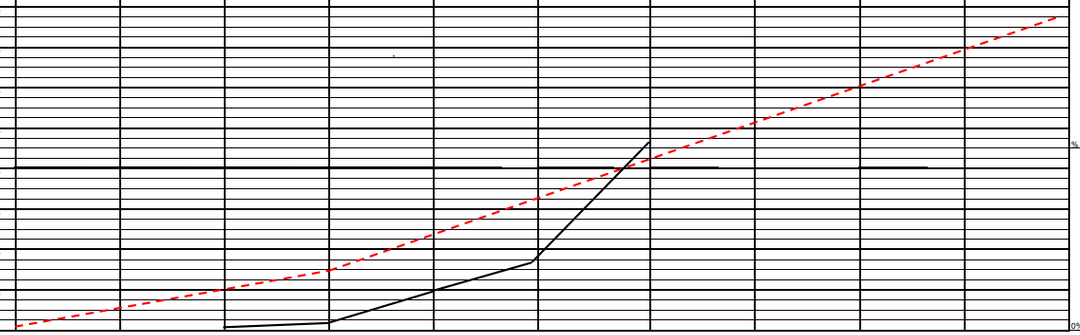

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.658.435.877,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1366
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	17
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla			
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.658.435.877,00		$ 2.658.435.877,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.658.435.877,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.396.919,27	$ 1.975.414,66	$ 12.372.333,93	$ 12.372.333,93
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 12.372.333,93**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.658.435.877,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 12.372.333,93
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **1**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-328903 NTS



Firma
Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: LUIS EDUARDO BLANCO 54202107869 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	10000511	Servicios de la construcción-COLOMBIA RURAL INVERSION EN VIAS RURALES	80	NACION	Contrato PrincipaL.	$ 2.658.435.877	
			TOTAL			$ 2.658.435.877	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.658.435.877,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	21	24	24	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	22	24	24	24	24	24	22	22		702
Lluvias moderadas	2	3			1		2																2						2	2		14
Lluvias intensas																					2	2										4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202328903 NTS

Firma
Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	21	24	24	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	22	24	24	24	24	24	22	22		702
Lluvias moderadas	2	3			1		2																2						2	2		14
Lluvias intensas																					2	2										4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se encuentra suspendido

Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202328903 NTS

Firma
Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Se encuentra suspendido


NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/11/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	5	7	2023	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	5	7	2023	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 71683210
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. 71683230
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO APROBADO: SI X NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN: **26/12/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 359,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/11/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.658.435.877,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.658.435.877,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:
Se encuentra suspendido

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 160 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION 10/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.658.435.877,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.658.435.877,00

PLAZO ACUMULADO: 359,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

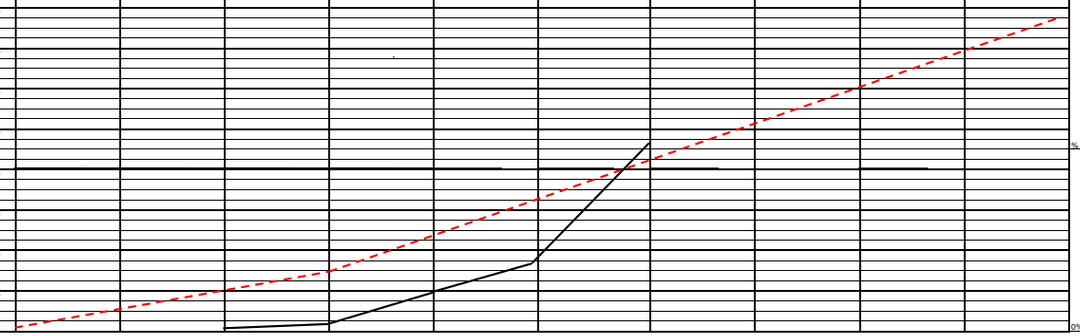

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se encuentra suspendido

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** sep-23

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 8 MESES

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 4.314.324.054,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 179.688.569,00

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2023 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	2605
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	9
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	743,5	771,5
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	4	4
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.281.143.357,00		$ 4.281.143.357,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 15.151.003,00		$ 15.151.003,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.151.003,00	2.878.691,00	$ 18.029.694,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.311.445.363,00	$ 2.878.691,00	**$ 4.314.324.054,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.266.651.637,30	$ -	$ 1.266.651.637,30	$ 1.266.651.637,30
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.999.493,33	$ 2.849.903,73	$ 17.849.397,06	$ 17.849.397,06
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.284.501.034,36**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.314.324.054,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.284.501.034,36

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29,77%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 21

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 16

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **21**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORREDOR 1 SANTA LUCIA - CANOAS TRAMO CHORRO 2	CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA- LA ARENOSA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA			CORREDOR 1 EL CHORRO2	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 1 EL CHORRO2	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TOTAL ACTIVO				2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	44	73%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	27%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se encuentra en ejecucion de obra fisica el Proyecto en el corredor No. 1

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ	1094322102	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.972.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.972.000,00	$ 137.300	5	NEUVA EPS	71488775	$ 78.900	COLFONDOS	71488775	$ 315.600	$ 78.900			
2	DIGNO AREVALO PEREZ	13140622	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 696.000,00	$ 48.500	5	COOSALUD	71488775	$ 27.900	PORVENIR	71488775	$ 111.400	$ 27.900			
3	ARBEY AURELIO BALLESTEROS	1091667473	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.972.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.972.000,00	$ 137.300	5	SANITAS	71488775	$ 78.900	PORVENIR	71488775	$ 315.600	$ 78.900			
4	NALLELYT GUERRERO GARAY	1091673181	TRABAJADORA SOCIAL	$ 1.740.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.740.000,00	$ 121.200	5	SANITAS	71488775	$ 69.600	PORVENIR	71488775	$ 278.400	$ 69.600			
5	ANDRES ALONSO MONTAÑA	1091673273	TOPOGRAFO	$ 1.740.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.740.000,00	$ 121.200	5	SURA	71488775	$ 69.600	PORVENIR	71488775	$ 278.400	$ 69.600			
6	CLAUDIA LILIANA RANGEL	37334004	DIRECTO DE OBRA	$ 3.480.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 3.480.000,00	$ 242.300	5	SANITAS	71488775	$ 139.200	COLPENSIONES	71488775	$ 556.800	$ 139.200			
7	MARIO PEÑARANDA TORRADO	88287629	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	NUEVA EPS	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
8	GABRIEL JOSE HERRERA ZAMORA	6031129	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	CAPITAL SALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
9	LUIS FERNANDO MORA LEON	1007670488	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	ASMETSALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
10	LEONEL TRIGOS PAEZ	1004981761	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	COOSALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
11	LUIS ANTONIO JAIME PEREZ	5408981	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	COOSALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
12	ALVARO PAEZ GARAVITO	88267060	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	COOSALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
13	JOSE ALEJANDRO ORTIZ LLAIN	1093060053	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	NUEVA EPS	71488775	$ 46.400	PROTECCION	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
14	JAIDER MALDONADO MORA	1093060213	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	ASMETSALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
15	WILFREDO TORO MEJIA	13176730	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	NUEVA EPS	71488775	$ 46.400	PROTECCION	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
16	JESUS ANIBAL CELIS PABON	13392820	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.044.000,00	$ 72.700	5	COOSALUD	71488775	$ 41.800	PORVENIR	71488775	$ 167.100	$ 41.800			
17	JAVIER ALEXANDER HERRERA ZAMORA	6511671	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.044.000,00	$ 72.700	5	NUEVA EPS	71488775	$ 41.800	PORVENIR	71488775	$ 167.100	$ 41.800			
18	DANILO ANTONIO PEREZ ORTIZ	1094580344	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 116.000,00	$ 8.100	5	COOSALUD	71488775	$ 4.700	PROTECCION	71488775	$ 18.600	$ 4.700			
19	JAIRO ORTIZ ARENAS	13140459	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X	CONSORCIO AD VIAS	$ 38.666,67	$ 2.700	5	ASMETSALUD	71488775	$ 1.600	PORVENIR	71488775	$ 6.200	$ 1.600			
20	YESENIA JAIME PEREZ	60417386	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800	5	COOSALUD	71488775	$ 46.400	PORVENIR	71488775	$ 185.600	$ 46.400			
21	JESUS YORDANO NIZ SANCHEZ	1064839591	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.972.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO AD VIAS	$ 1.972.000,00	$ 137.300	5	SANITAS	71488775	$ 78.900	COLPENSIONES	71488775	$ 315.600	$ 78.900			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Claudia Liliana Rangel
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: TP 54202101647

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901643989-6	CONSORCIO AD VIAS	ED PRIMAVERA IMPERIAL APTO 101	3165778490	CONSORCIOADVIAS1@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71488775	$8.489.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	413.000	0		0		0	0	0	0	413.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	69.600	0		0		0	0	0	0	69.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	171.700	0		0		0	0	0	0	171.700	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	181.000	0		0		0	0	0	0	181.000	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	261.600	0		0		0	0	0	0	261.600	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	668.200	0	0	0	0	0	0		668.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.530.600	0	0	0	0	0	0		2.530.600	14
231001	Colfondos	800227940-6	315.600	0	0	0	0	0	0		315.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	872.400	0	0	0	0	0	0		872.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.909.300				1.909.300	0	0	1.909.300			19.093	1.909.300	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	1.096.900	0	0	1.096.900	21

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901643989-6	CONSORCIO AD VIAS		ED PRIMAVERA IMPERIAL APTO 101	3165778490	CONSORCIOADVIAS1@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71488775	$8.489.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.096.900	1.096.900
Pensión	4	4.386.800	4.386.800
Riesgos Laborales	1	1.909.300	1.909.300
CCF	1	1.096.900	1.096.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.489.900	8.489.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901643989-6	CONSORCIO AD VIAS		ED PRIMAVERA IMPERIAL APTO 101	3165778490	CONSORCIOADVIAS1@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71488775	$8.489.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1094322102	CAICEDO LOPEZ ALBET YANIR	1	0			S																	231001	1.972.000	315.600	0	0	0	0	EPS037	1.972.000	78.900	14-11	1.972.000	5	137.300	CCF37	1.972.000	78.900	0	0	0	0	0
2	CC	13140622	AREVALO PEREZ DIGNO	1	0			S	X																230301	696.000	111.400	0	0	0	0	ESSC24	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF37	696.000	27.900	0	0	0	0	0
3	CC	1091667473	BALLESTEROS MENESES ARBEY AURELIO	1	0			S																	230301	1.972.000	315.600	0	0	0	0	EPS005	1.972.000	78.900	14-11	1.972.000	5	137.300	CCF37	1.972.000	78.900	0	0	0	0	0
4	CC	1091673181	GARAY GUERRERO NALLELYT	1	0			S																	230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS005	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	5	121.200	CCF37	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
5	CC	1091673273	ALONSO MONTAÑA ANDRES	1	0			S																	230201	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS010	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	5	121.200	CCF37	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
6	CC	37334004	RANGEL PACHECO CLAUDIA LILIANA	1	0			S																	25-14	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF37	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
7	CC	88287629	PEÑARANDA TORRADO MARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	PT	6031129	HERRERA ZAMORA GABRIEL JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1007670488	MORA LEON LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	1004981761	TRIGOS PAEZ LEONEL	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	5408981	JAIME PEREZ LUIS ANTONIO	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	88287060	PAEZ GARAVITO ALVARO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	1093060053	ORTIZ LLAIN JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	1093060213	MALDONADO MORA JAIDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	13176730	TORO MEJIA WILFREDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	13392820	CELIS PABON JESUS ANIBAL	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC24	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF37	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
17	PT	6511671	HERRERA ZAMORA JAVIER ALEXANDER	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS041	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF37	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
18	CC	1094580344	PEREZ ORTIZ DANILO ANTONIO	1	0			S	X																230201	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF37	116.000	4.700	0	0	0	0	0
19	CC	13140459	ORTIZ ARENAS JAIRO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF37	38.667	1.600	0	0	0	0	0
20	CC	60417386	JAIME PEREZ YESENIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1064839591	NIZ SANCHEZ JESUS YORDANO	1	0			S																	25-14	1.972.000	315.600	0	0	0	0	EPS005	1.972.000	78.900	14-11	1.972.000	5	137.300	CCF37	1.972.000	78.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1124002	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO P RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 4.314.324.054	
				MUNICIPIO	Adicional No1	$ 179.688.569	
			TOTAL			$ 4.494.012.623	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.494.012.623,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969.311.826	$ -	$ 969.311.826	$ 172.572.962	$ 796.738.863	$ 690.291.848,64		$ 3.524.700.798	$ 3.524.700.798				
TOTALES			**$969.311.825,50**	**$0,00**	**$ 969.311.826**					**$ 3.524.700.797,5**	**$ 3.524.700.797,5**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 955.210.384,00		$ 955.210.384,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 1.480.656,00		$ 1.480.656,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.605.702,10	$ 2.015.083,40	$ 12.620.785,50
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 967.296.742,10	$ 2.015.083,40	**$ 969.311.825,50**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	23	24	24	22	24		714
Lluvias moderadas														1					1		1					1			2			6
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
No se han Iniciado Actividades de Obra física.

Firma Claudia L Rangel P
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	14/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS 3000 PSI	1	70%	73,76%	SI	Resistencia a los 7 dias
2	21/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS 3000 PSI	1	80%	101,38%	SI	Resistencia a los 14 dias
3	20/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS , CUNETAS , BORDILLO 3000 PSI	1	70%	76,63%	SI	Resistencia a los 7 dias
4	27/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS , CUNETAS , BORDILLO 3000 PSI	1	80%	85,07%	SI	Resistencia a los 14 dias
5	21/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	CICLOPEO 2000 PSI	1	70%	72,20%	SI	Resistencia a los 7 dias
6	28/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	CICLOPEO 2000 PSI	1	80%	81,57%	SI	Resistencia a los 14 dias
7	25/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS 3000 PSI	1	70%	127,08%	SI	Resistencia a los 7 dias
8	27/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	HUELLAS , CUNETAS , BORDILLO 3000 PSI	1	70%	76,55%	SI	Resistencia a los 7 dias
9	28/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	CICLOPEO 2000 PSI	1	70%	73,99%	SI	Resistencia a los 7 dias
10	29/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	ALCANTARILLA 3000 PSI	1	70%	71,09%	SI	Resistencia a los 7 dias
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

se presentan los ensayos hasta la fecha del 15 de julio de 2023 , fecha de corte para el Acta No 1 .

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS



Firma


Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	Slump	-	Fecha	21/09/2023
Estructura	Placa huella	Fuente	CTA - Cemento Argos estructural	Diseño	3000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vias	Descripción	Triturado 1" y Arena de grano grueso	Número de registro	INF2023008

Prueba	1	2				
Descripción de la muestra	Huellas					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	7/09/2023	7/09/2023				
Fecha Rotura	14/09/2023	21/09/2023				
Diámetro (mm)	150,00	151,00				
Altura (mm)	308,00	304,00				
Peso (Kg)	13,198	12,799				
Área (mm^2)	17671,46	17907,86				
Volumen (mm^3)	5442809,27	5443990,51				
Densidad (Kg/m^3)	2424,85	2351,03				
Carga (KN)	269,60	375,50				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	15,3	21,0				
Resistencia Real Promedio (MPa)						
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	2212,8	3041,3				
Resistencia Real (Kg/cm^2)	154,9	212,9				
Porcentaje resistencia a la compresión	73,76 %	101,38 %				
Tipo de falla	Tipo 4	Tipo 5				

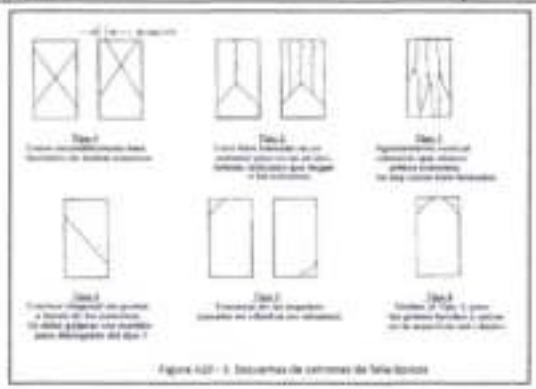


Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia Requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Flórez Duran
M.P. 54202-251799 NTS
Especialista en Geotecnia Ambiental

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	Slump	-	Fecha	27/09/2023
Estructura	Placa huella	Fuente	CTA - Cemento Argos estructural	Diseño	3000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vías	Descripción	Triturado 1" y Arena de grano grueso	Número de registro	INF2023009

Prueba	1	2				
Descripción de la muestra	Huellas, Cunetas, Bordillos (Placa SobreAncho)					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	13/09/2023	13/09/2023				
Fecha Rotura	20/09/2023	27/09/2023				
Diámetro (mm)	152,00	153,00				
Altura (mm)	306,00	308,00				
Peso (Kg)	13,300	13,389				
Área (mm^2)	18145,84	18385,39				
Volumen (mm^3)	5552626,79	5662698,77				
Densidad (Kg/m^3)	2395,26	2364,42				
Carga (KN)	287,60	323,50				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	15,85	17,60				
Resistencia Real Promedio (MPa)	2298,79	2552,05				
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	160,92	178,64				
Resistencia Real (Kg/cm^2)						
Porcentaje resistencia a la compresión	76,63 %	85,07 %				
Tipo de falla	Tipo 5	Tipo 5				

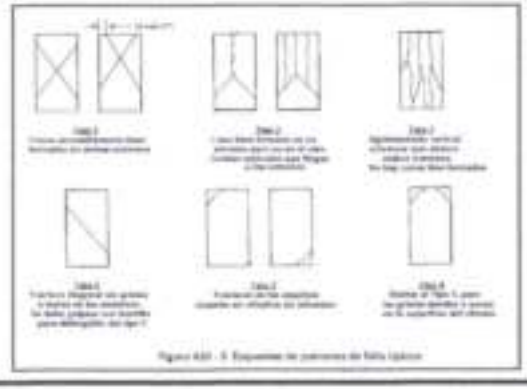


Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia Requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Flores Duran
M.P. 54202-251798 NTS
Especialista en Geotecnia Ambiental

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	Slump	-	Fecha	28/09/2023
Estructura	Placa huella	Fuente	CTA - Cemento Argos estructural	Diseño	2000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vías	Descripción	Triturado 1" y Arena de grano grueso	Número de registro	INF20230010

Prueba	1	2				
Descripción de la muestra	Ciclópeo					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	14/09/2023	14/09/2023				
Fecha Rotura	21/09/2023	28/09/2023				
Diámetro (mm)	151,00	154,00				
Altura (mm)	302,00	303,00				
Peso (Kg)	12,869	13,125				
Área (mm^2)	17907,86	18626,50				
Volumen (mm^3)	5408174,78	5643830,36				
Densidad (Kg/m^3)	2379,55	2325,55				
Carga (KN)	178,30	209,50				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	9,96	11,25				
Resistencia Real Promedio (MPa)	1444,09	1631,33				
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	101,09	114,19				
Resistencia Real (Kg/cm^2)						
Porcentaje resistencia a la compresión	72,20 %	81,57 %				
Tipo de falla	Tipo 2	Tipo 6				

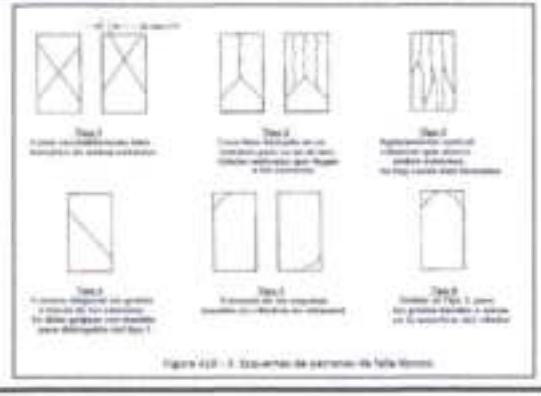

Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia Requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Florez Duran


M.P. 54202-251798 NTS

Especialista en Geotecnia Ambiental

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
GEOCIVILES S.A.S.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	Slump	-	Fecha	2/10/2023
Estructura	Placa huella	Fuente	CTA - Cemento Argos estructural	Diseño	3000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vías	Descripción	Triturado 1" y Arena de grano grueso	Número de registro	INF20230011

Prueba	1	2				
Descripción de la muestra	Huellas					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	18/09/2023	18/09/2023				
Fecha Rotura	25/09/2023	2/10/2023				
Diámetro (mm)	154,00	153,00				
Altura (mm)	308,00	306,00				
Peso (Kg)	13,268	13,260				
Área (mm^2)	18626,50	18385,39				
Volumen (mm^3)	5736962,88	5625928,00				
Densidad (Kg/m^3)	2312,72	2356,94				
Carga (KN)	489,60	579,60				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	26,29	31,53				
Resistencia Real Promedio (MPa)	3812,39	4572,39				
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	266,87	320,07				
Resistencia Real (Kg/cm^2)						
Porcentaje resistencia a la compresión	127,08 %	152,41 %				
Tipo de falla	Tipo 2	Tipo 4				

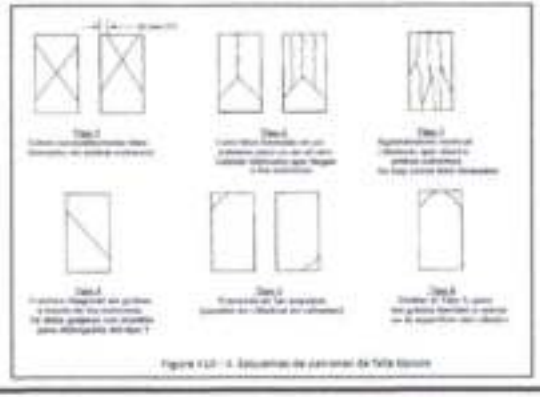

Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia Requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Florez Duran
M.P. 54202-251798 NTS
Especialista en Geotecnia Ambiental

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	Slump	-	Fecha	4/10/2023
Estructura	Placa huella	Fuente	CTA - Cemento Argos estructural	Diseño	3000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vias	Descripción	Triturado 1" y Arena de grano grueso	Número de registro	INF20230012

Prueba	1	2				
Descripción de la muestra	Huellas, Cunetas, Bordillos (Placa SobreAncho)					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	20/09/2023	20/09/2023				
Fecha Rotura	27/09/2023	4/10/2023				
Diámetro (mm)	152,00	152,00				
Altura (mm)	305,00	303,00				
Peso (Kg)	13,194	13,106				
Área (mm^2)	18145,84	18145,84				
Volumen (mm^3)	5534480,95	5498189,27				
Densidad (Kg/m^3)	2383,96	2383,69				
Carga (KN)	287,30	316,50				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	15,83	17,44				
Resistencia Real Promedio (MPa)	2296,39	2529,79				
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	160,75	177,09				
Resistencia Real (Kg/cm^2)						
Porcentaje resistencia a la compresión	76,55 %	84,33 %				
Tipo de falla	Tipo 3	Tipo 4				

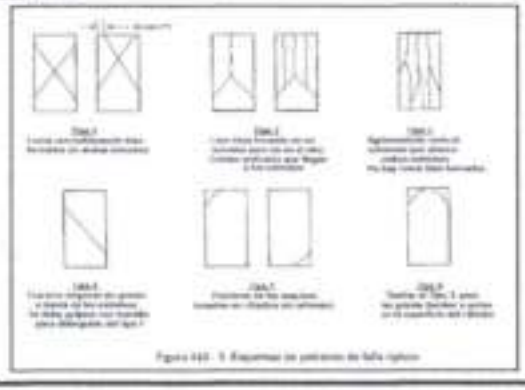


Figura 410 - 1 Esquemas de patrones de falla típicos

Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia Requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Florez Duran


M.P. 54202-251799 NTS

Especialista en Geotecnia Ambiental

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
GEOCIVILES S.A.S.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	**Slump**	-	**Fecha**	5/10/2023
Estructura	Placa huella	**Fuente**	CTA - Cemento Argos estructural	**Diseño**	2000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vias	**Descripción**	Triturado 1" y Arena de grano grueso	**Número de registro**	INF20230013

Prueba	**1**	**2**				
Descripción de la muestra	Ciclópeo					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	21/09/2023	21/09/2023				
Fecha Rotura	28/09/2023	5/10/2023				
Diámetro (mm)	150,00	152,00				
Altura (mm)	302,00	305,00				
Peso (Kg)	13,267	13,397				
Área (mm^2)	17671,46	18145,84				
Volumen (mm^3)	5336780,52	5534480,95				
Densidad (Kg/m^3)	2485,96	2420,64				
Carga (KN)	180,30	219,10				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	10,20	12,07				
Resistencia Real Promedio (MPa)	1479,83	1751,27				
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	103,59	122,59				
Resistencia Real (Kg/cm^2)						
Porcentaje resistencia a la comprensión	73,99 %	87,56 %				
Tipo de falla	Tipo 5	Tipo 5				

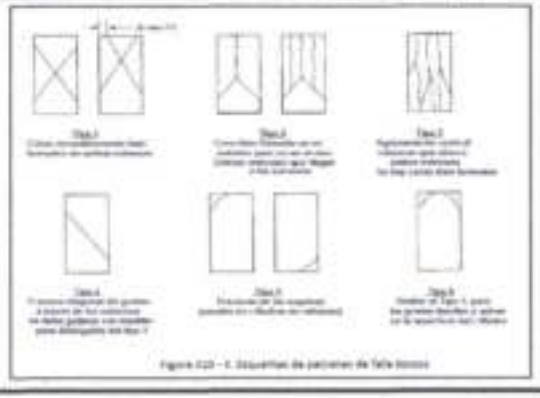

Resistencia a la compresión requerida	
Días	**Resistencia Raquerida**
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

GEOCIVILES S.A.S.

Ing. Víctor Alfonso Florez Duran


M.P. 54202-251799 NTS

Especialista en Geotecnia Ambiental

	ENSAYOS DE LABORATORIO	Código: FR-LAB-24
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	Versión: 03
	NORMA INV E-410-13	Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				
Localización	Ábrego, Norte de Santander	Slump	-	Fecha	5/10/2023
Estructura	Placa huella	Fuente	CTA - Cemento Argos estructural	Diseño	3000 PSI
Solicitante	Consorcio AD Vias	Descripción	Triturado 1" y Arena de grano grueso	Número de registro	INF20230014

Prueba	1	2				
Descripción de la muestra	Alcantarilla					
Dosificación	No especifica					
Fecha Toma	22/09/2023	22/09/2023				
Fecha Rotura	29/09/2023	6/10/2023				
Diámetro (mm)	154,00	153,00				
Altura (mm)	307,00	305,00				
Peso (Kg)	12,998	13,149				
Área (mm^2)	18626,50	18385,39				
Volumen (mm^3)	5718336,37	5607542,61				
Densidad (Kg/m^3)	2273,04	2344,88				
Carga (KN)	273,90	307,60				
Edad (días)	7	14				
Resistencia Real (MPa)	14,70	16,73				
Resistencia Real Promedio (MPa)	2132,79	2426,62				
Resistencia Real ($lb/pulg^2$) PSI	149,30	169,86				
Resistencia Real (Kg/cm^2)						
Porcentaje resistencia a la compresión	71,09 %	80,89 %				
Tipo de falla	Tipo 2	Tipo 4				

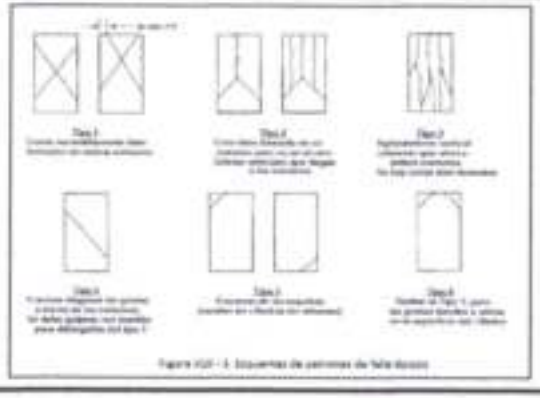

Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia Requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Florez Duran
M.P. 54202-251799 NTS
Especialista en Geotecnia Ambiental

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24-11-2022	24-11-2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24-11-2022	24-7-2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24-11-2022	24-7-2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16	1	2023	16	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16	1	2023	16	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16	1	2023	15	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15	9	2023	15	9	2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16	1	2023	15	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 16/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: **16/02/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ii

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL


CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/01/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 333,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E				Reprogramación No.1						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

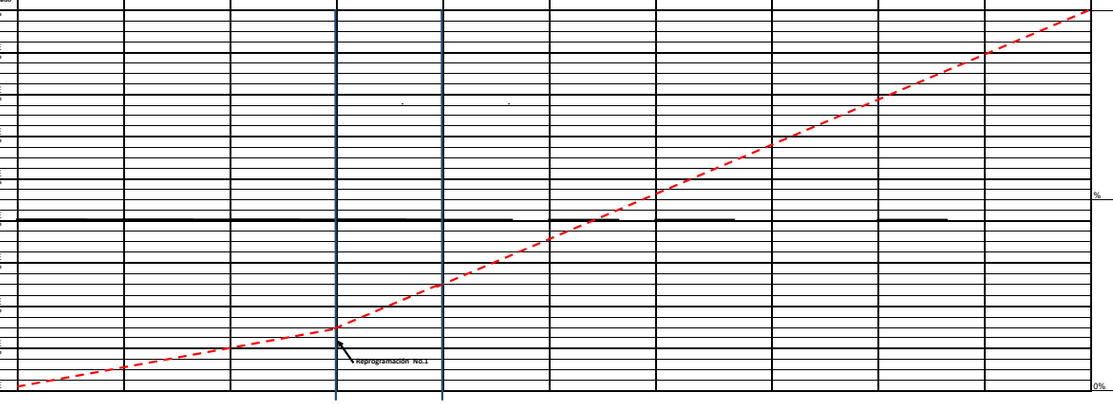

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL


CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 333,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

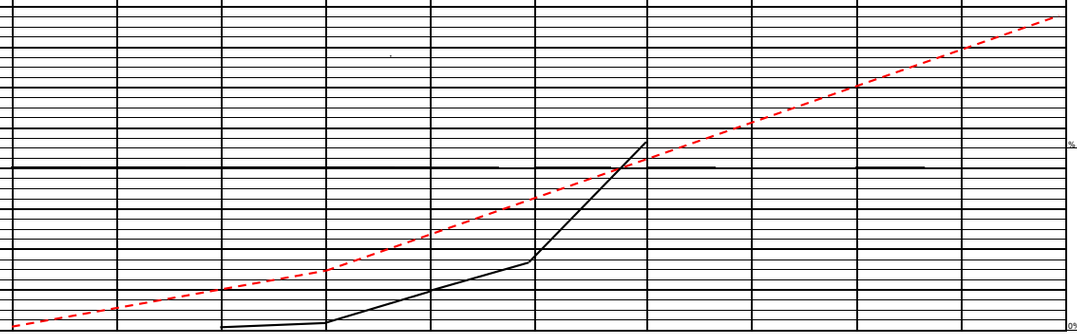

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.203.091.392,61

OBJETO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/12/2023

ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1400
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	11
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	50	50
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2	2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.180.493.836,00		$ 2.180.493.836,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 10.318.519,00		$ 10.318.519,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.318.519,00	1.960.518,61	$ 12.279.037,61
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.201.130.874,00	$ 1.960.518,61	**$ 2.203.091.392,61**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 597.719.978,60		$ 597.719.978,60	$ 597.719.978,60
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.231.808,42	$ 1.944.043,60	$ 12.175.852,02	$ 12.175.852,02
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 609.895.830,62**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.203.091.392,61

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 609.895.830,62

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 27,68%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 1 LLANO GRANDE - SAN PEDRO



CORREDOR 2 ESPERANCITA - CLAVELLINOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA			CORREDOR 2	I	I																													
PAJARITA			CORREDOR 2	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A																	
VIBROCOMPACTADOR			CORREDOR 1 Y 2	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I																	
8 VOLQUETAS SENCILLAS			CORREDOR 2	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I																	
MEZCLADORA			CORREDOR 2															A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 2															A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL ACTIVO				3	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				1	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	76	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	26	34%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	50	66%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: ANGIE ORTIZ
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0503283 NTS

Firma

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	0916-02	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 2.203.091.392,61	
TOTAL						$ 2.203.091.392,61	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.203.091.392,61**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP -004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA BELEN NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	1005075100	AYUDANTE	$ 1.160.000	12 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 734.667	$ 51.200	5	COOSALUD	71490643	$ 29.400	PORVENIR	71490643	$ 117.600	$ 29.400			
2	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	88183977	AYUDANTE	$ 1.160.000	12 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 734.667	$ 51.200	5	COOSALUD	71490643	$ 29.400	PORVENIR	71490643	$ 117.600	$ 29.400			
3	ORTIZ ACOSTA ANGIE MARCELA	1004860671	ING. RESIDENTE	$ 2.000.000	1 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 2.000.000	$ 139.200	5	SANITAS	71490643	$ 80.000	PORVENIR	71490643	$ 320.000	$ 80.000			
4	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1091668650	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.480.000,00	1 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 3.480.000	$ 242.300	5	SANITAS	71490643	$ 139.200	PORVENIR	71490643	$ 556.800	$ 139.200			
5	TORO MARTINEZ JESUS EMIRO	1091596227	AYUDANTE	$ 1.160.000	12 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 734.667	$ 51.200	5	COOSALUD	71490643	$ 29.400	PORVENIR	71490643	$ 117.600	$ 29.400			
6	TORO MARTINEZ JOSE DE DIOS	1091596228	AYUDANTE	$ 1.160.000	12 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 734.667	$ 51.200	5	COOSALUD	71490643	$ 29.400	PORVENIR	71490643	$ 117.600	$ 29.400			
7	MARTINEZ CORONEL URIEL	88183921	AYUDANTE	$ 1.160.000	12 al 30	CONSORCIO LA PLAYA	$ 734.667	$ 51.200	5	COOSALUD	71490643	$ 29.400	PORVENIR	71490643	$ 117.600	$ 29.400			
8	USUGA GUERRERO DEIBY	1091666570	OPERARIO	$ 1.160.000	1 2 3 4 5 6 7	DEIBY USUGA	$ 270.667	-	5	SANITAS S.A.	4520888261	$ 33.833	PORVENIR	4520888261	$ 43.400	-			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-38554

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901673967-2	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	3229281291	consorcioplacaslaplaya2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	LA PLAYA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71490643	$2.834.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	219.200	0		0		0	0	0	0	219.200	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	147.000	0		0		0	0	0	0	147.000	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.464.800	0	0	0	0	0	0		1.464.800	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	637.500				637.500	0	0	637.500			6.375	637.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	366.200	0	0	366.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	366.200	366.200
Pensión	1	1.464.800	1.464.800
Riesgos Laborales	1	637.500	637.500
CCF	1	366.200	366.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.834.700	2.834.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901673967-2	CONSORCIO LA PLAYA 2022		LA PLAYA	3229281291	consorcioplacaslaplaya2022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	LA PLAYA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71490643	$2.834.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005075100	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	1	0			S	X																230301	734.667	117.600	0	0	0	0	ESSC24	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF36	734.667	29.400	0	0	0	0	0
2	CC	88183977	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	1	0			S	X																230301	734.667	117.600	0	0	0	0	ESSC24	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF36	734.667	29.400	0	0	0	0	0
3	CC	1004860671	ORTIZ ACOSTA ANGIE MARCELA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF36	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1091668650	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF36	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
5	CC	1091596227	TORO MARTINEZ JESUS EMIRO	1	0			S	X																230301	734.667	117.600	0	0	0	0	ESSC24	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF36	734.667	29.400	0	0	0	0	0
6	CC	1091596228	TORO MARTINEZ JOSE DE DIOS	1	0			S	X																230301	734.667	117.600	0	0	0	0	ESSC24	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF36	734.667	29.400	0	0	0	0	0
7	CC	88183921	MARTINEZ CORONEL URIEL	1	0			S	X																230301	734.667	117.600	0	0	0	0	ESSC24	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF36	734.667	29.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1091666570
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEIBY USUGA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLAYA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	EDIFICIO PRIMAVERA IMPERIAL	TELÉFONO:	5695591
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4520888261**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/10/18	0	$ 0	$ 330.600
2023/10/19	1	$ 400	$ 331.000
2023/10/20	2	$ 700	$ 331.300
2023/10/23	5	$ 1.800	$ 332.400
2023/10/24	6	$ 2.100	$ 332.700
2023/10/25	7	$ 2.500	$ 333.100

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	**TOTAL PAGADO**
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 330.600**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	24	24		716
Lluvias moderadas																											2	2				4
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ANGIE ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0503283 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/10/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>70%	78,76%	SI	Resistencia a los 7 dias Huellas
2	10/10/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>80%	92,92%	SI	Resistencia a los 14 dias Huellas
3	26/08/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>70%	71,38%	SI	Resistencia a los 7 dias Cunetas
4	2/09/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA	INVE-410-13	LA PLAYA 3000 PSI	1	>80%	84,92%	SI	Resistencia a los 14 dias Cunetas
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO
NORMA INV E-410-13

OBJETO	'MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS".				
TIPO DE OBRA	INFRAESTRUCTURA VIAL	**LOCALIZACIÓN**	LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (VEREDA CALVELLINOS TRAMO 2)	**FECHA**	10/10/2023
ESTRUCTURA	PLACA HUELLA	**FUENTE**	CANTERA GUAYABAL	**CODIGO FORMATO**	ECC010SGS
SOLICITANTE	CONSORCIO LA PLAYA 2023	**DESCRIPCIÓN**	Concreto elaborado in situ	**DISEÑO**	3000 PSI

Prueba	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Descripcion de la muestra	HUELLAS			CUNETAS		
Dosificacion	1:2,73:3,74	1:2,73:3,74	1:2,73:3,74	1:2,73:3,74	1:2,73:3,74	1:2,73:3,74
Fecha Toma	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	19/08/2023	19/08/2023	19/08/2023
Fecha Rotura	3/10/2023	10/10/2023	24/10/2023	26/08/2023	2/09/2023	16/09/2023
Diametro (cm)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Carga (KN)	128,0	151,0	0,0	116,0	138,0	0,0
Edad (dias)	7	14	28	7	14	28
Resist Real (psi)	2362,93	2787,52	0,00	2141,41	2547,54	0,00
Resitencia Proyectada (psi)	3375,62	2934,24	0,00	3059,16	2681,62	0,00
Resistencia Real (Kg/Cm2)	141,78	195,13	0,00	128,48	178,33	0,00
Resitencia Proyectada (Kg/Cm2)	202,54	205,40	0,00	183,55	187,71	0,00
Porcentaje resistencia a la comprensión	78,76	92,92	0,00	71,38	84,92	0,00
Tipo de falla	Tipo 5	Tipo 4		Tipo 5	Tipo 4	

Resistencia 7 días > 70%

Resistencia 14 días > 80%

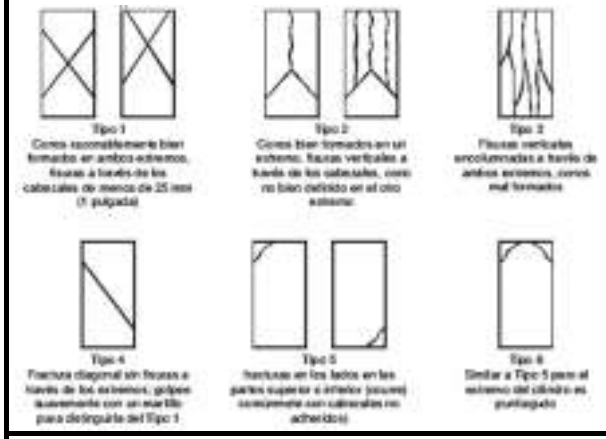

RICARDO CASTILLA DURAN
Ing. Civil
MP: 54202-363724 NTS
Esp. Geotecnia Ambiental

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 21/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. ------- FECHA DE VERSIÓN: **10/04/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL


CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.203.091.392,61 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.203.091.392,61

PLAZO ACUMULADO: 290,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

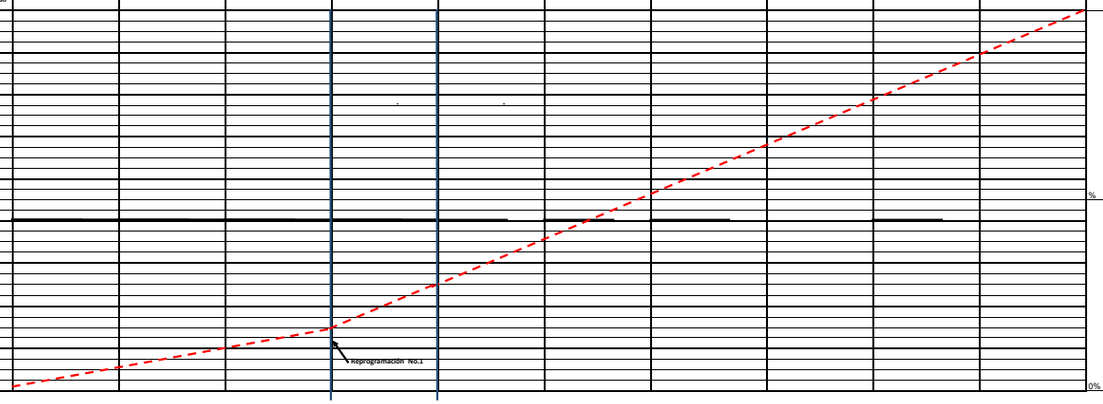

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: I.P-004 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL


CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.203.091.392,61 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.203.091.392,61

PLAZO ACUMULADO: 290,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

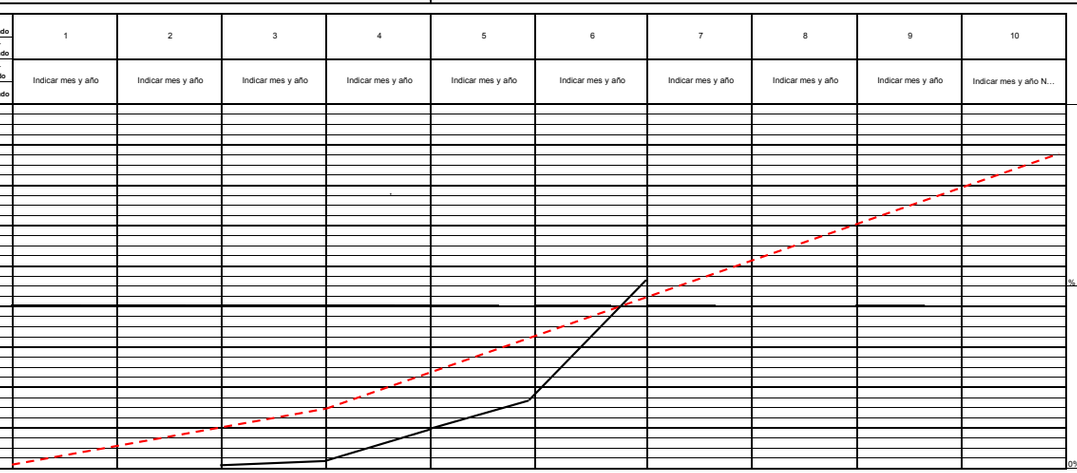

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 202 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 14/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/10/2023
PLAZO ACUMULADO: 182,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.703.523.226,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.703.523.226,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	2140
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	6
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	219	294
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.703.523.226,00		$ 1.703.523.226,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.703.523.226,00	$ -	**$ 1.703.523.226,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 238.193.628,00		$ 238.193.628,00	$ 238.193.628,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 19.555.069,31	$ 3.715.463,17	$ 23.270.532,48	$ 23.270.532,48
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 261.464.160,48**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.703.523.226,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 261.464.160,48
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 15,35%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 20
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **20**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA Y BORDILLO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO No. 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I		I	I	I	I	I	I		A	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADORA	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA			PAMPLONITA											A																			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3		3	3	3	3	3	3		4	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	
			TOTAL ACTIVO											2																			
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO	3	3		3	3	3	3	3	3		2	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	77	97%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.		INVIAS Y MUNICIPIO	202 DE 2022	$ 1.703.523.226	
TOTAL						$ 1.703.523.226	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.703.523.226,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 202-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	CIRO ALFONSO SIERRA JAIMES	5414762	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	CONFANORTE	27854268	$ 46.400	PORVENIR	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
2.	CARLOS RAFAEL GELVEZ PARADA	5.478.540	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	EPS SANITAS	27854268	$ 46.400	COLPENSIONES	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
3.	ANTONIO JOSE PARADA JAIMES	5.478.596	SURA	1.160.000.00										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 812.000,00	$ 56.600,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 32.500	PORVENIR	27854268	$ 130.000	$ 32.500	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
4.	CESAR DANIEL SALAZAR CONTRERAS	1.094.552.614	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	EPS SANITAS	27854268	$ 46.400	PORVENIR	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
5.	ALY MAURICIO VILLAMIZAR CAICEDO	1.072.529.634	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X																					UT COLOMBIA	$ 309.334,00	$ 21.600,00	V	EPS SANITAS	27854268	$ 12.400	COLPENSIONES	27854268	$ 49.500	$ 12.400	$ -	$ -	RETIRADO
6.	LEYDA MARCELA DUARTE LEAL	1.094.552.541	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 46.400	PORVENIR	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
7.	ROSA LIANA HERNANDEZ MARTINEZ	1.093.786.400	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 46.400	PROTECCIÓN	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
8.	ELIAS CRUZ PEÑALOZA	5.478.773	SURA	1.160.000.00	X	X																											UT COLOMBIA	$ 77.334,00	$ 5.400,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 3.100	COLPENSIONES	27854268	$ 12.400	$ 3.100	$ -	$ -	RETIRADO
9.	CARLOS JULIO CONDE DURAN	5.418.326	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 46.400	COLPENSIONES	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
10.	LUIS HUMERTO JAIMES SIERRA	5.479.015	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 46.400	PORVENIR	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
11.	JOSE ABELINO MANTILLA PORTILLA	88.154.443	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	EPS SANITAS	27854268	$ 46.400	PORVENIR	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
12.	SAMUEL VEGA ACERO	1.094.552.218	SURA	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27854268	$ 46.400	PORVENIR	27854268	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
13.	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	88.035.343	SURA	1.160.000.00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 928.000,00	$ 64.600	V	CONFAORIENTE	27854268	$ 37.200	PORVENIR	27854268	$ 148.500	$ 37.200	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
14.	FERNEY ALEXANDER CONTRERAS CONTRERAS	1.094.241.559	SURA	1.160.000.00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 928.000,00	$ 64.600	V	SANITAS	27854268	$ 37.200	COLPENSIONES	27854268	$ 148.500	$ 37.200	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
15.	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	1.094.552.339	SURA	1.160.000.00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 928.000,00	$ 64.600	V	SANITAS	27854268	$ 37.200	PORVENIR	27854268	$ 148.500	$ 37.200	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
16.	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	5.479.176	SURA	1.160.000.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 734.667,00	$ 51.200	V	NUEVA EPS	27854268	$ 29.400	PORVENIR	27854268	$ 117.600	$ 29.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
17.	PEDRO LION SUAREZ PARADA	5.478.682	SURA	1.160.000.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 734.667,00	$ 51.200	V	NUEVA EPS	27854268	$ 29.400	COLPENSIONES	27854268	$ 117.600	$ 29.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
18.	EDINSON ALEXIS CONTRERAS CONTRERAS	1.007.618.358	SURA	1.160.000.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 734.667,00	$ 51.200	V	NUEVA EPS	27854268	$ 29.400	COLPENSIONES	27854268	$ 117.600	$ 29.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
19.	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	5.478.647	SURA	1.160.000.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 734.667,00	$ 51.200	V	NUEVA EPS	27854268	$ 29.400	PORVENIR	27854268	$ 117.600	$ 29.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
20.	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	1.094.552.142	SURA	1.160.000.00												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 696.000,00	$ 48.500	V	NUEVA EPS	27854268	$ 27.900	COLPENSIONES	27854268	$ 111.400	$ 27.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
21.	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	88.160.653	SURA	1.160.000.00													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 657.334,00	$ 45.800	V	SANITAS	27854268	$ 26.300	COLPENSIONES	27854268	$ 105.200	$ 26.300	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
22.	CÉSAR ORLANDO SUÁREZ CAICEDO	1.005.012.045	SURA	1.160.000.00																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	$ 425.334,00	$ 29.700	V	NUEVA EPS	27854268	$ 17.100	PORVENIR	27854268	$ 68.100	$ 17.100	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra: LUIS EDUARDO BLANCO
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901653655	4	UNION TEMPORAL COLOMBIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 18 0 43 BR SAN LUIS		5710000			UTCOLOMBIA2023@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27854268	E	2023-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.646.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	27854268	2023-10-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 88251091	BARRERA CORREDOR ELMER JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
2	CC 5418326	CONDE DURAN CARLOS JULIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
3	CC 1007618358	CONTRERAS CONTRERAS EDINSON ALEXIS	1.160.000	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	734.667	117.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	734.667	29.400	COMFANORTE-CCF37	734.667	29.400	734.667	51.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.600	S	5429001
4	CC 1094241559	CONTRERAS CONTRERAS FERNEY ALEXANDER	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	COLPENSION ES-25-14	928.000	148.500	0	0	SANITAS-EPS005	928.000	37.200	COMFANORTE-CCF37	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
5	CC 5478773	CRUZ PEÑALOZA ELIAS	1.160.000	F		X														0			2	2	2	2	COLFONDOS-231001	77.334	12.400	0	0	SANITAS-EPS005	77.334	3.100	COMFANORTE-CCF37	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	24.000	S	5429001
6	CC 1094552541	DUARTE LEAL LEYDA MARCELA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
7	CC 5478647	FERNANDEZ CRUZ LUIS JACINTO	1.160.000	F	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	734.667	117.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	734.667	29.400	COMFANORTE-CCF37	734.667	29.400	734.667	51.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.600	S	5429001
8	CC 5478540	GELVEZ PARADA CARLOS RAFAEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
9	CC 1093786400	HERNANDEZ MARTINEZ ROSA LIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
10	CC 5479015	JAIMES SIERRA LUIS HUMBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
11	CC 88154443	MANTILLA PORTILLA JOSE AVELINO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
12	CC 5478596	PARADA JAIMES ANTONIO JOSE	1.160.000	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	812.000	130.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	812.000	32.500	COMFANORTE-CCF37	812.000	32.500	812.000	56.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	251.600	S	5429001
13	CC 88035343	RICO LEAL JOSE HUMBERTO	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	928.000	37.200	COMFANORTE-CCF37	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
14	CC 1094552142	RICO MENDOZA JAVIER ORLANDO	1.160.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	696.000	111.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	696.000	27.900	COMFANORTE-CCF37	696.000	27.900	696.000	48.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	215.700	S	5429001
15	CC 1094552614	SALAZAR CONTRERAS CESAR DANIEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
16	CC 5414762	SIERRA JAIMES CIRO ALFONSO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
17	CC 5479172	SILVA FERNANDEZ JOSE ALFREDO	1.160.000	F	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	734.667	117.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	734.667	29.400	COMFANORTE-CCF37	734.667	29.400	734.667	51.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.600	S	5429001
18	CC 1005012045	SUAREZ CAICEDO CESAR ORLANDO	1.160.000	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	425.334	68.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	425.334	17.100	COMFANORTE-CCF37	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5429001
19	CC 5478682	SUAREZ PARADA PEDRO LION	1.160.000	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	734.667	117.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	734.667	29.400	COMFANORTE-CCF37	734.667	29.400	734.667	51.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.600	S	5429001
20	CC 1094552218	VEGA ACERO SAMUEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
21	CC 1094552339	VERA FERNANDEZ RAUL ERNESTO	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	SANITAS-EPS005	928.000	37.200	COMFANORTE-CCF37	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
22	CC 1072529634	VILLAMIZAR CAICEDO ALI MAURICIO	1.160.000	F		X														0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFANORTE-CCF37	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
23	CC 88160653	VILLAMIZAR FLOREZ ORLANDO	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	657.334	105.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	26.300	COMFANORTE-CCF37	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5429001
24	CC 88226106	VILLAN VALENCIA FREDDY ALEXILI	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COOSALUD-EPS042	1.160.000	46.400	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901653655	4	UNION TEMPORAL COLOMBIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 18 0 43 BR SAN LUIS		5710000			UTCOLOMBIA2023@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27854268	E	2023-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.646.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	27854268		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.460.004	21.460.004	21.460.004	21.460.004	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				24	3.434.100	0	0	0	3.434.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	14	2.140.900	0	0	0	2.140.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	1.095.200	0	0	0	1.095.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	12.400	0	0	0	12.400
EPS(Administradoras: 5)				24	858.900	0	0	0	858.900
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	2	83.600	0	0	0	83.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	7	229.100	0	0	0	229.100
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	58.800	0	0	0	58.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	441.000	0	0	0	441.000
ARP(Administradoras: 1)				24	1.495.000	0	0	0	1.495.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	24	1.495.000	0	0	0	1.495.000
CCF(Administradoras: 1)				24	858.900	0	0	0	858.900
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	24	858.900	0	0	0	858.900
Gran Total					6.646.900	0	0	0	6.646.900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	24	24	23	24	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	22	23	24	24	24	23	24	23	24	24	23	24	23	24	24		708
Lluvias moderadas	2			1							1						1				1		1			1		1				9
Lluvias intensas									1							2																3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	28/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	Tramo 4 - A K0+250 Pamplonita	1	>95%	92,97%	NO	
2	28/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	Tramo 3 - A K0+140 Pamplonita	2	>95%	94,45%	NO	
3	28/09/2023	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	Tramo 3 - A K0+210 Pamplonita	3	>95%	93,84%	NO	

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29/3/2023	29/9/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

FECHA DE INICIO: 14/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/10/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **14/07/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----------
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---X-- NO ------- APROBADO: SI ---X-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 202 DE 2022


OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 182,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.703.523.226,00
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.703.523.226,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 14 Abril a 30 Abril-2023	2 1 de mayo A 31 de mayo - 2023	3 1 de Junio a 30 de Junio -2023	4 1 de Julio a 31 de Julio-2023	5 1 de agosto a 31 de Agosto-2023	6 1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2023	7 1 de Octubre a 13 de Octubre de 2023	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$1.573.583	92,37%		% P			0,52%	16,86%	30,80%	30,88%	20,95%			
				$ P			$8.125	$265.333	$484.596	$485.848	$329.682			
				$ E										
				% E										
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	$65.820	3,86%		% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$16.454	0,97%		% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	$4.200	0,25%		% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.660.057,30**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

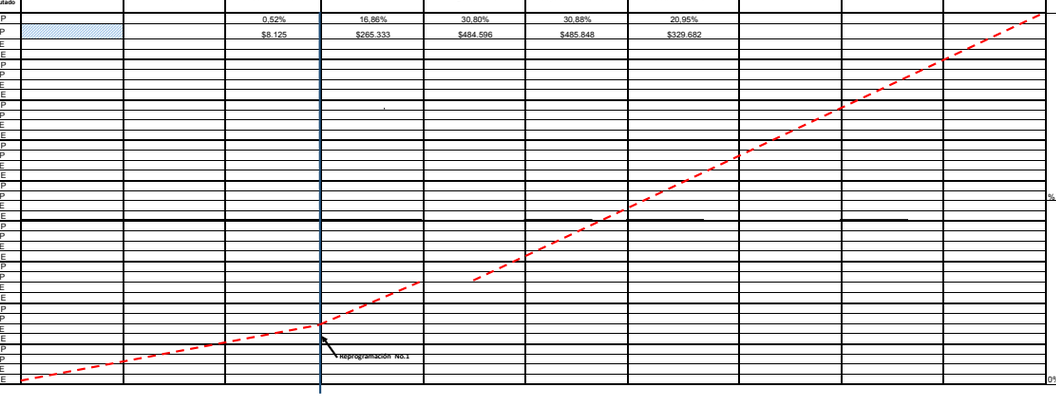

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565,32 / $ -	$ -	%
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.337,41 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00 / $ -	$ -	%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 17.563,20 / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 43.465,93	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.703.523,23**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma _____
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma: _____
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: _____
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: _____
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 202 DE 2022


OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 182.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.703.523.226,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.703.523.226,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

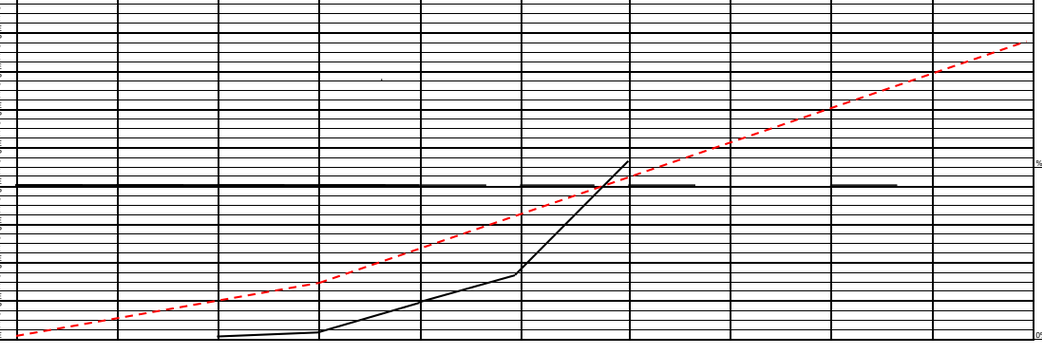

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tenoan considerados ítems de obra oue no se ouedan aoruoar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 9/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 8 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 16.898.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	16.013
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	112.258,97
	Mejoramiento	m2	168.980,72
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	84
	Gavion	m3	50

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	83,55	83,55
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	6981,18	15236,68
	mejoramiento	m2	10.936,83	45.048,23
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	0
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.461.634.569,00		$ 16.461.634.569,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 32.654.440,00	$ 204.519.914,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.865.372.886,00	$ 32.654.440,00	**$ 16.898.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 120.500.510,28		$ 120.500.510,28	$ 282.294.106,32
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 20.623.856,87	$ 3.918.532,81	$ 24.542.389,68	$ 75.672.368,18
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 9.000.000,00		$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
VALOR EJECUTADO			$ 154.042.899,96	**$ 366.966.474,50**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 16.898.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 366.966.474,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **2,17%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 45
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **45**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CORREDOR VIAL VEREDA BOYACA, MUNICIPIO DE GRAMALOTE



ADECUACION DE ANCHOS VEREDA COROZAL - CALIFORNIA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)



VERIFICACION DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y VERTICAL



VISTA GENERAL TRAMO DE PLACA HUELLA EJECUTADO 2-2 RINCONCADA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8	8		8	8		8	8	8		8	8		8	8	8		8	8		8	8	8		8	8		8	8	8	
			TOTAL ACTIVO	8	8		8	8		8	8	8		8	8		8	8	8		8	8		8	8	8		8	8		8	8	8	
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	176	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	176	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma

Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
			TOTAL			$ 16.898.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 16.898.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.461.634.569,00		$ 16.461.634.569,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 32.654.440,00	$ 204.519.914,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 16.865.372.886,00	$ 32.654.440,00	**$ 16.838.027.326,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Patiòn
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI ------ NO X VERSIÓN No. ------ FECHA DE VERSIÓN: ------

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☒

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOVIAL 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/04/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del actal)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 16.898.027.326,00 (Sección contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 16.898.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 243,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0 / 0	MES 1 / 10 ABRIL A 09 MAYO	MES 2 / 10 MAYO A 09 JUNIO	MES 3 / 10 JUNIO A 09 JULIO	MES 4 / 10 JULIO A 09 AGOSTO	MES 5 / 10 AGOSTO A 09 SEPTIEMBRE	MES 6 / 10 SEPTIEMBRE A 09 OCTUBRE	MES 7 / 10 OCTUBRE A 09 NOVIEMBRE	MES 8 / 10 NOVIEMBRE A 06 DICIEMBRE	
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3.739.008,10	22,13%		% P						8,13%	16,02%	16,55%	59,29%	100%
				$ P						$ 304.049,86	$ 598.966,29	$ 618.952,50	$ 2.217.019,45	
				$ E										
				% E										
Los Patios - Construccion Muros en Gavion	$ 11.397,70	0,07%		% P								20,00%	80,00%	
				$ P								$ 2.279,54	$ 9.118,16	
				$ E										
				% E										
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 263.474,72	1,56%		% P			-				0,40%	42,87%	56,73%	
				$ P							$ 1.047,83	$ 112.945,43	$ 149.481,47	
				$ E										
				% E										
Los Patios - Transporte	$ 18.795,21	0,11%		% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%	
				$ P						$ 2.864,03	$ 5.370,06	$ 5.549,06	$ 5.012,06	
				$ E										
				% E										
Los Patios - Señalizacion y seguridad	$ 4.154,02	0,02%		% P									100,00%	
				$ P									$ 4.154,02	
				$ E										
				% E										
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	1,29%		% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%	
				$ P						$ 33.196,13	$ 62.224,00	$ 64.298,13	$ 58.075,73	
				$ E										
				% E										
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 6.520.385,25	38,59%		% P				1,73%	8,66%	16,09%	18,68%	23,50%	32,35%	
				$ P				$ 112.715,09	$ 564.404,27	$ 983.709,99	$ 1.218.021,91	$ 1.532.257,65	$ 2.109.276,49	
				$ E										
				% E										
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1.043.472,98	6,18%		% P				0,34%	4,50%	12,74%	17,97%	31,71%	32,74%	
				$ P				$ 3.611,03	$ 46.961,41	$ 132.907,57	$ 187.561,42	$ 330.952,80	$ 341.668,66	
				$ E										
				% E										50%
Arboledas - Transporte	$ 50.363,66	0,30%		% P				1,30%	8,55%	15,88%	21,92%	27,23%	25,08%	
				$ P				$ 656,25	$ 4.306,66	$ 7.996,45	$ 11.037,21	$ 13.716,41	$ 12.631,69	
				$ E										
				% E										
Arboledas - Señalizacion y seguridad	$ 22.018,75	0,13%		% P									100,00%	
				$ P									$ 22.018,75	
				$ E										
				% E										
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	2,44%		% P			0,07%	1,31%	11,88%	21,32%	19,11%	24,34%	21,98%	
				$ P			$ 301,80	$ 5.385,56	$ 49.036,68	$ 87.972,15	$ 78.847,18	$ 100.428,61	$ 90.799,72	
				$ E										
				% E										
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.548.608,73	21,00%		% P				0,01%	8,02%	14,60%	22,10%	23,47%	31,81%	
				$ P				256,19	284.539,98	517.988,71	784.264,25	832.784,92	1.128.774,78	
				$ E										
				% E										
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 340.214,85	2,01%		% P					5,17%	8,44%	18,06%	33,64%	34,70%	
				$ P					$ 17.560,19	$ 28.696,44	$ 61.430,05	$ 114.450,26	$ 118.055,92	
				$ E										
				% E										
Gramalote - Transporte	$ 14.120,18	0,08%		% P				0,80%	6,30%	14,01%	25,91%	26,78%	24,19%	
				$ P				$ 113,47	$ 1.172,53	$ 1.978,51	$ 3.659,21	$ 3.781,19	$ 3.415,27	
				$ E										
				% E										
Gramalote - Señalizacion y seguridad	$ 22.439,21	0,13%		% P									100,00%	
				$ P									$ 22.439,21	
				$ E										
				% E										
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	1,38%		% P				0,82%	8,50%	16,68%	24,94%	25,78%	23,28%	
				$ P				$ 1.913,34	$ 19.771,20	$ 38.820,86	$ 58.048,35	$ 59.983,30	$ 54.178,46	
				$ E										
				% E										0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 16.461.834,56**	**97,42%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	38,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 835.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 6.426.816,78
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	100,0%
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.928.027,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ -		%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $ -		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392,76 / $ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.898.027,32**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar Mes o Año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ _____

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 0258 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROYA 0990

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 243,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 16.898.027.326,00 (Cuantía contrato adicional)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ _____

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **/C=A+B):** $ 16.898.027.326,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	0 / 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
						10 ABRIL A 09 MAYO	10 MAYO A 09 JUNIO	10 JUNIO A 09 JULIO	10 JULIO A 09 AGOSTO	10 AGOSTO A 09 SEPTIEMBRE	10 SEPTIEMBRE A 09 OCTUBRE	10 OCTUBRE A 09 NOVIEMBRE	10 NOVIEMBRE A 09 DICIEMBRE
													100%
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3.739.008,10	22,13%		% P						8,13%	16,02%	16,55%	59,29%
				$ P						$ 304.049,86	$ 598.986,29	$ 618.952,50	$ 2.217.019,46
				$ E									
				% E									
Los Patios - Construccion Muros en Gavion	$ 11.397,70	0,07%		% P								20,00%	80,00%
				$ P								$ 2.279,54	$ 9.118,16
				$ E									
				% E									
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 263.474,72	1,56%		% P							0,40%	42,87%	56,73%
				$ P							$ 1.047,83	$ 112.945,43	$ 149.481,47
				$ E									
				% E									
Los Patios - Transporte	$ 18.795,21	0,11%		% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%
				$ P						$ 2.864,03	$ 5.370,06	$ 5.549,06	$ 5.012,06
				$ E									
				% E									
Los Patios - Señalizacion y seguridad	$ 4.154,02	0,02%		% P									100,00%
				$ P									$ 4.154,02
				$ E									
				% E									
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	1,29%	0,13%	% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%
				$ P						$ 33.186,13	$ 62.224,09	$ 64.298,13	$ 58.075,73
			$ 21.849,40	$ E						$ 11.838,39	$ 10.011,01		
				% E						5,44%			
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 6.520.385,25	38,59%	0,38%	% P				1,73%	8,66%	15,09%	18,68%	23,50%	32,35%
				$ P				$ 112.715,09	$ 564.494,27	$ 983.709,99	$ 1.218.021,91	$ 1.532.257,64	$ 2.109.276,49
			$ 62.411,37	$ E				0,685%			$ 62.411,37		
				% E									
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1.043.472,98	6,18%		% P				0,34%	4,50%	12,74%	17,97%	31,71%	32,74%
				$ P				$ 3.511,03	$ 46.561,41	$ 132.907,57	$ 187.561,42	$ 330.062,88	$ 341.668,66
				$ E									
				% E									50%
Arboledas - Transporte	$ 50.363,66	0,30%		% P				1,30%	8,55%	15,88%	21,92%	27,23%	25,08%
				$ P				$ 656,25	$ 4.306,66	$ 7.996,45	$ 11.037,21	$ 13.716,41	$ 12.631,69
				$ E									
				% E									
Arboledas - Señalizacion y seguridad	$ 22.018,75	0,13%		% P									100,00%
				$ P									$ 22.018,75
				$ E									
				% E									
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	2,44%	0,94%	% P			0,07%	1,31%	11,88%	21,32%	19,11%	24,34%	21,98%
				$ P			$ 301,80	$ 6.385,56	$ 49.036,69	$ 87.972,15	$ 78.847,18	$ 100.428,61	$ 90.709,72
			$ 154.555,58	$ E					$ 113.172,85	$ 23.107,21	$ 17.724,43		
				% E					28,88%	5,65%			
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.548.608,73	21,00%		% P				0,01%	8,02%	14,60%	22,10%	23,47%	31,81%
				$ P				256,19	264.539,98	517.868,71	784.264,25	832.784,82	1.128.774,79
				$ E				0,002%					
				% E									
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 340.214,85	2,01%		% P					5,17%	8,44%	18,06%	33,64%	34,70%
				$ P					$ 17.590,19	$ 28.699,44	$ 61.430,05	$ 114.450,26	$ 118.055,92
				$ E									
				% E									
Gramalote - Transporte	$ 14.120,18	0,08%		% P				0,80%	8,30%	14,01%	25,91%	26,78%	24,19%
				$ P				$ 113,47	$ 1.172,63	$ 1.978,51	$ 3.659,21	$ 3.781,19	$ 3.415,27
				$ E									
				% E									
Gramalote - Señalizacion y seguridad	$ 22.439,21	0,13%		% P									100,00%
				$ P									$ 22.439,21
				$ E									
				% E									
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	1,38%	0,26%	% P				0,82%	8,50%	16,68%	24,04%	25,78%	23,28%
				$ P				$ 1.913,34	$ 19.771,26	$ 38.820,86	$ 58.048,35	$ 59.963,30	$ 54.178,46
			$ 43.476,44	$ E						$ 7.473,23	$ 15.000,00		
				% E						5,21%	15,47%		0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				% E									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 16.461.634,56**	**97,42%**	**1,71%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')													
			$ 282.292,79										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0,12%**	**0,15%**	**0,87%**	**4,95%**	**13,41%**	**17,09%**	**25,37%**	**38,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 26.009,13	$ 147.406,14	$ 835.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.890,92	$ 6.420.816,78
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0,12%**	**0,27%**	**1,14%**	**6,09%**	**19,50%**	**36,59%**	**61,96%**	**100,0%**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.928.027,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0,00%**	**0,05%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,41%**	**0,91%**		
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,60	$ 129.399,36	$ 69.207,82	$ 154.041,58		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0,00%**	**0,05%**	**0,08%**	**0,88%**	**1,26%**	**2,17%**		
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84 / $ -	$ -	%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ -	$ 63.590,23	%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $ -	$ 9.000,00	%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ -	$ 12.082,14	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392,76	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.898.027,32**	**$ 366.965,16**	**2,17%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma _____
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
E ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 11/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2023
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.159.028.732,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 5.159.028.732,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Batea		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5.040.831.650,00		$ 5.040.831.650,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391.912,00		$ 50.391.912,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 52.777.454,00	10.027.716,00	$ 62.805.170,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.149.001.016,00	$ 10.027.716,00	**$ 5.159.028.732,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.222.196,30	$ 802.217,30	$ 5.024.413,60	$ 38.311.152,70
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				
VALOR EJECCUTADO				**$ 38.311.152,70**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 5.159.028.732,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 38.311.152,70
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **0,74%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **1**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunion con las comunidades, entidad contratante, contratista de obra e interventoria para seguimiento y control al contrato.



Recorrido a lo largo del corredor vial para localizacion de las obras.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1049-22 del dia 13 de septiembre 2023, se le solicita al contratista plan de contingencia el cual le permita ponerse al dia en el componente de estudios y diseños, asi como en los tiempos de ejecucion de las obras que se encuentran atrasadas a la fecha.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO No. 2332 de 2023 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	**2**	3	4	5	6	7	8	**9**	10	11	12	13	14	15	**16**	17	18	19	20	21	22	**23**	24	25	26	27	28	29	**30**	31
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg	La Garita - La Mutis	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Motoniveladores			La Garita - La Mutis	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg	La Garita - La Mutis	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg	La Garita - La Mutis	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg	La Garita - La Mutis	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5
TOTAL ACTIVO				0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
TOTAL EN REPARACIÓN				0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
TOTAL INACTIVO				5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	130	100%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Teniendo en cuenta que a la fecha no se realizan actividades toda la maquinaria se encuentra INACTIVA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/092023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.		INVIAS Y MUNICIPIO	2332 DE 2022	$ 5.159.028.732	
			TOTAL			$ 5.159.028.732	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.159.028.732,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 5.040.831.650,00		$ 5.040.831.650,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391.912,00		$ 50.391.912,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 52.777.454,00	$ 10.027.716,00	$ 62.805.170,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
			$ -
VALOR TOTAL	$ 5.149.001.016,00	$ 10.027.716,00	**$ 5.159.028.732,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIMEBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/11/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/6/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

FECHA DE INICIO: 11/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **9/06/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 183,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU/ 10/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 5.159.028.732,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 5.159.028.732,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
					0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE
Construccion Placa Huella	$ 4.487.119,47	86,98%		% P					4,15%	29,66%	34,74%	31,46%
				$ P					$ 186.124,35	$ 1.330.666,20	$ 1.558.648,83	$ 1.411.680,09
				$ E								
				% E								
Construccion Muros en Gavion	$ 13.615,92	0,26%		% P					33,33%	66,67%		
				$ P					$ 4.538,64	$ 9.077,28		
				$ E								
				% E								
Construccion Alcantarillas	$ 459.515,73	8,91%		% P				10,63%	47,94%	41,42%		
				$ P				$ 48.857,41	$ 220.308,42	$ 190.349,89		
				$ E								
				% E								
Transporte	$ 25.153,13	0,49%		% P				23,64%	54,55%	21,82%		
				$ P				$ 5.945,26	$ 13.719,89	$ 5.487,96		
				$ E								
				% E								
Señalizacion y seguridad	$ 7.701,66	0,15%		% P								100,00%
				$ P								$ 7.701,66
				$ E								
				% E								
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%		% P				42,86%	57,14%			
				$ P				$ 20.453,89	$ 27.271,86			
				$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.040.831,65**	**97,71%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			**0,85%**	**1,79%**	**6,90%**	**32,26%**	**27,51%**	**30,69%**
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 92.585,15	$ 356.087,41	$ 1.664.150,21	$ 1.419.050,79	$ 1.583.464,62
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			**0,85%**	**2,64%**	**9,54%**	**41,80%**	**69,31%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 136.275,70	$ 492.363,11	$ 2.156.513,32	$ 3.575.564,11	$ 5.159.028,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391,91 / $ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45 / $ -		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00 / $ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.027,72 / $ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.197,08		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.159.028,73**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: ANDREA FAJARDO CORREDOR
Recresentante Lgal
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ **DE** ____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 5.159.028.732,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 5.159.028.732,00

PLAZO ACUMULADO: 183,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0 / 0	0 / 0	MES 1 / 11 MAYO AL 10 JUNIO	MES 2 / 11 JUNIO AL 10 JULIO	MES 3 / 11 JULIO AL 10 AGOSTO	MES 4 / 11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	MES 5 / 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	MES 6 / 11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE
Construccion Placa Huella	$ 4.487.119,47	86,98%		% P					4,15%	29,66%	34,74%	31,46%
				$ P					$ 186.124,35	$ 1.330.666,20	$ 1.558.648,83	$ 1.411.680,09
				$ E								
				% E								
Construccion Muros en Gavion	$ 13.615,92	0,26%		% P					33,33%	66,67%		
				$ P					$ 4.538,64	$ 9.077,28		
				$ E								
				% E								
Construccion Alcantarillas	$ 459.515,73	8,91%		% P				10,63%	47,94%	41,42%		
				$ P				$ 48.857,41	$ 220.308,42	$ 190.349,89		
				$ E								
				% E								
Transporte	$ 25.153,13	0,49%		% P				23,64%	54,55%	21,82%		
				$ P				$ 5.945,28	$ 13.719,89	$ 5.487,96		
				$ E								
				% E								
Señalizacion y seguridad	$ 7.701,66	0,15%		% P								100,00%
				$ P								$ 7.701,66
				$ E								
				% E								
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%		% P				42,86%	57,14%			
				$ P				$ 20.453,89	27.271,86			
				$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 5.040.831,65**	**97,71%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												

100%
50%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			**0,85%**	**1,79%**	**6,90%**	**32,26%**	**27,51%**	**30,69%**
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 92.585,15	$ 356.087,41	$ 1.664.150,21	$ 1.419.050,79	$ 1.583.464,62
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			**0,85%**	**2,64%**	**9,54%**	**41,80%**	**69,31%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 136.275,70	$ 492.363,11	$ 2.156.513,32	$ 3.575.564,11	$ 5.159.028,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,65%**	**0,09%**	
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$0	$0	$ 33.286,74	$ 5.024,41	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,65%**	**0,74%**	
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$0	$0	$ 33.286,74	$ 38.311,15	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391,91	$ -	%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45	$ 32.194,25	%
	$ -		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00	$ -	%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.027,72	$ 6.116,91	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.197,08	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.159.028,73**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 38.311,15**	**0,74%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407
PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 2/05/2023
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.499.989.139,00
OBJETO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/12/2023
ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE 2022
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1890
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Batea		
	Alcantarillas	und	10
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla			
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.499.989.139,00		$ 2.499.989.139,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.499.989.139,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 44.842.560,00		$ 44.842.560,00	$ 44.842.560,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.031.327,02	$ 1.715.952,13	$ 10.747.279,15	$ 10.747.279,15
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 55.589.839,15**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.499.989.139,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 55.589.839,15
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,22%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 13
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ALCANTARILLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA			PR07+0110	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
PAJARITA			PR07+0110	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR			PR07+0110	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA			PR07+0110	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL ACTIVO				4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	104	87%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	13%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Enier Caamaño

Nombre: ENIER JESUS CAAMAÑO MARTINEZ
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: C01 PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL OCAÑA BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN	13368842	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS	7897545847	$ 48.400	COLFONDOS	7897545847	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
2.	ENIER JESUS CAMAÑO MARTINEZ	1065821078	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT OCAÑA GBE 2022	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS	7895233988	$ 48.400	COLFONDOS	7895233988	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
3.	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	91541702	PROFESIONAL SST	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT OCAÑA GBE 2022	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS	7895233988	$ 48.400	COLPENSIONES	7895233988	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
5	LUIS CARLOS TAMAYO OCHOA	1091654453	CADENERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOPAGOS	$ 1.160.000	$ 80.000	V	CAJA COPI EPS	27971051	$ 48.400	PORVENIR	27971051	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
6	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	1091673791	AUX INGENIERIA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	CONSORCIO VIAS PGR	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7899077824	$ 48.400	PORVENIR	7899077824	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
7	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	1091676848	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	COMERCIALIZADORA OMEGAZESE	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS	7897513971	$ 48.400	COLPENSIONES	7897513971	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
8	CARLOS ALBERTO NAVARRO	1007912734	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOPAGOS	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS	27971051		PORVENIR	27971051			$ -	$ -	
9	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	1091683385	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOPGAOS	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	27971051		PORVENIR	27971051			$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre:
Director de Obra Luis Javier Carrascal Quin
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-17 la empresa ASOPAGOS S.A con documento de identificación NI 901318465 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante NAVARRO CAÑIZARES CARLOS ALBERTO identificado con CC-1007912734, dirigido a las siguiente entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901318465	ASOPAGOS S.A

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27971051	E	2023-10-17	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	26
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	26
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	26
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	26

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-17 la empresa ASOPAGOS S.A con documento de identificación NI 901318465 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante TAMAYO OCHOA LUIS CARLOS identificado con CC-1091654453, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901318465	ASOPAGOS S.A

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27971051	J	2023-10-17	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	CAJACOPI EPS S.A.S	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-17 la empresa ASOPAGOS S.A con documento de identificación NI 901318465 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GUERRERO QUINTERO DANY ALEJANDRO identificado con CC-1091683385, dirigido a las siguiente entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901318465	ASOPAGOS S.A

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27971051	E	2023-10-17	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	26
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	26
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	26
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	26

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901667678
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL OCANA GBE 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE13#10-62	TELÉFONO:	6124132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:				**7895233988**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2023/10/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		217538171

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 371.200**	**$ 0**	**$ 371.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 92.800
SUBTOTALES:													**$ 92.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 92.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 161.600	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 161.600
SUBTOTALES:									**$ 161.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 161.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 92.800**	**$ 0**	**$ 92.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1065821078	CAAMANO MARTINEZ ENIER JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91541702	FORERO GANDUR FABIAN CAMILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 718.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901595556
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROMOTORA COMERCIALIZADORA OMEGAZESE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#10-62	TELÉFONO:	6124132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no especializado.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7897513971**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			179199000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										**$ 371.200**	**$ 0**	**$ 371.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 92.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 92.800
SUBTOTALES:													**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	2	$ 92.800	$ 0	$ 92.800
CCF37	CCF37-COMFANORTE	2	$ 92.800	$ 0	$ 92.800
SUBTOTALES:			**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13363842
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAG 109 NO. 15-60 OF 305	TELÉFONO:	6123908
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7897545847**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		217546861	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 185.600	$ 600	$ 186.200
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 600**	**$ 186.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 46.400	$ 200	$ 0	$ 46.600
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 46.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 46.400	$ 200	$ 46.600
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 200**	**$ 46.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 13363842	CARRASCAL QUIN LUIS JAVIER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF21-CAFAM	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 285.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901723202
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS PGR 2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA11#7A-26	TELÉFONO:	6124132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7899077824**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		212123252	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 185.600	$ 1.400	$ 187.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 0	$ 1.113.600	$ 8.100	$ 1.121.700
SUBTOTALES:										**$ 1.299.200**	**$ 9.500**	**$ 1.308.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 139.200	$ 1.100	$ 0	$ 140.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 139.200	$ 1.100	$ 0	$ 140.300
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 46.400	$ 400	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES:													**$ 324.800**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 327.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 565.600	$ 565.600	$ 4.100	$ 0	$ 569.700
SUBTOTALES:									**$ 565.600**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 569.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 92.800	$ 700	$ 93.500
CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 232.000	$ 1.700	$ 233.700
SUBTOTALES:			**$ 324.800**	**$ 2.400**	**$ 327.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1091672939	PEREZ ORTIZ JHONATAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1091673791	TORRES DIAZ AURA CRISTINA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1091675151	PINEDA CASADIEGO DAVID STEVEN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1091675774	CHURIO BAYONA CRISTHIAM ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 18968822	CERVANTES PADILLA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 88280755	PEREZ CONTRERAS LENIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 88283744	GOMEZ ASCANIO HUGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.533.000**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		NACION	Contrato Principal	$ 2.499.989.139	
TOTAL						$ 2.499.989.139	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.499.989.139,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Enier Caamaño
Nombre: ENIER JESUS CAAMAÑO MARTINEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	25/09/2023	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	TRAMO 5	1	>95%	96,3%	SI	PR 07+475
2	25/09/2023	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	TRAMO 5	1	>95%	99,4%	SI	PR 07+380
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	ENSAYOS LABORATORIO	Código: FR-LAB-20
	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	Versión: 02
	NORMA INVE-161-13	Fecha: Diciembre 06 de 2022

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER				
TIPO DE OBRA	Placa Huella	LOCALIZACION	Corregimiento de Buenavista, Ocaña, Norte de Santander	FECHA	25/09/2023
SOLICITANTE	Unión Temporal Ocaña GBE	MATERIAL	Terraplen		

PRUEBA No.	1	2								
ABSCISA	7+475	7+380								
COSTADO	Derecho	Eje								
PROFUNDIDAD DEL ENSAYO (cm)	10,0	11,0								
Peso de frasco + arena inicial (grs.)	6126,0	6106,0								
Peso de frasco + arena restante (grs.)	1650,0	1892,0								
Peso de los retenidos en 3/4 " (grs.)	166,00	384,00								
Peso de los retenidos en 3/4 " seco (grs.)	164,36	380,20								
Peso especifico SH. Material retenido en 3/4"	2,570	2,570								
Porcentaje de material retenido en 3/4" seco	4,12%	10,07%								
Peso de arena total usada (grs.)	4476,0	4216,0								
Constante del cono	1686	1686								
Peso de arena en el hueco (grs.)	2790,0	2530,0								
Densidad de la arena (grs/cm3)	1,409	1,409								
Volumen del hueco (cm3)	1980,13	1795,60								
Peso del material extraido humedo (grs.)	4148,0	4038,0								
Porcentaje de material pasa 3/4" seco	95,88%	89,93%								
Peso del material extraido seco (grs.)	3987,2	3773,8								
DENSIDAD DEL MATERIAL TOTAL (grs/cm^3)	2,014	2,102								
DENSIDAD CORREGIDA DEL MATERIAL PASA 3/4" (grs/cm3)	1,995	2,060								
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO PASA 3/4" (grs/cm^3)	2,072	2,072								
% DE HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	7,10%	7,10%								
% DE COMPACTACION DEL TERRENO	96,3%	99,4%								
% DE COMPACTACION ESPECIFICADO	95%	95%								
VERIFICACION	CUMPLE	CUMPLE								
CONTENIDO DE HUMEDAD PASA 3/4"	4,03%	7,00%								
CONTENIDO DE HUMEDAD RETENIDO 3/4"	1,00%	1,00%								
Numero de resultados n										
Constante K										
Valor promedio de la muestra Vm										
Desviación estandar de la muestra										
Promedio Estimado del lote Vi(P)										

Ing. Victor Alfonso Florez Duran
MP: 54202-251799 NTS
Especialista en Geotecnia Ambiental

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	9	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.499.989.139,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 249.998.913,90	29	12	2022	28	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 124.999.456,95	29	12	2022	29	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249.998.913,90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEUGROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	12	22	29	4	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. ------- FECHA DE VERSIÓN: **19/04/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- **x** NO ------- APROBADO: SI ------- **x** NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ii

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4362407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.499.989.139,00

PLAZO ACUMULADO: 229,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

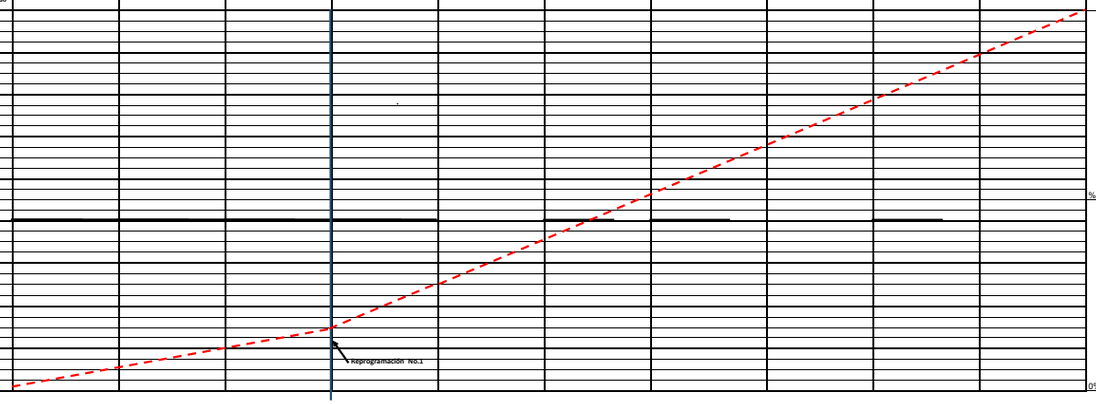

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.499.989.139,00

PLAZO ACUMULADO: 229,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

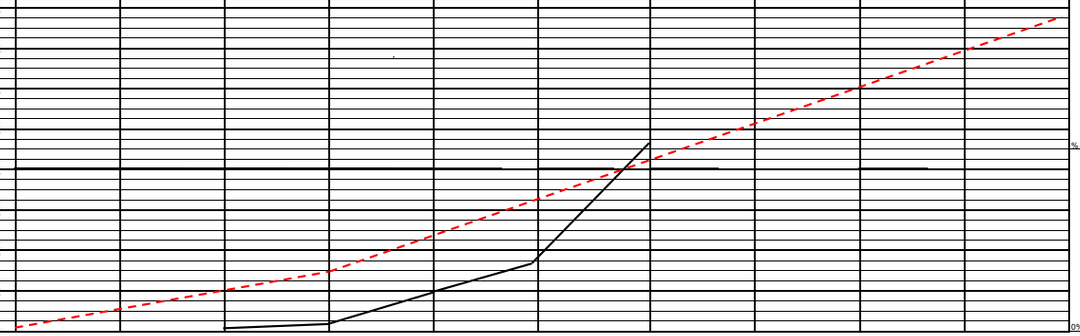

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 MUNICIPIO DE ABREGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 25, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

-Componente Social.
-PAGA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 15 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 25.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, a Ambiental y el área Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenía un compromiso de la semana anterior la cual no hizo entrega los informes trimestrales del componente Social.

El Contratista comenta que tienen varias dudas y solicita una mesa de trabajo, por ese motivo no han podido avanzar con los formatos.

Se da continuidad al avance con Corte del día 7 de septiembre de 2023, con un programado del 29,70% un ejecutado del 25,95% con un atraso de 3.75%.

Se tiene una metafísica del corredor 1, con una longitud prevista para ejecutar de 1150 metros lineales y se tiene ejecutadas 771.5 metros lineales paño completo, tenemos una longitud pendiente que se está ejecutando que es de 382 metros lineales, que para cumplir con estos metros lineales tenemos 67 días en el cual el rendimiento sería en este corredor de 6 metros lineales al día.

Tenemos un avance de metafísica del corredor 2, se tiene una longitud prevista ejecutar de 1251.35 metros lineales, en el momento no tenemos todavía ejecución en este corredor, la misma longitud pendiente, se tiene 81 días laborales para la finalización, se tendría un rendimiento requerido de 15.5 metros lineales día.

Personal en obra se tiene, total empleos generados 17, directos 7, indirectos 12 y de la zona de influencia 12, en el sitio que se está interviniendo hay una mezcladora y un vibrador de concreto.

Inconvenientes presentados a la fecha, se tiene la escasez de suministro de triturado y el mal tiempo de la lluvia, el factor climático que está afectando en los últimos días.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa de pre construcción se encuentra aprobada, en excepción el PAGA.

Se da continuidad con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños también se encuentra aprobado, solo está pendiente con observaciones es el concepto de los taludes.

.

Las actividades en obra en estos momentos se están interviniendo para conocimiento de todo el corredor 1, ya con 3 tramos terminados al 100% con sello de Juntas y alcantarillas, se está interviniendo es el tramo del Chorro 2, se tiene a la fecha 66 metros lineales de fundidos de paño completo y la instalación, está en ejecución la actividad de una de las alcantarillas que tenemos en ese tramo.

La Interventoria continua con la información SST comenta que se recibió el informe mensual de SST. Está pendiente la entrega de planilla de seguridad social del personal Contratista y subcontratista correspondiente al mes de agosto de 2023.

El Contratista afirma que va enviar la planilla de seguridad social hoy en horas de la mañana.

Se continua con el componente Ambiental afirma que el Contratista hizo la entrega del documento PAGA el día 13 de septiembre del 2023.

Con respecto al componente Social comenta que el Contratista le falta por entregar: Informes Trimestrales desde la firma del acta de inicio de obra (16 de enero de 2023); igualmente, se recuerda al Contratista presentar del tramo número dos (2) las Actas de Vecindad, Actas de Compromiso y Certificados de Territorialidad. El Consorcio AD VÍAS ha presentado la siguiente documentación del tramo número uno (1); Certificados de Territorialidad; Actas de Compromiso y Actas de Vecindad; así mismo, se envía a la Interventoría la Socialización Inicio de Obra, Solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior, y la NO OBJECIÓN en su componente social al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) presentado. Es de resaltar que, se remiten documentos por parte de la Alcaldía Municipal y el Contratista sobre la NO Conformación de la Veeduría Ciudadana, esto debido al sentir de la comunidad, al no ver necesario el conformar dicho comité.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero solicita que le haga llegar las actas de las reuniones que se hallan hecho con la comunidad.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Pago Planillas e seguridad social	15/09/2023	CONTRATISTA
Mesa de trabajo - componente Social	PENDIENTE FECHA	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/09/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	DIRECTOR	CONSORCIO AD VIAS	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AD VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

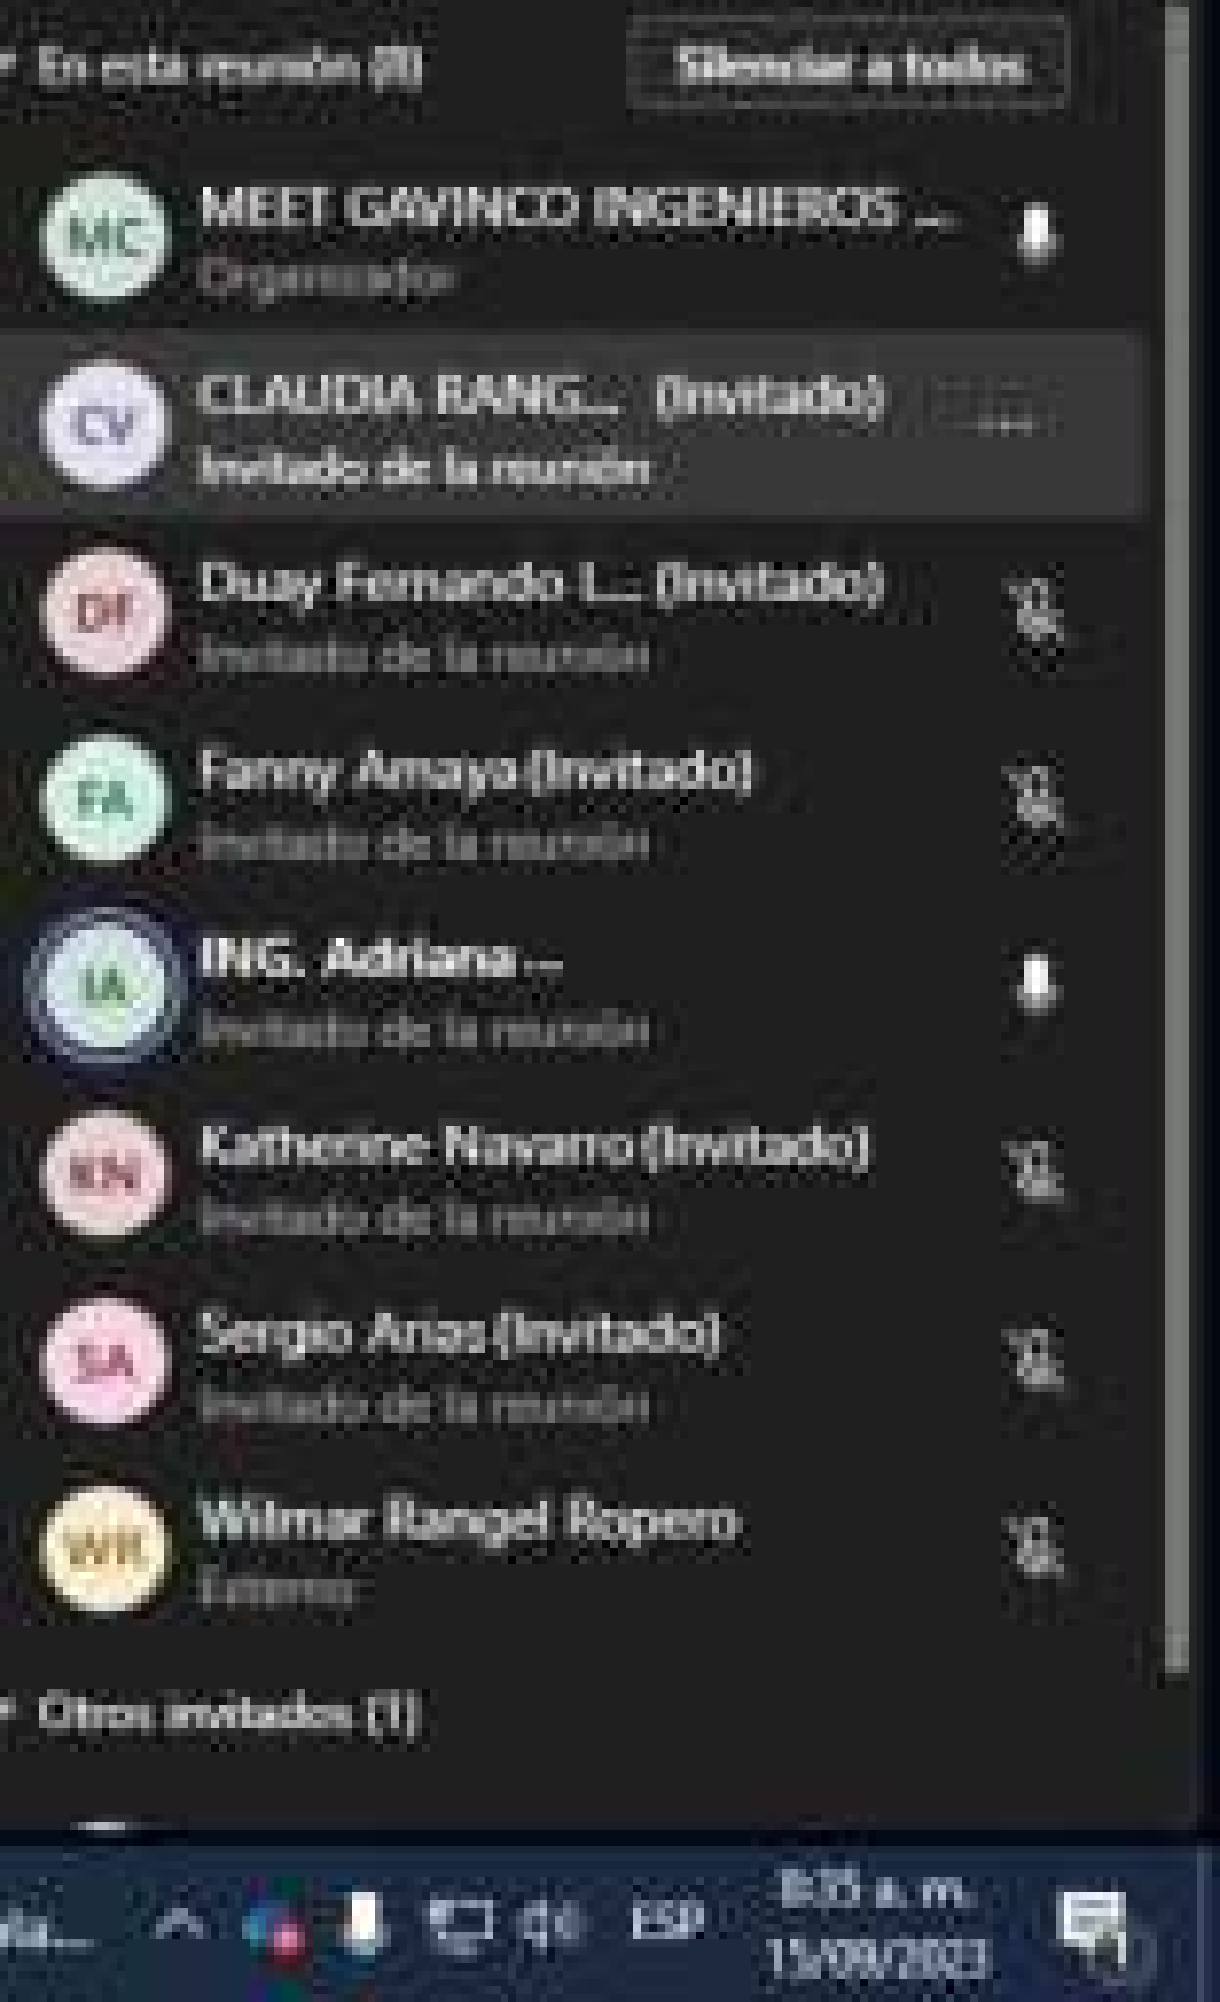
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS ...
Organizador
CLAUDIA RANG... (Invitado)
Invitado de la reunión
Duay Fernando L... (Invitado)
Invitado de la reunión
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana ...
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
Sergio Arias (Invitado)
Invitado de la reunión
Wilmar Rangel Ropero
Otros invitados (1)
ESP
8:35 a. m.
15/09/2023

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 MUNICIPIO DE ABREGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 26, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

-Mesa de Trabajo del componente Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 29 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 26.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST y Ambiental.

La Interventoria comenta que está a la espera del nuevo profesional social de la cual no se ha podido cumplir al Contratista a realizar una mesa de trabajo que están solicitando.

Ya la hoja de vida del profesional Social quedó radicada ante el INVIAS esta semana, hace falta por aprobación del INVIAS Central.

El Contratista manifiesta que se requiere al profesional Social porque lo que se va a tratar en esa mesa de trabajo son los formatos trimestrales y solamente lo conocen son ellos.

Se da seguimiento al avance en cifras con corte del 21 de septiembre de 2023, un programado del 40,79% versus ejecutado del 28,11% se tiene un atraso de 12,68%.

Toma la palabra el ingeniero Cristiam Mauricio Rodríguez Acevedo desea saber
si el plan de trabajo es vigente o todavía se continúa trabajando con el anterior, si ese atraso que se está reflejando es por documentación antigua y en caso tal de que así sea, cuándo puede ser posible que tengan al día toda la información para poder hacer un seguimiento.

La Interventoria comenta que el avance del corredor 1, ya se está terminando, faltan 310 metros lineales y el atraso que se tiene es el avance del corredor 2 que aún no hemos iniciado, allí se tenía el inconveniente de los acarreos.

Toma la palabra el ingeniero Sergio Arias comenta con respecto al avance del corredor 2, esta semana se tenía proyectado enviar material que se ha dificultado un poco por las lluvias, aumentaron el caudal del río y fue imposible pasar material de igual manera ya los maestros están asignados, se espera el día lunes poder mandar maquinaria y poder avanzar en el corredor 2, estamos a la espera que baje un poco el río para que las volquetas puedan pasar las máquinas.

La Interventoria le solicita al Contratista hacer llegar un informe fotográfico, donde se evidencia esa dificultad que se ha presentado allá en el cargo de las volquetas.

El ingeniero Sergio Arias comenta con respecto al corredor número 1, que fue algo que comento el día de ayer vía telefónica que se ha atrasado mucho el tema de que no podemos ingresar volquetas porque debido a las fuertes lluvias.

El Contratista comparte un oficio que fue dirigido el 27 de septiembre de 2023, por la Junta de Acción Comunal y esta es la solicitud que ellos realizan, igualmente se dirigieron a la alcaldía y le dijeron que no, que no les iban a colaborar para el suministro del material.

El Contratista indica que el oficio dice, la presente tiene como fin comunicarle que desde el pasado 24 de septiembre de 2023, a razón de una fuerte lluvia que se presentó en la zona, causó el daño de casi total del tramo de la vía donde está ubicada una alcantarilla Sector los limones por tal motivo, le solicitamos muy respetuosamente nos apoyen con los materiales necesarios para realizar la recuperación de este tramo lo antes posible. La Comunidad está en toda la disposición de trabajar articuladamente para dar a darle rápida solución a este daño, ya que si no se realiza esta recuperación lo más rápido posible nos quedaríamos incomunicados totalmente y es el presidente de la vereda la Ye del Chorro.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero hace una aclaración que ya está soportado y sustentado, pero no podemos agarrar y sacar de un corredor para el otro, porque eso no es así, como dice el Contratista, se hacen lo humanamente posible, y si no se puede, pues se suspende, porque tampoco es que se le recargue toda una persona. El municipio debe colaborar, debe estar presto a colaborar.

La Interventoria hace un recuento del avance de metafísica del corredor 1 que llevamos, tenemos una longitud que, para ejecutar en ese corredor de 1150 metros lineales, de los cuales este ya tenemos 843.5 metro lineales completos, solamente nos faltan por ejecutar 310 metros lineales, nos quedan 65 días hábiles y esto notaría para este corredor y un rendimiento de 4.8 metros lineales al día, que se está haciendo más de este rendimiento requerido.

En el avance metafísica del corredor 2, que son 1251.35 metros lineales, los cuales en el momento no hemos iniciado, tenemos 65 días y 19 metros lineales, días que deberíamos ejecutar a la fecha.

El personal en obra del corredor 1, tenemos empleos generados 20, directo 7, indirectos 13 y de la zona de influencia 15.

En estos momentos en el corredor 1 tenemos la mezcladora y el vibrador de concreto, aparte de Rana y demás herramientas menores.

Los Inconvenientes presentados a la fecha, es el factor climático y las lluvias que repentinamente tenemos, se puede decir que a diario y ya para este sector, son bastante fuertes.

Se da continuidad al avance de entrega documental etapa pre construcción, se tiene todo aprobado

En cuanto a la revisión de Estudios y Diseños todo está probado, tan solo tenemos se tiene una observación, pero se ha aclarado que es el concepto de unos taludes que salía cuando nos pasaron el diseño y el ingeniero Sergio Arias quedó en el compromiso que ya en los récords iba hacer esta corrección.

La Interventoria continua con las actividades en obras, se tiene la instalación de la tubería, el relleno y la compactación de esta, tenemos instalación de amarre de acero figurado, ya se fundió los sobre anchos.

En cuanto a la información SST, se le realiza seguimiento a la ejecución del SG-SST, a la espera del informe mensual SST.

En el componente Ambiental, ya se revisó el documento PAGA, ya se le dio la aprobación y la próxima semana se estará enviando el oficio al Contratista y se le recuerda la entrega del informe mensual mes de septiembre de 2023, el día de mañana.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero pregunta cuántas alcantarillas van ejecutadas en el corredor 1.

La Interventoria manifiesta que el tramo de Santa Lucía ya se ejecutó y se realizó una alcantarilla ya ese tramo está al 100% el tramo de la Ye del Chorro también tiene su respectiva alcantarilla. En total son 6 alcantarillas, solamente falta por ejecutar una alcantarilla, la del Ye del Chorro 1.

Se recomienda emitirle un oficio proyectarlo al municipio comentándole también la situación que el Contratista y la Comunidad también y nosotros, presionar al municipio comentando la gravedad del tema, que si no se construye se puede paralizar el proyecto y dejarlo muy claro la trazabilidad.

Se le recuerda al Contratista la entrega de los diseños aprobados, por qué nosotros como Interventoría tenemos que hacerlos llegar al INVIAS, la entrega de los físicos en original.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, agradecerle la participación y desearles que tengan un feliz resto de tarde a todos, muchas gracias.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Acta Parcial	PENDIENTE FECHA	CONTRATISTA
Diseños Aprobados (físicos)	PENDIENTE FECHA	CONTRATISTA
Mesa de Trabajo - Componente Social	PENDIENTE FECHA	INTERVENTORIA
Oficio al Municipio	PENDIENTE FECHA	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/10/2023 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	DIRECTOR	CONSORCIO AD VIAS	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
BRAYAN CAMILO CRIADO	APOYO INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
SERGIO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AD VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

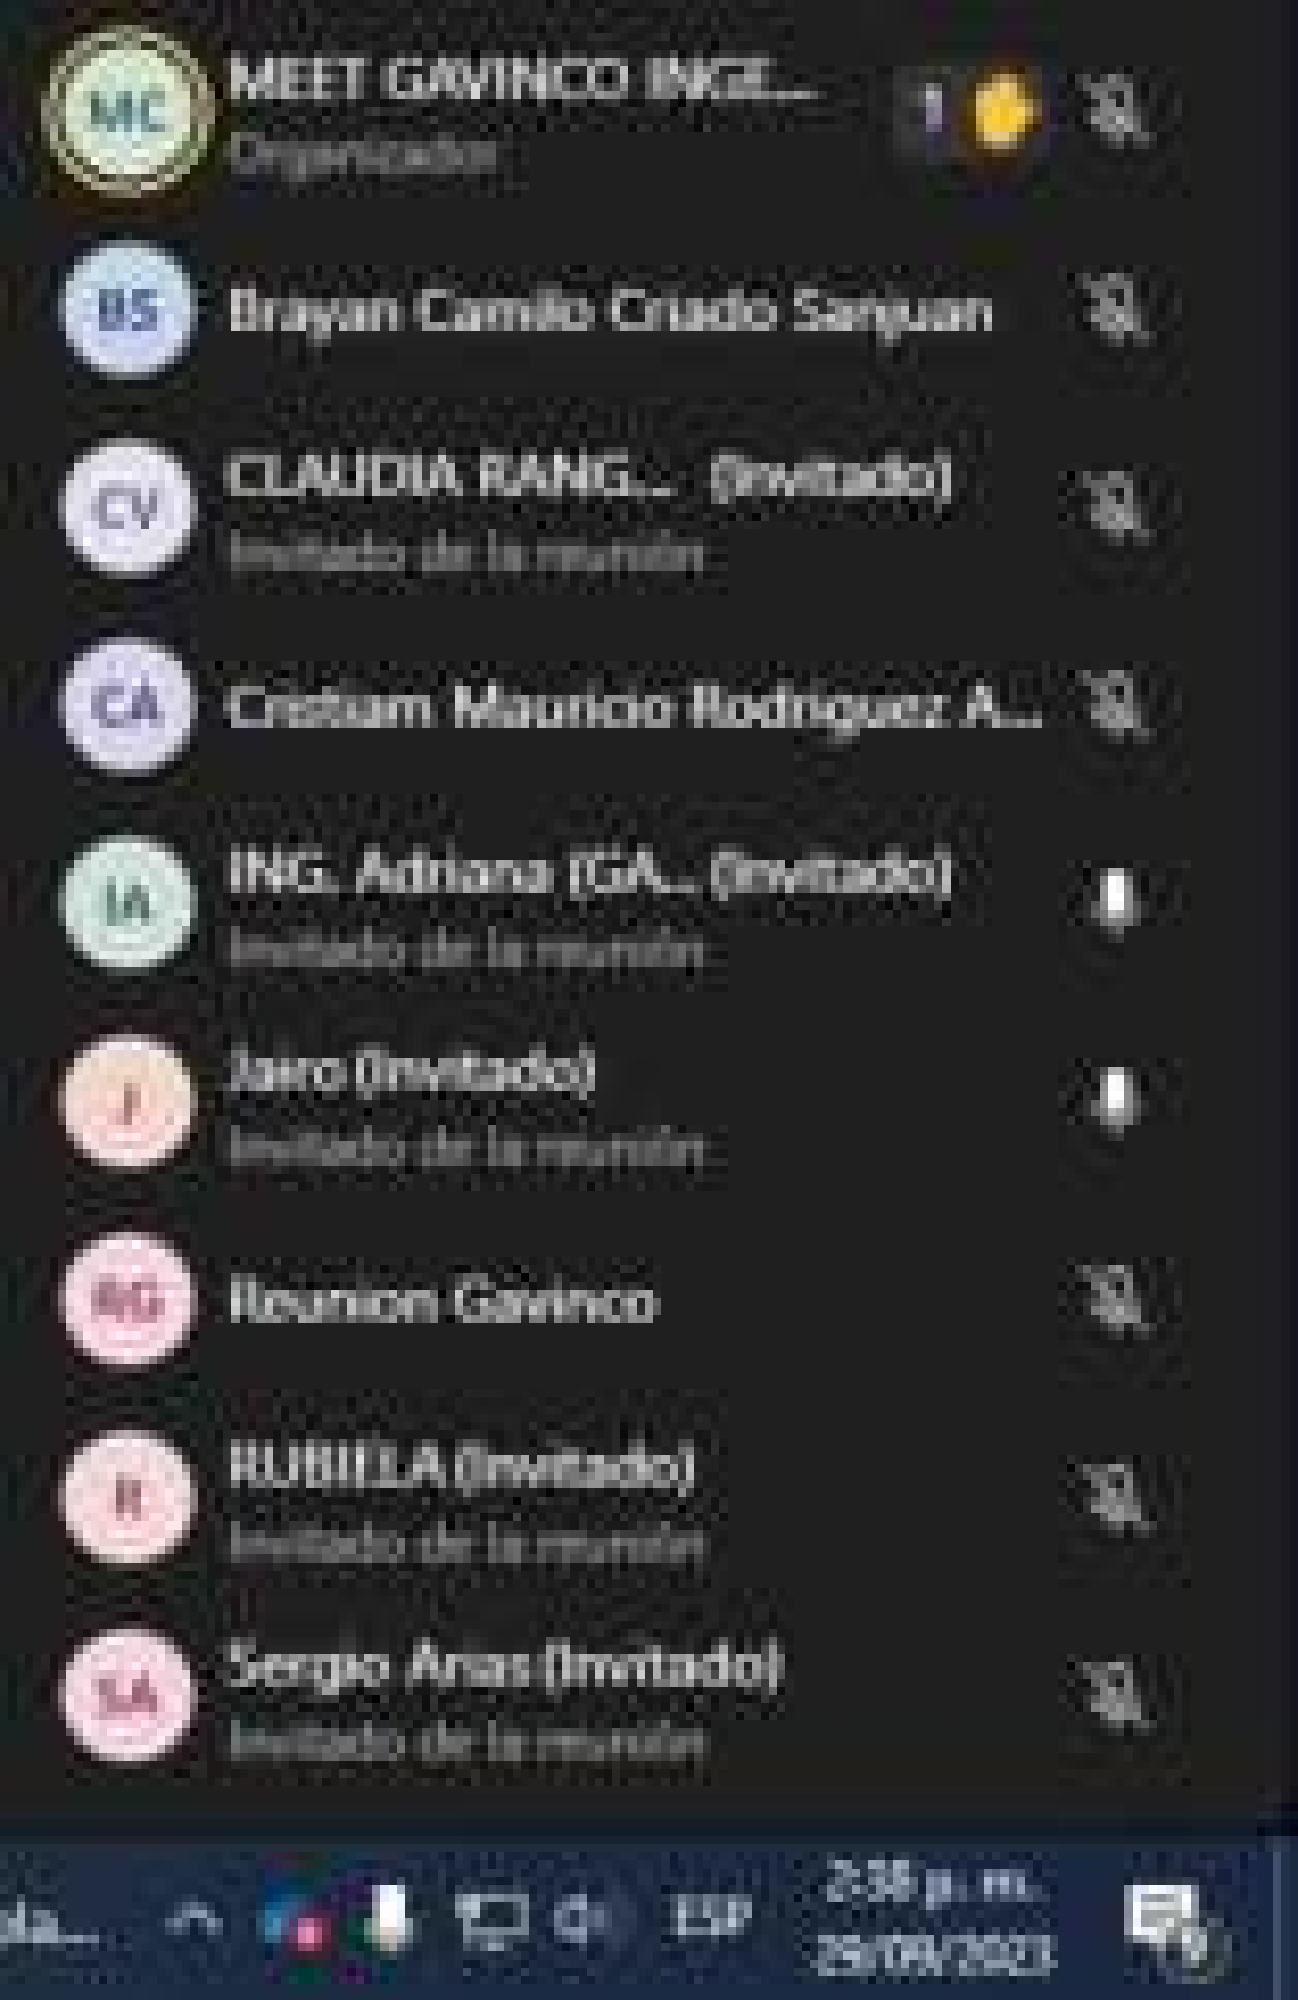
MEET GAVINCO INGE...
Organizador
Brayan Camilo Criado Sanjuan
CLAUDIA RANG... (Invitado)
Invitado de la reunión
Cristian Mauricio Rodriguez A...
ING. Adriana (GA... (Invitado)
Invitado de la reunión
Jairo (Invitado)
Invitado de la reunión
Reunion Gavinco
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
Sergio Arias (Invitado)
Invitado de la reunión
ESP
2:38 p. m.
23/08/2023

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 de 2022 MUNICIPIO DE CACHIRA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 15, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:
-Programación de obra.
-Flujo de Caja.
-PAGA.
-Componente Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 07 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 15

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenía un compromiso de entregar la Programación de obra y el Flujo de Caja el día 5 de septiembre de 2023 y no cumplió.

El Contratista y el municipio no hizo presencia en el presente comité.

Se va realizar un oficio de incumplimiento al Contratista de los compromisos pactados en los comités anteriores.

En el avance, a la fecha no hay obra física ni Placa Huella, ni obras de drenaje.

Total, empleos generados 1, directos generados 1, en la zona de influencia 1, no hay Maquinaria en obra.

El inconveniente que hay a la fecha es que el Contratista no ha iniciado obra física, se realizó una socialización el día 28 de agosto de 2023, se comprometió que la semana siguiente ya iniciaría en llevar maquinaria y materiales, la cual no ha cumplido.

Se continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la mayoría se encuentran aprobados en excepción Programación de obra y el Flujo de Caja, la Instalación de la valla, se encuentra en revisión por parte del INVIAS, con respecto al PAGA aún no lo han entregado, se encuentra con observaciones del 28 de marzo del 2023.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, se encuentran todos aprobados.

Se continua con la información SST, está a la espera del inicio de actividades de obra para verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión y Salud, Seguridad en el Trabajo.

En el componente Ambiental, La interventoría se encuentra a la espera de recibir el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional ambiental del contratista, estás fueron enviadas el día 27 de marzo de 2023, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, estamos a la espera de recibir los informes mensuales que no han sido entregados hasta la fecha, y por lo tanto se envió oficio N° GIC-INVIAS-NTS-912-22, por incumplimiento en la entrega de informes mensuales y trimestrales, el día 14 de agosto de 2023, definir fecha de entrega de esta documentación.

En el componente Social, presenta documentos sin entregar:

- Actas de Vecindad.
- Socialización Inicio de Obra.
- Actas de Compromiso.
- Conformación Comité de Veeduría Ciudadana.
- Certificados de Territorialidad.
- Solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior.
- Informes Mensuales y Trimestrales desde la firma del acta de inicio (19 de octubre de 2022).
- Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

Documentos entregados:

Hasta la fecha de este comité, la CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA, NO ha entregado ningún documento pre constructivo correspondiente al componente Social.

La Interventoría ha enviado los siguientes oficios a la CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA:

GIC-INVIAS-NTS-375-22 del 15 de marzo de 2023, con asunto “Solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos o afrodescendientes en el área de influencia del proyecto, obra o actividad.

GIC-INVIAS-NTS-443-22 DEL 12 DE ABRIL DE 2023, bajo tema “Solicitud de información, programa contratación de mano de obra”.

GIC-INVIAS-NTS-794-22 del 17 de julio de 2023, con sujeto “Solicitud informes mensual y cumplimiento de ejecución PAGA”.

GIC-INVIAS-NTS-805-22 del 19 de julio de 2023, con asunto “Solicitud cumplimiento de documentos previos al inicio de obra”.

GIC-INVIAS-NTS-930-22 del 17 de agosto de 2023, con tema “Solicitud entrega de documentación del componente Social pendiente; so pena, de informar a la entidad contratante sobre la imposición de multas por el incumplimiento a la obligación de entregar información de la componente Social requerida por la Interventoría”.

La Interventoria afirma junto con el profesional Social que el último oficio que se le envió al Contratista para que hiciera entrega de todo el

componente Social, Ambiental y Técnico el día 17 de agosto de 2023, la cual no ha hecho entrega, se le va solicitar a la entidad contratante de pasarle el valor de la multa y solicitarle el incumplimiento por ese componente, debido que se le ha enviado al Contratista varios oficios y no han enviado ningún soporte técnico del componente Social.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero pregunta a la Interventoria si el municipio ha solicitado un informe en el cuál indique el estado actual de la obra.

La Interventoria afirma que el día antier en la tarde llegó esa solicitud.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero autoriza a la Interventoria dar respuesta inmediata al municipio, por qué el municipio se está basando en que él no ha tomado las acciones pertinentes porque está pendiente de un informe que le debe dar la Interventoría. El municipio como contratante y como supervisores del contrato, pueden iniciar el proceso del presunto incumplimiento.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/09/2023 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
ROSANA MATTOS	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial











MEET GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES RUBIELA Anuar Cabarcas Wilmar Rangel Ropero Ing Adriana





Jairo Fanny Amaya

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 de 2022 MUNICIPIO DE CACHIRA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 16, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:
-Programación de obra.
-Flujo de Caja.
-Componente Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 29 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 16

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último el componente Ambiental.

La Interventoria comenta que el contratista tenía pendiente por entregar la Programación de obra y Flujo de Caja en donde se le habían realizado unas observaciones y a la fecha no lo ha subsanado.

Se continua con el avance en cifras con corte el día 21 de septiembre de 2023, con un Programado de 58,46% contra un ejecutado del 0,47% teniendo un atraso de 57,99%.

Avance físico de las obras a la presente no hay avance de Placa Huella, no hay avance de obras de drenaje.

Personal en obra hasta la presente no hay nadie, no hay empleo, no hay ninguna persona en obra, tampoco hay maquinaria ni equipo en la obra.

Inconvenientes presentados a la fecha, el Contratista no ha iniciado obra.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción. La Programación de obra y el Flujo de Caja siguen con observaciones, la mayoría se encuentran aprobados, la Valla se encuentra en revisión por parte del INVIAS, el Plan de Manejo Ambiental - PAGA aún se encuentra con observaciones.

Se continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños. Sus componentes se encuentran aprobados.

Las actividades en obra, no tenemos actividades en obra.

Se da continuidad con la información SST, en espera de iniciar obra para realizar seguimiento a la ejecución del Sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo.

En cuanto al componente Ambiental, se recibió documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), nuevamente para su revisión. Por otra parte, la Interventoría se encuentra a la espera de recibir informes mensuales y formatos trimestrales que hasta la fecha no se han recibido, se le sugiere al Contratista definir fecha de entrega ya que se encuentra un atraso, en cuanto a este componente.

El Contratista manifiesta que en el municipio de Cáchira esta semana estuvo el ingeniero Residente realizando ya la consecución de toda la información para el tema logístico, él regreso a la ciudad de Cúcuta el día de hoy, mañana nos estaremos reuniendo para tomar decisiones necesarias que tengamos que tomar y el lunes iniciar obra física.

El Contratista se compromete hacer entrega de la Programación de obra y el Flujo de Caja el día miércoles 4 de octubre de 2023.

La Interventoria emitirá un oficio al municipio informando sobre unos posibles inicios de apremio al Contratista, también se le había solicitado al Contratista el Plan de Contingencia por el atraso tan alto que presenta, no se va a nivelar tampoco con una a dos semanas de trabajo, ni con una cuadrilla, ni con un solo frente de equipos. Los Estudios y Diseños están aprobados hace más de 2 meses, entonces se le pide al Contratista cumplir con los solicitado.

Además, que el municipio también ya le ha dicho, el INVIAS, ya ha sido muy repetitivo el tema con el Contratista.

Toma la palabra el ingeniero Brayan Camilo Criado Sanjuan que se encuentra un poco preocupado, desde la territorial con este de Cachira, así fue la vez pasada, dijeron que ya iban a empezar a hacer presencia, pero igual vuelven y salen de la zona, quedamos en las mismas.

La Interventoria aclara que el Contratista manifestó hace un momento que el Residente que va a estar en Cachira se había reunido con el alcalde y el secretario de Planeación y que ya habían organizado, que el Residente ya cuenta con la información de acuerdo a la maquinaria que debía llegar y que ya tienen programación de iniciar como tal el día 9 de octubre de 2023, eso fue lo que nos informó el Contratista.

El ingeniero Brayan Camilo Criado Sanjuan tratara de tener comunicación directa con el municipio para ver que manifiesta al respecto, porque sabemos que el Convenio es hasta el 31 de diciembre de 2023, van a estar muy ajustados los tiempos para terminar esa fecha, entonces necesitamos máxima colaboración tanto de la entidad contratante como el Contratista para lograr culminar este proyecto, si no, ya sabemos que la Interventoría tiene la orden directa de recibir las obras funcionales a la fecha de terminación.

Toma la palabra el ingeniero Wilmar Rangel Ropero manifiesta la preocupación desde acá de Planta Central es alta, en vista de que está el municipio no hace presencia en los comités, que es de su obligación, que me imagino que la Interventoría le ha extendido la invitación y es el más interesado, brilla por la ausencia, hay un desinterés como yo lo vengo repitiendo, la idea es no llegar a tomar medidas, lo importante es que podamos disfrutar las obras, el tiempo ya es corto, qué planes de acción y contingencia irán implementar.

Se le recuerda a la Constructora Matices la entrega de los Diseños físicos con firmas originales, para cuando entregarían estos documentos para poder dar trámite al interior de la entidad.

El ingeniero Brayan Camilo Criado Sanjuan se compromete a realizar el acercamiento con el municipio de Cáchira y manifestar ahí las acciones

que consideren necesarias para la ejecución de las obras.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programacion de obra	04/10/2023	CONTRATISTA
Flujo de Caja	04/10/2023	CONTRATISTA
Inicio de obra física	09/10/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/10/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
ROSANA MATTOS	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (7)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS ...
Organizador
Brayan Camilo Criado Sanjuan
Constructora Ma... (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana (GA... (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
Rosana Del Pilar ... (Invitado)
Invitado de la reunión
Wilmar Rangel Ropero
Otros invitados (1)
Daniela Reyes
LAA
3:19 p. m.
25/09/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25 | 09 | 2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 0259O|2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Onion Temporal Edivial-Tnjo 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Bramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053|2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Seguimiento y control Municipio Los Patios - Vereda Corozal y California.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Actualmente se puede verificar que el contratista tiene el siguiente personal:
  - * Director de obra.
  - * Residente de obra.
  - * (4) operadores de maquinaria.
  - * (1) Almacenista.
  - * (2) oficial(s).
  - * (2) Ayudante(s).
  - * (1) SISO.

y de igual manera cuenta con la siguiente maquinaria.

- * Retroexcavadora.
- * Vibrocompactador.
- * Bobcat.
- * Motoniveladora.
- * 2 Volquetas.
- * 1 Carrotanque.
- * 1 Compresor.

Las actividades que se ha realizado actualmente son las siguientes:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* ~~Ex~~ cavación de taludes y cajas para sobreancho del diseño de la placa huella.
* Excavación Mecánico de cajon para estructura de placa huella.
* Instalación de Geotextil Tejido.
* Instalación de Subbase.
* Se realizo corte y figurado para estribos de Vigas riostras.
* Se realizo armado de Vigas riostras.

Se deja constancia por Parte de la interventoria que la estructura de la placa huella a la fecha no ha sido aprobado, Sin embargo el dia 20 de September 2023, Se realizó mesa de trabajo conjunta con especialistas de Geotécnia de la interventoria, con el fin de verificar y avalar la estructura propuesta por el contratista. Asi se recomendara con especialista de geotecnia del contratista la estructura definitiva. La interventoria realizará la toma de 4 CBR a lo largo del corredor Vial con el fin de corroborar los valores de CBR presentados en el informe de Geotécnia del Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Por otra parte, la interventoría Consorcio con las memorias de calculo los PR de conformación y mejoramiento en el corredor Vial, Delido a que dicha actividad van enfocadas en la perfilación, Escarificación, replanteo de Banco, Durante la excavación Mecánica realizada se obtenga la Presencia de roca de gran tamaño. Por lo tanto la interventoría y contratista se realizará la inspección con el fin de identificar dichos sitios en roca.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Tomas CBR por interventoria	29/09/2023	Interventoria.
* Verificacion de PE para actividades de Conformacion y mejoramiento	29/09/2023	Interventoria.
* Entrega Informe definitivo Geotecnia.	29/04/2023	Contratista.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02/10/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jairo Andres Quintero.	Director Interventoria	Gavinco	
Jose Torres	Residente interventoria	Gavinco	
William Quintero	Director Obra.	UTEdivial-Tropa.	
Astrid Leon	Residente Obra	UTEdivia-Tropa	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-09-2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 02590 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edvial - Troja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Granalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra 02590 de 2022

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Se Verifica que el Contratista tiene el Siguiente Personal en la Vereda Rinconada, Sitio de Intervencion Actualmente
   1. Director de Obra
   1. Residente de Obra
   1. Auxiliar SST
   1. Maestro
   2. Oficiales
   7. Obreros
   1. Personal de laboratorio.
2. De Igual Manera Se Cuenta con la Siguiente Maquinaria
   Mezcladora
3. Se evidencia en Campo la Presencia de Personal de Laboratorio Realizando Densidades de Campo a lo large del Tramo 2-1 Donde Se realizaron Dos (2) y de Igual Manera Se realizaron (3) Densidad para el Tramo 1.
4. Actualmente el Contratista Se encuentra ejecutando las Siguientes
   1. Corte, Figurado y Amarre de Acero de Refuerzo 3/8" Para elementos, Viga Riostra, Huellas, Acero longitudinal y Vertical.

FECHA: 28/09/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

5. El Tramo 2-1 de 38,55 mt ya se encuentra terminado Actualmente realizan Actividades de Curado de Concreto.
6. Por parte de la Interventoria se le Solicita al Contratista Colocar el número de estribos totales 21, teniendo en Cuenta que se evidencian (17), a lo que el Residente de Obra y Director de Obra manifiesta que no se estan Colocando los de las Aleas de la Cuneta, teniendo en Cuenta que se esta Dejando un Acceso Peatonal y de Motos para los Habitantes de la Vereda, los estribos faltantes se Colocaran una Vez se Vacie la Cuneta, Esto para la Rasante. Por Parte de Interventoria se le Solicita al Contratista Centrar los Aceros de Refuerzo de Huellas antes de Vaciar el Concreto.
7. La Interventoria le Manifiesta al Contratista que se debe realizar el Curado del Concreto con Antisol teniendo en Cuenta que este Material se tiene Dispuesto para la Presente Actividad APU (Concreto de 21 Mpa, Elaborado en Sitio) Se evidencia que efectivamente si se esta Utilizando el Presente Material y que si se tiene en Disposicion en Almacen.
8. Se le Recuerda al Contratista la toma de Muestras de Concreto al tramo en ejecucion Actualmente y de Igual Manera la Interventoria realizara las Verificaciones con la Muestra que se realicen con el fin de dar Validacion a los Resultados que se presenten.
9. El Contratista Manifiesta que Actualmente tienen Proyectado el Inicio de Actividades en el Corredor Vial Vereda Santo Domingo tramo de Placa Huella de 200m

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/09/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Despues del punto Concluido como el kiosco, Sentido Vasto Santo Domingo, Segun Acuerdos y Dialogos Tenidos Con las Comunidades, Interventoria, Entidad Contratante.

10. Por Parte de la Interventoria Se le Recuerda al Contratista realizar las localizaciones y Abscisados de los Corredores Viales a intervenir, Con el Fin de tener Claridad al Momento de los Recorridos a realizar Con las Diferentes Entidades.
11. Se le Recuerda al Contratista la entrega oficial de Componentes de Diseño tramos faltantes a Intervenir Vereda Santo Domingo y de Igual Manera a los Demas Corredores Viales a Intervenir.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/09/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de Ensayos Placa Huella		Contratista
Tramo 2-2 Ringamaga		Contratista
Inicia Actividades de Obra		
Santo Domingo		Contratista
Entrega Componente Faltantes		
Sto Domingo.		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cesar Cardenas	Resid. Obra	UT EDIVIAL-TROSA	
William Quintero	Director de Obra	UT EDIVIAL-TROSA	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2590 MUNICIPIOS NORTE DE SANTANDER
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. EDIVAL TROJA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 14, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplidos:
-Protocolo de Bioseguridad.
-Hojas de Vida.
-Programa de obra.
-Flujo de Caja.

Sin Cumplir:
-Documentos etapa pre construcción.
-Documentos Estudios y Diseños.
-Componente Social.
-Componente Ambiental.
-Componente SST.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

• Compromisos
• Aspectos técnicos
• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
• Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 07 de septiembre de 2023, la Interventoría a través del ingeniero Residente José Torres, da inicio al comité de seguimiento No. 14.

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta los compromisos que tenía pendiente el Contratista de la semana anterior la cual no ha hecho entrega el Plan de Calidad, entrega, el PMT, las topografías de la vereda Cinera y Juan Bueno, las Topografías de los demás tramos faltantes, el Diseño Geométrico y Diseño Estructural, tiene una fecha establecida de hoy 7 de septiembre de 2023. Sólo hizo entrega el Diseño Hidráulico, la reunión en el municipio de Arboledas, el informe SST y el PAGA.

Se da continuidad con el avance con corte del día 31 de agosto de 2023, se tiene un Programado del 15,66% y un Ejecutado del 1.26%, un atraso del 14,40%.

En el ejecutado por etapas, se tiene complementación, Estudios de Diseños, un 0.30%, este representa, el 25% de avance total o del valor total de Estudios y Diseños, y tenemos para la parte de ejecución de obra el 0.96% que representa las actividades que se vienen realizando actualmente, como en la conformación de la calzada existente y el mejoramiento de la sub rasante.

Se continua con el avance físico de acuerdo a lo que se tiene en el presupuesto y de acuerdo al alcance que se van a realizar de obras, se tiene la construcción de la Placa Huella, a la fecha no se ha iniciado ejecución de Placa Huella, obras de drenaje de alcantarillas tampoco y mantenimiento periódico, el Contratista viene realizando las actividades de conformación de la calzada existente y mejoramiento de la sub rasante.

Para la conformación de la calzada existente se tiene a la fecha una ejecución de 8255,50 M2 y para el mejoramiento de la sub rasante se tiene 34111,44 m2, ejecutados a la fecha.

El personal de obra, el Contratista a la fecha tienen unos empleos generados de 35 personas, empleos directos generados tiene 30, empleos indirectos generados tiene 5 y los empleos en la zona de influencia tiene 22.

Con respecto al Equipo Mínimo al Contratista se le exige de acuerdo al anexo técnico, una retroexcavadora, una motoniveladora, un compactador y dos volquetas, actualmente en obra el Contratista tiene una retroexcavadora, un compactador, dos volquetas, un bulldozer y un Bobcat.

Se continua con los inconvenientes presentados a la fecha en el municipio Arboleas, se tiene unos inconvenientes que es la inconformidad de las comunidades con algunos puntos de intervención que se tienen actualmente en la vereda de Santo Domingo, vereda Volcán y en la vereda de Chicagua.

De acuerdo a la reunión que se hizo el día 01 de septiembre de2023, junto con la entidad contratante, se pudo establecer en este caso para la vereda de Santo Domingo que los puntos de intervención que solicitaba la Comunidad si se encontraban dentro del anexo técnico.

Se da continuidad con el avance de entrega documental etapa de pre construcción, se hace un resumen de los documentos que se encuentran pendientes que es el Plan de Calidad se tienen unas observaciones desde el 25 de julio del 2023, se le pregunta al Contratista que ha pasado con este documento.

El Contratista comenta que esta en espera de que se realice en el día de hoy una mesa de trabajo con los Especialistas.

La Interventoria manifiesta que deben tener aprobado todos los componentes de Estudios y Diseños para iniciar actividades.

Por parte del INVIAS el ingeniero Jonathan Francisco Bernal Becerra comenta que es mejor tener ya todos los componentes aprobados para dar inicio a la obra técnica, yo creería que mejor se debería evaluar qué componentes son en sí necesarios para que el Contratista comience la obra técnica.

La Interventoria comenta con respecto del municipio de Los Patios, Corozal – California se tiene aprobada la Topografía, los Diseños Geométricos están en observaciones, está en revisión por parte de la Interventoría, el Estudio de Suelos y el Diseño de Pavimentos, tenemos observaciones, en este momento están en manos del Contratista.

La Interventoria continua con el Programa Generación de Empleo, a la fecha no sé ha recibido documento, el Análisis de Precios Unitarios se encuentran en este momento en revisión por parte de la Interventoría, el PMT no se ha recibido documento por parte del Contratista igualmente la Instalación de la Valla a la fecha se recibió un correo por parte del INVIAS como no se tiene alcance a la

fecha no se ha podido finiquitar estas Vallas, en relación con el PAGA se tienen observaciones desde 4 agosto de 2023, a la fecha no se ha recibido nada por parte del Contratista.

El Contratista afirma haber entregado el documento PAGA el día de ayer 6 de septiembre de 2023.

Y para el tema de Diseño de mezclas se encuentra en revisión por parte de la Interventoria.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, de acuerdo a las entregas que ha realizado el Contratista el estado actual de los diferentes componentes al día hoy se tiene aprobado por parte de la Topografía la vereda de Santo Domingo, Volcán, San Isidro, Santa Anita y Corozal - California. Aprobado con observaciones se tiene la vereda Boyacá.

Y los documentos que están observados y en revisión por parte de la Interventoría tenemos Potreros, Chicagua, Rinconada y Helechal, no se han recibido documentación de Cinera y Juan Bueno, entonces para este componente a la fecha se han recibido 10 veredas de las 12.

El Diseño Geométrico a la fecha se tienen aprobados con observaciones la vereda de Santa Anita, observaciones en manos del Contratista tenemos la vereda de Santo Domingo, el Helechal y Boyacá.

Y en revisión por parte de Interventoría documentos que ya fueron observados está la vereda de Chicagua, Rinconada, San Isidro y Corozal California. No se han recibido documentos de Volcán, Potrero, Cinera y Juan Bueno, para este componente tenemos documentos recibidos 8 de 12 veredas.

Se continua con el Estudio Geológico, Geotécnico e Informe de Suelos y pavimentos, se tiene en revisión por interventoría documentos que ya fueron recibidos está la vereda Santo Domingo y Rinconada y en observaciones en manos del Contratista se tiene Volcán, Potreros, Chicagua, Cinera, Juan Bueno, Helechal, Boyacá y Corozal – California, no se ha recibido información de San Isidro y Santa Anita a la fecha para este componente se han recibido 10 de 12 veredas.

Continuamos con el Diseño Estructural a la fecha no se ha recibido ningún documento para ninguna vereda. Y el Diseño Hidráulico a la fecha está en revisión por Interventoría, los documentos que ya fueron observados tenemos la vereda de Santo Domingo y Chicagua, observaciones en manos del Contratista la Rinconada.

Documentos que no se han recibido a la fecha están Volcán, Potreros, Cinera, Juan Bueno, el Helechal, Boyacá, San Isidro, Santa Anita y la vereda Corozal – California, para este componente se han recibido 3 de las 12 veredas.

El Contratista afirma que el Especialista se comprometió para el día de mañana entregar las observaciones de Santo Domingo.

La Interventoria continua con las actividades en obras, se están realizando a la fecha el mejoramiento de las obras ante en la vereda Boyacá por parte del Contratista.

Con respecto al Diseño Hidráulico el Contratista afirma haber entregado el día de ayer el de la Rinconada.

Las actividades en el municipio de Gramalote se tiene el mejoramiento de las sub rasante de la vereda Boyacá y en el municipio de Los Patios se tiene actividades de limpieza de alcantarillas existentes.

El Contratista rectificar que entregó la subsanación de la variedad de Santo Domingo, el de La Rinconada todavía no.

La información del componente SST se evidencia la entrega de dotación al personal que está contratado a la fecha en el municipio de Gramalote.

La Interventoria continua con el Componente Ambiental, la Interventoria recibe el día 6 de septiembre de 2023 el documento PAGA con observaciones subsanadas por parte del profesional Ambiental del Contratista mediante oficio UTET-2590-108, la interventoría se encuentra a la espera de recibir los informes mensuales pendiente hasta la fecha.

Con respecto al Componente Social comenta que hay:

¡Documentos sin entregar:

- Informes Mensuales y Trimestrales desde la firma del acta de inicio de obra (10 de abril de 2023).
- Conformación Veeduría Ciudadana (Gramalote y Los Patios).

Igualmente, no se ha remitido los siguientes documentos pre constructivos de los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas:

- Las Actas de Vecindad.
- Socializaciones de Inicio de Obra.
- Actas de Compromiso.
- Certificados de Territorialidad.
- Solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior.
- Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), componente social subsanado.

Documentos Entregados:

Conformación Comité de Veeduría Ciudadana, municipio de Arboledas.

El Contratista afirma que la conformación de la veeduría de Gramalote ya se entregó solo falta la resolución de personería de la parte de Gramalote, Los Patios los están todavía realizando.

El Contratista informa que va a iniciar ya la parte constructiva en el municipio de Los Patios con la parte de la excavación, mientras se pueda realizar la mesa de trabajo para esos puntos.

La Interventoria le manifiesta al Contratista que la Directriz es que no se inicia hasta tanto no se tengan los componentes aprobados.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/09/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR SANTOS	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
WILLIAM QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	U.T. EDIVIAL TROJA	
JOSE TORRES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIOBNAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
JONATHAN BERNAL	INGENIERO DE APOYO	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (7)
Silenciar a todos
MC
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
AC
Anuar Cabarcas (Invitado)
Invitado de la reunión
JB
Jonathan Francisco Bernal Becerra
Enviando
JT
JOSE TORRES (Invitado)
Invitado de la reunión
KN
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
R
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
WQ
William Quintero (Invitado)
Invitado de la reunión

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 MUNICIPIO DE LOS PATIOS
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 09, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplidos:

-Generación de Empleo.
-Fuente de Materiales.
-Informe Estructural.
-Hojas de Vida.

Sin Cumplir:

-Rendimientos Financieros.
-PAGA.
-Protocolo de Bioseguridad.
-Informe Hidráulico.
-Equipo Mínimo.
-Instalación de la Valla.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 07 de septiembre de 2023, la Interventoría a través del ingeniero Residente José Torres, da inicio al comité de seguimiento No. 09.

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

El Contratista no ha hecho presencia en el comité del día de hoy ni de la semana pasada.

Había unos compromisos pendientes de la semana anterior que eran, el Equipo mínimo, el Diseño Geométrico y el PAGA, EL Informe Hidráulico y la documentación de la socialización no se cumplió.

Los Estados Financieros por parte de la gobernación sí se cumplió.

Se continua con el avance en cifras con corte del día 31 de agosto del 2023, se tiene un programado del 26,90% y un ejecutado del 0.65% a la fecha el Contratista tiene un atraso del 26.26%.

El avance físico de las obras la construcción de Placa Huella a la fecha no se ha ejecutado nada. Obras de drenaje, alcantarillas tampoco y mantenimiento periódico no se tiene nada. Entonces a la fecha el Contratista no ha podido dar inicio a las obras, teniendo en cuenta de que no se tiene aprobación del total de los componentes de Estudios y Diseños.

Se continua con el personal de obra, no se tiene personal de obra a la fecha.

Continuamos con la maquinaria y equipo mínimo, el Contratista no ha completado los componentes de Estudios y Diseños, no se tiene maquinaria tampoco en campo.

Inconvenientes presentados a la fecha, es el atraso en la entrega de los diferentes componentes por parte del Contratista. Por lo tanto, no se han iniciado actividades o alguna intervención física del proyecto.

La Interventoria continua con el avance en la entrega documental de la etapa de pre construcción, se tienen observados a la fecha y que no se han entregado es la relación del equipo mínimo que se enviaron unas observaciones el día 27 de junio de 2023, pone la Comunicación 728 y a la fecha el Contratista no ha hecho entrega de la misma. La parte de Análisis de Precios Unitarios se encuentra en este momento en revisión por parte de la Interventoría, la Instalación de la Valla por parte del Contratista no se tiene definido el alcance a la fecha, con relación al PAGA, se tiene unas observaciones desde el 5 de julio de 2023, el Contratista no ha entregado nada de la fecha, los Diseños de Mezclas el Contratista se le envió un oficio reiterando la entrega de los diferentes diseños de mezclas a los concretos a la fecha tampoco se ha recibido y de igual manera, para los ensayos de la subbase no se ha recibido a la fecha.

Se da continuidad con el avance de la entrega documental de revisión de Estudios y Diseños a la fecha el Contratista tiene aprobados los Estudios Geológicos y Geotécnicos y el Informe Estructural. Tiene pendiente la entrega de la Topografía con observaciones desde el 27 de junio de 2023. El diseño Geométrico con observaciones desde el 14 de agosto de 2023 y el Diseño de Pavimentos se tienen observaciones desde el 15 de agosto de 2023.

La Interventoria continua con la información SST, se realiza revisión a los documentos de subsanación entregados por el Contratista SG-SST, se aprueban los documentos.

El componente Ambiental, La Interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional Ambiental del Contratista, definir fecha de entrega, se recibe informe mensual del mes de agosto de 2023.

Con referente al componente social, comenta que hay:

Documentos sin entregar:

•Informes Mensuales y Trimestrales desde la firma del acta de inicio de obra (11 de mayo de 2023).
•Conformación Veeduría Ciudadana.
•Actas de Vecindad.
•Socialización Inicio de Obra.
•Actas de Compromiso.
•Certificados de Territorialidad.
•Solicitud de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior.
•Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), componente social subsanado.

Documentos Entregados:

• Hasta la fecha de este comité, la Unión Temporal Placa Huella LA MUTIS 2022, NO ha entregado ningún documento de p construcción correspondiente al componente social.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/09/2023 (Dia / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR SANTOS	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
GUSTAVO LAMUS	SUPERVISOR	GOBERNACION	
JOSE TORRES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
OSCAR ROJAS	APOYO A LA SUPERVISION	GOBERNACION	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

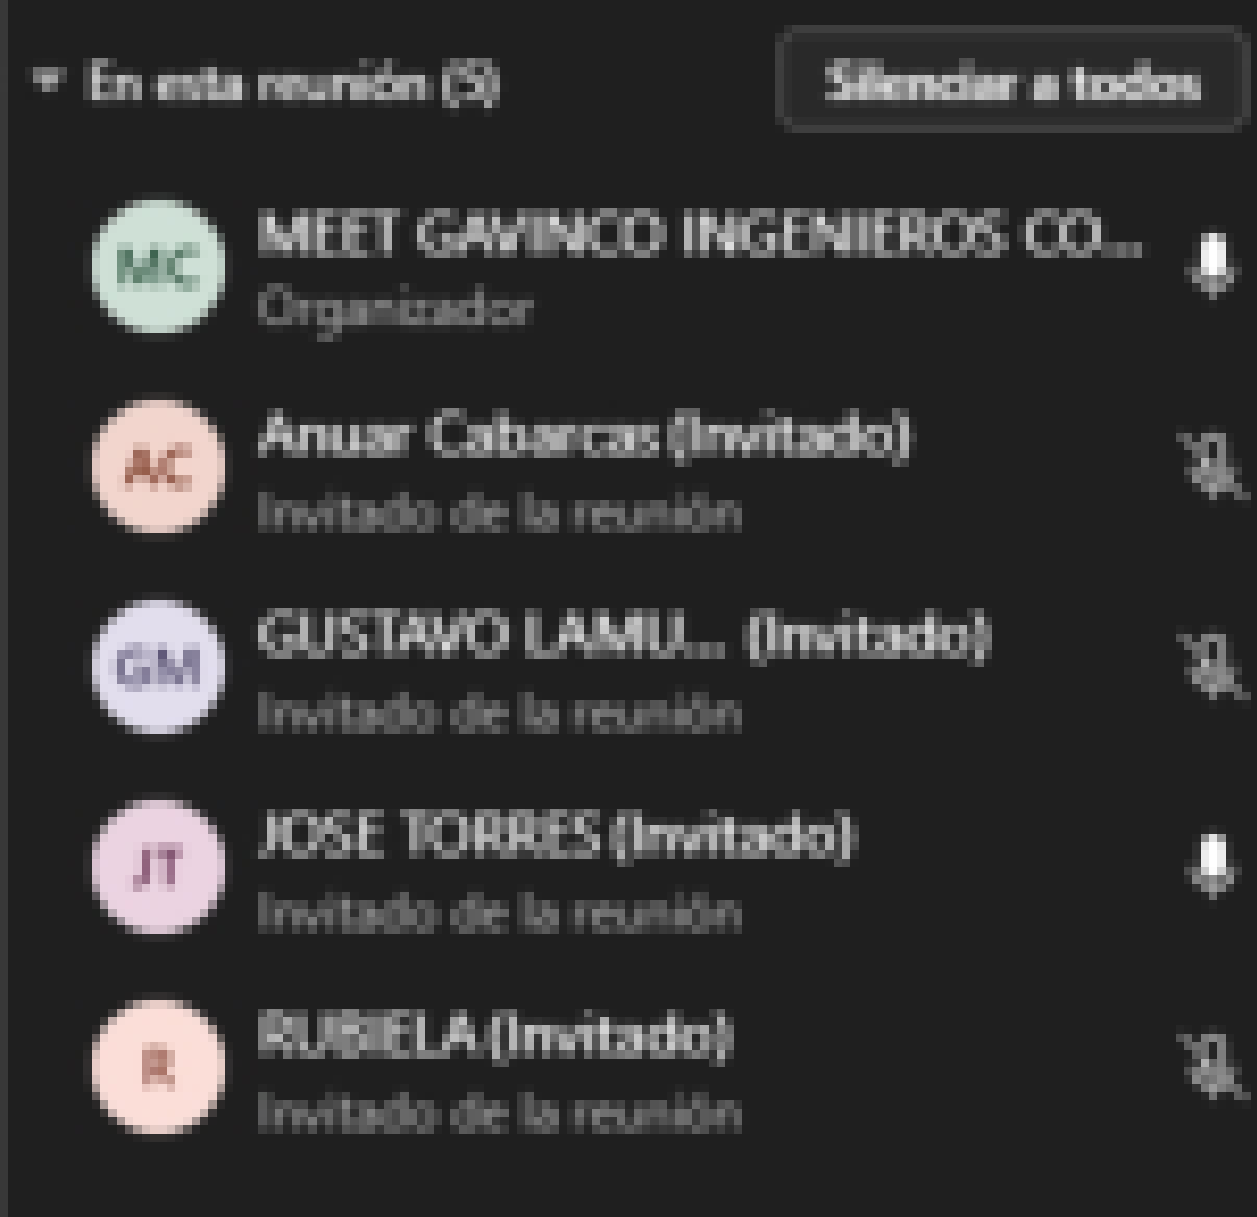
En esta reunión (5)
Silenciar a todos
MC
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
AC
Anuar Cabarcas (Invitado)
Invitado de la reunión
GM
GUSTAVO LAMU... (Invitado)
Invitado de la reunión
JT
JOSE TORRES (Invitado)
Invitado de la reunión
R
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión

FECHA 22/09/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 MUNICIPIO DE LOS PATIOS
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 10, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplidos:

-Protocolo de Bioseguridad.

Sin Cumplir:
-Topografía.
-Diseño de Pavimento.
-Rendimientos Financieros.
-PAGA.
-Informe Hidráulico.
-Equipo Mínimo.
-Instalación de la Valla.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

• Compromisos
• Aspectos técnicos
• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
• Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 22 de septiembre de 2023, la Interventoría a través del ingeniero Residente José Torres, da inicio al comité de seguimiento No. 10.

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último el componente Ambiental.

La Interventoria comenta que por parte de la Gobernación se tenía pendiente la entrega de los Rendimientos Financieros y por parte del Contratista cumplió los siguientes compromisos Diseño Geométrico, el Plan SST, el Diseño de Pavimento y aun no ha hecho entrega el Equipo Mínimo, el PAGA, el Informe Hidráulico y la documentación de socialización.

Se continua con el avance en cifras a corte del día 14 de septiembre de 2023, se tiene un programado de 41.80% y un porcentaje dado del 0.69% a la fecha el Contratista tiene un atraso del 41.11% y básicamente teniendo en cuenta este atraso, la Interventoría mediante el oficio 1049 el 13 de septiembre de 2023, le solicitó al Contratista un Plan de Contingencia con el fin de ponerse al día en Estudio y Diseños de igual manera en los tiempos de ejecución que se deberían tener actualmente.

El avance físico de las obras, a la fecha el Contratista teniendo en cuenta de que no ha entregado la totalidad de los componentes de Estudios y Diseños, no se tiene avance como tal de las obras.

El personal en obra cero también, no se ha iniciado actividades en campo y maquinaria y equipo cero.

Inconvenientes presentados a la fecha es que las comunidades de la vereda la Mutis actualmente se encuentran inconformes, teniendo en cuenta de que el Contratista no inicia actividades y de igual manera no se ha socializado como tal el proyecto, no se sabe el alcance total del proyecto, no se le ha informado de igual manera a las comunidades de la vereda La Mutis.

Se continua con la el avance de entrega documental etapa de pre construcción, el Contratista tiene faltantes actualmente observaciones la relación del equipo mínimo obligatorio, Análisis de Precios Unitarios que se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, la Instalación de la Valla, teniendo en cuenta de que no se tiene un alcance definido como tal a la fecha del proyecto, de igual manera estamos a la espera de que el Contratista haga la entrega de los respectivos documentos, el PAGA se le hicieron una observaciones al Contratista el día 5 de julio de 2023 y a la fecha tampoco se ha recibido documento alguno sobre el PAGA, Resultados de Laboratorio Diseños de Mezcla se tienen unas observaciones mediante el comunicado 952 se le reiteró al Contratista la entrega de los documentos de la Subbase, los ensayos de la subbase a la fecha tampoco el Contratista no lo ha entregado.

La Interventoria continua con el avance documental revisión de Estudios y Diseños a la fecha el Contratista tiene observaciones en lo que tiene que ver con la Topografía, Diseño de Pavimento y Diseño de que incluye el Diseño de Tránsito y de igual manera, el Informe Hidráulico solo se tiene aprobado lo que es el Diseño Geométrico, el Diseño Geológico y Geotécnico, el Informe Estructural.

Ya debería estar iniciando actividades de obra desde el 26 de junio de 2023, qué es lo que se tiene en la programación a la fecha estamos a la espera de que haga entrega del Plan de Contingencia con el fin de que se pongan al día en cada una de las actividades que debe tener a la fecha.

Se da continuidad con la información SST, la profesional ya aprobó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de igual manera también está a la espera del inicio de obra, con el fin de que ellos nos hagan entrega del informe de Ejecución del Sistema de Salud en el Trabajo.

Se continua con el componente Ambiental, a la fecha el Contratista no ha hecho entrega del documento PAGA, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y de igual manera la Interventoría se encuentra a la espera de recibir los informes trimestrales, se le sugiere al Contratista ponerse al día con la documentación solicitada.

La Interventoria le pregunta al ingeniero Gustavo Lamus sobre cómo va el trámite de los Rendimientos Financieros para este Convenio, solo han entregado
hasta el mes de abril de 2023, entonces quedaría pendiente de mayo, junio, julio, agosto de 2023 y ahorita que se termina septiembre de 2023, si de pronto sabes algo de ese trámite.

El ingeniero Gustavo Lamus manifiesta por escrito que, para el próximo lunes 25 de septiembre de 2023, espera tenerlos.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

FECHA 22/09/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Rendimientos Financieros	25/09/2023	MUNICIPIO

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/10/2023
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA	GAVINCO S.A.S.	
GUSTAVO LAMUS	SUPERVISOR	GOBERNACION	
JOSE TORRES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
OSCAR ROJAS	APOYO A LA SUPERVISION	GOBERNACION	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (5)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
GUSTAVO LAMU... (Invitado)
Invitado de la reunión
JOSE TORRES (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
Oscar rojas (Invitado)
Invitado de la reunión
Otros invitados (1)
Secretaria de Vias

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 MUNICIPIO DE HERRÁN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTE DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 21, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplidos:

- Documentos etapa pre construcción.
-Documentos de Estudios y Diseños.

Sin Cumplir:

-Valla
-PAGA.
-Componente Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

• Compromisos
• Aspectos técnicos
• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
• Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 15 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 21

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenía dos compromisos de la cual no hizo entrega que era la planilla de Seguridad Social y la instalación de la Valla.

Se continua con el avance a la fecha del día 7 de septiembre de 2023, se tiene un porcentaje Programado del 40,29% contra un ejecutado del 20,00% con un atraso del 20,29%. Complementación de ajustes y diseños se tiene un porcentaje 1.15% y porcentaje de ejecución de obra 18,85% en lo que se refiere a construcción de Placa Huella y avance en construcción de alcantarillas.

Construcción de Placa Huella paño completo están terminando el primer tramo de Placa Huella de aproximadamente 145 metros lineales, obras de drenaje intervención de 2 alcantarillas, informaron que tienen ya como 4 intervenciones de 4 alcantarillas.

Personal en obra, total empleo generados en obra 19, empleos directos generados 14, empleos indirectos generados 5 y empleos en la zona de influencia 10.

Se tiene en obra una retroexcavadora de llantas, una Motoniveladora, un compactador y dos volquetas.

Inconvenientes presentados a la fecha, en la semana ejecución no manifestaron tener inconvenientes para el desarrollo de la obra.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción, se encuentra con observaciones la programación de obra desde el día 5 de septiembre del 2023, al igual que el Flujo de Caja. ¿Se le pregunta al Contratista para cuándo tiene entrega esos documentos?

El Contratista comenta que no ha hecho entrega de la programación de obra y el Flujo de Caja porque no tienen la aprobación por parte del municipio del Acta de modificación.

Toma la palabra el ingeniero Miguel Cristancho, secretario de Planeación del municipio de Herrán, comenta que recibió el acta de modificación y se envió de manera informal a GAVINCO para revisión y firma, una vez se tenga se revisará para podérsela pasar al Contratista ya firmada.

La Interventoria comenta con respecto a la instalación de la Valla se encuentra en manos del INVIAS.

El Contratista afirma que la instalación de la Valla ya fue aprobada por parte del INVIAS, aun no se ha hecho la respectiva instalación, espera

realizar la respectiva instalacion para la proxima semana.

La Interventoria da las medidas exactas de la Valla que es 3 x 2 al Contratista.

Se continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, están aprobados en su totalidad.

Se da continuidad las actividades en obra, se ha instalado la tubería de 36 pulgadas, se tiene la fundida de huellas y excavaciones, se le solicita al Contratista un Plan de Contingencia urgente por el atraso que presenta y es muy preocupante.

La Interventoria continua con la información SST, comenta se recibió el informe mensual de SST. Está pendiente la entrega de planilla de seguridad social del personal Contratista y subcontratista, correspondiente al mes de agosto de 2023.
Se continua con el componente Ambiental, se le sugiere al Contratista subsanar las observaciones encontradas en la ejecución de la obra y empezar a implementar los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La Interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional Ambiental del Contratista.

Con respecto al componente Social, comenta que los Documentos sin entregar: Actas de Vecindad; Socialización Inicio de Obra; Actas de Compromiso; Conformación Comité de Veeduría Ciudadana (Alcaldía); Certificados de Territorialidad; Solicitud de Consulta Previa; Informes Mensuales y Trimestrales desde la firma del acta de inicio (19 de octubre de 2022); Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

Documentos entregados: Hasta la fecha de este comité, la Unión Temporal Placa Huella Herrán 2022, NO ha entregado ningún documento correspondiente al componente social.

A continuación, se mencionan los diferentes oficios enviados a la Unión Temporal:

- GIC-INVIAS-NTS-376-22 del 15 de marzo de 2023, con asunto “Solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos afrodescendientes en el área de influencia del proyecto, obra o actividad”.
- GIC-INVIAS-NTS-442-22 del 12 de abril de 2023, con asunto “Solicitud de información, programa contratación de mano de obra”.
- GIC-INVIAS-NTS-790-22 del 13 de julio de 2023, con asunto “Solicitud informes mensual y cumplimiento de ejecución PAGA”.
- GIC-INVIAS-NTS-806-22 del 19 de julio de 2023, con asunto “Solicitud cumplimiento de documentos previos al inicio de obra”.
- GIC-INVIAS-NTS-955-22 del 28 de agosto de 2023, con asunto “Solicitud entrega de documentación del componente social pendiente; so pena de informar a la entidad contratante sobre la imposición de multas por el incumplimiento a la obligación de entregar información de la componente social requerida por la interventoría”.
- GIC-INVIAS-NTS-1035-22 del 11 de septiembre de 2022, con asunto “Solicitud implementación proyectos (programas) sociales en el área o influencia del proyecto.”

El día de ayer 14 de septiembre de 2023 la dirección de Interventoría realizó visita al proyecto, básicamente se le hizo unas observaciones de compactación de los hombros, se verificó los aceros y toda la parte que está de acuerdo con el diseño, se dejó la nota en la bitácora, se cuenta con los planos. El tema de incrementar los rendimientos y generar otras cuadrillas adicionales en el frente de Placa Huella y la construcción de alcantarillas, se evidenció que el Contratista ya ha dispuesto el material granular a lo largo del corredor ya hay triturado y arena a pesar que no se han iniciado las actividades físicas.

El Contratista manifiesta que la siguiente semana hacer procedimiento de afiliación, exámenes médicos de ingreso del personal, se espera que en el transcurso de la siguiente semana ingrese el nuevo personal para dar inicio obra el próximo jueves 21 de septiembre de 2023.

La Interventoria se compromete de verificar el acta parcial que entregó el Contratista con el balance.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ingreso del nuevo personal	21/09/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/09/2023 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ROSANA MATTOS	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MAURICIO RODRIGUEZ	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	Martha Soriano
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
LUIS BLANCO	DIRECTOR	U.T. P.H. HERRAN 2022	
MIGUEL CRISTANCHO	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

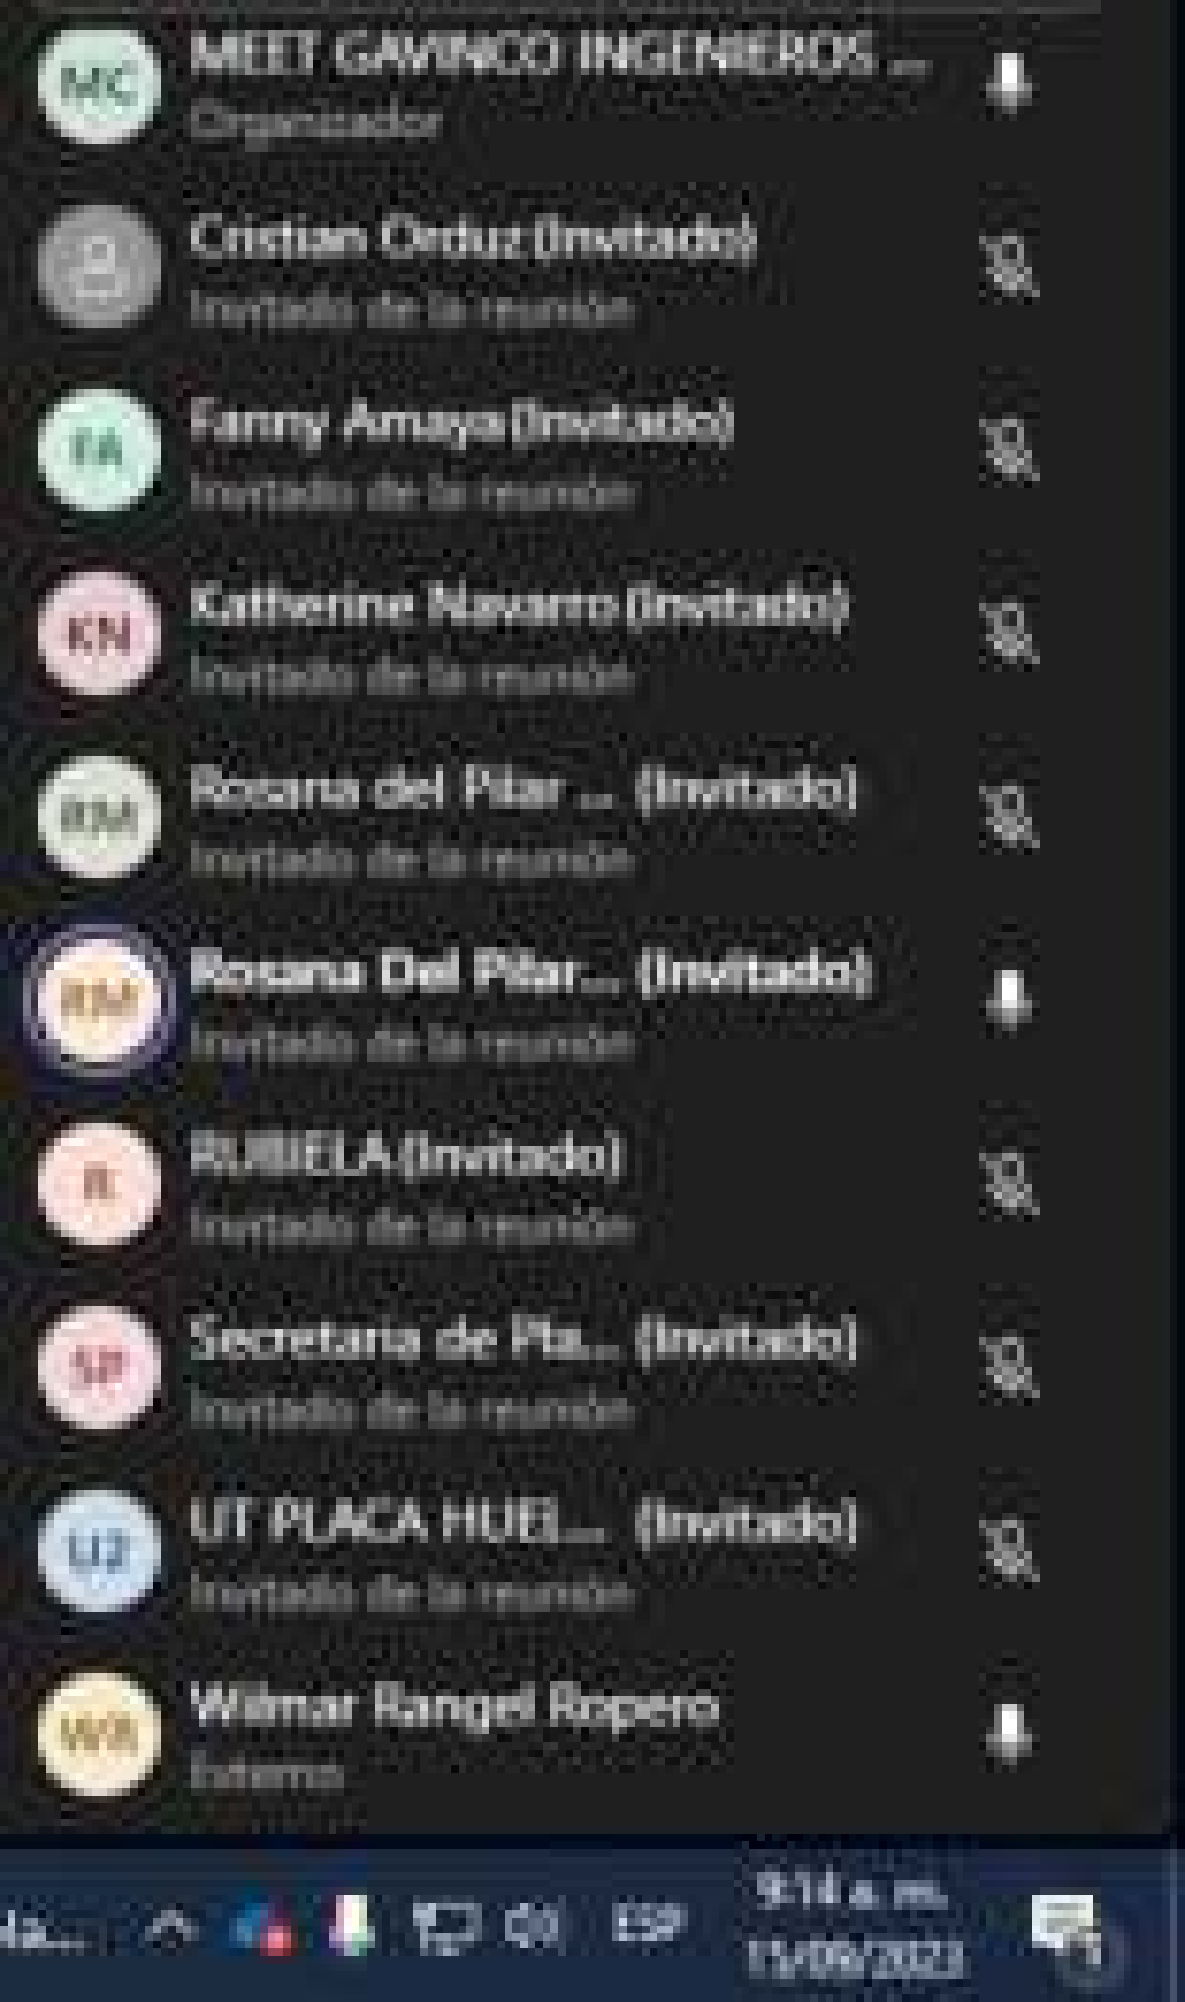
MEET GAVINCO INGENIEROS ...
Organizador
Cristian Orduz (Invitado)
Invitado de la reunión
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
Rosana del Pilar ... (Invitado)
Invitado de la reunión
Rosana Del Pilar... (Invitado)
Invitado de la reunión
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
Secretaria de Pla... (Invitado)
Invitado de la reunión
UT PLACA HUEL... (Invitado)
Invitado de la reunión
Wilmar Rangel Ropero
Externo
ESP
9:14 a. m.
11/09/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 28/04/23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

RECORRIDO DE OBRA PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL CONVENIO DERIVADO #1861-2021 EN LAS VEREDAS EL MOLINO Y EL RANAL.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERRAN EN DONDE SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN EL PROGRESO EN DONDE SE OBSERVÓ LA FORMALETA EN LA POCETA PARA LA POSTERIOR FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SE EVIDENCIA ALCANTARILLA EN EL KO+950 YA CONSTRUIDA CON 6 TUBOS DE 36".

- SE OBSERVA FUNDIDA DE LAS HUELLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, LLEVAN 6 VARILLAS DE 1/2" Y UDRILLAS DE 1/4"
- LAS VIGAS INSTALADAS TIENEN ACERO DE 1/2" EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, Y SUS FLEJES DE 1/4"
- CONTINUAN CON LA EXCAVACION PARA LAS VIGAS RIOSTRAS EN EL SECTOR DE EL RANAL.
- CONTINUAN CON LA ACTUIDAD DEL CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS VIGAS RIOSTRAS Y CORTE DE ACERO TRANSVERSAL PARA LAS HUELLAS
- EN EL SITIO DE LA OBRA, NO SE ENCUENTRA EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.
- SE LE HIZO LA OBSERVACIÓN AL ENCARGADO DE LA OBRA DE MAQUILLAR BIEN EL ANILLO EXTERIOR PARTE DE LOS ALETAS.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

COMPONENTE AMBIENTAL:

CON LA VISITA DE OBRA SE LOGRO EVIDENCIAR QUE EL CONTRATISTA ESTA CUMPLIENDO CON ALGUNOS PROYECTOS QUE CONTEMPLA EL PAGA, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE PUDO OBSERVAR QUE CUENTA CON PUNTO ECOLOGICO IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y QUE ESTAN REALIZANDO JORNADAS DE LIMPIEZA Y ASEO, EL MATERIAL SOBRANTE LO ESTAN UTILIZANDO COMO RELLENOS DE ALCANTARILLAS SE SUGIERE AL CONTRATISTA UBICAR LA SEÑALIZACION Y PUNTO ECOLOGICO YA QUE TODO SE ENCUENTRA EN UN ALMACEN; POR OTRA PARTE SE SOLICITA LA CERTIFICACION DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL DUEÑO DE LA CASA QUE ES UTILIZADA COMO ALMACEN..

- COMPONENTE SST.:

SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DEL PERSONAL SST EN OBRA DESDE EL 1.º DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA LA EJECUCIÓN DEL SGSST, SE EVIDENCIA PERSONAL EN OBRA SIN LOS EPP (ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL). NO SE REALIZAN CHARLAS, INSPECCIONES REPORTE DE ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE ENFERMEDAD COMÚN, EL BOTIQUIN QUE ESTA EN OBRA NO CUMPLE CON LOS PARAMETROS BASICOS ANTE LA ATENCIÓN DE UNA POSIBLE EMERGENCIA.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	3 DE 3 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- ARREGLAR ALCANTARILLA	30-09-23	CONTRATISTA
- RECUBRIMIENTO DEL ACERO EN LO PARTE CENTRAL DE LAS HUELLAS	29-09-23	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alvaro Rodriguez C	Residente obra	UT Placahuella	
Rosana Mattos	Residente interventoria	GAVINCO	
Katherine Navarro C	Profesional Ambiental	Gavinco	
Rebiela Molina C	Profesional SST	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1863 DE 2022 MUNICIPIO LA PLAYA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 18, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplido:

Sin Cumplir:

-Componente Social.
-Rendimientos Financieros.
-PAGA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 07 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 19.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, a Ambiental y el área Social.

La Interventoria comenta los compromisos que tenía el Contratista la semana anterior la cual fueron la Reprogramación que la entregó el día 25 de agosto de 2023, también cumplió la solicitud de Prórroga ante el municipio el día 24 de agosto de 2023 y el PAGA hizo entrega el día 25 de agosto de 2023.

La Interventoria continua con el avance en cifras con corte el día 31 de agosto de 2023, con un Programado el 99.90% y un Ejecutado 0.55% se tiene un atraso del 99.35% se hace una aclaración que para el próximo comité si se va a tener unas cantidades de lo que se ha estado ejecutando.

En el municipio de La Playa tenemos dos corredores cada uno tiene 3 tramos, estos 3 tramos está en intervención de perfilado y sub base, ya que, en esta para conocimiento de todos, el espesor de la sub base de 30 cm y ya por estos centímetros, tenemos que echarlos por capas, compactarlo y liberar, en conjunto con el Contratista estoy esperando los resultados de esas densidades para darle la liberación a la segunda capa para completar los 30 cm del diseño que tenemos en el municipio de La Playa.

Se da continuidad al comité de seguimiento, se tiene un personal en obra, un total de empleo generados de 5, empleos directos generados 2, empleos indirectos 3 y empleo de la zona de influencia 5.

Se tiene una maquinaria, una retroexcavadora que se encuentra en obra, una motoniveladora, un compactador y volquetas.

Los Inconvenientes presentados a la fecha, hay un material fundamental para la Placa Huella, la escasez de suministro de material triturado.

El Contratista comenta que el tema de triturado hay mucha demanda y solamente hay dos plantas y siempre dicen la una se dañó, la otra no tiene, ese es el motivo que hace parar la obra, también las lluvias.

Se continua con el avance de entrega documental etapa de pre construcción, se tienen todos aprobados en excepción el componente PAGA.

El Contratista se compromete hacer entrega del documento PAGA el día lunes 18 de septiembre de 2023.

Se da continuidad con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, se encuentra toda aprobada.

La Interventoria continua el avance de ejecución física, se tiene la ubicación de los ejes de vía y verificación de anchos, lo que es en el tramo de San Pedro, en el tramo de Clavellinos y la ubicación en Llano Grande.

Se continua con la información de SST, se realizan actividades con maquinaria amarilla a la espera del informe de sus respectivos anexos, según aplique para el mes en ejecución.

Con respecto al componente Social comenta que se tiene:

Documentos sin entregar:
•Informes Trimestrales desde la firma del acta de inicio de obra (06 de marzo de 2023).
•Actas de Compromiso.
•Certificados de Territorialidad.
•Conformación del Comité de Veeduría Ciudadana.
•Plan de Adaptación a la Guía Ambiental; aprobado con observaciones.

Documentos Entregados
•Socializaciones de Inicio de Obra.
•Actas de Vecindad (Corredor 1 y 2).
•Solicitud de Consulta Previa; fue enviado por el Contratista oficio con la información faltante solicitada por el Ministerio del Interior.

El Contratista se compromete hacer entrega de los documentos faltantes del componente Social para el día 15 de septiembre de 2023, las actas de compromiso se van adelantar como todavía no se tiene completo todas las cuadrillas, entonces tampoco están los certificados de territorialidad, hace entrega de la veeduría ciudadana el día 8 de septiembre de 2023.

La Interventoria le solicita al Contratista que, con base a la Prórroga, entregar la programación ajustada. Esta Prorroga va hasta el 21 de diciembre de 2023.

El Contratista afirma que la Prorroga está en trámite de la póliza con la aseguradora.

La Interventoria tiene programado para el día martes 12 de septiembre de 2023 hacer recorrido en el municipio de La Playa con el Contratista.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por la participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Visita a campo	12/09/2023	TODAS LAS PARTES
Observaciones componente Ambiental	18/09/2023	CONTRATISTA
Informe Trimestral - Componente Social	15/09/2023	CONTRATISTA
Veeduria ciudadana	8/09/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/09/2023 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CLAUDIA RANGEL	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
VICTOR SANTOS	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

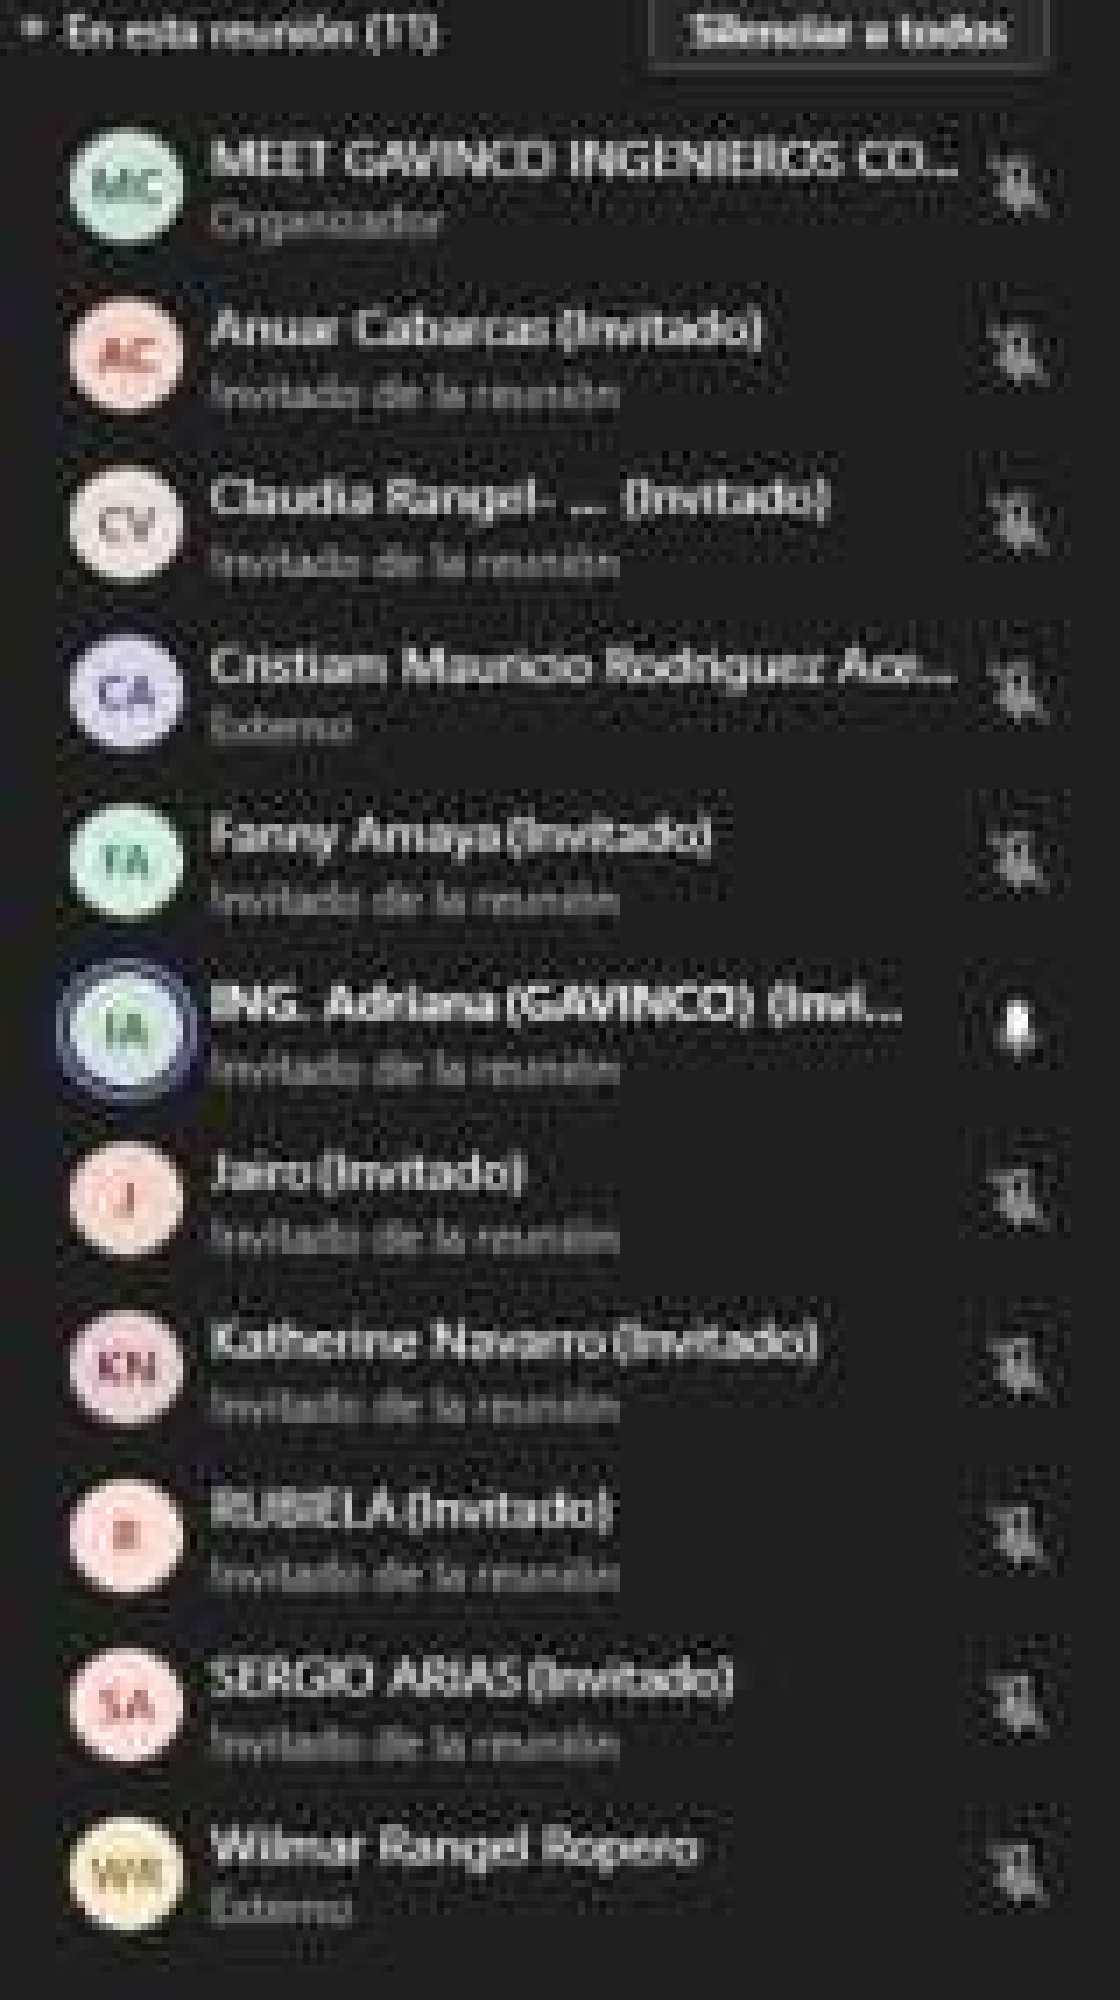
En esta reunión (11)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
Anuar Cabarcas (Invitado)
Invitado de la reunión
Claudia Rangel- ... (Invitado)
Invitado de la reunión
Cristian Mauricio Rodriguez Ace...
Externo
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana (GAVINCO) (Invi...
Invitado de la reunión
Jairo (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
SERGIO ARIAS (Invitado)
Invitado de la reunión
Wilmar Rangel Rojero
Externo

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1863 DE 2022 MUNICIPIO LA PLAYA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 18, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplido:

Sin Cumplir:

-Componente Social.
-Rendimientos Financieros.
-PAGA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 22 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez De Piñeres, da inicio al comité de seguimiento No. 20.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST y Ambiental.

La Interventoria comenta que el Contratista tiene un compromiso pendiente que es el informe trimestral del componente Social y que el Contratista pues había solicitado una mesa de trabajo, pero en el momento no contamos con profesional Social entonces estamos a la espera y para poderle dar respuesta al Contratista para hacer esta mesa de trabajo y aclarar las dudas que ellos tienen.

Continuamos con el avance con corte del día 14 de septiembre de 2023, se tiene un programado del del 10,00% un Ejecutado 6,83% con un atraso del 3,18%.

El avance físico de las obras se tiene en estos corredores 1175 metros lineales y 5 alcantarillas.

Personal en obra, se tiene total empleo generados 10, directos generados 2, indirectos generados 8 y de influencia 8 en el sitio tenemos una retroexcavadora, una volqueta, una mezcladora y un vibro compactador de concreto.

Inconvenientes presentados a la fecha, el factor climático, qué ha sido variante en estos últimos meses y el suministro de triturado ya la demanda que se encuentra en la zona, vale traerlo aquí presente el día de hoy.

El avance entrega documental etapa de pre construcción se encuentra en su totalidad aprobado en excepción el documento PAGA.

El avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños se encuentran todos aprobados.
El avance de ejecución física en este avance, se cuenta con todos los corredores intervenidos con la instalación de sub base y se tiene la construcción de alcantarillas en el tramo de Clavellinos 1 y 2.

La Interventoria continua con la información SST, se cumple con el compromiso de entrega de planillas de Seguridad Social del Contratista.

Con respecto al componente Ambiental, se recibe el documento PAGA, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y la Interventoría se encuentra a la espera de recibir los informes mensuales del mes de abril, mayo, junio y julio de 2023, ya que solo se ha recibido el informe del mes de agosto de 2023.

El Contratista se compromete hacer entrega de los informes del componente Ambiental para el día miércoles 27 de septiembre de 2023.

La Interventoria le pregunta a la Secretaría de Planeación con respecto a los Rendimientos Financieros, tenemos reporte de que han entregado hasta el mes de junio de 2023, queda pendiente a la fecha lo que es julio y agosto de 2023, y ahorita ya en 10 días es la entrega de los Rendimientos del mes de septiembre de 2023, si nos pueden informar, ¿qué ha pasado con estos Rendimientos Financieros?

Desde la Secretaría de Planeación, informan que no cuentan con ese dato por el inconveniente que presenta el municipio, dado que el alcalde renunció automáticamente de la Secretaría de Hacienda, se compromete para la próxima semana tener el dato de esa información, porque en estos momentos no se encuentra en el municipio la persona encargada de Hacienda entonces para poderle dar la información respectiva.

La Interventoria le pregunta al Contratista que el Diseño Geométrico que está pendiente le recomienda la entrega física de estos diseños ya que se debe hacer un acta de aprobación de estos diseños y posterior a esto hacer una radicación ante el INVIAS acá en Bogotá, que son 2 tomos en original con firmas originales.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Informes Ambiental	27/09/2023	CONTRATISTA
Rendimientos Financieros	PROXIMO COMITÉ	MUNICIPIO

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/10/2023 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CLAUDIA RANGEL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA	GAVINCO S.A.S.	Martha Soriano
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
CESAR AREVALO	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	
DUAY FERNANDO LOPEZ	INGENIERO AMBIENTAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

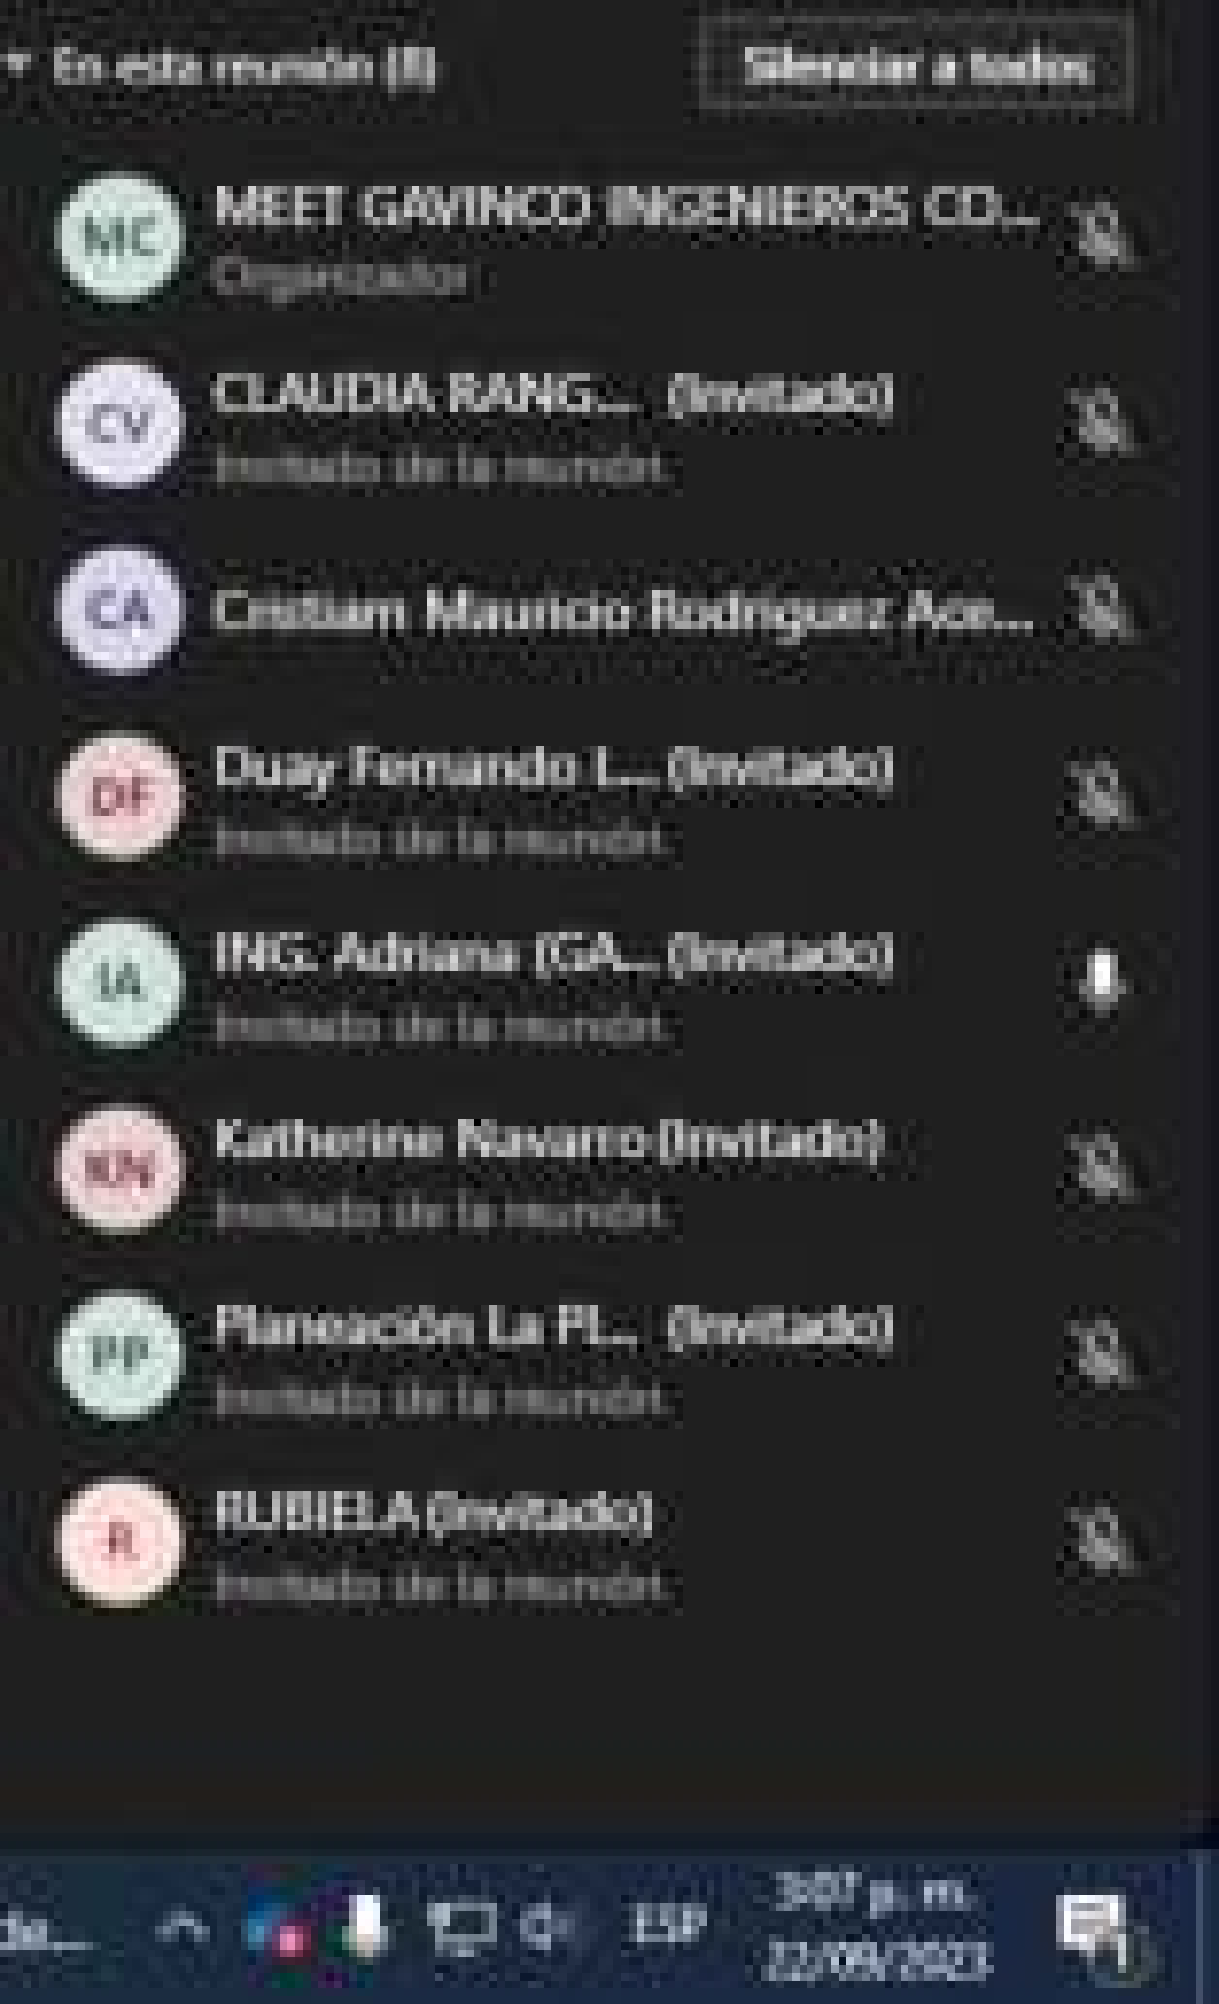
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
MC
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
CV
CLAUDIA RANG... (Invitado)
Invitado de la reunión
CA
Cristiam Mauricio Rodriguez Ace...
DF
Duay Fernando L... (Invitado)
Invitado de la reunión
IA
ING. Adriana (GA... (Invitado)
Invitado de la reunión
KN
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
PP
Planeación La PL... (Invitado)
Invitado de la reunión
R
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
ESP
3:07 p. m.
22/09/2023

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 14, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplido: -Programa de Obra. -Flujo de Caja. Sin Cumplir: -Diseño de Pavimentos. -Informe Estructural. -PAGA. -SST. -Componente Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
• Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 15 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 14.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, a Ambiental y el área Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenía dos compromisos de la semana anterior de la cual no las cumplió que era el informe mensual de la parte Ambiental y el otro las actas de vecindad, se le pregunta al ingeniero Fabián Gallardo para cuando hace entrega de este compromiso.

El Ing. Fabian Gallardo se compromete hacer entrega del informe mensual del componente Ambiental el día lunes 18 de septiembre de 2023.

Y el compromiso de las actas de vecindad la profesional Laura Daniela Barahona Carrascal se compromete hacer la entrega en el día de hoy.

Se da continuidad en el avance con corte del día 7 de septiembre 2023, se tiene un Programado del 0.57% y un Ejecutado al 0.37% con un retraso de 0,23% se hace claridad, actualmente se está trabajando en el tramo 5 y como está en la actividad de perfilado y el cajeo en este sector, la actividad no se ha terminado, todavía no se tiene cuantificada.

Tenemos el avance físico de las obras se va a intervenir 1515 metros lineales y 10 alcantarillas, en el momento se inició con el tramo 5 que correspondía a 350 metros lineales, pero por petición de la Comunidad ellos pidieron el favor de trasladar el primer tramo, que tenía 150 metros lineales para este ya la condición que tenía este tramo, entonces es el que inicialmente se está interviniendo.

El personal en obra se tiene total empleo generados 8, empleos directos generados 2, empleos indirectos generados 3 y empleos en la zona de influencia 5 y de maquinaria se tiene retroexcavadora en la obra, motoniveladora, un vibro compactador y se tiene volquetas.

Inconvenientes presentados a la fecha, el factor climático, las lluvias atrasa las actividades

La Interventoria continua con el avance entrega documental etapa de pre construcción se encuentra en su totalidad aprobados en excepción el componente Ambiental.

Se continua con el avance de entrega documental de revisión de Estudios y Diseños están aprobados con observaciones, está pendiente el Diseño de Pavimentos que fue entregado el día el 31 de agosto de 2023, está en manos del Contratista.

El Contratista manifiesta que las observaciones que le realizaron fueron en la disminución del alcance, está pendiente de aprobación por parte de la Interventoria el Diseño Geométrico hasta el tanto no esté aprobado, se remite nuevamente el oficio del alcance final con el Diseño Geométrico aprobado y ajustado igualmente el Diseño de Pavimento ajustado.

Las actividades en obra, está en el cajeo de la estructura de la vía del tramo 5 se retiró también la capa asfáltica de este tramo porque estaba en malas circunstancias, se hicieron conformación de sobre anchos, también se tuvo la semana pasada la visita por parte del director del ingeniero Jairo Andrés Quintero, que estuvo en el sitio haciendo un recorrido y observando las características que se tiene allí presente en este corredor, ya que en este corredor en este tramo se tiene una estructura de vía bastante considerable, también se tiene un mejoramiento de terraplén, sub base y carpeta de concreto rígido.

Se continua con información SST, Se realizan actividades con maquinaria amarilla. Está pendiente la entrega de planillas de seguridad social de operadores y personal de topografía, correspondiente al mes de agosto de 2023.

Con respecto al componente Ambiental. Se le envía al Contratista oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1020-22, con observaciones encontradas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).
La Interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con observaciones subsanadas por el profesional Ambiental del Contratista, informes mensuales de los meses abril, mayo, junio y julio de 2023, ya que solo se ha recibido informe del mes de agosto de 2023.

La Interventoria continua con el componente Social comenta que los documentos que faltan por entregar son: Actas de Vecindad; Informes Mensuales y Trimestrales de las diferentes actividades desarrolladas en el área de influencia del proyecto, desde la firma del acta de inicio de obra; Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), enviado con observaciones por esta Interventoría el día 08 de septiembre de 2023 con radicado GIC-INVIAS-NTS-1020-22.

Los documentos entregados son: Certificados de Territorialidad; Solicitud de Consulta Previa; Actas de Compromiso; Conformación de la Veeduría Ciudadana; Socialización Inicio de Obra.

Toma la palabra el ingeniero Wilmar Rangel Ropero solicitando que por favor le envíen en el día de hoy las actas donde la ciudadanía ha participado, pregunta que hasta cuando esta este contrato de obra. ¿Hasta cuándo quedó prorrogado?

El Contratista afirma que el contrato de obra va hasta el 17 de diciembre de 2023.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actas de participacion ciudadana para Planta Central Bogota	15/09/2023	INTERVENTORIA
Actas de vecindad	15/09/2023	INTERVENTORIA
Informe mensual Ambiental	18/09/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/09/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADOR DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	Martha Soriano
AURA CRISTINA TORRES	INGENIERO DE APOYO	UNION TEMPORAL GBE	
FABIAN GALLARDO	INGENIERO AMBIENTAL	UNION TEMPORAL GBE	
LUIS CARRASCAL	INGENIERO RESIDENTE	UNION TEMPORAL GBE	
CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	UNION TEMPORAL GBE	
WILMAR RANGEL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
LAURA BARAHONA	PROFESIONAL SOCIAL	UNION TEMPORAL GBE	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 15, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplido: -Programa de Obra. -Flujo de Caja. Sin Cumplir: -Diseño de Pavimentos. -Informe Estructural. -PAGA. -SST. -Componente Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
• Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 22 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 15.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST y Ambiental.

La Interventoria comenta que el Contratista tiene un compromiso pendiente que es el informe mensual Ambiental, se le pregunta para cuando haría entrega de este informe.

La profesional social Laura Daniela Barahona Carrascal informa que el ingeniero Fabián Gallardo no se pudo conectar en el momento porque ya tenía otro compromiso, entonces él informó que se va a contactar con la ingeniera Katherine Navarro para poder fijar con ella una fecha para la entrega del informe.

Se da continuidad al avance con corte del día 14 de septiembre de 2023, un programado 0,63% 101 un Ejecutado 0,4% con un atraso del 0.23%, se tiene instalada una excavación para la estructura de esta vía de 155 metros cúbicos de terraplén, se ha avanzado en 200 metros lineales en este corredor en el tramo 5, que es el que se está interviniendo.

En el avance físico de las obras, se tiene una construcción de Placa Huellas total en este corredor de 1515 metros lineales y de 10 unidades de alcantarilla.

El personal en obra se tiene total empleo generado 5, empleos directos generados 5, empleos indirectos generados 3 y empleo de la zona de influencia 5. Se tiene en el sitio la siguiente maquinaria una retroexcavadora sobre llantas, una motoniveladora, un Vibro, un compactador y se tiene volquetas.

Inconvenientes presentados a la fecha es el factor climático, los cambios de clima, ya que estamos en un tiempo de lluvias que son inesperadas.

La Interventoria continua con el avance entrega documental etapa preconstrucción están en su totalidad aprobadas en excepción el PAGA que se encuentra con unas observaciones, el ingeniero Fabián Gallardo envió un documento a la ingeniera.

Se continua con el avance de entrega documental de revisión de Estudios y Diseños se encuentra con observaciones el Diseño de Pavimentos, incluyendo el Diseño de Tránsito y el Informe Estructural.

El ingeniero Fernando Carrascal hace una aclaración con respecto al Diseño de Pavimentos y se enviaron observaciones con el oficio 969, el Diseño de Pavimentos está prácticamente enlazado con el Diseño Geométrico, el Diseño Geométrico está aprobado ahorita último bajo unas observaciones.

Y respecto al Informe Estructural se enviaron observaciones, un correo con oficio GB 042 se envió el 11 de agosto de 2023 y GB 046 se envió el 23 de agosto de 2023.

La Interventoria le solicita al Contratista enviar el Diseño Geométrico ajustado y el de Pavimentos.

Las actividades en obras, en el tramo 5 que se está interviniendo, se ha hecho el retiro de la capa asfáltica, ya que este corredor tenía pavimento asfaltico, se tiene la conformación de la vía, allí hay que hacer una caja de 70 cm y se tiene un chequeo de niveles. También se tiene la instalación del terraplén compactación de este mismo material y el día sábado se fue a corroborar y de nuevo los CBR en campo para tener claridad en el tipo de suelo de este corredor.

Se continua con la información SST, se encuentra pendiente la entrega de planillas de Seguridad Social de los operadores y personal de topografía correspondiente al mes de agosto de 2023.

Toma la palabra el ingeniero Camilo Forero informa que el día de ayer se hizo la entrega de las planillas.

La Interventoria continua con el componente Ambiental se informa que se recibió el día de ayer el documento PAGA y se encuentra en revisión por parte de la interventoría. La Interventoría se encuentra a la espera de recibir el informe mensual de los meses abril, mayo, junio, julio de 2023, ya que solo se recibió el mes de agosto de 2023 los formatos trimestrales y se les sugiere al Contratista ponerse al día con la documentación solicitada.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy. Feliz tarde para todos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Informe mensual Ambiental	26/09/2023	CONTRATISTA
Diseño Ajustado del Gometrico	22/09/2023	CONTRATISTA
Diseño de Pavimentos	22/09/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/10/2023 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADOR DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
LUIS CARRASCAL	INGENIERO RESIDENTE	UNION TEMPORAL GBE	
CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	UNION TEMPORAL GBE	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
LAURA BARAHONA	PROFESIONAL SOCIAL	UNION TEMPORAL GBE	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (12)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS ...
Organizador
Aura Cristina (Invitado)
Invitado de la reunión
Cristiam Mauricio Rodriguez A...
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
En espera
Fernando Carras... (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana (GA... (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
LAURA DANIELA... (externo)
Externo
Lised Arenas (Invitado)
Invitado de la reunión
ESP
2:09 p. m.
22/08/2023


LC
LUIS CARRASCAL (Invitado)
Invitado de la reunión
LE
luis estupiñan (Invitado)
Invitado de la reunión
R
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
LAA
2:10 p. m.
22/08/2023

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 - 2022 MUNICIPIO DE PAMPLONITA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No.1878 DEL 2021, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 11, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplido:
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hidráulico.

Sin Cumplir:
-Hojas de Vida.
-Ensayos de Laboratorio y Resultados de Laboratorio.
-SST.
-Pavimentos.
-PAGA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 07 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 11

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta que en el día de hoy realizó un recorrido en la obra, la cual no están cumpliendo con los aceros, hay una serie de observaciones en la obra, el personal mínimo no lo tienen. Se observó que hay 3 varillas de media y 3 varillas de 3/8, en los bordillos también algo similar, en la viga riostra también no están colocando los aceros.

El Contratista y el municipio no hizo presencia al comité del día de hoy.

Los seguimientos que se le ha hecho al Contratista no son con Cartilla Colombia rural, sino con Diseño de la Interventoría.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero pregunta a la Interventoria que la primera acta parcial de obra, ¿cuánto es? ¿Cuánto alcance lleva a pamplonita cuánta Placa Huella ha ejecutado completo?

Llevan construido 160 m lineales de Placa Huella y algo de bordillo.

La Interventoria va a devolver el acta parcial con las observaciones que se presentaron en el día de hoy.

La Interventoria le va solicitar al Contratista una homologación estructural y una modelación para verificar si están cumpliendo.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero comenta que va convocar una reunión con el municipio y con Interventoria para el día lunes 11 de septiembre de 2023.

El Contratista debe rectificar y colocar los aceros que fueron aprobados o sino hay que solicitarle la demolición, que demuestre como van esos 160 metros lineales.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz tarde.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/09/2023 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.


LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
WILMER RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
ROSANA MATTOS	INGENIERA RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

En esta reunión (9)

Silenciar a todos

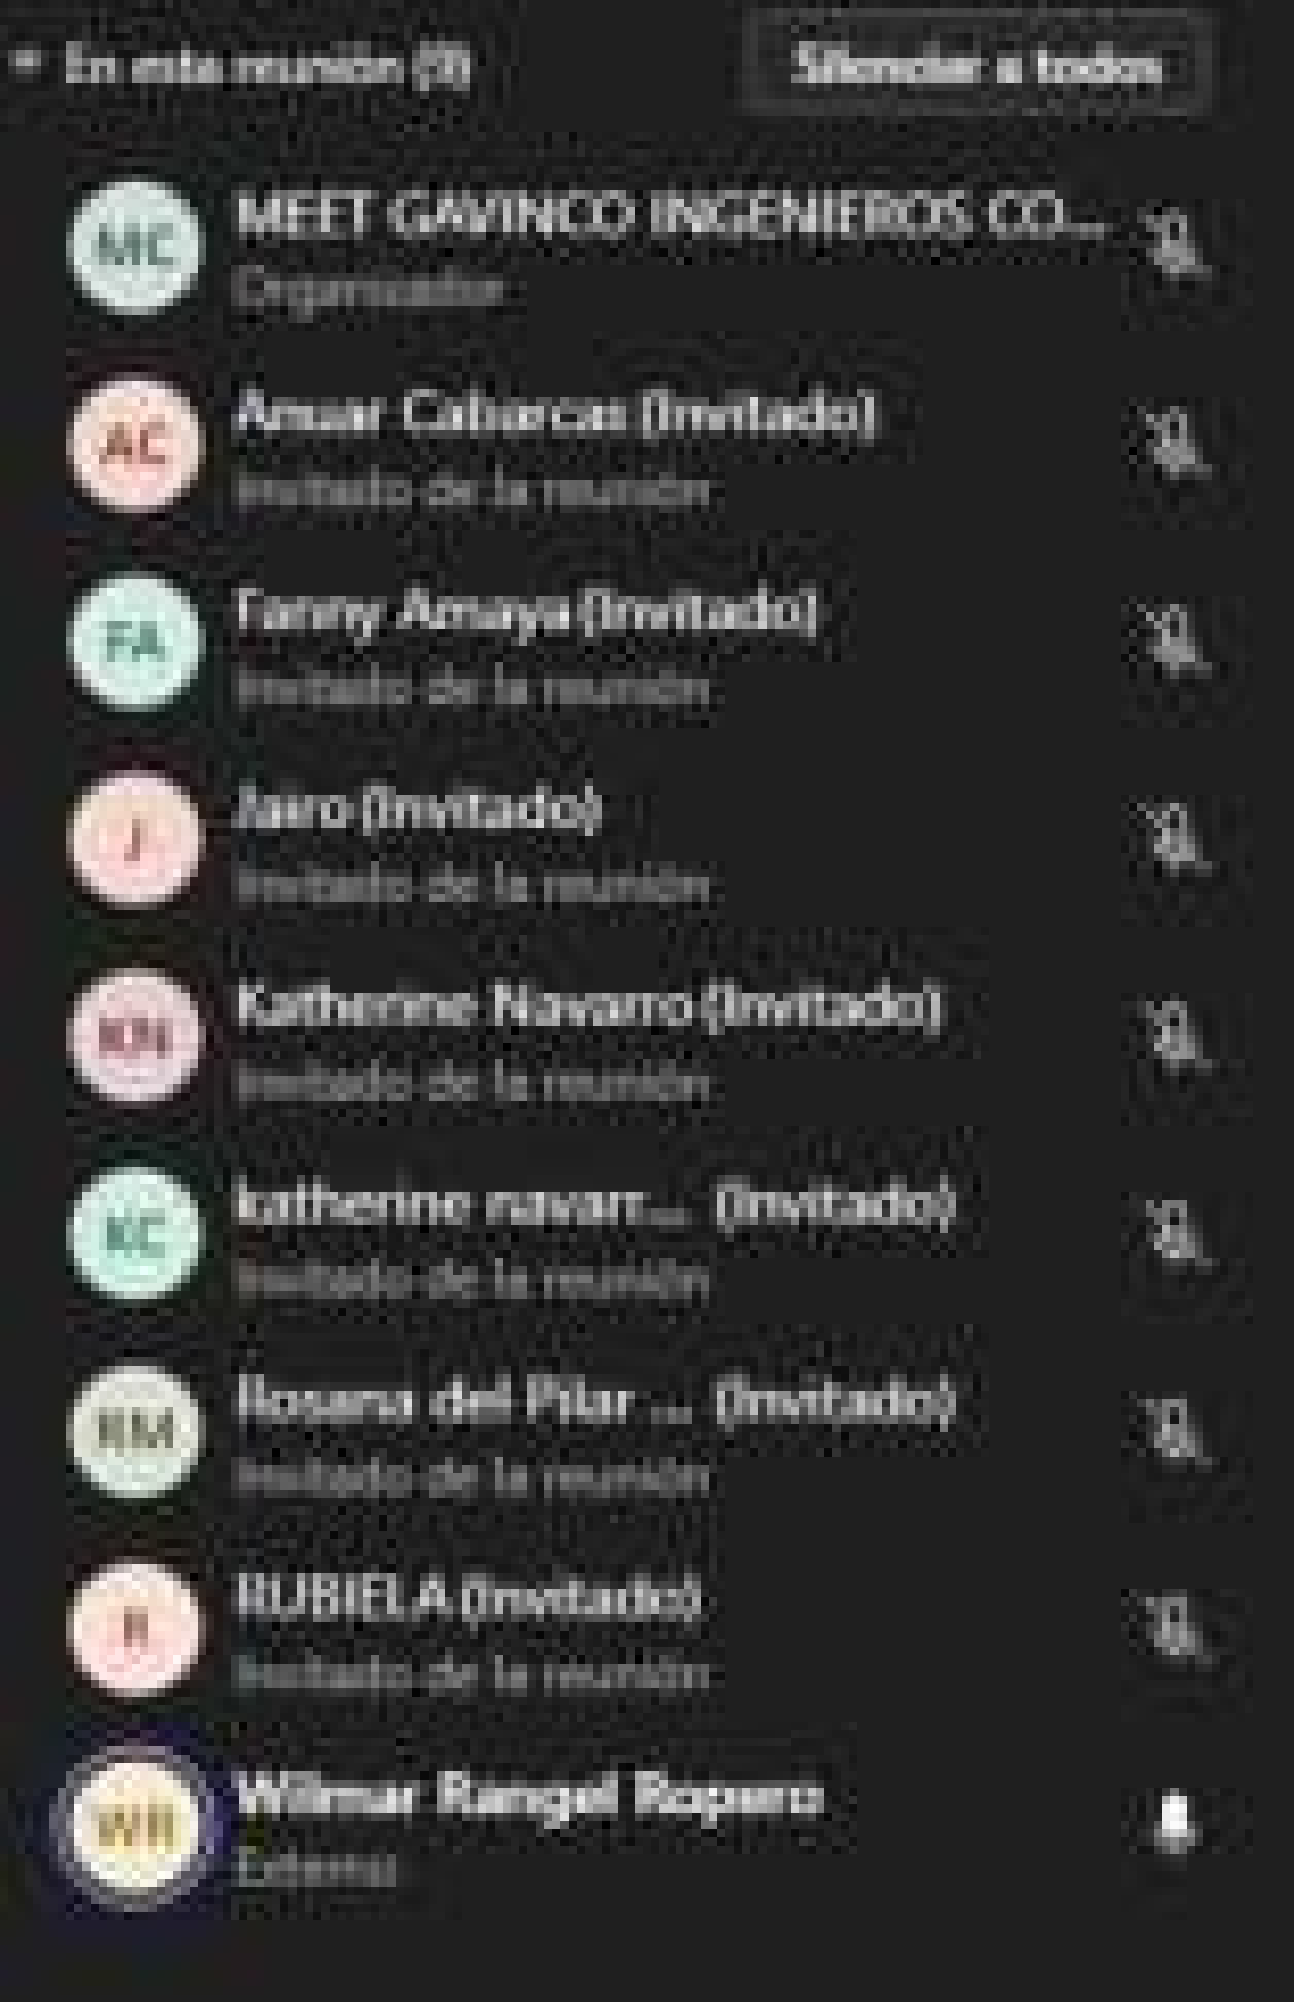

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 - 2022 MUNICIPIO DE PAMPLONITA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No.1878 DEL 2021, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 12, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:
-Hojas de Vida.
-Ensayos de Laboratorio y Resultados de Laboratorio.
-SST.
-Pavimentos.
-PAGA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 15 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 12

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenia un compromiso la cual no lo ha cumplido que son el componente Social, el PAGA y el SST.

El Contratista se compromete en el día de hoy elaborar el oficio y entregar el documento PAGA.

El Contratista manifiesta que el profesional Social realizó la entrega del documento a la profesional Rubiela Molina y que está pendiente unas situaciones de unas autoevaluaciones que él internamente se lo entrega a ella y se compromete enviar el documento de manera formal el día de hoy 15 de septiembre de 2023.

Se continua con el avance a la fecha corte 7 de septiembre de 2023, se tiene un porcentaje Programado del 58,63% contra un ejecutado del 11,52%, para un atraso del 47,10%.

Se tiene avances por etapas, complementación ajustes a Diseños 1,37% y ejecución de obra 10,15% en cuanto a la construcción de Placa Huella.

Avance físico construcción de Placa Huellas 150 metros lineales de paño completo, y en obras de drenaje se tiene excavación de 2 alcantarillas.

Personal en obra, total empleo generados 13, empleos directos generados 12, empleaos indirecto, generados 1 y empleos en la zona de influencia 13.

En obra se tiene Maquinaria 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 compactador y 2 volquetas.

Inconvenientes presentados a la fecha, el transporte del material se varó el camión donde lo llevaba y en donde están haciendo la excavación para la alcantarilla, se encontró una piedra enorme lo que ocasiono demora en la excavación.

La Interventoria continua con el avance entrega documental etapa pre construcción, se encuentra pendiente las Hojas de vida la cual no han manifestado por parte del municipio la aclaración sobre los requisitos del personal profesional.

Toma la palabra el ingeniero Johan Parada apoyo de la alcaldía, se compromete en el día de hoy 15 de septiembre de 2023, a redactar el oficio indicando los requisitos del personal.

Con respecto a la instalación de la Valla el Contratista se compromete para la próxima semana realizar la instalación de la Valla con las medidas de 3 x 2, para el día jueves 21 de septiembre de 2023.

Esta pendiente por parte del Contratista los ensayos de laboratorio, para cuando hacen entrega ese documento.

El Contratista manifiesta que envió un oficio de lo que el laboratorio ofrece, de los ensayos que ellos realizan.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, la mayoría se encuentra aprobados en excepción el Diseño de Pavimentos que se encuentra observado con fecha del 15 de agosto de 2023. El Contratista se compromete hacer entrega de este documento el día viernes 22 de septiembre de 2023.

La Interventoria comenta que el Diseño de Pavimentos en su estructura está aprobado, pero se debe ajustar el documento una inclusión de muros de contención a lo largo de los trazados, que se contempla en el Diseño Geométrico. Dar claridad para ver si aplica el tema de los muros o no.

La Interventoria le solicita al Contratista la entrega de los documentos físicos firmados en original para todos los proyectos porque ya hace más de 4 meses que se aprobó los Estudios y Diseños, posteriormente poder entregar el diseño definitivo al INVIAS.

En el avance en la ejecución física, se observa en el tramo 4 construcción de Placa Huellas, excavación para alcantarilla.

Se continua con la información SST, se comenta que se recibe el informe mensual de SST. Está pendiente la entrega de planilla de seguridad social del personal Contratista y subcontratista, correspondiente al mes de agosto de 2023.

El Contratista comenta que ya solicito las planillas a la parte administrativa, porque la elaboración de las planillas se deja para el último día de vencimiento, según el aplicativo, está a la espera que la oficina administrativa lo envíe.

Se continua con el componente Ambiental, se le sugiere al Contratista subsanar las observaciones encontradas en la ejecución de la obra, que fueron enviadas mediante oficio N°GIC-INVIAS-NTS-986-22 y empezar a implementar los proyectos contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental). La Interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional Ambiental del Contratista.

En cuanto al componente Social, se evidencia Documentos sin entregar:

•Actas de Vecindad.
•Socialización Inicio de Obra.
•Actas de Compromiso.
•Conformación Comité de Veeduría Ciudadana (Alcaldía).
•Certificados de Territorialidad.
•Solicitud de Consulta Previa.
•Informes Mensuales y Trimestrales desde la firma del acta de inicio (19 de octubre de 2022).
•Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

Documentos entregados: Hasta la fecha de este comité, la Unión Temporal COLOMBIA no ha entregado ningún documento correspondiente componente social.

La Interventoría ha enviado los siguientes oficios a la UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA:

GIC-INVIAS-NTS-532-22 del 11 de mayo de 2023, con asunto "Solicitud de presentación de documentos – inicio del contrato de obra – componente social".
GIC-INVIAS-NTS-833-22 del 27 de julio de 2023, bajo tema "Solicitud cumplimiento de documentos sociales previos al inicio de obra".
GIC-INVIAS-NTS-994-22 del 04 de septiembre de 2023, con sujeto "Solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos o afro descendientes en el área de influencia del proyecto, obra o actividad".
GIC-INVIAS-NTS-995-22 del 04 de septiembre de 2023, con asunto "Solicitud de información, programa contratación de mano de obra".
GIC-INVIAS-NTS-996-22 del 04 de septiembre de 2023, con tema "Solicitud informes mensuales y trimestrales; cumplimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).
GIC-INVIAS-NTS-1036-22 del 11 de septiembre de 2023, con asunto "Solicitud implementación proyectos (programas) sociales en el área de influencia del proyecto".

El Contratista se compromete enviar un oficio respondiendo a los requerimientos del componente Social, también manifiesta que ya abrió el segundo frente de trabajo en el sector de batalla bajo.

La Interventoria le solicita al Contratista realizar urgente un Plan de Contingencia para este contrato por los tiempos. También se le solicita la entrega del Informe Estructural.

El Contratista se compromete hacer entrega de este Plan de Contingencia para el día lunes 18 de septiembre de 2023 y el Informe Estructural hace entrega el día viernes 22 de septiembre de 2023.

Toma la palabra el ingeniero Wilmar Rangel Ropero pregunta de cómo está el tema de la veeduría ciudadana en el municipio y por favor hacer entrega de las actas donde haya participado la comunidad.

El ingeniero Johan Parada manifiesta que tienen dos compromisos, el primero era la socialización se hizo la semana pasada en el sitio por parte del señor alcalde y del secretario de Planeación, Joan Pantaleón, se está ya ultimando los detalles para hacer lo de las auditorías para crearlas, se conformaría para el viernes 22 de septiembre de 2023.

Se le informa al municipio el acompañamiento del día jueves 21 de septiembre de 2023, nos acompañen para visita técnica en la obra en horas de la mañana.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PAGA	15/09/2023	CONTRATISTA
SST	15/09/2023	CONTRATISTA
Hojas de Vida - Requisitos Personal	15/09/2023	MUNICIPIO
Instalacion Valla	21/09/2023	CONTRATISTA
Plan de Contingencia	18/09/2023	CONTRATISTA
Informe Estructural	22/09/2023	CONTRATISTA
Componente Social - Auditorias	22/09/2023	MUNICIPIO
Entrega de actas de la comunidad a Planta Central Bogota	15/09/2023	INTERVENTORIA
Visita Tecnica a Obra	21/09/2023	TODAS LAS PARTES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28/09/2023 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
ROSANA MATTOS	INGENIERA RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S.	
JOAN PARADA	INGENIERO DE APOYO	ALCALDIA	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

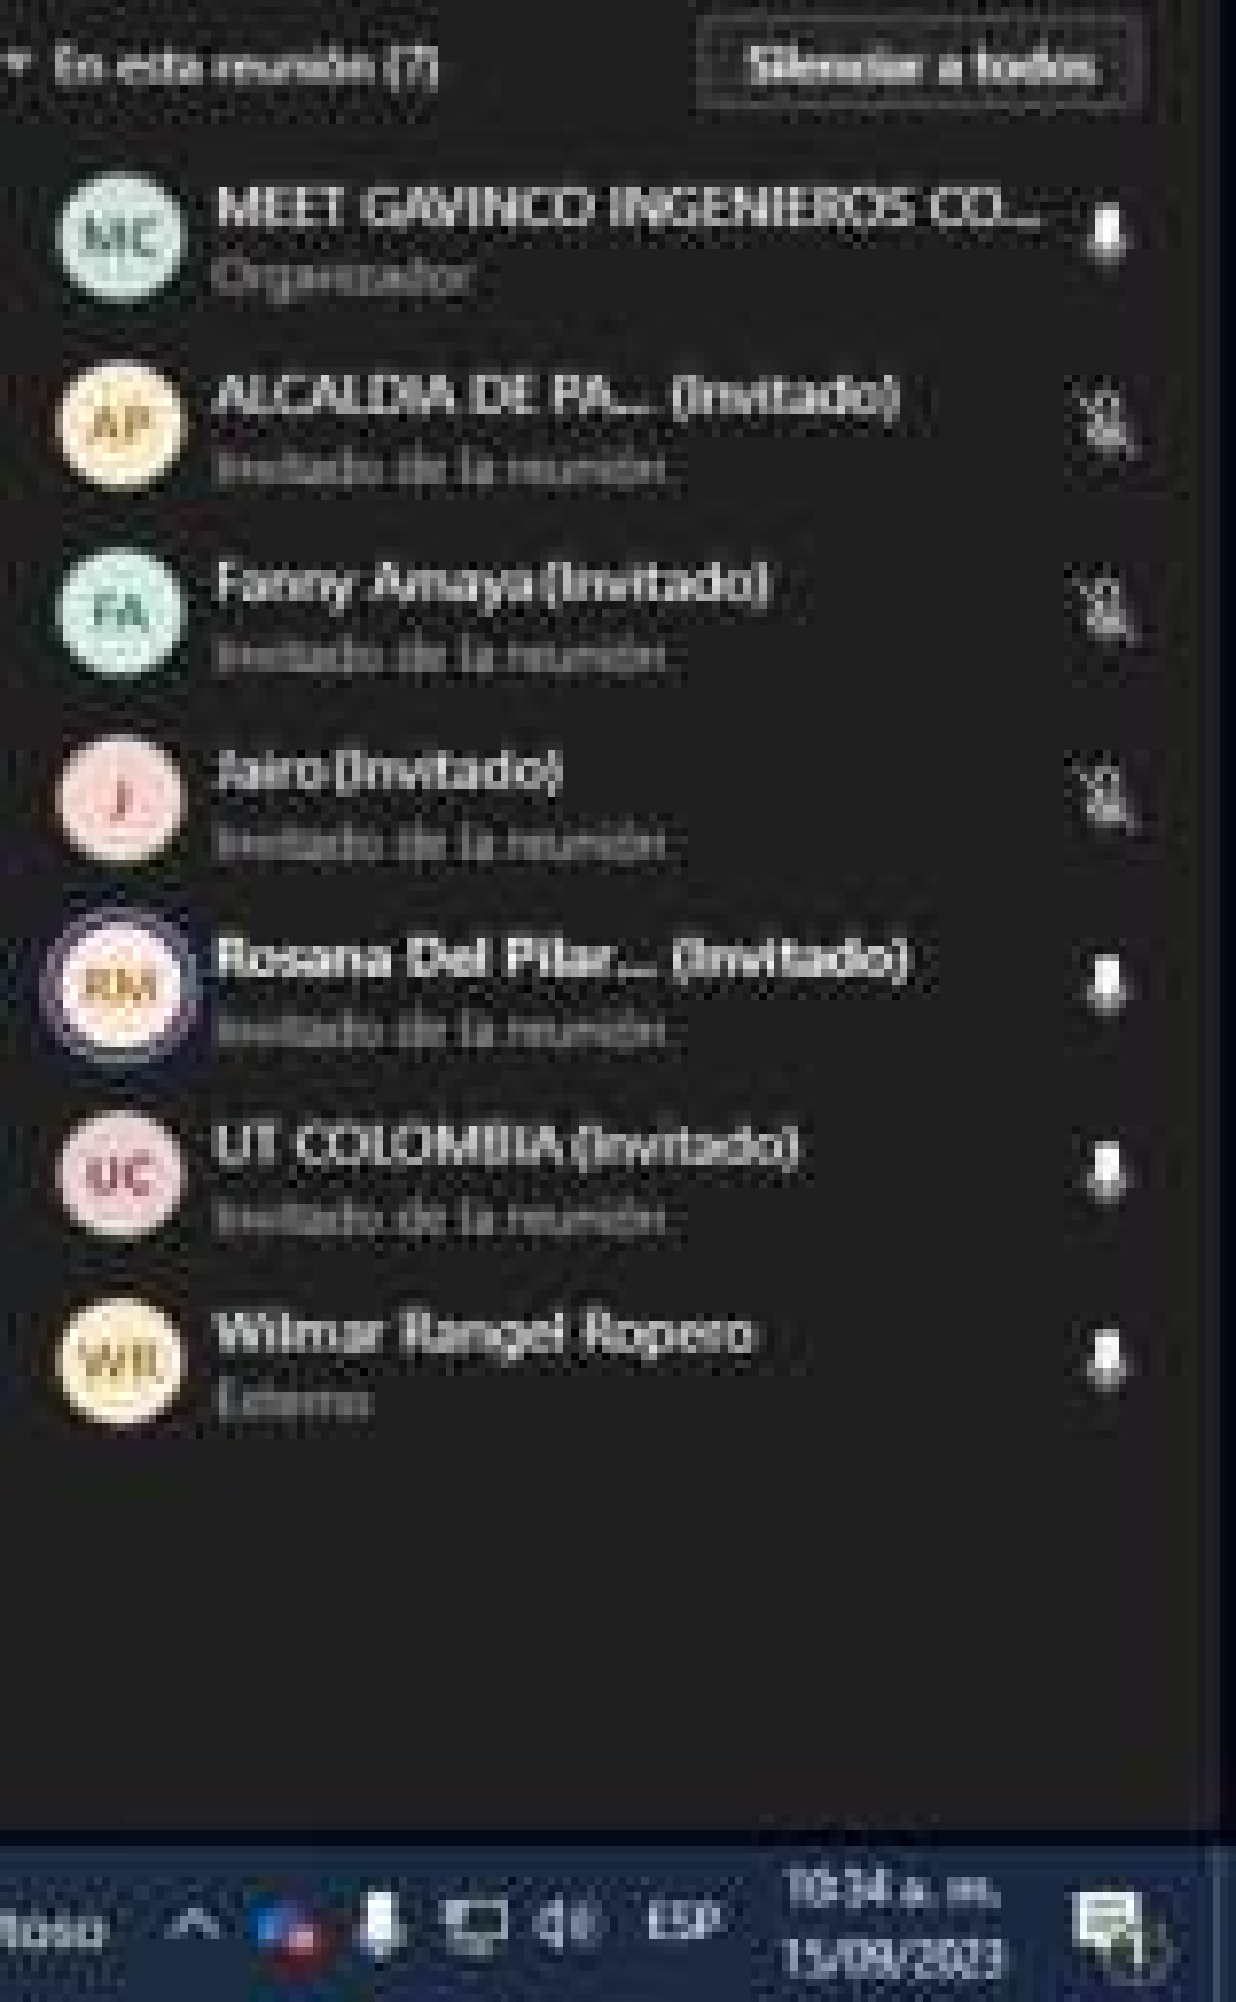
En esta reunión (7)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
ALCALDIA DE PA... (Invitado)
Invitado de la reunión
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
Jairo (Invitado)
Invitado de la reunión
Rosana Del Pilar... (Invitado)
Invitado de la reunión
UT COLOMBIA (Invitado)
Invitado de la reunión
Wilmar Rangel Rojero
Usted
ESP
10:34 a. m.
15/08/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA 28/09/23
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022
(Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO Nº 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

RECORRIDO DE OBRA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, VEREDA BATAGA CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

SE REALIZA RECORRIDO EN LA VEREDA BATAGA, TRAMO 4G, ANTES del PUENTE EN DONDE SE EVIDENCIÓ LA INSTALACIÓN DE LAS VIGAS RIOSTRAS CON ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE 1/2" Y FLEJES DE 1/4", LOS BORDILLOS EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DE LA VIA SE EVIDENCIAN VARILLAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE 3/8" Y LOS GANCHOS DE 1/4" EN LA ABSCISA K0+680 a K0+750.

EN LAS HUELLAS EN LA ABSCISA DE LA K0+689 HACIA PAMPLONITA K0+600 SE OBSERVO LA INSTALACIÓN DE 3 Varillas de 1/2" y 2 Varillas DE 3/8", DONDE SE EVIDENCIA CLARAMENTE QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON EL DISEÑO APROBADO POR LA INTERVENTORIA.

- Alcantarilla: K0+680 SE EVIDENCIA LA INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERTICAL EN LA ALETA DERECHA CON VARRIAS DE 3/8", Y EN DISEÑO DEBE IR DE 1/2".

SE LE HIZO LA OBSERVACIÓN A LA AUXILIAR DEL CONTRATISTA Y ELLA MANIFESTO QUE VAN A ADICIONAR OTRA VARILLA PARA CUMPLIR CON LA CUANTÍA, SE LES SOLICITA ENVIAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CUMPLIR CON EL DISEÑO.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

- En los Actividades ejecutadas estan fundiendo pieora pegada en los laterales de la placa huecos.

- Por parte de la interventoría se realizan la toma de densidades de subbase granular.

- Se hizo observación en la instalación del acero vertical de 1/2", deben tener una separación de 0,22. y se verifico en campo y tiene medidas variables.
- No se evidencia la presencia 100%. en obra del residente de obra

Componente Ambiental:
Con la visita se logro evidenciar que el contratista no esta cumpliendo con los proyectos que contempla, el PAGA, en la ejecución de obra se pudo observar que cuentan con un punto ecologico pero este no contempla la normativa ambiental vigente se le sugiere al contratista implementar cada uno de los proyectos contemplados en el PAGA.

Componente SST:
Se evidencia la ejecución del SGSST, Self recomienda a los trabajadores utilizar los elementos de protección personal

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	3 DE 3
	FECHA	28/09/23 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
- REFUERZO DE VARILLA ALCANTARILLA	28-09-23	Contratista
- HUELLAS CAMBIO DE ACEROS DE ACUERDO A DISEÑO	28-09-23	contratista
- BORDILLO: INSTALAR EL ACERO DE ACUERDO A DISEÑO	28-09-23	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Marcela Duarte Leal	Residente Contratista	OT. colombia	
Rosana Mattos	Residente Interv.	GAVINCO	
Katherine Navarro C.	Profesional Ambiental	GAVINCO	
Rubiela Molina C	Profesional SST	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	15/09/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 MUNICIPIO DE SANTIAGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - AZUL ALTO DEL MUNICIPO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 22, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplidos:
-Inicio de Obra física.

Sin Cumplir:
-PAGA (formatos).
-Componente Social
-Documentos SST.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 15 de septiembre de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 22

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el trascurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenía dos compromisos por entregar el día 16 de agosto de 2023, la cual no ha hecho entrega que son el componente Ambiental y Social.

El Contratista se compromete hacer entrega del PAGA y del componente Social en el día de hoy 15 de septiembre de 2023.

Se da continuidad con el avance con corte el día 07 de septiembre de 2023, con un Programado de 43,60% contra un ejecutado del 18,30% con un atraso del 22,70%.

Complementación ajuste de Estudios y Diseños 1,16% ejecución de obra 17,14%.

Avance físico de las obras en cuanto a la construcción de Placa Huella se tiene paño completo en el tramo 1: 521 metros lineales, tramo de 2: 150 metros lineales en el sector de La Palma, tramo 3: 50 metros lineales, tramo al llegar al Arenal.

Personal en obra total, empleos generados 33, empleos directos generados 8, empleos indirectos generados 25 y empleos en la zona de influencia 14, maquinaria y equipo una retroexcavadora de llantas, una Motoniveladora, un Compactador y cinco Volquetas.

Inconvenientes presentados a la fecha, la subida del material hasta el sitio de la intervención de la obra. El tripton presento fallas mecánicas lo que atraso el transporte interno del material.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción se encuentra en su totalidad aprobados.

Con respecto a la instalación de la Valla el Contratista todavía no cuenta con la aprobación por parte del INVIAS.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, se encuentra aprobado.

Se continua las actividades en obra se tiene avance de las huellas y la piedra pegada, cunetas y bordillos.

Se da continuidad con la Información del SST, se recibió el informe mensual, está pendiente la entrega de planilla de seguridad social del personal Contratista y subcontratista, correspondiente al mes de agosto de 2023.

Se continua con el componente Ambiental, se realiza visita de campo donde se logró evidencias que algunas observaciones realizadas han sido subsanadas por el Contratista como:

•Instalación del punto ecológico.
•Jornadas de aseo y limpieza.

La Interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con observaciones subsanadas por el profesional Ambiental del Contratista.

La Interventoria continua con el componente Social, comenta los documentos sin entregar: Informes Mensuales y Trimestrales desde la firma del acta de inicio de obra (18 de octubre de 2022); Actas de Vecindad; Actas de Compromiso; Certificados de Territorialidad.

Documentos Entregados: Conformación Comité de Veeduría Ciudadana, Socialización Inicio de Obra; Solicitud de Consulta Previa.

Igualmente, esta Interventoría ha remitido los siguientes oficios a la Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022:

• GIC-INVIAS-NTS-378-22 del 15 de marzo de 2023, con asunto “solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos o afrodescendientes en el área de influencia del proyecto, obra o actividad”.
•GIC-INVIAS-NTS-441-22 del 12 de abril de 2023, con asunto “Solicitud de información, programa contratación de mano de obra”.
•GIC-INVIAS-NTS-529-22 del 11 de mayo de 2023. con asunto “Solicitud cumplimiento de documentos previos al inicio de obra”.
•GIC-INVIAS-NTS-654-22 del 09 de junio de 2023, con asunto “Solicitud informes mensuales cumplimiento de ejecución PAGA”.
• GIC-INVIAS-NTS-711-22 del 23 de junio de 2023, con asunto “Solicitud envío de actas de vecindad, certificados territoriales, radicado de consulta previa y cifras de empleabilidad”.
• GIC-INVIAS-NTS-842-22 del 31 de julio de 2023, con asunto “Incumplimiento a la obligación de entregar información del componente social requerido por la Interventoría”.
•GIC-INVIAS-NTS-880-22 del 09 de agosto de 2023, con asunto “Solicitud informes mensuales y trimestrales componente social”.
• GIC-INVIAS-NTS-931-22 del 17 de agosto de 2023, con asunto “Solicitud entrega de documentación del componente social pendiente; so pena, de informar a la entidad contratante sobre la imposición de multas por el incumplimiento a la obligación de entregar información del componente social requerido por la Interventoría”.
• GIC-INVIAS-NTS-1032-22 del 11 de septiembre de 2023, con asunto “Solicitud implementación proyectos (programas) sociales en el área de influencia del proyecto”.

El Contratista afirma que la profesional Social de parte de ellos va entregar los compromisos del componente Socia con respecto a los grupos étnicos,

ya han realizado dos entregas al link del Ministerio del Interior y lo han rechazado por el tema de la ubicación del proyecto.

La Interventoria le pregunta al Contratista con respecto del tema de la entrega del informe de homologación estructural que se le había pedido en Santiago la semana pasada.

El Contratista comenta que los especialistas están trabajando en eso para dar una respuesta técnica y justificada la solicitud realizada por Interventoría, se compromete a más tardar el día lunes 18 de septiembre de 2023, en realizar entrega de ese documento.

La Interventoria le solicita al Contratista la entrega de un Plan de Contingencia, para mitigar el atraso que el día de hoy presenta el contrato.

El Contratista se compromete hacer entrega del Plan de Contingencia el día lunes 18 de septiembre de 2023.

La Interventoria comenta que la ingeniera Melissa Cárdenas comentó en una visita que se tuvo la semana anterior que van a contratar unas cuadrillas adicionales aquí en la en la en el sector del Mamon.

El Contratista comenta que el día que realizó la socialización, aproximadamente hace un mes en terreno donde la Comunidad manifestó que realizó la entrega de un oficio al municipio dónde solicita la demolición de los 70 metros de Placa Huella existente, el cual ellos manifiestan que no quieren que quede como ese lunar, o esa ventana de una Placa Huella, la cual técnicamente no cumple con las especificaciones técnicas de construcción, la cual por observación visual o un chequeo visual en algunos puntos ya presenta socavación y agrietamiento.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero solicita que le haga llegar en el día de hoy las actas donde ha participado la comunidad o esos comunicados.

El Contratista comenta que ha tenido dificultad con el tema de la ejecución de la obra, debido por el verano que se presenta en la región es bastante fuerte y dificultades para el tema del suministro de agua para la preparación de la mezcla en obra.

Se programa una visita al municipio de Santiago con todas las partes para el día viernes 22 de septiembre de 2023.

El ingeniero Andrés Ballesteros no pudo asistir en el comité, pero envió un audio en representación con el Geóloga de Planeación Municipal Sara Darlyn Cabrejo Puerto donde se disculpa por la no asistencia, porque ha tenido muchos compromisos y la verdad se ha sido difícil poder asistir en este momento, donde manifestó que días atrás, el día martes de esta semana estuvo en presente en la obra y estuvo haciendo el recorrido normal, rutinario, de cómo van los avances y ejecución de la obra y la verdad se encuentra un poco preocupado porque en los primeros días de agosto de 2023, en la primera semana de agosto de 2023, se reunió con el Contratista, en este caso el director de Obra Luis Blanco, allá en sitio y se hicieron algunas recomendaciones y se les hizo algunas solicitudes de manera verbal en la que correspondía en poder ingresar o contemplar la posibilidad de ingresar más mano de obra para poder agilizar un poco más el avance de ejecución de estas obras, también se pudiera incluir algunos carros para poder hacer el transporte interno de materiales a los lugares donde se está trabajando, la verdad no ha visto que se haya cumplido esos compromisos que se adquirieron en su momento.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PAGA	viernes, 15 de septiembre de 2023	CONTRATISTA
Componente Social	viernes, 15 de septiembre de 2023	CONTRATISTA
Plan de Contingencia	lunes, 18 de septiembre de 2023	CONTRATISTA
Actas de participacion a Planta Central - Bogota	viernes, 15 de septiembre de 2023	INTERVENTORIA
Visita al Municipio	viernes, 22 de septiembre de 2023	TODAS LAS PARTES
Informe de homologación estructural	lunes, 18 de septiembre de 2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28/09/2023 (Dia / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
ROSANA MATTOS	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S.	
SARA DARLYN CABREJO PUERTO	GEOLOGA	PLANEACION MUNICIPAL	
LUIS BLANCO	DIRECTOR	U.T. P.H. SANTIAGO 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (8)
MC
MEET GAVINCO INGENIEROS ...
Organizador
FA
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
KN
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
RM
Rosana Del Pilar ... (Invitado)
Invitado de la reunión
R
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
SP
Sara Dariyn Cabrejo Puerto
Externo
UT
UT PLACA HUEL... (Invitado)
Invitado de la reunión
WR
Wilmar Rangel Ropero
Externo
Otros invitados (1)
ESP
9:48 a. m.
13/09/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 27/09/23
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL - ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSUITORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

RECORRIDO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, VIA RURAL DE CUPERENA ZUL- ALTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

SE INICIO RECORRIDO EN EL TRAMO DEL ARENAL EN EL PR2+050 EN LA CURVA DONDE SE EVIDENCIÓ LA INSTALACIÓN DE LAS VIGAS RIOSTRAS CON ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE 3/8" Y FLEJES DE 1/4" ESTA INSTALACIÓN ES EN SENTIDO HACIA CUPERENA. POR LO QUE LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA LA HOMOLOGACIÓN ESTRUCTURAL DE PARTE DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA.

CONTINUAMOS NUESTRO RECORRIDO EN DONDE SE EVIDENCIA LA INSTALACIÓN DE 6 TUBOS DE 36" PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN EL PR2+400.

- SE EVIDENCIO FUNDIDA DE CUNETA EN LA MARGEN IZQUIERDA CON ACERO LONGITUDINAL DE 1/2" Y TRANSVERSAL DE 1/4", BORDILLO CON ACERO SUPERIOR DE 1/2" Y GANCHO DE 3/8", ESTAN PREPARANDO LA MEZCLA CON UNA DOSIFICACIÓN DE 8 VALDES DE ARENA Y 10 VALDES DE TRITURADO.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

EN EL K2+440 EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA SE EVIDENCIA LA INSTALACION DEL ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DE 1/2" SIN CUNETAS LA DEBIDA INSTALACIÓN DE LA SUBBASE GRANULAR, la VARILLA LONGITUDINAL SUPERIOR E INFERIOR SON DE 1/2" y los GANCHOS LOS COLOCARON DE 1/4". EL CONTRATISTA TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS GANCHOS SON DE 3/8"

- SE LE SUGERIO AL CONTRATISTA DE OBRA COMPACTAR BIEN EL TERRENO ANTES DE INICIAR CON EL VACIADO DEL CONCRETO.

- SE LE SUGERIO AL CONTRATISTA TERMINAR DE FUNDIR LA VENTANA QUE DEJARON EN LA PARTE CENTRAL EN EL PR1+120.

- EN EL RECORRIDO DE OBRA DE LA VIA CUBERNA ZULAITO. NO ESTA PRESENTE EL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA.

COMPONENTE AMBIENTAL:

CON LA VISITA SE LOGRO EVIDENCIAR QUE EL CONTRATISTA SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CONTEMPLAN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DEL DOCUMENTO "PAGA", EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE PUDO OBSERVAR QUE CUENTAN CON PUNTO ECOLOGICO, IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SE ESTAN REALIZANDO JORNADAS DE ASEO Y LIMPIEZA, SE LE SUGIRIO EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, YA QUE ESTOS DEBEN ESTAR EN UN ALMACEN PROVISIONAL

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

QUE CUENTEN CON SU RESPECTIVO TECHO, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA MEJOR DISPOSICIÓN FINAL Y EVITAR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
TAPAR VENTANA EN EL PRATO	30-09-23	Contratista
Compactación de hombros, cunetas y placa huella	27-09-23	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Melisa Cárdenas R.	Ing. Auxiliar	U.T. PH Santiago	Melisa Cardenas R.
Roscna Mattos	Resid. Interventt.	GAVINCO	
Katherine Navarro C.	Profesional Ambiental	Gavinco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 47 del 1/09/2023 al 7/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.932.001.928,43	43,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 874.726.354,70	19,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.057.275.573,73)	-23,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.932.001.928,43	43,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 926.345.544,92	20,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.005.656.383,51)	-22,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 183.228.416,50	4,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 115.397.030,64	2,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 56,99% | Avance o Atraso Físico %: -48,1%
Meta Física Ejecutada %: 8,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1171,01				35,5%
					Ejec	722				21,9%
* Construcción De Alcantarillas	UND	12			Prog	4,26				35,5%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	33	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion.

GIC-INVIAS-NTS-979-22: OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE OBRA

GIC-INVIAS-NTS-1001-22: RESPUESTA A SU COMUNICADO PHS2022 – 076 – 2022 DE FECHA 28-08-2023 cuyo asunto es: "JUSTIFICACIÓN DE LA NO INSTALACIÓN DE SUBBASE EN ALGUNOS TRAMOS"

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

Excavacion para vigas riostras: DEL K2+208 AL K2+232
Excavacion para Bordillo: DEL 2+653 AL 2+427; DEL 2+208 AL 2+285 por las dos margenes de la via.
Acero en las huellas: K2+208 ; K2+232
Acero de refuerzo en las vigas riostras: K2+208; K2+232
Acero de refuerzo en bordillos: Inicial PR 2+208 , Final PR2+285
Acero de refuerzo en cunetas: Inicial PR 2+427, Final PR2+753
Instalacion de subbase granular:
Concreto para huellas: Inicial PR2+232 Final K2+208
Concreto para vigas riostras: Inicial PR2+232 Final PR2+208
Concreto para bordillo: DEL 2+427 AL 2+653; DEL 2+208 AL 2+285 Bordillo izquierdo.
Concreto para cuneta: DEL PR2+427 AL PR2+753
Fundida de piedra pegada: K2+427 al K2+753
Se realizan viajes de transporte interno material petreo.
Se realizan viajes de transporte Interno material de peso.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se recibe informe mensual del mes de agosto, La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

ACTIVIDADES SOCIALES

Se lleva a cabo una (1) mesa de trabajo con la Profesional Social del Contratista, con el objetivo de darle a conocer los diferentes documentos preconstructivos que faltan por entregar; de igual manera, se pregunta sobre como va el avance del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), el cual aún no ha sido enviado por parte de la Unión Temporal.


COMPONENTE SST

Se realiza mesa de trabajo con el profesional SST Se recibe el informe mensual SST para la verificación del cumplimiento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la supervision de la instalacion de la subbase granular, toma de densidades, instalacion del acero de refuerzo, la fundida de las placa huellas, realizar el debido registro fotografico del antes durante y despues del proceso en ejecucion de las placa huellas del proyecto, tener al dia la bitacora de obra con todas sus actividades bien detalladas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de densidades de subbase granular.



Avance de placa huella



Fundida de cuneta y bordillo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

de parte de la interventoria exigirle celeridad al contratista en cuanto a la ejecucion del proyecto, ya que es indispensable el avance de la obra fisica para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales.
Se remite al contratista de Obra oficio GIC-INVIAS-NTS-1029-22 donde se remiten los hallazgos observados en la visita de obra realizada y se le solicita al contratista un informe Tecnico que soporte lo observado

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 48 del 8/09/2023 al 14/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.115.230.344,93	47,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 913.557.722,70	20,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.201.672.622,23)	-27,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.115.230.344,93	47,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 965.176.912,92	21,78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.150.053.432,01)	-25,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 183.228.416,50	4,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38.831.368,00	0,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 62,90% | Avance o Atraso Físico % -52,8%
Meta Física Ejecutada % 10,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1557,91				47,2%
					Ejec	833				25,2%
* Construcción De Alcantarillas	UND	12			Prog	4,98				41,5%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	26	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion.

Excavacion vigas: DEL K2+160 AL K2+208

Aceros huellas: K2+160- K2+208

Aaceros riostras: K2+160 - K2+208

Aceros cunetas: K2+208 al K2+285

Concreto Huella: K2+160 al K2+208

Concreto Viga: K2+160 al K2+208

Concreto cuneta: DEL K2+208 AL K2+285 cuneta margen izquierda.

Concreto ciclopeo: K2+208 al K2+285

Transportes internos de materiales petreos

Transportess internos de materiales de peso.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se envía oficio No GIC-INVIAS-NTS-1038-22 con la aprobación de informes mensuales, próximamente se les estará enviando observaciones encontradas en algunos informes que deben ser subsanadas. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

ACTIVIDADES SOCIALES

En espera de la entrega por parte del contratista del Documento PAGA, plan guia de adaptacion Ambiental.


COMPONENTE SST

Se recibe y revisa el informe mensual SST. Queda como compromiso la entrega de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole sequimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto de 3000 psi,



Vaciado de concreto 3000 psi



Fundida de huellas concreto 3000 psi.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nosotros como interventoria exigirle celeridad al contratista en cuanto a la ejecucion del proyecto, ya que es indispensable el avance de la obra fisica para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales. Se remite al contratista de Obra oficio GIC-INVIAS-NTS-1029-22 donde se remiten los hallazgos observados en la visita de obra realizada y se le solicita al contratista un informe Tecnico que soporte lo observado	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 49 del 15/09/2023 al 21/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.294.526.998,00	51,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 923.187.842,27	20,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.371.339.155,73)	-30,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.294.526.998,00	51,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 974.807.032,49	22,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.319.719.965,51)	-29,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 179.296.653,07	4,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.946.917,57	1,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 62,90% | Avance o Atraso Físico % -52,2%
Meta Física Ejecutada % 10,73%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1557,91				47,2%
					Ejec	900				27,3%
* Construcción De Alcantarillas	UND	12			Prog	4,98				41,5%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	26	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion.

Excavacion vigas: DEL K2+112 AL K2+160- DEL K2+058 AL K2+103

Aceros huellas: K2+112 - K2+160 ; K2+058- K2+103

Aceros riostras: K2+112-K2+160; K2+058- K2+103

Aceros cunetas:

Concreto Huella: K2+112 -K2+160; K2+058- K2+103

Concreto Viga: K2+112- K2+160; K2+058- K2+103

Concreto cuneta:

Concreto ciclopeo: K2+112 - K2+208

Transportes internos de materiales petreos

Transportess internos de materiales de peso.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N°PHS2022-080-2022. Por otra parte, la interventoría envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1040-22 con observaciones a los informes mensuales que deben ser subsanadas.

ACTIVIDADES SOCIALES


COMPONENTE SST

Se realiza mesa de trabajo, para coordinar temas de informe. Se solicita planilla de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal, vaciado de concreto de 3000 psi



Placa huella y formaleta para fundida de cunetas



Instalacion acero de refuerzo para posteriormente iniciar con el vaciado del concreto.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Nosotros como interventoria exigirle celeridad al contratista en cuanto a la ejecucion del proyecto, ya que es indispensable el avance de la obra fisica para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales.
Se remite al contratista de Obra oficio GIC-INVIAS-NTS-1029-22 donde se remiten los hallazgos observados en la visita de obra realizada y se le solicita al contratista un informe Tecnico que soporte lo observado
Se remite al contratista de Obra oficio GIC-INVIAS-NTS-1065-22 -ATRASO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SANTIAGO, donde la Interventoria Solicita Plan de Contigencia debido al atraso de obra presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 50 del 22/09/2023 al 28/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.471.779.134,50	55,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 978.444.100,91	22,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.493.335.033,59)	-33,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.471.779.134,50	55,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.030.063.291,13	23,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.441.715.843,37)	-32,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 177.252.136,50	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.256.258,65	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 71,14%
Meta Física Ejecutada % 11,74%
Avance o Atraso Físico % -59,4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1808,72				54,8%
					Ejec	1000				30,3%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	13,48				58,6%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	35	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	27	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 35

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion.

Excavacion vigas:
Aceros huellas:
Aceros riostras:
Aceros cunetas:
Concreto Huella:
Concreto Viga:
Concreto cuneta:
Concreto ciclopeo:
Transportes internos de materiales petreos
Transportess internos de materiales de peso.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se realiza visita donde se logró evidenciar que el contratista subsanó las observaciones enviadas en cuanto a la implementación de lo proyectos contemplados en cada uno de los programas del plan documento PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental), en la ejecución de la obra se pudo observar que cuentan con punto ecológico, implementación de la señalización, realización de jornadas de aseo y limpieza, se le sugirió al contratista el manejo adecuado de residuos peligrosos.

ACTIVIDADES SOCIALES


COMPONENTE SST

Se realiza mesa de trabajo con el motivo de informar los criterios a tener en cuenta en la entrega del informe SST.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE CONCRETO DE 3000 PSI



ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA LA FUNDIDA DE CUNETAS



EXCAVACION PARA LA INSTALACION Y VACIADO CONCRETO 3000 PSI DE VIGAS RIOSTRAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Nosotros como interventoria exigirle celeridad al contratista en cuanto a la ejecucion del proyecto, ya que es indispensable el avance de la obra fisica para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales.
Se remite al contratista de Obra oficio GIC-INVIAS-NTS-1029-22 donde se remiten los hallazgos observados en la visita de obra realizada y se le solicita al contratista un informe Tecnico que soporte lo observado
Se remite al contratista de Obra oficio GIC-INVIAS-NTS-1065-22 -ATRASO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SANTIAGO, donde la Interventoria Solicita Plan de Contigencia debido al atraso de obra presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 39 del 1/09/2023 al 7/09/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **HERRAN**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN - VEREDA EL RAMAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN. - VEREDA EL RAMAL

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	146 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 737.867.990,20		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.009,80	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.781.999.648,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 717.953.983,03	40,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 357.117.157,79	20,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (360.836.825,24)	-20,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.486.185,83	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 717.953.983,03	40,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 377.603.343,62	21,19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (340.350.639,41)	-19,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 85.303.754,85	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 41.775.542,65	2,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-192-22 del 19-Enero-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 60,13% — Avance o Atraso Físico %: -53,8%
Meta Física Ejecutada %: 6,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,99				99,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	1200			Prog	311				26,0%
					Ejec	145				12,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	3,10				77,5%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Herran cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-717-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado por la interventoria el 21-feb-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GIC-INVIAS-NTS-991-22: SOLICITUD ENTREGA DE MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI

GIC-INVIAS-NTS-999-22: RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ADUNTO ES “PROGRAMACIÓN AJUSTADA OTROSI 2” – OBSERVACIONES.

GIC-INVIAS-NTS-1014-22: RESPUESTA A SU OFICIO PHE2022-052-2022 DE FECHA 02-AGOSTO-2023 OBSERVACIONES BALANCE

ACTIVIDADES TECNICAS

Excavacion de vigas: DEL PR3+041 al PR3+000

Excavacion Alcantarillas: PR7+013; PR7+453

Acero Huellas: PR3+134 a PR3+086

Acero Riostras: PR3+153 - PR3+000

Acero Bordillos: PR3+104 al PR3+153

Concreto huellas: PR3+134 al PR3+086

Concreto Vigas: PR3+153 al PR3+083

Concreto ciclopeo: PR3+153 al PR3+134; PR3+134 al PR3+086

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibe el informe mensual de agosto y se le envían observaciones que deben ser subsanadas por la profesional ambiental del contratista. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

ACTIVIDADES SOCIALES

El Contratista no ha enviado el correspondiente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).


COMPONENTE SST

Se realiza visita de obra para verificación de la ejecución del SG-SST, Se recibe el informe mensual SST.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la supervision de las actividades ejecutadas por el constratista de obra, el debido registro fotografico del antes, durante y despues de las actividades realizadas, y todo el debido seguimiento dia a dia en cuanto al avance del proyecto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SECTOR MOLINOS PR3+ 086 A PR3+100, FUNDIDA DE HUELLAS



Toma de Densidades



Sector el molino, fundida de huellas y se empalma con la placa huella existente.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de la interventoría, exigir celeridad al Contratista en cuanto al desarrollo del proyecto, que presente un plan de contingencia para que pueda mitigar el atraso que lleva hasta el momento, debe implemenetar dos a tres cuadrillas para que puedan cumplir con la meta fisica del proyecto.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se solicita al contratista de obra por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-995-22, la entrega de la documentacion del componente social, en caso de incumplir dicha solicitud se le informara a la entidad contratante sobre la imposicion de multas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 40 del 8/09/2023 al 14/09/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **HERRAN**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN - VEREDA EL RAMAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN. - VEREDA EL RAMAL

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	146 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 737.867.990,20		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.009,80	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.781.999.648,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 797.409.166,30	44,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 457.958.339,88	25,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (339.450.826,42)	-19,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.486.185,83	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 797.409.166,30	44,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 478.444.525,71	26,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (318.964.640,59)	-17,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 79.455.183,27	4,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.841.182,09	5,66%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-192-22 del 19-Enero-22

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,23% — Avance o Atraso Físico %: -65,7%
Meta Física Ejecutada %: 6,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,99				99,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	1200			Prog	477				39,8%
					Ejec	153				12,8%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00				99,9%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Herran cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-717-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado por la interventoria el 21-feb-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GIC-INVIAS-NTS-1057-22: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022

GIC-INVIAS-NTS-1041-22: OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES AMBIENTALES

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza recorrido de obra por parte del Ingeniero Director de Interventoria para supervisar el proceso constructivo del la obra, verificar el cumplimiento en cuanto a los diseños aprobados por la interventoria, y en general todo el desarrollo del proyecto.

Excavacion de vigas:

Excavacion varias sin clasificar Alcantarillas: PR7+983 APROX

Acero Huellas:

Acero Riostras:

Acero Bordillos: PR3+104 al PR 3+000, PR3+104 al PR3+153

Acero Cunetas: PR3+000 al PR3+153

Concreto huellas: PR3+133,54 al PR 3+085,24

Concreto Vigas: PR3+153 al PR 3+000.

Concreto Cuneta: PR 3+153 AL PR3 +135,54

Concreto ciclopeo: PR3+085,24 al PR3+000

Concreto Bordillo: PR3+000 AL PR3+153

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se revisa informes mensuales enviados por la profesional ambiental del contratista, próximamente se estará enviando oficio con los aprobados y con algunas observaciones encontradas. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).


COMPONENTE SST

se recibe y revisa el informe mensual SST. Queda como compromiso la entrega de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la supervision de las actividades ejecutadas por el constratista de obra, el debido registro fotografico del antes, durante y despues de las actividades realizadas, y todo el debido seguimiento dia a dia en cuanto al avance del proyecto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto de 3000 psi.



Visita del ingeniero Director de Interventoria a supervisar la ejecucion de la obra.



Toma muestras de concreto 3000 psi.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista en cuanto al desarrollo del proyecto, que presente un plan de contingencia para que pueda mitigar el atraso que lleva hasta el momento, debe implemenetar dos a tres cuadrillas para que puedan cumplir con la meta fisica del proyecto.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se solicita al contratista de obra por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-995-22, la entrega de la documentacion del componente social, en caso de incumplir dicha solicitud se le informara a la entidad contratante sobre la imposicion de multas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 41 del 15/09/2023 al 21/09/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **HERRAN**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN - VEREDA EL RAMAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN. - VEREDA EL RAMAL

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	146 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.781.999.648,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.781.999.648,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 737.867.990,20		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.009,80	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.781.999.648,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 873.043.198,24	48,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 501.353.794,01	28,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (371.689.404,22)	-20,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.486.185,83	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 873.043.198,24	48,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 521.839.979,84	29,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (351.203.218,39)	-19,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 75.634.031,94	4,24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 46.713.382,91	2,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-192-22 del 19-Enero-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 73,79% — Avance o Atraso Físico %: -67,2%
Meta Física Ejecutada %: 6,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,99				99,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	1200			Prog	533				44,4%
					Ejec	153				12,8%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00				100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Herran cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-717-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado por la interventoria el 21-feb-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GIC-INVIAS-NTS-1041-22: OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES AMBIENTALES

GIC-INVIAS-NTS-1071-22: SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE OBRA.

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

Excavacion de vigas: DEL PR6+925 AL PR7+000

Excavacion varias sin clasificar Alcantarillas:

Acero Huellas: PR6+925 a PR 7+013; PR 6+925 a PR7+013; PR6+925 a PR7+013

Acero Riostras: PR6+925 A PR7+013; PR6 +925 A PR7+013; PR6 +925 A PR7+013

Acero Bordillos:

Acero Cunetas:

Concreto huellas: PR6+925 al PR7+013

Concreto Vigas:

Concreto Cuneta: PR3+085,24 AL PR3+000

Concreto ciclopeo:

Concreto Bordillo:

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N°PHE2022-055-2022. Por otra parte, la interventoría envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1041-22 con observaciones a los informes mensuales que deben ser subsanadas.


COMPONENTE SST

Se realiza mesa de trabajo, para coordinar temas de informe. Se solicita planilla de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la supervision de las actividades ejecutadas por el constratista de obra, el debido registro fotografico del antes, durante y despues de las actividades realizadas, y todo el debido seguimiento dia a dia en cuanto al avance del proyecto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENCOFRANDO PARTE INTERNA DE POCETA. ALCANTARILLA PR 7+013



MODULACION Y PREPARACION DE ZONA HUELLA, SEGUNDA IMAGEN MAESTRO COLOCANDO SEPARACION DE PARRILLA DEL SUELO.



CONTINUACION DE FUNDIDA DE HUELLA MARGEN DERECHA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista en cuanto al desarrollo del proyecto, que presente un plan de contingencia para que pueda mitigar el atraso que lleva hasta el momento, debe implemenetar dos a tres cuadrillas para que puedan cumplir con la meta fisica del proyecto.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se solicita al contratista de obra por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-995-22, la entrega de la documentacion del componente social, en caso de incumplir dicha solicitud se le informara a la entidad contratante sobre la imposicion de multas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 42 del 22/09/2023 al 28/09/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **HERRAN**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN - VEREDA EL RAMAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA A HERRAN. - VEREDA EL RAMAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 146 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00
FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 — VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.781.999.648,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 737.867.990,20		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.009,80	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.781.999.648,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 948.580.154,44	53,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 462.202.145,80	25,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (486.378.008,64)	-27,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.486.185,83	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 948.580.154,44	53,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 482.688.331,63	27,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (465.891.822,81)	-26,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 75.536.956,20	4,24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.596.728,31	1,49%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-192-22 del 19-Enero-22

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75,32% — Avance o Atraso Físico % -51,8%
Meta Física Ejecutada % 23,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,99				99,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	1200			Prog	588				49,0%
					Ejec	165				13,8%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00				100,0%
					Ejec	2			2	50,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Herran cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-717-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado por la interventoria el 21-feb-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En la presente semana se realizaron los siguientes oficios que se relacionan a continuacion.

GIC-INVIAS-NTS-1108-22: SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DE 2023

GIC-INVIAS-NTS-1107-22: SOLICITUD DE PRESENCIA EN OBRA DEL PROFESIONAL SST

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

Excavacion de vigas: DEL PR7+ 035 AL PR7+077

Excavacion varias sin clasificar Alcantarillas:

Acero Huellas: PR7+035 a PR7+077

Acero Riostras: PR7+035 A PR7+077

Acero Bordillos:

Acero Cunetas:

Concreto huellas: PR7 +035 AL PR7+077

Concreto Vigas:

Concreto Cuneta:

Concreto ciclopeo: PR6+925 al PR7+013

Concreto Bordillo:

Transportes internos de materiales petreos:

Transportes internos de material de peso.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se realiza visita a obra donde se logro evidenciar que el contratista está cumpliendo con algunos proyectos que contempla cada uno de los programas del documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), en la ejecución de obra se pudo observar que cuentan con punto ecológico, implementación de la señalización y están realizando jornadas de limpieza y aseo, el material sobrante lo están utilizando como material de relleno de alcantarillas, se sugiere al contratista ubicar la señalización y punto ecológico, ya que todo esto se encuentra en un almacén, por otra parte se solicita la certificación de la empresa prestadora del servicio para la disposición final de residuos peligrosos y acta o contrato de arrendamiento del dueño de la casa que es utilizada como almacén.


COMPONENTE SST

se realiza visita de obra, se identifica la falta del personal SST por parte del contratista y la no ejecución del SG-SST. Se deja por escrito en acta de obra y oficio emitido.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la supervision de las actividades ejecutadas por el constratista de obra, el debido registro fotografico del antes, durante y despues de las actividades realizadas, y todo el debido seguimiento dia a dia en cuanto al avance del proyecto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA Y PIEDRA PEGADA CENTRO



FORMALETA E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA FUNDIDA DE HUELLAS



AVANCE EN FUNDIDA DE HUELLAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista en cuanto al desarrollo del proyecto, que presente un plan de contingencia para que pueda mitigar el atraso que lleva hasta el momento, debe implemenetar dos a tres cuadrillas para que puedan cumplir con la meta fisica del proyecto.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se solicita al contratista de obra por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-995-22, la entrega de la documentacion del componente social, en caso de incumplir dicha solicitud se le informara a la entidad contratante sobre la imposicion de multas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 27 del 1/09/2023 al 7/09/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.372.333,93	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.372.333,93	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 12.372.333,93	0,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24 Enero de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -98,35%
Meta Física Ejecutada %: 1,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99	0,99	0,99	99,0%
* Placa Huellas	ML	1366			Prog	600	200,00	566	1366,00	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	17			Prog	7	2,00	8	17,00	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio San Alberto y La Esperanza — TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación del punto de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GIC-INVIAS-NTS-1012-22: RESPUESTA A SU OFICIO MATICCES -CACHI-060-2022 de FECHA 12 DE AGOSTO 2023 – BALANCE CACHIRA – OBSERVACIONES

ACTIVIDADES TECNICAS

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación ambiental como la entrega de los informes mensuales y la entrega del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional ambiental del contratista, hasta la fecha no se ha recibido documentación de este componente.

ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría de encuentra a la espera sea enviado el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); así como de los documentos de preconstrucción, los cuales han sido solicitados mediante oficia por la Interventoría y aún no han sido remitido


COMPONENTE SST

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

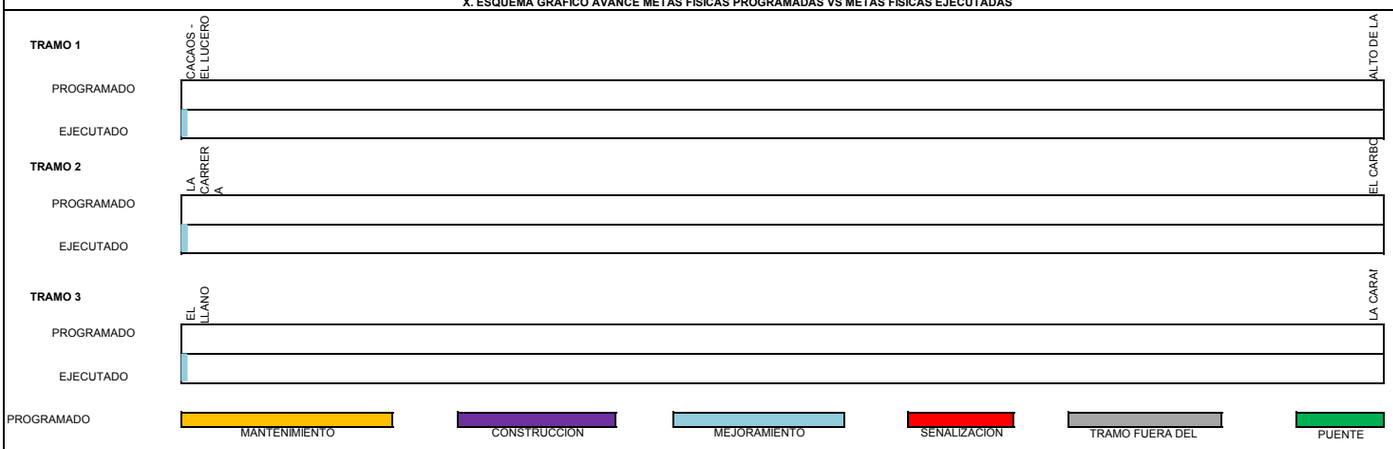

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de la interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la peticion de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
Se solicito al contratista de Obra por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-884-22 el 10 de agosto de 2023 las observaciones de la reprogramacion de obra, al no tener respuesta por parte del contratista se le reitera por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1033-22 el 11 se septiembre de 2023 la atencion las observaciones.
Se envia al municipio oficio GIC-INVIAS-NTS-1023-22,el 08 de septiembre de 2023 donde se remite informe del estado actual de obra del proyecto No.160 de 2022

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 8/09/2023 al 14/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.372.333,93	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.372.333,93	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 12.372.333,93	0,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24 Enero de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: -98,35%
Meta Física Ejecutada %: 1,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99	0,99	0,99	99,0%
* Placa Huellas	ML	1366			Prog	600	200,00	566	1366,00	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	17			Prog	7	2,00	8	17,00	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación del punto de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion.

GIC-INVIAS-NTS-1033-22: REITERACIÓN OFICIO GIC-INVIAS-NTS-884-22; SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA.

ACTIVIDADES TECNICAS

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación ambiental como la entrega de los informes mensuales y la entrega del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional ambiental del contratista, hasta la fecha no se ha recibido documentación de este componente.


COMPONENTE SST

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

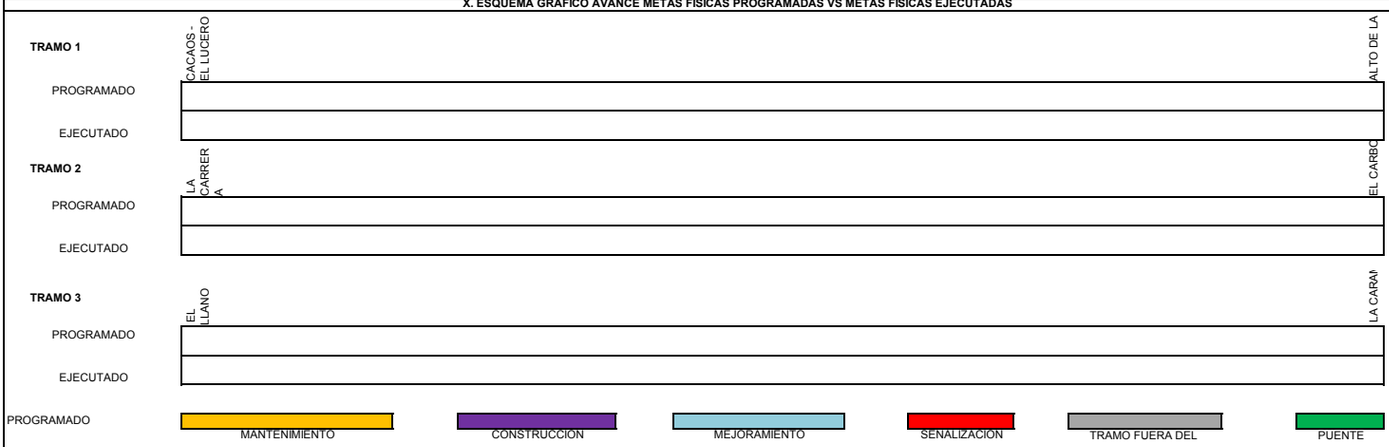

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad. Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 15/09/2023 al 21/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.372.333,93	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.372.333,93	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 12.372.333,93	0,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24 Enero de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: -98,35%
Meta Física Ejecutada %: 1,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99	0,99	0,99	99,0%
* Placa Huellas	ML	1366			Prog	600	200,00	566	1366,00	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	17			Prog	7	2,00	8	17,00	100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación del punto de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion.

GIC-INVIAS-NTS-1033-22: REITERACIÓN OFICIO GIC-INVIAS-NTS-884-22; SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA.

GIC-INVIAS-NTS-1079-22 : SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.

GIC-INVIAS-NTS-1096-22: RESPUESTA A SU OFICIO "REITERACIÓN SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO" CONTRATO 160 DE 2022 -CACHIRA

ACTIVIDADES TECNICAS

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N°MATICCES-CACHI-063-2022. Por otra parte, la interventoría se encuentra a la espera de recibir informes mensuales y formatos trimestrales.


COMPONENTE SST

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

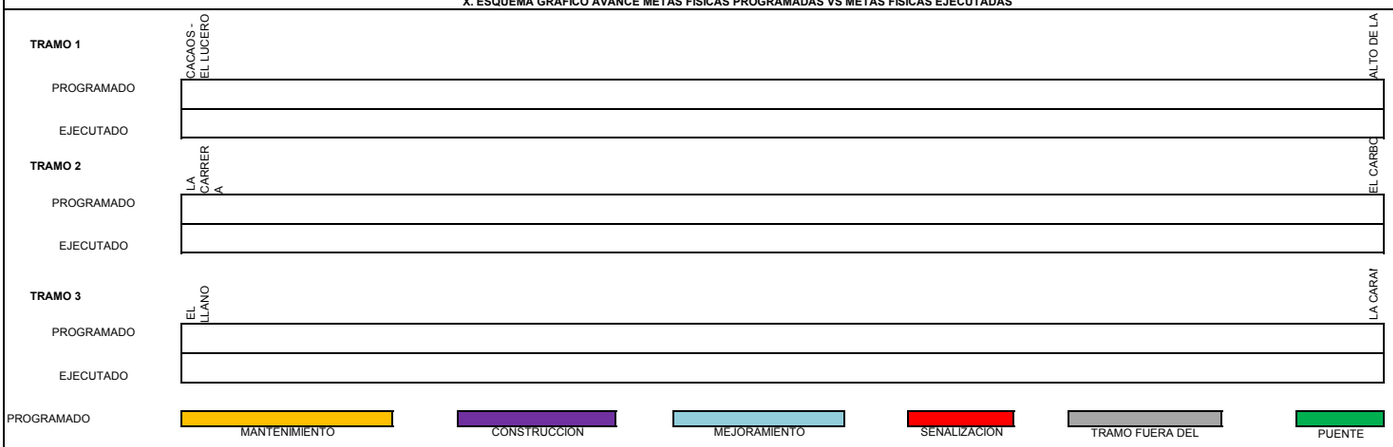

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira



Socializacion contrato 160 de 2022, alcaldia de cachira

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 22/09/2023 al 28/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.554.160.168,22	58,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.554.160.168,22)	-58,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.372.333,93	99,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.554.160.168,22	58,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.372.333,93	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.541.787.834,29)	-58,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 191.049.926,40	7,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24 Enero de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82,51% | Avance o Atraso Físico %: -80,86%
Meta Física Ejecutada %: 1,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99	0,99	0,99	99,0%
* Placa Huellas	ML	1463			Prog	449,3486	22,08006	289,5012	760,93	52,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	17			Prog	7	1,24	8	16,24	95,5%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	6

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación del punto de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se le solicito al contratista en la mesa de trabajo realizada el 29 de septiembre de 2023, plan de contengia debido a los altos atrasos que se presentan para el inicio de obra.

ACTIVIDADES TECNICAS

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibe nuevamente documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N°MATICCES-CACHI-064-2022. Por otra parte, la interventoría se encuentra a la espera de recibir informes mensuales y formatos trimestrales.


COMPONENTE SST

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En espera a que el contratista de inicio a las obras fisicas del proyecto.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

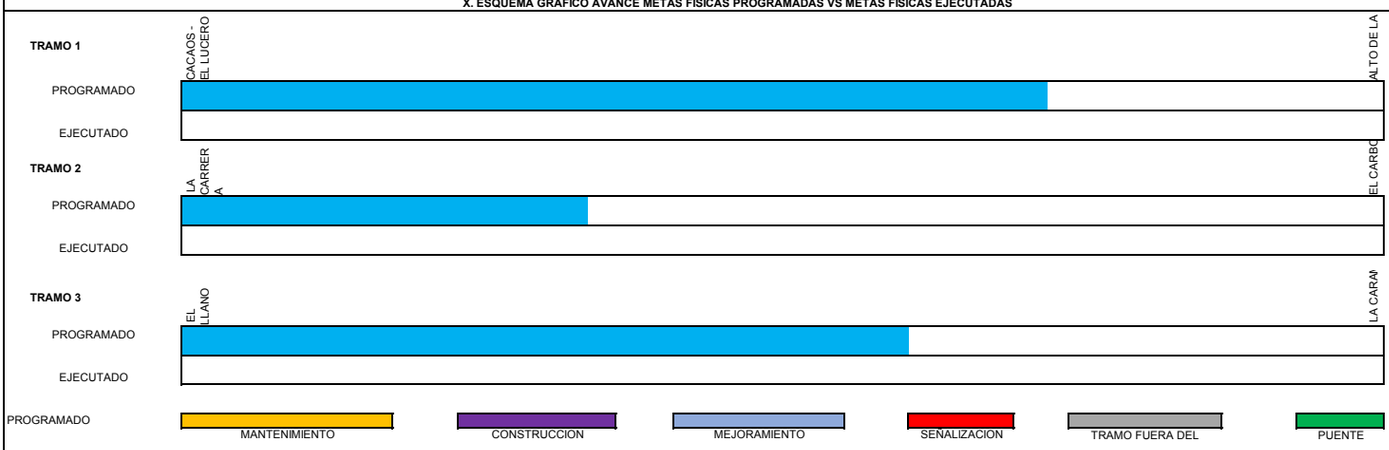

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A | **N/A** | **N/A**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 1/09/2023 al 7/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.316.949.981,64	29,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.148.567.165,96	25,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (168.382.815,68)	-3,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.849.397,06	99,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.334.799.378,70	29,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.166.416.563,02	25,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (168.382.815,68)	-3,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103.497.344,06	2,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.719.556,64	0,59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 62.733.825,00	1,46%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 18,32% | Avance o Atraso Físico % 13,89%
Meta Física Ejecutada % 32,21%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,0%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	663			663	27,6%
					Ejec	771,50			771,5	32,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	20			Prog	4,47			4,47	22,4%
					Ejec	3,00			3,00	15,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRODOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
se realiza mesa de trabajo con la profesional SST, y se recibe el informe mensual SST, correspondiente al mes de agosto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1010-22, OBSERVACIONES PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL) - ABREGO

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividad placa huella corredor 1 Santa Lucia - Canoas, En el tramo del Chorro 2 se realiza actividades de excavacion manual de alcantarilla, figurado de acero figurado, adecuacion del terreno, instalacion y amarre de acero figurado para cunetas, viga riostra y huella, fundida de huella 24 ml, fundida de contra huella central y lateral margen derecho e izquierdo 24 ml, fundida de cuneta 28 ml, fundida de 9 vigas riostras.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista en cuanto a las observaciones que deben ser subsanadas en el documento PAGA Plan Guía a la Adaptación Ambiental), se envía observaciónes al documento mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1010-22.

ACTIVIDADES SOCIALES

e sostiene una (1) mesa de trabajo con la Profesional Social del Consorcio AD VÍAS, con el propósito de saber cómo se están implementando los cinco (5) programas de Gestión Social; así como de las diferentes actividades de información y divulgación que se vienen desarrollando por parte del Contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con actividades en el corredor 1, tramo El Chorro 2 con figurado de acero, excavacion de viga riostra, instalacion de acero y encofrado, fundida de huella, contra huella, viga riostra y cunetas.

Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion Manual de Alcantarilla Tramo Chorro 2



Instalacion de Acero Figurado Tramo Chorro 2



Fundida de Placa Huella Tramo Chorro 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría exige celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 8/09/2023 al 14/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.551.131.559,21	34,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.201.076.986,01	26,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (350.054.573,20)	-7,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.849.397,06	99,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.568.980.956,27	34,91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.218.926.383,07	27,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (350.054.573,20)	-7,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 234.181.577,57	5,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.884.331,49	1,13%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19,67% | Avance o Atraso Físico % 13,09%
Meta Física Ejecutada % 32,76%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,0%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	719	0,06		719	30,0%
					Ejec	811,50			811,5	33,8%
* Construcción Alcantarillas	UND	20			Prog	4,74	0,07		4,81	24,1%
					Ejec	3,00			3,00	15,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRODOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	15	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 35

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

Se recibe y revisa el informe mensual SST. Queda como compromiso la entrega de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité de el 15 de Septiembre de 2023

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividad placa huella corredor 1 Santa Lucia - Canoas, En el tramo del Chorro 2 se realiza actividades de excavacion manual de alcantarilla, figurado de acero figurado, adecuacion del terreno, instalacion y amarre de acero figurado para cunetas, viga riostra y huella, fundida de huella 24 ml, fundida de contra huella central y lateral margen derecho e izquierdo 24 ml, fundida de cuneta 28 ml, fundida de 8 vigas riostras, instalacion y amarre de acero figurado para cunetas, viga riostra y huella de sobreancho, fundida de huella de sobreancho 12 ml, fundida de contra huella lateral margen derecho de sobreancho 12 ml, fundida de cuneta de sobreancho 12 ml, fundida de 4 vigas riostras de sobreancho.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista, en cuanto algunas observaciones que debían ser subsanadas en el documento PAGA
se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental). por parte del contratista con observaciones subsanadas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con actividades en el corredor 1, tramo El Chorro 2 con figurado de acero, excavacion de viga riostra, instalacion de acero y encofrado, fundida de huella, contra huella, viga riostra y cunetas, construccion de alcantarilla.


Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion Manual de Alcantarilla Tramo Chorro 2



Fundida de Placa Huella Tramo Chorro 2



Fundida de SobreAncho Tramo Chorro 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 36 del 15/09/2023 al 21/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.815.263.818,87	40,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.245.448.243,68	27,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (569.815.575,19)	-12,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.849.397,06	99,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.833.113.215,93	40,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.263.297.640,74	28,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (569.815.575,19)	-12,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 264.132.259,66	5,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44.371.257,67	0,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 20,68%
Meta Física Ejecutada % 33,40%
Avance o Atraso Físico % 12,72%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,0%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	751	0,15		751	31,3%
					Ejec	857,50			857,5	35,7%
* Construcción Alcantarillas	UND	20			Prog	5,00	0,16		5,16	25,8%
					Ejec	3,00			3,00	15,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRODOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	15	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 35

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
Se recibe la planilla de seguridad social, correspondiente al mes de agosto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1080-22, SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.
GIC-INVIAS-NTS-1088-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-128-2023 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "DISEÑO HIDRAULICO ALCANTARILLA PR7+410_OBSERVACIONES_15-08-2023" – OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1090-22, APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividad placa huella corredor 1 Santa Lucia - Canoas, En el tramo del Chorro 2 se realiza actividades de excavacion manual de alcantarilla, inserción de tuberia, relleno y compactación, figurado de acero figurado, adecuacion del terreno, instalacion y amarre de acero figurado para cunetas, viga riostra y huella de sobreancho, fundida de huella de sobreancho 29 ml, fundida de contra huella lateral margen derecho de sobreancho 29 ml, fundida de cuneta de sobreancho 29 ml, fundida de 12 vigas riostras de sobreancho.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1090-22 con aprobación de los informes mensuales, se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista en cuento a la normatividad ambiental que debe aplicarse en la formulación del documento PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se continuará con actividades en el corredor 1, tramo El Chorro 2 con figurado de acero, excavacion de viga riostra, instalacion de acero y encofrado, fundida de huella, contra huella, viga riostra y cunetas, fundida de muro de alcantarilla, fundida de caja de alcantarilla, fundida de disipadores.
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno y compactación de Alcantarilla Tramo Chorro 2



Fundida de Placa de Sobre Ancho Tramo Chorro 2



Fundida de Contra Huella de SobreAncho Tramo Chorro 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 37 del 22/09/2023 al 28/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.079.396.078,54	46,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.266.651.637,30	28,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (812.744.441,24)	-18,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.849.397,06	99,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.097.245.475,60	46,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.284.501.034,36	28,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (812.744.441,24)	-18,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 264.132.259,66	5,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.203.393,62	0,47%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 62.733.825,00	1,46%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 21,70% | Avance o Atraso Físico % 12,18%
Meta Física Ejecutada % 33,88%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,0%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	782	0,24		782	32,6%
					Ejec	771,50			771,5	32,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	20			Prog	5,26	0,24		5,50	27,5%
					Ejec	4,00			4,00	20,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRODOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
Se realiza mesa de trabajo con el motivo de informar los criterios a tener en cuenta en la entrega del informe SST.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité de el 29 de Septiembre de 2023

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividad placa huella corredor 1 Santa Lucia - Canoas, En el tramo del Chorro 2 se realiza actividades de excavacion manual de alcantarilla, relleno y compactación, figurado de acero, adecuacion del terreno, instalacion y amarre de acero figurado para caja, muro y disipadores de alcantarilla, fundida de solados para caja, tuberia y disipadores, fundida de caja, muro y disipadores.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se revisa documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista donde se logra subsanar todas las observaciones dadas por la interventoría, por lo tanto se le da aprobación al documento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con actividades en el corredor 1, tramo El Chorro 2 con figurado de acero, excavacion de viga riostra, instalacion de acero y encofrado, fundida de huella, contra huella, viga riostra y cunetas, excavacion manual de alcantarilla, instalacion y amarre de acero figurado para vigas, riostras, cunetas y huellas, instalacion y amarre de acero figurado para caja, muro y disipadores de alcantarilla, fundida de muro de alcantarilla, fundida de caja de alcantarilla, fundida de disipadores.


Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Con inicio a la alcaldía en cuanto a la duración de rendimientos financieros

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de la Caja de la Alcantarilla Tramo Chorro 2



Fundida de Disapadores de la Alcantarilla Tramo Chorro 2



Instalacion y amarre de acero figurado del muro de la Alcantarilla Tramo Chorro 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 27 del 1/09/2023 al 7/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,64
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.203.091.392,64
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	1053 DE 2022
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐

VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 207.286.560,97	9,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 387.192.330,00	17,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 179.905.769,03	8,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,42	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 220.330.941,71	10,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 399.368.182,42	18,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 179.037.240,71	8,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 97.076.766,75	4,41%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 387.192.330,00	17,57%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8,65%
Meta Física Ejecutada %: 1,65%
Avance o Atraso Físico %: 10,31%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	
					Ejec	0,99			0,99	99,2%
* Placa Huellas	ML	1400			Prog	106,57	33,97		140,54	10,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	11			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		1
MOTONIVELADORA		1
VIBROCOMPACTADOR		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL- CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da ARROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
se realiza mesa de trabajo con la profesional SST, y se recibe el informe mensual SST, correspondiente al mes de agosto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité de el 07 de Septiembre de 2023

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-984-22, OBSERVACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADPTACION AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL LA PLAYA
GIC-INVIAS-NTS-1016-22, RESPUESTA A OFICIO 300-0467 CUYO ASUNTO ES "CERTIFICACIÓN - PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022" - CONCPETO APROBATORIO.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza activida en el corredor 2 de Clavellinos tramo 2 en instalacion de segunda capa de sub base y compactacion de la misma, en los tramos de Esperancita y Clavellinos 2 se continuo con la compactacion y toma de densidades en esta corredor. En el corredor 1 se realizaron actividades de compactacion en los difrentes tramos San Pedro,Llano grande tramo 1, Llano grande tramo 2. se realiza acopio de material y figurado de acero en el corredor 2 Clavellinos tramo 1 y 2.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista en cuanto a las observaciones que deben ser subsanadas en el documento PAGA Plan Guía a la Adaptación Ambiental), se envía observaciónes al documento mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-984-22.


ACTIVIDADES SOCIALES

LA Interventoría lleva a cabo una (1) mesa de trabajo de manera conjunta con la Profesional Social y Directora de Obra, con el objetivo de dar a conocer los diferentes documentos de preconstrucción faltantes; así mismo, se les informa que se aprobó con observaciones el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) presentado, indicándoles el ítem que deben de subsanar; por último, el Contratista envía las Actas de Vecindad del corredor número dos (2).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la actividad de compactacion en el corredor 1 tramo San Pedro. Figurado de acero en el corredor 2 de Clavellinos tramo 1 y 2.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

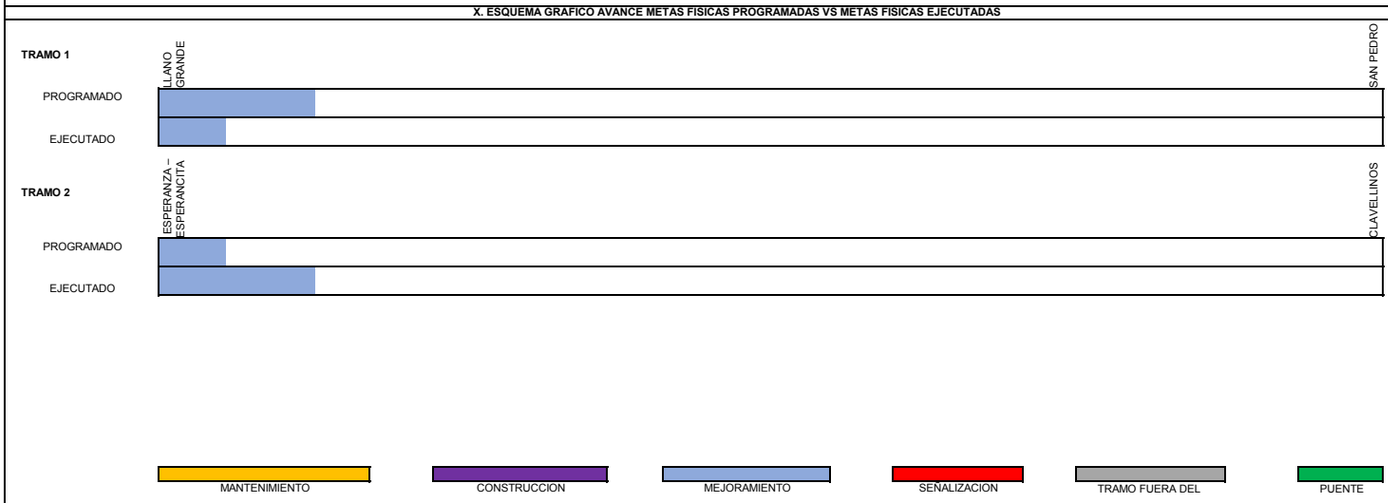

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 2 Clavellinos tramo 1 Compactacion



Corredor 2 Esperancita Compactacion



Corredor 1 Llano Grande Tramo 2 Compactacion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de lla interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023, de acuerdo a dicha prorroga se ajusta la programacion de obra presentada por el contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 8/09/2023 al 14/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,64
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.203.091.392,64
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	1053 DE 2022
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐

VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 347.106.676,96	15,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 138.191.804,00	6,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (208.914.872,96)	-9,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,42	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 220.330.941,71	10,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 150.367.656,42	6,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (69.963.285,29)	-3,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 140.011.451,68	6,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 138.191.804,00	6,27%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,42%
Meta Física Ejecutada % 1,65%
Avance o Atraso Físico % 8,07%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	
					Ejec	0,99			0,99	99,2%
* Placa Huellas	ML	1400			Prog	156,87	77,61		234,48	16,7%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	11			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		1
MOTONIVELADORA		1
VIBROCOMPACTADOR		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL- CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da ARROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
se recibe y revisa el informe mensual SST. Queda como compromiso la entrega de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
La Interventoría remite aprobacion de la Programacion y flujo de caja correspondiente a la Prorroga No.1 por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1055-22 del 14 de Septiembre de 2023


ACTIVIDADES TECNICAS
Se realiza activida en alcantarillas del corredor 2 Clavellinos tramo 1 y 2 en figurado de acero, excavacion, fundida de solados e instalacion de tuberia de 36" y relleno para la estructura, excavacion y fundida de solado de la caja y descole.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista, en cuanto algunas observaciones que deben ser subsanadas en el documento PAGA.
La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con observaciones subsanadas por el profesional ambiental del contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara activida en alcantarillas del corredor 2 Clavellinos tramo 1 y 2 en instalacion de acero de refuerzo de la caja,descole y aletas, encofrado y fundida.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

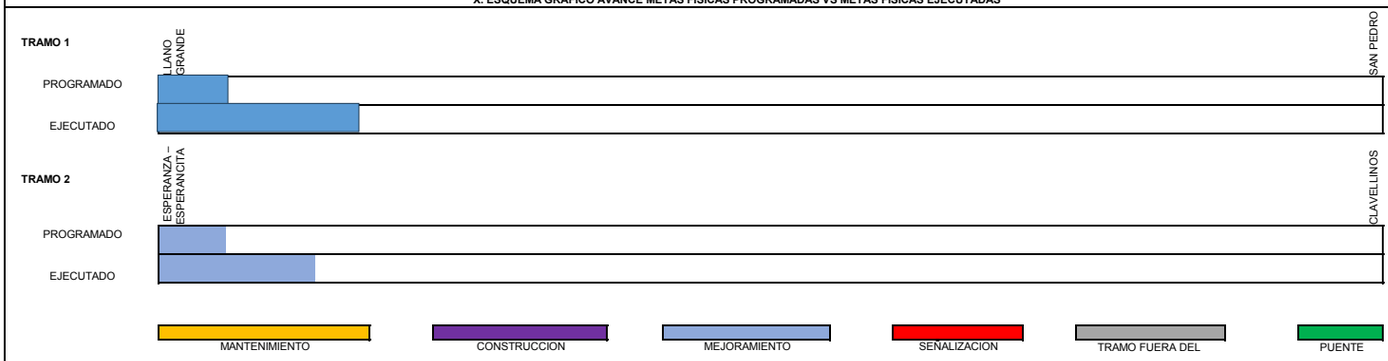

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 2 Clavellinos tramo 1 Conformacion ancho de via



Corredor 2 Clavellinos tramo2 excavacion de alcantarilla



Corredor 2 Clavellinos tramo2 instalacion de acero de caja

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 15/09/2023 al 21/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%		
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,64
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.203.091.392,64
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 563.997.583,58	25,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 541.692.597,20	24,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.304.986,38)	-1,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,42	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 563.997.583,58	25,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 553.868.449,62	25,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.129.133,96)	-0,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 217.082.242,31	9,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.304.443,20	0,74%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4,46% | Avance o Atraso Físico % 10,52%
Meta Física Ejecutada % 14,99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	
					Ejec	0,99			0,99	99,2%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	179,40	124,50		303,90	25,9%
					Ejec					
* Alcantarillas	UND	5			Prog	0,7	0,46		1,18	23,5%
					Ejec		2,0		2,00	40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		1
MOTONIVELADORA		1
VIBROCOMPACTADOR		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL- CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da ARROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se recibe la planilla de seguridad social, correspondiente al mes de agosto, se emite oficio de contestación por temas de documentación de proveedores de materiales.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité de el 22 de Septiembre de 2023

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1081-22, SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza activida en alcantarillas del corredor 2 Clavellinos tramo 1 y 2 en excavacion para la instalacion de tuberia de 36", fundida de solado de tuberia, instalacion de tuberia, atraque y relleno de la misma, exacavacion de caja de alcantarilla, figurado e instalacion de acero, encofrado y fundida de la misma, exavacion de escole, fundida de solado, figurado e instalacion, encofrado y fundida para las aletas y cabezal, excavacion de viga riostra e instalacion de acero en viga, huella y cunetas en clavellinos tramo2.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se recibe en borrador documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), para su respectiva revisión, se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista en cuento a la normatividad ambiental que debe aplicarse en la formulación del documento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara activida en el corredor 2 Clavellinos tramo 1 y 2 en excavacion e instalacion de acero viga riostra, instalacion de acero para huella y cunetas, encofredo y fundida de las mismas.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

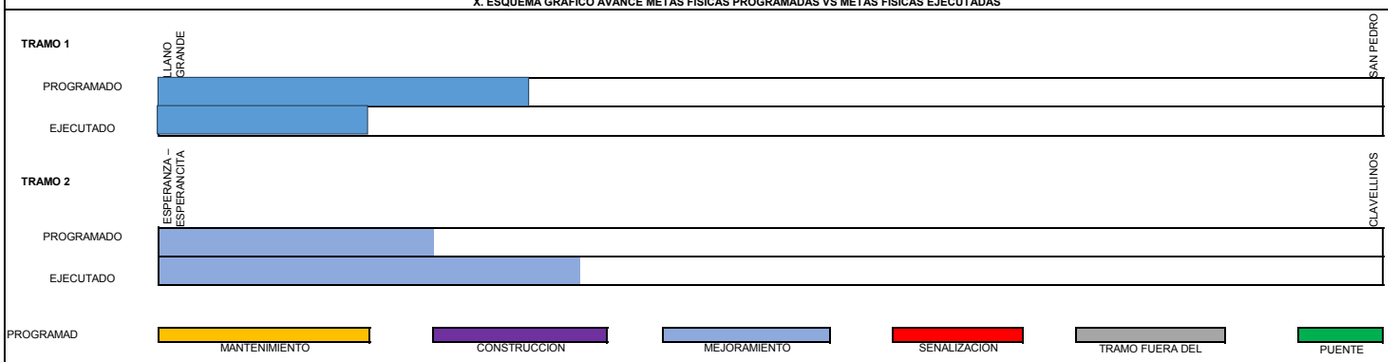

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 2 Clavellinos tramo 2 encofredo de caja de alcantarilla



Corredor 2 Clavellinos tramo2 fundida de caja de alcantarilla



Corredor 2 Clavellinos tramo2 excavacion de viga riostra

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 22/09/2023 al 28/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,64
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.203.091.392,64
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	1053 DE 2022
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐

VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,64			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 734.631.904,56	33,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 597.719.978,60	27,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (136.911.925,96)	-6,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,42	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 734.631.904,56	33,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 609.895.831,02	27,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (124.736.073,54)	-5,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 170.825.656,66	7,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56.027.381,40	2,54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,21% | Avance o Atraso Físico % 4,19%
Meta Física Ejecutada % 16,40%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	
					Ejec	0,99			0,99	99,2%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	211,80	178,49		390,29	33,2%
					Ejec		50		50,00	4,3%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	1,0	0,97		1,97	39,4%
					Ejec		2,0		2,00	40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL- CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da ARROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realiza mesa de trabajo con el motivo de informar los criterios a tener en cuenta en la entrega del informe SST.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza activida de instalación de acero y vigas riostras en el tramo 2 de Clavellino, instalación de formaletas para los cajones de la piera pegada de la Placa huella y se organiza el material como arena y triturado, vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas y vigas en el tramo 2 de Clavellinos, Corredor 2. Se realiza el campamento y se recibe el material en el Tramo 1 de Clavellinos.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se recibe informes mensuales mediante oficio No OFC-CLP-GIC- 067-2023, correspondientes a los meses mayo, junio y julio para su respectiva revisión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara activida en el corredor 2 Clavellinos tramo 1 y 2 en excavacion e instalacion de acero viga riostra, instalacion de acero para huella y cunetas, encofrado y fundida de las mismas.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

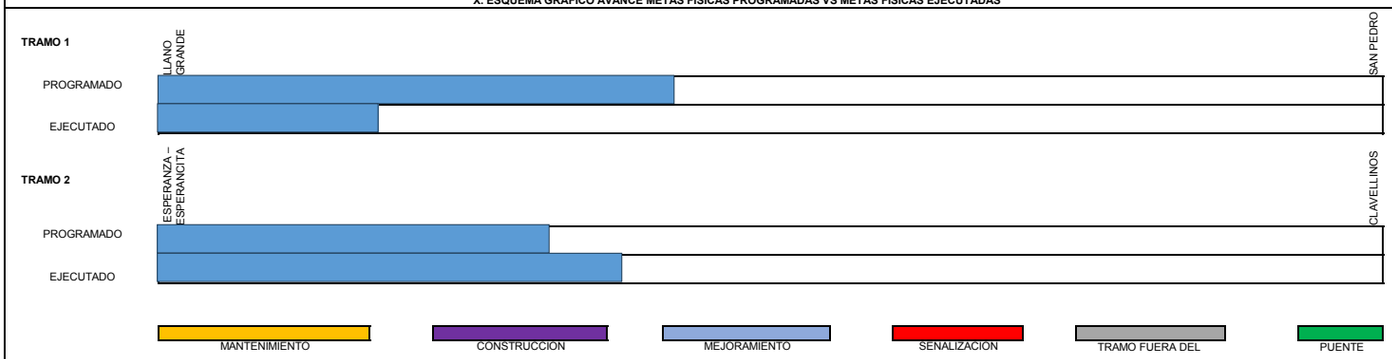

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 2 Clavellinos tramo 2 Fundida de huella



Corredor 2 Clavellinos tramo2 Instalacion de acero



Corredor 2 Clavellinos tramo2 Fundida de huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 21 del 1/09/2023 al 7/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13 – OCTUBRE - 2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 998.715.283,85	58,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 173.052.998,00	10,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (825.662.285,85)	-48,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 23.270.532,48	96,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 998.715.283,85	58,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 196.323.530,48	11,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (802.391.753,37)	-47,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.606.389,88	7,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-Mayo-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 48,48% | Avance o Atraso Físico %: -44,7%
Meta Física Ejecutada %: 3,78%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,96			0,96	96,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	865,73			865,73	40,5%
					Ejec	140			140	6,5%
* Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	14,00			14,00	100,0%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se enviaron los siguientes oficios que se relacionan a continuacion:

GIC-INVIAS-NTS-986-22: OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA EN LA EJECUCION DE OBRA.

GIC-INVIAS-NTS-996-22: SOLICITUD INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES; CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

GIC-INVIAS-NTS-1013-23: RESPUESTA A SU OFICIO PHS2022-028-2022 DE FECHA 8-AGOSTO-2023.

ACTIVIDADES TECNICAS:

se reporta un avance general de 140 metros de Placa Huella

ACTIVIDADES SOCIALES

Se lleva a cabo una (1) mesa de trabajo con la Profesional Social de la Unión Temporal Colombia, Yury Peña, a quien se le informa de la no implementación de los programas o proyectos de Gestión Social descritos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); se le indica a la profesional que se deben de ejecutar estos programas dentro del periodo de duración del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se envía oficio No GIC- INVIAS- NTS- 986- 22, observaciones componente ambiental en la implementación del PAGA en la ejecución de obra. Y La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por la profesional ambiental del contratista.


COMPONENTE SST

se realiza verificación de cumplimiento del componente SST
Se realiza hallazgos, falta de señalización y no se encuentran en obra elementos para atención de emergencia.
Se realiza en campo acta con fechas de cumplimiento para la subsanación de los hallazgos.
Se recibe el informe mensual de SST.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de huellas concreto de 3000 psi



Fundida de huellas concreto de 3000 psi



EXCAVACION PARA ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte la interventoria,exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado,
Exigirle al contratista la subsanacion de las observaciones realizadas por esta interventoria, para poder realizar la revision lo mas pronto posible y dar concepto aprobatorio, para que asi puedan dar inicio con las actividades fisicas del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 22 del 8/09/2023 al 14/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13 – OCTUBRE - 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.121.321.673,73	65,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 229.396.528,00	13,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (891.925.145,73)	-52,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 23.270.532,48	96,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.121.321.673,73	65,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252.667.060,48	14,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (868.654.613,25)	-50,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.606.389,88	7,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56.343.530,00	3,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-Mayo-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 56,20% | Avance o Atraso Físico %: -52,3%
Meta Física Ejecutada %: 3,94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,96			0,96	96,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1361,28			1361,28	63,6%
					Ejec	150			150	7,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	14,00			14,00	100,0%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	19	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se enviaron los siguientes oficios que se relacionan a continuacion:

GIC-INVIAS-NTS-1059-22: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022

GIC-INVIAS-NTS-1042-22: APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES

GIC-INVIAS-NTS-1066-22: ATRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

GIC-INVIAS-NTS-1036-22: SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS (PROGRAMAS) SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se terminaron los 150 ml de paño completo de la vereda bataga tramo 4b

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se revisa informes mensuales enviados por la profesional ambiental del contratista, próximamente se estará enviando oficio con los aprobados y con algunas observaciones encontradas. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).


COMPONENTE SST

Se recibe y revisa el informe mensual SST. Queda como compromiso la entrega de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de huellas en curva y acopio de piedras para concreto clase G, centro



Placa Huella fundida paño completo.



Marcacion dilataciones losa de transicion.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado,
Exigirle al contratista la subsanacion de las observaciones realizadas por esta interventoria, para poder realizar la revision lo mas pronto posible y dar concepto aprobatorio, para que asi puedan dar inicio con las actividades fisicas del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 23 del 15/09/2023 al 21/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13 – OCTUBRE - 2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.243.928.063,61	73,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 238.193.628,00	13,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.005.734.435,61)	-59,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 23.270.532,48	96,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.243.928.063,61	73,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 261.464.160,48	15,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (982.463.903,13)	-57,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.606.389,88	7,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.797.100,00	0,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-Mayo-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 58,78% | Avance o Atraso Físico %: -52,6%
Meta Física Ejecutada %: 6,18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,96			0,96	96,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1526,46			1526,46	71,3%
					Ejec	294			294	13,7%
* Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	14,00			14,00	100,0%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	19	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se enviaron los siguientes oficios que se relacionan a continuacion:

GIC-INVIAS-NTS-1066-22: ATRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

GIC-INVIAS-NTS-1078-22: SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.

GIC-INVIAS-NTS-1089-22: RESPUESTA A SU COMUNICADO PHS2022 – 033 – 2022 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES “ENTREGA PLAN SST”

ACTIVIDADES TECNICAS:

Del tramo 5; Terminada la placa huella completa los 68 metros.

Del tramo 4b, Se termino en su totalidad los 150 metros, del tramo 4a se lleva un aproximado de 50 mts de placa huella, una sola alcantarilla instalados 6 tubos de 24"

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N°PHS2022-080-2022. Por otra parte, la interventoría envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1040-22 con observaciones a los informes mensuales que deben ser subsanadas.


COMPONENTE SST

Se realiza mesa de trabajo, para coordinar temas de informe. Se solicita planilla de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 5, Instalacion de acero longitudinal y transversal para luego posterior vaciado de concreto



Tramo 5, Instalacion de acero longitudinal y transversal para luego posterior vaciado de concreto



Instalacion de Formaleta para luego la instalacion del acero longitudinal y transversal.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado,
Exigirle al contratista la subsanacion de las observaciones realizadas por esta interventoria, para poder realizar la revision lo mas pronto posible y dar concepto aprobatorio, para que asi puedan dar inicio con las actividades fisicas del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 24 del 22/09/2023 al 28/09/2023 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13 – OCTUBRE - 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.366.534.453,48	80,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 238.193.628,00	13,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.128.340.825,48)	-66,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 23.270.532,48	96,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.366.534.453,48	80,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 261.464.160,48	15,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.105.070.293,00)	-64,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.606.389,88	7,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-Mayo-23

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 58,78% | Avance o Atraso Físico %: -50,2%
Meta Física Ejecutada %: 8,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,96			0,96	96,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1526,46			1526,46	71,3%
					Ejec	294			294	13,7%
* Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	14,00			14,00	100,0%
					Ejec	1			1	7,1%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana se realizó visita a obra donde se logro evidenciar que el contratista no está cumpliendo con los proyectos que contempla cada uno de los programas del documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), en la ejecución de obra se pudo observar que cuentan con punto ecológico pero este no cuenta con la normatividad ambiental vigente.


COMPONENTE SST

se realiza visita de obra, se verifica el cumplimiento de ejecución del SG-SST

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE PLACA HUELLA CENTRO



TOMA DE DENSIDADES SUBBASE GRANULAR



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA Y BORDILLO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado,
Exigirle al contratista la subsanacion de las observaciones realizadas por esta interventoria, para poder realizar la revision lo mas pronto posible y dar concepto aprobatorio, para que asi puedan dar inicio con las actividades fisicas del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 22 del 1/09/2023 al 7/09/2023 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.296.434.542,90	19,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.168.028,16	1,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.098.266.514,74)	-18,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.310.775,06	29,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.296.434.542,90	19,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 257.478.803,22	1,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.038.955.739,68)	-17,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 650.830.098,17	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44.555.228,68	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 19,51% | Avance o Atraso Físico %: -17,98%
Meta Física Ejecutada %: 1,52%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,54532					54,53%
					Ejec	0,29					29,0%
* Construcción De Placa Huella	ML				Prog						
					Ejec						
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog						
					Ejec						
					Prog						
*					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago TRITURADORA LA AMARILLA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-866-22, Fecha: 04-Agosto-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	32	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 47

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En el periodo se continúan actividades de revisión de los diferentes documentos de estudios y diseños radicados por parte del contratista de obra a la interventoría con el fin de emitir los diferentes conceptos técnicos por parte de los especialistas en cuanto a la revisión de cada uno de estos.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) en el Municipio de Gramalote, Corredor vial Vereda Boyacá Pr6+400 hasta Pr4+985.
Se realizan actividades de compactacion una vez se ejecuta el mejoramiento en toda la seccion vial del corredor Vereda Boyaca, municipio de arboledas.
Se continúan hsata terminar actividades de mantenimiento periódico (Conformación de la calzada existente) en el Corredor vial Vereda Corozal - California, del Municipio de los patios.
Se realiza limpieza de alcantarillas existentes colmatadas a lo largo del corredor vial Vereda Corozal - California para mejorar su funcionalidad.
El contratista se encuentra realizando acopio de matriales petreos como, subbase, arena y triturado en el lugar destinado de almacenamiento.

ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría recibe mediante oficio enviado por el Contratista con radicado UTET-02590-111, la respectiva relación de mano de obra contratada durante el mes de agosto de 2023; igualmente, en comunicación remitida por la Unión Temporal Edivial-Troja con radicado UTET-02590-108, es enviado el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), para que sea revisado por la Interventoría.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por el contratista mediante oficio No UTET-02590-108.

ACTIVIDADES SST

Se realiza verificación de la implementación del SG-SST en el municipio de Gramalote y se evidencia la entrega y el uso de los elementos de protección personal.
Se realiza mesa de trabajo con la profesional SST, para dar recomendaciones y recordar él envió del informe SST de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene proyectado actividades de (Mantenimiento periódico) mejoramiento de la subrasante Vereda Rinconada, Municipio de Arboledas y continuar en la Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general mejoramiento de la subrasante Vereda Boyaca, Municipio de Arboleda.



Compactacion de subrasante Mejorada Vereda Boyaca.



Vista General a lo largo del corredor vial Pr6 + 400



Conformacion de la calzada existente Vereda Corozal - California.



Limpieza de alcantarilla existente colmatadas, Corozal - California.



Acopio de materiales.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-982-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-088 del 24 de agosto de 2023, donde se realizan Aprobacion con observaciones al documento de preconstruccion instalaciones provisionales.
2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1003-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-077 del 21 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Chicagua Bajo del Municipio de Arboledas.
3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1005-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-082 del 22 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Potreros del Municipio de Arboledas.
4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1006-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-079 del 21 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Helechar del Municipio de Arboledas.
5. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1007-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-078 del 21 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Volcan del Municipio de Arboledas.
6. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1008-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-096 del 28 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Corozal - California del Municipio de Los Patios.
7. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1009-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-097 del 30 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Boyaca del Municipio de Gramalote.
8. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1019-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-049 del 02 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Chicagua Alto y Bajo del Municipio de Arboledas.
9. Mediante Comunicado GIC-INVIAS-NTS-1027-22, La interventoría remite oficio del estado actual del componente revision y/o complementacion estudios y diseños y se hace la solictud de entrega de plan de contigencia

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 23 del 8/09/2023 al 14/09/2023 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.959.680.648,05	23,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 206.796.768,16	1,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.752.883.879,89)	-22,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 67.491.571,62	33,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.959.680.648,05	23,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 274.288.339,78	1,62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.685.392.308,27)	-21,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 663.246.105,15	3,92%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.809.536,56	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 23,43% | Avance o Atraso Físico %: -21,81%
Meta Física Ejecutada %: 1,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,57839					57,84%
					Ejec	0,33					33,0%
* Construcción De Placa Huella	ML				Prog						
					Ejec						
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog						
					Ejec						
					Prog						
*					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago TRITURADORA LA AMARILLA	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-866-22, Fecha: 04-Agosto-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	32	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 47

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se continúan actividades de revisión de los diferentes documentos de estudios y diseños radicados por parte del contratista de obra a la interventoría con el fin de emitir los diferentes conceptos técnicos por parte de los especialistas en cuanto a la revisión de cada uno de estos.

ACTIVIDADES TECNICAS
Se continuan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) en el Municipio de Gramalote, Corredor vial Vereda Boyacá Pr4+985 hasta Pr4+870 y de igual manera se ejecuta la compactacion de la misma.
Se finalizan actividades de mantenimiento periódico (Conformación de la calzada existente) en el Corredor vial Vereda Corozal - California, del Municipio de los patios.
Se continuan actividades de limpieza de alcantarillas existentes colmatadas a lo largo del corredor vial Vereda Corozal - California para mejorar su funcionalidad.
Se continuan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) en el Municipio de Arboledas, Corredor vial Vereda Rinconada a lo largo del corredor vial.
Se realizan actividades de topografias por parte de la interventoria en los diferentes corredores viales Municipio de Arboledas, Gramalote, Los Patios, donde se realizan diferentes chequeos para verificar el cumplimiento de topografias y diseños geometricos.

ACTIVIDADES SOCIALES


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se revisa por parte de la interventoria el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se realiza mesa de trabajo con el fin de subsanar algunas de las observaciones encontradas, se recibe oficio UTET-02590-114, solicitando los lineamientos lugar disposición final de los escombros.

ACTIVIDADES SST
Se recibe y revisa el informe mensual SST. Queda como compromiso la entrega de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene proyectado continuar actividades de mantenimiento periodico - Mejoramiento de la Subrasante Vereda Rinconada y Vereda Boyaca.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Vista general corredor vial Vereda Corozal - California


Verificacion de actividades Vereda Corozal - California, Los Patios.


Verificacion topografica Corozal - California, Municipio de Los Patios.


Verificacion topografica interventoria Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.


Actividades de Mejoramiento de la Subrasante, Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.


Vista general Chequeos topograficos, Vereda Boyaca.


Verificaciones topograficas Vereda Potreros, Municipio de Arboledas.


Verificaciones topograficas Vereda Potreros, Municipio de Arboledas.


Verificaciones topograficas Interventoria Vereda Santo Domingo, Municipio de Arboledas.


Topografia para revision de Curva Vereda Santo Domingo, Municipio de Arboledas.


Verificacion de anchos a lo largo del corredor vial, Santo Domingo, Municipio de Arboledas.


Verificacion de anchos, Vereda la Rinconada, Municipio de Arboledas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1037-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-087 del 24 de agosto de 2023, donde se realiza aprobacion con observaciones del tramo 1 al 12 y observaciones al tramo 6, Diseño geometrico via Vereda Corozal - California.
2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1051-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-112 del 11 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda San Isidro del Municipio de Gramalote.
3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1052-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-113 del 11 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Santa Anita del Municipio de Gramalote.
4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1047-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-109 del 08 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones al estudio geotécnico y estructura de pavimento de la Vereda Corozal - California del Municipio de Los Patios.
5. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1044-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-081 del 22 de agosto de 2023, donde se realizan observaciones al informe y diseño hidraulico de la Vereda Chicagua bajo del Municipio de Arboledas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 24 del 15/09/2023 al 21/09/2023 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.693.977.144,19	27,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 250.365.841,83	1,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.443.611.302,36)	-26,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 77.581.969,90	37,93%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.693.977.144,19	27,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 327.947.811,73	1,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.366.029.332,46)	-25,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 734.296.496,14	4,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53.659.471,95	0,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15,12% | Avance o Atraso Físico %: -14,89%
Meta Física Ejecutada %: 0,23%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,61145967					61,15%
					Ejec	0,35					35,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	3785			Prog	450,00	848,97	137,1467	386,0	1822,08	48,1%
					Ejec	38,55				38,55	1,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	3,00	4,43	0,99	2,34	10,76	43,0%
					Ejec						
* Mejoramiento					Prog						
					Ejec						
* **Descripción de la Meta Física Contractual**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	3185			Prog		122,15	172,70	149,1847	444,03	13,9%
					Ejec						
Construcción De Alcantarillas	UND	26			Prog			0,83	0,99	1,82	7,0%
					Ejec						
Mejoramiento					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	2
Motoniveladora	1	2
Compactador min 7 Ton	1	2
Volquetas	2	2
Buldozer		2
Bobcat (Minicargador)		2
Dumper		2
Total	5	14

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog						
					Ejec						
* Construcción De Placa Huella	ML	4543			Prog	942,61	400,01	70,2		1412,80	31,1%
					Ejec						
* Construcción De Alcantarillas	UND	18			Prog	2,75	0,98			3,72	20,7%
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	2
Motoniveladora	1	2
Compactador min 7 Ton	1	2
Volquetas	2	2
Buldozer		2
Bobcat (Minicargador)		2
Dumper		2
Total	5	14

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog						
					Ejec						
* Construcción De Placa Huella	ML	4500			Prog	654,29				654,29	14,5%
					Ejec						
* Construcción De Alcantarillas	UND	15			Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	2
Motoniveladora	1	2
Compactador min 7 Ton	1	2
Volquetas	2	2
Buldozer		2
Bobcat (Minicargador)		2
Dumper		2
Total	5	14

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-866-22, Fecha: 04-Agosto-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	22	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se continúan actividades de revisión de los diferentes documentos de estudios y diseños radicados por parte del contratista de obra a la interventoría con el fin de emitir los diferentes conceptos técnicos por parte de los especialistas en cuanto a la revisión de cada uno de estos.

ACTIVIDADES TECNICAS
Se continuan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) y compactacion de la misma en el Corredor vial Vereda Boyacá Pr4+870 hasta Pr4+644 Municipio de Gramalote.
Se realizan actividades de adecuacion a lo largo del corredor vial con el fin de dar cumplimiento de anchos de diseño de placa huellas a ejecutar Vereda Corozal - California, Municipio de Los Patios.
Se continuan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) en el Municipio de Arboledas, Corredor vial Vereda Rinconada a lo largo del corredor vial.
Se realiza corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal para viga riostra, huellas, cuneta y bordillo para placa huella tramo 2-2 vereda la rinconada
Se realiza instalacion de cajones y formaleta en maderas en general en todo el tramo de placa huella longitud de 38,55 tramo 2-2 Vereda la Rinconada, Municipio de Arboledas.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa (D) para vigas riostra, huellas, cuneta y bordillo placa huella tramo 2-2 Vereda la rinconada, Municipio de Arboledas elaborado en obra de acuerdo a especificaciones tecnicas.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa (G) ciclopeo para franja central y sobre anchos placa huella tramo 2-2 Vereda la rinconada, Municipio de Arboledas elaborado en obra de acuerdo a especificaciones tecnicas.
Se realizan toma de muestras de concreto para ensayo de resistencias concretos elaborados en obra.

ACTIVIDADES SOCIALES

ACTIVIDADES AMBIENTALES
La interventoría se encuentra a la espera de recibir informes mensuales, formatos trimestrales, y documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental.

ACTIVIDADES SST
Se realiza visita de obra, para verificación del cumplimiento SST.
Se recibe planilla de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene proyectado continuar actividades de mantenimiento periodico - Mejoramiento de la Subrasante Vereda Rinconada y Vereda Boyaca.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Dosificacion de la mezcla concreto de 14 Mpa


Vista general huella y acero de refuerzo


Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra


Toma de muestras concreto de 21 Mpa para ensayo de resistencia


Vista general tramo 2-2 Corredor vial la Rinconada, Municipio de Arboledas.


Verificacion Ancho de placa huella y elementos en concreto.


Verificacion de anchos bordillo, placa huella 2-2 Vereda la Rinconada.


Adecuacion de ancho Corozal - California, Municipio de los Patios


Adecuacion de ancho Corozal - California, Municipio de los Patios



Adecuacion de ancho Corozal - California, Municipio de los Patios



Mejoramiento de la subrasante, Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.



Vista general terminado mejoramiento, Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna: 1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1063-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-114, donde se Informa al contratista de obra los lineamientos para el lugar de disposicion de material. 2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1069-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-120 del 13 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones al plan de manejo de transito del Municipio de Los Patios. 3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1070-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-122 del 14 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones al plan de manejo de transito del Municipio de Los Patios. 4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1067-22 se envian observaciones al contratista de obra del documento PAGA (Plan Guia a la Adaptacion Ambiental, Componente Ambiental y Social). 5. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1064-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-117, donde se realizan observaciones generales de coumentacion a entregar por parte del contratista al inicio y durante la ejecucion del proyecto. 6. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1084-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-106, donde se realizan observacionesal estudio de geotecnia y estructura de pavimento, Vereda Santo Domingo y Rinconada del Municipio de Arboledas. 7. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1087-22 se le solicita al contratista de obra la localizacion de puntos de referencia en tramos a intervenir Municipio de Arboledas, Gramalote y Los Patios, igualmente verificar en campo los diseños. 8. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1087-22 se le solicita al contratista de obra la localizacion de puntos de referencia en tramos a intervenir Municipio de Arboledas, Gramalote y Los Patios, igualmente verificar en campo los diseños.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 25 del 22/09/2023 al 28/09/2023 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.439.153.389,24	32,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 282.294.106,32	1,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.156.859.282,92)	-30,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 84.672.368,18	41,40%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.439.153.389,24	32,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 366.966.474,50	2,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.072.186.914,74)	-30,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 745.176.245,05	4,41%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.018.662,77	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30,47%
Meta Física Ejecutada %: 8,85%
Avance o Atraso Físico %: -21,61%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	64,45%					64,45%
						Ejec	37,00%					37,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	3785			Prog	450,00	917,92	168,51	432,8	1969,19	52,0%
						Ejec	65,75				65,75	1,7%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	3,00	4,85	1,45	2,76	12,05	48,2%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico	M2	55908,60			Prog	10924,05	7513,36	5754,41	4347,10	28538,91	51,0%
*	(Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec	3128,09	10141,01	6847,96	4252,05	24369,11	43,6%
*	**Descripción de la Meta Física Contractual**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
	Estudios y diseños	UND	1			Prog						
						Ejec						
	Construcción De Placa Huella	ML	3185			Prog		216,23	212,72	183,52	612,47	19,2%
						Ejec						
	Construcción De Alcantarillas	UND	26			Prog			1,21	1,45	2,65	10,2%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico	M2	62779,78			Prog		5139,85	5530	5754,41	16424,26	26,2%
	(Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec		5690,72	6847,96	5098,40	17637,08	28,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog						
						Ejec						
*	Construcción De Placa Huella	ML	4543			Prog	1036,79	493,18	123,6		1653,53	36,4%
						Ejec						
*	Construcción De Alcantarillas	UND	18			Prog	3,04	1,43			4,48	24,9%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico	M2	82517,04			Prog	20693,9618	9514,69	4954,85		35163,50	42,6%
*	(Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec	9890,00				9890,00	12,0%
*						Prog						
						Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog						
						Ejec						
*	Construcción De Placa Huella	ML	4500			Prog	822,50				822,50	18,3%
						Ejec						
*	Construcción De Alcantarillas	UND	15			Prog						
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico	M2	80320,27			Prog	26773,4233				26773,42	33,3%
*	(Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec	15236,68				15236,68	19,0%
*						Prog						
						Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-866-22, Fecha: 04-Agosto-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	22	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durante la semana la interventoria continua en revision de observaciones de componentes de estudios y diseños presentados por parte del contratista de los diferentes corredores viales a intervenir.

ACTIVIDADES TECNICAS
Se continuan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) y compactacion de la misma en el Corredor vial Vereda Boyacá Pr4+644 hasta Pr4+566 Municipio de Gramalote.
Se realizan actividades de adecuacion a lo largo del corredor vial con el fin de dar cumplimiento de anchos de diseño de placa huellas a ejecutar Vereda Corozal - California, Municipio de Los Patios.
Se continua con corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal para viga riostra, huellas, cuneta y bordillo para placa huella tramo 2-1 vereda la rinconada, Municipio de Arboledas.
Se continua con instalacion de cajones y formaleta en maderas en general a lo largo del tramo en ejecucion tramo 2-1 Vereda la Rinconada, Municipio de Arboledas.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa (D) para vigas riostra, huellas, cuneta y bordillo placa huella tramo 2-1 longitud de 45 m, Vereda la rinconada, Municipio de Arboledas elaborado en obra de acuerdo a especificaciones tecnicas.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa (G) ciclopeo para franja central y sobre anchos placa huella tramo 2-1 Vereda la rinconada, Municipio de Arboledas elaborado en obra de acuerdo a especificaciones tecnicas.
Se realiza riego de material antisol para curado de concreto de la estructura de placa huella Tramo 2-1.

ACTIVIDADES SOCIALES


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.
la interventoría se encuentra a la espera de recibir informes mensuales, formatos trimestrales, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no los ha presentado.

ACTIVIDADES SST
Se realiza visita de obra, para verificación del cumplimiento SST.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene proyectado continuar actividades en placa huella Tramo 2-1 municipio de Arboledas, Vereda Rinconada y dar inicio de actividades en la Vereda Santo Domingo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de densidades puntos a intervenir Vereda Rinconada



Vista general acero de refuerzo 3/8´ longitudinal y transversal placa huella



Vista general acero de huella Placa huella Tramo 2-1.



Verificacion de cantidades de placa huella Vereda Rinconada, Municipio de Arboledas.



verificacion de separacion de acero de refuerzo, Bordillos.



Verificacion aceros de refuerzo placa huellas Tramo 2-1 Rinconada.



Diligenciamiento acta de reunion en campo, para seguimiento y control de actividades.



Actividades de mejoramiento de la subrasante Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.



Adecuacion de anchos, vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.



Adecuacion de anchos de via, Vereda Corozal - California, Municipio de los Patios.



Vista general de actividades, Vereda Corozal - California, Municipio de los Patios.



Visita de campo por parte del Director de Obra e Inteventoria para seguimiento y control de actividades.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna: 1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1091-22 del 19 de septiembre de 2023, se le solicita al contratista de obra la ubicación de obras de drenaje tipo alcantarillas a lo largo de los corredores viales a intervenir. 2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1106-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-118 del 13 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones a la entrega del informe estructural para el proyecto de referencia. 3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1104-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-123 del 18 de septiembre de 2023, donde se da aprobacion con observaciones a los tramos 1,2,y 3 y se observa el tramo 4 de los diseños geometricos de la vereda Boyaca, Municipio de Gramalote. 4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1100-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-116 del 25 de septiembre de 2023, donde se da aprobacion con observaciones de la topografia de la vereda Juan Bueno del Municipio de Arboledas. 5. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1110-22 del 25 de septiembre de 2023 se le solicita a la entidad contratante Gobernacion Norte de Santander, la entrega de memorias tecnicas iniciales y puntos de intervencion para los item de comformacion de la calzada y mejoramiento de la subrasante. 6. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1101-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-115 del 12 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones aldiseño geometrico de la via vereda Santo Domingo, Municipio de Arboledas. 7. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26 de septiembre de 2023, se realizan observaciones al coredore vial vereda Corozal - California, Municipio de los patios, teniendo en cuenta que se vienen ejecutando actividades por parte del contratista de obra sin estar aprobado los estudios y diseños por parte de la Interventoria. 8. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1119-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-126 del 29 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones de la topografia de la vereda helechar del Municipio de Arboledas. 9. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1121-22 se da respuesta a oficio UTET-02590-124 del 29 de septiembre de 2023, donde se realizan observaciones al diseño geometrico de la via Vereda Rinconada, Municipio de Arboledas. 10.Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1123-22 se realizan observaciones al diseño geometrico Vereda Helechar Municipio de Arboledas.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 1/09/2023 al 7/09/2023 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 – NOVIEMBRE - 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.782.245.201,73	34,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.782.245.201,73)	-34,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 34.542.843,50	55,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.782.245.201,73	34,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34.542.843,50	0,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.747.702.358,23)	-33,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 394.248.180,09	7,64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.256.103,40	0,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se reiteran observaciones a la programacion de obra presentado por el contratista de obra mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-810-22, del 19 de julio de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 34,55% | Avance o Atraso Físico %: -33,9%
Meta Física Ejecutada %: 0,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,55				55,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	1604,30				26,0%
					Ejec					
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	23,94				95,8%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se continua en revisión de documentos observados al contratista, Componentes de Topografía, Diseño Geométrico, Estudio de suelos, Diseño de pavimento, Diseño estructural y Diseño hidráulico, con el fin de emitir conceptos de los mismos.

ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista continua con observaciones de los componentes de estudios y diseño por lo tanto no se tiene ejecucion de obra a la fecha.

ACTIVIDADES SOCIALES
Esta Interventoría se encuentra a la espera sea enviado el correspondiente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA); de igual forma, el Contratista no ha enviado los respectivos documentos de preconstrucción solicitados por esta Interventoría.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se recibe el informe mensual de agosto con observaciones subsanadas. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

ACTIVIDADES SST
Se aprueba documentos iniciales de sistema de seguridad en el trabajo y se esta a la espera de inicio de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se tiene ninguna proyeccion de inicio de actividades.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoria durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera agil y oportuna:
1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-983-22 del 04 de septiembre de 2023 donde se da respuesta a los documentos iniciales del sistema de gestion de segurridad y salud en el trabajo.

2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-953-22 Se le solicito al contratista de Obra la asistencia a los Comité del Seguimiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 8/09/2023 al 14/09/2023 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	02332 DE 2022	CONTRATO No.	1053 DE 2022
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 – NOVIEMBRE - 2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	N/A
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	N/A
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.156.513.322,20	41,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.156.513.322,20)	-41,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 35.798.946,90	57,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.156.513.322,20	41,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35.798.946,90	0,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.120.714.375,30)	-41,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 374.268.120,48	7,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.256.103,40	0,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se reiteran observaciones a la programacion de obra presentado por el contratista de obra mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-810-22, del 19 de julio de 2023

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 41,80% | Avance o Atraso Físico %: -41,1%
Meta Física Ejecutada %: 0,69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,57				57,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	2089,04				33,8%
					Ejec					
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: **En espera al inicio de las obras.**

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Por parte de la interventoria se continua con actividades de revisión de documentos observados al contratista, Componentes de Topografía, Diseño Geométrico, Estudio de suelos, Diseño de pavimento, Diseño estructural y Diseño hidráulico, con el fin de emitir conceptos de los mismos.

ACTIVIDADES TECNICAS
Durante el periodo el contratista continua con observaciones de los componentes de estudios y diseño por lo tanto no se tiene ejecucion de obra a la fecha.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se revisan los informe mensuales que han sido entregados por la profesional ambiental del contratista. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

ACTIVIDADES SST
El contratista esta al día en la información inicial del SG-SST. Pendiente inicio de obra para verificación de ejecución SST.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Debido al estado actual del contrato, no se tienen proyeccion de inicio hasta tanto no se aprueben estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Verificacion Topografica Interventoria



Verificacion Topografica Interventoria



Verificacion Topografica Interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Por parte de la interventoria durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera agil y oportuna: 1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1030-22 del 11 de septiembre de 2023, se da aprobacion con observaciones al informe diseño geometrico de vias, parte 1 y 2. 2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1048-22 del 13 de septiembre de 2023, se le reitera al contratista de obra la emntrega de documentos componente de complementacion y ajuste a estudios y diseños. 3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1049-22 del 13 de septiembre de 2023, se le relaciona al contratista de obra el estado actual del componente revision y/o complementacion estudios y diseños y solicitud de plan de contingencia. 4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1056-22 del 14 de septiembre de 2023, se envia solicitud de asistencia a comites de seguimiento al contrato de obra 2332 de 2022, teniendo en cuenta que el contratista no ha asistido a los (2) dos ultimos realizados.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 19 del 15/09/2023 al 21/09/2023 — Último Informe Semanal SI E

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10 – NOVIEMBRE - 2023
$ -
$ -
$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.511.276.018,47	48,68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.511.276.018,47)	-48,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.055.050,30	59,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.511.276.018,47	48,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 37.055.050,30	0,72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.474.220.968,17)	-47,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 354.762.696,26	6,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.256.103,40	0,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se reiteran observaciones a la programacion de obra presentado por el contratista de obra mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-810-22, del 19 de julio de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 48,68% — Avance o Atraso Físico %: -48,0%
Meta Física Ejecutada %: 0,72%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,59				59,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	2573,77				41,6%
					Ejec					
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
					Ejec					
*					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: **En espera al inicio de las obras.**

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Por parte de la interventoria se continua con actividades de revisión de documentos observados al contratista, Componentes de Topografía, Diseño Geométrico, Estudio de suelos, Diseño de pavimento, Diseño estructural y Diseño hidráulico, con el fin de emitir conceptos de los mismos.

ACTIVIDADES TECNICAS
Durante el periodo se continua con observaciones de los componentes de estudios y diseño por lo tanto no se tiene ejecucion de obra a la fecha.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se revisan los informe mensuales que han sido entregados por la profesional ambiental del contratista. La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

ACTIVIDADES SST
Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y de igual manera los informes trimestrales, ya que a la fecha el contratista no hace entrega de los mismos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Debido al estado actual del contrato, no se tienen proyeccion de inicio hasta tanto no se aprueben estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inspeccion Interventoria a puntos de intervencion



Acompañamiento de la comunicadad Vereda la Mutis al recorrido de los tramos a intervenir



Localizacion de punto de inicio y final de placa huellas a ejecutar

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoria durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera agil y oportuna:
1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1061-22 del 15 de septiembre de 2023, se da aprobacion al informe mensual ambiental presentado por el contratista de obra.
2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1062-22 del 15 de septiembre de 2023, se realizan observaciones al informe geotecnico y pavimentos presentado por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 20 del 22/09/2023 al 28/09/2023 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 – NOVIEMBRE - 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	737.867.990,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	1.032.132.009,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.866.038.714,73	55,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.866.038.714,73)	-55,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 38.311.153,70	61,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.866.038.714,73	55,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 38.311.153,70	0,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.827.727.561,03)	-54,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 354.762.696,26	6,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.256.103,40	0,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se reiteran observaciones a la programacion de obra presentado por el contratista de obra mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-810-22, del 19 de julio de 2023

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 55,55% — Avance o Atraso Físico %: -54,8%
Meta Física Ejecutada %: 0,74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,61				61,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	3058,51				49,5%
					Ejec					
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: **En espera al inicio de las obras.**

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se continuan actividades de revisión de documentos observados al contratista, Componentes de Topografía, Diseño Geométrico, Estudio de suelos, Diseño de pavimento, Diseño estructural y Diseño hidráulico, con el fin de emitir conceptos de los mismos.

ACTIVIDADES TECNICAS
Se realiza recorrido a lo largo del corredor vial La Garita - La Mutis, Contratista de obra, Interventoria y Comunidades con el fin de localizar los puntos de intervencion que se tienen actualmente en Diseños.


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se recibio documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio No PHM2022-038-2022, para revision del mismo.
Se esta a la espera que el contratista de obra haga entrega de formatos trimestrales del area ambiental.

ACTIVIDADES SST
se realiza recorrido de obra con la comunidad con el fin de finiquitar el inicio de actividades de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la reunion que se sostuvo con la entidad contratante (Gobernacion Norte de Santander), Comunidades JAC La mutis, Contratista de obra e Interventoria se establecio como compromiso el inicio de actividades de conformacion de la Calzada existente el dia lunes 02 de octubre de 2023.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunion Entidad Contratante, Contratista de obra e Interventoria con el fin de establecer compromisos para inicio de actividades de obra.



Recorrido a lo largo del corredor vial, Comunidades, contratista de obra e Interventoria, para localizacion de puntos de Intervencion.



Vista general manifestaciones de la comunidad para inicio de actividades.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoria durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera agil y oportuna:

1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1095-22 del 25de septiembre de 2023, se le solicita al contratista de obra la localizacion de puntos de referencia en tramos a intervenir y verificacion de diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 18 del 1/09/2023 al 7/09/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.537.459,20	0,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.537.459,20)	-0,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 8.586.525,26	68%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.247.776,20	0,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.586.525,26	0,3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.661.250,94)	-0,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.537.459,20	0,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.525.238,04	0,06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación observada por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-685-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.919.445.445,00	68,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.054.166.352,20	24,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,68				67,6%
* Placa Huellas	ml	1890			Prog	1,28				0,1%
					Ejec					
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog					
					Ejec					
* Gavion	Unidad	2			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN, Vereda el Hatillo y la Madera — DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-852-22, 02-Agosto -23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Documentación aprobada.Se realiza mesa de trabajo con el profesional SST, para recordar el envío de la seguridad social y los documentos durante la ejecución.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:

GIC-INVIAS-NTS-1004-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-052-2022 DE FECHA 30-08-2023 CUYO ASUNTO ES "SUBSANACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIASNTS-945-22."– APROBACION CON OBSERVACIONES OCAÑA 1814

ACTIVIDADES TÉCNICAS
Se realizaron actividades en el tramo 5, PR 7+0110 en retiro de capa asfaltica, perfilado de via, conformacion de sobre anchos con maquinaria (pajarita y motoniveladora) y compactacion.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se recibe informe mensual del mes de agosto, el documento PAGA Plan Guía a la Adaptación Ambiental), se encuentra en revisión por parte de la interventoria.


ACTIVIDADES SOCIALES

Se adelanta con la Profesional del Contratista, dos (2) mesas de trabajo los días 04 y 06 de septiembre de 2023; esto con el fin de darle a conocer a la profesional por parte de esta Interventoría los documentos de preconstrucción faltante, así como de las observaciones realizadas al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental presentado; igualmente, el Contratista envía las Actas de Vecindad de los corredores a intervenir, realizándose observaciones a las mismas por parte de esta Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizaran actividades de perfilado, conformacion de sobre anchos y nivelacion de via.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista adecuacion via alterna



Buenavista Socializacion



Buenavista PR 07+0110 perfilado de via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de la interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 8/09/2023 al 14/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.074.918,40	0,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.074.918,40)	-0,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.111.763,30	80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.785.235,40	0,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.111.763,30	0,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.673.472,10)	-0,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.537.459,20	0,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.525.238,04	0,06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación observada por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-685-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.982.179.270,00	69,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,80				79,6%
* Placa Huellas	ml	1890			Prog	2,55				0,1%
					Ejec					
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog					
					Ejec					
* Gavion	Unidad	2			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN, Vereda el Hatillo y la Madera

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	X	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-852-22, 02-Agosto -23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
El contratista esta al día en la información inicial del SG-SST, se recibe informe mensual SST y planilla de pago de seguridad social del contratista. Está pendiente la entrega de planilla de pago de seguridad social del subcontratista.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se llevo a cabo comité de obra el 15 de Septiembre de 2023

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1020-22, OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL) - OCAÑA 1814

ACTIVIDADES TÉCNICAS
Se realizaron actividades en el tramo 5, PR 7+0110 en retiro de capa asfaltica, perfilado de via, conformacion de sobre anchos, excavacion de estructura de via de 70cm en 80m, compactacion de lo intervenido. Maquinaria (pajarita, motoniveladora y vibrocompactador) .

ACTIVIDADES AMBIENTALES
La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con observaciones subsanadas por el profesional ambiental del contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizaran actividades de perfilado, conformacion de sobre anchos, nivelacion de via y compactacion.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista PR 07+0110 Conformacion de la via



Buenavista PR 07+0110 Conformacion de sobreancho



Buenavista PR 07+0110 visita del director de Interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras
Se remite aprobacion del compoente topografico por medio de Oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13 de Septiembre 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 20 del 15/09/2023 al 21/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.448.701,85	1,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28.026.600,00	1%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.422.101,85)	-0,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.747.279,15	85%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 42.159.018,85	1,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 38.773.879,15	1,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.385.139,70)	-0,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.373.783,45	1,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.662.115,85	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación observada por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-685-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.044.913.095,00	71,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.332.203.964,70	31,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,85				84,6%
* Placa Huellas	ml	1890			Prog	2,55				0,1%
					Ejec					
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog					
					Ejec					
* Gavion	Unidad	2			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN, Vereda el Hatillo y la Madera
PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI DISPONIBLE X NO

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-852-22, 02-Agosto -23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se emite oficio, con el motivo de informar los criterios a tener en cuenta en la entrega del informe SST. Se recibe seguridad social del subcontratista.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se llevo a cabo comité de obra el 22 de Septiembre de 2023

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1073-22, SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.
GIC-INVIAS-NTS-1082-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-059-2022 DE FECHA 11-09-2023 CUYO ASUNTO ES "SUBSANACIONES DISEÑO GEOMETRICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-936-22". – APROBADO (T-1) Y APROBADO CON OBSERVACIONES TRAMOS (2,4,5,7 Y 9) OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-1094-22, RESPUESTA A SU OFICIO 180-667, con asunto: Solicitud modificación del tramo No. 1 y No. 5 de la construcción de placa huella en el sector de Buenavista. OCAÑA 1814


ACTIVIDADES TÉCNICAS
Se realizaron actividades en el tramo 5, en el PR 07+0285 al PR 07+0485 En conformacion de excavacion para estructura de via , instalacion de terraplen 20 cm en el PR 07+0330 al PR 07+0485, compactacion de lo intervenido. Maquinaria (pajarita, motoniveladora y vibrocompactador) , con comision topografica constante y acopio de material granular.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se recibe el día de ayer documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) se encuentra en revisión por parte de la interventoría., nos encontramos a la espera de recibir, informes mensuales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizaran actividades de conformacion estructura de via, trabajos topograficos en nivelacion de via, instalacion de terraplen y compactacion.
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista PR 07+0250 Chequeo de niveles y alineamiento



Buenavista PR 07+0290 Instalacion de terraplen



Buenavista PR 07+0465 Compactacion de la subrasante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras
Se remite aprobacion del compoente topografico por medio de Oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13 de Septiembre 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 21 del 22/09/2023 al 28/09/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE DICIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 737.867.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.032.132.010	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 55.822.485,30	2,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.842.560,00	2%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (10.979.925,30)	-0,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.747.279,15	85%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 68.532.802,30	2,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.589.839,15	2,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.942.963,15)	-0,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.373.783,45	1,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.815.960,00	0,67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación observada por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-685-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.107.646.920,00	72,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.653.197,20	33,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 62.733.825,00	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 31.366.912,50	0,73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,85				84,6%
* Placa Huellas	ml	1890			Prog	46,36				2,5%
					Ejec					
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog					
					Ejec					
* Gavion	Unidad	2			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN, Vereda el Hatillo y la Madera	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-852-22, 02-Agosto -23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realiza mesa de trabajo con el motivo de informar los criterios a tener en cuenta en la entrega del informe SST.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realizan actividades en PR 7+0460, en retiro de capa asfaltica deteriorada en tramos parciales,perfilado de la via,conformacion de sobreanchos ,excavacion de estructura de 70 cm en 120 m,compactacion de lo intervenidos en capas de 10 cmcon material para definir terraplen de 20 cm en este tramo de 120 m, Maquinaria de apoyo en sitio activa(pajarita,motoniveladora y vibrocompactador), se realizaron ensayos para conformacion del terraplen en PR7+0380 Y PR7+'475, se proecde a instalar en capas de 10 cm de material subbase en los tramos definidos desde el PR 7+0370 al PR 7+0590.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se revisa documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), donde se logró evidenciar que el documento no fue entregado de forma completa, por lo tanto se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista, para que el documento sea enviado nuevamente teniendo en cuenta las observaciones dadas por la interventoria, por otra parte nos encontramos a la espera de recibir, informes mensuales y formatos trimestrales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizan actividades de perfilado ,conformacion de sobreanchos,nivelacion de via del tramo PR7 +0110 al PR7+0390(contemplando la parte inicial del tramo de 480m),se espera el laboratorio para muestras de densudades para subbase granular ,inicio de actividades de excavacion de riostras desde el PR7+590, e inicio de actividdaes de figurado de acero segun diseño cartilla colombia rural .
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista PR 07+0460 Compactacion de terraplen



Buenavista PR 07+0520 Chequeo y renivelacion



Buenavista PR 07+0475 Toma de densidades en terraplen

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras
Se remite aprobacion del compoente topografico por medio de Oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13 de Septiembre 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES
ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: GOBERNACION 1943, GOBERNACION 2052, OCAÑA 1814.

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023

OCAÑA 1814

1. El contratista hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11 de septiembre de 2023. Se da respuesta aprobando con observaciones con el oficio: GIC-INVIAS-NTS-1082-22 del 18 de septiembre de 2023. Las observaciones planteadas son las siguientes:

   Tramo 1: No hay observaciones.

   Tramo 2

   - El abscisado está corrido 0.57 m. en la planta a partir de la abscisa K2+820. Persiste.
   - El abscisado está corrido desde la abscisa K2+820 hasta el final del tramo. Al medir entre los puntos geométricos y el abscisado, las distancias no dan. Por ejemplo, en la imagen la diferencia entre K2+820.00 y K2+814.71 debería dar 5.29 y no 4.73 como se aprecia. Para verificar el abscisado generé la alineación con el mismo eje dibujado en el plano. Al comparar las marcas del abscisado en K2+780 y K2+800 coinciden, pero en las abscisas K2+820 y K2+840 difieren 0.57 m. Las marcas de los puntos geométricos sí coinciden.

   Tramo 4

   - La curva del PI-2 requiere un sobreancho de 1.35 m. para la circulación de un camión C3, pero según el levantamiento topográfico no se puede construir este sobreancho porque tocaría conformar un talud en relleno y demoler la alcantarilla existente.
   - Aparecen las curvas de nivel duplicadas y con diferencias, unas en color gris y otras en colores 34 y 42. Estas deben coincidir con las curvas de nivel y las secciones transversales del último levantamiento topográfico que nos llegó el 8 de septiembre.


   Tramo 5

   - La curva del PI-5 requiere un sobreancho de 1.80 m. para la circulación de un camión C3, pero según el levantamiento topográfico no se puede construir este sobreancho porque tocaría conformar un talud en relleno y demoler la alcantarilla existente.

   Tramo 7

- Las cotas rojas del K5+880 al K5+950 están erradas, no coinciden con el perfil dibujado. Por ejemplo, en la abscisa K5+930 la cota roja escrita es 1637.291, pero al verificar el perfil con la grilla en esta misma abscisa nos da la cota 1637.411.
- Las secciones transversales de diseño del K5+880 al K5+950 no coinciden con el perfil dibujado en el diseño. Por favor verificar el archivo de Civil 3D, seguro hace falta regenerar el archivo para que se actualicen las cotas tanto en el perfil como en las secciones transversales.

Tramo 9

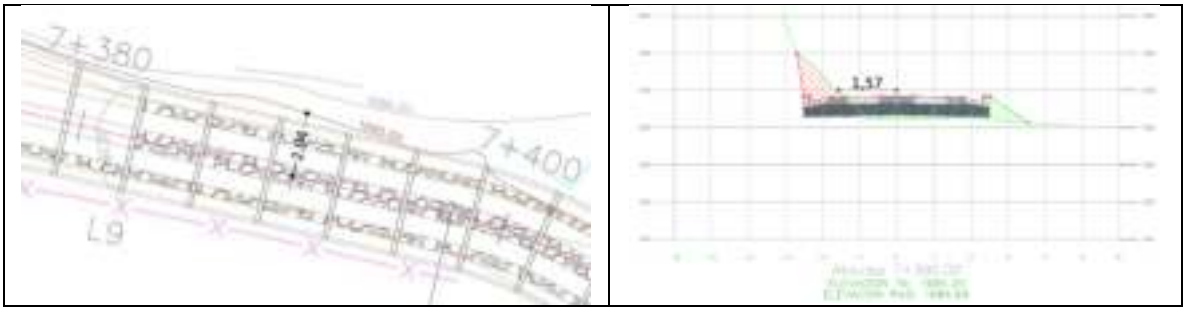

Las imágenes anteriores corresponden a la abscisa K7+390 en planta y sección transversal. En la planta vemos que la distancia del eje de diseño a la curva de nivel 1685 es de 2.94 m., mientras que en la sección transversal esta distancia nos da 1.57 m.; si las secciones transversales estuvieran dibujadas de acuerdo a las curvas de nivel, esta distancia debería ser la misma. Por favor, actualizar las secciones transversales de tal manera que coincidan con las curvas de nivel de la planta.

GOBERNACIÓN 1943

Verada Boyacá Municipio de Gramalote

1. Se reciben documentos con comunicado UTET-02590-123 del 18 de septiembre de 2023. Damos aprobación de los tramos 1, 2 y 3 con observaciones y emitimos observaciones para el tramo 4 mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25 de septiembre de 2023. Las observaciones son las siguientes:

   Tramo 1 y 2: No hay observaciones.

   Tramo 3

   - La escala de la planta del tramo 3 no está bien configurada. Persiste.
   - La transición al sobreancho al finalizar la curva C8 del tramo 3 se ve muy forzada porque el sobreancho de esta curva se aplicó por la parte externa. Estéticamente se ve mejor esta transición como estaba en la versión anterior. Esta observación la hago dejándola a su libre criterio.

Tramo 4

- La curva C14 no requiere sobreancho.
- Las transiciones al sobreancho de la curva C24 deben ser de 9 metros y el sobreancho conservarse desde el PC hasta el PT.
- En la curva C11 se debería dejar el sobreancho constante desde el PC hasta el PT para que se vea mejor estéticamente.
- Revisar la zona de cruce de la curva C15, los vértices de las transiciones al sobreancho (derecho e izquierdo) no están enfrentados (en la misma abscisa).
- La transición al sobreancho al finalizar la curva C34 se ve muy forzada porque el sobreancho de esta curva se aplicó por la parte externa. Estéticamente se vería mejor esta transición con una distancia más larga (9 metros). Esta observación la hago dejándola a su libre criterio.
- De la abscisa K5+674.52 a la abscisa K5+694.64 se redujo la calzada del borde derecho para evitar invadir el predio. De todas formas, les recomiendo que cuando se inicien labores se verifique en terreno si se puede construir el ancho de calzada completo.

Vereda El Helechar Municipio de Arboledas

1. Se emite el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29 de septiembre de 2023. Se hacen observaciones, éstas son las siguientes:

Tramo 1

- Hace falta dibujar los dentellones o rampas de acceso a la placa huella.
- En la abscisa K4+956.10 hay un PIV que por el cambio de pendiente requiere el diseño de una curva vertical. En las abscisas K4+966.84 y K4+982.48 hay dos PIV que recomiendo que sean eliminados.
- En las abscisas K4+835.73, K4+860.19, K4+874.48, K4+910.65, K4+919.52, K4+930.23, K4+939.47, K4+966.68, K4+976.48, K4+987.72, K4+992.49, K5+002.29, K5+010.30, K5+038.44 hay PIs sin diseño de curva horizontal, se deben diseñar las curvas o eliminar los PI que tengan deflexión pequeña.
- En las secciones transversales, en lo posible dibujar la modulación (placa huella, piedra pegada, cunetas y bordillos).
- Para construir la placa huella propuesta se debe ampliar la vía existente. Por favor verificar en terreno antes de iniciar obra que efectivamente se pueda ejecutar.
- El tramo tiene 251.80 m. Debería haber al menos una zona de cruce por si se encuentran dos vehículos, uno de los dos no se vea obligado a reversar más de 100 metros. Si no se puede construir dicha zona de cruce por favor justificar por escrito.
- Revisar desde la parte de geotecnia los espesores de la placa huella y la subbase teniendo en cuenta que es para tráfico pesado.
- Tener en cuenta las observaciones realizadas al levantamiento topográfico.

Tramo 2

- El eje del plano de modulación aparece por fuera del plano.

- Hace falta dibujar los dentellones o rampas de acceso a la placa huella y la modulación de las curvas que requieren sobreancho.
  - En las abscisas: K8+953.03, K9+916.92, K9+028.53, K9+050.33, K9+071.84 y K9+093.64 hay PIV sin diseño de curva vertical, se debe diseñar la respectiva curva vertical o eliminar el PIV.
  - Las curvas C5 y C6 que son tipo 11 y tipo 9 requieren sobreancho de 1.35 m. y 0.45 m. respectivamente.
  - En las abscisas K8+977.79, K8+987.76 y K9+056.50 hay PIs sin diseño de curva horizontal, se deben diseñar las curvas o eliminar los PI que tengan deflexión pequeña.
  - En las secciones transversales, en lo posible dibujar la modulación (placa huella, piedra pegada, cunetas y bordillos).
  - El tramo tiene 200 m. Debería haber al menos una zona de cruce por si se encuentran dos vehículos, uno de los dos no se vea obligado a reversar más de 100 metros. Si no se puede construir dicha zona de cruce por favor justificar por escrito.
  - Revisar desde la parte de geotecnia los espesores de la placa huella y la subbase teniendo en cuenta que es para tráfico pesado.
  - Tener en cuenta las observaciones realizadas al levantamiento topográfico.

Tramo 3

- Este tramo está mal georreferenciado. Consultar con la comisión de topografía.
- La modulación debe ser tipo Colombia rural. La modulación de la curva C4 no cumple con esta condición. La modulación planteada en esta curva puede ir desde el punto donde inicia la transición al sobreancho y hasta el punto donde termina el sobreancho, esto revisando el presupuesto, ya que esta modulación requiere más concreto que piedra pegada. Si el presupuesto no lo permite, se modula tipo Colombia rural, quedando la franja de piedra pegada interna (borde derecho) más ancha. Hace falta dibujar los dentellones o rampas de acceso a la placa huella.
- En las abscisas: K9+866.04, K9+886.59, K9+921.89 y K10+010.61 hay PIV sin diseño de curva vertical, se debe diseñar la respectiva curva vertical o eliminar el PIV.
- En las abscisas K9+848.05, K9+885.66 y K9+904.25 hay PIs sin diseño de curva horizontal, se deben diseñar las curvas o eliminar los PI que tengan deflexión pequeña.
- En las secciones transversales, en lo posible dibujar la modulación (placa huella, piedra pegada, cunetas y bordillos).
- Para construir la placa huella propuesta se debe ampliar la vía existente. Por favor verificar en terreno antes de iniciar obra que efectivamente se pueda ejecutar.

- El tramo tiene 224 m. Debería haber al menos una zona de cruce por si se encuentran dos vehículos, uno de los dos no se vea obligado a reversar más de 100 metros. Si no se puede construir dicha zona de cruce por favor justificar por escrito.
- Revisar desde la parte de geotecnia los espesores de la placa huella y la subbase teniendo en cuenta que es para tráfico pesado.
- Tener en cuenta las observaciones realizadas al levantamiento topográfico.

Vereda Chicagua bajo Municipio de Arboledas

Se envían observaciones genérales mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023,** las cuales se presentan a continuación:

1. Revisar el abscisado de inicio y fin del tramo 1 dentro del informe, ya que se encuentra invertido.
2. Según anexo técnico la longitud a intervenir en los dos (2) tramos es de 1000 metros, pero se está diseñando una longitud de 500m. Revisar
3. Varios puntos de quiebre (PI) se encuentran sin diseño de curvas horizontales, y con una deflexión de más de 6°, por recomendación del manual de diseño geométrico, se pueden omitir las curvas horizontales cuando se presente una deflexión menor a 6°, esto con el fin de evitar una defectuosa apariencia de la vía y quiebres muy forzados. Revisar
4. Revisar la abscisa K1+970 del tramo 2, el perfil presenta un quiebre en la topografía y hace que se genere un relleno según sección transversal.
5. El achurado de la modulación (capas de pavimento) y las cunetas, no se ven en las secciones transversales.
6. Están presentando el diseño de la subrasante en los perfiles y secciones transversales, pero como se había solicitado anteriormente y como lo recomienda el Manual de diseño geométrico es necesario presentar las cotas de rasante, así mismo, como se manifiesta en el informe de diseño.
7. Revisar el empalme con placa huella existente en el final del tramo 1, abscisa K0+540, ya que el diseño del perfil debería estar por debajo del terreno natural el espesor del pavimento (en este caso 15 cm de subbase y 15 cm de placa huella).

Vereda Santo Domingo Municipio de Arboledas

Se recibe documentación mediante comunicado **UTET-02590-115 del 12-sept-2023**, se da respuesta con observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sept-2023,** las cuales se presentan a continuación:

Archivos dwg

1. Teniendo en cuenta que ya se determinó el camión C3 como vehículo de diseño, según el informe (pág. 6), se deben analizar varias curvas que no cumplen con el radio mínimo de 8.20m que se está solicitando y más teniendo en cuenta que se tiene una topografía muy justa y se está diseñando con un ancho de sección de 4.10 m."
   La anterior observación se realizó visto que un camión C3, necesita un radio mínimo de 8.20 m para realizar el giro de manera adecuada y la curva 11 tiene un radio de 5.83 m con deflexión de 167°42'31"; esta interventoría realizo la visita al tramo a intervenir donde se verifico por topografía que el espacio es limitado y es muy difícil aumentar el radio, por tal razón, se solicita analizar la viabilidad de cambiar el vehículo de diseño, dada la dificultad que tendría un camión C3 para realizar el giro en dicho curva.

2. Se realizó una visita técnica al tramo verificando los diseños y las curvas más críticas, la curva 23 sobre la abscisa K4+850 presenta un ancho efectivo de 3.70m (tomado en campo), con un talud vertical al costado izquierdo y un deslizamiento sobre el costado derecho; los diseños presentados para esta curva vienen con un ancho de sección teniendo en cuenta el sobreancho de 5.45 m, por tal razón, se solicita verificar con topografía el diseño planteado, de lo contrario realizar el ajuste correspondiente.
3. El alineamiento presenta varios PI con deltas mayores a 6 grados a los cuales no se les está diseñando una curva generando quiebres bruscos en los diseños. Por favor revisar y corregir.
4. Las secciones transversales no traen las cunetas ni los bordillos dibujados. Revisar
5. Para la entrega final se deben revisar los grosores de línea al momento de imprimir archivos en PDF, ya que no es posible visualizarlos de manera correcta.

Vereda Corozal-California Municipio de los Patios

1. Se envía aprobación con observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023,** las cuales se presentan a continuación:

Tramo 1

- Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo.
- Se había solicitado diseñar un sobreancho a la curva C4, el cual se efectuó en 0.60 m, pero la transición no se está realizando de acuerdo a la guía de diseño. Revisar
- Según el informe de diseño, están aplicando un ancho de sección de 5 m, el cual se debería ver reflejado en los tramos en tangente, pero están diseñando estos tramos con un ancho superior y en algunos puntos según topografía los diseños se están metiendo a los paramentos. Revisar.
- Nota: El archivo contiene 3 carpetas (1. PLANOS, 2. REPORTES, 3. INFORMES), en una de ella vienen los archivos dwg de los planos; pero de igual manera vienen

2 archivos dwg sueltos fuera de las carpetas; por favor anexar dentro de las carpetas únicamente los archivos que se van a presentar para no generar confusiones.

Tramo 2-3-4

- Revisar el dibujo de las riostras ya que no están acordes al ancho de sección del diseño.
- Nota: El archivo contiene 3 carpetas (1. PLANOS, 2. REPORTES, 3. INFORMES), en una de ella vienen los archivos dwg de los planos; pero de igual manera vienen 2 archivos dwg sueltos fuera de las carpetas; por favor anexar dentro de las carpetas únicamente los archivos que se van a presentar para no generar confusiones.

Tramo 5

- Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo.
- Revisar el dibujo de las riostras ya que no están acordes al ancho de sección del diseño.

Tramo 6

- Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo.
- La guía de diseño recomienda diseñar curvas con un radio mayor a 11 metros para vehículo tipo C3, sin embargo, el radio mínimo que se recibe por esta interventoría teniendo en cuenta las dimensiones de los vehículos, es de 8.20m, por favor revisar la curva 64.

Tramo 7 al 12

- Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo.
- Revisar el dibujo de las riostras ya que no están acordes al ancho de sección del diseño.
- La Abscisa K6+835.12 del tramo 12 es el empalme de diseño entre las abscisas K1 +942.36 a K1+952.88 del tramo 1, por favor anexar la sección transversal de dicha abscisa, y tener en cuenta los niveles de las abscisas nombradas para realizar el empalme de diseño.

2. Se recibe documentación mediante comunicado **UTET-02590-125 del 25-sept-2023,** los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

Vereda Rinconada Municipio de Arboledas

Se recibe documentación mediante comunicado **UTET-02590-124 del 25-sept-2023**, se da respuesta de aprobación con observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sept-2023,** las cuales se presentan a continuación:

1. Por favor ubicar los puntos geométricos (PC-PT-PI) de cada curva en el plano final (modulado).
2. Se debe presentar el cuadro de coordenadas de la línea base o puntos de amarre con los cuales se realizarán los trabajos de replanteo en campo.
3. Hay varios PIV a los cuales no se le está diseñando curvas verticales, verificar si se cuenta con la longitud disponible para diseñar dichas curvas ya que se están generando quiebres bruscos en la vía. Abscisas K4+760.
4. Las secciones transversales no traen dibujados los bordillos, de ser posible, dibujar la modulación sobre las secciones transversales.
5. Por favor anexar el diseño de la losa de transición al inicio y fin del tramo donde no se realicen empalmes con estructuras existentes como placa huellas o puentes.
6. Uno de los planos esta desactualizado ya que presenta curvas con sobreanchos los cuales no se ven en los planos de modulación. Revisar y corregir
7. Para la entrega final se deben revisar los grosores de línea al momento de imprimir archivos en PDF, ya que no es posible visualizarlos de manera correcta.
8. La curva 2 se está diseñando fuera del límite del levantamiento, por favor verificar con topografía si es posible realizar el diseño.

Vereda San Isidro Municipio de Gramalote

Se recibe documentación mediante comunicado **UTET-02590-129 del 30-Sept-2023**, la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.


GOBERNACION 2052

1. Se recibe documentación de Diseño geométrico mediante comunicado **PHM2022-035 y 036-2022 del 07-Sept-2023,** los cuales se aprueban con observaciones las cuales se presentan a continuación mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-1030-22 del 11-Sept-2023:**

LA MUTIS TRAMO 1

- Los planos no vienen rotulados y con la información necesaria que se debe anexar en la presentación de un plano.
- Como lo ha venido informando esta interventoría, y tal cual se manifiesta en la nota adjunta de la lista de chequeo, los documentos bases de revisión son la cartilla Colombia rural y la guía de diseño de pavimentos con placa huella las cuales nos dan los parámetros mínimos de diseño; para el caso de los sobreanchos se recomienda realizarlos de PC a PT fluctuando en ancho dependiendo del tipo de curva y que el punto de quiebre de la transición coincida con los puntos geométricos de la curva(como se había observado anteriormente); las riostras son elementos estructurales que se pueden ajustar en campo dependiendo la longitud de la curva,

ya que la guía no nos obliga a tener losas (placa huella) de una longitud exacta, sino con una longitud máxima de 2.80m la cual puede variar y ajustarse, con el fin de poder localizar una riostra en los puntos de quiebre de la transición.

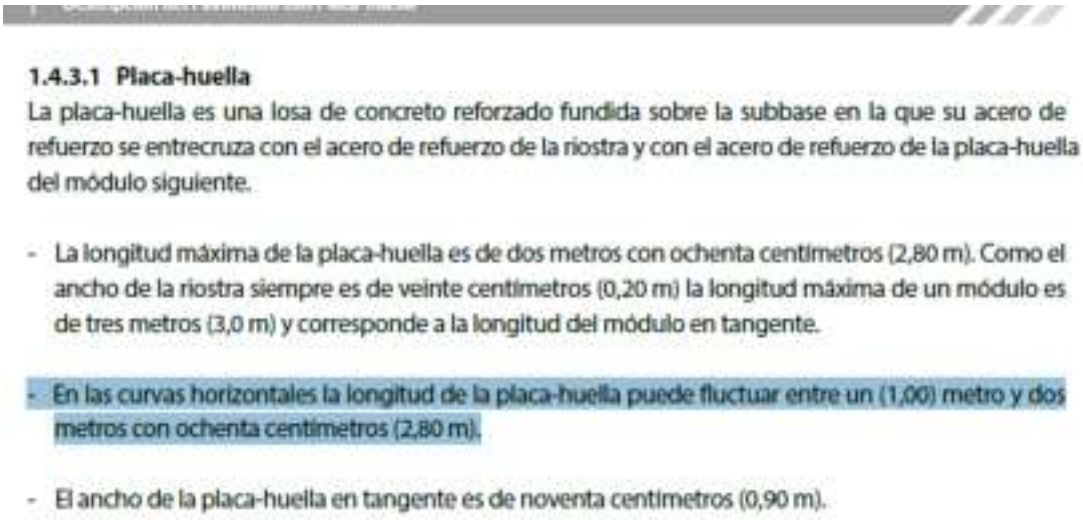

1.4.3.1 Placa-huella

La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente.

- La longitud máxima de la placa-huella es de dos metros con ochenta centímetros (2,80 m). Como el ancho de la riostra siempre es de veinte centímetros (0,20 m) la longitud máxima de un módulo es de tres metros (3,0 m) y corresponde a la longitud del módulo en tangente.
- En las curvas horizontales la longitud de la placa-huella puede fluctuar entre un (1,00) metro y dos metros con ochenta centímetros (2,80 m).
- El ancho de la placa-huella en tangente es de noventa centímetros (0,90 m).

En el caso de los diseños presentado en las curvas que requieren sobreancho, no se está atendiendo esta recomendación, por tal razón, de acuerdo a lo anterior y la posición tomada en la mesa de trabajo del 25 de agosto de 2023 por parte del contratista, se deja a su responsabilidad la ejecución de los diseños presentados.

- En el tramo 2 se esta diseñando sobre una placa huella existente entre las abscisas K0+210 a K0+230, en la cual se esta solicitando soportar si se piensa demoler, de no ser así, los diseños se deberán ajustar a dicha placa huella.
- En el tramo 5 se había generado la siguiente observación “La abscisa K0+480 presenta un sector de inestabilidad y caída de banca, lo cual fue evidenciado en la visita realizada por parte de la interventoría; en los archivos presentados están diseñando sobre esta zona desplazando el eje hacia el costado izquierdo donde no hay información topográfica, se recomienda revisar con el especialista en geotecnia la viabilidad de intervención , que como ya se comentó presenta inestabilidad, de ser así, se debe soportar con topografía la zona donde se desea diseñar ya que no se cuenta con la información necesaria.” A la cual se le esta dando la siguiente respuesta por parte del contratista “Muy respetuosamente se le informa a la interventoría que por recomendaciones prácticas del geotecnista y del contratista, con el ánimo de no impactar el presupuesto y alcance de la obra, se decidió correr el diseño hacia la parte interna, dónde se cuenta con espacio. La proyección de un muro de contención para la banca sería una solución viable si no se contara con el

espacio suficiente en la parte interna. Se recomienda realizar actividades de revegetalización de la zona de media ladera inestable por lluvias.” La solicitud que se realizo es tener soporte topografico de la zona hacia donde se pretende mover el alineamiento, pero solo se está justificando de manera escrita que se cuenta con espacio y aprobación del geotecnista; de no tener esta información, solo se puede dar aprobación del tramo hasta la abscisa K0+450 (que es hasta donde se tiene información topográfica completa de las secciones.) o quedando a responsabilidad del contratista la ejecución de la placa huella desde la abscisa señalada anteriormente (K0+450).

- Los 5 tramos cumplen con los diseños en planta, longitud de transiciones, anchos de sección, modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas de cruce, zonas de alcantarilla) , sin embargo, no se están atendiendo algunas de las recomendaciones realizadas, justificando que no se está siendo práctico en la ejecución del proyecto, por tal razón, se da aprobación con observaciones a los 5 tramos del proyecto, dejando anexas a este documento la explicación de las solicitudes , y en espera de la entrega final con los planos debidamente rotulados.

CONCLUSIONES

- Los diseños de Ocaña 1814 han sido aprobados con observaciones.
- De los diseños de la vereda Boyacá del municipio de Gramalote del convenio Gobernación 1943 se aprobaron los tramos 1 y 2, se aprobó con observaciones el tramo 3 y se emitieron observaciones del tramo 4.
- Se emitieron observaciones para los diseños de la vereda El Helechar del Municipio de Arboledas del convenio Gobernación 1943. Se espera que sean subsanados.
- Del convenio Gobernación 1943, se encuentran con observaciones la vereda Chicagua Bajo, y aprobado con observaciones la vereda Santo Domingo, Corozal-california, Rinconada.
- El municipio de los Patios- Gobernación 2052 se encuentra aprobado con observaciones esperando la subsanación de las mismas.

Cordialmente,

Gicela Córdoba Londoño.

GICELA CORDOBA LONDOÑO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

ARBOLEDAS

El contratista mediante comunicado UTET - 02590-081, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto con Contrato de obra pública No 02590, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Esta revisión, realizada el 11 de septiembre, para la vereda Chicagua Alto y Bajo, presentó un avance del 54% ya que no delimito correctamente las cuencas aferentes y no realizó el chequeo hidráulico de las obras existentes y proyectadas de forma correcta. Igualmente no presentó planos de obras de drenaje.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS – HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO – CHICAGUA ALTO Y BAJO – ARBOLEDAS			FECHA: 11/9/2023
		DISEÑADOR	Firma:		TIPO DE VÍA:	Rural
			Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES		LONG. (m):	
			Matrícula N°: MP. 5422211 84617 NTS		Nº REVISIÓN:	2

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	HEC VEREDA CHICAGUA BAJO					
	INFORME HIDRAULICO VEREDA CHICAGUA BAJO MUNICIPIO ARBOLEDAS					
	RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTE HIDRAULICO					
	UTET-02590-081 ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA CHICAGUA BAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación ARBOLEDAS [16030030]. La cartografía consultada corresponde a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas mencionan el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador		X		**Pendiente por atender.** Debe presentar los documentos del profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	

1. ESTUDIO HIDROLÓGICO

1	**INFORME**				
1.1	Ubicación del proyecto	X			Se atiende observación. Incluye coordenadas de inicio y fin de los tramos a intervenir junto con el norte geométrico.
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en imágenes satelitales de Google Earth.
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación AMBEUTAM (14020650).
1.4	Análisis de la precipitación	X			Se atiende observación. Presenta el análisis de precipitación incorporando el régimen mensual multianual de la lluvia.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Se atiende observación. Presenta imagen con la ubicación de la estación hidro climatológica con respecto a los tramos viales a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Se atiende observación. Incorpora dentro del informe la caracterización de las cuencas aferentes.
1.9	Delimitación de la cuenca		X		**No cumple.** El item presenta imagen de las áreas aferentes a las alcantarillas no se acepta que no se incluya las áreas aferentes a las cunetas. El proyecto de placa huella requiere la implantación de cunetas y no simplemente justificando que se adopta la cuneta de la cartilla de Colombia rural, opción que se debe evaluar hidráulicamente y verificar que cumpla con los requerimientos hidráulicos. La cartilla presenta diversas secciones y es responsabilidad del consultor estimar la mas adecuada para el manejo de la escorrentía superficial.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores		X		**No cumple.** Debe presentar la estimación y delimitación de las áreas aferentes a las cunetas.	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos el cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores		X		**No cumple.** El estudio hidráulico debe contemplar el drenaje total de la placa huella a implementar incluyendo cunetas, disipadores de energía y demás obras requeridas para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.15	Planos de localización		X		**No cumple.** Presenta cuadrícula en los planos pero no se evidencian las coordenadas.	
1.16	Planos de cuencas y/o áreas aferentes		X		**No cumple.** Debe presentar las áreas aferentes a las cunetas.	

2. ESTUDIO HIDRÁULICO

2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados
2.2	Inventario de obras existentes		X		**No cumple.** Debe presentar el respectivo formato de inspección y registro fotográfico de las obras de drenaje existentes.



Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.9	Diseño en planta		X		El plano debe contener coordenadas.	
2.10	Diseño en perfil	X			Se atiende observación. Los planos presentan las obras de drenaje a implementar. Presenta detalle con las cotas batea de inicio y fin.	
2.11	Detalles		X		Falta implementar el detalle de la cuneta.	

CONCLUSIONES: Atender las observaciones realizadas mediante oficio en donde se evidencie respuesta una a una a cada observación realizada.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº:

PORCENTAJE DE AVANCE: 54%

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma / Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA / Rol: 2520220470?

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

ABREGO

El contratista mediante comunicado OFC-CADV-GC-128-2023, hace entrega del informe para el ajuste de la alcantarilla ubicada en la abscisa PR7+410 correspondiente al contrato No 252 de 2022, MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

De acuerdo con la información suministrada mediante comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 , en la cual, el contratista da respuesta a las observaciones realizadas a las

modificaciones de drenaje del PR 7 + 410, a continuación se presenta el respectivo concepto técnico:

OBSERVACION:

1. Si bien presenta el chequeo de la capacidad de una cuneta triangular, no es claro de donde sale el caudal aferente de 0.05 m3/s. Además, teniendo en cuenta que es una cuneta existente debe presentar el área aferente a dicha cuneta con lo cual se pueda verificar que el caudal que llega de la rápida no afecta la capacidad de dicha estructura. Por lo tanto debe presentar el plano con la ubicación de dicha cuneta donde se pueda verificar la pendiente y las dimensiones de esta junto con el área aferente. también se solicito el punto de descarga de dicha cuneta y no se presentó.

El plano debe contener la implantación de la cuneta, las dimensiones, área aferente y pendiente de la cuenta; y punto de descarga.

Concepto de interventoría: Se atiende parcialmente. En el informe "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL A LA SALIDA DE LA ALCANTARILLA" presenta el chequeo hidráulico de la cuneta existente, para lo cual incluye y delimita debidamente las áreas aferentes.

En el plano "Plano_Ye_del_chorro-Alcantarilla_existente 28-08-23" presenta el diseño de las obras hidráulicas requeridas y la descarga a la cuneta existente. Finalmente, presenta el trazado de la cuneta y la descarga final a una alcantarilla.

Se tiene la siguiente observación:



Del plano se observa el punto de descarga final de la cuneta se encuentra en la otra calzada, por lo tanto, no es claro como la cuneta atraviesa la vía.

Conclusiones: Aclarar como la cuneta realiza el cruce de la vía existente hasta llegar al punto de descarga final.

ARBOLEDAS – SANTO DOMINGO

El contratista mediante comunicado UTET - 02590-107, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto con Contrato de obra pública No 02590, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Esta revisión, realizada el 28 de septiembre, para la vereda Santo Domingo, presentó un avance del 57% ya que no delimito correctamente las cuencas aferentes y no realizó el chequeo hidráulico de las obras existentes y proyectadas de forma correcta. Los planos presentados, del detalle de las obras transversales, evidenciaban alcantarillas enterradas por lo que se solicito aclarar dicha situación y mejorar los perfiles transversales.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - SANTO DOMINGO - ARBOLEDAS	FECHA: 9/28/2023
		DISEÑADOR:	Firma / Nombre / Matrícula Nº	TIPO DE VÍA: Rural LONG. (m): Nº REVISIÓN: 1



Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	HID. VEREDA SANTO DOMINGO					
	HIDROLOGICO E HIDRAULICO - SANTO DOMINGO					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación ARBOLEDAS [16020056]. La cartografía consultada correspondió a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas mencionó el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador		X		Debe presentar los documentos del profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta, en la figura 1, la localización general del proyecto, referenciando el inicio y final del tramo a intervenir.	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en imágenes satelitales de GoogleEarth.	

1.3	Información hidrometeorológica	x			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación ARBOLEDAS [16020050].
1.4	Análisis de la precipitación	x			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	x			Presenta imagen con la ubicación de la estación Arboledas [16020050] con respecto a los tramos a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	x			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			x	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	x			Presenta las características de las cuencas aferentes. Indica la pendiente y tipo de terreno con el cual establece el coeficiente de escorrentía.
1.9	Delimitación de la cuenca	x			Presenta, en la figura 2, la delimitación de las cuencas aferentes a tramo vial a intervenir.
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			x	Las cuencas tienen áreas inferiores a 3 Km2.
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores		x		No es clara la delimitación de las áreas aferentes a las cunetas. Aclarar en el informe. Debe presentar el área aferente a cada tramo de cuneta. En el capítulo 5.2 indica que toma un área aferente con una franja de 25 m lo cual no corresponde con la delimitación de áreas presentada en planos y en la figura 2. Las áreas aferentes deben corresponder con la delimitación de las cuencas. Si va a tomar una ancho de 25m debe proyectar zanjas de coronación a dicha distancia para garantizar que únicamente a las cunetas llegue el caudal aferente de los 25m.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.12	Cálculo del tiempo de concentración Aunque el cálculo de los diferentes tiempos de concentración para una hoya hidrográfica difiere de acuerdo con la fórmula empleada, se requiere que se utilice, desde el punto de vista de la seguridad en relación con mayores tiempos de concentración (mayores intensidades de precipitación y/o histogramas de lluvias más concentrados), la fórmula de Kirpich. Por otro lado, se tomará como mínimo un tiempo de concentración igual a 15 min, con el fin de tener en cuenta el tiempo inicial que tarda el agua en concentrarse en una hoya y no sobreestimar la intensidad de precipitación que resultaría con valores calculados inferiores a este tiempo de concentración.		x		Debe corregir el texto de la pagina 24 ya que indica que se toma un tiempo de concentración de 15 minutos lo cual no es cierto ya que en los cálculos presenta un tiempo de 10 minutos.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			x	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores		x		Una vez aclare y justifique el área aferente a cada tramo de cuneta se revisará nuevamente el calculo establecido.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización	x			Presenta planos con la implantación de los tramos a intervenir.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes		x		Debe presentar las áreas aferentes a cada tramo de cuneta. Si va a tomar un ancho de 25 m debe proyectar zanjas de coronación y deben quedar implementadas en los planos.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
2	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	x			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados	
2.2	Inventario de obras existentes		x		Debe aclarar en el informe si en los tramos a intervenir existen obras de drenaje transversal. Si existen debe presentar el respectivo formato de inspección y registro fotográfico.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes		x		Sujeto a respuesta del numeral 2.2.	

2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas propuestas utilizando el software HY8.
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.).		X		Debe aclarar en el informe por que no se requieren obras de disipación al descole de las alcantarillas. Indicar que tipo de descole se maneja si se entrega directamente al terreno y si se requiere o no alguna obra de protección del suelo.
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (canales, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)		X		Debe justificar el área aferente a cada tramo de cuneta. Una vez justifique el área se revisara nuevamente el calculo hidráulico de las cunetas.
2.7	Análisis de socavación			X	N/A
3	**PLANOS DE DISEÑO**				
3.8	Rotulo y convenciones	X			Los planos presentan rótulos y convenciones.
3.9	Diseño en planta		X		En el plano en planta debe aparecer la cuneta indicando el sentido de drenaje. Si va a implementar zanjas de coronación estas deben aparecer en el plano.

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**	**OBJETO:**	**ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - SANTO DOMINGO - ARBOLEDAS**	**FECHA**	9/28/2022
		DISEÑADOR	Firma / Nombre / Matrícula N°	**TIPO DE VÍA:**	Rural
				LONG. (m):	
				N° REVISIÓN:	2

N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
3.10	Diseño en perfil 		X		Los planos en perfil deben contener las cotas de la tubería. En cada nota de la tubería presentada, indicar cota batea de inicio y fin.	
3.11	Detalles 		X		En las secciones transversales debe prolongar el perfil del terreno de tal forma que se evidencie la descarga al terreno natural. Todas las alcantarillas deben quedar con descarga libre. Los perfiles presentados muestran alcantarillas enterradas. Debe presentar la sección transversal hasta el punto que donde se evidencie y se garantice descarga libre.	

CONCLUSIONES: Atender las observaciones realizadas mediante oficio en donde se evidencie respuesta una a una a cada observación realizada.

INTERVENTORÍA:	**ESPECIALISTA HIDRÁULICO:**	Firma	**Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:**
CONTRATO INTERVENTORÍA N°:		Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA	
		Mat.: 252022047DT	
PORCENTAJE DE AVANCE:	57%		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera

resumida, para el proyecto de Arboledas en las veredas Chicagua Alto, Bajo y Santo Domingo, a la fecha se han realizado observaciones a la documentación presentada.

Cordialmente,



JAIRO ALONSO ZORRO ROA
MP 25202204707 CND
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA GEOTECNIA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS (CHICAGUA - HELECHAR - POTREROS - POTREROS - VOLCAN - LA RINCONADA) Y LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. CHICAGUA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

2. HELECHAR

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

3. POTREROS

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

4. VOLCAN

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

5. LA RINCONADA

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

6. COROZAL

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida.

El Contratista del municipio de Arboledas y Los Patios, a la fecha no cuenta con aprobación de Interventoría.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS (CHICAGUA - HELECHAR - POTREROS - VOLCAN - LA RINCONADA) Y LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA

En primera medida, se aclara que el trabajo de acompañamiento, revisión, ajuste y aprobación final de los estudios y diseños se ha realizado con base en las directrices y requerimientos de la normativa vigente correspondiente a la **Cartilla Colombia Rural,** adaptada mediante Resolución 2483 de 19 de octubre de 2020.

Nos permitimos dejar dos salvedades relacionadas al diseño de la estructura.

1. Conceptualmente, los pavimentos en placa huella son estructuras de concreto reforzado donde la falla estructural se produce por carga última, es decir, cuando circulen por la estructura vehículos con mayores solicitaciones a las planteadas en el diseño.


2. Como complemento a lo anterior, la elaboración de un estudio de tránsito traducido en un espectro de cargas resulta innecesario porque la estructura de placa huella falla por carga última, no por acumulación de fatiga por paso repetitivito de automotores. El estudio de tránsito debe estar enfocado en la selección del Vehículo de Diseño, donde se defina la configuración de ejes y el peso del mayor vehículo que transitará por la vía.


Teniendo en cuenta lo anterior, la Cartilla Colombia Rural adapta dos estructuras de placa huella según el vehículo de diseño:

Diseño para vehículo liviano (plano 125 - página 169)

Aplica para la circulación de motocicletas, automóviles y camionetas. El diseño consta de una placa huella de 15 cm de espesor apoyado sobre una capa de apoyo (material granular o suelo cemento) de 15 cm de espesor. A continuación, se presenta el detalle extraído de la Cartilla.

Ilustración 1 Diseño placa huella vehículo liviano.






Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales

El acero de refuerzo para la placa huella corresponde a barras No. 3 cada 0.20 m.

Diseño para vehículo C2-C3 (plano 126 - página 170)

Aplica para el tránsito de vehículos livianos, y camiones con la configuración C2-C3. El diseño consta de una placa huella de 20 cm espesor apoyado sobre una capa de apoyo (afirmado, base granular o suelo cemento) de 30 cm de espesor. A continuación, se presenta el detalle extraído de la Cartilla.

Ilustración 2 Diseño placa huella vehículo C2 C3

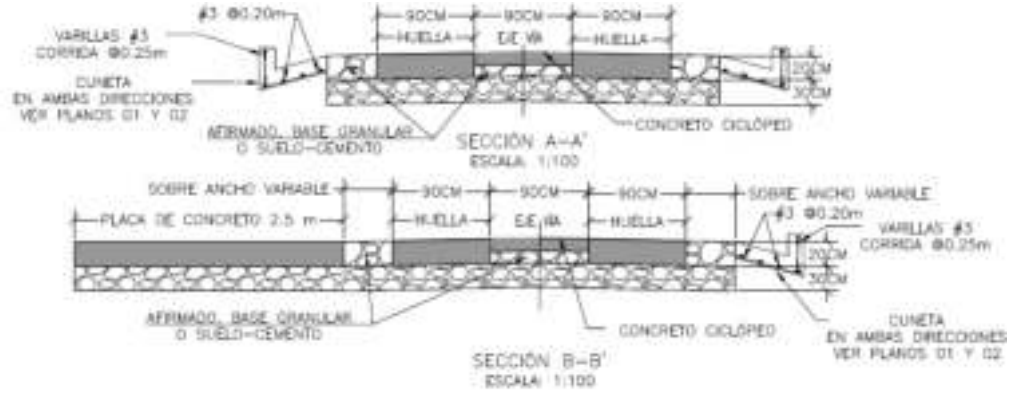

Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales

El acero de refuerzo para la placa huella corresponde a barras No. 4 cada 0.20 m. La Cartilla deja la salvedad que para el diseño de vehículos pesado se puede implementar placa de 15 cm de espesor siempre y cuando se incluyan barras No. 4 separadas cada 0.15 m. A continuación, se presenta la tabla resumen para el tipo de barra y el espesor de la placa.

Ilustración 3 Recomendación de placa para vehículo de diseño C2 C3

CON MATERIAL GRANULAR

LONGITUD DE LA PLACA (m)	ESPESOR DE LA PLACA	BARRA #	SEPARACIÓN ENTRE BARRAS	CONCRETO PLACAS (m3)	ACERO DE REFUERZO (KG)	CONCRETO CICLÓPEO (m3)	MATERIAL GRANULAR O SUELO CEMENTO (m3)
3	0.15	4	0.15	51	3024	13	130
	0.20	4	0.20	60	2745	13	130

Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales

Consideración adicional:

Desde la buena práctica de la ingeniería de pavimentos y siguiendo la recomendación de la Cartilla (título 8 Pavimentos página 155), la subrasante debe tener una capacidad de soporte CBR superior al 3.0%. En caso contrario, se deben incluir técnicas de mejoramiento pertinentes (reemplazo con material granular, estabilización con aditivos químicos, instalación de geotextiles, etc.) para garantizar una superficie estable, homogénea y con CBR superior al 3.0% donde pueda construir la estructura de pavimento.

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. ABREGO

El convenio incluye dos corredores:

- ✓ Corredor 1: Cuatro tramos con una longitud total de 1320 ml.
- ✓ Corredor 2: Cinco tramos con una longitud total de 1287 ml.

- Estudio de tránsito:

Se realizó el estudio de tránsito donde se identificó la circulación de camiones C2P y C2G en ambos tramos.

Tabla 1 Estudio de tránsito Abrego corredor 1

MOVIMIENTO	DIAS	A	COLECTIVOS		Buses	CAMIONES						Mixtos
			CP	CG		C2 P	C2 G	C3	C4	C5	>C5	
1	LUNES	4	0	0	0	2	3	1	0	0	0	10
	MARTES	8	0	0	0	2	2	2	0	0	0	14
	MIERCOLES	4	0	0	0	1	2	2	0	0	0	9
	JUEVES	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0	7
	VIERNES	3	0	0	0	1	2	2	0	0	0	8
	SABADO	4	0	0	0	2	2	2	0	0	0	10
	DOMINGO	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	9
	PROMEDIO	4	0	0	0	2	2	2	0	0	0	10

Fuente: CONSORCIO AD VÍAS

Tabla 2 Estudio de tránsito Abrego corredor 2

PERIODO (CONTEOS DE 8.00 am a 6.00 pm	V. LIVIANOS		AUTOBUSES		CAMION			CAMION REMOLQUE		GRAN TOTAL
	AUTOS	TAXIS	BUS INTERMEDIO	M EDIANO	C2P	C2G	C3-4	C5	>C6	
LUNES	3	0	0	0	2	2	0	0	0	7
MARTES	2	0	0	0	3	1	0	0	0	6
MIERCOLES	3	0	0	0	3	4	0	0	0	10
JUEVES	3	0	0	0	5	3	0	0	0	11
VIERNES	0	0	0	0	3	2	1	0	0	6
SABADO	2	0	0	0	4	1	0	0	0	7
DOMINGO	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
TOTAL DE LA SEM.	13	0	0	0	22	13	2	0	0	50
TPDS	2	0	0	0	3	2	0,3	0	0	7
	26,00%		0,00%		74,00%			0,00%		100%

Fuente: CONSORCIO AD VÍAS

- Estudio de geotecnia:

Corredor 1: Se realizaron ocho (8) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que el material de subrasante corresponde limos de bajas plasticidad algo arenosos con capacidad de soporte CBR medida en laboratorio superior al 5.0%. Por lo tanto, no se requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 3 Resumen general de ensayos CBR Corredor 1

% CBR SUMERGIDO PARA DIFERENTES TIPOS DE SUELOS - INVE-148-13										
UBICACION	TRAMO No.	SECTOR	APIQUE No.	ABSCISA	TIPO DE SUELO SUCS	TIPO DE SUELO AASHTO	DENSIDAD MAXIMA (gr/cm3)	%W OPTIMA	% CBR INVE-148-13	% PROMEDIO CBR INVE-148-13
PR9+720 - PR10+103	4	El Chorro Tramo 2	1	PR9+650	ML	A-4(3)	1.6315	19.60	11.90	12.85
PR9+605.00 - PR9+662.00		El Chorro Tramo 1	2	PR9+600	ML	A-4(4)	1.6615	19.00	13.80	
PR8+240 - PR8+350	3	Agropecuaria Pie de Chot	3	PR8+520	ML	A-4(5)	1.6730	20.80	5.80	5.95
			4	PR8+260	ML	A-4(5)	1.6700	22.00	6.10	
PR7+407.98 - PR7+607.98	2	Via para El Chorro	5	PR7+480	ML	A-5(5)	1.7430	18.40	16.50	16.65
			6	PR7+430	ML	A-5(5)	1.6880	12.40	17.20	
PR2+305 - PR2+565	1	Santa Lucia	7	PR2+430	ML	A-4(5)	1.6700	13.50	13.30	14.20
			8	PR2+150	ML	A-4(7)	1.6830	14.45	15.40	

Fuente: CONSORCIO AD VÍAS

Corredor 2: Se realizaron diez (10) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad con capacidad de soporte CBR medida en laboratorio superior al 10.0%. Por lo tanto, no se requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 4 Resumen general de ensayos CBR Corredor 2

% CBR SUMERGIDO PARA DIFERENTES TIPOS DE SUELOS - INVE-148-13										
UBICACIÓN	TRAMO No.	SECTOR	APIQUE No.	ABSCISA	TIPO DE SUELO SUCS	TIPO DE SUELO ASSTHO	DENSIDAD MAXIMA (grlcm3)	%W OPTIMA	% CBR INVE-148-13	% PROMEDIO CBR INVE-148-13
Corredor 2 - Vias Rurales, Municipio de Abrego, Norte de Santander	5	Vereda La Vega del Tigre	1	PR56+350	SM	A-5(3)	1.982	12.50	15.2	15.08
			2	PR56+260	SM	A-4(3)	1.988	12.40	14.9	
	4	Vereda Los Milagros	3	PR53+160	SM	A-1b	1.925	14.60	10.4	10.72
			4	PR53+110	SM	A-1b	1.978	14.90	11.1	
	3	Sector San Juan	5	PR0+670	ML	A-4(4)	1.730	20.10	20.0	18.84
			6	PR0+090	ML	A-4(4)	1.684	20.70	17.7	
	2	Sector San Luis	7	PR0+230	GM	A-1b	1.938	14.40	16.5	17.62
			8	PR0+050	GM	A-2-4	1.970	13.50	18.8	
	1	Sector San Vicente	9	PR0+380	GM	A-1b	2.020	10.80	26.0	24.32
			10	PR0+130	GM	A-2-4	2.159	8.80	22.7	

Fuente: CONSORCIO AD VÍAS

- Diseño de la placa huella:

El diseño es el mismo para los dos corredores. El vehículo de diseño es camión C2/C3 y no se requiere técnica de mejoramiento, la estructura propuesta corresponde al plano 126 de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 15 cm y acero de refuerzo No. 4 cada 15 cm apoyada sobre subbase granular de 0.30 m. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada.

Ilustración 4 Sección tipo placa huella Corredor 1-2 Abrego



Fuente: CONSORCIO AD VÍAS

2. OCAÑA MORRISON (1758)

El convenio incluye dos tramos de aproximadamente 700 ml.

- Estudio de tránsito:

De acuerdo a lo detectado en el corredor de los dos tramos de placa huella comprendido entre PR 14+0100 al PR 14+0292 y entre los PR 15+0400 al PR 15+0900, se concluye que el tráfico en este corredor es tráfico liviano, por lo tanto, se diseña el pavimento bajo los parámetros de la cartilla COLOMBIA RURAL con los parámetros de tráfico liviano.

Estudio de geotecnia:

Se realizaron cuatro (4) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad y capacidad de soporte CBR medida en laboratorio de 10.0%. No se requiere técnicas de mejoramiento.

Tabla 5 Resumen general de ensayos CBR


% CBR SUMNERGIDO PARA DIFERENTES TIPOS DE SUELOS - INVE-148-13									
TRAMO No.	APIQUE No.	ABSCISA	LONGITUD (m)	TIPO DE SUELO SUCS	TIPO DE SUELO ASSTHO	DENSIDAD MAXIMA (gr/cm3)	%W OPTIMA	% CBR INVE-148-13	% PROMEDIO CBR INVE-148-13
2	1	0+130	530	SM	A-2-4	1.930	13.50	10.50	12.10
	2	0+380		SM	A-1b	2.083	10.00	13.70	
1	4	0+040	192	SM	A-1b	2.192	9.20	20.40	17.55
	3	0+180		SC	A-2-4	2.178	8.30	14.70	

Fuente: Consultor

- Diseño de la placa huella:

El vehículo de diseño es liviano y no se requiere técnica de mejoramiento, la estructura propuesta corresponde al plano 125 de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 15 cm y acero de refuerzo No. 3 cada 20 cm apoyada sobre subbase granular de 0.15 m. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada.

Ilustración 5 Sección tipo placa huella

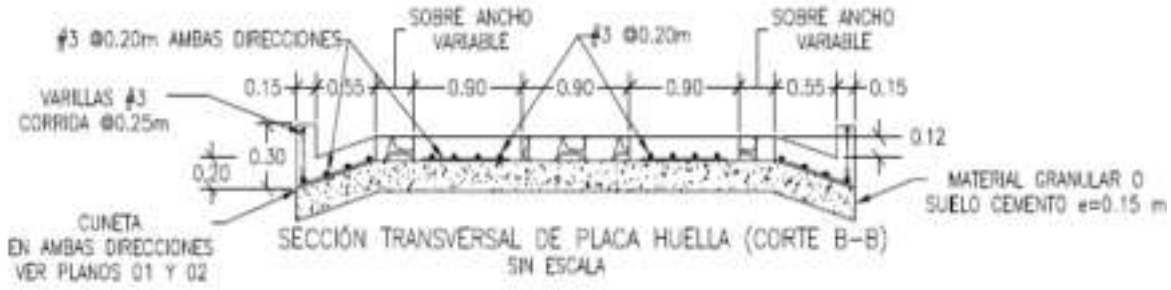

Fuente: Consultor

3. SANTIAGO

El proyecto corresponde al diseño de placa huella de 5030 metros lineales en la vía rural Cuperena – Zulia Alto, del Municipio de Santiago, departamento Norte de Santander.

- Estudio de tránsito:

Se definió el tránsito de vehículos pesados y se estipuló el vehículo de diseño en camiones C2P y C2G.

- Estudio de geotecnia:

Se realizaron diez (10) apiques donde se identificó que el material de subrasante corresponde arenas arcillosas de consistencia muy firme y buena capacidad de soporte, los CBR superar el 10% y no se requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 6 Resumen general de ensayos CBR

Apique	% CBR
1	14.5
2	10.5
3	6.5
4	12.0
5	2.0
6	11.0
7	13.0
8	5.5
9	10.5
10	6.0

Fuente: Consultor

- Diseño de la placa huella:

La metodología de diseño consistió en aplicar el Modelo de Elementos Finitos (FEM) para calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentarían debido a la aplicación de las cargas vivas y muertas.

Tabla 7 Resultado modelación placa huella Santiago

MÉTODO DE LA RESISTENCIA ÚLTIMA		
REFUERZO PRINCIPAL		
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD
F'c	21,1	Mpa
Fy	420	Mpa
b	0.9	m
h	0,15	m
Recubrimiento	0,075	m
d	0,075	m
Ø	0,9	
As sum. (6 # 4 @15 cm)	774	mm2
ρ Suministrada	0.01146	
Ø Mn	18.98	KN.m
Mmáx Producido por el Camión C3 en la placa huella de 3 metros de largo por 0.90 m de ancho[12]	18.4	KN.m
1#4 @0.15m		
CHEQUEO POR CORTANTE		
Ø Vc	47.43	KN
Vmáx Producido por el Camión C3 en la placa huella de 3 metros de largo por 0.90 m de ancho	45.48	KN

Fuente: Consultor}

La estructura propuesta, después de la modelación de elementos finitos FEM, es una placa huella de 15 cm reforzada con barras No. 4 sobre una subbase granular de 15 cm. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada.

Ilustración 6 Sección tipo placa huella



Fuente: Consultor

4. HERRÁN

UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022

El proyecto corresponde al diseño de placa huella de 1776 ml repartidos en tres tramos de la vía rural Herrán-Alto Mejue, del Municipio de Herrán, departamento Norte de Santander.

- Estudio de tránsito:

Se definió el tránsito de vehículos pesados y se estipuló el vehículo de diseño en camiones C2P y C2G.

- Estudio de geotecnia:

Se realizaron seis (6) apiques donde se identificó que el material de subrasante corresponde arcillas arenosas de baja plasticidad, consistencia firme y buena capacidad de soporte, los CBR superar en promedio el 5% y no se requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 8 Resumen general de ensayos CBR

Apique	% CBR
1	11.0
2	10.0
3	10.0
4	4.0
5	3.0
6	11.5

Fuente: Consultor

- Diseño de la placa huella:

La metodología de diseño consistió en aplicar el Modelo de Elementos Finitos (FEM) para calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentarían debido a la aplicación de las cargas vivas y muertas.

Tabla 9 Resultado modelación placa huella Herrán

MÉTODO DE LA RESISTENCIA ÚLTIMA		
REFUERZO PRINCIPAL		
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD
F'c	21,1	Mpa
Fy	420	Mpa
b	0.9	m
h	0,15	m
Recubrimiento	0,075	m
d	0,075	m
Ø	0,9	
As sum. (6 # 4 @15 cm)	774	mm2
ρ Suministrada	0.01146	
Ø Mn	18.98	KN.m
Mmáx Producido por el Camión C3 en la placa huella de 3 metros de largo por 0.90 m de ancho[12]	18.4	KN.m
1#4 @0.15m		
CHEQUEO POR CORTANTE		
Ø Vc	47.43	KN
Vmáx Producido por el Camión C3 en la placa huella de 3 metros de largo por 0.90 m de ancho	45.48	KN

Fuente: Consultor}

La estructura propuesta, después de la modelación de elementos finitos FEM, es una placa huella de 15 cm reforzada con barras No. 4 sobre una subbase granular de 15 cm. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada.

Ilustración 7 Sección tipo placa huella



Fuente: Consultor

5. LA PLAYA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace aprobación con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-630-22 del día 08 de junio de 2023, las cuales se relacionan a continuación:

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, a los Espesores de capas, la Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes, las Secciones transversales, Planos obras Hidráulicas y empalme obras Hidráulicas.

RESUMEN TÉCNICO DE LA PLACA HUELLA:

El convenio incluye dos corredores:

- ✓ Corredor 1: La Playa-San Pedro y La Playa-Llano Grande con tres tramo y longitud total de 800 m.
- ✓ Corredor 2: La Playa- Clavellino y La Playa-La Esperancita con tres tramo y longitud total de 800 m.

- Estudio de tránsito:

Se realizó el estudio de tránsito donde se identificó la circulación de camiones C2P y C2G.

Tabla 10 Estudio de tránsito La Playa

					VEHICULOS DE CARGA					
PERIODO (CONTEOS DE 8.00 am a 6.00 pm	V. LIVIANOS		AUTOBUSES		CAMION			CAMION REMOLQUE		GRAN TOTAL
	AUTOS	TAXIS	BUS INTERMEDIO	M EDIANO	C2P	C2G	C3	C2R2	C2R3	
LUNES	2	0	0	0	2	3	0	0	0	7
MARTES	1	0	0	0	1	3	0	0	0	5
MIERCOLES	0	0	0	0	2	3	0	0	0	5
JUEVES	1	0	0	0	2	2	0	0	0	5
VIERNES	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
SABADO	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4
DOMINGO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL DE LA SEM.	5	0	0	0	10	14	0	0	0	29
TPDS	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4
	17.24%		0.00%		82.76%			0.00%		100%

Fuente: CONSORCIO LA PLAYA 2022

- Estudio de geotecnia:

Se realizaron nueve (9) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que el material de subrasante corresponde gravas areno limosas de baja compresibilidad y buena capacidad de soporte, los CBR superar el 10% y no se requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 11 Resumen general de ensayos CBR

CORREDOR	TRAMO	APIQUE No.	%CBR PDC	TIPO SR
1. La Playa-San Pedro y La Playa-Llano Grande	1. La Playa-San Pedro	1	14,13	S4
		2	18,4	S4
	2. La Playa-Llano	3	27,6	S5
		4	10,6	S4
	3. La Playa-Llano Grande	5	17,9	S4
2. La Playa-Clavellino y La Playa-Esperancita	1. la Playa-Clavellinos	6	26,73	S5
	2. La Playa-Clavellinos	7	15,69	S4
		8	21,75	S5
	3. la Playa-Esperancita	9	28,9	S5

Fuente: CONSORCIO LA PLAYA 2022

- Diseño de la placa huella:

El vehículo de diseño es camión C2/C3 y no se requiere técnica de mejoramiento, la estructura propuesta corresponde al plano 126 de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 15 cm y acero de refuerzo No. 4 cada 15 cm apoyada sobre subbase granular de 0.30 m. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada.

Ilustración 8 Sección tipo placa huella



Fuente: CONSORCIO LA PLAYA 2022

6. OCAÑA - BUENAVISTA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

2. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, a los Espesores de capas, la Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes, las Secciones transversales, Planos obras Hidráulicas y empalme obras Hidráulicas.

RESUMEN TÉCNICO DE LA PLACA HUELLA:

- Estudio de tránsito:

Se realizó el estudio de tránsito donde se identificó la circulación de camiones C2P y C2G.

Tabla 12 Estudio de tránsito La Playa

AFOROS	A	COLECTIVOS		Buses	CAMIONES						Motos
		CP	CG		C2 P	C2 G	C3	C4	C5	>C5	
TPDS (24 h)	126	0	0	0	10	1	0	0	0	0	137
COMPOSICION	91.12%	0.00%	0.00%	0.00%	5.35%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Fuente: Contratista

- Estudio de geotecnia:

Se realizaron dieciséis (16) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad. Los CBR aportados por el contratista son inferiores al 3% y requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 13 Resumen general de ensayos CBR

% CBR SUMERGIDO PARA DIFERENTES TIPOS DE SUELOS - INVE-148-13									
UBICACIÓN	TRAMO No.	APIQUE No.	ABSCISA	TIPO DE SUELO SUCS	TIPO DE SUELO AASHTO	DENSIDAD MÁXIMA gr/cm3	%w ÓPTIMA	% CBR INVE-148-13	% PROMEDIO CBR INVE-148-13
Corregimiento Buenavista, Ocaña, Norte de Santander	1	1	PR1+680	SC	A-6(3)	1.94	12.20	1.6	1.8
		2	PR1+760	SC	A-2-6(1)	1.88	10.50	2.1	
	2	3	PR2+730	SC-SM	A-2-4	2.11	7.50	2.9	2.9
		4	PR2+870	SC-SM	A-2-4	2.11	8.40	2.8	
	3	5	PR4+330	SM	A-1b	2.15	8.20	41.3	40.7
		6	PR4+380	SM	A-1b	2.18	9.80	51.0	
	4	7	PR4+810	ML	A-4(5)	1.98	14.40	8.8	28.7
		8	PR4+950	SM	A-2-4	2.09	10.50	48.7	
	5	9	PR5+100	SC-SM	A-2-4	1.83	15.00	1.5	2.9
		10	PR5+200	CL	A-7-6(11)	1.73	13.40	4.2	
	6	11	PR5+500	SM	A-1b	1.87	15.50	2.7	2.6
		12	PR5+640	SC	A-6(3)	1.94	13.70	2.5	
	7	13	PR6+840	SC-SM	A-4(1)	1.97	10.50	13.5	22.3
		14	PR6+960	SM	A-2-4	2.07	11.75	31.2	
	8	15	PR7+150	SM	A-4(1)	1.88	13.80	2.9	2.8
		16	PR7+370	ML	A-4(8)	1.65	13.50	2.2	

Fuente: Contratista

- Diseño de la placa huella:

El vehículo de diseño es camión C2/C3 y requiere técnica de mejoramiento, la estructura propuesta corresponde al plano 126 de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 20 cm y acero de refuerzo No. 4 cada 20 cm apoyada sobre subbase granular de 0.30 m, además de una capa de mejoramiento de 20 cm.

Disminución del alcance y alarma por parte del INVIAS

La estructura de pavimentos de 70 cm implica una disminución en el alcance del proyecto de 275 m (1515 m a construir en contra posición de los 1790 m proyectados), situación que no solo afecta directamente a la comunidad, sino que prendió las alarmas del Instituto Nacional de Vías INVIAS y de los entes de control al existir una reducción tan drástica del alcance contractual.

Medidas de mitigación por parte de la interventoría

Ante la situación de alarma y el llamado de atención del Instituto, la interventoría tomó las siguientes medidas:

1. Inspección de campo y registro fotográfico. El día viernes 29 de septiembre de 2023, se realizó una inspección de campo por parte de la ingeniera residente donde verificó las condiciones de los tramos viales a intervenir y realizó un registro detallado con 120 fotografías georreferenciadas con su respectiva descripción. Como conclusión, se evidenció afloramiento rocoso y estabilidad general en todos los corredores. En el Anexo 1 se incluye el registro fotográfico de la actividad realizada.

2. Verificación de la capacidad de soporte CBR. La interventoría realizó ensayos de penetración dinámica con cono PDC para verificar la capacidad de soporte CBR del material rocoso de la subrasante. Los resultados arrojaron, en concordancia con el comportamiento y resistencia de la roca, una capacidad de soporte superior al 20% categorizando la subrasante como buena a excelente. En el Anexo 2 se presenta el resultado del ensayo de PDC.

3. Recorrido de campo director del proyecto y especialista en pavimentos. El día martes 03 de octubre de 2023 se realizó un recorrido de campo a cargo del director de interventoría, especialista en pavimentos e ingeniera residente donde se concluyó**:**

    - A lo largo de la vía aflora roca metamórfica correspondiente a la formación Neis de Bucaramanga.
    - La subrasante es competente (material compacto de muy buena capacidad de soporte) y realizar excavación en la roca altera directamente el confinamiento y homogeneidad del material, además que repercute en sobrecostos asociados a maquinaria especializada.
    - No existe manejo de aguas, situación que ha generado algo de erosión laminar en la superficie de la roca. Situación completamente normal dada la pendiente del terreno y el grado de meteorización al que se ve expuesta la superficie.

    En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se observa el estado g eneral del corredor vial y el afloramiento de la roca.

Ilustración 9 Estado tramo vial PR 4+965 (izq.) y PR 5+817 (der)



Fuente: Elaboración propia

Recomendación para el diseño de la placa huella

En primera medida, se aclara que la estructura de pavimento de 70 cm conformada por placa huella de 20 cm, subbase granular de 30 cm y mejoramiento de la subrasante de 20


cm es inviable desde el punto de vista técnico y económico, por lo tanto, se requiere realizar un ajuste a la estructura de pavimento.

Siguiendo las recomendaciones de la Cartilla Obras Menores de Drenajes y Estructuras Viales Programa Colombia Rural del Instituto Nacional de Vías año 2020, la estructura de placa huella se debe realizar considerando el vehículo de diseño camión C2/C3.

La información aquí presentada es tomada directamente de la Cartilla Colombia Rural, específicamente el plano 169 (página 170 del documento).

La sección presentada consta de una placa huella de 20 cm espesor apoyado sobre una capa de apoyo (afirmado, base granular o suelo cemento) de 30 cm de espesor. A continuación, se presenta el detalle extraído de la Cartilla.

Ilustración 10 Diseño placa huella vehículo C2 C3

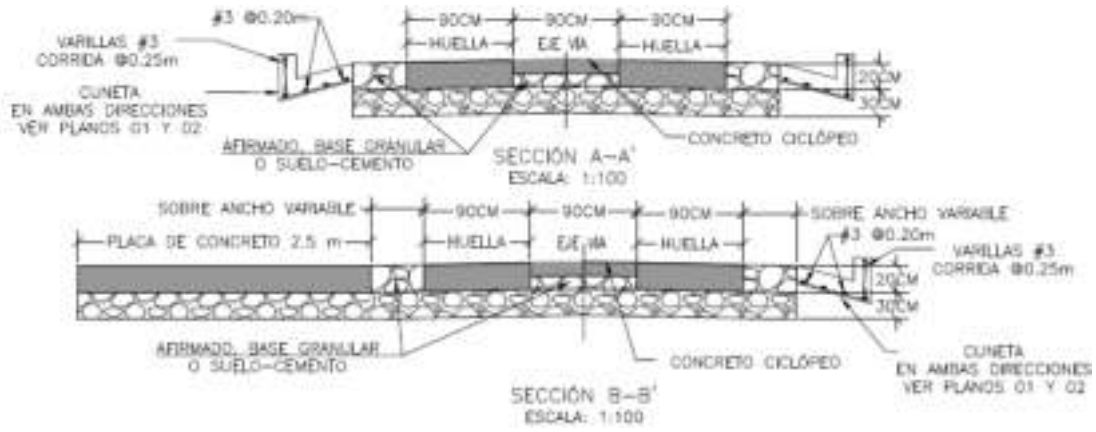

Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales

Además, el documento deja dos salvedades respecto al espesor y refuerzo de la placa huella para vehículo de diseño camión C2/C3.

- Salvedad 1: Es válido implementar placa de 15 cm de espesor siempre y cuando se incluyan barras No. 4 separadas cada 0.15 m, tal como se observa en la siguiente tabla:

Ilustración 11 Recomendación placa huella para vehículo de diseño C2 C3 con material granular

CON MATERIAL GRANULAR

LONGITUD DE LA PLACA (m)	ESPESOR DE LA PLACA	BARRA #	SEPARACIÓN ENTRE BARRAS	CONCRETO PLACAS (m3)	ACERO DE REFUERZO (KG)	CONCRETO CICLÓPEO (m3)	MATERIAL GRANULAR O SUELO CEMENTO (m3)
3	0.15	4	0.15	51	3024	13	130
	0.20	4	0.20	60	2745	13	130

Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales

- Salvedad 2: Es válido implementar la placa huella sin capa de apoyo, es decir, construida directamente sobre la subrasante, siempre y cuando se incluyan barras

No. 5 separadas cada 0.15 m para placas de 15 cm de espesor, o separadas cada 0.20 m para placas de 20 cm de espesor. Esta información se detalla en la siguiente tabla:

Ilustración 12 Recomendación placa huella para vehículo de diseño C2 C3 sin material granular

SIN MATERIAL GRANULAR

LONGITUD DE LA PLACA (m)	ESPESOR DE LA PLACA	BARRA #	SEPARACIÓN ENTRE BARRAS	CONCRETO PLACAS (m3)	ACERO DE REFUERZO (KG)	CONCRETO CICLÓPEO (m3)
3	0.15	5	0.10	51	4579	13
	0.20	5	0.20	60	3244	13

Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales

Teniendo en cuenta lo anterior, la recomendación de diseño de pavimentos es implementar una placa huella de 15 cm de espesor reforzada con barras No. 4 cada 0.15 m apoyada sobre una capa de subbase granular de 15 cm de espesor, de manera que se garantice una superficie homogénea sobre la cual se pueda construir la placa.

La implementación de este diseño no solo garantiza una estructura de pavimento estable y duradera para la circulación de camiones C3, sino que, aprovechando las bondades del material rocoso de la subrasante respecto a capacidad y estabilidad, permite aumentar de forma considerable el alcance del proyecto protegiendo y salvaguardando los recursos de la nación.

7. CACHIRA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace aprobación con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-872-22 del día 09 de agosto de 2023, las cuales se relacionan a continuación:

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, considerando la naturaleza areno limosa y la presencia de algunos bloques, no fue posible extraer muestras para ensayos CBR en laboratorio, se realizaron ensayos de PDC con valores superiores al 3%, no requiere mejoramiento.

2. Se da viabilidad la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes, las Secciones transversales, Planos obras Hidráulicas - empalme obras Hidráulicas.

3. Se da viabilidad a los Espesores de capas, aunque el diseño de Placa Huella no sigue los lineamientos de la Cartilla Colombia Rural para vehículo de diseño pesado,

el Contratista realizo la evaluación y verificación de la estructura propuesta (15 cm de Placa Huella y 15 cm de subbase granular) mediante el programa SAP.

RESUMEN TÉCNICO DE LA PLACA HUELLA:

El proyecto corresponde a 1100 ml de placa huella dividido en 5 tramos.

- Estudio de tránsito:

Se definió el tránsito de vehículos pesados y se estipuló el vehículo de diseño en camiones C2P y C2G.

- Estudio de geotecnia:

Se realizaron tres (3) apiques donde se identificó que el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad con algo de gravas, densas y buena capacidad de soporte, los CBR superar en promedio el 20% y no se requiere implementar técnicas de mejoramiento.

Tabla 14 Resumen general de ensayos CBR

Apique	% CBR
1	40.0
3	25.0
5	60.0

Fuente: Consultor

- Diseño de la placa huella:

La metodología de diseño consistió en aplicar el Modelo de Elementos Finitos (FEM) para calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentarían debido a la aplicación de las cargas vivas y muertas.

Tabla 15 Resultado modelación placa huella Herrán

MÉTODO DE LA RESISTENCIA ÚLTIMA		
REFUERZO PRINCIPAL		
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD
F'c	21,1	Mpa
Fy	420	Mpa
b	0.9	m
h	0,15	m
Recubrimiento	0,075	m
d	0,075	m
Ø	0,9	
As sum. (6 # 4 @15 cm)	774	mm2
ρ Suministrada	0.01146	
Ø Mn	18.98	KN.m
Mmáx Producido por el Camión C3 en la placa huella de 3 metros de largo por 0.90 m de ancho[12]	18.4	KN.m
1#4 @0.15m		
CHEQUEO POR CORTANTE		
Ø Vc	47.43	KN
Vmáx Producido por el Camión C3 en la placa huella de 3 metros de largo por 0.90 m de ancho	45.48	KN

Fuente: Consultor}

La estructura propuesta, después de la modelación de elementos finitos FEM, es una placa huella de 15 cm reforzada con barras No. 4 sobre una subbase granular de 15 cm. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada.

Ilustración 13 Sección tipo placa huella



Fuente: Consultor

8. CHICAGUA – GOBERNACIÓN 1943

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

4. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, el tramo 2 arrojo un CBR de 2,6%, por lo tanto, requiere la implementación de una técnica de mejoramiento de la subrasante. El Contratista propone la estabilización con cal, la propuesta se considera viable.

5. Se hacen observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, No presentó informe de Pavimentos.

6. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, Se debe especificar el vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia rural. Se solicita tener en cuenta la recomendación de la Cartilla que especifica como superficie de apoyo de la placa: material granular o suelo cemento.

7. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas, el documento recomienda implementar filtro francés, Se debe presentar los planos correspondientes para el manejo de aguas., los Diseños de Riostras y el empalme de vías existentes.

8. Se da viabilidad a la Modulación de Pavimentos y Secciones transversales.

9. HELECHAR - – GOBERNACIÓN 1943

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, la Modulación de Pavimentos.

2. Se hacen observaciones la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, no presentó informe de pavimentos.

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural. La implementación de suelo cemento como capa de apoyo es válido según la Cartilla, aun así, se debe verificar el espesor de esta capa según el tráfico del proyecto.

4. No presenta los Diseño de Riostras y Empalme con vías existentes.

5. Se hacen observaciones Secciones transversales, revisar sección K4+990. Se observa que la placa huella queda en voladizo y no se incluye ninguna obra de contención.

6. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas. El documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos correspondientes para el manejo de aguas.

10. POTREROS – GOBERNACIÓN 1943

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se hacen observaciones a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, para los dos tramos el Contratista propone una técnica de mejoramiento de la subrasante mediante estabilización con cal. Revisar la pertinencia con base en el perfil estratigráfico, los resultados de ensayo de clasificación y ensayo CBR.

2. Se hacen observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, no se presento informe de pavimentos.

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural.

4. No presenta la Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, empalme con vías existentes, las Secciones transversales.

5. No presenta los Planos obras Hidráulicas - empalme obras Hidráulicas, el documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos correspondientes para el manejo de aguas.

11. VOLCAN – GOBERNACIÓN 1943

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se hacen observaciones a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, para el tramo 1, el Contratista propone una técnica de

mejoramiento de la subrasante mediante estabilización con cal. Teniendo en cuenta que el CBR en condición sumergida es de 6,6% y el material corresponde a arenas arcillosas de baja plasticidad, da inicio de una buena capacidad de soporte incluso en condición critica de saturación, por lo tanto, implementar una técnica de estabilización con cal puede conllevar a sobre costos. Se debe revisar y ajustar.

2. Se hacen observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, no se presentó informe de pavimentos.

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural. Se solicita tener en cuenta la recomendación de la Cartilla que especifica como superficie de apoyo de la placa: material granular o suelo cemento.

4. Se da viabilidad a la Modulación de pavimentos.

5. No presenta Diseño de Riostras, empalme con vías existentes, las Secciones transversales.

6. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas, el documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos correspondientes para manejo de aguas.

12. LA RINCONADA – GOBERNACIÓN 1943

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, la Modulación de Pavimentos y las Secciones transversales.

2. Se hace observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, no se presentó informe de pavimentos.

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural.

4. No presenta Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes y los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas.

13. COROZAL – GOBERNACIÓN 1943

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se hacen observaciones a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, el material de subrasante corresponde a arcillas de baja capacidad de soporte son CBR inferior al 3,0%. El Contratista propone como técnica de mejoramiento el reemplazo de 15 cm de material granular tipo sub base e incluir un geotextil tejido de refuerzo y separación. Se solicita realizar el análisis técnico y presupuestal para realizar el mejoramiento con menos competentes como afirmado o rajón. De igual forma, evaluar el impacto económico vs beneficios técnicos al incluir el geotextil cuando se esta realizando un mejoramiento con reemplazo del material de subrasante.

2. Se hace observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, no se presentó informe de pavimentos.

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural.

4. Se da viabilidad a la modulación de pavimentos y las Secciones transversales

5. No presenta Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes.

6. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas, el documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos correspondientes para manejo de aguas.

NOTA 1: TRANSITO

- **Periodo de diseño:** Según la Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS) se establece un periodo de diseño de 10 años.
- **Vehículo de diseño:** El vehículo de diseño considerado en la Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS) es C3 y C2.

Nota: es importante tener en cuenta que estas vías veredales objeto de este estudio presentan unos volúmenes de tráfico muy bajos; por lo tanto, y debido a estos niveles se especifica una estructura de pavimento en placa huella con un nivel de cargas mínimo considerado en la cartilla de Colombia Rural.

Comentario Interventoría:

Para el periodo de diseño, incluir nota en el informe.

Respecto al tránsito y el vehículo de diseño, se solicita presentar los aforos de tránsito para establecer la cantidad y distribución de vehículos en los tramos viales.

Lo anterior es sumamente importante porque dictamina si el diseño de la placa huella acoge la estructura de vehículo liviano con placa huella de 15 cm de espesor apoyado sobre una capa de apoyo (material granular o suelo cemento) de 15 cm de espesor (página 169 de la Cartilla Colombia Rural), o por el contrario, transcurren vehículos pesados y el diseño corresponde a una placa huella de 20 cm espesor apoyado sobre una capa de apoyo: afirmado, base granular o suelo cemento de 30 cm de espesor (página 170 de la Cartilla Colombia Rural).

NOTA 2: DISEÑO DE PAVIMENTO

Selección de parámetros: En el informe se presentan los parámetros a tener en cuenta para nivel de carga de diseño en número de repeticiones para la carga estándar de 8.2 Ton, (N<150000 EE), categoría de la subrasante con base en el CBR, categoría de las condiciones de precipitación.

- **Espesor de las capas:** Se toma en cuenta los espesores recomendados en la Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS), que son losas de 15cm, capas de subbase de 15cm y capas de mejoramiento de subrasante también de 15cm. Están basadas en los resultados de los CBR obtenidos del estudio de suelos y la clasificación del suelo existente.

Aclaración suelo de subrasante vereda california

Es importante aclarar que la subrasante en esta vereda corresponde a un suelo arcilloso que presenta un potencial de cambio volumétrico medio a alto con valores bajos de CBR (entre 1.7 a 2.7) y valores de expansión que llegan hasta un 6.5%, bajo estas condiciones los criterios y recomendaciones de diseño, además de las especificaciones del Invias es realizar estabilización o mejoramiento de la subrasante; bajo las condiciones que presenta el suelo lo más conveniente es reemplazar parte del suelo arcilloso expansivo de la subrasante por un suelo de mejoramiento tipo subbase que sería de unos 30cm para posteriormente sobre este colocar la subbase de 15cm y la estructura de la placa huella de 15cm, para un total de espesor a intervenir de 60cm, lo cual resulta en una caja importante y genera mayores tiempos de construcción, por lo tanto, y atendiendo las recomendaciones que consigna el mismo Invias en sus especificaciones, se establece quitar 15cm de mejoramiento y reemplazarlos por un geotextil de tipo Tejido. Este geotextil cumple funciones de separación, impermeabilización y refuerzo. El uso de esta geotextil resulta muy beneficioso para el proyecto, ya que reduce los tiempos de construcción y costos por

que se economizan en 15cm de mejoramiento con subbase, excavación, etc. Y por otro lado este suelo arcilloso de subrasante con su capacidad de expansión puede generar presiones de expansión que pueden llegar a 30 Ton/m2; en este caso el geotextil en su función de refuerzo y su capacidad de absorber esfuerzos de tensión, es muy favorable ante esta situación; complementadas con los sistemas de drenaje propuestos.

Se recomienda mantener la estructura de pavimento expuesta en el informe, la cual presenta beneficios ampliamente expuestos, lo cual favorece la estabilidad y vida útil del proyecto. Se podría considerar, un material de peña para el mejoramiento; sin embargo, es un inconveniente encontrar una cantera de este tipo que cumpla con los requerimientos ambientales y licencias respectivas, por eso es conveniente considerar un material tipo subbase producido en algunas de las fuentes legalmente constituidas de la ciudad de Cúcuta.

Comentario Interventoría:

Respecto a la propuesta de mejoramiento, la interventoría es consciente que el material arcilloso de la subrasante tiene baja capacidad de soporte y alto potencial de cambio volumétrico, por lo tanto, está de acuerdo en la implementación de mejoramiento mediante reemplazo de material. Ahora bien, respecto a la recomendación de reemplazar 15 cm con material tipo subbase e incluir un geotextil de refuerzo, la solución es viable técnicamente y satisface las necesidades del proyecto.

Se insiste en la necesidad de aclarar el tránsito y el vehículo de diseño para establecer la estructura de placa huella que aplica: vehículo liviano o camiones C2/C3. De esta manera, definir la estructura de pavimento (placa huella, subbase granular y capa de mejoramiento) del proyecto.

NOTA 3: OTROS ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA

Los empalmes, losas de transferencia, vigas de confinamiento y demás detalles fueron presentados según los recomendados de la Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS).

Comentario Interventoría:

Respecto a los empalmes y detalles de construcción, la observación está subsanada.

NOTA 4: DISEÑO ESTRUCTURAL.

- **Características de los materiales:** Se especifica según la misma Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS), concreto para las losas de f'c 3000psi, concreto ciclópeo de f'c 2000psi y acero de refuerzo de fy=4200 Kg/cm2.
- **Proceso constructivo:** En el informe según la evaluación y resultados del estudio de suelos se establecen los procesos constructivos de mejoramiento del suelo existente de subrasante con adición de cemento y se establece el grado de compactación requerido, el

proceso constructivo para construcción de la placa huella sigue los lineamientos de la cartilla Colombia Rural del INVIAS.

- **Fuentes de Materiales:** Los materiales para la construcción será suministrados por las plantas de procesamiento de agregados de la ciudad de Cúcuta.

Nota: las respuestas presentadas corresponden a las del alcance del informe de suelos y pavimentos presentado.

Comentario Interventoría:


Complementar el informe con la información acá consignada.

En conclusión, se solicita al contratista presentar los aforos de tránsito para establecer la cantidad y distribución de vehículos en los tramos viales. De esta manera, verificar que estructura de placa huella aplica (vehículo liviano o camiones C2/C3) según los lineamientos de la Cartilla Colombia Rural.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida no cuentan con aprobación los municipios de Arboledas (Chicagua - Helechar - Potreros - Volcán - La Rinconada) y Los Patios presentan observaciones relacionadas en el informe.

Cordialmente,



DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
MP 54202-207920 NTS
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: OCAÑA, SANTIAGO, CACHIRA, HERRAN, ABREGO, LA PLAYA DE BELEN,

PERIODO: 01 al 30 de septiembre de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se realizaron las siguientes:

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su versión , dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:

TRAMITE AMBIENTAL	ACTIVIDADES GENERADORAS
Concesión de aguas superficiales	En caso de que el contratista utilice agua para sus actividades constructivas y/o campamento, tomada directamente de fuentes hídricas.
Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	En caso de que se generen más de 10kg de residuos peligrosos durante el periodo de la ejecución del proyecto, correspondiente al año vigente.
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	En caso de que la ejecución del proyecto genere la intervención de causes intermitentes mediante la construcción de estructuras hidráulicas
Permisos de vertimientos	En caso de que el proyecto genere vertimientos domésticos y/o industriales que serán descargados directamente a fuentes hídricas o al suelo
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	En caso de que el contratista instale una planta de concreto para la ejecución del proyecto, que supere las cantidades permitidas por la normatividad ambiental, y para el caso de plantas trituradoras de material.
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	En caso que la ejecución del proyecto requiera aprovechamiento de árboles aislados.
Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, RCD	**Es de obligatorio cumplimiento.** Según resolución 427 del 2017 expedida por el ministerio ambiente y desarrollo sostenible, ESTABLECE “Este procedimiento aplica generadores y gestores naturales o jurídicos que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan residuos de construcción y demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional.

- En el PAGA, se deberán indicar los tramites requeridos para la ejecución del proyecto, así como evidencias su gestión ante la autoridad ambiental respectiva.
- Se deberá presentar un cuadro comparativo de los impactos ambientales identificados y que proyectos establecidos en la guía establecen las medidas de manejo ambiental requerida para su control, mitigación o prevención.

LISTA DE CHEQUEO PAGA INVIAS			
Ítem	**Consideraciones Generales (PAGA INVIAS)**	**ACTIVIDAD O REQUERIMIENTO (Metodología de la presentación)**	**SEGUIMIENTO**
1.	**INTRODUCCION**. Presentación de las principales generalidades del proyecto		
1.1	Objetivo y Alcance PAGA INVIAS	Describir el objetivo y alcance del documento	Ok
1.2	Marco de Referencia Legal del Proyecto	Incluye los siguientes ítems	**SUBSANAR**
1.2.1	Estudio de Antecedentes	Relación de información ambiental; estudios precios, actos administrativos y todo lo relacionado que permita la valoración de los impactos ambientales a nivel biótico, abiótico.	**SUBSANADO**
1.2.2	Marco Normativo del Sector	Normatividad actual en materia ambiental. Incluir Guías Ambientales.	**SIN SUBSANAR.** Aunque se evidencia, normatividad en materia de fauna y se menciona la guía para entender y diagnosticar el impacto por atropellamiento de fauna silvestre. Se deben Incluir leyes y decretos en cuanto a permisos atmosféricos, licencia minera ambiental, **tener en cuenta la normativa contemplada en la Guía de Manejo Ambiental Subsector Vial (Segunda Edición, abril de 2011), entre otras.**
1.2.3	Seguimiento preliminar a trámites ambientales requeridos por la autoridad ambiental	Análisis preliminar de requerimientos ambientales específicos.	**SUBSANADO**
1.3	Metodología y descripción del contenido PAGA	Descripción de la metodología utilizada y contenido del documento	**SUBSANADO**
1.4	Licencia, permisos y/o autorizaciones.	Relación de los tramites y/o permisos ambientales aplicables	**SUBSANADO**
1.5	Generalidades Contractuales	Información contractual del contratista e interventor.	**SIN SUBSANAR, Aunque se evidencia en la página 32, se**

			debe incluir como anexo del PAGA la documentación contractual (Contrato de Obra y acta de inicio del proyecto). Así mismo mencionar entidad contratante. **Incluir las obligaciones establecidas en el contrato en materia ambiental**
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.** Relación del tipo de proyecto y sus características		
2.1	Localización Geográfica del proyecto	Contexto general del área de influencia. (Caracterización departamental donde se localiza el proyecto)	**SUBSANAR** **Sin subsanar. Aunque se evidencia el esquema de localización de las vías a intervenir, la imagen presentada no presenta nitidez**
2.2	Descripción de las obras a ejecutar	Identificación actividades constructivas y el alcance de las obras	**SUBSANADO**
2.3	Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales	Descripción de la demanda ambiental del proyecto: agua, materiales, combustible, energía.	**Sin subsanar. Aunque se evidencia en la página 39, se debe incluir la empresa que prestara el servicio de baños portátiles. El PAGA deberá indicar los proveedores y su información ambiental.**
3.	**AREA DE INFLUENCIA Y LINEA BASE AMBIENTAL.** Descripción especifica de las condiciones del área de influencia (Corredor vial), para los componentes bióticos, físico y socioeconómico.		
3.1	Análisis Área de influencia Medio Biótico, Abiótico y Socioeconómico	Caracterización cualitativa y cuantitativa de las condiciones bióticas y socioeconómicas existentes en el área de influencia del medio antes de la ejecución del proyecto.	**SUBSANAR** **Ok**
3.2	Descripción General del Municipio donde se localiza el proyecto	Descripción características generales entidad municipal donde se desarrolla el proyecto	**SIN SUBSANAR. Aunque se evidencia en la página 63, la descripción general del proyecto, se debe incluir, coordenadas y**

			fotografías de la vía a intervenir.
3.2.1	Limites del municipio	Limites y división político-administrativa municipal.	**SUBSANADO**
3.2.2.	Características geográficas del municipio	Determinación de las condiciones del área para determinar línea base.	**SUBSANADO**
3.2.3	Vías de comunicación	Infraestructura vial existente en el área de influencia del proyecto a desarrollar	**SUBSANADO**
3.4	Línea base o Caracterización físico, biótico.	Caracterización ambiental área de influencia por elemento ambiental acorde con la tabla 7-1, incluida en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.	**SIN SUBSANAR**. **Aunque en la página 69, se encuentra el componente suelo, no se logra evidenciar el mapa temático, aire, niveles de ruido y calidad de aire y vegetación, afectación cobertura vegetal.**
3.5	Descripción Área de Influencia Directa.	Definición, identificación y delimitación del área de influencia.	**SUBSANADO**
4.	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.** Actividades constructivas aplicables al proyecto.		
4.2	Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales.	Descripción de la demanda ambiental del proyecto: agua, materiales, combustible, energía.	**SUBSANADO**
5	**CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.** Presentar la identificación y valoración de impactos generados por el desarrollo del proyecto, con base en lo cual se identifican los programas de la GUIA que aplican		
5.1	Identificación de Aspectos Ambientales	Relación de las actividades a desarrollar y los aspectos ambientales	**Ok**
5.2	Descripción de los impactos ambientales	Identificación y evaluación de los posibles impactos generados en el proyecto	**Ok**
5.3	Parámetros de Evaluación de Impactos Ambientales.	Metodología de evaluación	**Ok**
		Parámetros de evaluación de los impactos	**Ok**
		Valor parámetros de evaluación	**Ok**
		Clasificación según el grado de importancia.	**Ok**

5.4	Evaluación de impacto ambiental SIN PROYECTO	Matriz valoración de impactos	**SIN SUBSANAR**. **En la página 78 no se evidencia la matriz de impactos sin proyecto.**
6.	**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANEJO AMBIENTAL.** Desarrollo de los Programas y Proyectos de la Guía aplicables a la obra, con su cronograma y recursos. Justificar los que no apliquen.		
6.1	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL, Elaboración de ficha del programa según anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental		**Ok**
6.1.1	Proyecto DAGA 1.1-01. Conformación del grupo de gestión ambiental		**Ok**
6.1.2	Proyecto DAGA 1.2-02. Capacitación ambiental del personal de obra.		**Ok**
6.1.3	Proyecto DAGA 1.3-03 Cumplimiento requerimientos		**Ok**
6.2	PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental		**SUBSANAR**
6.2.1	Proyecto PAC 2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción		**Ok**
6.2.2	Proyecto PAC 2.2-05 Explotación fuentes de materiales		Este proyecto no aplica.
6.2.3	Proyecto PAC 2.3-06 Señalización de frentes de obra y sitios temporales.		**SIN SUBSANAR. Aunque se incluye este proyecto dentro del documento, la señalización contemplada debe ajustarse, ya que la contemplada no se implementa en obras civiles.**
6.2.4	Proyecto PAC 2.4-07 Manejo y Disposición final de escombros y lodos		**SUBSANADO**
6.2.5	Proyecto PAC 2.5-08 Manejo y Disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales		**Ok**
6.3	PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HÍDRICO. Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental		**SUBSANADO**
6.3.1	Proyecto PGH-3.1-09. Manejo de aguas superficiales.		**Ok**
6.3.2	Proyecto PGH- 3.2-10 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales		**SUBSANADO**
6.4	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS. Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental		**SUBSANADO**
6.4.1	Proyecto PBSE 4.1-1.1 Manejo de descapote y cobertura vegetal		OK

6.4.2	Proyecto PBSE 4.2-1.2 Recuperación de áreas afectadas		No aplica para el proyecto
6.4.3	Proyecto PBSE 4.3-1.3 Protección de Fauna		**SUBSANADO**
6.4.4	Proyecto PBSE 4.4-1.4 Protección de ecosistemas sensibles		No aplica para el proyecto
6.5	PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES. Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental		**SUBSANAR**
6.5.1	Proyecto PMIT 5.1-15 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.		ok
	Proyecto PMIT 5.1-16 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración de concreto		No aplica para el proyecto
6.5.2	Proyecto PMIT 5.1 -17 Proyecto manejo maquinaria, equipos y vehículos		**SIN SUBSANAR. <u>No se logra evidenciar este proyecto dentro del documento, ya que no se evidencia</u>**
7	**PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL.** Costo para la elaboración y la ejecución del PAGA contenidos en los ítem de obra y en el presupuesto oficial del proyecto.		
8	**CRONOGRAMA DE EJECUCION.** Cronograma en coherencia con el plan de obra.		
9.	**PLAN DE CONTINGENCIA**		
9.1	**Planes de acción**		**SIN SUBSANAR. <u>Aunque se evidencia el plan de acción en la página 141, no se contempla terremotos o sismo, incendios, accidentes personales, medidas de prevención, procedimientos de notificación, sitios de implementación, responsables de la ejecución.</u>**
10	**PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL**		**SUBSANADO**
11	**FORMATO (MANUAL DE INTERVENTORIA PÚBLICA 2022)**		
11.1	GESTION AMBIENTAL		
11.1.1	**MASPS-MN1-IN-1-FR-1**	**Anexo 1.** Plano de localización del proyecto. (digital).	**SIN SUBSANAR**
		Anexo 2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por la autoridad ambientales o copia del radicado para inicio de trámite.	**SIN SUBSANAR. <u>Se debe incluir un oficio en este anexo donde se deje como observación que los actos administrativos</u>**

	Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto.		**no aplican en este proyecto.**
		Anexo 3. Registro Fotográfico Inicial	**SIN SUBSANAR**
		Anexo 4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores	Ok
		Anexo 5. Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice disposición de material de excavación. (Físico y Digital)	**SIN SUBSANAR.**
		Anexo 6. Geodatabase, Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental. (Digital)	**SIN SUBSANAR.**

2. MUNICIPIO DE LA GOBERNACIÓN 1943 – ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se realizaron las siguientes:

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su versión 1, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTE AMBIENTAL PAGA INVIAS			
Ítem	**Consideraciones Generales (PAGA INVIAS)**	**ACTIVIDAD O REQUERIMIENTO (Metodología de la presentación)**	**SEGUIMIENTO**
1.	**INTRODUCCION**. Presentación de las principales generalidades del proyecto		
1.1	Objetivo y Alcance PAGA INVIAS	Describir el objetivo y alcance del documento	**SUBSANADO**
1.2	Marco de Referencia Legal del Proyecto	Incluye los siguientes ítems	**SUBSANAR**
1.2.1	Estudio de Antecedentes	Relación de información ambiental; estudios precios, actos administrativos y todo lo relacionado que permita la valoración de los impactos	**SIN SUBSANAR**. Aplica para los proyectos que tienen antecedentes de estudios y diseños para este caso se incluye un pequeño resumen del tipo

		ambientales a nivel biótico, abiótico.	de proyecto "Colombia Rural" mencionando la resolución INVIAS N°2483 de 19 de octubre de 2020, por lo cual se adopta la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial.
1.2.2	Marco Normativo del Sector	Normatividad actual en materia ambiental. Incluir Guías Ambientales.	**SIN SUBSANAR.** Se debe incluir normatividad en cuanto a fauna incluir la guía para entender y diagnosticar el impacto por atropellamiento de fauna silvestre. Incluir leyes y decretos en cuanto a normatividad general, maquinaria y equipo permisos atmosférico, tener en cuenta la normativa contemplada en la Guía de Manejo Ambiental Subsector Vial (Segunda Edición, abril de 2011), entre otras.
1.3	Metodología y descripción del contenido PAGA	Descripción de la metodología utilizada y contenido del documento	Ok
1.4	Licencia, permisos y/o autorizaciones.	Relación de los tramites y/o permisos ambientales aplicables	**SUBSANADO.**
1.5	Generalidades Contractuales	Información contractual del contratista e interventor.	**SUBSANADO**
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.** Relación del tipo de proyecto y sus características		
2.1	Localización Geográfica del proyecto	Contexto general del área de influencia. (Caracterización departamental donde se localiza el proyecto)	**SUBSANADO** **SUBSANADO**
2.2	Descripción de las obras a ejecutar	Identificación actividades constructivas y el alcance de las obras	**Ok**
3.	**AREA DE INFLUENCIA Y LINEA BASE AMBIENTAL.** Descripción especifica de las condiciones del área de influencia (Corredor vial), para los componentes bióticos, físico y socioeconómico.		
3.1	Análisis Área de influencia Medio	Caracterización cualitativa y cuantitativa de las condiciones bióticas y socioeconómicas	**SUBSANAR** Ok

	Biótico, Abiótico y Socioeconómico	existentes en el área de influencia del medio antes de la ejecución del proyecto.	
3.2	Descripción General del Municipio donde se localiza el proyecto	Descripción características generales entidad municipal donde se desarrolla el proyecto	**SUBSANADO**
3.2.1	Limites del municipio	Limites y división político-administrativa municipal.	**SUBSANADO**
3.2.2.	Características geográficas del municipio	Determinación de las condiciones del área para determinar línea base.	**SUBSANADO**
3.2.3	Vías de comunicación	Infraestructura vial existente en el área de influencia del proyecto a desarrollar	**SUBSANADO**
3.4	Línea base o Caracterización físico, biótico.	Caracterización ambiental área de influencia por elemento ambiental acorde con la tabla 7-1, incluida en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.	**SIN SUBSANAR** Incluir en la línea base componente aire, para cada uno de los municipios que hacen parte del proyecto.
3.5	Descripción Área de Influencia Directa.	Definición, identificación y delimitación del área de influencia.	**SUBSANADO**
4	**CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.** Presentar la identificación y valoración de impactos generados por el desarrollo del proyecto, con base en lo cual se identifican los programas de la GUIA que aplican		
			SUBSANADO
4.1	Identificación de Aspectos Ambientales	Relación de las actividades a desarrollar y los aspectos ambientales	**SUBSANDO**
4.2	Descripción de los impactos ambientales	Identificación y evaluación de los posibles impactos generados en el proyecto	**SUBSANDO.**
4.3	Parámetros de Evaluación de Impactos Ambientales.	Metodología de evaluación	**SUBSANADO**
		Parámetros de evaluación de los impactos	**SUBSANADO**
		Valor parámetros de evaluación	**SUBSANADO**
		Clasificación según el grado de importancia.	**SUBSANADO**.
4.4	Evaluación de impacto ambiental SIN PROYECTO	Matriz valoración de impactos	**SUBSANADO**
4.5	Evaluación de impacto ambiental CON PROYECTO	Matriz valoración de impactos	**SUBSANADO**

5	**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANEJO AMBIENTAL.** Desarrollo de los Programas y Proyectos de la Guía aplicables a la obra, con su cronograma y recursos. Justificar los que no apliquen.	
5.1	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL, Elaboración de ficha del programa según anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental	**SUBSANADO**
5.1.1	Proyecto DAGA 1.1-01. Conformación del grupo de gestión ambiental	**SUBSANADO**
5.1.2	Proyecto DAGA 1.2-02. Capacitación ambiental del personal de obra.	**SUBSANADO**
5.1.3	Proyecto DAGA 1.3-03 Cumplimiento requerimientos	**SUBSANADO.** Eliminar la tabla 6.6 tramites legales ambientales y solo hacer énfasis en la información del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, RCD
5.2	PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental	**SUBSANADO**
5.2.1	Proyecto PAC 2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción	**SUBSANADO**
5.2.2	Proyecto PAC 2.2-05 Explotación fuentes de materiales	Este proyecto no aplica.
5.2.3	Proyecto PAC 2.3-06 Señalización de frentes de obra y sitios temporales.	**SUBSANADO**
5.2.4	Proyecto PAC 2.4-07 Manejo y Disposición final de escombros y lodos	**SUBSANADO**
5.2.5	Proyecto PAC 2.5-08 Manejo y Disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	**SUBSANADO**
5.3	PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HÍDRICO. Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental	**SUBSANAR**
5.3.1	Proyecto PGH-3.1-09. Manejo de aguas superficiales.	**SIN SUBSANAR.** Revisar la información Tabla 6-13 suministrada y adaptarla de acuerdo al tipo de proyecto que se está ejecutando.
5.3.2	Proyecto PGH- 3.2-10 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	**SIN SUBSANAR.** Debe eliminarse el indicador de los baños portátiles.
5.4	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS. Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental	**SUBSANAR**

5.4.1	Proyecto PBSE 4.1-1.1 Manejo de descapote y cobertura vegetal		**SIN SUBSANAR.** Revisar en la Tabla 6-15. Manejo de descapote y cobertura vegetal, las acciones a ejecutar deben ser acorde a la ejecución del proyecto.
5.4.2	Proyecto PBSE 4.2-1.2 Recuperación de áreas afectadas		**SUBSANADO**
5.4.3	Proyecto PBSE 4.3-1.3 Protección de Fauna		**SUBSANADO**
5.4.4	Proyecto PBSE 4.4-1.4 Protección de ecosistemas sensibles		**SUBSANADO**
5.5	PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES. Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental		**SUBSANADO**
5.5.1	Proyecto PMIT 5.1-15 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.		**SUBSANADO**
	Proyecto PMIT 5.1-16 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración de concreto		No aplica para el proyecto
5.5.2	Proyecto PMIT 5.1 -17 Proyecto manejo maquinaria, equipos y vehículos		**SUBSANADO**
6	**PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL**		**SUBSANADO**
7	**CRONOGRAMA DE EJECUCION.**		**SUBSANADO**
8	**PLAN DE CONTINGENICA**		**SUBSANADO**
9	**PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS**		**SUBSANADO**
10	**PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL**		**SIN SUBSANAR** Incluir Actividades de cierre y abandono
11	**FORMATO (MANUAL DE INTERVENTORIA PÚBLICA 2022)**		
11.1	GESTION AMBIENTAL		
11.1.1	**MASPS-MN1-IN-1-FR-1** Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto.	**Anexo 1.** Plano de localización del proyecto. (digital).	**Pendiente**
		Anexo 2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por la autoridad ambientales o copia del radicado para inicio de trámite.	**Pendiente**
		Anexo 3. Registro Fotográfico Inicial	**Pendiente.**
		Anexo 4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores	**Pendiente**

		Anexo 5. Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice disposición de material de excavación. (Físico y Digital)	**Pendiente**
		Anexo 6. Geodatabase, Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental. (Digital)	**Pendiente**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a los oficios enviados a los Contratistas CONSORCIO AD VIAS, UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO y UNION TEMPORAL COLOMBIA, en cuanto a las observaciones realizadas en el PAGA en el mes de Julio y Agosto.

Por otra parte, también se espera sean subsanadas las observaciones realizadas en agosto a los Contratista de UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 Y UNION TEMPORAL OCAÑ GBE 2022.

Es de aclarar que, para dar aprobación a los documentos correspondientes al PAGA, se deben subsanar todas las observaciones realizadas a los documentos presentados por los contratistas y se debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ABREGO

PLACA HUELLA VIAS TERCIARIAS VEREDAS LA VEGA DEL TIGRE – LOS MILAGROS-SANJUAN- SAN LUIS- SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ABREGO

Con comunicado GIC-INVIAS-NTS-460-22 Se solicitó al Contratista de Obra Consorcio AD VIAS justificar los diseños de los pavimentos calculando momentos y cortantes y sus respectivas comprobaciones con espesores, material y refuerzos, utilizando las siguientes ecuaciones:


$$\emptyset Mn = \left(\emptyset \, x \, \rho \, x \, Fy \, x \left((1 - 0.59 \, \rho \, x \left(\frac{Fy}{F'c}\right)\right)\right) x \, b \, x \, d^2$$

$$\phi V_c = \phi 0.17 \sqrt{f'_c} bd$$


Solicitando verificar que:
ΦMn > Mmax producido por el camión C3.

ΦVc > Vmax producido por el camión C3.

Adicionalmente se solicitó que se realizaran algunos arreglos en los planos presentados, donde se menciona conveniente Anexar los recubrimientos establecidos en los documentos presentados en el diseño.



El contratista subsano las observaciones realizadas con su comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023, dentro de los documentos entregados por el contratista se encuentran los siguientes:



Se recibe 1 Documento: Denominado Anexo 3 Memoria de Calculo Estructural de Pavimentos con Placa Huella en Concreto Reforzado. Con 13 Folios

Memorias de Calculo

No presenta Observaciones.


Se recibe 1 plano estructural

No presenta Observaciones.

Teniendo en cuenta que el contratista subsano todas las observaciones realizadas se da Aprobación al corredor 2 del proyecto.

GOBERNACIÓN 2052 – LOS PATIOS.

El contratista hace entrega de la siguiente documentación:

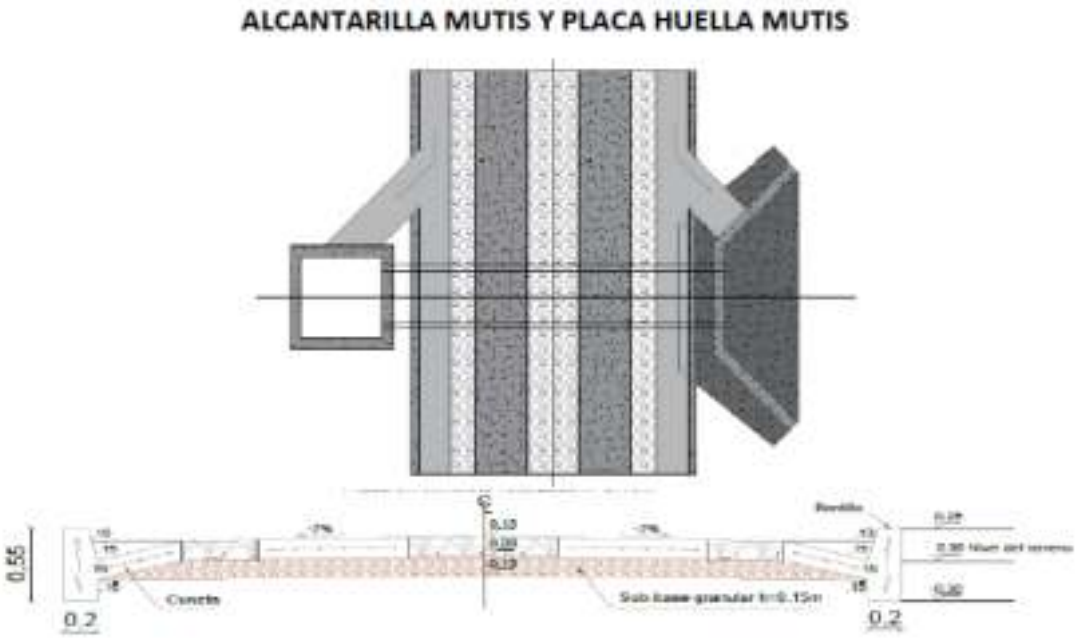

Memorias Estructurales

Se reciben 3 Documentos

- Memorias de Calculo Diseño Alcantarilla 23 Paginas
- Memorias de Calculo Diseño Placa Huella 33 Páginas.
- Estudio de Suelos 43 Páginas.

No presentan Observaciones

Planos Estructurales


- Se reciben 4 Planos Estructurales

Una vez revisada la documentación entregada la misma se encuentra acorde a la Cartilla Colombia Rural y se da aprobación a la documentación presentada.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CORRESPONDIENTE A AL CORREDOR VIAL OCAÑA -BUENAVISTA

El contratista de Obra hace entrega de los documentos estructurales, a continuación, se presenta la estructura propuesta para las Placa Huellas del proyecto:



- Se solicita explicar mediante cálculos de flexión y cortante las cuantías obtenidas para todos los elementos estructurales, en especial para las Riostras ya que están con cantidades de acero superiores a las recomendadas por las cartillas.
- En cuento a la viga riostra la Guía de diseño define que debe tener un ancho de 20 cm y una altura de 25 cm y su longitud será de 5 m.

GOBERNACIÓN 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS

El contratista entrega un documento estructural de 8 páginas, dentro de las cuales no presenta ningún tipo de cálculo estructural, ni planos.


Este documento no reemplaza las memorias ni los planos de construcción, por lo que atentamente se solicita se envié la respectiva memoria de cálculo de cada estructura con su soporte de diseño y los planos estructurales que soporten dichos diseños.

Por lo que hasta no recibir diseños estructurales de cada estructura a construir no se podrá dar aprobación a los documentos.

Las cartillas de referencia no son diseños estructurales, los diseños los debe realizar un profesional facultado al igual que los planos de construcción.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para el proyecto de Abrego se da la aprobación de los diseños presentados y para el municipio de Ocaña Buenavista y Arboledas, Gramalote y Los Patios queda pendiente se entregue por parte del contratista los ajustes solicitados.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REPORTES EJECUCUION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-23

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - HWP 247	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Oroch - JNL 995	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar 180 Neon -BAJAJ MBQ07F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO HWP 247 : Desde 24-05-2023 hasta el 23-05-2024.
TECOMECANICA: Desde 09-08-2023 hasta el 09-08-2024
SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 24-03-2023 hasta el 24-03-2024.
TECOMECANICA: Desde 04-01-2023 hasta el 04-01-2024
SOAT VEHÍCULO JNL 995 : Desde 30-11-2022 hasta el 29-11-2023.
TECOMECANICA: NO REQUIERE
SOAT MOTOCICLETA CBP 23 E : Desde 21-02-2023 hasta el 20-02-2024.
TECOMECANICA: Desde 24-02-2023 hasta el 24-02-2024
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2023 hasta el 20-03-2024.
TECOMECANICA: Desde 20-03-2023 hasta el 20-03-2024
SOAT MOTOCICLETA MBQ 07F : Desde 07-08-2023 hasta el 07-08-2024.
TECOMECANICA: Desde 13-08-2023 hasta el 13-08-2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-oct (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO), 1943-2021 (GOBERNACIÓN), 2033-2021 (GOBERNACIÓN) Y 2052-2021 (GOBERNACIÓN)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO), 1943-2021 (GOBERNACIÓN), 2033-2021 (GOBERNACIÓN) Y 2052-2021 (GOBERNACIÓN)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	931422	13-21 SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GASTO C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Contrato principal	$ 40,000,000	$ -
2023	148423	13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Contrato principal	$ 1,770,000,000	$ 551,311,915
				TOTAL		$ 1,810,000,000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,810,000,000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	sep-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40,000,000.00	$ 4,288,164,910.00		
2	oct-22	$ 15,314,720.00	$ 2,909,796.80	$ 18,224,516.80	$ -	$ 18,224,516.80	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 21,775,483.20	$ 4,269,940,393.20	135914 de 13/12/2022	
3	nov-22	$ 18,293,100.00	$ 3,475,689.00	$ 21,768,789.00	$ -	$ 21,768,789.00	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6,694.20	$ 4,248,171,604.20	138491 de 16/12/2022	
4	dic-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6,694.20	$ 4,248,171,604.20	30405 de 28/03/2023	
5	ene-23	$ 5,625.38	$ 1,068.82	$ 6,694.20	$ -	$ 6,694.20	$ -	931422 - 2022/08/22	-$ 0.00	$ 4,248,164,910.00	30405 de 28/03/2023	
5	ene-23	$ 112,508,774.62	$ 21,376,667.18	$ 133,885,441.80	$ -	$ 133,885,441.80	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1,636,114,558.20	$ 4,114,279,468.20	30405 de 28/03/2023	
6	feb-23	$ 120,947,040.00	$ 22,979,937.60	$ 143,926,977.60	$ -	$ 143,926,977.60	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1,492,187,580.60	$ 3,970,352,490.60	51262 de 24/05/2023	
7	mar-23	$ 158,329,920.00	$ 30,082,684.80	$ 188,412,604.80	$ -	$ 188,412,604.80	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1,303,774,975.80	$ 3,781,939,885.80	80426 de 22/08/2023	
8	abr-23	$ 120,928,360.00	$ 22,976,388.40	$ 143,904,748.40	$ -	$ 143,904,748.40	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1,159,870,227.40	$ 3,638,035,137.40	82649 de 05/10/2023	
9	may-23	$ 106,743,040.00	$ 20,281,177.60	$ 127,024,217.60	$ -	$ 127,024,217.60	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1,032,846,009.80	$ 3,511,010,919.80	81576 de 13/09/2023	
10	jun-23	$ 128,309,800.00	$ 24,378,862.00	$ 152,688,662.00	$ -	$ 152,688,662.00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 880,157,347.80	$ 3,358,322,257.80	82864 el 10/10/2023	
11	jul-23	$ 137,155,500.00	$ 26,059,545.00	$ 163,215,045.00	$ -	$ 163,215,045.00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 716,942,302.80	$ 3,195,107,212.80	83561 el 24/10/2023	
12	ago-23	$ 139,185,200.00	$ 26,445,188.00	$ 165,630,388.00	$ -	$ 165,630,388.00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 551,311,914.80	$ 3,029,476,824.80	83750 el 27/10/2023	
13	sep-23	$ 150,813,200.00	$ 28,654,508.00	$ 179,467,708.00	$ -	$ 179,467,708.00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 371,844,206.80	$ 2,850,009,116.80		
TOTALES		**$ 1,208,534,280.00**	**$ 229,621,513.20**	**$ 1,438,155,793.20**	**$ -**	**$ 1,438,155,793.20**	**$ -**		**$ 371,844,206.80**	**$ 2,850,009,116.80**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 1,208,534,280.00	$ 229,621,513	$ 1,438,155,793.20
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1,208,534,280.00	$ 229,621,513	$ 1,438,155,793.20

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4,288,164,910.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,288,164,910.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428,816,491.00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857,632,982.00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857,632,982.00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1,286,449,473.00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428,816,491.00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857,632,982.00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857,632,982.00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1,286,449,473.00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

PRORROGA No.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																														% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
																																						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18,491,977	DIRECTOR	$ 6,500,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 6,500,000	$ 452,400	V	SANITAS	9457345691	$ 780,000	PORVENIR	9454645510	$ 1,040,000	$ 130,000			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA	37,335,038	RESIDENTE	$ 5,500,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	SANITAS	9457345691	$ 220,000	COLFONDOS	9457345691	$ 935,000	$ 220,000			
3	ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA	37,270,723	RESIDENTE	$ 5,500,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	SANITAS	9457345691	$ 220,000	COLPENSIONES	9457345691	$ 935,000	$ 220,000			
4	JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ	1,090,395,213	RESIDENTE	$ 5,500,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	SANITAS	9457345691	$ 660,000	COLPENSIONES	9457345691	$ 880,000	$ 110,000			
5	GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ	1,090,177,481	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3,000,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3,000,000	$ 208,800	V	COMPENSAR	9457345691	$ 360,000	COLPENSIONES	9457345691	$ 480,000	$ 60,000			
6	KATHERINE NAVARRO CARRASCAL	1,091,666,432	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3,500,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9457345691	$ 140,000	PORVENIR	9457345691	$ 560,000	$ 140,000			
7	ANUAR JESITH CABARCAS CARRASCAL	1,019,076,882	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1,633,334	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		50%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1,633,334	$ 113,680	V	NUEVA EPS	9457345691	$ 140,000	COLFONDOS	9457345691	$ 560,000	$ 140,000			
8	RUBIELA MOLINA CORTES	60,421,399	INSPECTOR SST	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	NUEVA EPS	9457345691	$ 80,000	PORVENIR	9457345691	$ 320,000	$ 80,000			
9	FANNY AMAYA GÓMEZ	60,398,879	SECRETARIA	$ 1,150,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1,150,000	$ 80,040	I	SANITAS	9457345691	$ 46,000	PORVENIR	9457345691	$ 184,000	$ 46,400			
10	LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN GONZALEZ	88,241,378	INSPECTOR	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SANITAS	9457345691	$ 80,000	PORVENIR	9457345691	$ 320,000	$ 80,000			
11	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88,210,062	INSPECTOR	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SANITAS	9457345691	$ 240,000	PORVENIR	9457345691	$ 320,000	$ 40,000			
12	NICOLAS MAZO RODRIGUEZ	1,090,529,410	INSPECTOR	$ 2,000,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SANITAS	9457345691	$ 240,000	PORVENIR	9457345691	$ 320,000	$ 40,000			
13	WILMER SALAZAR GARCÍA	88,248,488	CONDUCTOR	$ 1,160,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1,160,000	$ 80,736	V	SALUD TOTAL	9457345691	$ 46,400	COLFONDOS	9457345691	$ 185,600	$ 46,400			
14	WILLIAM LUNA MELO	1,091,656,642	CONDUCTOR	$ 1,160,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1,160,000	$ 80,736	V	NUEVA EPS	9457345691	$ 46,400	COLPENSIONES	9457345691	$ 185,600	$ 46,400			
15	JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ	88,243,936	CONDUCTOR	$ 1,160,000	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1,160,000	$ 80,736	V	NUEVA EPS	9457345691	$ 46,400	COLPENSIONES	9457345691	$ 185,600	$ 46,400			
16	DIANA ROCIÓ SUAREZ RINCÓN	51,989,792	PROFESIONAL CALIDAD	$ 3,325,000		X			X	X	X		X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X		95%	DIANA ROCIÓ SUAREZ RINCÓN	$ 3,325,000	$ 231,420	V	SANITAS	1057966381	$ 399,000	PORVENIR	1057966381	$ 532,000				
17	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	1,031,120,730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 360,000		X			X	X		X	X				X		X	X				X			X				X	X	X	X		6%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 360,000	$ 25,056	V	SANITAS	9457345691	$ 43,200	PORVENIR	9457345691	$ 57,600	$ 7,200			

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------ APROBADO: SI ------ NO x VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ------ APROBADO: SI ------ NO x FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **5** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 4

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ **x** NO ------

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **0**
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**100%**	**Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100**
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Angeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresion	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manometro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automatico	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatico	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automatico	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERIA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: TRAMO 1 SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO EN HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS Y BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA-ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE DE PLACA HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: TRAMO UNO, SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE EN PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESCARGUE DE MATERIAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO Y COLOCACION DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO Y COLOCACION DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 3000 PSI EN CURVA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: HUELLA FUNDIDA Y MARCACION DE DILATACIONES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA-ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE DE HUELLAS FUNDIDAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: TRAMO UNO, SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE EN PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS COCRETO 3000 PSI

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA POSTERIORMENTE VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FORMALETA PARA POSTERIOR VACIADO DE CONCRETO EN CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VERIFICACION ACERO DE REFUERZO PARA B0RDILLOS Y CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA POSTERIORMENTE INICAR CON EL VACIADO DEL CONCRETO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA-ZUL ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN HUELLAS PARA LUEGO INCIAR CON EL VACIADO DEL CONCRETO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI EN HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI EN HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI EN HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y VIGAS RIOSTRAS PARA INCIAR VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE DE HUELLAS Y PIEDRA PEGADA CENTRO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE DE PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA-ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO EN CUNETAS Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS Y BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA INSTALACION DE VIGAS RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI EN HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL- ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI EN HUELLAS

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS, HUELLAS Y RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS, RIOSTRAS Y HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS, RIOSTRAS Y HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS, RIOSTRAS Y HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO Y EXCAVACION DE RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS, RIOSTRAS Y CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA HUELLAS, RIOSTRAS Y CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO Y EXCAVACION DE RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO Y EXCAVACION DE RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA, CUNETAS Y RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA, CUNETAS Y RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRASLADO MANUAL DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSERCION DE TUBOS DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSERCIÓN DE LA TUBERIA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSERCIÓN DE TUBERIA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA, CUNETAS Y VIGAS DE SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA, CUNETAS Y VIGAS DE SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACION DE LA TUBERIA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACION DE LA TUBERIA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE LA CAJA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION MANUAL Y REPLANTEO DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION MANUAL Y REPLANTEO DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA DE SOBREANCHO, CUNETAS Y VIGAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA DE SOBREANCHO, CUNETAS Y VIGAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO CICLOPEO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE LA CAJA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE LA CAJA DE LA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE DISIPADOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE DISIPADOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CAJA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CAJA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESENCOFRADO CAJA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO MURO ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO MURO ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE MURO DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION Y REPLANTEO DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO DISIPADORES

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO DISIPADORES

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO DISIPADOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE DISIPADORES ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE DISIPADORES ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE DISIPADOR

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION Y REPLANTEO DEL TERRENO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO MUROS DISIPADORES DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA MUROS DISIPADORES DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE RIOSTRAS E INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE RIOSTRAS E INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA PLACA, CUNETAS Y RIOSTRAS DE SOBRE ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA PLACA, CUNETAS Y RIOSTRAS DE SOBRE ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO E INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO E INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA, CUNETAS Y VIGAS RIOSTRAS DE SOBRE ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 CHORRO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA, CUNETAS Y VIGAS RIOSTRAS DE SOBRE ANCHO

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA, TRAMO 4A
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA TRAM0 4A
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CONCRETO DE 3000 PSI

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO, TRAMO 4A
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TERMINANDO EL PAÑO COMPLETO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO, TRAMO 4b
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA, TRAMO 4A
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PAÑO COMPLETO PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA TRAM0 4A
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA PAÑO COMPLETO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO, TRAMO 4A
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA PAÑO COMPLETO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO, TRAMO 4b
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA LOSA DE TRANSCICION.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA LOSA DE TRANSCISION

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CURVA FUNDIDA CONCRETO DE 3000 PSI.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA HUELLA EN CURVA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA, TRAMO 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA TRAM0 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FORMALETA PARA POSTERIOR INSTALACION DEL ACERO LONGITUDINAL Y TRASNVERSAL DE LAS HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA, TRAMO 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO, TRAMO 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: HUELLAS FUNDIDAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA CON EL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO, ALCALDE, SECRETARIO DE PLANEACION, CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA FUNDIDA PAÑO COMPLETO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA LAS VIGAS RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA LAS VIGAS RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA TRAMO 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO LOGITUDINAL Y TRANSVERSAL HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA, TRAMO 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA Y FUNDIDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA BAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA Y BORDILLOS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VERIFICACION MEDIDA DE BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Conformación de la calzada existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Actividades de perfilado de cunetas y conformación de la calzada existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante corredor vial.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Fin de obra – Terminación corredor vial a intervenir.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de alcantarillas existentes, colmatadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista interior de tubería.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 31 DE AGOSTO 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acopio de materiales por parte del contratista de obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Conformación de la calzada existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Los Patios, Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de anchos - actividades conformación de la calzada existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Chequeos Mejoramiento de la subrasante corredor vial.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Chequeo de topografoia

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Arboledas, Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación topografía interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Arboledas, Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación topografía interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Arboledas, Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación topografía interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Arboledas, Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación topografía Interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Arboledas, Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación topografía Interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Arboledas, Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación topografía Interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Arboledas, La Rinconada
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Arboledas, La Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Arboledas, La Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Dosificación de la mezcla

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa - ciclopeo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa – Ciclópeo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado placa huella tramo 2-2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado concreto de 14 Mpa – ciclópeo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabados placa huella tramo 2-2 Rinconada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de anchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación ancho de bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Muestras en concreto para ensayo de resistencia.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Perfilado talud para adecuación de anchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general trabajos de perfilación talud.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de acero de refuerzo longitudinal y vertical.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación acabados concreto y cuantificación de cantidades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo de 3/8´ viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación separación acero de refuerzo bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general borde izquierdo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de Densidades Subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Amarre de acero de refuerzo longitudinal y vertical de Placa Huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Diligenciamiento acta de reunión seguimiento y control de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella ejecutada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada Tramo Placa Huella 2-1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella ejecutada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general Mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos de via.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos de vías.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Reunión en campo director de Obra, director de Interventoría, revisión actividades en campo.

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+ 013
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACION DE ALCANTARILLA AREA SEÑALIZADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)




UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+ 013
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ALCANTARILLA INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO (2023-09-01)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



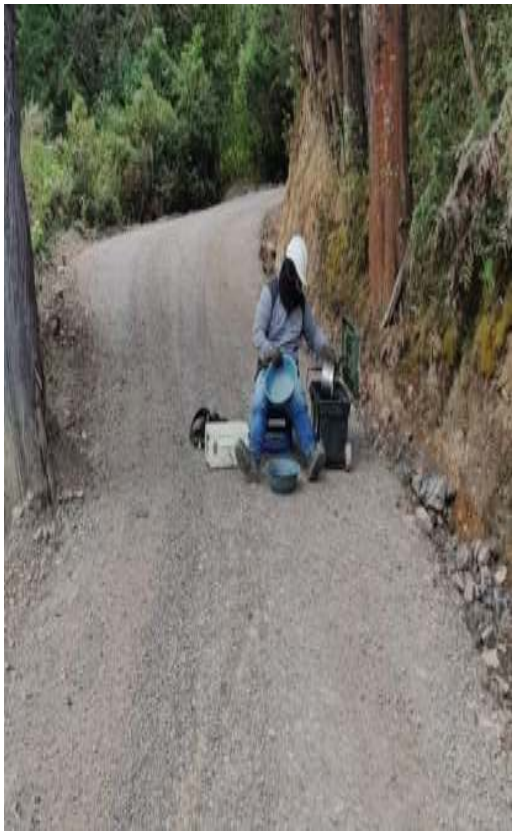

UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 1ª Y 2ª TOMA DE ENSAYO DENSIDAD EN CAMPO (2023-09-02)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)





UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 3ª Y 4ª TOMA DE ENSAYO DENSIDAD EN CAMPO (2023-09-01)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 086 A PR 3+ 100
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PREPARACION ZONA MARGEN DERECHA HUELLA EN CURVA (2023-09-01)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 000 A PR 3+ 011
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA FUNDIDA CON CONCRETO DE 3000 PSI, FALTA DILATACIONES Y LABRADO TEXTURIZADO (2023-09-02).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 134 AL PR 3+ 153 EMPALME.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA EJE Y MARGEN IZQUIERDA, DERECHA. CON PLACA HUELLA EXISTENTE (2023-09-04 5:10:06 p.m.)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 153 FIN A PR 3+ 034
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MAESTRO COLOCANDO REFUERZO DE BORDILLO MARGEN IZQUIERDA (2023-09-06 8:34:16 a.m.)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE CILINDROS CONCRETO DE 3000 PSI CUNETA Y BORDILLO (2023-09-07 1:46:19 p.m).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MAQUINA BAJANDO TUBERIA. TRABAJADOR COMPACTANDO PISO CIMENTACION MEJORADO PARA POYAR TUBERIA EN ALCANTARILLA. (2023-09-07 3:49:53 p.m).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+983
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACION DE LA 4ª ALCANTARILLA. Y ULTIMA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+ 983
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ALCANTARILLA EXCAVACION DE NUCLEO, SE DEJA BLOQUEADA VIA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISION COLOCACION DE REFUERZO Y MODULADO FORMALETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR EL MOLINOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO EN EJE PR3+000 A PR3+ 050.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 000
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PREPARACION Y VERFICACION DE DOSIFICACION CONCRETO CICLOPEO 1 BULTO CEMENTO, 10 VALDES ARENA, 15 VALDES DE TRITURADO (1:3:5).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 000
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:INSPECTOR HACIENDO TOMA DE CILINDROS CONCRETO CICLOPEO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 050 AL PR 3+ 062
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA FALTANTE, SE OBSERVAN NUMERO VARILLAS Y PARRILLA LEVANTADA. MARGEN IZQUIERDA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS PR 3+ 084
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA EJE CENTRAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR MOLINOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PREPARANDO ZONA PIEDRA PEGADA 0,45 LATERAL MARGEN DERECHA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR EL MOLINOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISION Y VERIFICACION DE VARILLAS Y ANCHOS DEL ELEMENTO CUNETA Y BORDILLO MARGEN DERECHA PR3+050 A PR3+084

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL CAMPAMENTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FIGURACION Y ARMADO DE CANASTAS VIGAS, GANCHOS A 135º

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ALCANTARILLA EXCAVACION DE ENCOLE POCETA, FUNDIDA SOLADO PR 7+013

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 6+925 AL PR 6+970
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PERSONAL EN EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+ 013
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ARMADO DE REFUERZO DE POCETA ENCOLE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 6+ 970
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PREPARACION Y REPLANTEO DE INSTALACION DE CANASTA VIGA RIOSTRA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 6+ 925
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MODULACION Y PREPARACION DE ZONA HUELLA, SEGUNDA IMAGEN MAESTRO COLOCANDO SEPARACION DE PARRILLA DEL SUELO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL ALCANTARILLA PR 7+ 013
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PISO POCETA ESPESOR 20 cm.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONTINUACION DE FUNDIDA DE HUELLA MARGEN DERECHA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)





UBICACIÓN: SECTOR RAMAL PR 6+925 A PR 6+ 950
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: HUELLA MARGEN IZQUIERDA CON EL TEXTURIZADO Y LABRADO, Y EMPAREJANDO CON EL MARGEN DERECHO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISION Y VERIFICACION MEZCLA CONCRETO TOMA DE CILINDROS. Y PERSONAL ENCOFRANDO PARTE INTERNA DE POCETA. ALCANTARILLA PR 7+013

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7 + 035 A PR 7 + 970
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RECOMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR PARA DAR PISTA A MODULACION Y EXACAVACION DE VIGAS Y LOSAS HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 6 + 925 AL PR 7 + 084
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PREPARANDO ZONA Y ALISTANDO PIEDRA PARA DAR INICIO A FUNDIDA EN EJE 90cm ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 6+970 Y CAMPAMENTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PERSONAL LLEVANDO TABLERO MADERA PARA FORMALETEAR CABEZAL DESCOLE, Y TRANSPORTE INTERNO, DESCARGUE DE MATERIAL DE PESO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR PARA AFIRMAR SUPERFICIE

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CANASTAS VIGAS RIOSTRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+ 100
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MODULACION Y PREPARACION DE ZONA HUELLA, COLOCANDO SEPARACION DE PARRILLA CON LAS MEDIDAS 15cm VARILLA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL PR 7+ 100
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: AMARRE DE VARILLAS HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR RAMAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONTINUACION DEINSTALACION Y AMARRE REFUERZO LONGITUDINAL, PRESENCIA DE LLUVIAS. EN EL SECTOR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR RAMAL PR 7 + 453
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ARMADODE CANASTA POCETA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HERRAN NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**146 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR EL RAMAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISION Y VERIFICACION DE ESPESOR PROFUNDIDA DE RIOSTRA, Y SEPARACION DE PARRILLA DEL SUELO

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 ESPERANCITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION ANCHO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE SOLADO ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA 36”

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA DE 36”

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA DE 36”

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SEÑALES

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE CAJA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN HUELLA, CUNETA Y VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA SOBRE ANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE ALETAS Y LOSA DE PISO ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE ALETAS Y LOSA DE PISO ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE CAJA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PISO DE CAJA ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE LOSA DE PISO ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE CAJA DE ALCANTARILA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE ALETAS Y CABEZAL ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CAJA ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE VIGA RIOSTRA, HUELLA Y CUNETA

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACONDICIONAMIENTO DE VIA ALTERNA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACONDICIONAMIENTO DE VIA ALTERNA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA CASA CURAL
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CARGUE DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SEÑALIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SEÑALIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION ANCHO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CARGUE DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE SOBREANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CARGUE DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISITA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CARGUE DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0110
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0460
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA CONFORMACION DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0490
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CHEQUEO Y RENIVELACION DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CHEQUEO DE ALINEAMIENTO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0360
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TERRAPLEN

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0370
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE TERRAPLEN

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0216
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE CBR TRAMO 5

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0385
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TERRAPLEN SEGUNDA CAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0460
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE TERRAPLEN SEGUNDA CAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0530
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0580
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION PARA ESTRUCTURA DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0465
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION PARA ESTRUCTURA DE VIA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION SUBRASANTE

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0320
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION PARA ESTRUCTURA DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0330
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TERRAPLEN PRIMERA CAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0340
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TERRAPLEN PRIMERA CAPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0350
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TERRAPLEN PRIMERA CAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CARGUE DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0590
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA CONFORMACION DE VIA

FOTOGRAFÍA (20)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0530
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA CONFORMACION DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0430
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TERRAPLEN EN ESPESOR DE CAPAS DE 0.10M

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0460
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE TERRAPLEN

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0470
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0550
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CARGUE DE MATERIAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0589
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0590
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CAJEO DE VIA EN TRAMO FINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0385
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE VIA Y CARGUE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0350
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACION

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0530
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO Y NIVELACION CON LA COMISION TOPOGRAFICA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CHEQUEO Y RENIVELACION DE TRAMO CON COMISION TOPOGRAFICA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0475
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES EN TERRAPLEN

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0380
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES PARA TERRAPLEN.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0570
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUBRASANTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0580
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0520
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE EN CAPA DE 0,10M

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0480
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE EN CAPA DE 0,10M

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0470
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0390
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

FOTOGRAFÍA (20)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0380
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE EN CAPA DE 0,10 M

FOTOGRAFÍA (21)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+590
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

FOTOGRAFÍA (22)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+530
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE EN

FOTOGRAFÍA (23)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+336
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE EN CAPA DE 0,10M

FOTOGRAFÍA (24)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0350
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE ACERO #4 Y #3

FOTOGRAFÍA (25)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+310
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE VIA DE EXCAVACION DE 0,70M

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GIC-INVIAS-NTS-978-22	1-sep-23	REMISION INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022 PERIODO 18/08/2023 - 24/08/2023	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	VFSO	LAFC	**2023E-VUVRAZ-004855**
GIC-INVIAS-NTS-979-22	4-sep-23	OBSERVACIONES GENERADAS EN VISIDA DE OBRA SANTIAGO	3	Señores: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 CONTRATO DE OBRA No LP-OP-01-2022 Santiago – Norte de Santander	SANTIAGO	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-980-22	4-sep-23	OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE OBRA PAMPLONITA	2	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA CONTRATO DE OBRA No. 202 del 2022 Pamplonita – Norte de Santander	PAMPLONITA	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-981-22	1-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-126-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO No 252-2022" – APROBACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA.	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	MISM	LAFC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-982-22	1-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-088 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE INFORME DE INSTALACIONES PROVICIONALES GOBERNACION 1943"	1	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590	GOBERNACION 1943	MISM	LAFC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-983-22	4-sep-23	RESPUESTA A ENVIO DE LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL SG-SST GOBERNACION 2052	9	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS CONTRATO DE OBRA No. LP- SV 02332-2022	GOBERNACION 2052	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-984-22	4-sep-23	OBSERVACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADPTACION AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL LA PLAYA	9	Señores: CONSORCIO LA PLAYA 2022 DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante legal La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	KNC	JAQC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-985-22	1-sep-23	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PAGA EN LA EJECUCION DE OBRA HERRAN	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Luis Eduardo Blanco Director de obra	HERRAN	KNC	LAFC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-986-22	1-sep-23	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PAGA EN LA EJECUCION DE OBRA PAMPLONITA	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022	PAMPLONITA	KNC	LAFC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-987-22	1-sep-23	Solicitud ingreso a laborar Director de Interventoría	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	LAFC	2023E-VUVRAZ-004972 - 2023-09-01
GIC-INVIAS-NTS-989-22	1-sep-23	RESPUESTA A ENVIO DE LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL SG-SST - PAMPLONITA	8	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA CONTRATO DE OBRA No. 202 del 2022	PAMPLONITA	RMC	LAFC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-990-22	1-sep-23	APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO A LA PRORROGA 1 DEL CONTRATO DE OBRA	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	MISM	LAFC	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-991-22	2-sep-23	SOLICITUD ENTREGA DE MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-992-22	4-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO DE ASUNTO "ENTREGA DE INFORMACION PRECONTRACTUAL - COLOMBIA RURAL 2033 E INFORMACION INCIIO CONTRATO CONVENIO DERIVADO - GOBERNACION 2033	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS SECRETARIO DE VIAS GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-993-22	4-sep-23	ALCANCE AL OFICIO OFC-CLP-ALP-057-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 REMITIDO POR EL CONTRATISTA CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO"	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	LA PLAYA	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-994-22	4-sep-23	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PRESENCIA O NO DE GRUPOS ÉTNICOS O AFRODESCENDIENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD.	1	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	AJCC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-995-22	4-sep-23	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.	1	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	AJCC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-996-22	4-sep-23	SOLICITUD INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES; CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA).	2	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	KNC-AJCC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-997-22	4-sep-23	SOLICITUD ENTREGA DE MEMORIAS TECNICAS INICIALES Y PUNTOS DE INTERVENCION PARA LOS ITEM DE CONFORMACION DE LA CALZADA Y MEJORAMIENTO DE LA SUUBRASANTE.	3	Secretario de Vías GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-998-22	4-sep-23	Remisión Hoja de Vida Ingeniero Auxiliar de Interventoría – Ing. Diego Camargo.	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	2023E-VUVRAZ-005627 - 2023-09-04
GIC-INVIAS-NTS-999-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ADUNTO ES "PROGRAMACIÓN AJUSTADA OTROSI 2" – OBSERVACIONES.	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1000-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-047-2022 DE FECHA 23-08-2023 CUYO ASUNTO "PROGRAMACIÓN Y FLLUJO DE CAJA" – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES PROJECT – APROBACIÓN FLUJO DE CAJA	1	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA 1814	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1001-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO PHS2022 – 076 – 2022 DE FECHA 28-08-2023 cuyo asunto es: "JUSTIFICACIÓN DE LA NO INSTALACIÓN DE SUBBASE EN ALGUNOS TRAMOS"	5	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	MISM	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1002-22	5-sep-23	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1003-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-077 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1004-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-052-2022 DE FECHA 30-08-2023 CUYO ASUNTO ES "SUBSANACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIASNTS-945-22."– APROBACION CON OBSERVACIONES OCAÑA 1814	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE Contratista	OCAÑA 1814	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1005-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-082 CUYOASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMIENTO DE LA VEREDA POTRETOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1006-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-079 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTENCIA DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA EL HELECHAR MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1007-22	5-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-078 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTENCIA DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCAN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1008-22	6-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-096 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA COROZAL - CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1009-22	6-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-097 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA BOYACA DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1010-22	9-sep-23	OBSERVACIONES PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL) - ABREGO	9	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista	ABREGO	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1012-22	6-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO MATICCES -CACHI-060-2022 de FECHA 12 DE AGOSTO 2023 – BALANCE CACHIRA – OBSERVACIONES	1	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1013-22	6-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO PHS2022-028-2022 DE FECHA 8-AGOSTO-2023	1	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1014-22	6-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO PHE2022-052-2022 DE FECHA 02-AGOSTO-2023 OBSERVACIONES BALANCE	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1015-22	6-sep-23	INFORME EJECUTIVO TRAZABILIDAD MUNICIPIO DE CAC HIRA	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	2023E-VUVRAZ-006250
GIC-INVIAS-NTS-1016-22	6-sep-23	RESPUESTA A OFICIO 300-0467 CUYO ASUNTO ES "CERTIFICACIÓN - PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022" - CONCPETO APROBATORIO.	1	SECRETARIA DE OBRAS	LA PLAYA	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1017-22	6-sep-23	SOLICITUD INGRESO A LABORAR INSPECTORES DE CACHIRA Y PAMPLONITA	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1018-22	5-sep-23	Alcance al Acta de costos he Informe mensual No. 10 de Interventoría correspondientes al periodo de JUNIO de 2023, atendiendo observaciones realizadas por la Territorial Nte de Santander.	2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1019-22	7-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO UTET-02590-049 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA OBSERVACIONES DE DISEÑO GEOMETRICO DE VIA DE LA VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" – OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1020-22	8-sep-23	OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL) - OCAÑA 1814	7	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista	OCAÑA 1814	KNC	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1021-22	7-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO UTET-02590-092 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-942-22 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES REALIZADAS A TOPOGRAFIA DE LA VEREDA CHICAGUA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" – APROBACION GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1022-22	7-sep-23	SOLICITUD VERSION FINAL DOCUMENTO PAGA - OCAÑA 1758	1	Señor LUIS JAVIER CARRASCAL Director de Obra CONSORCIO OK 2022 Contratista	OCAÑA 1758	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1023-22	8-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO "SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DE OBRA" CONTRATO 160 DE 2022 - CACHIRA	1	Doctor JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO Alcalde municipal	CACHIRA	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1024-22	8-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-093 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-941-22 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES REALIZADAS A TOPOGRAFIA DE LA VEREDA RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - APROBADO GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1025-22	8-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 UTET-02590-094 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-927-22 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES REALIZADAS A TOPOGRAFIA DE LA VEREDA PROTEROS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - APROBADO GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1026-22	8-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO UTET-02590-098 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA TOPOGRAFIA DE LA VEREDA EL HELECHAR DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" – OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1027-22	8-sep-23	RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS Y SOLICITUD DE ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA. - GOBERNACION 1943	6	Ingeniero ALIRO GIOVANNY Representante Legal CARDENAS RICO UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1028-22	8-sep-23	REMISIÓN INFORME TECNICO VISITA DE OBRA – PAMPLONITA	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA CONTRATO DE OBRA No. 202 del 2022 Pamplonita – Norte de Santander	PAMPLONITA	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1029-22	8-sep-23	REMISIÓN INFORME TECNICO VISITA DE OBRA – SANTIAGO	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Contratista	SANTIAGO	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1030-22	11-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO PHM2022 – 035 – 2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES " ENTREGA INFORME DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS – parte 1" - APROBADO CON OBSERVACIONES	9	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS	GOBERNACION 2052	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1031-22	11-sep-23	RESPUESTA OFICIO 2023S-VNSA-002851, RECIBIDO EL 07 SEPTIEMBRE DE 2023, CON ASUNTO REITERACIÓN ACCIONES CONTRATO DE OBRA No. 02590 DEL 2022 - INVIAS	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1032-22	11-sep-23	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS (PROGRAMAS) SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. SANTIAGO	3	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022	SANTIAGO	AJCC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1033-22	11-sep-23	REITERACIÓN OFICIO GIC-INVIAS-NTS-884-22; SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA.	2	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista	CACHIRA	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1034-22	11-sep-23	RESPUESTA OFICIO No. 2023-08400-021106-1; SOLICITUD DE ACLARACIÓN ITEM COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS – GOBERNACION CONVENIO 2033 DE 2021	4	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1035-22	11-sep-23	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS (PROGRAMAS) SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. HERRAN	2	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista	HERRAN	AJCC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1036-22	11-sep-23	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS (PROGRAMAS) SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. PAMPLONITA	2	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista	PAMPLONITA	AJCC	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1037-22	11-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO UTET-02590-087 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "SEGUNDA RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-802-22 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023 CON OBSERVACION REALIZADAS AL DISEÑO DEL GEOMETRICO DE VIA VEREDA COROZAL - CALIFORNIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS" – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES TRAMO 1 AL 12 Y OBSERVACIONES TRAMO 6. GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1038-22	13-sep-23	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES -SANTIAGO	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022. Jhon Freddy Quintero León Representante legal	SANTIAGO	KNC	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1039-22	13-sep-23	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES - HERRAN	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Luis Eduardo Blanco Director de obra Herrán – Norte de Santander	HERRAN	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1040-22	15-sep-23	OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES AMBIENTALES. SANTIAGO	2	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022. Jhon Freddy Quintero León Representante legal CONTRATO DE OBRA No. 2220577	SANTIAGO	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1041-22	15-sep-23	OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES AMBIENTALES HERRAN	2	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Luis Eduardo Blanco Director de obra	HERRAN	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1042-22	15-sep-23	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES - PAMPLONITA	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022	PAMPLONITA	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1043-22	15-sep-23	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL MES DE AGOSTO DE 2023 . PAMPLONITA	2	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022	PAMPLONITA	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1044-22	14-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-081 DE FECHA 22 DEAGOSTO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA CHICAGUA BAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" – OBSERVACIONES	1	Señores: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante lega UNION TEMPORAL EDIVIAL	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1045-22	15-sep-23	OBSERVACIONES LISTA DE CHEQUEO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL AMBIENTAL OCAÑA 1758	2	Señor LUIS JAVIER CARRASCAL Director de Obra CONSORCIO OK 2022 Contratista	OCAÑA 1758	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1046-22	13-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-058-2022 DE FECHA 08-09-2023 CUYO ASUNTO ES "SUBSANACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIASNTS- 1004-22"– APROBACION	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE Contratista	OCAÑA 1814	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1047-22	13-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 UTET-02590-109 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1008-22 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023CON OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA COROZAL – CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS" - OBSERVACIONES	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1048-22	13-sep-23	REITERACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPONENTES DE COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS. GOBERNACION 2052	2	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1049-22	13-sep-23	RELACION ESTACION ACTUAL COMPONENTE REVISION Y/O COMPLEMENTACION ESTUDIOS Y DISEÑOS Y SOLICITUD DE ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.	2	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1050-22	13-sep-23	RESPUESTA RADICADO 2023S-VNSA-002850 DEL 07 SEPTIEMBRE DE 2023 - CACHIRA	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	JAQG	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1051-22	13-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 UTET-02590-112 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE" - OBSERVACIONES	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1052-22	13-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 UTET-02590-113 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE." - OBSERVACIONES	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1053-22	13-sep-23	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022 - PERIODO 01/09/2023 AL 07/09/2023	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105	INVIAS	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1054-22	13-sep-23	SOLICITUD INGRESO INSPECTOR MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y ARBOLEDAS.	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1055-22	14-sep-23	RESPUESTA "PROGRAMACÓN Y FLUJO DE CAJA PRORRROGA No. 1" -APROBACIÓN	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista	LA PLAYA	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1056-22	14-sep-23	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS CONTRATO DE OBRA No. LP- SV 02332-2022 La Mutis – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1058-22	14-sep-23	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022	1	Señor HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Doctor JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO	CACHIRA	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1059-22	14-sep-23	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL COLOMBIA Contratista Señor alcalde: SAMUEL MEJIA ARAQUE Alcaldía municipal Pamplonita	PAMPLONITA	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1060-22	14-sep-23	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA LP-OP-01-2022 SANTIAGO	1	Ingeniero LUIS ANDRES BALLESTEROS Secretaria De Planeación Carrera 3 N° 3-61 Barrio el Centro Santiago - Norte de Santander	SANTIAGO	VFSO	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1061-22	15-sep-23	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES. - GOBERNACION 2052	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 HUGO PEREZ ALVAREZ Representante legal	GOBERNACION 2052	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1062-22	19-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO PHM2022 – 037 – 2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA INFORME GEOTECNIA Y PAVIMENTO" - OBSERVACIONES - GOBERNACION 2052	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1063-22	15-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-114, ASUNTO: LINEAMIENTOS LUGAR DISPOSICIÓN DEL MATERIAL. GOBERNACION 1943						
GIC-INVIAS-NTS-1064-22	15-sep-23	RESPUESTA A OFICIO UTET-02590-117 "RESPUESTA A COMUNICACION GICINVIAS-NTS-774-22 DE FECHA 11 DE JULIO Y GIC-INVIAS-NTS-736-22 DE 29 DE JUNIO DE 2023 CON OBSERVACIONES DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO" GOBERNACION 1943	4	Señores: UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022 Norte de Santander REF: MEJORAMIENTO Y	GOBERNACION 1943	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1065-22	15-sep-23	ATRASO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SANTIAGO	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 Contratista	SANTIAGO	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1066-22	15-sep-23	ATRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PAMPLONITA	1	Señor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante legal UNION TEMPORAL COLOMBIA Contratista	PAMPLONITA	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1067-22	15-sep-23	OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL, COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL) GOBERNACION 1943	7	Señores: UNION TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal	GOBERNACION 1943	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1068-22	15-sep-23	Acta de costos he Informe mensual No. 11 de Interventoría correspondientes al periodo de JULIO de 2023.	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	2023E-VUVRAZ-009683 - 2023-09-15
GIC-INVIAS-NTS-1069-22	18-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-120 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MUNICIPIO DE LOS PATIOS GOBERNACION 1943" - OBSERVACIONES	1	UNION TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590	GOBERNACION 1943	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1070-22	18-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-122 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MUNICIPIO DE GRAMALOTE GOBERNACION 1943" - OBSERVACIONES	1	UNION TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590	GOBERNACION 1943	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1071-22	18-sep-23	SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE OBRA.	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1072-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE VIAS	OCAÑA 1758	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1073-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE VIAS	OCAÑA 1814	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1074-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE VIAS	GOBERNACION 1943	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1075-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE VIAS	GOBERNACION 2052	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1076-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	HERRAN	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1077-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	SANTIAGO	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1078-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	PAMPLONITA	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1079-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CACHIRA	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1080-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ABREGO	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1081-22	18-sep-23	SOLICITUD PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	LA PLAYA	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1082-22	18-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-059-2022 DE FECHA 11-09-2023 CUYO ASUNTO ES "SUBSANACIONES DISEÑO GEOMETRICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-936-22". – APROBADO (T-1) Y APROBADO CON OBSERVACIONES TRAMOS (2,4,5,7 Y 9) OCAÑA 1814	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE Contratista	OCAÑA 1814	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1083-22	18-sep-23	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO AGOSTO 2023 – MUNICIPIO DE ABREGO – CONVENIO 1791 DE 2021	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1084-22	18-sep-23	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-106 CON ASUNTO: "RESPUESTA A COMUNICACIONES GIC-INVIASNTS-973-22 Y GIC-INVIAS-NTS-976-22 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES REALIZADAS AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, VEREDA SANTO DOMINGO Y RINCONADA, MUNICIPIO DE ARBOLEDA" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1085-22	18-sep-23	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A ABRIL 2023 – GOBERNACIÓN 1943 – CONVENIO 1943 DE 2021	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1087-22	19-sep-23	SOLICITUD LOCALIZACION DE PUNTOS DE REFERENCIA EN TRAMOS A INTERVENIR Y VERIFICACION DE DISEÑOS.	3	UNION TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590	GOBERNACION 1943	IAPC	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1088-22	19-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-128-2023 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "DISEÑO HIDRAULICO ALCANTARILLA PR7+410_OBSERVACIONES_15-08-2023" – OBSERVACIONES.	2	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1089-22	19-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO PHS2022 – 033 – 2022 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA PLAN SST"	1	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1090-22	19-sep-23	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1091-22	19-sep-23	SOLICITUD UBICACIÓN DE OBRA DE DRENAJE TIPO ALCANTARILLAS. GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY Representante Legal CARDENAS RICO UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1092-22	19-sep-23	REVISION BALANCE PRESUPUESTAL - PAMPLONITA	1	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1093-22	19-sep-23	Remisión Hoja de Vida Residente de Interventoría – Ing. Rafael Carrero y Profesional Social – Melissa Rojas.	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1094-22	19-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO 180-667, con asunto: Solicitud modificación del tramo No. 1 y No. 5 de la construcción de placa huella en el sector de Buenavista. OCAÑA 1814	1	Señor: YORBI FRANCO TELLES Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1095-22	25-sep-23	SOLICITUD LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA EN TRAMOS A INTERVENIR Y VERIFICACIÓN DE DISEÑOS.	2	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	MISM	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1096-22	20-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO "REITERACIÓN SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO" CONTRATO 160 DE 2022 - CACHIRA	1	Doctor JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO Alcalde municipal Carrera 3 N° 3-61 Barrio el Centro	CACHIRA	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1097-22	20-sep-23	REMISION INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022 (08/09/2023 AL 14/09/2023)	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1098-22	22-sep-23	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CADV-GIC-136-2023, CON ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE RCD POR PARTE DE LA COMUNIDAD ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista	ABREGO	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1099-22	26-sep-23	INFORMACION QUE DEBERA TENER ENCUENTA EN LA PRERSENTACION DEL INFORME MENSUAL SST OCAÑA 1814	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1100-22	25-sep-23	SOLICITUD ENTREGA DE MEMORIAS TECNICAS INICIALES Y PUNTOS DE INTERVENCION PARA LOS ITEM DE CONFORMACION DE LA CALZADA Y MEJORAMIENTO DE LA SUUBRASANTE. GOBERNACION 1943	3	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1101-22	26-sep-23	RESPUESTA AL COMUNICADO UTET-02590-115, RECIBIDO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON ASUNTO: "RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-734-22 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 CON OBSERVACIONES A DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." – OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1102-22	22-sep-23	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CADV-GIC-137-2023 FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON ASUNTO: "ENTREGA DE SUBSANACIÓN TOPOGRAFIA CORREDOR 1." REITERACIÓN OBSERVACIONES 25-05-2023 ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista	ABREGO	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1103-22	22-sep-23	SOLICITUD INGRESO INSPECTOR MUNICIPIO DE LA PLAYA.	1	Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1104-22	22-sep-23	RESPUESTA AL COMUNICADO UTET-02590-123 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON ASUNTO: "RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-956-22 DE FECHA 29 DE AGOSTO CON OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA BOYACA MUNICIPIO DE GRAMALOTE" – APROBACION CON OBSERVACIONES TRAMO 1, 2 Y 3 Y OBSERVACIONES TRAMO 4 GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1105-22	22-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-139-2023 DE FECHA 18-09-2023 CUYO ASUNTO ES "MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA – EL CHORRO 1 - 2" - OBSERVACIONES ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista	ABREGO	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1106-22	22-sep-23	RESPUESTA AL OFICIO UTET-02590-118 DE FECHA 13-09-2023 CON ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO EN REFERENCIA" - OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1107-22	25-sep-23	SOLICITUD DE PRESENCIA EN OBRA DEL PROFESIONAL SST HERRAN	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Luis Eduardo Blanco Director de obra	HERRAN	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1108-22	25-sep-23	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DE 2023 HERRAN	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Luis Eduardo Blanco Director de obra	HERRAN	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1109-22	25-sep-23	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CADV-GIC-140-2023 DE FECHA 25-09-2023 CON ASUNTO: "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1105. OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL" - APROBADO ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista	ABREGO	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1110-22	25-sep-23	SOLICITUD ENTREGA DE MEMORIAS TECNICAS INICIALES Y PUNTOS DE INTERVENCION PARA LOS ITEM DE CONFORMACION DE LA CALZADA Y MEJORAMIENTO DE LA SUUBRASANTE. GOBERNACION 1943	3	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1111-22	26-sep-23	REMISION DE ACTAS DE VISITA REALIZADAS DURANTE LOS DIAS 12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 GOBERNACION 2033	4	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA MALDONADO GERENTE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S	GOBERNACION 2033	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1112-22	26-sep-23	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-884-22 Y GIC-INVIAS-NTS-1033-22; SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA CACHIRA	2	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista	CACHIRA	RPMP	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1113-22	26-sep-23	OBSERVACIONES CORREDOR VIAL COROZAL – CALIFORNIA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.	3	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1114-22	27-sep-23	SOLICITUD INGRESO INSPECTOR MUNICIPIO DE SANTIAGO.	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1115-22	27-sep-23	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022 (15/09/2023 - 21/09/2023)	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1117-22	29-sep-23	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-332-22 Y GIC-INVIAS-NTS-521-22; ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO PARA EL CTI 1053 DE 2022	2	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1118-22	29-sep-23	APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL ABREGO	5	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	KNC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1119-22	29-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO UTET-02590-126 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1026-22 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE CON OBSERVACIONES AL COMPONENTE TOPOGRAFICO DE LA VEREDA EL HELECHAR DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" – OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico

GIC-INVIAS-NTS-1120-22	29-sep-23	ACTA MODIFICATORIA No. 1 HERRAN	1	Ingeniero HERNANDO JOSÉ CELY MOGOLLÓN Alcalde Municipal Calle 6 No. 3 - 29 Sector San Martín	HERRAN	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1121-22	29-sep-23	RESPUESTA AL COMUNICADO UTET-02590-124, RECIBIDO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONASUNTO: "ENTREGA DE OBSERVACIONES SUBSANADAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA RINCONADA, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS"– APROBADO CON OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1122-22	29-sep-23	Acta de costos he Informe mensual No. 12 de Interventoría correspondientes al periodo de AGOSTO de 2023.	1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	2023E-VUVRAZ-014289
GIC-INVIAS-NTS-1123A-22	29-sep-23	RESPUESTA A SU CORREO CUYO ASUNTO ES "DISEÑO GEOMETRICO VEREDA HELECHAR MUNICIPIO ARBOLEDAS" – OBSERVACIONES GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1131-22	5-sep-23	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL SST	1	Señores: Unión temporal placa huella Herrán 2022 CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2022	HERRAN	RMC	JAQG	Correo electronico
GIC-INVIAS-NTS-1141-22	5-sep-23	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	VFSO	JAQG	

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

UTET-02590-105	1-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-964-22 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES LOCALIZACION DE LAS OBRAS VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO ARBOLEDAS GOBERNACION 1943	002 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	1/09/2023	20234994	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
OFC-CLP-GIC-090-2023	1-sep-23	ENTREGA INFORME GESTION SOCIAL - MES DE AGOSTO	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIERO SCONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO LA PLAYA DE 2022	LA PLAYA	1/09/2023	20235014	PENDIENTE RESPUESTA		
UTET-02590-106	2-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACIONES GIC-INVIAS-NTS-973-22 Y GIC-INVIAS-NTS-976-22 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES REALIZADAS AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA SANTO DOMINGO Y RINCONADA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIERO SCONSULTORES INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	4/09/2023	20235021	GIC-INVIAS-NTS-1084-22	18/09/2023	
FARO DEL CATATUMBO	4-sep-23	ENTREGA DE INFORMACION PRECONTACTUAL - COLOMBIA RURAL 2023 GOBERNACION 2033	003 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIERO SCONSULTORES INTERVENTORIA	FARO DEL CATATUMBO	GOBERNACION 2033	4/09/2023	20235042	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
OFC-CADV-GIC-131-2023	4-sep-23	ENTREGA DE CAVD-AMB-ICA-01- INFORME MESUAL AGOSTO 2023 CONSORCIO AD VIAS ABREGO	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	4/09/2023	20235043	GIC-INVIAS-NTS-1090-22	19/09/2023	
OFC-CADV-GIC-132-2023	4-sep-23	RADICADO MINISTERIO DEL INTERIOR ABREGO	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	4/09/2023	20235044	No requiere respuesta		
OFC-CADV-GIC-129-2023	4-sep-23	ENTREGA INFORME GESTION SOCIAL – MES AGOSTO	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	5/09/2023	20235046	NO SE HA ENVIADO RESPUESTA	20/10/2023	
MUNICIPIO ABREGO	5-sep-23	SOPORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1428-2021 ABREGO	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE ABREGO	ABREGO	5/09/2023	20235048	NO REQUIERE RESPUESTA		
OFC-CLP-GIC-061-2023	4-sep-23	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD CORREDOR 2 - LA PLAYA	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO LA PLAYA	LA PLAYA	5/09/2023	20235049	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
ALCALDIA DE CACHIRA	5-sep-23	SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DE OBRA	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CACHIRA	CACHIRA	5/09/2023	20235072	GIC-INVIAS-NTS-1023-22	11/09/2023	
PHE2022-054-2022	5-sep-23	ENTREGA DOCUMENTACION ACTA No. 1 Y ANEXOS HERRAN	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	6/09/2023	20235075	PENDIENTE RESPUESTA		
2023S-VNSA-002161	5-sep-23	APROBACION HOJA DE VIDA INSPECTORES DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1053 DE 2022 LA PLAYA DE BELEN Y LOS PATIOS (GOBERNACION 1943)	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	6/09/2023	20235076	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
GBE-056-2022	5-sep-23	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD CORREGIDAS CORREGUIMIENTO DE BUENAVISTA - OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	6/09/2023	20235086	PENDIENTE RESPUESTA		
GBE-057-2022	5-sep-23	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL DE JULIO - OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	6/09/2023	20235087	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
2023-08400-021106-1	6-sep-23	TRASLADO OFICIO CON No. DE RADICADO 2023-08400-024723-2 COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS GOBERNACION 2033	004 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2033	6/09/2023	20235102	GIC-INVIAS-NTS-1034-22	11/09/2023	
2023-08400-021103-1	5-sep-23	RESPUESTA A OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-319-505-655-22 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA GOBERNACION 2033	005 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2033	5/09/2023	20235103	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
UTET-02590-107	6-sep-23	ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	6/09/2023	20235105	1122A	2/10/2023	
UET-02590-108	6-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-866-22 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023 CON OBSERVACIONES PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL COMPONNETE AMBIENTAL Y SOCIAL GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	6/09/2023	20235106	GIC-INVIAS-NTS-1067-22	18/09/2023	
OFICIO 300-0467	4-sep-23	CERTIFICACION PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO - LA PLAYA	002 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MUNICIPIO LA PLAYA	LA PLAYA	6/09/2023	20235108	GIC-INVIAS-NTS-1016-22	6/09/2023	
2023S-VNSA-002851	7-sep-23	REITERACION ACCIONES CONTRATO DE OBRA No. 02590 DEL 2022 GOBERNACION 1943	003 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	8/09/2023	20235152	GIC-INVIAS-NTS-1031-22	11/09/2023	
2023S-VNSA-002850	8-sep-23	REITERACCION ACCIONES CONTRATO DE OBRA No. 160 DEL 2022 CACHIRA	003 FOLIOS	Señor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	8/09/2023	20235153	GIC-INVIAS-NTS-1050-22	13/09/2023	
2023S-VNSA-002842	7-sep-23	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1053 DE 2022	003 FOLIOS	Señor (a): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	8/09/2023	20235154	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
PHM2022-036-2022	7-sep-23	ENTREGA INFORME DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS - PARTE 2	001 FOLIOS	Señor (a): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	8/09/2023	20235156	GIC-INVIAS-NTS-1030-22	11/09/2023	
2023S-VNSA-002845	7-sep-23	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-004972 INGRESO A LABORES INGENIERO JAIRO	002 FOLIOS	Señor (a): LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	7/09/2023	20235160	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
OFC-CADV-GIC-133-2023	7-sep-23	ENTREGA DE INFORME SST - MES DE AGOSTO 2023 ABREGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES OFC-CADV-GIC-133-2023 INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	7/09/2023	20235163	PENDIENTE RESPUESTA	15/10/2023	
OFC-CLP-GIC-062-2023	8-sep-23	ENTREGA INFORME SST MES DE AGOSTO 2023 ABREGO	001 FOLIOS	Señor (a): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	8/09/2023	20235169	PENDIENTE RESPUESTA		
GBE-058-2022	8-sep-23	SUBSANACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1004-22. - OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señor (a): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	OCAÑA 1814	OCAÑA 1814	8/09/2023	20235170	GIC-INVIAS-NTS-1046-22	13/09/2023	
UTET-02590-109	8-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1008-22 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA COROZAL – CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	8/09/2023	20235171	PENDIENTE RESPUESTA		
UTET-02590-110	8-sep-23	ENTREGA DE INFORME DE COMPONENTE SST CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	8/09/2023	20235172	GIC-INVIAS-NTS-956-22	29/08/2023	

UTET-02590-111	8-sep-23	PRESENTACION RELACION MANO DE OBRA CONTRATADA DE MANERA MENSUAL GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	8/09/2023	20235173	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
GBE-059-2022	11-sep-23	SUBSANACIONES DISEÑO GEOEMTRICO - RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-936-22 OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señor (a): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	11/09/2023	20235223	GIC-INVIAS-NTS-1082-22	18/09/2023	
GBE-060-2022	11-sep-23	ENTREGA ACTA DE SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRAS FISICAS VEREDA BUENAVISTA OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señor (a): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	11/09/2023	20235224	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
UTET-02590-112	11-sep-23	ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	11/09/2023	20235225	GIC-INVIAS-NTS-1051-22	13/09/2003	
UTET-02590-113	11-sep-23	ENTREGA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	11/09/2023	20235227	GIC-INVIAS-NTS-1052-22	13/09/2023	
2023S-VBOG-002604	7-sep-23	MANIFESTACION DE LA REDUCCION DE LAS METAS FISICAS	002 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	12/09/2023	20235220	PENDIENTE RESPUESTA		
PHM2022-037-2022	12-sep-23	ENTREGA INFORME DISEÑO DE PAVIMENTOS Y MODULACION GOBERNACION 2052	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	12/09/2023	20235250	GIC-INVIAS-NTS-1062-22	15/09/2023	
UTET-02590-114	12-sep-23	LINEAMIENTOS LUGAR DE DISPOSICION DEL MATERIAL GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	12/09/2023	20235263	GIC-INVIAS-NTS-1063-22	15/09/2023	
UTET-02590-115	12-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-734-22 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 CON OBSERVACIONES A DISEÑO GEOMETRICO DE VIA SANTO DOMINGO DE ARBOLEDAS	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	12/09/2023	20235264	GIC-INVIAS-NTS-1101-22	26/09/2023	
CONSORCIO OK-122-2022	12-sep-23	ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA CONSORCIO OK 2022 - OCAÑA 1758	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	12/09/2023	20235265	GIC-INVIAS-NTS-1045-22	15/09/2023	
GBE-061-2022	12-sep-23	INFORME SST AGOSTO OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	13/09/2023	20235273	PENDIENTE RESPUESTA		
2023-08400-021776-1	12-sep-23	CITACION A REUNION PRESENCIAL CONTRATO DE OBRA No. 02590-2022	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	GOBERNACION 1943	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	13/09/2023	20235291	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
UTET-02590-116	13-sep-23	ENTREGA TOPOGRAFIA DE LA VEREDA JUAN BUENO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/09/2023	20235301	GIC-INVIAS-NTS-1100-22	25/09/2023	
UTET-02590-117	13-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-774-22 DE FECHA 11 DE JULIO Y GIC-INVIAS-NTS-736-22 DE 29 DE JUNIO DE 2023 CON OBSERVACIONES DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/09/2023	20235312	GIC-INVIAS-NTS-1064-22	15/09/2023	
UET-02590-118	13-sep-23	ENTREGA DE INFORME DE ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO EN REFERENCIA GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/09/2023	20235317	GIC-INVIAS-NTS-1106-22	25/09/2023	
UTET-02590-119	13-sep-23	REPSUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1027-22 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON RELACION ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISION Y/O COMPLEMENTACION ESTUDIOS Y DISEÑOS Y SOLICITUD DE ENTREGA PLAN DE CONTIGENCIA GOBERNACION 1943	007 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/09/2023	20235325	GIC-INVIAS-NTS-1199-22	18/10/2023	
UTET-02590-120	13-sep-23	ENTREGA DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MUNICIPIO DE LOS PATIOS GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/09/2023	20235326	GIC-INVIAS-NTS-1069-22	18/09/2023	
PHS2022-079-2022	13-sep-23	ENTREGA INFORME EJECUTIVO No. 2 SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO N.S. ING. LUIS ANDRES BALLESTEROS Secretario de planeación municipal – supervisor del contrato	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	13/09/2023	20235327	PENDIENTE RESPUESTA		
MUNICIPIO ABREGO	14-sep-23	SOPORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1791 DE 2021 ABREGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	MUNICIPIO ABREGO	ABREGO	14/09/2023	20235328	GIC-INVIAS-NTS-1083-22	18/09/2023	
GBE-062-2022	14-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1000-22 "APROBACION CON OBSERVACIONES PROJECT" - RESPUESTA A OBSERVACIONES OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	14/09/2023	20235344	PENDIENTE RESPUESTA		
UTET-02590-121	14-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-928-22 DE FECHA 16 DE AGOSTO CON OBSERVACIONES REVISION - INFORME SST MES DE JUNIO CON RESPECTO AL INFORME MENSUAL GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	14/09/203	20235349	PENDIENTE RESPUESTA		
UTET-02590-122	14-sep-23	ENTREGA DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MUNICIPIO DE GRAMALOTE GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	15/09/2023	20235350	GIC-INVIAS-NTS-1070-22	18/09/2023	

OFC-CLP-GIC-063-2023	14-sep-23	DOCUMENTACION COMPONENTE SST LA PLAYA	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	15/09/2023	20235351	PENDIENTE RESPUESTA		
2023S-VNSA-003940	13-sep-23	REITERACION ACCIONES CONTRATO DE OBRA No. 02332 DEL 2022 GOBERNACION 2052	003 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS NORTE SANTANDER	NTE SANTANDER	13/09/2023	20235353	GIC-INVIAS-NTS-3940-22	9/10/2023	

PHS2022-080-2022	15-sep-23	ENTREGA PAGA SANTIAGO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLAC AHUELLA SANTIAHGO 2022	SANTIAGO	18/09/2023	20235377	GIC-INVIAS-NTS-1172-22	11/10/2023	
PHE2022-055-2022	15-sep-23	ENTREGA PAGA HERRAN	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	18/09/2023	20235378	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022-032-2022	15-sep-23	ENTREGA PAGA PAMPLONITA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	18/09/2023	20235379	PENDIENTE RESPUESTA		
MATICCES - CACHI-063-20222	15-sep-23	ENTREGA PAGA CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	18/09/2023	20235380	PENDIENTE RESPUESTA	30/10/2023	
PHS2022-033-2022	18-sep-23	ENTREGA PLAN SST PAMPLONITA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	18/09/2023	20235381	GIC-INVIAS-NTS-1089-22	19/09/2023	
OFC-CADV-GIC-138-2023	18-sep-23	RESPUESTA A OFICIO No. GIC-INVIAS-1010-22 SUBSANACION DOCUMENTACION PAGA ABREGO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/09/2023	20235407	GIC-INVIAS-NTS-1118-22	2/10/2023	
OFC-CADV-GIC-137-2023	18-sep-23	ENTREGA DE SUBSANACION TOPOGRAFIA CORREDOR 1 ABREGO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/09/2023	20235410	GIC-INVIAS-NTS-1102-22	22/09/2023	
OFC-CADV-GIC-136-2023	18-sep-23	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE RCD POR PARTE DE LA COMIDAD ABREGO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/09/2023	20235416	GIC-INVIAS-NTS-1098-22	22/09/2023	
OFC-CADV-GIC-135-2023	18-sep-23	SOLICITUD DE ACTAS DE COMITES Y GRABACIONES ABREGO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/09/2023	20235418	GIC-INVIAS-NTS-1139-22	5/10/2023	
OFC-CADV-GIC-139-2023	18-sep-23	MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA EL CHORRO 1-2 ABREGO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/09/2023	20235420	GIC-INVIAS-NTS-1105-22	22/09/2023	
MUNICIPIO DE HERRAN	18-sep-23	ACTA MODIFICATORIA CONTRATO 146-2023 MUNICIPIO HERRAN	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	MUNICIPIO DE HERRAN	HERRAN	18/09/2023	20235423	GIC-INVIAS-NTS-1120-22	29/09/2023	
UTET-02590-123	18-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-956-22 DE FECHA 29 DE AGOSTO CON OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA BOYACA MUNICIPIO DE GRAMALOTE. - GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	19/09/2023	20235431	GIC-INVIAS-NTS-1104-22	25/09/2023	
MUNICIPIO DE CACHIRA	19-sep-23	REITERACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR EL ATRASO EN EL INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 - CACHIRA	001 FOLIOS	Señor: HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	MUNICIPIO DE CACHIRA	CACHIRA	20/09/2023	20235457	NO SE REQUIERE RESPUESTA		
MUNICIPIO DE CACHIRA	19-sep-23	REITERACIÓN SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO - CACHIRA	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	MUNICIPIO DE CACHIRA	CACHIRA	20/09/2023	20235458	GIC-INVIAS-NTS-1096-22	20/09/2023	
MUNICIPIO DE CACHIRA	19-sep-23	RESPUESTA A SU COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-1079-22 "SOLICITUD POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTAS DE APROBACION DE POLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO" CACHIRA	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	MUNICIPIO DE CACHIRA	CACHIRA	20/09/2023	20235460	NO REQUIERE RESPUESTA		
PHS2022-082-2022	20-sep-23	ENTREGA INFORME DE VALIDACION ACERO DE REFUERZO SANTIAGO	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	21/09/2023	20235484	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022-035-2022	20-sep-23	ENTREGA INFORME DE VALIDACION ACERO DE REFUERZO PAMPLONITA - AJUSTADO	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	21/09/2023	20235489	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022-034-2022	20-sep-23	ENTREGA INFORME DE VALIDACION ACERO DE REFUERZO PAMPLONITA	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	21/09/2023	20235490	PENDIENTE RESPUESTA		
OFC-CLP-GIC-065-2023	20-sep-23	ENTREGA ACTA DE VEEDURIA LA PLAYA	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	21/09/2023	20235493	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
OFC-CLP-GIC-066-2023	20-sep-23	ENTREGA DENSIDADES CORREDOR 1 Y 2 - LA PLAY A	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	21/092023	20235497	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
GBE-063-2022	21-sep-23	ENTREGA DE LAS ACTAS DE VECINDAD, ALMANCENAMIENTO DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA Y FINALMENTE LEVANTAMIENTO DE ACTA PLACA HUELLA EXISTENTE OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	22/09/2023	20235513	PENDIENTE RESPUESTA		
2023S-VNSA-006872	23-sep-23	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-008678 INSPECTORES CACHIRA Y LOS PATIOS	003 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	INVIAS NORTE SANTANDER	INVIAS	23/09/2023	20235560	NO REQUIERE REPSUESTA	N.A	
UTET-02590-124	23-sep-23	ENTREGA DE OBSERVACIONES SUBSANADAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA RINCONADA, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	23/09/2023	20235561	GIC-INVIAS-NTS-1121-22	29/09/2023	
UTET-02590-125	23-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1037-22 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE CON OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA CALIFORNIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	23/09/2023	20235565	GIC-INVIAS-NTS-1144-22	9/10/2023	
UTET-02590-126	23-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1026-22 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE CON OBSERVACIONES AL COMPONENTE TOPOGRAFICO DE LA VEREDA EL HELECHAR DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	23/09/2023	20235566	GIC-INVIAS-NTS-1119-22	29/09/2023	
GBE-064-2022	23-sep-23	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-969-22 - RESPUESTA A OBSERVACIONES OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	23/09/2023	20235568	PENDIENTE RESPUESTA		

OFC-CADV-GIC-140-2023	25-sep-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1105. OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL ABREGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	25/09/2023	20235569	GIC-INVIAS-NTS-1109-22	25/09/2023	
PHS2022 – 036 – 2022	25-sep-23	RESPUESTA OFICIO 1092-22 – REVISION BALANCE PRESUPUESTAL PAMPLONITA	003 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	25/09/2023	20235575	PENDIENTE RESPUESTA		
PHM2022 – 038 – 2022	25-sep-23	ENTREGA INFORME PAGA GOBERNACION 2052	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	25/09/2023	20235589	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022 – 083 – 2022	25-sep-23	PLAN DE CONTIGENCIA 2 SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	25/09/2023	20235591	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022 – 083 – 2022	25-sep-23	PLAN DE CONTIGENCIA 2 SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	25/09/2023	20235593	PENDIENTE RESPUESTA		
2023S-VNSA-006873	23-sep-23	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-007647 - SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	003 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	INVIAS NORTE SANTANDER	INVIAS	26/09/2023	20235616	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022 – 037 – 2022	26-sep-23	ENTREGA PREACTA 01 CORREGIDA PAMPLONITA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	26/09/2023	20235619	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022-084-2022	26-sep-23	ENTREGA PREACTA 02 CORREGIDA SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	26/09/2023	20235625	PENDIENTE RESPUESTA		
UTET-02590-127	26-sep-23	ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA COROZAL-CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/09/2023	20235626	GIC-INVIAS-NTS-1146-22	6/10/2023	
GBE-066-2022	27-sep-23	INFORMACION DEL PROFESIONAL SOCIAL POR PARTE DE GAVINCO OCAÑA 1814	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	27/09/2023	20235647	PENDIENTE RESPUESTA		
OFC-CLP-GIC-067- 2023	28-sep-23	ENTREGA INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO-PAGA LA PLAYA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	28/09/2023	20235652	PENDIENTE RESPUESTA		
MATICCES-CACHI-064-2022	28-sep-23	ENTREGA DOCUMENTO PAGA COMPLETO - CAHIRA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	29/09/2023	20235670	GIC-INVIAS-NTS-1190-22	13/10/2023	
UTET-02590-128	28-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1113-22 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE CON OBSERVACIONES CORREDOR VIAL COROZAL – CALIFORNIA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	29/09/2023	20235671	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022 – 031 – 2022	5-sep-23	ENTREGA INFORME EJECUTIVO Y ANEXOS ACTA PARCIAL 01	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	6/09/2023	20235078	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022 – 081 – 2022	19-sep-23	ENTREGA PREACTA Y RESULTADO ENSAYOS, ACTA PARCIAL 02	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	19/09/2023	20235445	PENDIENTE RESPUESTA		
2023S-VBOG-008720	29-sep-23	RESPUESTA OFICIOS 998 Y 1093 APROBACION RESIDENTE DE INTERVENTORIA-AUXLIAR DE INTERVENTORIA Y PROFESIONAL SOCIAL	003 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS NORTE SANTANDER	INVIAS	2/10/2023	20235698	NO REQUIERE RESPUESTA	N.A	
UTET-02590-129	30-sep-23	ENTREGA DE OBSERVACIONES SUBSANADAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE BOYACA. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	2/10/2023	20235702	GIC-INVIAS-NTS-1195-22	17/10/2023	
UTET-02590-130	30-sep-23	RESPUESTA A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1106-22 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE CON OBSERVACIONES A ENTREGA DE INFORME DE ESTRUCTURAS. GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	2/10/2023	20235703	PENDIENTE RESPUESTA		
OFC-CADV-GIC-141-2023	28-sep-23	RELACION DFE GASTOS EN EL ITEM DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ABREGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	4/10/2023	20235761	PENDIENTE RESPUESTA		
PHS2022-038-2022	29-sep-23	INFORME AFECTACION LLUVIAS PAMPLONITA	010 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	4/10/2023	20235769	GIC-INVIAS-NTS-1138-22	5/10/2023	
160-SHT	1-sep-23	SOLICITUD DE ACEPTACION DE CHEQUES	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría	ALCALDIA DE ABREGO	ABREGO	17/09/2023	20236152	PENDIENTE RESPUESTA		
OFC-CLP-GIC-072- 2023	28-sep-23	SOLICITUD DE COMUNIDAD CALVELLINOS 2	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	CONOSRCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	23/10/2023	20236260	PENDIENTE RESPUESTA		
2023S-VBOG-002604	7-sep-23	MANIFESTACION DE LA REDUCCION DE LAS METAS FISICAS	002 FOLIOS	Señor (a): LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR REPRESENTANTE LEGAL GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS NORTE SANTANDER	INVIAS	23/10/2023	20235220	PENDIENTE RESPUESTA		

BITACORA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Septiembre 01.
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 6am - 12 pm ; 1pm - 4pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 1 oficial, 9 ayudantes
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental
Equipos: Sin Maquinaria.

Powered by CamScanner

Actividades de Obra: En el tramo Chano 2 se realizaron actividades de excavación de cortes, instalación y amarre de acero figurado, excavación manual de alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 02
Placa Huella.
Clima: Día Sabado.
Hora de inicio:
Personal de Obra:
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria.
Actividades de Obra: En el tramo del Chano 2 no se realizaron actividades debido a que en el transcurso de la semana se laboraron horas adicionales para completar el día Sabado 02 septiembre.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 04.
Placa Huella.
Clima: Dia Sabado
Hora de inicio: 6am - 12pm; 1pm - 3pm.
Personal de Obra: Ing Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 1 oficial, 11 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria.
Actividades de Obra: En el tramo Chano 2 se realizaron actividades de instalación y amarre de acero figurado, encofrado, excavación manual de alcantarilla.
Observaciones: El dia anterior se presentaron fuertes lluvias con granizo y en horas de la noche continuaron a baja escala.

Powered by CamScanner

Se realizó la visita previa para recibo definitivo de obra en compañía del municipio y el contratista, se realizará el acta pertinente.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 05.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado. (Lluvia 2 horas)
Hora de inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria. (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Charco 2 se realizaron actividades de encofrado, fundida de huellas, cunetas y viostras.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 06.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Charco 2 se realizaron actividades de encofrado, fundida de concreto ciclópeo, fundida de huellas, viostras y cunetas.

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

Septiembre 07.
Placa Huella
Clima: Día Soleado (Lluvia 1 hora)
Hora de inicio: 6am - 12pm; 1pm - 4pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto)
Actividades de Obra: En el frente del Chorro 2 se realizaron actividades de encofrado, fundida de concreto ciclópeo, fundida de huellas, rústica y uretas.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 08.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado (Lluvia 2 horas)
Hora de inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 4pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el frente del Chorro 2 se realizaron actividades de fundida de concreto ciclópeo, adecuación manual del terreno, instalación y armado de acero figurado, encofrado.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 09
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio:

Powered by CamScanner

Personal de Obra.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria.
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 no se realizaron actividades debido que en el transcurso de la semana se laboraron horas adicionales para completa el día Sábado 09 Septiembre.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 11.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 6pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 Oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto)
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de encofrado, fundida de huellas, contrahuellas y vigas.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 12
Placa Huella.
Clima: Día Soleado. (Lluvia 3 horas)
Hora de inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 4pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades

Powered by CamScanner

de adecuación manual del terreno, replanteo, instalación y amarre de acero figurado, fundida de concreto ciclópeo.
Observaciones: El contratista realiza la actividad relleno de bordillos solicitada por el municipio en la previa visita técnica, para tenerla en cuenta
Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 13
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 6 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 Oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de instalación y amarre de acero figurado, encofrado, fundida de placa, cunetas y riostras de sobre ancho, excavación manual de alcantarilla.
Observaciones: Se continua la actividad de relleno de bordillos solicitada por el municipio.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 14.
Placa Huella
Clima: Dia Soleado (Lluvia 1 hora).
Hora de inicio: 6 am - 12 pm; 1 pm - 4 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron

Powered by CamScanner

actividades de fundida de ciclópeo, adecuación y replanteo de vía, instalación y amarre de acero figurado, encofrado, excavación manual de alcantarilla, fundida de solado de tubería, inserción de tubos de concreto.
Observaciones: Se realizó excavación en la curva para reducir la pendiente y peralte presentado en la vía.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 15.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio: 6 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 Oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Clarro 2 se realizaron actividades de inserción de tubería, instalación y amarre de acero figurado, fundida de placa, cunetas y vastras de sobre ancho.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 16
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio:
Personal de Obra:
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspecto de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos. Sin Maquinaria.
Actividades de Obra: En el tramo del Clano 2 se realizaron actividades, debido que en el transcurso de la semana se laboraron horas adicionales.

Powered by CamScanner

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 18.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado
Hora de Inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social. 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing Residente, Inspector de obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizan actividades de fundido de placa, cunetas y riostras de sobre ancho, relleno y compactación de tubería de alcantarilla, excavación de la caja de la alcantarilla.
Observaciones: Se presentaron fuertes lluvias el día anterior. 17 de septiembre.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 19.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado (Lluvia 1 hora)
Hora de inicio: 6am - 12pm; 1pm - 4pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria
Actividades de obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de adecuación y replanteo del terreno, instalación y amarre de acero figurado, encofrado, relleno y compactación de la tubería de la alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Septiembre 20.
Placa Huella
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio: 6am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de encofrado, fundida de placa, cunetas y viseras de sobre ancho, excavación de la caja de la alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 21.
Placa Huella
Clima: Día Soleado (Llovió 1 hora)
Hora de inicio: 6 am - 12 pm; 1 pm - 4 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto)
Actividades de obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de fundida de concreto ciclópeo, instalación y amarre de acero figueado para la caja de la alcantarilla, fundida de la placa de la caja de la alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 22
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.

Powered by CamScanner

Hora de inicio: 6 am - 12pm, 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de instalación y amarre de acero figurado para disipador, encofrado, fundida de disipador, fundida de caja de la alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 23.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio:
Personal de Obra:
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria.
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 no se realizaron actividades debido que en el transcurso de la semana se laboraron horas adicionales.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 25.
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio: 6 am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.

Powered by CamScanner

Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro2 se realizaron actividades de desencofrado de la caja de la alcantarilla, instalación y amarre de acero figurado del muro de la alcantarilla, encofrado, relleno y compactación del disipador y la tubería, adecuación y replanteo del terreno, fundida del muro de la alcantarilla.
Observaciones: El día anterior se presentaron fuertes lluvias que afectaron el trabajo realizado y debido a este se realizó el relleno y compactación de la tubería y del disipador de la alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 26
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado (Lluvia 1 hora)
Hora de inicio: 6 am - 12 pm; 1 pm - 4 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de relleno y compactación de la tubería de la alcantarilla, instalación y amarre de acero figurado de los disipadores, encofrado, fundida de los disipadores.
Observaciones: Se presentan fuertes lluvias al finalizar la jornada laboral.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 27.
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.

Powered by CamScanner

Hora de inicio: 6 am - 12pm ; 1pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social. 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de adecuación y replanteo del terreno, encofrado del disipador, fundida del disipador, excavación de riostras, instalación y amare de acero figurado, fundida de placa, cunetas y riostras de sobre ancho.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 28
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 6 am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto).
Actividades de Obra: En el tramo del Chorro 2 se realizaron actividades de instalación y amare de acero figurado, encofrado, fundida de placa, cunetas y riostras (sobre ancho).

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 29.
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado (Llovia 2 horas).
Hora de inicio: 6 am - 12 pm; 1pm - 4pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, SST, Social, 1 maestro,

Powered by CamScanner

2 oficiales, 11 ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria (Mezcladora y vibrador de concreto)
Actividades de Obra: En el tramo del Charro 2 se realizaron actividades de excavación manual de alcantarilla, fundida de concreto ciclópeo, fundida de huellas, cunetas y riostras, excavación de riostras, instalación y amarre de acero figurado.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 30
Placa Huella.
Clima: Día Soleado.
Hora de inicio:
Personal de Obra:
Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, Social, Ambiental.
Equipos: Sin Maquinaria.
Actividades de Obra: En el tramo del Charro 2 no se realizaron actividades debido a que en el transcurso de la semana se laboraron horas adicionales.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

25 de Agosto de 2023
Vereda Bayaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente, 3 Operadores Residente de Interventoria.
- Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora
- Actividades ejecutados.

El Contratista da inicio de Actividades de Mejoramiento de la Subrasante desde el final del Corredor Vial a Intervenir.
Se espera que para el Dia de Mañana ya se tenga en Campo el Vibrocompactador y Bulldozer.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 de Agosto de 2023
Vereda Bayaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de Obra, 3 Operadores, Residente de Interventoria
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador.
- Actividades ejecutados.

Se inician Actividades de Corte de Material para Mejoramiento de la Subrasante y Adecuacion del Ancho de Acuerdo a Diseños.
Se Culminan Actividades Sobre Medio dia.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

lider

28 de Agosto del 2023
Vereda Boyaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, 3 Operadores, Residente de Interventoria.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer y Vibrocompactador
- Actividades ejecutadas.

El Contratista Continua con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante mediante el Corte y Disgregacion de material a lo largo del Corredor Vial Punto de Inicio K6+544, Asi mismo se realizo Compactacion de la Misma. con Ayuda de Vibrocompactador.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

29 de Agosto del 2023
Vereda Boyaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, 3 Operadores, Residente de interventoria.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer y Vibrocompactador
- Actividades ejecutadas

Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial y Asi Mismo Se realizo Compactacion en toda el Area.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

lider

30 de Agosto del 2023
Vereda Boyaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, 3 Operadores, Residente de Interventoria.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer y Vibrocompactador.
- Actividades ejecutadas

Se Realiza Compactacion de la Subrasante en areas Mejoradas y asi mismo se Continuan con labores de Corte y Disgregacion para Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

31 de Agosto del 2023
Vereda Boyaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, 3 Operadores, Residente de Interventoria
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador
- Actividades ejecutadas

El Contratista el dia de hoy Continua Con labores de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial y Adecuando Curvas (Anchos de Via).
Se Continua Con la Compactacion en dos Franjas en las Punta ya Intervenidas y por Recompactar.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria
lider=

01 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca, Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (3) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador
• Actividades Ejecutadas:
El dia de hoy el Contratista Continua con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante mediante la Perfilacion y Corte de la misma a lo largo del Corredor Vial.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

02 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (3) Operadores, Residente de interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades Ejecutadas.
Se Continua Con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante mediante la Perfilacion y Cuneteo de la misma de igual Manera Se realiza Compactacion en tramos intervenidos.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (3) Operadores. Residente de Interventoría.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades Ejecutadas
Se Continuan con Actividades de Mejoramiento de la subrasante y Cuneteo a lo largo del Corredor Vial y asi mismo se realiza la Compactacion de la misma

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (3) Operadores, Residente de Interventoría.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua con Actividades de Mejoramiento de la subrasante y Cuneteo a lo largo del Corredor Vial. Se Compacta Subrasante teniendo en cuenta que debido a la escarificacion queda Material Suelto.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (3) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador y Bobcat
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan Con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor vial y Compactacion de la Misma

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante y Cuneteo a lo largo del Corredor Vial.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 de septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora

lider

Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan Actividades de Perfilado y Cuneteo (Mejoramiento de la Subrasante) a lo largo del Corredor Vial.
Se Compacta tramos donde se encuentra material Suelto

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 de Septiembre del 2023
Vereda Bavaca Clima:
• Personal en obra; Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo disponible y en Uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El dia de hoy el Contratista Continua con Actividades de Mejoramiento de la subrasante a lo largo del Corredor Vial

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

11 de Septiembre del 2023
Vereda Bavaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de interventoria
• Equipo disponible y en Uso: Retroexcavadora, bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua con Activida-

dos de Mejoramiento de la Subrasante
(Perfilado y Cunetas) a lo largo del
Corredor Vial

José H. Tortes Suarez
Residente de Interventoria

12 de Septiembre del 2023
Vereda Carozal - California Clima:
• Personal en Obra: Residente de Obra, (4)
Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso, Retroexcavadora
Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua, Con trabajos de
Mejoramiento de la Subrasante, Mediante
el Perfilado con Bulldozer y Adecuacion
de Cunetas.
se Compacto Material a lo largo del
Corredor

José H. Tortes Suarez
Residente de Interventoria

13 de Septiembre del 2023
Vereda Carozal - Calfor Clima:
• Personal en obra: Residente de Obra, (4)
Operadores, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora
Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua Con Actividades
de Mejoramiento de la Subrasante a lo

largo del Corredor Vial y así mismo se realiza Compactacion y Humectacion de la Misma

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

14 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca, Clima.
• Personal en obra: Residente de Obra, (1) Operadores, Residente de interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Buldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante y Compactacion de la misma a lo largo del Corredor Vial.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

15 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra. Residente de Obra, (1) Operadores, Residente de interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Buldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante y Compactacion de la Misma a lo largo del Corredor.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

líder

16 de septiembre de 2023.
Vereda Boyaca, Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, Profesional sst, Inspector de obra, Comision de topografia, (4) Operadores, (2) Oficiales, (1) Ayudante, (1) Almacenista.
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El dia de hoy se continua con Actividades de mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial Vereda Boyaca y se realiza compactacion de la misma

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

18 de Septiembre de 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal de obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial Vereda Boyaca y se realiza Compactacion de la Misma

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal de obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El dia de hoy se continuan realizando Actividades de Mejoramiento de la Subrasante (Perfilacion y Cunteo) a lo largo del Corredor Vial y Compactacion de la misma.

Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

20 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal de obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades Ejecutadas.
El Contratista continua con Actividades de Mejoramiento de la subrasante (Perfilacion y Cunteo) a lo largo del Corredor Vial y Compactacion de las Areas intervenidas

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

21 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima.
Personal de obra: Residente de obra, (4)

lider=

Operadores, Residente de interventoría.
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades Ejecutadas.
El contratista de obra continua realizando Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del corredor Vial. Se compactan frentes faltantes y donde se evidencia Material Suelto.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

22 de Septiembre de 2023
Vereda Boyacá Clima:
• Personal de obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoría
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades Ejecutadas.
Durante el día solamente se ejecutan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante mediante el Perfilado y Cunetes. Así mismo se Compacta material a lo largo del Corredor Vial.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

23 de Septiembre de 2023
Vereda Boyacá Clima:
• Personal de obra. Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoría

• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El Contratista ejecuta Actividades de Mejoramiento de la subrasante, Percolacion y Cunetas.
Se Compacta a lo largo del Corredor Vial de Acuerdo a especificaciones.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

25 de Septiembre de 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal de Obra: Residente de Obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en USO: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante, Percolacion, Cunetas y Asi Mismo se realiza Compactacion de la Misma.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 de Septiembre de 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal de Obra: Residente de Obra, (4) operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.

• Actividades Ejecutadas
El contratista de obra continua Actividades de Mejoramiento de la subrasante a lo largo del Corredor Vial.
Se continua con Compactacion de Material de la subrasante a lo largo del Corredor Vial.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 de septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de Obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades Ejecutadas
Se realiza Compactacion de Areas faltantes Mejoradas a lo largo del Corredor Vial y Se continua con Corte y perfilamiento para Mejoramiento de la Subrasante.

José, H, Torres Suarez
Residente de Interventoria

28 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en Obra: Residente de Obra, (4) Operadores, Residente de interventoria
• Equipo disponible y en Uso: Retroexcavadora Bulldozer, Vibrocompactador, Bobcat.

• Actividades Ejecutadas.
Se Continua con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante y perfilado de Cunetas a lo largo del Corredor Vial
Se Compacta a lo largo del Corredor Vial.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

29 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de obra, (4) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora Buldozer, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades Ejecutadas
Durante el día Se realizan Actividades de Compactacion de la Subrasante Mejorada y de igual manera se trabaja en frente final del Corredor.

José H. Torres Suarez
Residente de interventoria.

30 de Septiembre del 2023
Vereda Boyaca Clima:
• Personal en obra: Residente de Obra, (4) Operadores y Residente de interventoria,
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora Buldozer, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
Se Continuan Con Actividades de Mejoramiento y Compactacion de la Subrasante

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

01 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 2 Operadores, Ayudante de Obra, Residente de Interventoria.
• Equipo disponible y en Uso: Bulldozer, Minicargador, Motoniveladora.
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la subrasante a lo largo del Corredor Vial donde se adecuan Anchos y Perfilan Curvas de Acuerdo a las Especificaciones.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

02 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, 2 Operadores, Ayudante de Obra, Residente de Interventoria.
• Equipo disponible y en uso: Bulldozer, Minicargador, Motoniveladora.
• Actividades ejecutadas.
El dia de hoy el Contratista Adecua Anchos en el Corredor Vial teniendo en Cuenta que en Algunas Secciones son Muy Reducidas, de Igual Manera se realiza levantamiento del Acta de Vecindad a lo largo del Corredor.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

03 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, 2 Operadores, Ayudante de Obra, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Bulldozer, Minicargador, Motoniveladora, Retroexcavadora.
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial, Se adecuan Anchos teniendo en Cuenta la reducido de los Mismos.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno - Clima Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 2 Operadores, Ayudante de obra, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Bulldozer, Minicargador Motoniveladora, Vibrocompactador
• Actividades ejecutadas
El dia de Hoy Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la subrasante a lo largo del Corredo Vial, de igual manera se realiza Compactacion de la Misma en Sitios faltantes.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, Auxiliar SST, 1 Operador, Ayudante de obra, Residente de interventoria
• Equipo disponible y en uso: Bulldozer, Minicargador, Motoniveladora, Vibrocompactador.
• Actividades ejecutadas
El Contratista realiza labores Medio dia en Mejoramiento de la Subrasante y perfilado de la misma, asi Mismo se Compactan tramos faltantes

Vereda Rincanada
El Contratista realiza Desplazamiento de Maquinaria amarilla para Inicio de Intervencion, Corredor Vial.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 de Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta Actividades en Campo.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 de Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta Actividades en Campo

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, Auxiliar sst, 2 Operadores, Ayudante de obra, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Bulldozer, Minicargador, Motoniveladora
• Actividades ejecutadas
El dia de hoy el Contratista Continua con el Mejoramiento de la Subrasante y Adecuacion de Anchos de Via, Segun la Necesidad.

Vereda la Rinconada - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, Auxiliar sst, 1 Operador, Ayudante de obra, Residente de interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Motoniveladora, Minicargador
• Actividades ejecutadas
Se inician Actividades en el presente Corredor Vial, donde se interviene trama inicial de la Vereda, se Verifica Ancho de Via a lo largo del Corredor.

Res. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 de Agosto del 2023
Vereda Juan Bueno - Clima: Nublado
• Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, Auxiliar sst, 1 Operador, Ayudante de obra, Residente de Interventoria.
• Equipo disponible y en uso: bulldozer, Minicargador.

• Actividades ejecutadas.
Se analiza Actividades de Mejoramiento de la Subrasante en el Corredor Vial Juan Bueno y se realiza Compactacion final de tramos faltantes.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

11 de Agosto del 2023
Vereda la Rinconada - Clima: Soleado
• Personal en obra, Residente de Obra, Inspector de obra, Auxiliar Sst, 1 Operador, Ayudante de Obra, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Bulldozer, Minicargador.
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasantes y Compactacion del Mismo en el Sector de Intervencion Actual.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta Cactividades en este Municipio

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

13 de Agosto del 2023
El Contratista de obra No ejecuta Ninguna Actividad en este Municipio.

Res. d. Obra

José H. Torres Suarez,
Residente de Interventoria

14 de Agosto del 2023
El Contratista de Obra No ejecuta Actividades en el presente Municipio.

Res. d. Obra

José, H, Torres Suarez
Residente de Interventoria

15 de Agosto Hasta 22 Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta Ninguna Actividad de obra en el Municipio de Arboledas.

Resid Obra

José H, Torres Suarez
Residente de Interventoria.

23 de Agosto del 2023
Vereda Santo Domingo - Clima: Nublado.
- Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente de Interventoria
- Actividades ejecutadas.

Teniendo en Cuenta la solicitud enviada por parte de la Comunidad Vereda Santo Domingo, donde manifiestan inconformidades con los puntos a intervenir Actualmente, la Comunidad esta en desacuerdo con el inicio de Actividades Fisicos Hasta tanto no haga presencia la entidad Contratante, Interventoria, con el fin de que se llegue

a un Acuerdo con los puntos de intervencion que ellos Manifiestan, en la Comunicacion enviada al Contratista, y esta trasladada a la Interventoria Mediante oficio del Contratista de obra UTBT-02590089.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

24 de Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta, Actividades de Obra en ninguna Vereda del Municipio

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

25 de Agosto del 2023.
Vereda Santo Domingo Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Residente de Interventoria, Profesional social Interventoria,
- Equipo disponible y en Uso: Ninguno
- Actividades ejecutadas.

Dando Cumplimiento a lo Manifestado por la Comunidad la interventoria, Contratista de Obra y Comunidad realiza recorrido a los Puntos Manifestados por la Comunidad en su Comunicacion, con el fin de revisar la Necesidad Actual y de igual manera mediante Acta de reunion se deja escrito la Solicitud Manifestada por la Comunidad con el fin de Revisar y tomar las decisiones Pertinentes.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

26 de Agosto del 2023
El Contratista No ejecuta Ninguna Actividad.

Resid. Obra

José H. Tolres Suarez
Residente de Interventoria

28 de Agosto del 2023
El Contratista No ejecuta Ninguna Actividad

Resid. Obra

José H. Tolres Suarez
Residente de Interventoria

29 de Agosto del 2023
Vereda Santa Domingo
- Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar SISO, 2 Operadores, 1 Ayudante
Residente de Interventoria.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora y Dumper.
- Actividades ejecutadas.

El Contratista bajo su responsabilidad da inicio a Actividades en el Progresiva de Subsuelo Cemento para mejorar el suelo de la subrasante y las Caracteristicas de resistencia. Debido a que no se ha dado respuesta a lo Manifestado por la Comunidad en Cuanto a la Intervencion del otras puntas Proyectadas y que no se tienen Incluidas Actualmente, la Comunidad Solicita que se suspendan Actividades Hasta tanto no se llegue a un Acuerdo.

Resid. Obra

José H. Tolres Suarez
Residente de Interventoria

30 de Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta Actividades de Obra en ningun Corredor Vial de Municipio de Arboledas.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

31 de Agosto del 2023
El Contratista no ejecuta Actividades de obra realiza Actividades Administrativas que tienen que Ver Con los Estudios y Diseños.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

01 de Septiembre del 2023
El Contratista no ejecuta Actividades de Obra en Campo.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

02 de Septiembre del 2023
El Contratista no ejecuta Actividades de Obra en Campo.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 de Septiembre del 2023
Vereda Manzanada - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, (2) Operadores, 1 Ayudante

Residente de interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades Ejecutadas
El Contratista el dia de hoy reanuda Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial en la vereda Rincanada, Adecuando Ancho de Curva, y Seccion transversal de Via.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada – Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, (3) Operadores, (1) Ayudante. Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades Ejecutadas.
El Contratista Continua con Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial, se realiza retiro de Material Sobrante.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada – Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, (3) Operadores, (1) Ayudante, Residente de Interventoria.

• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial y de igual manera se realiza Compactacion de la Misma con el fin de Mejorar la Propiedad del Suelo y Adicionar el Material Suelto.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

07 de Septiembre del 2023
Vereda Rincorado. - Clima: Soleado.
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (3) Operadores, (1) Ayudante Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat, Dumper.
• Actividades Ejecutadas
El Contratista con Ayuda del Dumper inicia a trasladar material fresado a la Vereda la rincorado con el Fin de Acopiar y Almacenar cerca a donde se tiene Proyectado el inicio de Actividades de Placa Huella Tramo 2-2.
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial y se Adecuan Anchos de Via en Curvas, Sobreanchos y Sitios Necesarios de Ampliar.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 de Septiembre del 2023
Vereda Helechal – Clima: Soleado
• Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, (3) Operadores, (1) Ayudante, Residente de Interventoría.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat, Dumper.
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua trasladando Material Retirado a la Vereda Kinconada, donde Acopia Material para inicio de Actividades de Placa Huella Tramo 2-2 Se realizan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial Vereda Helechal y de igual Manera se Compacta el Material de Acuerdo a especificaciones.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

09 de Septiembre del 2023
Vereda Helechal – Clima: Soleado
• Personal en obra. Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, (2) Operadores, (1) Ayudante, Residente de Interventoría.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat, Dumper.
• Actividades Ejecutadas
Se Continuan Actividades de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial Y se Realiza la Debido Compactacion de Acuerdo a especificaciones.
Se Continua Almacenando Material en el Tramo R-2 a ejecutar en la Kinconada

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

11 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanado - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas
El Contratista de obra Ingresa Personal a Campo para inicio de Actividades en Placa Huella 2-2 Vereda Rincanado.
Se inician Actividades de Corte y figurado de Acero de Refuerzo #3 - 3/8" para elemento de Placa Huella Viga Riostra.
Se Inicia Adecuacion de terreno en Sitio de Construccion de Placa huella tramo 2-2 y se realizo retiro de Material Sobrante.

Resid. Obra.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible, y en Uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Bobcat.
• Actividades ejecutadas.
Se Continua adecuacion de Terreno en el Sitio de Construccion de Placa Huella Tramo 2-2 y se retira material Sobrante,
Se Continua con Corte y Figurado de Acero de Refuerzo #3 - 3/8" para elementos de Placa

Hasta.
Se continua con traslado de Material Petreo a la Almacenado a sitio de Acopio.

Resid. Obra

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoria

13 de Septiembre del 2023
Viernes Almacenaje - Clima: Soleado
• Personal en obra Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar Est. (2) Operadores, (1) Maestro (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Volqueta.
• Actividades Ejecutadas
Se realizo Compactacion de subrasante Tramo K-2 y se continuo con actividades de Corte y Fundido de Placa de Concreto para Viga Riostra (Longitudinal y Transversal) #3 - 3/8" de acuerdo a Cantidad Faltante Final
Se hizo Recepcion de Formaleta en Madera (Laminas) para elementos de Placa Huella o Rodadura Tramo K2 Almacenada.

Resid. Obra.

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoria

14 de Septiembre del 2023
Viernes Almacenaje - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar Est. (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Volqueta.

Actividades Ejecutadas.
Se Continua con Instalacion de formaleta de Madera (cajones) Para elementos de Placa Huella.
Se Realiza Instalacion de Acero de Refuerzo de Viga Muro y se realiza la debida excavacion de 0,2 x 0,1 para el elemento, a lo largo del Tramo 2-2.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

15 de septiembre del 2023
Vereda Rincondada — Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro (4) Ayudantes, Residente de interventoria.
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora. Vibrocompactador. Bobcat, Mezcladora de bulto.
• Actividades ejecutadas.
Se realiza instalacion de Acero de Refuerzo longitudinal y Vertical para Huellas y Viga muro #3 - 3/8" de Acuerdo a especificaciones cartilla Colombia rural.
en Horas de la tarde Se da inicio a Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para Huellas y Viga muro tramo de Placa Huella 2'-2 Rincondada
Se realiza curado de Concreto con Aditivo Antisol para garantizar el desarrollo de la Resistencia.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

16 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada — Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas
Se Continua con Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para Huellas y Viga Riostra Tramo de Placa Huella 2-2 Rincanada.
Se Continua con Instalacion de Acero de Refuerzo Longitudinal y Vertical para Huellas y Viga riostra #3 - 3/8".
Se retira Formaleta de Madera a lo largo del Corredor Vial

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

18 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada — Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas
Se Continua con Armado de Formaleta de Madera Bayones para elementos de Placa Huella.
Se inicia con Vaciado de Concreto de 14 Mpa elaborado en obra para Ciclopeo Franja Central y Sobrecimbras.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada — Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Bobcat Mezcladora de Concreto.
• Actividades Ejecutadas
Se Continua Con Vaciado de Concreto de 14 Mpa Elaborado en Obra para Ciclopeo en Franja Central y Sobrecarho de Placa Huella Tramo 2-2.
Se realiza Instalacion de Acero de Refuerzo de 3/8' - #3 para Viga Maestra y Huellas.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

20 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada — Clima: Soleado
• Personal de obra, Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo disponible y en Uso: Retroexcavadora, Bobcat Mezcladora de Concreto.
• Actividades Ejecutadas.
Se Continua Con Vaciado de Concreto de 21 Mpa Elaborado en obra para Huella y Viga Maestra Tramo de Placa Huella 2-2 Rincanada.
de Igual Manera Se realiza Instalacion de Formaleta en Madera (Cajones) para elementos de Placa Huella de Acuerdo a seccion de Placa Huella.

Resid. Obra.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

21 de Septiembre del 2023
Vereda Rincondi — Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bobcat Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas.
Se Continua con Vaciado de Concreto de 14 Mpa Elaborado en obra para Ciclopeo y Franja Central y sobreancho de Placa Huella Tramo 2-2.
Se finaliza Armado de Acero de Refuerzo Longitudinal y Vertical #3 - 3/8' para elementos de Placa Huella Tramo 2-2.
En Horas de la tarde se continua Vaciado de Concreto de 21 Mpa en el Presente tramo.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 de Septiembre del 2023
Vereda Rincondi — Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bobcat Mezcladora de Concreto.
• Actividades Ejecutadas
Se continua con Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de Placa Huella Cuneta, Bordillo y Huellas Faltantes a lo largo del Tramo en ejecucion 2-2 Vereda Rincondi.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

23 de Septiembre de 2023
Vereda Rincanada ~ Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de obra, inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bobcat Mezcladora de Concreto.
• Actividades Ejecutadas.
Se Continua Vaciado de Concreto de 21 Mpa Elaborado en obra para Cuneta, Bordillo y Viga riostra y Huellas faltantes Tramo de Placa Huella 2-2.
Se Culmina Vaciado de Concreto de 14 Mpa elaborado en obra para Franja Central y Sobrecanchos faltantes tramo 2-2 Rincanada.

Res. d. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

25 de Septiembre de 2023
Vereda Rincanada — Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bobcat, Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas.
Se inicia intervencion de tramo de Placa Huella 2-1 realizando replanteo de terreno y adecuacion.
Se continua con Corte, figurado de Acero de Refuerzo para elementos de Placa Huella (Viga riostra, Huellas, Cunetas y Bordillos) de Acuerdo a Dimensiones.

En horas de la tarde se inicia instalacion de formaleta de Madera para elementos de Placa Huella

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

26 de Septiembre del 2023
Vereda Rincanada - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas.
Se realiza excavaciones para Viga reostra a lo largo del Tramo 2-1
Se continua con instalacion de formaleta de Madera para Cajones (elementos de Placa Huella).
Se continua con instalacion de Acero de Refuerzo longitudinal y transversal de 3/8" - #3 para Viga reostra, Huellas, Cuneta y Bordillo.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

27 de Septiembre, del 2023
Vereda Rincanada - Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro (1) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Mezcladora de Concreto.

• Actividades ejecutadas.
Se inicia Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra, para Huellas y Viga Riostra Tramo de Placa, Huella 2-1 Rincanada.
Se realiza instalacion de Formaleta en Madera para elementos de Placa Huella y se instala Acero de refuerzo longitudinal y Vertical de Viga riostra y Huellas.

Resid. Obra

José H. Tavres Suarez
Residente de Interventoria.

28 de Septiembre de 2023
Vereda Rincanada — Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro (1) Oficial, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Bobcat, Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas
Se inicia Vaciado de Concreto de 14 Mpa elaborado en obra para Ciclopeo, Franja Central y Sobreancho a lo largo del Tramo 2-1 Rincanada de Acuerdo a especificaciones.

Resid. Obra.

José H. Tavres Suarez
Residente de Interventoria

29 de Septiembre de 2023
Vereda Rincanada — Clima. Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspecta de obra, Auxiliar sst, (2) Operadores, (1) Maestro (1) Oficial, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora

Bobcat, Mezcladora de Concreto.
• Actividades Ejecutadas.
Se Continua con Actividades de Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra de Acuerdo a diseño de Mezcla para Huellas, Viga riostra. de igual Manera se Vacia Concreto de 14 Mpa, elaborado en obra para Ciclopeo, Franja Central de 0,9mt y sobreanchos de 0,45mt.
Finalizando la tarde se Continua con Instalacion de formaleta en Madera a lo largo del Tramo en Intervencion 2-1.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

30 de septiembre de 2023
Vereda Rincanada – Clima: Soleado
• Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, (2) Operadores, (1) Maestro (1) Oficial, (4) Ayudantes, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bobcat, Mezcladora de Concreto
• Actividades ejecutadas
El Contratista Continua Actividades de obra en el Tramo 2-1, Vereda la Rincanada, donde se realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos de Placa Huella (Viga Riostra, Huella, Cuneta y Bordillo).
de igual manera se Vacia Concreto de 14 Mpa para Franja Central y Sobreanchos.

Resid. Obra.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

* LUNES 11 SEPTIEMBRE 2023.

- INICIO JORNADA: 7:00 AM, - CLIMA DIA DESPEJADO; CONDICIONES: APTAS.
- MAQUINARIA/EQUIPO: 1 PARRILLA, 3 MEZCLADORAS, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 OPERADOR MAQUINA, 11 OBREROS, 1 INSPECTOR
- INTERVENTORIA ACTIVIDADES: SE INICIO FUNDIDA PLACA HUELLA FRENTE E CONTINUAN CON CICLOPEO. EJE ESTE. SE HACE MEDIDA ENTRE ALCANTARILLAS, FIN JORNADA 5:00PM.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA.

INSPECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO

INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO

* MARTES 12 SEPTIEMBRE 2023.

INICIO JORNADA 7:30 AM - CLIMA SOLEADO - MAQUINARIA/EQUIPO: MISMO DIA ANTERIOR,
- PERSONAL: SE MANTIENE MISMO PERSONAL - ACTIVIDADES: PEGUE MAQUINA DE LOSA EN VIA - MUROS: SE HACE REVISION DIFERENTES ACTIVIDADES - ARMADO FIERRO HUELLA
FIN JORNADA 5:00PM.

INSPECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO

* MIERCOLES, JUEVES, 13-14 SEPTIEMBRE/2023

Se realiza visita por parte del Director de Interventoría al sitio. Se evidencian las siguientes actividades en sitio:

- Vaciado Bordillo margen derecha PR3+050
- En margen izquierda se ejecuta preparación del terreno para el acondicionamiento y armado de acero. La interventoría solicita el contratista compactar con rana los hombros de la placa huella.
- En los bordillos la interventoría verificará la sección ejecutada (de 30 cm x 55 cm)
- Así mismo se verificará el balance de obra con el Finder corroborar el Clear Find.
- La interventoría realizará ensayos de laboratorio en la subbase y el concreto.
- Se realiza vaciado concreto de cuneta 3000 PSI con la dosificación de 7 bolsas de cemento y

los bolos de tramado.
• Se observan tres maestros en obra y herramienta menor. Personal con dotación.
• La interventoría solicitó al contratista el estricto cumplimiento de los requerimientos técnicos y planos del proyecto.

Director Interventoría

- INICIO JORNADA 7:30AM
- CLIMA: DIA DESPEJADO.
- CONDICIONES: BUENAS CONDICIONES.
- MAQUINARIA/EQUIPOS: 1 PERFORADORA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA.: 1 ING RESIDENTE, 1 OPERADOR MAQUINARIA, 2 OFICIALES + 9 AYUDANTES. - PERSONAL INTERVENTORIA: ING RESIDENTE, INSPECTOR OBRA
- ACTIVIDADES DEL DIA MIERCOLES 13/SEP/2023: EL MOLINOS SE HACE PERFILADO ZONA CUNETAS BOLILLO. MARGEN IZQUIERDA PR3+000. PR3+030; TAMBIEN FUNDIDA CUNETA BOLILLO MARGEN DERECHA. PR3+000 A PR3+040,
- ACTIVIDADES DEL DIA JUEVES 14/SEP/2023: LIMPIEZA ZONA CUNETA-BOLILLO, PERFILADO EN PR3+030 A PR3+070, SE CONTINUA FUNDIDA BOLILLO CUNETA EN PR3+040 A PR3+080. MARGEN DERECHA, A EMPALME CON LOZA CURVA; SE RECIBE VISITA ING. JAIRO DIRECTOR INTERVENTORIA - VERIFICA PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS - VERIFICACION REFUERZO HACE INCAPIE DEL SEGUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. FIN JORNADA 5:00PM.

Rubert Eugenio Ignacio
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINO

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE RODANA

VIERNES. 15 SEPTIEMBRE/2023

INICIO JORNADA 7:00 AM.

- CLIMA: AMANECIO SIN LLUVIAS, DESPEJADO, CONDICIONES: BUENAS.
- MAQUINARIA/EQUIPO: 1 PAPAELITA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 OPERADOR MAQUINARIA, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA.
- ACTIVIDADES: - SE OBSERVA CONTINUACION ACTIVIDAD DIA ANTERIOR EN. MALEN DERECHA FUNDIDA DE CUNETA BORDILLO. PR3+070 A PR3+034. FINAL CON LOSA. Y DESPEGA A LA MARGEN IZQUIERDA PR3+000 + PR3+065 CON FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI,

FIN JORNADA 5:00 PM.

Ruben Eugenio Ignitia
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINCO

Ing. Contratista Residente.

Ing. Residente Gavinco

- SABADO 16 SEPTIEMBRE/2023
- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: DIA DESPEJADO.
- MAQUINARIA/EQUIPO: 1. PAPAELITA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 OPERADOR, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR OBRA
- ACTIVIDADES: SE CONTINUO CON FUNDIDA CUNETA - BORDILLO MARGEN IZQUIERDA DEL PR3+065 AL PR3+034. DANDO TERMINADO EL TRAMO MOLINOS.

PERSONAL RECOGIO TABLAS, EQUIPOS; SALIDA 10:00 AM.

Ruben Eugenio Ignitia
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINCO

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Ing. Residente Gavinco Interventoria.

VIERNES. 15 SEPTIEMBRE/2023.

INICIO JORNADA 7:00 AM.

- CLIMA: AMANECIO SIN LLUVIAS, DESPEJADO, CONDICIONES: BUENAS
- MAQUINARIA/EQUIPO: 1 PAJARITA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 OPERADOR MAQUINARIA, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA.
- ACTIVIDADES: - SE OBSERVA CONTINUACION ACTIVIDAD DIA ANTERIOR EN. MALLA DERECHA FUNDIDA DE CUNETA BORDILLO. PR3+070 A PR3+034. FINAL CON LOSA. Y PASADA A LA MARGEN IZQUIERDA PR3+000 Y PR3+065 CON FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI,

FIN JORNADA 5:00 PM.

Rubel Eugenio Epieyu
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINEO

ING. CONTRATISTA RESIDENTE.

Ing. Residente Gavineo

- SABADO 16 SEPTIEMBRE/2023
- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: DIA DESPEJADO.
- MAQUINARIA/EQUIPO: 1 PAJARITA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 OPERADOR, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR OBRA
- ACTIVIDADES: SE CONTINUO CON FUNDIDA CUNETA-BORDILLO MARGEN IZQUIERDA DEL PR3+065 AL PR3+034. DANDO TERMINADO EL TRAMO MENCIONADO.
- PERSONAL RECOGIO TABLAS, EQUIPOS: SALIDA 10:00 AM.

Rubel Eugenio Epieyu
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINEO

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Ing. Residente Gavineo Interventoria

LUNES - 18 SEPTIEMBRE 2023

- INICIO JORNADA 7:00 AM
- CLIMA: DIA NUBLADO TODA LA MAÑANA, CONDICIONES BUENAS.
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 OPERADOR MAQUINA, 1 OFICIAL 9 AYUDANTES,
- MAQUINARIA Y EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR.
- ACTIVIDADES: SE LLEGÓ A ZONA RAMAL Y SE ENCUENTRA AL PERSONAL FIGURANDO HIERRO VIGAS, EXCAVACIÓN VIGAS RIOSTRAS Y EN ALCANTARILLA #1, SE INICIO PK 6 +925 VIENDO DEL PUEBLO LA ALCANTARILLA #1 ES PK. 7 +013., SE FINALIZÓ JORNADA 5:00 PM

Rubén Eugenio Ipuchima
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINCO

Ramon del Pilar Ante Lama
ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING RESIDENTE INTERVENTERIA GAVINCO

MARTES 19 SEPTIEMBRE 2023.

- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: DIA DESPEJADO, CONDICIONES: BUENAS PARA TRABAJAR
- MAQUINARIA / EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING RESIDENTE, 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA, 1 OFICIAL 9 AYUDANTES, TOTAL PERSONAL: 12 PERSONAS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA.
- ACTIVIDADES: EN CAMPAMENTO RAMAL, PERSONAL SIGUIO CORTANDO Y FIGURANDO HIERRO, PARA CANASTAS VIGAS RIOSTRAS, CONTINUARON CON EXCAVACIÓN DE VIGAS RIOSTRAS Y SE HIZO EL CONCRETO DE SANEAMIENTO EN EL DESCOLE Y ENCOLE DELA ALCANTARILLA, FIN JORNADA 5:00 PM

Rubén Eugenio Ipuchima
INSPECTOR INTERVENTORIA GAVINCO

Ramon del Pilar Ante Lama
ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERVENTORIA GAVINCO

MIERCOLES 20 SEPTIEMBRE /2023

- INICIO JORNADA: 7:30 AM.
- CLIMA: AMANECIÓ DIA NUBLADO SIN LLUVIAS
- MAQUINARIA / EQUIPOS: 1 LANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES = 12 PERSONAS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR OBRA
- ACTIVIDADES: SE LLEGÓ A SITIO Y SE ENCONTRÓ DE SALIDA MAQUINA RETROEXCAVADORA CON OPERADOR DE LA ZONA. (RETIRAN), EN CONTINUACIÓN SE SIGUIÓ CON EL MODULADO Y ARMADO HIERRO HUELLAS, PERSONAL AUSTANDO MATERIAL PARA DAR INICIO FUNDIDA CONCRETO 3500 PSI.
- SE HACE OBSERVACIONES Y SE SOLICITA AL ING. RESIDENTE SR. ALVARO R. COLOCAR SEPARADORES EN LA PARRILLA DE HUELLAS, Y QUE SE LIBERE LA PLATAFORMA MATERIAL SUBBASE CON RANA, YA QUE HAN HABIDO MOTOCICLISTAS QUE PASAN POR ENCIMA DE LAS CANASTAS Y SE RESBALAN Y SUELTAN EL SUBBASE.

Rubert Eugenio Soto
INSPECTOR INTERVENTORIA CAMINOS S.A.S

Alvaro Rodriguez
ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Ricardo Andres Sanchez Sanchez
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA CAMINOS

JUEVES 21 SEPTIEMBRE /2023

- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: DIA TOTALMENTE DESPEJADO SOLEADO. CONDICIONES: APTAS PARA FUNDIDAS
- MAQUINARIA / EQUIPOS: 1 LANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING RESIDENTE, 2 OFICIALES, 11 AYUDANTES = 14 TOTAL
- PERSONA INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA
- ACTIVIDADES: CONTINUAN VARIAS ACTIVIDADES CON EL MISMO PERSONAL UNA CUADRILLA ARMANDO HIERRO EN HUELLAS (0%), OTRA MODULANDO FORMALETAS (1%), FUNDIDA HUELLA DERECHA PR 64 PR5 (1%). SE TERMINA JORNADA 5:00 PM

Rubert Eugenio Soto
INSPECTOR INTERVENTORIA CAMINOS S.A.S

Alvaro Rodriguez
ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Ricardo Andres Sanchez Sanchez
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 22 SEPTIEMBRE 2023.

- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: AMANECIO DIA CON LLUVIAS DESDE- RAFAGAS.
- CONDICIONES: APTAS PARA LABORAR.
- MAQUINARIA/EQUIPO: 3 MEZCLADORAS, 1 PLANA COMPACTADORA. HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL. 1 MUJER AYUDANTE, 10 AYUDANTES = 14 PERSONAS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA
- ACTIVIDADES: AMANECIO DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS, SE TRABAJO EN LA FUNDIDA DE POCETA ALCANTARILLA, Y SE FUNDIO HUELLA SLOSA MARGEN IZQUIERDA. DESDE EL MEDIO DIA COMENZO A PRESENTARSE LLUVIAS.

FIN JORNADA 5:00 pm

Reinel Eugenio Zapata.
INSPECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO. J & J.

Ing. Residente contratista.

Ing. Residente interventoria consorcio

SABADO 23 SEPTIEMBRE 2023.

- INICIO JORNADA 7:00 AM
- CLIMA: DIA SIN LLUVIAS DESPEJADO.
- CONDICIONES: BUENAS
- MAQUINARIA / EQUIPOS: 1 PLANA COMPACTADORA, 3 MEZCLADORAS HERRAMIENTA MENOR, SE MANTIENEN MOTONIVELADORA - VIBROCOMPACTADOR. (DISPONIBLES EN PARQUEO).
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 MUJER AYUDANTE 10 AYUDANTES = 14 PERSONAS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1. ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA.

ACTIVIDADES: SE ENVIO PERSONAL A CUNETA POR TOLEDO PARA DESAGUE DE ALIVIO, SE FUNDIO HUELLA MARGEN DERECHA HASTA LLEGAR ALCANTARILLA, NO SE HIZO MAS ACTIVIDADES

CIERRE JORNADA 10:00 AM.

Ruben Eugenio Spitia
C. JEFE CUERPO ESPECIAL
INSPECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO

Ana Rosa Rodriguez
ING RESIDENTE INTERVENTORIA

Ruben Eugenio Spitia
INSPECTOR INTERVENTORIA CONTRATO 345

Ana Rosa Rodriguez
ING RESIDENTE INTERVENTORIA CONTRATO

LUNES 25 SEPTIEMBRE 2017

- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: AMANECIO DIA NUBLADO, CON LLUVIAS, SE OBSERVAN SECTOR MOJADO Y HUMEDO
- CONDICIONES Y NOTAS PARA LABORAR.
- MAQUINARIA / EQUIPO: 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PANA, 3 APISONADORAS HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING RESIDENTE, 1 CONTRATISTA, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 MUJER, 10 AYUDANTES = 15 PERSONAS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA.

* ACTIVIDADES: SE ENCONTRO LA MAQUINA EN VIA ADECUANDO MATERIAL QUE SE HA SACADO DE BASE, Y RESTANTE EN FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA EN EJE, Y OTRA PARTE FORMALETEANDO PLETAS DEFECTUOSAS ACCIONPHILA PR 77013.

* OBSERVACIONES: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA (ING. RESIDENTE) SE QUE USE PARA EL CURADO Y DESHIDRATACION DEL CONCRETO PUESTO (BURLAP) O ALGUN METODO DE HIDRATACION Y CURADO EN LOS CONCRETOS COLOCADOS EN OBRA, SE RECOMIENDA APISONAR CON PISON MANUAL O MEDIO MECANICO (PANA) TODA SUPERFICIE QUE ESTE SUELTA LA SUB-BASE.
- POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA, SE SOLICITA TAMBIEN LA COLOCACION DE LA SEÑAL SEMAFORICA MOVIL. EN EL INICIO - FINAL DE OBRA.

SIN TEMA.

MARTES 26 SEPTIEMBRE 2023

- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: AMANECIO DIA NUBLADO SIN LLUVIAS, CONDICIONES: BUENAS
- MAQUINARIA / EQUIPOS: 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 PANA, 3 MEZCLADORAS HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR MAQUINA, 1 MEJOR AYUDANTE, 10 AYUDANTES HOMBRES, = 15 TOTAL
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR OBRA.
- ACTIVIDADES: SE OBSERVA EN OBRA EL VIA A VIBROCOMPACTADOR APISONANDO SUB-BASE ALTRAVES DEL PATIO EN EL PANAL, PALA DAT PISTA A PERSONAL EN LA EXCAVACION VIGAS RIOSTRAS, SE INSTALAN LAS CANASTAS Y SE ENCUENTRO PERSONAL MIRANDO HUECOS CON FORMALETA ENTRADAS, CONTINUARON AMARRANDO ACERO PARRILLA HUECOS CON VARILLA Ø 1/2" LONGITUDINAL, Ø 1/2" TRANSVERSALES A CADA 30CM Y SE PREPARA ZONA PARA FUNDIR EL DIA SIGUIENTE, EN HORAS DELA TARDE 2:30PM COMENZÓ A LLOVER UN POCO Y LUEGO; CULMINACION 5:00 PM

Ruben Eugenio Ignacio
INSPECTOR - INTERVENTORIA CANINO S.A.S

Residente contratista

Ingeniero Residente Interventoria Canino SAS

MIERCOLES 27 SEPTIEMBRE 2023

- INICIO JORNADA = 7:00 AM
- CLIMA: DIA AMANECIO NUBLADO, SE OBSERVA ZONA PANAL MOJADO LAS VIAS, CONDICIONES = BUENAS PARA TRABAJAR.
- MAQUINARIA / EQUIPOS: 1 PANA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL 1 MEJOR AYUDANTE, 10 AYUDANTES HOMBRES, = 14 TOTAL
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR OBRA.
- ACTIVIDADES: SE LLEGÓ A SITIO PLACA HUELLA ± 2 PK 7 + 453
- DONDE SE ENCONTRÓ PERSONAL AMARRANDO CANASTA POCETA. CANASTA EXTERIOR.

EN PR7+013 A PR7+065 SE CONTINUO CON EXCAVACIONES VIGAS RIOSTRAS, PERSONAL ALISTO PARRILLA Y VIGAS, Y SE PROCEDIO A FUNDIR CON CONCRETO 3000 PSI.

- AUN NO HAN PROFESIONAL SST EN OBRA.
- OBSERVACIONES: POR REQUERIMIENTO SE NECESITA QUE SE INSTALEN LAS SEÑALIZACIONES MOVILES QUE ESTAN EN LA BODEGA, Y DAR EL RESPECTIVO USO.

Ruben Eugenio Soto
INSPECTOR INTERVENTORIA CAVINCO S.A.S

ING Residente contratista

Roman d'Silva Acosta Sana
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA CAVINCO S.A.S.

JUEVES 28 SEPTIEMBRE 2023

- INICIO JORNADA 7:00 AM.
- CLIMA: DIA SOLEADO DURANTE LA MAÑANA, NUBLADO EN LA TARDE
- CONDICIONES: BUENAS PARA TRABAJAR
- MAQUINARIA / EQUIPOS: 1 RANA COMPACTADORA, 3 MEZCLADORAS, HERRAMIENTA MENOR.
- PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 MUJER 11 AYUDANTES = TOTAL 15 PERSONAS.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA
- ACTIVIDADES: PERSONAL CORTANDO Y FIGURANDO HIERRO CAMPAMENTO RANAL.
  - CUADRILLA (1x2) ENCOFRANDO CASA POCETA. ALCANTARILLA PR7+453
  - PR7+035 CONTINUACION CON FUNDIDA DE ALETAS 0.90 x 2.80 EN ESTE CON DOSIFICACION (1:2.3) BULTO CEMENTO, 7 BALDES ARENA, 10.5 BALDES TRITURADO, EN HORAS TARDE 2:30 PM SE NUBLO TOTALMENTE PROVABILIDAD DE LLUVIAS.

Ruben Eugenio Soto
INSPECTOR INTERVENTORIA CAVINCO.

Roman d'Silva Acosta Sana
ING. RESIDENTE CAVINCO S.A.S

ING. RESIDENTE CONTRATISTA.

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Septiembre 01

Placa Huella.

Clima: Día soleado.

Hora de Inicio: 7 am - 12pm ; 1pm - 5pm

Personal de obra: Ing. Residente, Topografo.

Personal de Interventoría: Ing Residente, profesional social, SST, ambiental.

Equipos: Motoniveladora, Retroexcavadora, vibro Compactador, 8 volquetas sencillas

Actividades de obra: se realiza la actividad de instalación de sub-base granular clase C en el tramo 2 de Olaya Herrera, segunda capa, carril #2.

líder=

Powered by CamScanner

Se realizo la toma de densidades de los tres tramos del carreder # 2, 2do Capa.

Angie Ortiz.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 02

Placa Huella

Clima: Dia Soleado

Hora de inicio: 7am - 12pm

Personal de obra: Ing. Residente, Topografo.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, SST, Ambiental.

Equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibro compactador, 8 volquetas sencillas

Actividad de obra. Se realizo los actividades de retiro de lo inservible y volquetas

Adriana Gutierrez de P. Angie Ortiz.

Septiembre 04.

Placa Huella

Clima. Dia Soleado

Hora de Inicio: 7:am - 12pm - 1pm - 5pm

Personal de obra. Ing. Residente, Topografo., operador

Personal de Interventoria. Ing. Residente, profesional social, SST, ambiental.

Equipos: Vibro compactador.

Actividad de obra. Se realizo la compactación mecanica en el tramo 1 y 2 de Clavellinos, carrera No. 2.

Adriana Gutierrez de P.

líder

Septiembre 05
Placa Huella
Clima: Dia Soleado
Hora de Inicio: 7:0m - 5pm
Personal de obra: Ing. Residente, Topografo- operador.
Personal de Interventoria: Ing Residente, profesional Social, SST, ambiental.
Equipos: Vibro-Compactador
Actividades de obra: Se realiza la compactación mecanica en el tramo 1 y 2 de Clavellinos, Corredor No. 2. Se realiza el traslado del equipo hasta el Corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 06
Placa Huella
Clima: Dia Soleado
Hora de Inicio: 7 am- 5pm
Personal de obra: Ing. Residente, Topografo, operador
Personal de Interventoria: Ing Residente, profesional Social, SST, ambiental
Equipos: Vibrocompactador.
Actividades de obra: Se realiza la Compactación mecanica del tramo 1 y 2 delos tramos de Llano Grande, Corredor No.1.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 07
Placa Huella
Clima: Dia Nublado.
Hora de Inicio: 7 am- 5pm
Personal de obra: Ing. Residente, Topografo, Operador.
Personal de Interventoria: Ing Residente, Profesional Social, SST, ambiental.
Equipo: Vibrocompactador.
Actividades de obra: Se realiza la compactación mecanica en el

líder=

Powered by CamScanner

Tramo San Pedro del Corredor No. 1.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 08

Placa Huella.

Clima: Día Nublado.

Hora de Inicio: 7am - 5pm

Personal de obra: Ing. Residente

Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional Social, ambiental, SST.

Actividades de obra: Se reciben materiales para la obra en los tramos 1 y 2 de Clavellinos del Corredor No. 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 09.

Placa Huella.

Clima: Día Soleado.

Hora de Inicio: 7am - 12 pm

Personal de obra: Ing. Residente

Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional Social, ambiental, SST.

Actividades de obra: se realiza la logistica de la obra y organización de materiales para iniciar el lunes la construcción de Placa Huella y Alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 11.

Placa Huella.

Clima: Día Soleado

Hora de inicio: 7 am - 5 pm.

Personal de obra: Ing. Residente, operador, Maestro, Ayudantes

Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional Social, ambiental, SST.

líder=

Actividades de obra: Se realiza la excavación y el vaciado de concreto de 14 Mp Para el soldo. de la Alcantarilla No. 8 en el tramo 2 de Clavellinos del Corredor N. 2.

Equipos: Retroexcavadora.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 12.

Placa Huella

Clima: Día Soleado.

Hora de Inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 6 pm

Personal de obra: Ing. Residente, Operador, maestro, ayudante.

Personal de Interventoria: Ing Residente, profesional social, ambiental, SST.

Equipos: Retroexcavadora.

Actividades de obra: se realiza la instalación de la tubería de 36" en la Alcantarilla #3 del Tramo 2 de Clavellinos y el relleno de la misma, se da inicio a la excavación de la Alcantarilla #2 del tramo 1 de Clavellinos.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 13.

Placa Huella.

Clima: Día Nublado.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 6 pm.

Equipos: Retroexcavador.

Personal de Obra: Ing. Residente, operador, maestro, oficial, ayudantes

Personal de Interventoria: Ing Residente, profesional social, ambiental, SST.

Actividades de obra: Se realiza la instalación de tubería de 36" para la Alcantarilla #2 del Tramo 1 de Clavellinos. Se realiza el respectivo atraque y posterior relleno de igual manera se inicia con la excavación de la caja de la Alcantarilla #3 correspondiente al tramo 2 de Clavellinos.

Adriana Gutierrez de P

líder=

Powered by CamScanner

Septiembre 14.
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.
Hora de Inicio: 7:am-12 pm ; 1pm-6 pm.
Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudante.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.
Actividades de obra: Se realizo la excavación para caja y desde de la alcantarilla #3 del Tramo 2 de Clavellino, posterior a esto se realizo el vaciado de concreto de 19 mpa. para el solado.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 15.
Placa Huella.
Clima: Dia soleado.
Hora de Inicio 7 am - 12 pm; 1pm - 5 pm
Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudante.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.
Actividades de obra: Se realizo la instalación de acero para caja, deflote y aletas, además se funde el piso de la caja en concreto de 21 Mpa. dichas actividades se realizan en la Alcantarilla #3 del tramo 2 de Clavellino.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 18.
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm
Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.
Actividades de obra: Se realizo el vaciado de concreto para el descole de la Alcantarilla #3 y se inicio con la instalación de Formaletas para

líder=

los muros de la caja y el muro guarda ruedas y aletas. De igual manera se inicia el fundido de acero de las vigas riostras para la placa Huella.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 19.
Placa Huella.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 7am - 12pm - 1pm - 6pm
Personal de obra. Ing. Residente, maestro, ayudantes
Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.
Actividades de obra: Se realiza el vaciado de concreto 21 Mpa para los muros de la caja de la Alcantarilla #3 y se continua con el figurado de acero para vigas riostras, Tramo 2 clavellinos del cuerpo #2.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 20.
Placa Huella.
Clima: Dia soleado.
Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm
Personal de obra: Ing. Residente, maestros, ayudantes
Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.
Actividades de obra: Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para aletas y muro guardaruedas del descole para la Alcantarilla #3. Se inicia con la excavación manual para posterior instalación de vigas riostras para la Placa Huella.

Adriana Gutierrez de P.

lider

Septiembre 21

Placa Huella

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 6 pm.

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudantes

Personal de interventoría: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.

Actividades de obra: Se continua con la excavación manual para vigas riostras y se da inicio con la instalación de acero longitudinal y transversal de la placa Huella.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 22.

Placa Huella

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1pm - 5 pm.

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudantes

Personal de interventoría: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.

Actividades de obra: se realiza la instalación de acero y vigas riostras en el tramo 2 de Clavellinos. Se realiza el vaciamiento y se recibe material para darle inicio al tramo 1 de clavellinos.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 23.

Placa Huella

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudantes.

Personal de interventoría: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST

Actividades de obra: se realiza la instalación de formaletas para los cajones de piedra pegada de la placa huella y se organiza, cirna y tritura lo para iniciar a fundir el día de mañana T2. Clavellinos

Adriana Gutierrez de P.

líder

Septiembre 26

Placa Huella.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 6 pm.

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, capudante.

Personal de interventoría: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.

Actividades de obra: Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas y vigas rostras en el tramo 2 de clavellino.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 27.

Placa Huella.

Clima: Nublado - Lluvia de 7am - 9 am

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1pm - 6 pm.

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, capudante.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.

Actividades de obra: Se realizo el vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas y vigas rostras en el tramo 2 de Clavellino

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 28.

Placa Huella.

Clima: Día soleado - Lluvia Hora de la tarde de 3pm - 5pm.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1pm - 6 pm.

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, capudante.

Personal de Interventoria. Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST

Personal de Inter.)

Actividades de obra: Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas y vigas rostras en el tramo 2 de Clavellino.

Adriana Gutierrez de P

líder=

Powered by CamScanner

Septiembre 29.

Placa Huella.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de obra: Ing. Residente, maestro, ayudantes.

Profesional de Interventoría: Ing. Residente, profesional social, ambiental, SST.

Actividades de obra: Se realiza la excavación manual para viga de cimentación y posterior instalación del acero, longitudinal y transversal, en el tramo 2 de Chuellina, Corredor #2.

Adriana Gutiérrez de P.

líder=

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

AGOSTO 31 /2023

Plaza Huella Buenavista.

Clima : Dia Sabado

Hora de Inicio : 7am - 12 pm y 1pm - 5 pm

Personal de Obra : Ingeniero Residente, Cuadrilla Topografia.

Personal de Interventoria : Ingeniero Residente, S.S.T, Social, Ambiental, Ingeniero de Obra.

Equipos : Equipos Topograficos, 1 motosierra, 1 guadaña y 1 Compactador, 2 Volquetas.

Actividades de Obra : Se continua con la limpieza del Tramo 9 del Corredor de Buenavista, y este dia se genera el desperdicio material por las Volquetas y la Llegada de la maquinaria correspondiente a los equipos para iniciar actividades de mejoramiento de la Via Alterna la Abanza.

Adriana Gutierrez de P. Eviser Caamaño

SEPTIEMBRE 1 /2023

Plaza : Huella Buenavista

Clima : Dia Sabado

Hora de Inicio : 7am - 12 pm y 1pm - 5pm.

Personal de Obra : Ingeniero Residente, Cuadrilla Topografia

Personal de Interventoria : Ingeniero Residente, S.S.T, Social, Ambiental e Ingeniero de Obra.

Equipos : Equipos Topograficos, 1 motosierra, 1 guadaña, 2 Volquetas, 1 Compactador.

Actividad de Obra : Se continua en limpieza y remoción del Tramo 9 correspondiente a 350 ml y se inicia con el mejoramiento de la Via alterna la Abanza, donde el material es recogido en lugar predeterminado y el respectivo Trabajo y Labor por parte de equipos pesados

Adriana Gutierrez de P Eviser Caamaño

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 2 /2023

Plaza: Malla Bienvenida.

Clima: Día Soleado.

Hora de trabajo: 7 am - 12 pm y 1pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ingeniero Residente, Comisión Topográfica.

Personal de intervención: Ingeniero Residente, S.S.T, Social Ambiental e Inspector de Obra.

Equipo: Equipo Topográfico, 1 motoniveladora, 1 pajarita, 1 Compactador y 2 Volquetas.

Actividad de Obra: Se continua con el mejoramiento en la vía alterna la alborada, con los equipos de Pajarita y motoniveladora y Compactador en esta fecha.

Adriana Gutierrez de P. Erick Quamaid

SEPTIEMBRE 4 /2023

Plaza: Malla Bienvenida.

Clima: Día Soleado.

Hora de trabajo: 7 am - 12 pm y 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ingeniero Residente, SST, Social, Comisión Topográfica.

Personal de intervención: Ingeniero Residente, S.S.T, Social, Ambiental y Inspector de Obra.

Equipo: Equipo Topográfico, 1 Motoniveladora, 1 Pajarita, 1 Compactador y 2 Volquetas.

Actividad de Obra: En este día se da la continuidad normal por la vía Alterna la Alborada y en horas de la mañana la comisión Topográfica en actividades de mantenimiento y en la jornada de la Tarde se llevo a cabo la Socialización del presente cuerdo con la comunidad donde se establecen las actividades en los tramos a intervenir de los 5 puentes Viales y en metros de 1315 metros lineales y en Alcantarillas en los tramos del puente Gutierrez.

Adriana Gutierrez de P. Erick Quamaid.

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 5/2023

Placa Huella Buenavista

Clima: Día Soleado.

Hora de Inicio: 7 am - 12 pm y 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 2 Obreros, Comisión Topográfica

Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T, Sisvel, Auxiliar

Inspector de Obra

Equipo: Equipo Topográficos, 1 motoniveladora, 1 pajarita

1 Compactador, 2 Volquetas.

Actividades de Obra: Se procede a trabajar en la adecuación del Terreno y en la pajarita y motoniveladora en la excavación de cuneta este Tramo de aproximadamente 0,40 m de longitud. y el acondicionamiento de los espacios pavimentados al material de Sub-base y el material de la Obra cuando en este Tramo de 350 metros lineales.

Adriana Gutierrez de P. Erika Caamaño

SEPTIEMBRE 6/2023.

Clima: Día Soleado.

Hora de Inicio 7 am - 12 pm y 1 pm - 5 pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 2 Obreros, Comisión Topográfica

Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T. Sisvel, Auxiliar

Inspector de Obra

Equipo: Equipo Topográficos, 1 motoniveladora, 1 pajarita

1 Compactador, 3 Volquetas

Actividades de Obra: Se continua con el Riego de Material Sub-base en Áreas designadas y en la excavación del Tramo 2 en una profundidad de 0,34 m a 0,45 m en el primer Tramo la comisión Topográfica retira en este sector.

Adriana Gutierrez de P. Erika Caamaño

SEPTIEMBRE 7/2023

PLACA HUELLA OVEJAVISTA.

Clima : Dic Soleado

Hora de Inicio : 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

Personal de Obra : Ingeniero Residente, 2 Obreros, Comisión Topográfica

Personal de Interventoría : Ingeniero Residente, S.S.T., Social, Ambiental

Inspector de Obra.

Equipos : Equipo Topográfico, 1 motoniveladora, 1 pajarita, 1 Compactador

2 Volquetas.

Actividades de Obra : Se continua en el Acopio de material

Seleccionado en el sitio acondicionado y se continua en la excavación

del Trans 9 avanzando a 350 metros lineales en una

profundidad de 0,40 m.

Adriana Gutierrez de P. Euder Caamaño

SEPTIEMBRE 8/2023.

Placa Huella Buenavista

Clima : Dic Soleado.

Hora de Inicio 7am - 12pm - y 1pm - 5pm.

Personal de Obra : Ingeniero Residente, SST. Comisión Topográfica

Personal de Interventoría : Ingeniero Residente, SST, Social

Ambiental, Inspector de Obra.

Equipos Equipo Topográfico, 1 motoniveladora, 1 pajarita, 1 compactador

2 Volquetas

Actividad de Obra ; Se continua en Excavación de Material

Seleccionado en el Trans 9 y Acopio definitivo en el

punto Seleccionado ; se conoce varios chagres pertenecientes

en la excavación en los ultimos 100 m del Trans.

Adriana Gutierrez de P. Euder Caamaño.

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 9 /2023

Placa Huella Bermuda

Clima Dia Soleado

Hora de Inicio 7am a 12 pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente

Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental

Inspector de Obra

Equipo: Equipo Topografico, 1 Bagueta, 1 motoniveladora, 1 Compactador, 2 Volquetes

Actividad de Obra: Se Cortan en la Excavacion en el Tramo 9 en una profundidad de 0,40m; el material con la Subbase se acopia en el lugar predeterminado.

Adriana Gutierrez de P. Enise Caraballo

SEPTIEMBRE 11 /2023

Placa Huella Bermuda

Clima Dia Soleado

Hora de Inicio 7am - 12 pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra Ingeniero Residente, Cuadrilla Topografica

Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental

Inspector de Obra

Equipo: Equipo Topografico, 1 Bagueta, 1 motoniveladora, 1 Compactador, 2 Volquetes

Actividad de Obra: Se Cortan en la Cuneta en el Tramo 9 y durante la especificacion de la Cuadrilla Topografica durante todo proyecto perfilaron mas; el material removido del SB, el Acopio Definitivo.

Adriana Gutierrez de P. Enise Caraballo

Noviembre 4/2022
Ruta hacia Buenavista
Hra de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero.
Personal de Interventoría: Director de Obra, Ingeniero Residente, SST
Social Ambiental, Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía, 1 Pavimentadora, 1 Retroexcavadora, 1 Compactador
6 Volquetas.
Actividades en obra:

- Se realiza visita por parte del Director de Interventoría verificando que se encuentran los siguientes actividades en obra:
  - Excavación con material común del PR 7+380 - PR 7+460. Se evidencia material con presencia de raíces y material orgánico
  - Acopio de material de sobre excavación PR 7+440
  - Se empalma el oficio recibido por parte de la Comunidad (Presidente JAC Buenavista) y radicado trasladan el primer tramo de placa huella correspondiente al PR 7+650 al final del tramo de placa huella y empiezan el acceso al Centro poblado. La Interventoría siempre ya cuando le interesaría llegar en el mismo sentido a solicitud de la Comunidad y Alcaldía de Ocaña. Dejando constancia que este empalme del tramo deberá quedar en los planos record y ampliando el tramo a 40cm.
  - Empalme vertical del sitio de disposición final de la excavación con base en el Apu aprobado.

Ing COO
Director Interventoría

Enive Carmona

SEPTIEMBRE 13 /2023
Placa halla Bamba
Clima: Dia Soleado
Hora de inicio 7am a 12pm y 1pm a 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, Comisión Topografica, 1 Obrero
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, S.S.T., Social, Ambiental
Ingeniero de Obra
Equipo: Equipo Topografico, 1 Pajarita, 1 motoniveladora, 1 Compactador
2 Volquetes
Actividad: Se continua en la Excavacion del Tramo 7 + demanda
a especificaciones de la Comisión Topografica se hace el nivel
determinado de 0.70m de profundidad

Adriana Gutierrez de P. Enver Caamaño

SEPTIEMBRE 14/2023
Placa halla Bamba
Clima: Dia Soleado
Hora de inicio 7am - 12pm y 1pm 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, Comisión Topografica, 1 Obrero
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental
Ingeniero de Obra
Equipo: Equipo Topografico, 1 Pajarita, 1 motoniveladora, 1 Compactador
2 Volquetes
Actividad: Se continua en la Excavacion del Tramo 7
de 450 metros lineales y se identifica el nivel a llegar en el
cual se esta dejando como de 0.70m de excavacion.

Adriana Gutierrez de P Enver Caamaño

SEPTIEMBRE 15/2023
Placa halla
Clima: Dia Soleado

Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm a 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, Cuadrilla Topografía, 1 Obrero
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, SST, Gestor Ambiental, Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía, 1 Pajarita, 1 Motosierra, 1 Compactador y 2 Volquetas.
Actividad: Se Continua Trabajando en la Excavación pertinente descrito a los niveles establecidos en el Tramo 5 de 0,70m de profundidad y ancho de entorno de Subbase con un nivel de 0,50m. en vigas de Cimentación y la instalación y retroexcavadora.

Adriana Gutierrez de P Enier Caicedo

.SEPTICOBAC 1612023
Plan Hall Remoto
Clima: Soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm
Personal de obra: Ingeniero Residente, Cuadrilla Topografía, 1 Obrero
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, SST, Gestor Ambiental, Ingeniero de Obra
Equipo: Topografía: Equipo de Topografía, 1 Pajarita, 1 motosierra, 1 Compactador, 2 Volquetas.
Actividad: Se procede a la corrugación y retiro de las vigas de Nivel de Entorno de Subbase, retiro material y Compactado en el Tramo del PK 2+360 al PK 2+460.
- En este día se retira corrugamiento por la instalación de la corrugación en los Tramos del proyecto y retiro de retroexcavadora en sentido a Chocontá ya que hay Tramo de placahuella Completado no se ejecuta el ensayo por pendiente de material suelto en este Sector.

Adriana Gutierrez de P Enier Caicedo

SEPTIEMBRE 10 / 2023

Place holle de Bienestar

Clima: Día Soleado

Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, Comisión Topográfica, 1 Obrero

Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental

Inspector de Obra

Equipos: Equipo de Topografía, 1 Pegante, 1 Motosierra, 1 Computador

2 Volquetas.

Actividad: Se Continua con actividad de Cerramos por 30 metros en el Tramo PR 71+460 y PR 71+500, en la cual se apoyan con equipo de la Comisión Topográfica y se Continua Aseguramiento material de CSV/Sobrante en el lugar Seleccionado en abril PR 71+00

Adriana Gutierrez de P. Enier Carmenio

SEPTIEMBRE 11 / 2023

Place holle de Bienestar

Clima: Día Soleado

Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero

Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental e Inspector de Obra.

Equipo: Equipo de Topografía, 1 Pegante, 1 Motosierra, 1 Computador 1 Volqueta.

Actividad: Se continua con el mismo material anterior, Regando a un nivel despejado por la Comisión Topográfica en el Tramo de PR 71+460 al PR 71+500.

Adriana Gutierrez de P. Enier Carmenio

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 20/2023.
Nave Nueve Bucaramanga.
Clima: Dia Soleado.
Hora de Inicio 7am - 12pm. y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Residente, 1 Obrero.
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T. Social, Ambiental
Inspector de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía, 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta, 1 Compactador
1 Volqueta.
Actividad: Se Continua con excavación de material en el Tramo
del PR 71460 al PR 71500, en la cual se ve y observa
material disperso a nivel superficial y respectivo retiro de
este para su cambio posterior en el material de relleno
seleccionado.

Adriana Gutierrez de P. Enier Caamaño

SEPTIEMBRE 21/2023
Nave Nueve Bucaramanga.
Clima: Dia Soleado
Hora de Inicio 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Residente de Obra y 1 Obrero
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T. Social, Ambiental
Inspector de Obra.
Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 Compactador, 1 Volqueta.
Actividad: Se Continua con excavación de material en el Tramo 5
del PR 71460 al PR 1570, en la Cual se ve y observa
material disperso a nivel superficial y disposición del mismo
para el relleno seleccionado.

Adriana Gutierrez de P. Enier Caamaño

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 22/2023
Plaza Bella de Bucaramanga
Clima: Día Soleado
Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T. Social, Ambiental
Inspector de Obra
Equipos: Equipos Topográficos, 1 Pajarito, 1 Retroexcavadora, 1 Compactador
1 Volqueta.
Actividad: Se Continua en la Excavación del Tramo 5 en el PR 7+470 al PR 7+540 en un espesor de 0,70 m en el respectivo punto se observa material organico superficialmente y disposición por el punto de botado autorizado.

Adriana Gutierrez de P. Ender Casanchez

SEPTIEMBRE 23/2023
Plaza Bella de Bucaramanga
Clima día Soleado
Hora de Inicio 7am - 12pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero.
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T, Social, Ambiental
Inspector de Obra.
Equipos: Equipos de Topografía, 1 Pajarito, 1 Retroexcavadora, 1 Compactador
1 Volqueta.
Actividad: Se continua en la Excavación del Tramo 5 en el PR 7+560 al PR 7+570 en un espesor de 0,70 m y retiro de material excavado al sitio de botado autorizado.

Adriana Gutierrez de P. Ender Casanchez

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 25/2023
Placa huella de Bomberos
Clima: Dia Soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero, 1 Cuadrilla Topografia
Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental
Inspector de Obra.
Equipos: Equipos de Topografia, 1 Pajarita, 1 motosierra, 1 Compactador.
2 Volquetas.
Actividad: Se realizan Actividades con la Cuadrilla Topografica en el Replanteo y medicion del Tramo comprendido entre PR7+340 al PR7+530 donde se chequean la rasante existente del pavimento rigido del Terraplen, en horas de la mañana se realizaron los Tramos de ensayo para densidades en el Relleno material Terraplen de 0,10m en los PR7+425, PR7+300, por parte del Contratista. Se realizan en la actividad de Excavacion en el PR7+570 al PR7+530, con equipos de Cuadrilla Topografica.

Adriana Gutierrez de P. · Edilber Cardenas.

SEPTIEMBRE 26/2023
Placa huella de Bomberos
Clima Dia Soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero, 1 Cuadrilla Topografia
Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, SST, Social, Ambiental
Inspector de Obra
Equipos: Equipos de Topografia, 1 Pajarita, 1 motosierra, 1 Compactador.
2 Volquetas.
Actividad: Se realizan Actividad con la Cuadrilla Topografica en el Replanteo en la Excavacion del PR7+570 al PR6+930+530, se pasa a motobo (Silbato) en el Terraplen en Capas de 0,10m. del PR7+570 a PR7+530

Con Apoyo de la Comisión Topográfica y cargue de la excavación en la cual es de 0,20m de espesor.

Adriana Gutierrez de P. · Enrique Caicedo

SEPTIEMBRE 23 / 2023
Plaza bolle de Bomboná
Clima de día Soleado
Hora de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero, 1 Comisión Topográfica
Personal de interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T, Social, Ambiental
Inspector de Obra.
Equipos: Equipo Topográfico, 1 pisonta, 1 retroexcavadora, 1 cargador 1 Volqueta.
Actividad: Se continua con apoyo de retroexcavadora y volqueta la adherencia del Terraplen y se supervisa la Comisión Topográfica cargues de suelos de Terraplen en capas de 0,20m del PR7+550 al PR7+590.

Adriana Gutierrez de P · Enrique Caicedo

SEPTIEMBRE 23 / 2023
Plaza bolle de Bomboná
Clima de día Soleado
Hora de labores de 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 obrero, 1 Comisión Topográfica.
Personal de interventoría: Ingeniero Residente, S.S.T, Social, Ambiental
Inspector de Obra.
Equipos: Equipo Topográfico, 1 Pisonta, 1 retroexcavadora, 1 cargador 1 Volqueta
Actividad: Se continua con apoyo de la Comisión y maquinaria amarillo ubicado en Obra con la Excavación de 0,20 en el Terraplen del Cuerpo de Bomboná en el PR7+260 al PR7+330

Powered by CamScanner

Se retiran con el material de Subbase en capas de 0,10m y compactados en el Tramo del PR7+490 al PR7+530.

Adriana Gutierrez de P. · Enlace Cazmanto

SEPTIEMBRE 29 /2023.
Placa huella de Bienvenida.
Clima: Dia Soleado.
Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero, 1 Cuadrilla Topografos.
Personal de Interventoria Ingeniero Residente, S.S.T, Social-Ambiental e Ingeniero de Obra
Equipos: Equipo Topografico, 1 pajarita, 1 Motoniveladora, 1 Compactador 2 Volquetas.
Actividad Se retiran con el material de Subbase en motoniveladora de Capas de 0,10m y dispersados con el compactador del PR7+490 al PR7+530.
- Se realizo un ancho y registro poligonal para evaluar la pendiente de cada una de las Tramos pertenecientes al Tramo 1 del PR4+000 al PR5+060, el Tramo 2 del PR5+060 al PR5+350, y el Tramo 3 del PR5+460 al PR5+965.

Adriana Gutierrez de P · Enlace Cazmanto

SEPTIEMBRE 30 /2023.
Placa huella de Bienvenida.
Clima: Dia Soleado.
Hora de Inicio: de 7am a 1pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero, 1 Cuadrilla Topografica.
Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, 1 de S.S.T, Ingeniero Ambiental y Social y el Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo Topografico, 1 Pajarita, 1 Motoniveladora, 1 Compactador 2 Volquetas.

Powered by CamScanner

Con Apoyo de la Comisión Topográfica y Conservación del nivel al cual se llenara en (0,10 m Total) 0,30m en el Tramo correspondiente y adicional a estos se chapearan en Tramo del PR 7+450 al PR 7+590 en material de Subbase, Granulago y Cuneton pulimento de 0,70m del PR 7+700 al PR 7+330.

Adriana Gutierrez de P. • Enier Cazmano.

OCTUBRE 2/2023

Plaza Bella de Buenavista.

Clima dia Sabado.

Hora de labores 7am-12pm y 1pm-5pm.

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Obrero Maestro de Obra, 1 Obrero, 2 Operarios, Comisión Topografica.

Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, 1 Secret. S.S.T. Ambiental, Inspector de Obra.

Equipos: Equipo Topografico, 1 Aparato de Mantenimiento, 1 Carpintería, 2. Volquetas.

Actividades: Se procede a retirar el cargo de Cuneton ubicados en el Tramo 2 de 200m y Tramo 3 de 405m, con 2 cuneton en Total a cada uno unte en PR5+063, PR5+166, PR5+226, PR5+475, PR5+525 PR5+675 y PR5+775, se evidencia en Tramo de PR7+590 depresion de unos de 1/2 y 3/4 en la Cual se retira empleado en donde evidencia y cargue en actividad, se continua con cunetones de material de 0,70m desde el PR7+260 al PR7+300, y se puede llevar desde 3:00pm a 4:30pm. en este periodo.

Adriana Gutierrez de P.
