INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 23 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 20

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 22

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 23

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 25

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 28

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 52

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 59

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 60

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 60

3.1.1.1. Actividades Administrativas 60

3.1.1.2. Actividades Técnicas 62

3.1.1.3. Actividades ambientales 63

3.1.1.4. Actividades sociales 63

3.1.1.5. Actividades SST 64

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 64

3.1.1.7. Etapa de Construcción 64

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 66

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 66

3.2.1.1. Actividades Administrativas 66

3.2.1.2. Actividades ambientales 69

3.2.1.3. Actividades Sociales 69

3.2.1.4. Actividades SST 69

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 69

3.2.1.6. Etapa de Construcción 70

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 72

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 72

3.3.1.1. Actividades Administrativas 72

3.3.1.2. Actividades Técnicas 73

3.3.1.3. Actividades ambientales 74

3.3.1.4. Actividades Sociales 74

3.3.1.5. Actividades SST 74

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 75

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 76

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 76

3.4.1.1. Actividades Administrativas 77

3.4.1.2. Actividades Técnicas 78

3.4.1.3. Actividades ambientales 79

3.4.1.4. Actividades Sociales 79

3.4.1.5. Actividades SST 79

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 82

3.4.3. Estado de avance del proyecto 82

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 82

3.4.3.2. Etapa de Construcción 83
3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 85
3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 85
3.5.1.1. Actividades Administrativas 86
3.5.1.2. Actividades Técnicas 86
3.5.1.3. Actividades ambientales 88
3.5.1.4. Actividades Sociales 96
3.5.1.5. Actividades SST 96
3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 100
3.5.3. Estado de avance del proyecto 101
3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 101
4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 105
3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 105
3.6.1.1 Actividades Administrativas 106
3.6.1.2. Actividades Técnicas 106
3.6.1.3. Actividades ambientales 108
3.6.1.4. Actividades Sociales 119
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 128
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 128
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 128
3.6.3.3. Etapa de Construcción 129
3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 130

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 130
3.7.1.1. Actividades Administrativas 130
3.7.1.2. Actividades Técnicas 131
3.7.1.3. Actividades ambientales 133
3.7.1.4. Actividades Sociales 133
3.7.1.5. Actividades SST 133
3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 133
3.7.1.7. Etapa de Construcción 134
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 135
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 135
3.8.1.1. Actividades Administrativas 135
3.8.1.2. Actividades Técnicas 136
3.8.1.3. Actividades Ambientales 145
3.8.1.4. Actividades Sociales 156
3.8.1.5. Actividades SST 163
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 173
3.8.3. Estado de avance del proyecto. 173
3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 173
3.8.3.2. Etapa de Construcción 188
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 190
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 190
3.9.1.1. Actividades Administrativas 190

3.9.1.2. Actividades Técnicas ... 191
3.9.1.3. Actividades ambientales ... 193
3.9.1.4. Actividades Sociales ... 205
3.9.1.5. Actividades SST ... 205
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos ... 210
3.9.3. Estado de avance del proyecto ... 210
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños ... 210
3.9.3.2. Etapa de Construcción ... 212
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 ... 215
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas ... 215
3.10.1.1. Actividades Administrativa ... 216
3.10.1.2. Actividades Técnicas ... 216
3.10.1.3. Actividades ambientales ... 218
3.10.1.4. Actividades Sociales ... 218
3.10.1.5. Actividades SST ... 223
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos ... 226
3.10.3. Estado de avance del proyecto ... 227
3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños ... 227
3.10.3.2. Etapa de Construcción ... 227
3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. ... 229
3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas ... 229
3.11.1.1. Actividades Administrativas ... 229

3.11.1.2. Actividades Técnicas 265

3.7.1.1. Actividades ambientales 274

3.7.1.2. Actividades Sociales 290

3.7.1.3. Actividades SST 301

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 313

3.7.1.2. Etapa de Construcción 349

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 366

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA: 367

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 367

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 369

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 370

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA 372

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 377

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 378

4.4.1. Reporte Informe Semanal 378

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA 382

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 385

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 386

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 396

4.8.1. Reporte Informe Semanal. 396

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 401

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 406

4.10.1. Reporte Informe Semanal 407
4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 409
4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 410
4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo 410
4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 410
4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 410
4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 413
4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones 413
4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 413
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 415
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 415
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 415
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 415
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 417
5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 418
5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 419
5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 420
5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 422
5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 423
5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 424
5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 426
5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 427

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 429

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 440

5.2.10. Actividades administrativas 443

5.2.11. Actividades técnicas 443

5.2.12. Actividades financieras 444

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 446

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 447

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 447

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 447

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 449

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 450

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 451

6.6. Bitácora de Obra 451

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 452

8. ANEXOS 456

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 24

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 27

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 27

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 58

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 59
Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 60
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 61
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 63
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 64
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 66
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 66
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 68
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 70
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 72
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 73
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 74
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 76
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 77
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 78
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 83
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 83
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 85
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 86
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 87
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 103
Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas 104

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 105
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa..... 106
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 107
Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 129
Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 130
Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita..... 131
Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 132
Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 134
Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943..... 135
Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 135
Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales..... 158
Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 187
Tabla 39 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943 188
Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052..... 190
Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 191
Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052..... 193
Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo 212
Tabla 44 Avance contractual en el periodo 213
Tabla 45 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814..... 215
Tabla 46 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814..... 216
Tabla 47 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 217
Tabla 48 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 227

Tabla 49 Condiciones del contrato - Gobernación 2033 229

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 233

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 235

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 237

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 239

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 241

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 243

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 245

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 247

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 250

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 252

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 254

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 255

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 258

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 261

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 264

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 264

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023. 315

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023. 317

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 320

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 323

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023 328

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 331

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023 334

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 336

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 339

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023 341

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023 342

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023 343

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 344

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023 346

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023 348

Tabla 82 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 349

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 350

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia 351

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 353

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos 354

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario 355

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 356
Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes 357
Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 358
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander 359
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 360
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita 361
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 362
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán 363
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago 364
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 365
Tabla 94 Garantías Municipio de Santiago 369
Tabla 95 Garantías Municipio de Herrán 370
Tabla 96 Garantías Municipio de Ocaña 372
Tabla 97 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira 372
Tabla 98 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira 372
Tabla 99 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira 376
Tabla 100 Garantías Municipio de Cáchira 377
Tabla 101 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira 378
Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 378
Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 379
Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 379
Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego 381

Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 381
Tabla 107 Reporte informes semanales Municipio de Playa 382
Tabla 108 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa 382
Tabla 109 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa 383
Tabla 110 Garantías Municipio de La Playa 384
Tabla 111 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa 385
Tabla 112 Garantías Municipio de Pamplonita 386
Tabla 113 Reporte informes semanales Gobernación 1943 386
Tabla 114 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 387
Tabla 115 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 393
Tabla 116 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 394
Tabla 117 Garantías Gobernación 1943 395
Tabla 118 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 395
Tabla 119 Reporte informes semanales Gobernación 2052 396
Tabla 120 Equipo Mínimo Gobernación 2052 396
Tabla 121 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052 399
Tabla 122 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 2052 399
Tabla 123 Garantías Gobernación 2052 400
Tabla 124 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052 401
Tabla 125 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814 402
Tabla 126 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814 402
Tabla 127 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814 403

Tabla 128 Estado Financiero y Presupuestal en el municipio de Ocaña - 1814 404
Tabla 129 Garantías Municipio de Ocaña 1814 405
Tabla 130 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814 405
Tabla 131 Reporte informes semanales Gobernación 2033 408
Tabla 135 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033 410
Tabla 133 Garantías Gobernación 2033 412
Tabla 134 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033 414
Tabla 135 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 415
Tabla 136 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago 416
Tabla 137 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán 417
Tabla 138 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758 ... 418
Tabla 139 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira 419
Tabla 140 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 420
Tabla 141 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa 422
Tabla 142 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita 423
Tabla 143 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 425
Tabla 144 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052 426
Tabla 145 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814 ... 428
Tabla 146 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033 439
Tabla 147 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 443
Tabla 148 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 445
Tabla 149 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 447

Tabla 150 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 449

Tabla 151 Seguimiento Financiero Interventoría 450

Tabla 152 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 450

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander 24

Ilustración 2 Resolución No. ST-0200 del 22 de febrero del 2024 120

Ilustración 6 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 144

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 29

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 30

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 31

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña 32

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira 33

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 34

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 35

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 36

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 37

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 38

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 39

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 40

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 41

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 42

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 43

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 44

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 45

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 46

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 47

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Cáchira. 80

Fotografía 21 Verificación Equipos de Emergencia Cáchira. 81

Fotografía 22 Entregas de EPP - Abrego 99

Fotografía 23 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 99

Fotografía 24 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 100

Fotografía 25 Entregas de EPP – La Playa 126

Fotografía 26 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa 127

Fotografía 27 Entrega de EPP – Gobernación 1943 170

Fotografía 28 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943 170

Fotografía 29 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 171

Fotografía 30 Implementación protocolo de bioseguridad 172

Fotografía 31 Entrega de EPP – Gobernación 2052 208

Fotografía 32 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052 209
Fotografía 33 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814 224
Fotografía 34 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814..... 225
Fotografía 35 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814 225

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 65
Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 70
Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758..... 75
Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 84
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego..... 104
Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 129
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita..... 134
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 189
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 212
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 228
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 350
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia..... 351
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 352
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 353
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos..... 354
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario..... 355

Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 356
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 357
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 358
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander 359
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 360
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 361
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 362
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Herrán 363
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Santiago 364
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 365

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.494.012.623,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.700.000.000,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.268.620.424,00. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 24.463.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021,

Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 6.045.781.859,50.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente

- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

- Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
- Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato

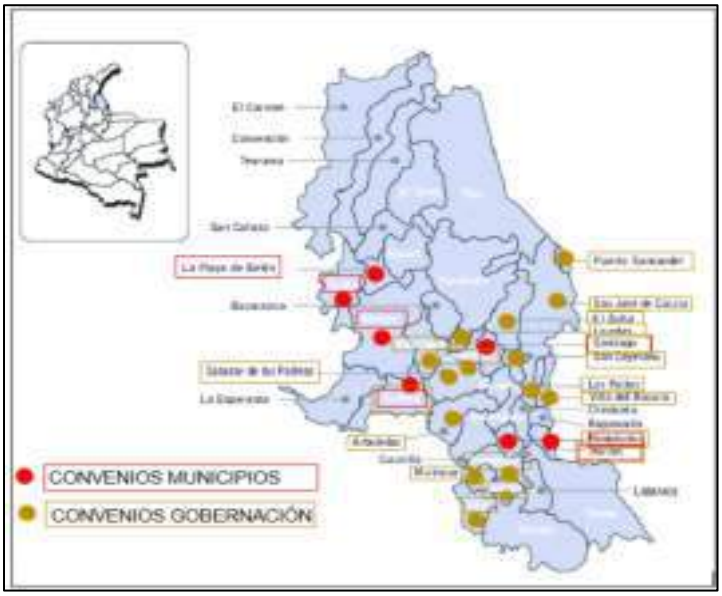


Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa "COLOMBIA RURAL", los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943, GOBERNACIÓN 2052 y GOBERNACION 2033. A la fecha se encuentran terminados 2 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758 y HERRAN los cuales se encuentran en proceso de liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto
	

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.



Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.



Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.

	
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.



Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.



Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avicola	Tramo 2 Plak Huella Extt
	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista
	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.






Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.






Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.



Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.



Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.



Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.



Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.






Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.



Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.





2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943, 2033 Y 2052 y terminados los convenios con los municipios de OCAÑA-1758 y HERRAN. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
	ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VIA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
	CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
	CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En liquidación	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado En Suspensión	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado En liquidación	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En liquidación	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En liquidación	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En Ejecución	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En Ejecución	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 15 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	15 de junio de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago



3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 30-JUN-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							**3,300.00**		
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$	85,869,696.00	1894.21	154,029,580.36
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$	1,370,323,983.00	2129.11	1,552,770,568.55
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$	1,280,954,322.00	135475.63	1,113,315,696.48
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$	331,425,197.00	2058.01	336,992,963.47
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$	212,249,206.00	719.65	273,901,668.60
					SUB TOTAL	**$**	**3,280,822,404.00**	$	3,431,010,477.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							**20.00**		
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$	96,156,170.00	738.54	60,055,118.64
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$	126,023,904.00	111.17	$ 81,076,836.85
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$	9,018,977.00	23.24	$ 12,046,035.68
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,105.00	$	10,222,576.00	276.73	$ 9,714,606.65
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$	98,249,640.00	90.00	$ 73,687,230.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$	95,146,036.00	9258.72	$ 76,086,586.98
					SUB TOTAL	**$**	**434,817,303.00**	$	312,666,414.80
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$	44,741,086.00		
					SUB TOTAL		**44,741,086.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$	3,682,899.00	5.00	3,069,082.50
					SUB TOTAL		**3,682,899.00**		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS									
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$	452,685,628.00	6,965.70	$ 483,419,580.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$	178,580,835.00	151,971.04	$ 98,477,233.92
					SUB TOTAL		**631,266,463.00**	$	581,896,813.92
TOTAL EJECUTADO								**$**	**4,325,573,706.18**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

Las actividades del presente contrato finalizaron en el mes de junio, sin embargo, continua la revisión de documentación de la guía ambiental – PAGA, pare realizar los respectivos reportes.

El documento de la guía ambiental – PAGA, fue APROBADO por el INVIAS, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563. Se espera documentación final de las actividades realizadas.

3.1.1.4. Actividades sociales

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

El contratista realiza envió de informe trimestral # 6 para revisión y concepto por parte de la interventoría, tan pronto sea revisada la información se realizan algunas observaciones al contratista para hacer las debidas correcciones y luego proceder a enviar a Invias.

3.1.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTIA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.1.7. Etapa de Construcción

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

A corte del presente informe se ejecuta la terminación de la obra física.

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción. A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

El día 10 de julio 2024, en oficina del contratista, se entregó la siguiente información:

- Información técnico final de obra.
- Planillas de seguridad de obra.
- Manual de mantenimiento.
- Informes trimestrales ambientales y sociales PAGA.
- Informe final de la gestión ambiental y social de cumplimiento PAGA.
- Informe final de la gestión SST y bioseguridad.
- PAGA definitivo componente ambiental y social.



Socialización entrega proyecto.



Socialización entrega proyecto.

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$	85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$	644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$	368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$	251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$	135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$**	**1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$	10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$	26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$	8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$	2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$	19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$	16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$**	**84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$	22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL		**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$	8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$	96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$	28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL		**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO								**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

Se remite al invias oficio GIC-INVIAS-NTS-930-24, balance terminación contrato de obra.

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-031910.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación la obra ya se encuentra terminada el 30 de diciembre de 2023.

3.2.1.3. Actividades Sociales

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-031910.

El contratista U.T PLACA HUELLA HERRAN 2022, termino las actividades de construcción el día 30 de diciembre de 2023, por lo tanto, no aplica la entrega de informes mensuales.

La interventoría recibió informe trimestral por parte del contratista de obra, se revisa y hace observaciones para corregir o agregar información pertinente. A la fecha actual, no se han enviado correcciones o ajustes de la documentación para subsanar y enviar a Invias.

El contratista debe entregar a la fecha el informe Balance terminación Contrato de Obra, para dar cierre al componente ambiental.

3.2.1.4. Actividades SST

El contrato actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A fecha del 31 de enero, el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

Al contratista de obra, le queda pendiente el cobro del 5% del valor del contrato, este se pagará cuando se realice la liquidación del contrato, de igual manera para tramitar el 5%

del valor del contrato el contratista de obra, deberá justificar para pago el valor de la compensación ambiental y el valor de la provisión protocolo de bioseguridad, lo anterior deberá soportarse.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

A continuación, se describe la trazabilidad administrativa de documentación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

El 21/08/2024 en instalaciones de la alcaldía municipal, se hace reunión para la liquidación del contrato de obra, entre la alcaldía, la interventoría y el contratista. Dando como compromiso por parte de la presente interventoría emitir la última aprobación documental.

Mediante los oficios GIC-INVIAS-NTS-1199-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1225-24 se aprueban las versiones finales de los informes social y ambiental respectivamente.

3.3.1.2. Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra. Es de aclarar que las cantidades presentadas no son las definitivas ya que el contrato se encuentra en liquidación y pueden surgir ajustes a las cantidades definitivas ejecutadas.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.1.4. Actividades Sociales

La interventoría en APRUEBA CON OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1199-24 DE FECHA 26-08-2024 CUYO ASUNTO ES: “APROBACIÓN INFORME FINAL SOCIAL” - Aprobado sin observaciones.

3.3.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RECORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RECORD)
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023 - **NO VIABLE**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES**

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

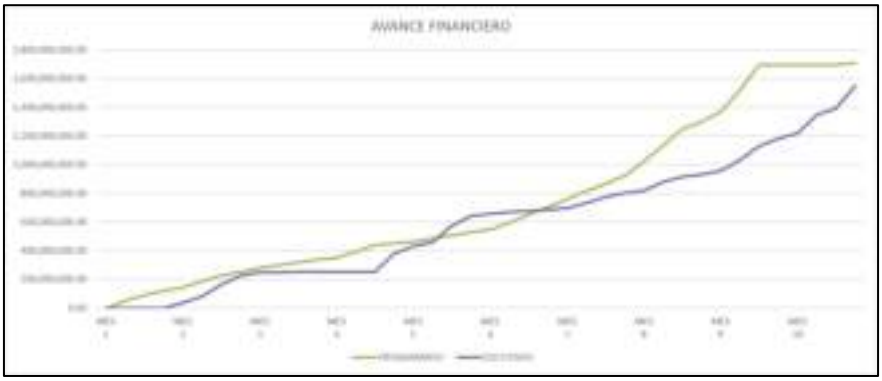


Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024 (INDEFINIDO)
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024 (INDEFINIDO)

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista continua con la ejecución de la construcción de placa huella y alcantarillas.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Solicitud	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

Se realizan comités presenciales una vez por semana para hacerle seguimiento al contrato de obra No. 160 de 2022, allí se plasman los compromisos de entrega de los documentos de la etapa de pre- construcción y de estudios y diseños, de esta manera se lleva la trazabilidad de cómo se encuentra el contrato a la fecha en cuestión de entrega documental.

3.4.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra se encuentra en suspensión indefinida desde el 30/07/2024 hasta el 31/12/2024 fecha límite del programa COLOMBIA RURAL del cual pertenece el proyecto en ejecución.

La presente interventoría mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-1186-24 da respuesta al oficio de la alcaldía, manifestando que NO es conveniente realizar la liquidación bilateral o unilateral, hasta tanto no se tenga una resolución definitiva sobre la denuncia del presunto hurto electrónico.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30- JUNIO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	477.00	24,028,398.00
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00	30.79	25,033,963.45
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00	1985.06	16,209,999.96
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00	10.77	4,906,424.28
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-
					SUB TOTAL	$ 929,150,702.00	$	182,724,870.81
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00	21.07	17,131,068.85
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00	1722.90	14,069,201.40
					SUB TOTAL	$ 153,477,996.00	$	63,030,683.13
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-
					SUB TOTAL	$ 347,681,393.00	$	390,239,804.34
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62
					SUB TOTAL	$ 46,366,624.00	$	33,970,578.59
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	433.71	21,847,707.54
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	160.40	160,160,522.80
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	8420.07	69,212,975.40
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	22.88	10,423,304.32
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-
					SUB TOTAL	$ 949,833,499.00	$	438,984,190.06
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	175.28	8,829,554.72
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	35.12	35,067,565.84
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	70.14	2,500,701.42
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.60	2,168,218.80
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	2887.58	23,735,907.60
					SUB TOTAL	$ 189,941,468.00	$	98,488,528.38
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-
					SUB TOTAL	6,421,903.00	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	1,207,438,655.31

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

NO hay actividades durante el mes de julio, el consorcio MATICCES P&B LTDA y la Alcaldía de Cáchira firmaron acta de suspensión # 2 del día 30 de julio de 2024 según firmas de acta.

3.4.1.4. Actividades Sociales

La interventoría recibió informe trimestral por parte del contratista de obra, se revisa y se hace observaciones para corregir o agregar información pertinente. A la fecha actual del presente informe, no se han enviado informes mensuales, ni correcciones, ni se presentan evidencias fotográficas por motivos de la suspensión del contrato de obra.

3.4.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista da inicio a las actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Durante el mes el Contratista no ha presentado el registrado de ingreso de personal.

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MES	DIAS PERDIDOS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	Julio	0

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. **Dotación elementos de Protección Personal**

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Cáchira.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

5. Maquinaria y Equipo

Para el presente periodo del informe, se registra trabajos con maquinaria amarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, a la fecha no se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se debe tiene en obra los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.



Fotografía 21 Verificación Equipos de Emergencia Cáchira.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de agosto de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	agosto	0	0

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	agosto	0

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto

El presente contrato de obra se encuentra suspendido desde el 30/07/2024, debido al proceso investigativo del presunto hurto cibernético de las cuentas bancarias.

El corredor vial a intervenir se divide en tres (3) corredores de los cuales se estaba interviniendo el corredor 3 únicamente, dado a que en el corredor 1 se habían parado las actividades por el difícil acceso de material a la obra por mal estado de la vía, en el corredor 2 está terminado al 100%.

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya cuenta con los aprobados a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

3.4.3.2. Etapa de Construcción

El presente contrato de obra se encuentra suspendido desde el 30/07/2024, debido al proceso investigativo del presunto hurto cibernético de las cuentas bancarias.

En el corredor 1 se realizaron actividades de alcantarillas en el tramo 1 y 3 dando por terminado las cuatro (4) contratadas.

En el corredor 3 se realizaron actividades de corte, figurado e instalación de acero para placa huella de igual modo se realizó vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada y 21Mpa para placa huella suspendiendo el proyecto en 224.10m de placa huella.

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseño Municipio de Cáchira

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579
	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se suspende actividades hasta no se les garanticen los recursos para su terminación del proyecto todo esto a causa del robo cibernético

En el corredor 1 se suspenden actividades de placa huella dado al difícil acceso de vehículos de carga pesada, se continuaron las actividades de alcantarillas dado a que esta el material en obra para culminar esta actividad, cuatro (4) alcantarillas terminadas al 100% de las cuatro (4) contratadas.

En el corredor 3 se suspenden actividades de placa huella con un avance de 224.10ml en el tramo 2.

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 11 de noviembre de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	11 de noviembre de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de agosto de 2024.


Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de julio por parte del contratista se tiene:

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

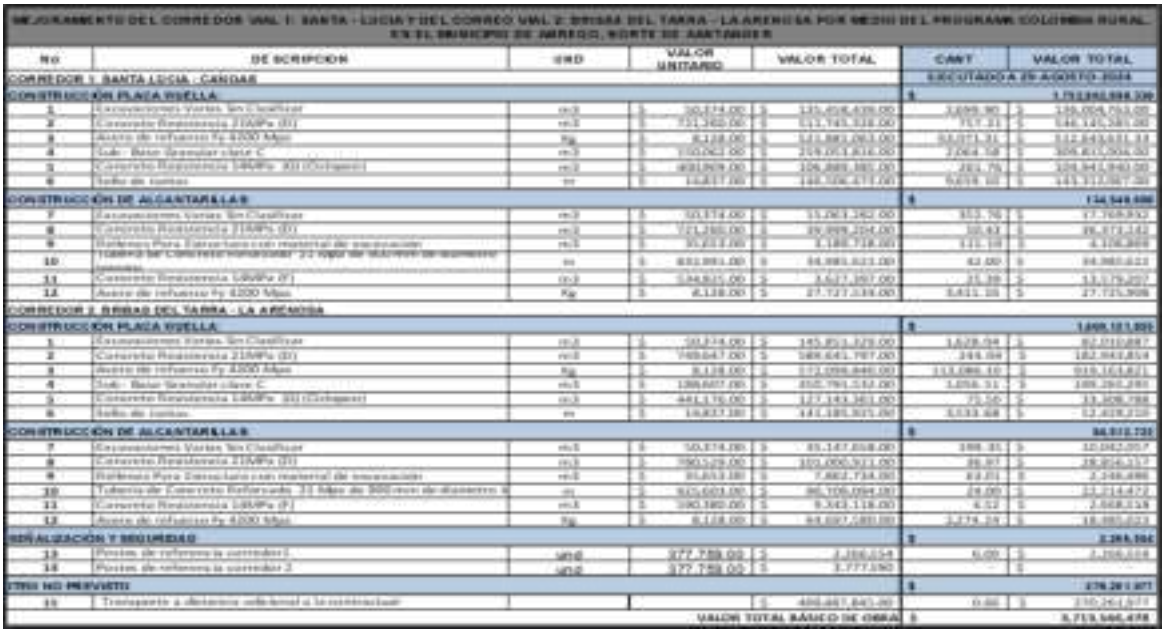

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREDOR VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
NO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANDAS					EJECUTADO A 29 AGOSTO 2024	
CONSTRUCCION PLACA HUELLA					$	1.753.592.598,39
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.574,00	$ 135.408.439,00	2.678,30	$ 135.408.753,00
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 731.362,00	$ 513.745.538,00	717,31	$ 546.145.381,00
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 6.138,00	$ 131.883.063,00	23.071,31	$ 132.843.631,18
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150.062,00	$ 259.051.816,00	2.064,58	$ 309.810.004,00
5	Concreto Resistencia 14MPa (D) (Cilindro)	m3	$ 493.909,00	$ 106.889.380,00	221,75	$ 109.543.940,00
6	Sello de juntas	m	$ 16.837,00	$ 148.106.479,00	9.018,10	$ 151.917.597,00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS					$	134.549.600
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.574,00	$ 15.063.252,00	353,70	$ 17.769.932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 731.362,00	$ 39.995.204,00	32,83	$ 24.011.152
9	Refuerzo Para Concreto con material de excavación	m3	$ 31.613,00	$ 4.180.738,00	111,19	$ 4.136.809
10	Tubería de Concreto Reforzado 12 Mpa de 900mm de diámetro incluido cama de concreto reforzado 21 mpa de espesor de acuerdo al diseño	m	$ 831.991,00	$ 58.983.633,00	61,00	$ 58.983.633
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 744.915,00	$ 3.627.397,00	35,39	$ 33.179.207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 6.138,00	$ 27.727.338,00	5.611,10	$ 27.721.908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCION PLACA HUELLA					$	1.609.121.000
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.574,00	$ 145.851.329,00	1.628,94	$ 82.711.087
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749.647,00	$ 588.641.787,00	244,04	$ 182.943.814
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 6.138,00	$ 172.099.840,00	113.086,10	$ 915.163.811
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 286.607,00	$ 202.791.153,00	1.056,11	$ 189.260.283
5	Concreto Resistencia 14MPa (D) (Cilindro)	m3	$ 441.176,00	$ 127.143.361,00	71,55	$ 31.408.788
6	Sello de juntas	m	$ 16.837,00	$ 141.181.921,00	8.533,68	$ 12.409.220
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS					$	56.512.721
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.574,00	$ 15.147.658,00	299,61	$ 10.042.057
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 750.529,00	$ 101.000.921,00	99,97	$ 28.934.117
9	Refuerzo Para Concreto con material de excavación	m3	$ 31.613,00	$ 7.882.734,00	83,01	$ 2.346.886
10	Tubería de Concreto Reforzado 12 Mpa de 900mm de diámetro incluido cama de concreto reforzado 21 mpa de espesor de acuerdo al diseño	m	$ 825.683,00	$ 36.705.994,00	28,00	$ 17.714.472
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 990.980,00	$ 9.343.118,00	4,52	$ 2.648.218
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 6.138,00	$ 44.697.580,00	2.274,24	$ 16.965.023
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					$	2.265.594
13	Postes de referencia corredor 1	und	$ 377.799,00	$ 2.356.154	6,00	$ 2.356.218
14	Postes de referencia corredor 2	und	$ 377.799,00	$ 3.777.390	-	$ -
OTRO NO PREVISTO					$	276.201.877
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 400.467.840,00	0,60	$ 240.280.577
				VALOR TOTAL BASICO DE OBRA	$	5.713.566.478

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

Corredor 2 Brisas del Tarra - La Arenosa

- Se encuentran aprobados todos los Avance de entrega documental etapa Proconstrucción de estudios y diseños en el municipio de Abrego corredor 1 y 2.

- Se realiza actividad de corte, figurado y amarre de acero para vigas riostras y bordillos, tramo San Vicente.

- Se realiza en el tramo de San Vicente la instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillo, encofrado de huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa con un avance de 412m paño completo.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.5.1.3. Actividades ambientales

El contratista no envió informe mensual del componente ambiental.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas:

1. El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.

2. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio AD Vías cuenta con la participación de los profesionales relacionados en materia ambiental y social, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
Nallelyt Garay Guerrero	Trabajadora Social	310 2150679
Duay Fernando Lopez Ferizola	Profesional Ambiental	300 4347225
Claudia Liliana Rangel	Directora De Obra	321 3257189

Fuente: Contratista

3. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.
4. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.
5. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

6. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

- La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.

- Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.

- Suministro de agua.

- Predio para la disposición de residuos sólidos.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo del San Vicente, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas.



Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Sanciones para los infractores de las normas ambientales	28/05/2024	10 min	Anexo 2 Anexo 4. No 1
Manejo integral de residuos líquidos, Material de excavación, residuos reciclables y basuras	18/05/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 4. No 1
Manejo de materiales de construcción	17/05/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 4. No 1
Prevención de emergencias y control	21/05/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 4. No 1
Capacitación sobre señalización en obra	23/05/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 4. No 1
Manejo seguro de equipos y maquinaria	20/05/2024	10 min	Anexo 2 Anexo 4. No 1

Fuente: Contratista

En el periodo reportado no se registró ingreso de personal nuevo, el personal que inicio actividades ya cuentan con la inducción.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo. A continuación, y a manera informativa se identifican los permisos y la aplicabilidad en el proyecto:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Concretos & Triturados Algodonal: Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR. Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes.

Baterías sanitarías provisionales: Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Yaneida Contreras.

Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado y se entregara a principios del mes de mayo de 2024 a la Unidad de Servicios Públicos de Abrego.

El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Unidad de Servicios Públicos de Abrego.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas:

En el periodo reportado se realizó suministro de materiales de construcción, el cual fue dispuesto a un costado de la vía extendido en forma de cordón con la finalidad de no realizar obstrucción del paso.

El material de construcción fue cubierto con plástico para evitar el aporte de este a las fuentes hídricas o escorrentías.



Fuente Contratista

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: - Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 6).

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.



Fuente Contratista

-Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 924.995 m3 de material de excavación (**Anexo 7**), de los cuales:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	15,34	Frente de obra
Donado	0	Vereda del Chorro, Sr Miguel.
Disposición final	0	
TOTAL	15,34	



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto.



Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

Se realizará la entrega de los residuos una vez la cantidad sea la necesaria para la entrega a la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Esperancita	No aprovechables	0,15	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Aprovechables	8,8	Rojo

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Unidad de Servicios Públicos, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.

2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID).

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo.

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas:

1. En el mes reportado no se utilizó la mezcladora.

2. Se realizaron los correspondientes preoperacionales a l maquinaria y equipos utilizados en obra.

3. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.
4. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.

5. El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V3, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032474, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

El contratista se encuentra al día con la documentación ambiental entregada a la interventoría.

3.5.1.4. Actividades Sociales

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El contratista no se encuentra al día con la documentación social del mes de julio; por tanto, se informa que la obra se dio inicio en el mes de julio y está por terminar.

La interventoría se encuentra a la espera de recibir información solicitada al contratista de obra para revisión del informe mensual. Asimismo, se espera documentos PAGA y trimestral por parte del contratista de obra.

3.5.1.5. Actividades SST

El presente contrato está suspendido, por lo tanto, las actividades de obra no se están ejecutando:

1. Contratación del personal

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	NIZ SANCHEZ JESUS YORDANO	INSPECTOR	1.064.839.591	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
2	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	37.334.004		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
3	ALONSO MONTAÑA ANDRES	TOPOGRADO	1.091.673.273	09/04/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
4	GARAY GUERRERO NALLELYT	SOCIAL	1.091.673.181	9/04/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
5	CAICEDO LOPEZ ALBET	RESIDENTE	1.094.322.102	9/04/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
6	ARDILA ROBLES NUMAEL	MAESTRO	13.195.759	19/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
7	ARDILA ROBLES BAUDILIO	OFICIAL	13.380.134	13/04/2024	ACTIVO	MEJIA RODRIGUEZ ALFONSO
8	CONTRERAS RANGEL CARMEN EMIRO	OBRERO	5.472.294	11/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
9	ASCANIO ASCANIO RAMIRO	OBRERO	1.004.859.365	11/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
10	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	OBRERO	1.090.962.198	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
11	DURAN ROPERO ISMAEL JOSE	OBRERO	1.005.074.099	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
12	ARDILA VACA IMER	OBRERO	1.094.573.879	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
13	CONTRERAS RANGEL RAMON EMILIO	OBRERO	1.004.981.453	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
14	ARENAS GARCIA MIGUEL ANGEL	OBRERO	88.142.069	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
15	RANGEL ROPERO JOSE IYARIT	OBRERO	1.010.063.158	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
16	DURAN EVELIO	OBRERO	88.283.519	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
17	NAVARRO VACA GERSON EDUARDO	OBRERO	1.007.250.372	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Exámenes de ingreso

En el periodo no se presentó ingreso del personal

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

5. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

6. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de julio realizó trabajos con maquinaria amarilla.



Fotografía 22 Entregas de EPP - Abrego

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 23 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

1. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento

que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	0	0	0

2. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VIAS	10	7

3. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	agosto	0



Fotografía 24 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(...) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los rios aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como ùnica alternativa el material del arrastre sobre el cauce del rio El Tarra; fuente hidrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raiz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en limites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, asi como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(...)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 -CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 -CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 -CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-006-2024 del 31-Ene-2024 -CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-039-2024 del 28-Mayo-2024 - **PLANOS RECORDS** - GIC-INVIAS-NTS-863-24 del 07-Jun-24 - **OBSERVADO PLANOS RECORDS** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2024 del 19-Jun-2024 - **PLANOS RECORDS**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 -CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA para la construcción de dos alcantarillas en el Tramo de San Juan, en el tramo de San Vicente seguirá con la ejecución de la placa huella.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	1562	839.35
		CORREDOR 2 VEREDA	412		

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

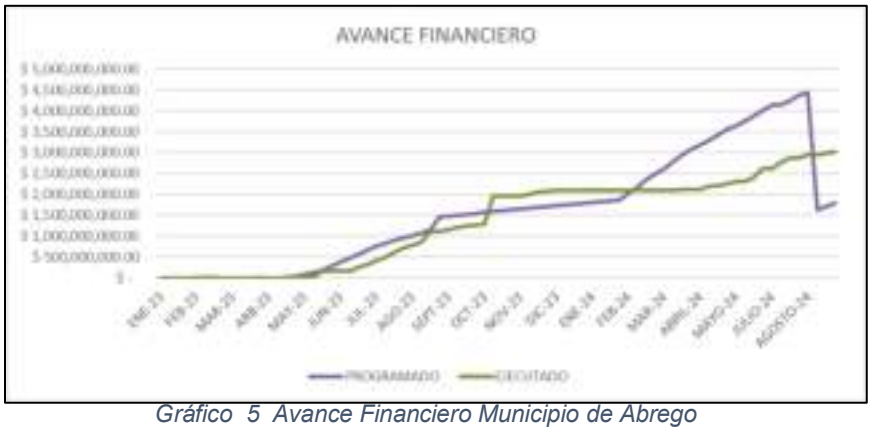


Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

A fecha del presente informe se tiene un avance ejecutado de obra de $3.034.536.931,85 frente a un avance programado de $1.787.209.724,98.

Se realizo la terminación del tramo de San Vicente con la ejecución de 412 m de placa huella e instalación de sello de juntas.

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024
Fecha de Reinicio 1:	19 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	26 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, una vez se ejecutó a cabalidad el 100% del proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Flujo de Caja	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de junio de 2024 por parte del contratista están:

- Se encuentran aprobados todos los documentos de la etapa Preconstrucción de estudios y diseños en el municipio de La Playa de Belén corredor 1 y 2.

CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO

Finaliza a satisfacción la construcción de 630 m de placa huella y dos (02) alcantarillas en el tramo 1 y la construcción de 545m de placa huella y tres (03) alcantarillas en el tramo 2.

Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO 31/07/2024
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CORREDOR 1: LLANO GRANDE - SAN PEDRO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 800 MTS				**$ 1,076,212,491.85**				
1	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1601.64	$ 71,112,816
2	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	491.70	$ 381,067,500
3	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	41842.52	$ 335,577,010
4	320.3	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	1003.73	$ 201,749,730
5	630.7	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	67.37	$ 28,295,400
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	4560.94	$ 60,204,408
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND				**$ 40,260,415.12**				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	99.68	$ 4,425,792
8	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	18.49	$ 14,329,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	31.51	$ 945,300
10	661.2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	12.00	$ 10,200,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	2.26	$ 1,243,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	1137.12	$ 9,119,702
CORREDOR 2: ESPERANZA - ESPERANCITA - CLAVELLINOS								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS				**$ 954,963,397.86**				
1	600.1.1-2	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1376.63	$ 61,122,372
2	630.4 - 2	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	446.65	$ 346,153,750
3	640.1-2	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	36584.20	$ 293,405,284
4	320.3-2	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	922.69	$ 185,460,690
5	630.7-2	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	49.44	$ 20,764,800
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	3647.24	$ 48,143,568
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND				**$ 71,550,425.99**				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	164.17	$ 7,289,148
8	630.4 - 3	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	32.17	$ 24,931,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	63.70	$ 1,911,000
10	661.2-2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	18.00	$ 15,300,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	3.64	$ 2,002,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	2180.61	$ 17,488,492
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				**$ 4,550,000**				
13	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor1	und	$ 350,000	7.00	$ 2,450,000
14	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor 2	und	$ 350,000	6.00	$ 2,100,000
ITEMS NO PREVISTO:				**$ 94,850,758**			0.00	$ -
	900.2.8	Transporte a distancia adicional a la contractual			gl	$ 57,577,010	0.85	$ 48,940,459
	N.P 1	Suministro E Instalación De Tubería Pvc 6" Drenaje Sin Filtro			ML	$ 46,361	115.66	$ 5,362,113
	N.P 2	Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000			ML	$ 275,909	115.66	$ 31,911,635
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$**	**2,242,387,489**	**$**	**2,233,007,469**

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

En el informe de cumplimiento del componente ambiental correspondiente al periodo del 01 de al 26 de agosto de 2024, se presentan las generalidades de la gestión del periodo en revisión en el área ambiental dentro de los ítems contractuales contemplados en el PAGA.

Cabe resaltar que la obra estuvo suspendida hasta el día 19 de agosto de 2024 y las actividades reportadas en el presente informe van desde la finalización de suspensión hasta el 26 de agosto de 2024, cuya fecha es la terminación de actividades de obra.

Así mismo hace referencia al conjunto de medidas que se implementaron y aplicaron en el transcurso de este periodo relacionado con el manejo ambiental del contrato de obra No. MPLP-004 de 2022, bajo la supervisión y el apoyo de la Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES.

*Según oficio radicado GIC-INVIAS-NTS-1116-24 se da aprobación de la suspensión de la obra.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Subprograma 1: conformación del grupo de gestión ambiental y social	**DAGA-1.1-01**

Actividades ejecutadas en el periodo

1. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio la Playa 2022 (**Anexo 1**), cuenta con la participación de los profesionales seleccionados al inicio del proyecto, el cual se describen a continuación:

Nallelyt Garay Guerrero	Trabajadora Social	310 2150679
Duay Fernando López Ferizola	Profesional Ambiental	300 4347225
Sergio Andrés Arias	Director De Obra	N.A

2. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.

3. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.

4. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

5. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

   - La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.
   - Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.
   - Suministro de agua por la unidad de servicios públicos de la Playa.
   - Predio para la disposición de residuos sólidos.

Lugar de Ejecución

Llano Grande II

Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo.	$\frac{3}{3}$ **X** 100	100%	**Anexo 1**

Observaciones

Ninguna

Subprograma 2: capacitación y concienciación para el personal de obra	DAGA - 1.2 - 02

Actividades ejecutadas en el periodo

1. Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en Llano grande y Esperancita con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramo la capacitaciones y charlas ejecutadas, cabe resaltar que debido a la suspensión se aplazaron unas capacitaciones ambientales:

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Terminación del proyecto y balance de final de la gestión ambiental.	22/08/2024	60 min	**Anexo 2** Actas de asistencia
Capacitación sobre la señalización de los frentes de obra	23/08/2024	15 min	(Registro No.1) **Anexo 2**
Manejo integral de residuos sólidos, líquidos, de excavación.	24/08/2024	15 min	**Anexo 2**

2. En el periodo evaluado no se realizaron las inducciones esto a que no se registró ingreso de personal nuevo.

Lugar de Ejecución

Llano Grande II

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Taller Inducción	0	100%	-

Capacitaciones	$\frac{6}{6}$ X100	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

Subprograma 3: cumplimiento de requerimientos legales	**DAGA - 1.3 - 03**
Actividades ejecutadas en el periodo	

1. Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo.

2. Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Proveedor	Permiso - Licencia	Observaciones
Concretos & Triturados Algodonal	Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería.	Vigentes

3. Se verifico el acta de permiso con la vivienda y se continua con el servicio de baños:

Clase de permiso	Permiso - Licencia	Observaciones
Baterías sanitarías provisionales	Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Orfelina Sánchez	Vigente

4. Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado y se entregara a principios de agosto de 2024 a la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén.
5. El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de

la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén. 6. La secretaria de planeación emitió el certificado del predio para la disposición de RCD, pero a la fecha no se ha realizado depósito de RCD en el predio, esto a que el material se ha reutilizado en la obra.
Lugar de Ejecución
Llano Grande II

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 1: manejo integral de materiales de construcción	**PAC - 2.1 - 04**
Actividades ejecutadas en el periodo	

1. El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado. (**Anexo 3. Registro No. 3**)

- El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado.
- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.
- Durante la manipulación del cemento y la preparación de concreto, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto

2. El concreto se realiza en la mezcladora y el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras.

Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	$\left(\frac{1}{1}\right) \cdot 100$	100%	-
Condiciones de la realización de mezclas de concreto en obra (MC)	$\left(\frac{1}{1}\right) \cdot 100$	100%	-
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA)	$\left(\frac{1}{1}\right) \cdot 100$	100%	Anexo 2
Observaciones			

Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	$\frac{1}{1}$ X100	100%	Anexo 3
Condiciones de la realización de mezclas de concreto en obra (MC)	$\frac{2}{2}$ X100	100%	Anexo 3
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA)	$\frac{1}{1}$ X100	100%	Anexo 2
Observaciones			
El certificado del suministro de material se encuentra en el **anexo 5**			

Subprograma 3: señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	PAC- 2.3 - 06

Actividades ejecutadas en el periodo

1. Se realizó la señalización del frente de obra (**Anexo 3. Registro No.4**), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (**Anexo 6**)



Fuente: Contratista

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.
- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Lugar de Ejecución

Llano Grande II

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Señalización y demarcación propuesta	$\frac{1}{1} X100$	100%	**Anexo 3. Registro No.4**

Observaciones

Ninguna

Subprograma 4: manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción, demolición (RCD) y lodos	PAC- 2.4 - 07

Actividades ejecutadas en el periodo

1. En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 1.2 m3 de material de excavación (**Anexo 7**), de los cuales:

LLANO GRANDE II:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	1.1	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis Coronel Llano Grande
Disposición final	0	-
TOTAL	1.1	

2. El municipio de la Playa por medio de la secretaria de planeación emitió el certificado del predio para la disposición de RCD, no se ha dispuesto sobrantes de excavación en el predio ya que el material ha sido reutilizado en obra.

Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD)	$\frac{1}{1} X100$	100%	En el periodo no se requirió
Observaciones			
El material generado se produjo por las actividades de excavación para la construcción de vigas riostras.			
Subprograma 5: manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales			**PAC - 2.5 - 08**
Actividades ejecutadas en el periodo			

1. En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto. (**Anexo 8** y **Anexo 3. Registro No. 6**)



Almacenamiento y entrega

1. Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

2. Se realizará la entrega de los residuos del periodo a principios del mes de agosto de 2024.

3. A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (**Anexo 8**), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como peligroso, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la administración pública cooperativa de servicios públicos de la Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

TRAMO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (Kg)	COLOR
Llano Grande II	No aprovechables	0,2	NEGRO
	Aprovechables	0	BLANCO
	Orgánico aprovechables	0	VERDE
	Peligrosos	4,3	ROJO

Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM)	$\frac{1}{X100}$	100%	**Anexo 3**

	1		
Implementación de programas de separación, reutilización - reducción de residuos (PRRR))	$\frac{1}{1} X100$	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Los certificados se entregan en el próximo mes.			

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Administración Pública Cooperativa De Servicios Públicos De La Playa De Belén, cuenta con los permisos.

Subprograma 2: manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	**PGA-3.2-11**
Actividades ejecutadas en el periodo	
1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo. 2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo. 3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros 4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (**Anexo 4** y **Anexo 3 Registro No. 8**)	



Fuente: Contratista

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo (**Anexo 6)**

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.
7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

Durante el periodo no se presentaron derrames.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles	**PBSE – 4.3 - 14**
Actividades ejecutadas en el periodo	
1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles. 2. Se realizó una capacitación sobre educación ambiental, tratando el tema de ecosistemas estratégicos o sostenibles. 3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.	
Lugar de Ejecución	

Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores (CSA)	$\frac{1}{(\ )} * 100$ 1	100%	**Anexo 2**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 3: manejo de maquinaria, equipos y vehículos	**PMIT - 5.3 - 20**
Actividades ejecutadas en el periodo	

1. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.



Fuente: Contratista

2. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.

El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

3.6.1.4. Actividades Sociales

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El contratista no se encuentra al día con la documentación social del mes de julio. Por lo tanto, se informa que la obra se suspendió el 30 de julio por orden público.

La interventoría se encuentra a la espera de recibir información solicitada al contratista de obra para revisión del informe mensual. Asimismo, se espera documentos PAGA y trimestral por parte del contratista de obra.

Las actividades que se han realizados en el componente social fueron las siguientes:

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL

SUB- PROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL

A través del presente subprograma se busca propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia directa del proyecto, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto. Así como la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Implementación: A continuación, se relaciona el personal contratado, el cual incluye mano de obra calificada y no calificada; resaltando la igualdad de género donde se garantizan las mismas oportunidades a hombres y mujeres del área de influencia del proyecto.

Reporte cifras de contratación, junio 2024.

NÚMERO DEL DOCUMENTO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2
1.091.668.650	ARIAS	ANZOLA	SERGIO	ANDRES


Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

En el presente periodo el contrato contó con suspensión No. 1 de fecha del 31/07/2024.

PROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Subprograma 4: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Mediante correo de fecha 22 de febrero el Ministerio del interior emite resolución No. ST - 0200 de 22 de feb 2024, de acuerdo con su solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa:

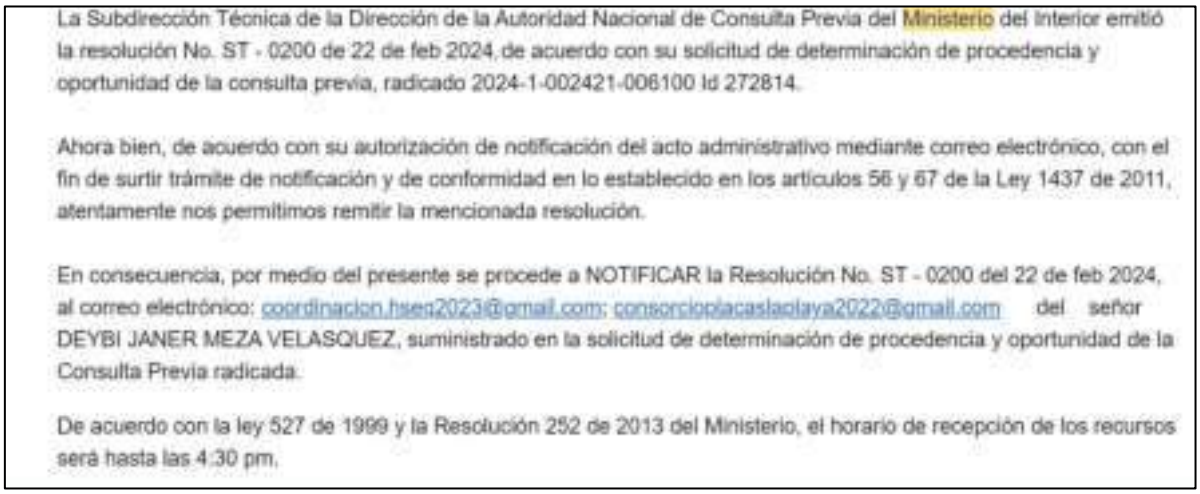

La Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior emitió la resolución No. ST - 0200 de 22 de feb 2024, de acuerdo con su solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, radicado 2024-1-002421-006100 Id 272814.

Ahora bien, de acuerdo con su autorización de notificación del acto administrativo mediante correo electrónico, con el fin de surtir trámite de notificación y de conformidad en lo establecido en los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011, atentamente nos permitimos remitir la mencionada resolución.

En consecuencia, por medio del presente se procede a NOTIFICAR la Resolución No. ST - 0200 del 22 de feb 2024, al correo electrónico: coordinacion.hseq2023@gmail.com; consorcioplacaslaplaya2022@gmail.com del señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ, suministrado en la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa radicada.

De acuerdo con la ley 527 de 1999 y la Resolución 252 de 2013 del Ministerio, el horario de recepción de los recursos será hasta las 4:30 pm.

Ilustración 2 Resolución No. ST-0200 del 22 de febrero del 2024

Subprograma 5: Gobernanza

Implementación: se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto incluye gremios de transportadores de la zona del proyecto para realizar el traslado de materiales como arena, triturado y piedra que hacen parte de las actividades constructivas del proyecto.

Indicadores:
Vinculación = (número de organizaciones convocadas desde etapas tempranas del proyecto/ número de organizaciones existentes en el área de influencia del proyecto de la región) *100

En el presente periodo no se llevó a cabo vinculación de ningún tipo ya que el contrato se suspendió por un término de 20 días y se finalizó el día 26 de agosto del 2024.

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1: Atención a la comunidad

Objetivo: Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

I**mplementación:** Se cuenta con buzón en el frente de obra Llano Grande y en la oficina Consorcio La Playa con el fin de que la comunidad pueda presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y poder brindar una oportuna respuesta a las solicitudes presentadas, generando un espacio de participación ciudadana con el cual la comunidad se sienta parte activa del proceso de ejecución de la obra.

En dichos puntos de información se dispone la siguiente información:

Contrato: MP-LP-004-2022
Objeto: mejoramiento de vías rurales en el municipio de La Playa de Belén (ND) en cumplimiento del programa Colombia rural nacional y conforme a convenio No. 1863 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional De Vías.
Contratista: Unión temporal La Playa 2022
Correo electrónico: consorciolaplaya2022@gmail.com Teléfono: 3102150679

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

De igual manera en la Alcaldía Municipal de La Playa se cuenta con una cartelera y buzón para el mismo fin.



Punto de Ubicación: Alcaldía Municipal de La Playa de Belén
Fuente Contratista

Se cuenta con formatos para realizar el seguimiento de cualquier queja o reclamo y así llevar el seguimiento a las posibles soluciones o pasos a seguir. A continuación, se relaciona dicho formato: (se anexa los presentes formatos que hacen parte de este programa ver **ANEXO 1. FORMATOS PROGRAMA – BUZON DE SUGERENCIA QUEJAS O RECLAMOS**.

Se cuenta en obra con un buzón de sugerencia para la atención de las quejas y/o reclamos de la Comunidad.



Fuente Contratista





Fuente Contratista

Indicadores:

En el presente periodo no se presentaron quejas en el buzón de sugerencia y el día 26 de agosto se retira de obra

SUBPROGRAMA 2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Objetivo: El proyecto de Información y divulgación es un mecanismo de interrelación con los diferentes actores sociales del área de influencia, a partir del cual, se diseñan e implementan diversas estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, que apuntan al posicionamiento del Proyecto y a un ambiente favorable de información y aceptación en la comunidad que coadyuva al menor impacto social posible y desarrollo normal de la obra.

Implementación: El CONSORCIO LA PLAYA 2022 instalo unas carteleras informativas ubicadas en la alcaldía y en la iglesia municipal con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder cualquier tipo de solicitud.

Cartelera informativa:







Fuente Contratista

Volantes informativos:

Nota: En relación a la entrega de volantes informativos en el presente periodo del informe no se pudo realizar la actividad a razón de la suspensión del contrato de obra.

SUBPROGRAMA 3: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.

En este periodo el contrato de obra conto con la suspensión por medio de acta de suspensión de fecha 31 de julio de 2024.

Indicador:

No aplica para el presente periodo. En este periodo se termina el último tramo del corredor 1 Llano Grande 2.

SUB-PROGRAMA 4: INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

Objetivo: Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas de los proyectos, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Implementación:

En el mes de agosto el contrato estuvo suspendido a razón del acta de suspensión No 001 de fecha 31 de julio del 2024.

Indicadores:

No aplican para el presente periodo.

Durante el periodo de ejecución del 01 al 26 de agosto el contrato estuvo suspendido por un término de 20 días, por lo cual no se llevaron a cabo en su totalidad los programas de la gestión social. Igualmente, el contrato finalizo sus actividades de obra el 26/08/2024.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El contratista cumplió con la entrega del informe del mes de agosto y con la documentación social solicitada por la interventoría.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032475, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

Se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Contratación del personal**

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	0

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 25 Entregas de EPP – La Playa

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 26 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en la ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de agosto de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO LA PLAYA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO LA PLAYA	0	5

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO LA PLAYA	agosto	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.





3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto, como el sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

A la fecha de corte del informe, el contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Esperancita y en el Corredor uno en el tramo de San Pedro y llano grande Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

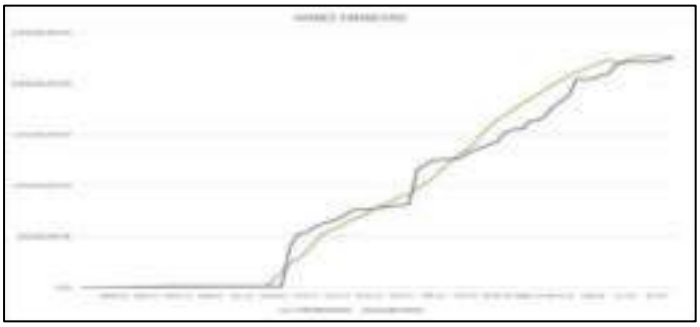


Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

Con corte a 26 de agosto de 2024, el contratista de obra ejecutado la totalidad del proyecto $2.268.620.424,02.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Hojas de Vida	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL PERSONAL AL MUNICIPIO GIC-INVIAS-NTS-570-22 del 24-May-23
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	Hace entrega documentación – PHP-026-2022 del 01-Ago-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, entra en fase de liquidación.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.



A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MAYO-2024		
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	1474.64	48,663,120.00	
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	1071.61	717,978,700.00	
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	65636.94	544,786,602.00	
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1288.96	154,675,200.00	
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	317.12	114,163,200.00	
					SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	1,580,266,822.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00	194.70	$ 6,425,100.00	
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00	28.48	$ 19,081,600.00	
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00	6.19	$ 3,218,800.00	
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00	77.66	$ 2,485,120.00	
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00	
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00	2314.68	$ 19,211,844.00	
					SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**	$	63,622,464.00	
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		-	
					SUB TOTAL	**16,454,000.00**			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00	7.00	4,200,000.00	
					SUB TOTAL	**4,200,000.00**			
						TOTAL EJECUTADO	$	**1,643,889,286.00**	

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.4. Actividades Sociales

El contratista de obra finalizo la obra el 30 de mayo del 2024, a la fecha entrega informe trimestral para revisión y concepto por parte de la interventoría; se le hace la observación de corregir o ajustar la documentación, por otra parte, no ha entregado informes mensuales con las actividades realizadas durante el mes, se presentan atrasos en la entrega de la documentación.

Se le sugiere al contratista UNION TEMPORAL COLOMBIA, enviar la documentación asignada en el proyecto la cual se relacione al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

3.7.1.5. Actividades SST

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, entrando en proceso de liquidación:

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO** - CONTRATISTA HACE ENTREGA DE ALTERNATIVAS DE ALCANTARILLA EL 01-12-2023

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Valor adicional 1:	$ 7.565.000.000,00 M/CTE
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha reinicio 1:	20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Prorroga 2:	04 meses hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de diciembre de 2024

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24-Nov-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-622-22 del 06-Jun-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-982-22 del 01-Sep-23 – Falta Gramalote y Los Patios
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1256-22 27/Oct/23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 29-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

3.8.1.2. Actividades Técnicas

En el mes de agosto, el contratista ha desarrollado una serie de actividades en múltiples frentes de trabajo, gestionando cuidadosamente los recursos disponibles y organizando las tareas necesarias para garantizar un avance efectivo del proyecto. Estas acciones incluyen la asignación de personal, la programación de labores específicas y la optimización de procesos para cumplir con los plazos establecidos y asegurar el éxito de cada etapa del desarrollo del proyecto.

Municipio de los Patios

- **Vereda Corozal - California**

Durante el mes de agosto, el contratista se dedicó plenamente a la ejecución de la placa huella en el tramo No. 1, asegurando la correcta continuidad y ajuste de los elementos estructurales. Con la aprobación final de la nueva sección de placa huella de 7 metros de ancho, se logró avanzar significativamente en su ejecución durante el mes. En función de lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades en el sitio de obra:

- Se avanzó en la colocación y extensión del geotextil 2400N en el tramo No. 1, tras un notable progreso en la excavación sin clasificar hasta alcanzar avanzando notablemente en la nueva sección de placa huella de 7 mts.
- Durante este periodo, se continuaron las labores de excavación sin clasificar para la estructura de la placa huella (Cajeo) en el tramo No. 1, manteniendo los niveles de rasante final y la topografía del terreno.

- Se llevaron a cabo tareas de extendido, compactación y humectación de la subbase granular a lo largo del tramo No. 1, cumpliendo con los niveles de rasante establecidos por la topografía.

- Para la modulación de los elementos de la placa huella, se instaló formaleta de madera a lo largo del periodo, facilitando el vaciado de los sobreanchos y modulando los diferentes elementos estructurales (huellas y viga riostras).

- Se realizaron trabajos de corte, figurado y armado del acero de refuerzo de 3/8", tanto en dirección longitudinal como transversal, para los elementos de la placa huella, viga riostra, huellas, cunetas y bordillos en el tramo No. 1 sección de placa huella de 7 metros de acuerdo diseño.

- Durante todo el mes de agosto, el contratista ejecutó el vaciado de concreto con resistencia de 21 MPa para huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos, y de 14 MPa para el sobreancho elaborado en obra de acuerdo a diseño de mezclas en el tramo No. 1 del sector de Corozal.

- Considerando que el día 9 del mes en curso se llevó a cabo el Adicional No. 2 en términos de tiempo y valor, el 26 de agosto se realizó una socialización con las comunidades de la vereda Corozal - California para informarles sobre el nuevo alcance establecido en el adicional del contrato. Asimismo, el miércoles 28 de agosto se efectuó un recorrido a lo largo de los 12 tramos de placa huella que serán intervenidos, con el propósito de dar a conocer su localización y longitud.

Municipio de Arboledas

- **Vereda Santo domingo, Rinconada, Helechar y Volcán.**

Considerando que las actividades físicas en las veredas Santo Domingo, Rinconada, Helechar y Volcán estuvieron suspendidas debido a la pérdida de la banca en el corredor vial que conecta el municipio de Arboledas con el Corregimiento de Castro, durante este mes, gracias a la gestión de la alcaldía municipal y los entes gubernamentales, se logró restablecer el paso. Esto permitió reactivar las actividades en los frentes de trabajo de las veredas Volcán y Santo Domingo, y próximamente en la vereda Helechar.

Vereda Chicagua

A lo largo del mes, el contratista continuó con los trabajos en los tramos No. 2 y No. 1, llevando a cabo diversas actividades para asegurar la continuidad de la placa huella. Las labores realizadas en el campo fueron las siguientes:

- Se realizaron excavaciones sin clasificar a lo largo de los tramos No. 2 y No. 1, actualmente concluidos, específicamente para la estructura de la placa huella. Estas excavaciones se efectuaron de acuerdo con los espesores indicados en los planos, lo que permitió preparar de manera adecuada el terreno para la colocación de los diferentes elementos de la placa huella.

- Se procedió con el armado de la formaleta de madera para modular los diferentes elementos de la placa huella en los tramos No. 2 y No. 1, actualmente finalizados. Esta actividad se realizó siguiendo los anchos de diseño establecidos, asegurando que la ejecución de la placa huella fuera continua y conforme a las especificaciones del proyecto.

- Durante el mes, se llevó a cabo el corte, figurado y armado del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella, cumpliendo con los requisitos establecidos en los diseños.

- Durante todo el mes de agosto, el contratista realizó el vaciado de concreto para los elementos de la placa huella en los tramos No. 2 y No. 1, actualmente completados. Este proceso incluyó el uso de concreto con una resistencia de 21 MPa para los elementos estructurales principales, como huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos. Para la franja central y el sobreancho, se utilizó concreto con una resistencia de 14 MPa, los mismos fueron elaborados en obra.

- Dado que al finalizar el mes de agosto no se ejecutaron actividades en esta vereda debido al fraguado de los elementos de concreto a lo largo del tramo No. 1, se espera reanudar y continuar con los tramos restantes por ejecutar una vez concluya este período.

Vereda Cinera

Durante el mes de agosto, el contratista se enfocó en realizar diversas actividades en los tramos de placa huella No. 3. Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:

- Se llevaron a cabo trabajos continuos de escarificación en la subrasante para preparar el terreno para su estabilización con una mezcla de suelo y cemento. Después de aplicar la mezcla, se procedió a la compactación a lo largo de toda la vía, con el objetivo de lograr un acabado final sólido y uniforme para la subrasante.

- Durante el período, se realizó la modulación de los elementos de la placa huella con formaleta de madera en el tramo No. 3, ajustándose a las dimensiones establecidas.

- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella en los tramos No4 finalizado y en el tramo No3 intervenido actualmente.

- Durante agosto, se procedió con el vaciado de concreto en el tramo No. 3. Este proceso incluyó la preparación de concreto con una resistencia de 21 MPa para huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos, mientras que para la franja central y el sobreancho se utilizó concreto con una resistencia de 14 MPa.

- Una vez finalizado el periodo el contratista tienen un avance durante el mes de 152,3 metros lineales, teniendo ejecutados a la fecha 442 metros comprendidos entre el tramo No. 4 finalizado y No. 3 en ejecución.

Vereda Juan Bueno

Durante el mes de agosto, el contratista llevó a cabo actividades para la construcción de la placa huella en el tramo No. 2, realizando las siguientes tareas en el campo:

- Durante el período en curso, se realizó la escarificación de la subrasante en los tramos No. 2 para preparar el terreno antes de las siguientes etapas de construcción. Luego, se aplicó una mezcla de concreto según las especificaciones técnicas del proyecto para estabilizar el terreno y mejorar su capacidad de carga, seguido de su compactación.

- Para avanzar en el proceso constructivo, se llevó a cabo la instalación de formaleta de madera para modular los elementos de la placa huella a lo largo del tramo No. 2, preparando el área para el vaciado del sobreancho y la franja central.
- Durante todo el período, el contratista realizó el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 3/8 y/o #3, tanto longitudinal como transversal, para los diferentes elementos de la placa huella. Esto incluyó mallas y/o parrillas para curvas de transición a lo largo de los tramos No. 2.

- Durante todo el mes, se llevó a cabo el vaciado de concreto en los elementos de la placa huella del tramo No. 2. Se utilizó concreto con una resistencia de 21 MPa para huellas, vigas riostra y cunetas, mientras que para la franja central se empleó concreto con una resistencia de 14 MPa, elaborado en obra.

- Una vez finalizado el periodo el contratista tienen un avance durante el mes de 178,3 metros lineales, teniendo ejecutados a la fecha 431,2 metros comprendidos entre el tramo ejecutados a la fecha.

- Durante el periodo, se realizó la actividad de excavación sin clasificar para elementos de alcantarilla K1+070 y su proceso de inserción de tubería de 36" con relleno con material excavado sin clasificar.

- Se realiza la actividad de replanteo y vaciado de solados en el encole y descole de la alcantarilla K1+070, posteriormente iniciar el proceso de instalación y amarre de aceros de refuerzo #4 externos y #3 internos para los diferentes elementos de encole y descole.

Durante el periodo se realiza vaciado de elementos de alcantarilla K1+070, en concreto de 21 MPa teniendo en cuenta especificaciones de cada elemento.

Vereda Potreros

Durante el mes, la contratista continua actividades en el tramo No. 1, llevando a cabo una serie de actividades para garantizar la continuidad en la construcción de las placas huellas. Donde ejecuta las siguientes actividades:

- Se realizaron actividades de excavación para el cajeo de la estructura de la placa huella en el tramo No. 1, y también se llevó a cabo la adecuación de los anchos de la vía, considerando que esta longitud es muy reducida.

- Se llevaron a cabo actividades de extendido, compactación y humectación de la subbase granular a lo largo del tramo No. 1, teniendo en cuenta los niveles de la subrasante y los acabados correspondientes.

- Se procedió con la instalación de la formaleta de madera para la modulación de elementos como vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos, después de haber vaciado los sobreanchos y la franja central.

- A lo largo del período, se realizaron el corte y figurado del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

- Durante el periodo se realiza vaciado de elementos en concreto de 21 MPa y 14 MPa elabora en obra a lo largo del tramo en ejecución teniendo en cuenta especificaciones de cada elemento.

- Al concluir el período, el contratista logró un avance de 280,84 metros lineales durante el mes, en los tramos ejecutados.

- Durante el periodo, se realizó la actividad de excavación sin clasificar para elementos de alcantarilla K3+250 y su proceso de inserción de tubería de 36” con relleno con material excavado sin clasificar.

- Se realiza la actividad de replanteo y vaciado de solados en el encole y descole de la alcantarilla K3+250, posteriormente iniciar el proceso de instalación y amarre de aceros de refuerzo #4 externos y #3 internos para los diferentes elementos de encole y descole

Durante el periodo se realiza vaciado de elementos de encole de alcantarilla K3+250, en concreto de 21 MPa teniendo en cuenta especificaciones de cada elemento.

Vereda el Volcán

Durante el mes, el contratista reanudó las actividades en el tramo No. 5, realizando una serie de tareas para asegurar la continuidad en la construcción de las placas huella. Entre las actividades llevadas a cabo se incluyen:

- Se llevaron a cabo actividades de replanteo y compactación del terreno a lo largo del tramo No. 5, considerando los niveles de la subrasante y los acabados correspondientes.

- Se realizo excavaciones sin clasificar a lo largo del tramo No. 5, específicamente para la estructura de la placa huella. Estas excavaciones se efectuaron de acuerdo con los espesores especificados en los planos, lo que ha permitido preparar el terreno adecuadamente para la colocación de los distintos componentes de la placa huella.

- Se procedió al armado de formaleta de madera para modular los distintos elementos de la placa huella en el tramo No. 5, actividad que se concluyó. Esta tarea se realizó siguiendo los anchos de diseño establecidos, lo que garantizó que la ejecución de la placa huella fuera continua y conforme a las especificaciones del proyecto.

- Durante el transcurso del período, se realizó el corte y figurado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de viga riostra, huellas, cunetas y bordillos, manteniendo la continuidad del trabajo.

- Durante el periodo se realiza vaciado de elementos en concreto de 21 MPa y 14 MPa elabora en obra a lo largo del tramo en ejecución teniendo en cuenta especificaciones de cada elemento.

Al concluir el período, el contratista logró un avance de 98 metros lineales durante el mes, continuando con el tramo No. 5 en ejecución.

Vereda Santo Domingo

En el transcurso del período del mes de agosto, el contratista se dedicó a llevar a cabo diversas actividades en el tramo de placa huella No. 5. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- En el tramo actualmente en intervención, se realiza trabajos continuos de escarificación en la subrasante para preparar el terreno para su estabilización con una mezcla de suelo y cemento. Una vez que la mezcla se aplica, se procede a la compactación a lo largo de toda la vía, con el objetivo de alcanzar un acabado final sólido y uniforme para la subrasante.

- Durante el periodo se lleva a cabo la modulación de los elementos de la placa huella siguiendo las dimensiones especificadas en el tramo No. 5.

- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella en el tramo No. 5 intervenido actualmente.

- Durante agosto, se ha procedido con el vaciado de concreto para los elementos de la placa huella en el tramo No. 5. Este trabajo implica la elaboración de concreto con una resistencia de 21 MPa para huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos, mientras que para la franja central y el sobreancho se ha empleado concreto de 14 MPa.

Una vez finalizado el periodo el contratista tienen un avance durante el mes de 70 metros lineales, teniendo ejecutados a la fecha 617 metros comprendidos entre todos los tramos.

Municipio de Gramalote

- **Vereda Boyacá**

Durante el período señalado, el contratista sigue avanzando en la construcción de la placa huella en el tramo No. 4. Las actividades que se están realizando son las siguientes:

- Para avanzar en la construcción del tramo en curso, se sigue realizando la excavación sin clasificar para los elementos de viga riostra en el tramo No. 4.

- Se Continúa con la instalación de formaleta de madera para modular la placa huella en el tramo No. 4, incluyendo el vaciado de elementos de sobreancho y franja central, así como la delimitación de vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.

- Se sigue llevando a cabo el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal en varilla corrugada No. 3 para los distintos elementos de la placa huella, como huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

- Se realiza durante todo el período el vaciado de concreto con dos niveles de resistencia: 21 MPa para componentes estructurales como huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, asegurando la resistencia y durabilidad necesarias; y 14 MPa para la franja central y el sobreancho, garantizando un rendimiento adecuado y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Al concluir el período, el contratista logró un progreso de 186,8 metros lineales durante el mes, con un total acumulado de 1054 metros, abarcando en el tramo No. 4 en curso.

Se llevó a cabo la excavación para la zanja de la tubería de alcantarilla PR5+780, y se procedió a la instalación de una tubería de PVC de 36” conforme a las especificaciones. Posteriormente, se realizó el relleno para habilitar el paso sobre el corredor en ejecución

Vereda San isidro

- Durante el período, el contratista completó las actividades en el tramo No. 5 y luego continuó con la ejecución de tareas en el tramo No. 2. Las actividades realizadas en campo incluyen:

- Se llevaron a cabo tareas de estabilización de la subrasante en el tramo 5 y 2, que incluyeron escarificación, incorporación de cemento y compactación

- Dando continuidad a los elementos se sigue con la instalación de formaleta de madera para modular la placa huella área final tramo No5 y en el tramo No2, incluyendo el vaciado de los elementos de franja central y sobreancho.

- Se continúa con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 (3/8”) para los distintos elementos de la placa huella, como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos, en el tramo correspondiente.

- Se continua el vaciado de concreto con una resistencia de 21 MPa, mezclado en el sitio, para los elementos estructurales como huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos. Igualmente, se utiliza concreto de 14 MPa, también preparado en el lugar,

para la franja central y el sobreancho, de acuerdo con las especificaciones del diseño.

- Se llevó a cabo la excavación para la zanja de la tubería de alcantarilla PR6+3338, y se procedió a la instalación de una tubería de PVC de 36" conforme a las especificaciones. Posteriormente, se realizó el relleno para habilitar el paso sobre el corredor en ejecución.

- Al final del período, el contratista alcanzó un avance de 215,2 metros lineales durante el mes, acumulando un total de 888,9 metros, correspondientes a los tramos ejecutados.

Durante todo el mes, se llevaron a cabo comités y/o reuniones periódicas de seguimiento y supervisión para evaluar exhaustivamente todas las actividades realizadas en campo en los frentes de trabajo ubicados en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios.

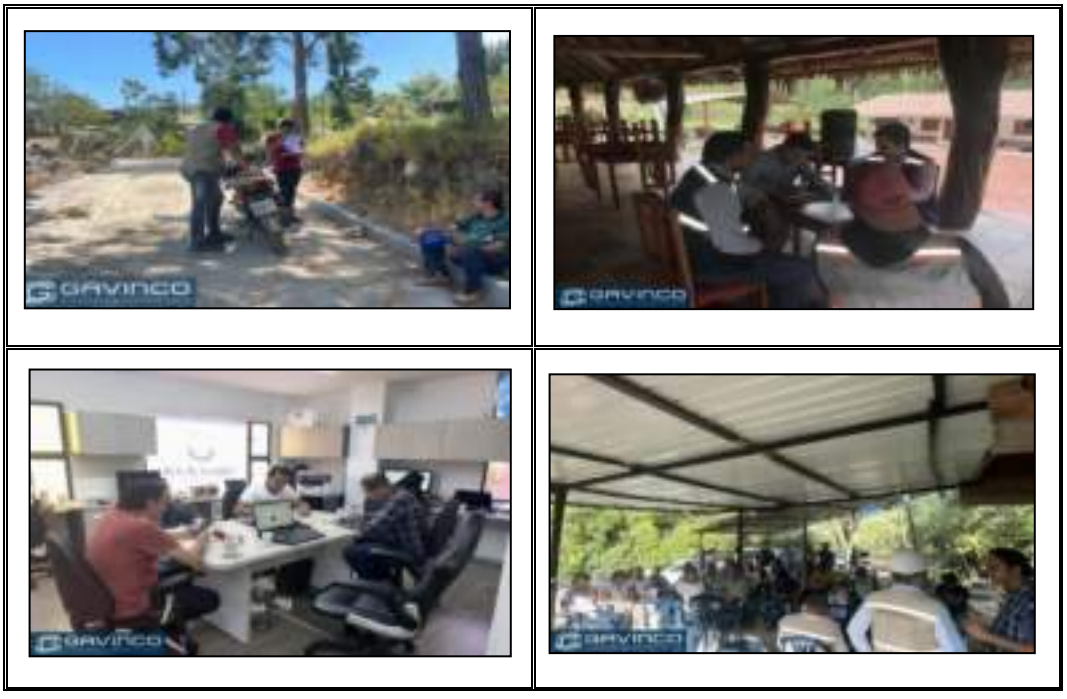


Ilustración 3 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

Al finalizar este mes de julio el contratista envía información incompleta de las actividades realizadas del seguimiento al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Debido al egreso de la Ingeniera residentes de obra en el municipio de Los Patios, el día 22 de Abril del 2024 se realiza actualización del grupo de gestión ambiental y social para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero William Quintero Pabón, la Profesional Ambiental Dayana Melina Salazar Ortega, la auxiliar Social Esther Saray, la profesional social Beltrán Ortega, el ingeniero residente de obra en el municipio de Arboledas Brayan Alberto Abellaneda y el ingeniero residente de obra del municipio de Gramalote Cesar Andrés Cárdenas Coll, de quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo previo al inicio de actividades labores en el Proyecto, durante el mes mayo ingresaron nuevos trabajadores para los frentes de obra del municipio de Gramalote.

Durante el mes de junio se realizan las siguientes capacitaciones programadas en el cronograma del PAGA.

1. Adecuada separación de residuos sólidos.

2. Cuidado de la flora y la fauna.

Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de los Patios.




Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Arboledas



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Arboledas, gramalote y Los Patios, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportado y dispuestos en el relleno sanitario.

Con respecto a los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la Trituradora La Amarilla quienes cuentan con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Todos los frentes de obra cuentan con sus materiales de construcción.

- Municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente Contratista

- Municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Durante este periodo el contratista recibió materiales de la Trituradora La Amarilla.

Tabla 2. Fuente de materiales

Localización	Volumen utilizado	Tipo de fuente	Numero de licencia ambiental
Santiago Norte de Santander	Ver tabla 3,4 y 5.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 344 de 09 de junio 2021

Se han recibido las siguientes cantidades de materiales provenientes de cantera durante el mes de junio del año 2024.

Tabla 3. Materiales utilizados en obra municipio de Los Patios

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	196,1515
Arena	125,3872
Piedra	37,778
Subbase	498,036

Tabla 4. Materiales utilizados en obra municipio de Arboledas

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	81,178
Arena	51,538
Piedra	7,207
Subbase	74,415

Tabla 5. Materiales utilizados en obra municipio de Gramalote

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	213,010
Arena	136,209
Piedra	42,103
Subbase	0

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra.

- Señalización en el municipio de Gramalote:



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

- Señalización en el municipio de Los Patios



Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de construcción y demolición generados a partir de la actividad de excavación serán dispuestos en predios autorizados por los dueños y por la alcaldía de cada municipio.
Los municipios de Los Patios y Gramalote se encuentran a la espera de la autorización del sitio de disposición por parte de la alcaldía.

El municipio de Arboledas cuenta con la autorización de la secretaria de planeación donde consta que si está permitido la disposición de materiales en el área seleccionada

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se instalan puntos ecológicos para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.

- Punto ecológico en el municipio de los Patios:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

Durante este periodo se entregan los residuos peligrosos almacenados en el municipio de Los Patios a la empresa NORSIDE quien se encarga de recolección transporte y su adecuada disposición final, se almacenan los residuos peligrosos en los frentes de obra de Gramalote y Arboledas, se inicia la gestión para realizar la recolección de residuos peligrosos en los frentes obra.

Durante el mes de junio se generaron las siguientes cantidades de residuos sólidos:

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Los Patios – Vereda California	No aprovechables	1,4	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		12,2 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Gramalote – Vereda Boyacá	No aprovechables	2,0	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	8,0	Rojo
TOTAL		19 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
	No aprovechables	1,5	Negro

Arboledas – Vereda Santa Anita	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		14,5 kg	

Fuente Contratista

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: En Los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas se realiza la compra de agua para uso industrial, en una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad vigentes.

Durante el mes de junio se realiza jornada de riego, en la vía existente con el objetivo de minimizar la generación de material particulado

.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: En los diferentes frentes de obra se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietarios de vivienda aledaña a los campamentos, lo que

permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y anti sol, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Durante este periodo, el proyecto no ha realizado intervenciones en Áreas Protegidas, En caso de realizarse alguna intervención se implementarán Medidas de conservación áreas de interés ecológico y se reportara en el informe mensual.

Se realizarán charlas de sensibilización a los trabajadores con el fin de informar que está prohibido extraer de los ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler viviendas cercanas las cuales se utilizan como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, igualmente se utilizan como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

- Campamento municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de los Patios



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de junio ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del contratista con el fin de revisar la documentación ambiental que se encuentra pendiente por entregar hasta la fecha.

3.8.1.4. Actividades Sociales

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

Se realiza socialización para el cierre de la vía y se da el reinicio de actividades constructivas, en donde se contó con la participación de la comunidad, presidente de la junta de acción comunal, interventoría y contratista.

Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-646-24, respuesta al oficio UTET-02590-322, con asunto: INFORME COMPONENTE SOCIAL ABRIL Y MAYO DE 2024.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL

Descripción actividades por programa

SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Se realiza seguimiento al canal de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, a través de un buzón de sugerencias, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas por la comunidad y a su vez mantener la confianza de los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Seguimiento de la Oficina de Información y Atención a la Comunidad

En el mes de abril no se presentaron PQRS por parte de la comunidad en los 3 municipios, se cuenta con formatos donde las personas pueden realizar su queja o reclamo, luego se realiza el seguimiento para poder llegar a posibles soluciones o pasos a seguir.

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
Patios		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de arboledas, con ubicación en castro y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Gramalote		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

4.1.2 Seguimiento a los Buzones Satelitales

En el presente mes contamos con tres medios de atención en funcionamiento y establecidos en los tres municipios que son: Correo electrónico y buzón de sugerencias.

Patios		En el buzón instalado enla Vereda California del municipio de los patios no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad.
Arboledas		En el buzón instalado en el corregimiento de castro del municipio de arboledas no se presentóninguna sugerencia por parte de la comunidad.
Gramalote		En el buzón instalado en la urbanización Miraflores del municipio de gramalote no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad

Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales

Fórmula: $\boldsymbol{N° \, medios \, de \, medios \, de \, atención \, en \, funcionamiento \, establecidos * 100}$

Fórmula: $\frac{3}{3} * 100 =$ 100%

Subprograma de apoyo a la comunidad en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad

Objetivo: Brindar apoyo en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad para que puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Acciones de información

Durante el periodo actual no se requirieron reuniones ya que la información requerida por lacomunidad se canalizo a través de cada presidente de junta de acción comunal de cada vereda

Fórmula: $\frac{N° \ de \ reuniones \ realizadas}{N° \ de \ reuniones \ programadas} * 100$

Fórmula: (0/0) *100 = 100%

No se planearon reuniones para la socialización y, por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna.

Acciones de divulgación

- Se realizaron oficios los cuales se radicaron a través de los presidentes de juntas de acción comunal en las respectivas veredas enlos cuales se ejecuta el respectivo proyecto.
- Se realizar avisos los cuales se colocaron en sitios visitados o transitados de manera frecuente por los miembros de la comunidad

Fórmula: (5/5) *100 =100%

Gramalote		Se realizó reunión con interventoría y la comunidad para tratar temas relacionados con el proyecto y aclarar dudas que se presentaron.

Proyecto de cultura vial y participación comunitaria



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

LISTADO DE ASISTENCIA

COMPONENTE GESTION SOCIAL - UT EDIVIAL

TEMA O NOMBRE DEL EVENTO	
CIUDAD / MUNICIPIO	
PROGRAMA / ESTRATEGIA	FECHA:

Objetivo: Realización Taller participativo de seguridad vial

RELACION DE PARTICIPANTES- LISTADO DE ASISTENC

#	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO					ORIENTACION SEXUAL				PERTENENCIA ETNICA							DISCAPACIDAD				
		Mujer		Hombre																		
		Cis	Trans	Cis	Trans	Ns/Rtesto	Homosexual	Bexual	Heterosexual	Asexual	Indígena	Negro	Afrocolombiano	Raizal	Palenquero	Arom	Ninguna	Psicosocial	Física	Cognitiva	Auditiva	Visual
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						

	ACTA DE REUNION	***AR-FAR-001***
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	**Versión 001**
		Fecha: 23/11/2023

ASISTENTES		
NOMBRE	**EMPRESA**	**FIRMA**

ASUNTO

COMPROMISOS

CONCLUSIÓN	
ACCIONES POR VENIR	**RESPONSABLE**
ELABORADA POR	

CONSECUTIVO		FECHA DE RECIBO	PROYECTO	SOLICITANTE	DEMORA EN DIAS	TIEMPO DE SOLUCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN	MEDIO POR EL QUE LLEGA	RECIBIDO POR	RESPONSABLE ASIGNADO
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
		TOTAL					0		0	0	Maximo dia
							0		0	0	Minimo dias
							0		0	0	Promedio d
							0		0	0	
							0		0	0	
		0					0		0	0	
										0	

Al finalizar este mes de AGOSTO el contratista envía solo anexos (algunos incompletos) de las actividades realizadas del seguimiento al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 11, quedando 2 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
7	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
8	LUIS ALBERTO MERCHAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426529	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
9	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
10	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
11	SERGIO ALONSO VALERO	CONDUCTOR	1094426974	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
12	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
13	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		TODO EL PROYECTO
14	DAYANA MELINA SALAZAR	ING AMBIENTAL	88261502	23/08/2024		TODO EL PROYECTO
15	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		ARBOLEDAS
16	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		ARBOLEDAS
17	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO		ARBOLEDAS
18	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		ARBOLEDAS, GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
19	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		ARBOLEDAS
20	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		ARBOLEDAS
21	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINAR	1094426430	ACTIVO		ARBOLEDAS
22	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO		ARBOLEDAS
23	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		ARBOLEDAS
24	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO		ARBOLEDAS
25	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	25/06/2024		ARBOLEDAS
26	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		ARBOLEDAS
27	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO		ARBOLEDAS
28	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		ARBOLEDAS
29	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024		ARBOLEDAS
30	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO		ARBOLEDAS
31	JESUS SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	RETIRADO		ARBOLEDAS
32	ALVARO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13413081	19/08/2024		ARBOLEDAS
33	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412578	19/08/2024		ARBOLEDAS
34	DOUGLAS URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	14/08/2024		ARBOLEDAS
35	RONALD SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	1/08/2024		ARBOLEDAS
36	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		ARBOLEDAS
37	DIEGO JESUS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		ARBOLEDAS
38	LUIS ANGEL ANTOLINES	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		ARBOLEDAS
39	FABIO URIBE	AYDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		ARBOLEDAS
40	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		ARBOLEDAS
41	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
42	EUGENIO MARTINEZ MACHADO	AYUDANDE DE OBRA	7618618	ACTIVO		ARBOLEDAS
43	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		ARBOLEDAS
44	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		ARBOLEDAS
45	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO		ARBOLEDAS
46	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		ARBOLEDAS
47	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024		ARBOLEDAS
48	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	17/06/2024		ARBOLEDAS
49	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	01/07/2024	ARBOLEDAS
50	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		ARBOLEDAS
51	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	01/07/2024	ARBOLEDAS
52	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		ARBOLEDAS
53	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO		ARBOLEDAS
54	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO		ARBOLEDAS
55	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	01/07/2024	ARBOLEDAS
56	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		ARBOLEDAS
57	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	RETIRADO	ARBOLEDAS
58	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	08/06/2024		ARBOLEDAS
59	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	08/06/2024	RETIRADO	ARBOLEDAS
60	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	08/06/2024		ARBOLEDAS
61	JHON DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	08/06/2024		ARBOLEDAS
62	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024		ARBOLEDAS
63	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024		ARBOLEDAS
64	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645020	08/07/2024		ARBOLEDAS
65	JESUS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
66	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024		PATIOS
67	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024		PATIOS
68	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		PATIOS
69	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		PATIOS
70	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024		PATIOS
71	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		PATIOS
72	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		PATIOS
73	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		PATIOS
74	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024		PATIOS
75	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		PATIOS
76	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024		PATIOS
77	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		PATIOS
78	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		PATIOS
79	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		PATIOS
80	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		PATIOS
81	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		PATIOS
82	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		PATIOS
83	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		PATIOS
84	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		PATIOS
85	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	13/07/2024	PATIOS
86	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO		PATIOS
87	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		PATIOS
88	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO		PATIOS
89	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		PATIOS
90	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
91	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO		GRAMALOTE
92	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO		GRAMALOTE
93	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVO		GRAMALOTE
94	GEOVANNY ORTIZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1090515100	ACTIVO		GRAMALOTE
95	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		GRAMALOTE
96	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO		GRAMALOTE
97	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	18/08/2024	GRAMALOTE
98	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	17/08/2024	GRAMALOTE
99	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	24/08/2024	GRAMALOTE
100	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO		GRAMALOTE
101	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO		GRAMALOTE
102	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	18/08/2024	GRAMALOTE
103	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO		GRAMALOTE
104	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO		GRAMALOTE
105	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO		GRAMALOTE
106	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO		GRAMALOTE
107	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO		GRAMALOTE
108	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO		GRAMALOTE
109	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO		GRAMALOTE
110	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	RETIRADO		GRAMALOTE
111	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO		GRAMALOTE
112	BRENDA ROCIO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647055	ACTIVO		GRAMALOTE
113	LUIS ANDELFO VEGA SALAZAR	AYUDANTE DE OBRA	1004896992	ACTIVO		GRAMALOTE
114	PEDRO ALEXIS SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092156588	ACTIVO		GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
115	LUIS ALFREDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092154860	ACTIVO		GRAMALOTE

2. Exámenes de ingreso

En el periodo se presentaron los siguientes exámenes de ingreso:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	CARLOS ALBERTO GONZALES	1051747361	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2024	FIGURAS	WILLIAM BARBOSA	3861	JOSE BELEÑO
2	CRISTIAN DANIEL FULLEDAS	1007883115	AYUDANTE	22/08/2024	FIGURAS	WILLIAM BARBOSA	3861	JOSE BELEÑO
3	EDER VANEGAS ARENILLA	1051743874	AYUDANTE	10/08/2024	FIGURAS	WILLIAM BARBOSA	3861	JOSE BELEÑO
4	ALVARO CRUZ	13413081	AYUDANTE	19/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF
5	ANGEL MARIA JAIMES	13412578	AYUDANTE	19/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF
6	DOUGLAS URIBE	1093889177	AYUDANTE	14/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF
7	RONALD SALCEDO	1092644428	AYUDANTE	01/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF
8	YOSSER CARVAJAL	1004941773	AYUDANTE	19/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF
9	DIEGO JESUS BOHADA	1092644511	AYUDANTE	19/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF

10	LUIS ANGEL ANTOLINES	1092645613	AYUDANTE	19/08/2024	PREVENIR	JAIRO MIGUEL ALDANA LAGUADO	3625	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF

3. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

5. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de agosto de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

ARBOLEDAS	PATIOS	GRAMALOTE
		

Fotografía 27 Entrega de EPP – Gobernación 1943

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

ARBOLEDAS – LOS PATIOS – GRAMALOTE

Fotografía 28 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 29 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

8. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de agosto de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

9. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIOS	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	Arboledas	10	26
	Gramalote		26
	Patios		26

10. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	agosto	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

Para el presente informe el contratista se adjunta registro fotográfico, protocolo CODVID y lavado de manos.



Arboledas



Los Patios



Gramalote

Fotografía 30 Implementación protocolo de bioseguridad

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante el periodo debido a la necesidad evidenciada en campo se hizo necesario la proyección de un filtro francés en el sentido lateral al corredor vial Veredas Cinera, Municipio de Arboledas y Vereda San isidro Municipio de Gramalote, por lo tanto, el contratista a la fecha no ha presentado dicho APU con el fin de ser validado y verificado por parte de la interventoría.

3.8.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFIA	DISEÑO GEOMETRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRAULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcán	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Juan Bueno	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyacá	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
	Santa Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
TOTALES	12	12	10	12	12	8

Convenciones

44		APROBADO FINAL
5		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2		NO HA PRESENTADO

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024-Volcan - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024-Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-608-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-609-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-610-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-611-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN**
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote.
TOPOGRAFIA	

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACION LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACION BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACION RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISION SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-307 del 15/04/2024 – CINERA - GIC-INVIAS-NTS-623-24 del 22/04/2024 – OBSERVACIONES CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-337 del 15-Jul-2024 - JUAN BUENO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11/Oct/2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 - GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 - GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14/Jun/2024 – **APROBACION**
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACION SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACION HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACION VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTETE LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACION POTRETOS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACION CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 - OBSERVACIONES - Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO

Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.3.2. Etapa de Construcción

De acuerdo con el seguimiento continuo de la ejecución del contrato de obra realizado por la interventoría y el informe semanal No. 65, se ha registrado un avance programado del 32,77% y un avance ejecutado del 39,02%. Esta evaluación considera el adicional No. 2 en tiempo y valor, que ha reducido el avance proporcional en función del nuevo valor del contrato. Durante el período, se han realizado actividades en 9 de las 12 veredas previstas, que se encuentran en los municipios de Arboledas (incluyendo las Veredas Chicagua Bajo, Potreros, Cinera, Juan Bueno, Santo Domingo y Volcán), Gramalote (Veredas Boyacá y San Isidro) y Los Patios (Vereda Corozal – California).

Es relevante mencionar que el contratista de obra está actualmente ejecutando actividades en los frentes de trabajo que habían estado suspendidos debido a la incomunicación entre el municipio de Arboledas y el corregimiento de Castro. La reanudación de estas actividades es crucial para cumplir con los objetivos del proyecto en las áreas afectadas.

A continuación, se ofrece un desglose detallado de las cantidades de placa huella ejecutadas hasta la fecha, proporcionando una perspectiva clara del avance logrado en el proyecto.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	6883	VEREDA SANTA DOMINGO	617	2975,3	3907,70
		VEREDA RINCONADA	307		
		VEREDA HELECHAR	183		
		VEREDA VOLCAN	261,4		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	449,40		
		VEREDA JUAN BUENO	431,2		
		VEREDA CINERA	442		
		VEREDA PORTREROS	284,30		
GRAMALOTE	2706	VEREDA BOYACA	1054	1942,5	763,10
		VEREDA SAN ISIDRO	888,90		
LOS PATIOS	4554	COROZAL - CALIFORNIA	1801,30	1801,30	2752,70
TOTAL	14143		**TOTAL**	6719,10	7423,9

Tabla 39 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

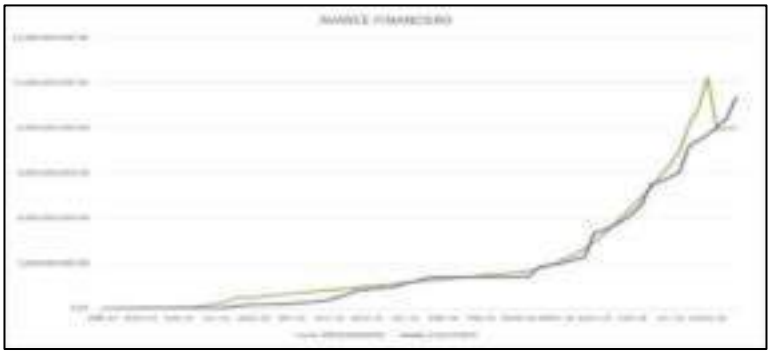


Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 31 de agosto de 2024, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $9.333.028.429,64 vs un programado equivalente en pesos a $8.017.000.442,58.

Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ejecuto el 100% el proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo de Caja	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952-22 del 28-Ago-23 – Reiteración
Caracterización Material Granular	Observado	PHM-044-2022 del 19-Oct-23

Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

Durante el mes de agosto, el contratista finalizo actividades de construcción en el tramo No. 5 del proyecto, hasta completar el alcance estipulado en el contrato.

- Se llevó a cabo el vaciado de los elementos de concreto que aún estaban pendientes a lo largo del tramo No. 5.

- A raíz de las observaciones realizadas durante el recorrido efectuado el 2 de agosto de 2024, junto con representantes de INVIAS, el contratista de obra y la interventoría, se solicitó la reparación de las fisuras detectadas, que eran causadas por retracción o variaciones de temperatura. La reparación de estas fisuras se realizó de acuerdo con las especificaciones requeridas para asegurar la calidad y durabilidad del trabajo.

- Se procedió con el retiro de materiales sobrantes y residuos acumulados en ambos márgenes del corredor vial. Esta tarea fue esencial para mantener el área de trabajo limpia y ordenada, contribuyendo así a un entorno de trabajo más seguro y eficiente.

- En el punto de referencia PR9+770, se llevó a cabo la instalación de canastas de alambre galvanizado. Estas canastas fueron luego sometidas a un proceso de encofrado para ser llenadas con piedra. Esta actividad es crucial para la construcción de la estructura de contención conocida como gaviones, que proporciona soporte y estabilidad al terreno.

- Además, se realizó la instalación de postes de referencia a lo largo del corredor vial. Estos postes tienen como propósito facilitar la identificación y localización precisa del tramo vial, siguiendo el código de ruta asignado. Esta medida es importante para la correcta señalización y orientación del proyecto en su totalidad.

- Dado que el contrato está entrando en la etapa de liquidación, se ha programado un recorrido para principios del mes de septiembre. Este recorrido incluirá a las comunidades de las veredas La Garita y La Mutis, así como a la alcaldía municipal, el contratista de obra y la interventoría. El propósito de esta reunión es realizar el acta de recibo a satisfacción por parte de las comunidades y llevar a cabo la entrega final de las obras a la comunidad.

Es importante destacar que, a la fecha de corte del presente informe, todas las actividades físicas del contrato han sido completadas al 100%, cumpliendo con el alcance de obra previsto.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		EJECUTADO AL 30-AGOSTO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							CANTIDAD	VALOR TOTAL
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00		3,438.00	$ 160,764,318.00
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00		2,902.50	$ 1,955,028,217.50
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00		186,218.19	$ 1,492,166,356.47
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00		6390.62	$ 789,254,351.24
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00		720.78	$ 239,495,012.16
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**		**$**	**4,636,708,255.37**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00		893.00	$ 41,757,573.00
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00		171.90	$ 115,786,167.30
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00		27.80	$ 12,680,052.60
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00		345.70	$ 11,170,604.10
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00		129.00	$ 98,678,679.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00		12,589.20	$ 100,877,259.60
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**		**$**	**380,950,335.60**
TRANSPORTES								
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00		0	$ -
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**		**$**	**-**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00		-	$ -
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**		**$**	**-**
PERFILADO Y CUNETEO								
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE.	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00		33,444.82	$ 47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**		**$**	**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES								
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00		40.98	9,299,673.36
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**		**$**	**9,299,673.36**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=			**5,074,684,022.47**

Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO:

Subprograma 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se programa reunión para el miércoles 29 de noviembre del presente año con el objetivo de conformar el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 0; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Subprograma 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto

Se realiza capacitación ambiental al personal de obra y administrativo en:

Ver anexo 1. Registro de asistencia.

- ¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE UN DERRAME?

Su seguridad siempre es lo primero intente averiguar qué líquido es y si hay algún peligro añadido con este líquido.

Informar al supervisor o jefe inmediato, para así recibir indicaciones sobre el manejo de la situación.

El personal debe utilizar los elementos de protección adecuada.



Delimitar o señalar el área.

Detenga la acción responsable del derrame.

Contenga el derrame para evitar que se siga dispersando el producto.

Evite que la sustancia vaya al alcantarillado o pueda alcanzar un cuerpo de agua.

Utilice el aserrín para absorber la sustancia química, retire el aserrín contaminado y disponga en una bolsa color negra hasta que haya retirado por completo el producto.

Disponga adecuadamente el residuo con un gestor autorizado.



Fuente contratista

Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, unidades sanitarias, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta. No se generarán residuos peligrosos en obra. Los mantenimientos de las maquinaria, equipos y vehículos se realizarán en un lugar externo y que cumpla con los requerimientos para prestar el servicio.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque. A la fecha no se ha requerido de este servicio. Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza y mantener papel higiénico y jabón para lavado de manos. Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO

SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

Con respecto a la aprobación del documento PAGA, La documentación del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA, versión 1, fue radica al Invias, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS- 133-24

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 2.1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos asociados al manejo de los materiales de construcción en los sitios de influencia directa de las obras y centros de acopio

Actividades ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

El contratista hace entrega de los EPP a todo el personal:



Fuente: Contratista

Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra.

Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS.

Fuente de materiales

Localización	Volumen a extraer	Tipo de fuente	Estado Legal		
			Con Licencia ambiental	En trámite	Vigencia de la licencia
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra

CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA			
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,434.37	160,594,575.57
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	2,917.31	1,965,003,744.77
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	185,308.33	1,484,875,648.29
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	6,380.60	788,016,861.20
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	719.85	239,185,999.20
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	893.00	41,757,573.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	171.90	115,786,167.30
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	27.80	12,680,052.60
RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	345.70	11,170,604.10
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	129.00	98,678,679.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	12,589.20	100,877,259.60
TRANSPORTES			0.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1 000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	-	0.00
			0.00
SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	6.00	3,554,610.00
PERFILADO Y CUNETEO			0.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	47,725,756.14
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES			0.00
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	43.56	9,885,854.87

Fuente Contratista

Subprograma 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución de, que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.

Actividades ejecutadas: Se cuenta señalización SST y manejo de tránsito en los frentes de obra.



Fuente contratista

Subprograma 4: Manejo Integral de los residuos sólidos convencionales en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Los Patios, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente, el que está en obra no cumple la normatividad ambiental.

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo. La vía se encuentra limpia y sin residuos solidos



Fuente Contratista

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo.

Durante este periodo no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario

ya que la cantidad generada no es significativa. Los residuos se almacenan en los contenedores.

Los lubricantes y aceites usados serán tratados por la empresa que preste el servicio de mantenimientos. Por lo que, no se generarán residuos peligrosos en la ejecución de la obra.

LUGAR	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (KG)	COLOR
La Mutis	Aprovechable	0,0	Blanco
	No Aprovechable	5,0	Negro
	Orgánico Aprovechable	0,0	Verde
	Peligroso	0	Rojo
TOTAL		5,0	

La vía se encuentra limpia y sin residuos sólidos





Fuente: Contratista

PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA

Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: El agua que se requiere para uso industrial, se suministra a través de carro tanque, la empresa que presta el servicio cuenta con los permisos ambientales para su funcionamiento. (Anexo 2. Permiso concesión de agua) Se solicita el servicio de carrotanque para actividades civiles y para riego de las vías internas como medida de mitigación de la dispersión del material particulado.



Fuente contratista

Subprograma 3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 4.1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. **PBSE-4.1-11**

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente.



Fuente: Contratista

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

Subprograma 4.3: Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles. PBSE-4.3-14

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente.

Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre la importancia ecológica, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas estratégicos, las medidas ambientales a implementar y la normatividad ambiental.

Se prohíbe a los trabajadores la utilización de las áreas sensibles para la disposición d sus excretas, el contratista deberá instalar los sistemas sanitarios que garanticen las necesidades del personal.

Se prohíbe a los trabajadores extraer de estos ecosistemas estratégicos, especímenes vegetales y animales.

Subprograma 4.4: Protección de Fauna en Obra PBSE-4.4-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Los Patios En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

MEDIO ABIÓTICO

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas. Así mismo, se cuenta con parqueadero de motos y parqueadero de maquinaria. Se cuenta con kit de atención de emergencia, con material de primeros auxilios tales como botiquín debidamente dotado, camilla para transporte de heridos, entre otros.

Subprograma 5.2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.3-20

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver anexo 3 Preoperacionales) Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

El operario cuenta con todos los elementos de protección personal (EPP), que son necesarios para realizar su trabajo. Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.


Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización. En el periodo no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental

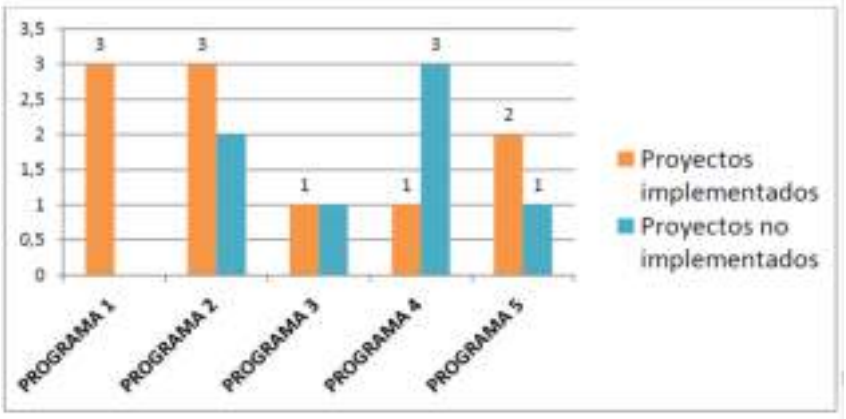

Fuente Contratista

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación de los informes estado ambiental del proyecto que deben ser entregados trimestralmente.

La interventoría da aprobación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se remite al INVIAS, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-133-24.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El contratista de obra a la fecha no ha entregado información solicitada por la interventoría; Así mismo no ha entregado informes mensuales con las actividades realizadas durante el mes, se presentan atrasos en la entrega de la documentación.

La obra fue finalizada el 30 de agosto de 2024, la interventoría se encuentra a la espera de información pertinente en cuanto al componente social.

3.9.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Control del personal**

El Contratista registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/10/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
2	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	SST	1.090.448.010	7/11/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023	4/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
4	JOSE ANDRES OSORIO CACERES	VIGILANTE	1.090.461.533	16/04/2024	30/05/2024	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
5	OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	OPERADOR PAJARITA	13.388.186	20/03/2024		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
6	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1.090.472.764	14/03/2024	23/03/024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
7	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
8	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
9	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
10	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023	30/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023	25/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
16	LUIS ANTONIO TARAZONA GARCIA	AYUDANTE	88.261.764	28/11/2023	24/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
17	DANIEL ALBERTO CAMARGO GALVIS	AYUDANTE	1.090.425.897	12/12/2023	30/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
18	LUIS ALBERTO PARRA GALLO	AYUDANTE	1.090.390.418	10/01/2024	29/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
19	RAMIRO RAVELO PINZON	AYUDANTE	5.634.789	12/12/2023	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
20	GREGORI ALEXIS CARRILLO	AYUDANTE	1.232.402.729	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
21	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL	1.120.564.035	28/11/2023	30/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
22	LUIS ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE	1.094.266.383	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
23	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL	11.202.858	20/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
24	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	OFICIAL	13.506.458	12/02/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS
25	OSCAR PEÑARANDA RODRIGUEZ	OFICIAL	5.398.337	1/04/2024	4/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
26	ALEXANDER ZUÑIGA SANCHEZ	OFICIAL	1.090.441.784	2/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
27	EDINSON FABIAN RODRIGUEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.269.347	9/04/2024	11/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
28	PEDRO JOSE ORDUZ HERNANDEZ	OFICIAL	88.267.721	9/04/2024	13/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
29	ANDRES CAMILO LOPEZ LOPEZ	OFICIAL	1.114.091.588	10/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
30	ERMIR BADILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.148.221.318	12/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
31	JEAN CARLOS FLOREZ FLOREZ	OFICIAL	1.090.378.596	15/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
32	ALEXANDER ROLON MIRANDA	AYUDANTE	88.312.383	18/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
33	WILMER ARBEY PADILLA DUARTE	OFICIAL	1.092.357.805	22/04/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS
34	JESUS ALBEIRO AMAYA ZAMBRANO	AYUDANTE	5.519.424	21/05/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS	LA MUTIS	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de mayo se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 31 Entrega de EPP – Gobernación 2052

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 32 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se debe contar en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.



Fuente Contratista

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado

en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de agosto de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	0	5

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	agosto	0

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Actualmente el contratista no está ejecutando ITEMs no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el contratista de obra continua en estado (APROBACION CON OBSERVACIONES) de algunos de los componentes revisados (Topografía, Diseño geométrico, Informe Hidráulico), teniendo en cuenta que la interventoría realizo algunas observaciones a las subsanaciones ya entregadas faltando alguna información técnica o en su defecto alguna corrección.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

Durante el período mencionado, el contratista llevó a cabo una serie de actividades fundamentales para cumplir con el alcance contractual de las obras previstas en el corredor vial. Estas acciones fueron esenciales para avanzar en la construcción del proyecto. A la fecha, se ha logrado la construcción completa de 4,004 metros lineales de placa huella a lo largo del corredor vial La Garita – La Mutis.

A continuación, se presenta un resumen detallado del total de metros de placa huella que se han ejecutado hasta la fecha. Este resumen ofrece una visión clara del progreso del proyecto y ha sido actualizado según las medidas realizadas en campo:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238,60	0	238,60
TRAMO No2	1411	0	1411
TRAMO 3A	518,3	0	518,3
TRAMO 3B	790,2	0	790,2
TRAMO 4	701,2	0	701,2
TRAMO 5	344,8	0	344,8
TOTAL	4004	0	4004

Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

En el presente informe se evidencia la ejecución al programado de $6.043.156.517,39.

Por lo tanto, se presentan las siguientes cantidades en el avance contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES PROGRAMADA	CANTIDADES EJECUTADAS
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:			
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	3438,00	3438,00
2,0	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	2902,50	2902,50
3,0	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	186218,19	186218,19
4,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	6390,62	6390,62
5,0	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	720,78	720,78
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES			
6,0	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	40,98	40,98
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:			
7,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	893	893
8,0	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	171,9	171,9
9,0	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	27,8	27,8
10,0	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	345,70	345,70
11,0	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	129	129
12,0	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	12589,20	12589,20
	TRANSPORTES			
13,0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	0	0
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			
14,0	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	9	9
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO			
	PERFILADO Y CUNETEO			
15,0	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33.444,82	33.444,82

Tabla 44 Avance contractual en el periodo

Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

2. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

3. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 45 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Solicitud	GBE-157-2022 del 04-Abr-2024
Flujo de Caja	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-526-24 del 03-Nov-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 46 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de agosto por parte del contratista se tiene:

Municipio de Ocaña - Buenavista

El contratista finaliza la ejecución del proyecto al 100%, en donde se ejecutó 1692m de placa huella y ocho (08) alcantarillas.

Además, el día 26/08/2024 se firmó ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de obra, entre la alcaldía municipal, el contratista de obra y la interventoría.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 22-AGOSTO-2024	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,776.65	$ 191,247,512.70
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,179.38	$ 768,994,679.54
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	102,295.80	$ 768,548,345.40
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,668.08	$ 392,295,806.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	392.06	$ 133,549,750.16
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00	14,196.82	$ 194,879,748.14
SUB TOTAL					$ 2,275,884,754.00	$	2,449,515,842.58
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	227.43	$ 9,105,842.34
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	95.37	$ 62,184,387.21
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$ 3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$ 42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	33.13	$ 15,202,595.01
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,986.91	$ 29,953,654.83
SUB TOTAL					$ 172,645,113.00	$	161,544,185.29
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CL	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$ -
SUB TOTAL					$ 21,920,020.00	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00	8.00	$ 2,796,016.00
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	129177		522.50	$ 67,494,982.50
SUB TOTAL							
TOTAL						$	2,681,351,026.37

Tabla 47 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

Las actividades Finalizadas el día 24 de agosto del presente año, del componente ambiental No hay información.

La interventoría se solicitó mediante oficio emitido el 23 de agosto radicado GIC-INVIAS-NTS-1184-24, en el cual se pide aclaratoria sobre correcciones en documentos, de un contrato de proyecto Buena vista, pero que hace mención a Morrison, estamos a la espera de que el funcionario de INVIAS resuelva la disyuntiva

3.10.1.4. Actividades Sociales

Las actividades realizadas en el componente social fueron las siguientes:

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

Subprograma 1 – Atención a la comunidad

En este subprograma que tiene como objetivo establecer una comunicación directa con la población y los entes que intervienen en la misma, es necesario realizar reuniones para establecer a cuerdos y responder las inquietudes de la comunidad.


Horario de atención	Hora
Lunes a viernes	8:00 a.m. – 12:00 a.m. a 2:00 p.m. - 6:00p.m.
Sábados	8:00 a.m. – 12:00 a.m.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
	En este caso no se presentaron PQRSen el mes de julio.
	Información (Puntos móviles de información **1/** Frentes activos **1**) **=** 100%

Subprograma 2 – Información y Divulgación


En el proyecto vial es importante tener una comunicación directa, con el presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Buenavista, debido a que, es la representación de su comunidad; además, al presidente se le recuerdalos diferentes canales

de comunicación con los que cuenta el contratista para larecepción de las peticiones, el buzón satélite, el correo electrónico y el componente social quien estará al tanto de las inquietudes.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
 Reuniones = (Reuniones celebradas **1** / Reuniones requeridas **1**) x**100** = **100 %**	Reunión de culminación del proceso constructivo y encuentro con el presidente para el cierre de las actas de almacenamiento.
	N/A

Subprograma 3 – Cultura vial y participación comunitaria

En el desarrollo de este mes se hizo dos actas de cierre almacenamiento de materiales pétreos y herramienta menor, debido a que en los tramos uno, fue entregado a la comunidad y el cual está siendo utilizado por el mismo; así mismo, en esta fase constructiva, la contratación del personal en obra pertenece al corregimiento.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
 Estrategias=(Estrategias implementadas **1**/ Estrategias proyectadas **1**) =**100**	Se realizan visitas a los propietarios para el cierre de las actas de vecindad.
 Acercamientos=(Reuniones realizadas **1**/ Reuniones convocadas **1**)x100 =**100**	Se realiza un encuentro con los habitantes del corregimiento, para realizar un recorrido por el último tramo.
	N/A



Fuente: Contratista

Subprograma 4 – La infraestructura de predios y servicios públicos

En este subprograma no se realizaron actividades debido a que ya fueron entregadas las actas de vecindad a la interventoría.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Actas de vecindad} = \left(\frac{\text{Actas de vecindad elaboradas}}{\text{Construcciones afectadas}} \right) * 100$	N/A
$\text{Afectaciones} = \left(\frac{\text{Afectación subsanada}}{\text{Afectación realizada}} \right) * 100$	

Se anexa evidencia del documento modelo para la captación de la información.



Fuente: Contratista

Subprograma 6 – Mano de obra contratada con enfoque de género. Derecho fundamental

Es importante que, en el desarrollo del proyecto vial, la mano de obra es de la vereda, en este caso, se tiene laborando siete personas, además, la ingeniera auxiliar de la obra está al tanto de la empleabilidad de los habitantes del corregimiento.

INDICADORES DE GESTIÓN	PROCESO/DESCRIPCIÓN
Vinculación (MO de la región contratada **7/** total MO proyecto **7) x100 =100%**	Es importante que la mano de obra sea de la vereda de Buenavista.
Vinculación (MO pertenecientes a grupos vulnerables **7/** total personal del proyecto de la región **7) x100 =100%**	La vinculación del personal hace parte del corregimiento de Buenavista.

Subprograma14 – Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa informada con comunidades étnicas

Para la consulta previa el Ministerio del Interior se envió nuevamente, debido a que solicitaron unos SHAPE de topografía y coordenadas del proyecto, así mismo, el PAGA (Plan Adaptación Guía Ambiental), el cual cuenta con el componente socialy ambiental con las estrategias de mitigación por la intervención vial.




Subprograma 15 – Inclusión social con perspectiva de género y transversalización

En este subprograma se tiene en cuenta una charla enfocada a los principales factores de riesgos en el marco de la violencia de género y el aumento de las cifras en Colombia,

así mismo, como se educa las emociones en llegado caso de sufrir alguna emergencia en el hogar, donde debe primar el bienestar de las personas que habitan en el núcleo familiar; asimismo, en el proyecto la contratación se realizó directamente con los habitantes del corregimiento puesto que todos pertenecen a Buenavista.



INDICADORES DE GESTIÓN	PROCESO/DESCRIPCIÓN
Flexibilización(Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización **6** / Número total de padres-madres cabeza de hogar del proyecto **7) x100** **=85%**	En el mes de agosto se realizó la contratación de 7 personas de la vereda.
Capacitaciones=(Número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso **7** /Número total de trabajadores del proyecto **7**)**x100** **=100%**	Se realiza una capacitación enfocada en los principales riesgos en la violencia de genero.

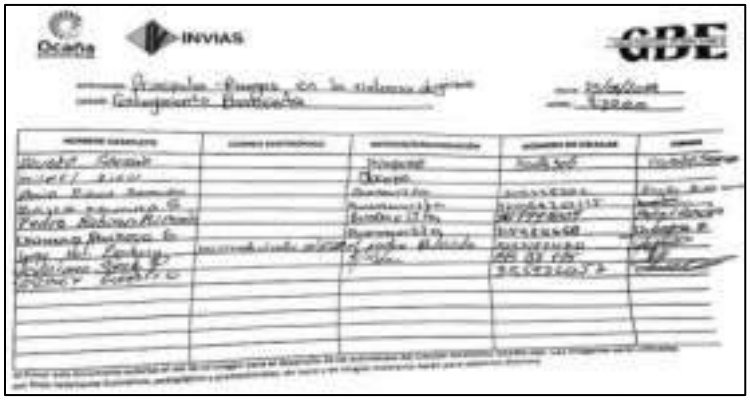

El contratista de obra durante la semana realizo envió del informe del mes de agosto a la interventoría, donde evidencia el cierre de actividades durante la ejecución del proyecto. La interventoría está a la espera de la revisión y subsanación por parte de Invias para dar aprobación de la realización y entrega del trimestral final por parte del contratista y dar cierre al componente social.

3.10.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se la obra se encuentra suspendida desde el pasado 27/05/2024:

1. Contratación del personal

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842		ACTIVO
2	DIEGO ARMANDO	PROFESION AL SST	91541702		ACTIVO
3	HUGO ALEJANDRO GOMEZ ASCANIO	RESIDENTE DE OBRA	88283744		ACTIVO
4	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1007912734		ACTIVO
5	CIRO ANTONIO VEGA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	5470076		ACTIVO
6	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978		ACTIVO
7	ALVEIRO NAVARRO GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	5471233		ACTIVO
8	CRISTIAN OLIVER NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1091674616		ACTIVO
9	JHONATAN PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.467		ACTIVO
10	JHANCARLOS PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.466		ACTIVO

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 33 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 34 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 35 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de agosto de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	1	3

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	agosto	0

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto las cuales son:

- Terraplén

Durante el periodo se encuentra en verificación por parte de la interventoría con el fin de evaluar el valor unitario final para cada una de las actividades.

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** -
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 48 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizo con la actividad de construcción de 142m de placa huella en el tramo 3.

Teniendo en cuenta que a la fecha se tiene la totalidad de estudios y diseños.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1692	1692	0
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1692	0

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

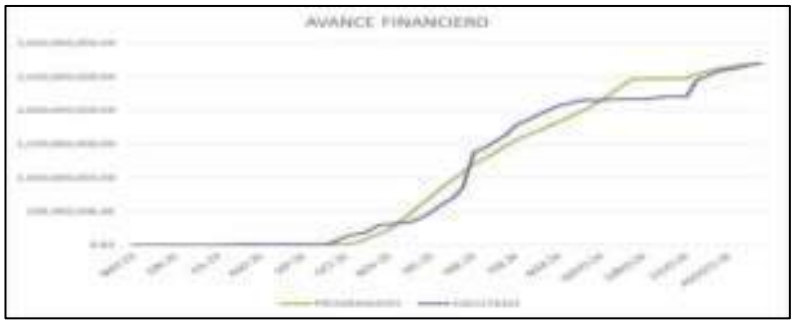


Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A corte de 24 de agosto de 2024, el contrato de obra ejecuto la totalidad del valor del contrato $2.700.000.000.

En el presente informa de realizado un total de 1692m lineales de paño completo llevándose a cabo la totalidad de ejecución de 8 alcantarilla ubicadas en el presente corredor comprendidas de 3 und en el tramo 4 de 500 ml con sus obras de protección y 5 unidades el tramo 3 con sus obras de protección como gradas disipadoras y puntos de estabilización de taludes con 1692 ml de paño ejecutado y terminación del sello de juntas.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COEMRCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 49 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los siguientes documentos. A la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024

		GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024

		GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISION A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	N/A	No se maneja anticipo en el contrato de obra.
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

		CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr–2024 GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**

Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar–2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISION AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISION INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N°020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N°021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Revisión	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega con N°028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISION AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N°026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023-REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISION GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISION GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 - REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observación	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Hojas de vida	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024 Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024
Instalaciones Provisionales	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalación De Valla	Observado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Mar-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024 IC-INVIAS-NTS-987-24 del 03-MAY-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISION INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Observado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	No entregado	
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACION RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACION DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 12-06-2024
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista entrega por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-0010 - 18-07-2024
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°015- CD-FC-082-2023 el 18-07-2024

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Hojas de vida	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024
Plan De Manejo De Transito - PMT	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024 Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1171-24 DEL 22/08/2024 **APROBACION**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Programa De Obra	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.1.1. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1172-24 DEL 22/08/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad		
Hojas de vida		
Programa De Obra		
Flujo De Caja		
Programa De Generación De Empleo		
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio		
Análisis de Precios Unitarios		
Instalaciones Provisionales		
Plan De Manejo De Transito - PMT		
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo		
Fuente De Materiales		
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio		
Diseño de Mezcla		

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de mayo de 2024 por parte del contratista están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 385 metros lineales de placa huella, 01 alcantarilla y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros lineales de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella, 16699.60 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 223 metros lineales de placa huella, 13441.69 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 232 metros lineales de placa huella, 16201.11 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 50 metros lineales de placa huella, 16964.05 m^2 de mantenimiento periódico y 03 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El acta de inicio del presente contrato de obra se firmó el 05/08/2024, se proyecta la realización de 350 metros lineales de placa huella, 04 alcantarillas y 15460.91 m^2; el contratista de obra se encuentra en etapa de estudios y diseños, entrega de documentación de preconstrucción, estudio de la zona y acopio de material. Igualmente, en la zona se han realizado 02 alcantarillas.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio (GIC-INVIAS-NTS-1189-24) ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1122-24; RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA -.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio (GIC-INVIAS-NTS-1183-24) donde se subsana RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-039300 – ENTREGAN REQUERIMIENTOS.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista se encuentra al día en la entrega de la documentación del componente ambiental. Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de febrero 2024.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

se entrega oficio GIC-INVIAS-NTS-1196-24 El día 26 agosto del presente año ASUNTO: ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-737-24; RESPUESTA OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-047971.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente. Para este mes de agosto no aplica información, el proyecto finalizo el 6 de abril 2024.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio INVIAS (GIC-INVIAS-NTS-1252-24) ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047967 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS

INFORME PAGA - MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE AMBIENTAL. (2024S-VBOG-047967) Al finalizar este mes de julio no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente. Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de febrero 2024.

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza recorrido de obra a la vereda Primavera con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental; se solicita la entrega del informe trimestral y el informe balance a la terminación del contrato de obra, para realizar el respectivo cierre. Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de junio 2024.

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de agosto no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de agosto no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

Se envía oficio haciendo requerimientos mediante oficio del 15 agosto GIC-INVIAS-NTS 1148-24, ASUNTO: SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de agosto no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

Se envía oficio haciendo requerimientos mediante oficio del 13 agosto GIC-INVIAS-NTS 1150-24, ASUNTO: SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL.

.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se da aprobación a la FUENTE DE MATERIALES, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-860-24.

Se realiza recorrido de obra, con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y la implementación de los subprogramas contemplados en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), durante la ejecución de la obra.

Por otra parte, esta interventoría solicito al contratista de obra la entrega documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Desde la presentación del informe anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades sociales durante el periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2024.

ACTIVIDAD 1 – SOCIALIZACION DE AVANCE DE OBRA CON CONCEJO MUNICIPAL

En el marco del desarrollo de las actividades sociales, para el presente periodo, el concejo municipal realizó una invitación al residente de obra a una de las sesiones, con el fin de socializar el avance físico de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDAD 2 – RESULTADO MONITOREO A INDICADORES


Los indicadores son herramientas que permiten la medición del cumplimiento de los objetivos y estos se realizan para la planeación y gestión de las actividades realizadas, cada subprograma tiene en cuenta este ítem para evaluar el resultado y productos que permitan disminuir el impacto.

SUBPROGRAMA 1: ATENCION A LA COMUNIDAD

Como se mencionó en informes anteriores, el contratista ha dispuesto de un buzón de PQRS donde la comunidad puede enviar sus solicitudes de manera directa al correo viasrurales2023@gmail.com, también la secretaria de planeación del municipio se encuentra disponible para brindar cualquier información acerca del proyecto vial que se está ejecutando.


Con lo anterior se reafirma el compromiso con la comunidad de establecer una comunicación directa con el fin de resolver todas las inquietudes que surjan del proyecto.

El horario de atención para la recepción de solicitudes es de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
	Para el periodo del presente informe no se presentaron PQRS.
	Información (Puntos móviles de información **1/** Frentes activos **1**) **=** 100%




SUBPROGRAMA 2: INFORMACION Y DIVULGACION

Con respecto a este subprograma se informa que el presidente de la junta se encuentra informado acerca de los canales oficiales con los que la comunidad puede dirigir sus inquietudes, quejas o requerimientos referentes al proyecto y de esta manera socializarlos con su comunidad.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
	Para el periodo del presente informe no se realizaron reuniones.
	Estrategia de divulgación pública: número de elementos de divulgación implementados **1**/ número de elementos de divulgación proyectados **1**) x100) **=100%**

SUBPROGRAMA 3: CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No se han realizado actas de cierre del proyecto debido a que aún se encuentra en ejecución.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
	En este mes no se realizaron encuentros con la comunidad.
	N/A
	En este mes no se realizaron actas de cierre.

SUBPROGRAMA 4: LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

No se reportan actividades en este subprograma ya que las actas de vecindad ya fueron entregadas a la interventoría en informes anteriores.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$Acta Vecindad = \left(\frac{\text{Acta de vecindad elaborada}}{\text{Construcciones aledañas}} \right) x100$	N/A
$Afectaciones = \left(\frac{\text{Afectación subsanada}}{\text{Afectación realizada}} \right) x100$	N/A



SUBPROGRAMA 5: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO DE DERECHO Y DIFERENCIAL

Como se ha reflejado siempre, el compromiso del contratista es emplear la mano de obra de la región para fomentar el bienestar de la comunidad foco del proyecto; por tanto, en este periodo se cuenta con 11 personas de la región laborando de manera directa y se han generado 10 empleos indirectos correspondientes a transportes, alimentación y hospedaje.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$Vinculación = \left(\frac{\text{MO de la región contratada}}{\text{Total MO proyecto}} \right) x100$	Vinculación =(MO de la región contrata **11** / Total MO proyecto **11**) **x100 =100 %**
$Vinculación = \left(\frac{\text{MO perteneciente a grupos vulnerables}}{\text{Total personal proyecto de la región}} \right) x100$	Vinculación=(MO perteneciente a grup vulnerables **7**/Total personal proyecto la región **11**) **x100 =63.6%**

SUBPROGRAMA 15: INCLUSION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y TRANSVERSALIZACION

Para este periodo se cuenta con 9 personas de la región laborando de manera directa en la fase operativa del proyecto.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
	Flexibilización=(Número de padres madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización **8/** Número total de padres- madres cabeza de hogar del Proyecto **11) x**100 =**72.7%**
	N/A
	Vinculación=(MO perteneciente a grupos vulnerables **7/**Total personal proyecto de la región **11**) **x100** **=63.6%**

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA 1.1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CÓDIGO SM-DAGA- 1.1-01

OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, PAGA, a través de la gestión de los profesionales responsables de la actualización e implementación del documento.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA X ALTA ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La formulación del documento PAGA es la esencia de la gestión socioambiental del proyecto, por lo cual los profesionales deben realizar la gestión necesaria (formulación, ajuste, aprobación y radicación del documento) para obtener la aprobación del documento por parte de la interventoría, previo al inicio de las actividades constructivas.

Se requiere contar con el equipo mínimo de profesionales que puedan realizar la supervisión e implementación de las medidas de manejo durante el desarrollo del proyecto, atendiendo las obligaciones y/o recomendaciones que sean suscitas por las autoridades ambientales y propiciar ante la dirección del proyecto, el suministro de elementos necesarios para el desarrollo de cada uno de los subprogramas. Evidenciar mediante la formulación de informes de gestión, la implementación de cada una de las medidas de manejo del documento PAGA y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante las autoridades ambientales de forma general o específicamente en cada uno de los actos administrativos que se hayan generado para la autorización del uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD MOMENTO

Seguimiento a la formulación del documento PAGA, aprobación de la interventoría y radicación del documento ante la entidad contratante.

Antes de inicio de las actividades constructivas Validación de los insumos y elementos necesarios para implementar las medidas de manejo.

Durante el desarrollo se realiza el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA X ALTA ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El equipo de gestión socioambiental del proyecto se encuentra a cargo de realizar las inducciones y capacitaciones de todas las personas vinculadas al proyecto, especialmente las que de una u otra forma puedan aportar en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas para el proyecto. Dentro del control y seguimiento, se verificará la realización de las siguientes actividades:

• Talleres de inducción al personal programados.
• Capacitaciones para la prevención y control de contingencias.
• Capacitaciones en educación ambiental a los trabajadores del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista de obra no está realizando la entrega de la documentación solicitada a tiempo por parte de la interventoría.

La interventoría está realizando la supervisión y evaluación de las actividades tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se radica oficio el día 27 de agosto asunto: solicitud del documento PAGA según radicado GIC-INVIAS-NTS-1204-24.

Una vez culminada la etapa de revisión y ajuste a los diseños, que tomó 5 semanas, se da inicio con las actividades de obra en la vereda la Aradita, desde este momento inicia el desarrollo de las actividades ambientales correspondientes a la ejecución y que se muestran a continuación:

ACTIVIDAD 1 – AREA DE ALMACEN

Para la construcción del tramo 2 del proyecto se requirió de la instalación de un nuevo punto de almacén para resguardar los materiales de obra y se presenta a continuación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 2 – ORDEN Y SEÑALIZACIÓN DE AREAS

Se evidencia orden y aseo dentro y fuera del campamento, así como la señalización de áreas. También la instalación del punto ecológico en el tramo 2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 3 – CAPACITACIONES AMBIENTALES

Con el fin de dar cumplimiento con lo contenido en el documento PAGA, se realizaron durante el mes de agosto las siguientes capacitaciones:

Presencia de vectores
Alteración hábitat fauna silvestre

Los registros de las capacitaciones se encuentran en al apartado anexos del presente documento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES SOCIALES MES DE AGOSTO

ACTIVIDAD 1 – VISITA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL A LA OBRA

La administración municipal en cabeza de la alcaldesa Ana dolores Solano y la secretaría de planeación, realizaron visita al tramo 1 con el fin de observar el avance físico de la obra. Se realizó socialización de las actividades llevadas a cabo hasta el momento y la programación de obra vigente. Se hicieron recomendaciones a la alcaldía y la comunidad acerca del cierre de la vía una vez terminada la última placa ya que debe darse un tiempo de fraguado al concreto sin paso de vehículos para garantizar la resistencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 2 – VISITA DEL INVIAS A LA OBRA

Se recibe visita de obra de parte del INVIAS con la presencia del Ingeniero Mauricio Rodríguez de la territorial Norte de Santander y se verifican espesores de placa, conformación de subbase y aceros de refuerzo instalados en obra. También hace presencia el director de Interventoría y la directora de Obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

ACTIVIDAD 3 – RESULTADO MONITOREO A INDICADORES

Los indicadores son herramientas que permiten la medición del cumplimiento de los objetivos y estos se realizan para la planeación y gestión de las actividades realizadas, cada subprograma tiene en cuenta este ítem para evaluar el resultado y productos que permitan disminuir el impacto.

SUBPROGRAMA 1: ATENCION A LA COMUNIDAD

Como se mencionó en informes anteriores, el contratista ha dispuesto de un buzón de PQRS donde la comunidad puede enviar sus solicitudes de manera directa al correo viasrurales2023@gmail.com, también la secretaria de planeación del municipio se encuentra disponible para brindar cualquier información acerca del proyecto vial que se está ejecutando.

Con lo anterior se reafirma el compromiso con la comunidad de establecer una comunicación directa con el fin de resolver todas las inquietudes que surjan del proyecto.

El horario de atención para la recepción de solicitudes es de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$\text{Cierre PQRS} = \left(\frac{\text{PQRS cerradas}}{\text{PQRS presentadas}} \right) \times 100$	Para el periodo del presente informe no se presentaron PQRS.

$Información = \left(\frac{Puntos\ móviles\ de\ información}{Frentes\ activos} \right) x100$	Información (Puntos móviles de información **1/** Frentes activos **1**) **=** 100%

SUBPROGRAMA 2: INFORMACION Y DIVULGACION

Con respecto a este subprograma se informa que el presidente de la junta se encuentra informado acerca de los canales oficiales con los que la comunidad puede dirigir sus inquietudes, quejas o requerimientos referentes al proyecto y de esta manera socializarlos con su comunidad.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$Reuniones = \left(\frac{Reuniones\ celebradas}{Reuniones\ requeridas} \right) x100$	Para el periodo del presente informe no se realizaron reuniones.
$Estrategia\ de\ divulgación\ pública = \left(\frac{Número\ de\ elementos\ de\ divulgación\ implementados}{Número\ de\ elementos\ de\ divulgación\ proyectados} \right) x100$	Estrategia de divulgación pública: número de elementos de divulgación implementados **1**/ número de elementos de divulgación proyectados **1**) x100) **=100%**

SUBPROGRAMA 3: CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

No se han realizado actas de cierre del proyecto debido a que aún se encuentra en ejecución

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$Estrategias = \left(\frac{Estrategias\ implementadas}{Estrategias\ proyectadas} \right) x100$	En este mes no se realizaron encuentros con la comunidad.
$Acercamientos = \left(\frac{Reuniones\ realizadas}{Reuniones\ convocadas} \right) x100$	N/A
$ActaCompr = \left(\frac{Compromisos\ cerrados}{Compromisos\ establecidos} \right) x100$	En este mes no se realizaron actas de cierre.

SUBPROGRAMA 4: LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

No se reportan actividades en este subprograma ya que las actas de vecindad ya fueron entregadas a la interventoría.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$ActaVecindad = \left(\frac{Acta\ de\ vecindad\ elaborada}{Construcciones\ aledañas} \right) x100$	N/A
$Afectaciones = \left(\frac{Afectación\ subsanada}{Afectación\ realizada} \right) x100$	N/A

SUBPROGRAMA 5: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO DE DERECHO Y DIFERENCIAL

Como se ha reflejado siempre, el compromiso del contratista es emplear la mano de obra de la región para fomentar el bienestar de la comunidad foco del proyecto; por tanto, en este periodo se cuenta con 9 personas de la región laborando de manera directa y se han generado 7 empleos indirectos correspondientes a transportes, alimentación y hospedaje.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$Vinculación = \left(\frac{MO\ de\ la\ región\ contratada}{Total\ MO\ proyecto} \right) x100$	Vinculación =(MO de la región contratada **9** / Total MO proyecto **9**) **x100 =100 %**
$Vinculación = \left(\frac{MO\ perteneciente\ a\ grupos\ vulnerables}{Total\ personal\ proyecto\ de\ la\ región} \right) x100$	Vinculación=(MO perteneciente a grupos vulnerables **5/**Total personal proyecto de la región **9**) **x100 =55.5%**

SUBPROGRAMA 15: INCLUSION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y TRANSVERSALIZACION

Para este periodo se cuenta con 9 personas de la región laborando de manera directa en la fase operativa del proyecto.

INDICADOR DE GESTION	PROCESO / DESCRIPCION
$Flexibilización = \left(\frac{\text{Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización}}{\text{Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto}} \right) x100$	Flexibilización=(Número de padres madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización **6/** Número total de padres-madres cabeza de hogar del Proyecto **9) x**100 =**66.6%**
$Capacitaciones = \left(\frac{\text{Número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso}}{\text{Número total de trabajadores del proyecto}} \right) x100$	N/A
$Vinculación = \left(\frac{\text{MO perteneciente a grupos vulnerables}}{\text{Total personal proyecto de la región}} \right) x100$	Vinculación=(MO perteneciente a grupos vulnerables **5/**Total personal proyecto de la región **9**) **x100 =55.5%**

Teniendo en cuenta lo reportado en el mes anterior, se evidencia que, para este periodo, continúa el desarrollo de las actividades tendientes a cumplir lo estipulado tanto el componente social, como el componente ambiental del proyecto.

Que se realizaron las actas actividades ambientales referentes al cumplimiento de lo estipulado en el PAGA y se adjuntan sus anexos.

El contratista con la presentación de este informe, evidencia la disponibilidad que tiene para dar cumplimiento con todos los componentes de sus obligaciones contractuales y la firme disposición de vincular a la comunidad con el desarrollo del proyecto.

El contratista ha empleado al 90% del personal de obra no calificado de la región foco del proyecto, creando así empleos directos e indirectos.

Con la instalación del punto de atención a la comunidad se está asegurando la correcta comunicación con la población beneficiada y se están teniendo en cuentan las sugerencias de la zona de influencia

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En contratista de obra no a presentado documentación

3.11.1.2.16 CD-FC-071-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1206-24, se solicita al contratista de obra el documento PAGA.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-24, respuesta a comunicación, remisión PAGA y observaciones.

3.7.1.2. Actividades Sociales

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad de inicio y demás documentación de inicio de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-742-24 - APROBACION PARCIAL PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL) – CACOTA

Durante el mes la interventoría revisa y aprueba el informe trimestral y balance de estado social del proyecto ya subsanado para la supervisión de Invias y proceder al cierre de la obra.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-653-24

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, para enviar las correcciones a Invias y subsanar lo que está pendiente.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-24.

La interventoría durante el mes recibe el certificado que ratifica la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.” Por tanto, se subsana la observación por parte de la interventoría.

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-736-24 - APROBACION PARCIAL PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL) – SALAZAR DE LAS PALMAS

La interventoría recibe informe trimestral y balance de estado social del proyecto para revisión y concepto.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

La interventoría recibe, revisa y realiza sugerencias de correcciones o ajustes en la documentación del informe trimestral y balance de estado social del proyecto. Por tanto el contratista acata las recomendaciones y subsana lo indicado para enviar la información documental al invias.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio la interventoría emite la APROBACIÓN PARCIAL del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

La interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-841-24 - ENTREGA INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE AMBIENTAL, ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL.

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, por tanto, se encuentra a la espera de certificado de cierre de obra.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047971 con Fecha: 2024-07-19 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-741-24 - ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, por tanto, se encuentra a la espera de certificado de cierre de obra.

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

- **EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL**

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales**.**

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En el desarrollo de las actividades de cada mes, es importante realizar un control con un informedonde se encuentra consolidada la información sobre lo realizado en el mes de agosto.

PERIODO DEL INFORME

Tabla 1 Periodo del informe

PERIODO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
AGOSTO 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	21 DE AGOSTO DE 2024

Resultado monitoreo a indicadores

Los indicadores son herramientas que permiten la medición del cumplimiento de los objetivos y estos se realizan para la planeación y gestión de las actividades realizadas, cada subprograma tieneen cuenta este ítem para evaluar el resultados y productos que permitan disminuir el impacto.

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

En este subprograma que tiene como objetivo establecer una comunicación directa con la población y los entes que intervienen en la misma, es necesario realizar reuniones para establecera cuerdos y responder las inquietudes de la comunidad.

En el mes de agosto están disponibles los medios de atención para la población, en este caso, el enel frente de obra en la vereda El Páramo en el que se encuentra disponible el personal para brindar la respectiva información sobre el proyecto; a continuación se encuentra el horario para recibir la solicitudes y con la salvedad que estos serán respondidos en 15 días hábiles, además, el correo ing.jeros@hotmail.com que se encuentra disponible por el contratista para recibir los requerimientos.

Tabla 2 *Horario de atención a la comunidad*

Horario de atención	Hora
Lunes a viernes	8:00 a.m. – 12:00 p.m. a 2:00 p.m. -6:00 p.m.
Sábados	8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Tabla 3 Indicador de Gestión atención a la comunidad

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Cierre PQRS} = \frac{\text{PQRS cerradas}}{\text{PQRS presentadas}} * 100$	No se presentaron PQRS en el mes de agosto.
$\text{Información} = \frac{\overline{\text{Puntos móviles de información}}}{\text{Frentes activos}} * 100$	$\text{Información} = \frac{1}{1} * 100 = 100$

SUBPROGRAMA 2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

En el proyecto vial es importante tener una comunicación directa, con el presidente de la junta deacción comunal de la vereda El Páramo y Pica Pica, debido a que son la representación de su comunidad; además, al presidente se le recuerda los diferentes canales de comunicación con los que cuenta el contratista para la recepción de las peticiones, en el frente de obra, el correo electrónico y el componente social quien estará al tanto de las inquietudes.

En el desarrollo de este mes se realizó una reunión al terminar la construcción de la obra paraentregar la vía a la comunidad.

Tabla 4 Indicador de Gestión Información y divulgación

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Reuniones} = \frac{\text{Reuniones celebradas}}{\text{Reuniones requeridas}} * 100$	$\text{Reuniones} = \frac{1}{1} * 100 = 100$

SUBPROGRAMA 3: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

No se realizaron reuniones en el mes de agosto.

Tabla 5 Indicador de Gestión participación ciudadana

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Reuniones} = \frac{\text{Reuniones celebradas}}{\text{Reuniones requeridas}} * 100$	No se realizaron reuniones en el mes deagosto.

SUBPROGRAMA 4: LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

En este subprograma no se realizaron actividades debido a que no aplica las actas de vecindad,ya que no hay predios aledaños a la vía.

Tabla 6 Indicador de Gestión Infraestructura de predios

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Actavecindad} = \frac{\text{Acta de vecindad elaborada}}{\text{construcciones aledañas}} * 100$	N/A
$\text{Afectaciones} = \frac{\text{Afectación subsanada}}{\text{Afectación realizada}} * 100$	N/A

SUBPROGRAMA 6: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHO YDIFERENCIA

Se empleó mano de obra no calificada de la región con el fin de generar empleo en la zona deinfluencia del proyecto.

Tabla 7 Indicador de Gestión mano de obra de la región

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Vinculación} = \frac{MO\ de\ la\ región}{contratada\ \text{Total MO proyecto}} * 100$	$\text{Vinculación} = \frac{6}{6} * 100 = 100$

3.7.1.2.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).

Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

Durante el mes la interventoría recibe el documento PAGA para revisión y concepto por parte de la interventoría

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

Durante el mes la interventoría recibe el documento PAGA para revisión y concepto por parte de la interventoría.

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista sigue gestionando documentación del componente SST.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista de obra NO a enviado información mensual, se solicita él envió de la documentación pertinente.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Relación del personal que trabajo durante el mes de julio.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ING	RETIR	SEGURIDAD SOCIAL
1.	LAURA RIOS DUATE	110528446	DIRECTORA	18/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
2.	JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS	1090405439	RESIDENTE DE OBRA	18/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
3.	LUIS FRANCISCO ORTIZ LEAL	88306154	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
4.	NESTOR YOHANY MOGOLLON CHONA	1148457223	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
6.	ALVARO ENRIQUE JAIMES TORRES	88033628	OPERADOR DE MAQUINARIA	27/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
8.	PEDRO YESID MEAURY BLANCO	1092361134	OPERADOR DE MAQUINARIA	19/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
9.	GLORIA MARQUEZ SALAZAR	60390105	PROFESIONAL SST	18/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
10	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	88251179	MAESTRO DE OBRA	27/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
11	SERGIO CHONA ROZO	1148456738	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
12	DANIEL ALFONSO SARMIENTO	5455822	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
13	SILFREDO CHONA ROZO	1148456736	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
14	YONAN FABIAN GONZALES CHONA	1148959152	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
15	WILSON ESPINOSA CONTRERAS	1094508582	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
16	JAVIER ANDRES CAMPEROS CHONA	1094506920	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

17	IVAN DARIO CAMPEROS DELGADO	5455537	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	28/08/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
18	JESUS ALBERTO GONZALEZ	1148456964	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
19	OMAR ALBERTO ROZO OCHOA	5455728	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Anexo Afiliaciones seguridad social, de obras activas

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

El contratista de obra, cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo, y se realiza la divulgación en las diferentes inducciones.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

El contratista de obra, cuenta con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

El contratista de obra, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo

El contratista de obra, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

Exámenes de ingreso.

El contratista de obra, a la fecha no se registra examen de ingreso de personal.

AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	DIAS
RENZO ADRIANO	HERRAN	0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS SEGUROS

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

El contratista de obra, se continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

DOTACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista de obra, en la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio, se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

El contratista de obra, para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico

ESTADISTICAS SST

Todos los contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	AGOSTO	0	0	0

INDUCCION Y CAPACITACION

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	AGOSTO	11	11

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	AGOSTO	0

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	JULIO	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Relación del personal que trabajo durante el mes de agosto.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MAYO	RETIROS MAYO	SEGURIDAD SOCIAL
1.	LAURA RIOS DUARTE	1110528446	DIRECTOR DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
2.	CARLOS ALBERTO DELGADO OTALORA	88259424	INGENIERO RESIDENTE	13/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
3.	LEOPOLDO MENDOZA GARCIA	13353119	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
4.	PABLO BAUTISTA RODRIGUEZ	5463398	CELADOR	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
5.	WILSON ORDUZ VILLAMIZAR	1094280194	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024	02/08/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
6.	DIOMEDES FLOREZ RINCON	1094247850	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024	03/08/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
7.	OSCAR ROZO GRANADOS	1005061144	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
8.	ROBINSON AMAYA FIGUEROA	1005043614	OFICIAL DE OBRA	29/06/2024	01/08/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
9.	JOSE ARIEL SUAEZ GAMBOA	5605393	AYUDANTE DE OBRA	11/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
10.	EDWIN ALBERTO CONTRERAS VILLAMIZAR	5463042	AYUDANTE DE OBRA	12/07/2024	21/08/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
11	GERMAN ESTIVEN SANCHEZ SOLANO	1094808162	AYUDANTE DE OBRA	12/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
12	ELKIN ARMANDO MANTILLA PINILLOS	1005060963	AYUDANTE DE OBRA	16/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
13	BREYNER DUVAN MANTILLA PINILLOS	1094282706	AYUDANTE DE OBRA	16/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S

14	GLORIA MARQUEZ SALAZAR	60390105	PROFESIONAL SST	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
15	ARTURO SANCHEZ VERA	17549062	MAESTRO OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
16	EDILSON YAIR CAÑAS VERA	1005060297	AYUDANTE DE OBRA	03/08/2024	30/08/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
17	JAVIER HERNANDEZ VERA	1005012473	AYUDANTE DE OBRA	03/08/2024	30/08/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Anexo Afiliaciones seguridad social, de obras activas

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

El contratista de obra, cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo, y se realiza la divulgación en las diferentes inducciones.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

El contratista de obra, cuenta con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

El contratista de obra, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo

El contratista de obra, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

Exámenes de ingreso.

El contratista de obra, a la fecha se registra 17 exámenes de ingreso de personal.

AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	DIAS
RENZO ADRIANO	MUTISCUA	0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS SEGUROS

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

El contratista de obra, se continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

DOTACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista de obra, en la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio, se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

El contratista de obra, para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico

ESTADISTICAS SST

Todos los contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	AGOSTO	0	0	0

INDUCCION Y CAPACITACION

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de agosto 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	AGOSTO	17	3

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	AGOSTO	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente.

3.7.1.3.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACION**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACION de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RECORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 **– APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RECORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.
En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes, a excepción del componente del diseño geométrico y diseño estructural que se encuentra APROBADO, pero con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RECORD GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RECORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - SE EMITE CORREO DE APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD 20/08/2024 - ING. JAIRO
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24 GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24 Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24 Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION al componente geotécnico y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 - **REITERACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 **- OBSERVACIONES**

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES topografía y el informe hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24 El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES el componente estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía e hidrología.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023

3.7.1.1.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía y diseño geométrico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1194-24 del 26/08/2024 - Observaciones
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 Se envían observaciones a las alcantarillas mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1195-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.14. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía, geotecnia y diseño geométrico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 **- APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1136-24 DEL 13/08/2024 APROBADO CON OBSERVACIONES Contratista hace entrega por correo 14/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION solo los componentes de geotecnia y pavimento. El resto de componentes se encuentran en observación.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACION CONTRATISTA HACE ENVIO CON COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1156-24- **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACION**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACION CONTRATISTA ENVIA COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.1.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION solo los componentes de geotecnia y pavimento. El resto de componentes se encuentran en observación.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO		SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS		SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)		
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO		

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.2. Etapa de Construcción

Se continua con la actividad de construcción de placa huella en los municipios de correspondientes al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	195.00	EJECUTADO A 07-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		$ 440,027,742.14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	0		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	$ -	$ -
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		13,831,782.23
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		28,568,598.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		482,428,122.38

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de febrero de 2024:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	320.00	EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$ 26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$ 207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$ 121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$ 91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$ 44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$ 492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$ 4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$ 13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$ 1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$ 1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$ 11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$ 11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$ 44,096,105.34
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$ 30,399,750.00
						SUB TOTAL	11,450.00	30,399,750.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$ 34,656,912.54
						SUB TOTAL		34,656,913.00
ITEMS NO PREVISTOS								
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	1,177.20	$ 26,109,118.80
						SUB TOTAL		26,109,119.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		627,778,223.78

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	CANT	VALOR TOTAL
						EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00		31 DE MAYO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	539.8	$ 21,548,816.00
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	173.38	$ 178,759,634.64
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	11516.29	$ 117,638,902.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	303	$ 104,658,018.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	73.98	$ 45,019,123.38
							SUB TOTAL		$ 467,624,494.37
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600,1,1P		600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	173.31	$ 8,905,187.73
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	15.25	$ 15,723,177.00
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	3.69	$ 3,012,032.61
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	42,165.00	100.74	$ 4,247,702.10
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	15.00	$ 15,820,605.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	1,639.27	$ 16,745,143.05
							SUB TOTAL		$ 64,453,847.49
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 5,240.78	$ 17,802,929.66
							SUB TOTAL		17,802,929.66
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	7.99	222,924.00	7.54	$ 1,680,846.96
				REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m2	21.08	80,445.00	19.27	$ 1,550,175.15
				FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	65.00	209,271.00	60.00	$ 12,556,260.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		586,364,190.63

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

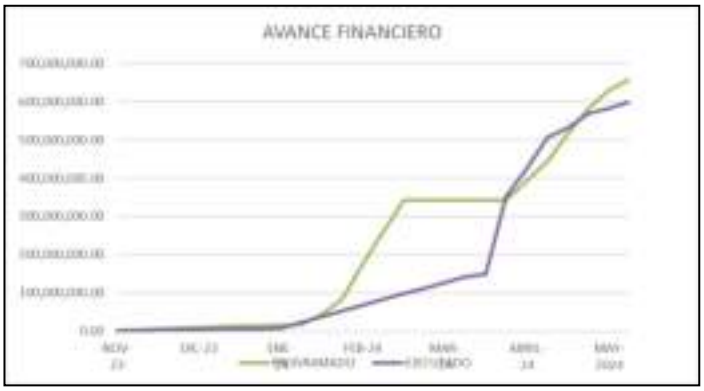


Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

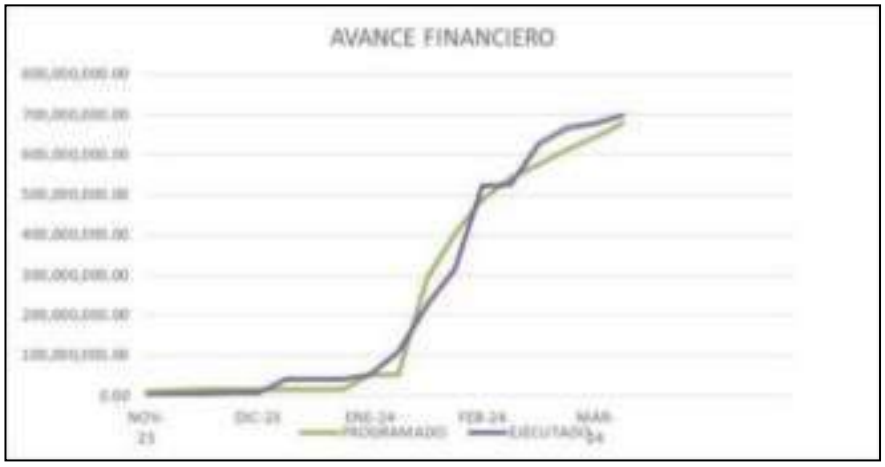


Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**ML**	**155.00**	**EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70	862.70	$ 29,919,298.70
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65	90.65	$ 77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13	4,405.13	$ 44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00	620.00	$ 110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57	40.57	$ 17,893,560.78
						SUB TOTAL	$ 6,019.05	$ 281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**UND**	**1**		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28	45.28	$ 2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78	5.78	$ 4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	1.61	$ 992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 22.15	22.15	$ 891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00	6.00	$ 5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70	782.69	$ 7,979,524.55
						SUB TOTAL	$ 863.51	$ 22,852,783.32
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81	5,650.81	$ 15,002,900.55
						SUB TOTAL	5,650.81	15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50	11,381.50	$ 22,011,821.00
						SUB TOTAL	11,382.00	22,011,821.00
		NO PREVISTO						
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50	237.50	$ 37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00	190.00	$ 31,462,670.00
								69,299,507.50
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00	410,535,693.00

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

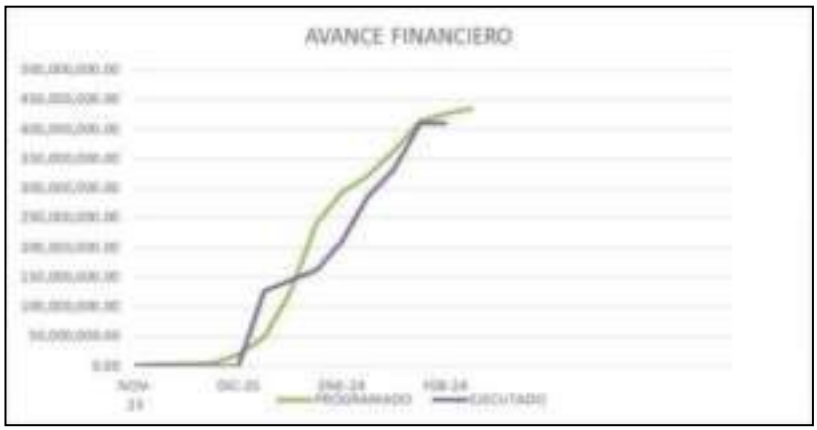


Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

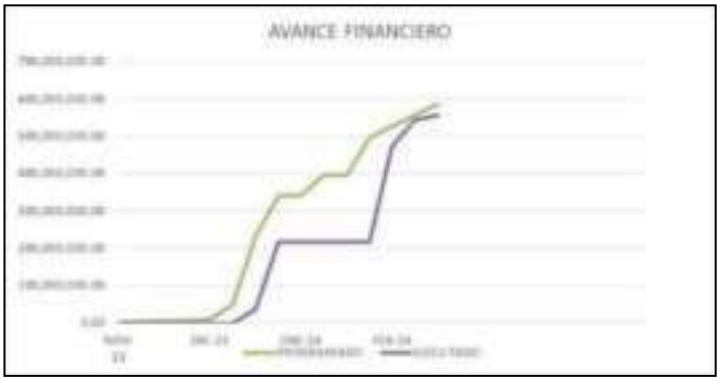


Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								30 DE JUNIO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	286.52	$ 11,437,878.40
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	235.91	$ 239,509,986.60
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	14,915.94	$ 152,291,747.40
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	229.22	$ 76,054,279.12
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	63.46	$ 37,739,154.32
							SUB TOTAL		$ 517,033,045.84
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	6.01	$ 6,101,712.60
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	21.40	$ 902,331.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	550.86	$ 5,624,280.60
							SUB TOTAL		$ 22,183,578.88
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,181.00	14,387.00	$ 31,378,047.00
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		31,378,047.00
							SUB TOTAL		570,594,671.72

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

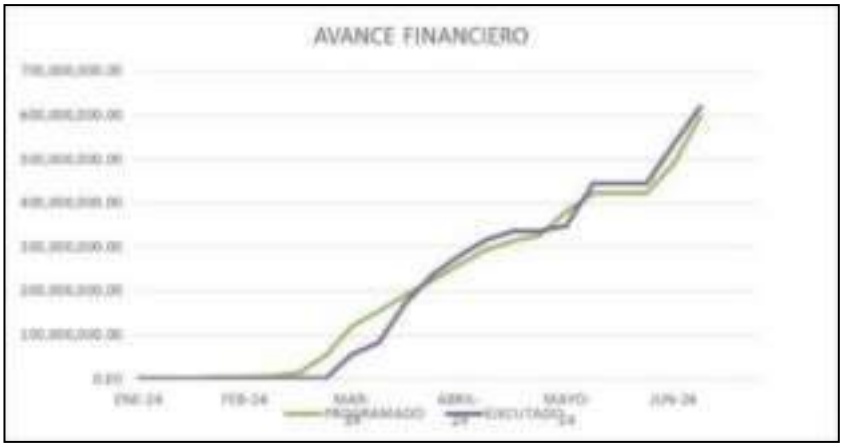


Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.					
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	316.07	$ 38,121.00	$ 11,688,661.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	234.96	$ 1,138,016.00	$ 250,727,685.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11032.81	$ 10,242.00	$ 123,211,158.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	299.39	$ 428,491.00	$ 130,316,968.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	119.10	$ 677,827.00	$ 71,117,609.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:				
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	103.54	$ 49,585.00	$ 2,567,015.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	15.70	$ 1,138,016.00	$ 8,899,285.00
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.60	$ 890,664.00	$ 712,531.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	23.76	$ 64,380.00	$ 764,834.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	12.00	$ 1,090,746.00	$ 6,544,476.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1157.36	$ 10,242.00	$ 5,590,698.00
	TRANSPORTES				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	5454.95000	$ 3,397.00	$ 18,530,465.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	7.00	$ 719,407.00	$ 5,035,849.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	17393.5200	$ 2,181.00	$ 37,936,314.00
	VALOR BÁSICO OBRA				**$ 673,643,548.00**

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

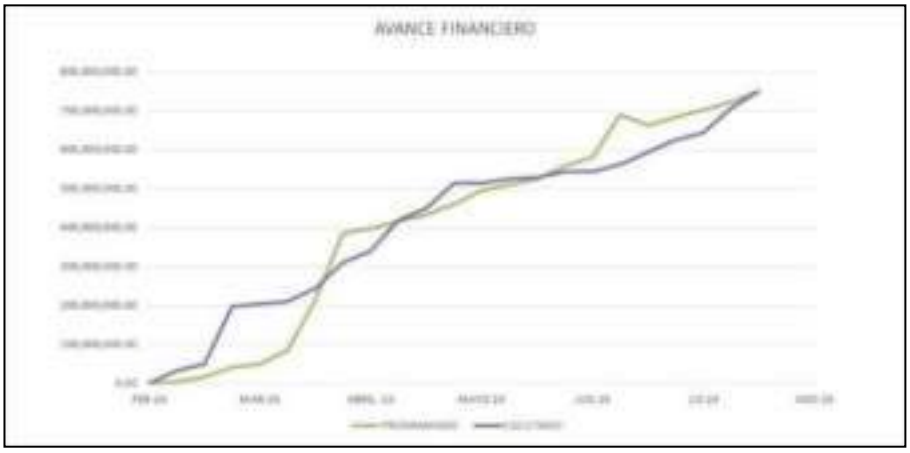


Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se ha ejecutado el 100% de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V/R PARCIAL	EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ 107,647,342.75
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	581.41	$ 34,681.00	$ 20,163,880.00	301.65	$ 10,461,523.65
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	213.63	$ 985,280.00	$ 210,482,563.00		$ -
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11068.00	$ 10,234.00	$ 113,269,912.00	1000	$ 10,234,000.00
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	343.30	$ 288,254.00	$ 98,957,598.00	301.65	$ 86,951,819.10
1.5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	30.24	$ 551,760.00	$ 16,685,222.00		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							$ -
2.1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 49,585.00	0.00		$ -
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 985,450.00	0.00		$ -
2.3	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 748,239.00	0.00		$ -
2.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 40,248.00	0.00		$ -
2.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	UND	0	$ 1,016,390.00	0.00		$ -
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0	$ 10,234.00	0.00		$ -
TRANSPORTES							$ -
3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS	M3/KM	4209.50	$ 2,655.00	$ 11,176,215.00		$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							$ -
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	UND	7.00	$ 705,224.00	$ 4,936,568.00	0	$ -
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 21,355,228.00
5.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13803.10	$ 1,934.00	$ 26,695,187.00	11042	$ 21,355,228.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	$ 502,367,145.00		$ 129,002,570.75

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	44.56	34,681.00	$ 1,545,309.00	43.2	$ 1,498,219.20
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	214.00	890,706.00	$ 190,611,084.00	158.1	$ 140,820,618.60
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,152.00	10,205.00	$ 103,601,160.00	9949.62	$ 101,535,872.10
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	244.00	206,590.00	$ 50,407,960.00	243	$ 50,201,370.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	48.90	468,731.00	$ 22,920,946.00	47.42	$ 22,227,224.02
				SUB TOTAL	$ 369,086,459.00		$ 316,283,303.92
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	15.60	890,706.00	$ 13,895,014.00		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	649,432.00	$ 1,039,091.00		$ -
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	40,248.00	$ 1,770,912.00		$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	976,347.00	$ 11,716,164.00		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,205.00	$ 11,817,390.00		$ -
				SUB TOTAL	$ 44,602,051.00		$ -
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,215.29	2,655.00	$ 3,226,605.00	341.4	$ 906,417.00
				SUB TOTAL	3,226,605.00		$ 906,417.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	12.00	705,224.00	$ 8,462,688.00		$ -
				SUB TOTAL	8,462,688.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	12,350.13800	1,934.00	$ 23,885,167.00	12350.138	$ 23,885,166.89
				SUB TOTAL	23,885,167.00		$ 23,885,166.89
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	449,262,970.00		$ 341,074,887.81

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

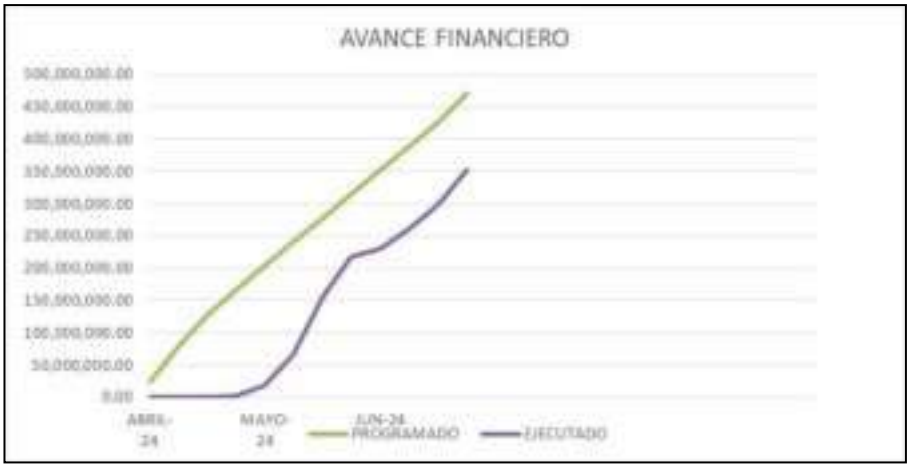


Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	VALOR TOTAL EJECUTADO A 30-JUNIO-2024
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							$ 179,602,332.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.47	$ 34,600.00	$ 13,302,524.00	219.07	$ 7,579,822.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	218.04	$ 884,000.00	$ 192,745,857.00	58.67	$ 51,864,280.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14619.64	$ 10,200.00	$ 149,120,328.00	6803.45	$ 69,395,190.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	338.26	$ 215,500.00	$ 72,894,168.00	208.58	$ 44,970,540.00
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.22	$ 463,400.00	$ 23,271,948.00	12.5	$ 5,792,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							$ 20,271,960.00
600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88	$ 51,000.00	$ 4,488,000.00	48.18	$ 2,457,180.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	16	$ 884,000.00	$ 14,144,000.00	3.32	$ 2,934,880.00
630.1.6	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.6	$ 665,000.00	$ 1,064,000.00	0.88	$ 585,200.00
610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	50	$ 40,000.00	$ 2,000,000.00	14.07	$ 562,800.00
661.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12	$ 1,134,000.00	$ 13,608,000.00	10	$ 11,340,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1160	$ 10,200.00	$ 11,832,000.00	234.5	$ 2,391,900.00
TRANPORTES							$ 1,940,216.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3307.26	$ 2,900.00	$ 9,591,060.00	669.04	$ 1,940,216.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI- 04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	8	$ 706,480.00	$ 5,651,840.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 69,133,795.00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	37572.71	$ 1,840.00	$ 69,133,795.00	37572.71	$ 69,133,795.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$ -
NP-01	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	KG	15779.64	$ 480.00	$ 7,574,227.00		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)					**$ 590,421,747.00**		$ 270,948,303.00

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

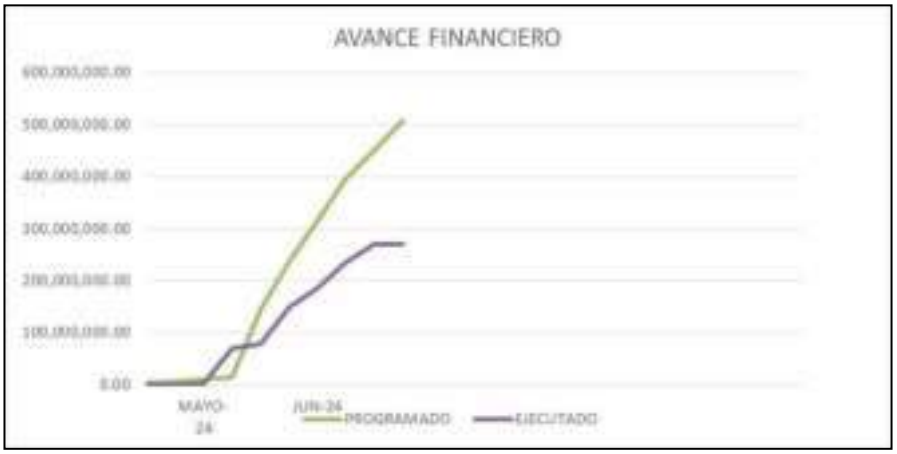


Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-AGOSTO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	58.00	34,607.00	$ 2,007,206.00	57	$ 1,972,599.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - M	m3	243.00	994,334.00	$ 241,623,162.00	166.69	$ 165,745,534.46
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11,529.00	10,189.00	$ 117,468,981.00	10962.35	$ 111,695,384.15
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	278.00	310,651.00	$ 86,360,978.00	173.45	$ 53,882,415.95
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	55.50	560,269.00	$ 31,094,929.50	50.554	$ 28,323,839.03
				SUB TOTAL	$ 478,555,256.50		$ 361,619,772.59
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	51,383.00	$ 4,521,704.00	83.49	$ 4,289,966.67
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	15.60	994,334.00	$ 15,511,610.40	14.96	$ 14,875,236.64
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	780,421.00	$ 1,248,673.60	1.58	$ 1,233,065.18
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	39,452.00	$ 1,735,888.00	41.48	$ 1,636,468.96
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	1,134,794.00	$ 13,617,528.00	11	$ 12,482,734.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,189.00	$ 11,798,862.00	1100.21	$ 11,210,039.69
				SUB TOTAL	$ 48,434,266.00		$ 45,727,511.14
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,375.20	2,959.00	$ 4,069,226.36	921.92	$ 2,727,961.28
				SUB TOTAL	4,069,226.36		$ 2,727,961.28
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	16.00	708,315.00	$ 11,333,040.00	0	$ -
				SUB TOTAL	11,333,040.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	16,201.10700	1,879.00	$ 30,441,880.05	16201.11	$ 30,441,885.69
				SUB TOTAL	30,441,880.00		$ 30,441,885.69
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	572,833,669.00		$ 440,517,130.70

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

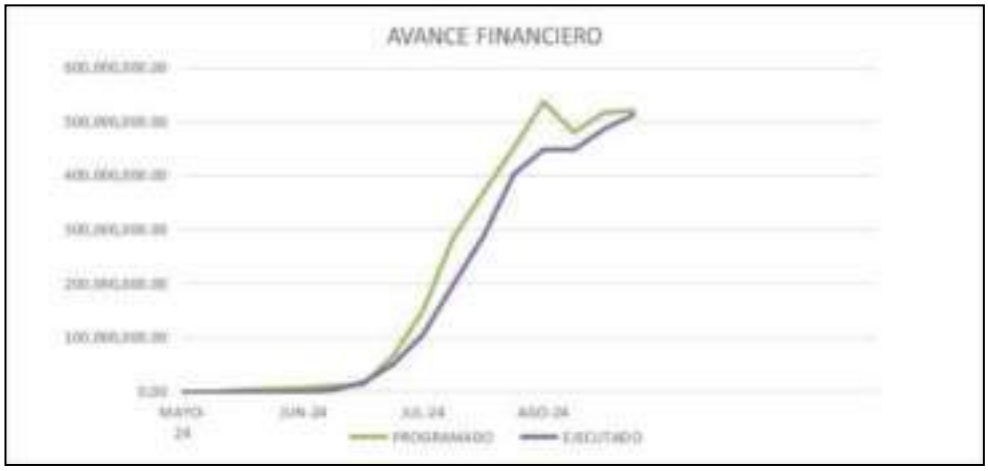


Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.14. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER. GOBERNACIÓN 2033								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO A AGOSTO-2024	
No	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN								
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	49.00	35,953.00	$	1,761,697.00	48.12	1,730,058.36
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	208.00	1,025,581.00	$	213,320,848.00	99.00	101,532,519.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,855.00	10,194.00	$	100,461,870.00	8654.38	88,222,749.72
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	237.00	327,669.00	$	77,657,553.00	321.12	105,219,430.94
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	47.50	571,437.00	$	27,143,258.00	44.45	25,400,374.65
				SUB TOTAL	**$**	**420,345,226.00**	$	322,105,132.67
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$	4,363,480.00	86.20	4,274,227.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	12.00	1,025,581.00	$	12,306,972.00	11.51	11,804,437.31
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.60	788,692.00	$	1,261,907.00	1.54	1,214,585.68
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	44.00	41,886.00	$	1,842,984.00	43.00	1,801,098.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12.00	1,023,650.00	$	12,283,800.00	12.00	12,283,800.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,194.00	$	11,804,652.00	1105.54	11,269,874.76
				SUB TOTAL	**$**	**43,863,795.00**	$	42,648,022.75
TRANSPORTES								
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,118.14	3,271.00	$	3,657,436.00	876.83	2,868,110.93
				SUB TOTAL		**3,657,436.00**	$	2,868,110.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	11.00	705,522.00	$	7,760,742.00	0.00	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$	-
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13,441.68	1,986.00	$	26,695,176.48	13441.69	26,695,196.34
				SUB TOTAL		**502,322,375.48**	$	26,695,196.34
TOTAL EJECUTADO							**$**	**394,316,462.69**

Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

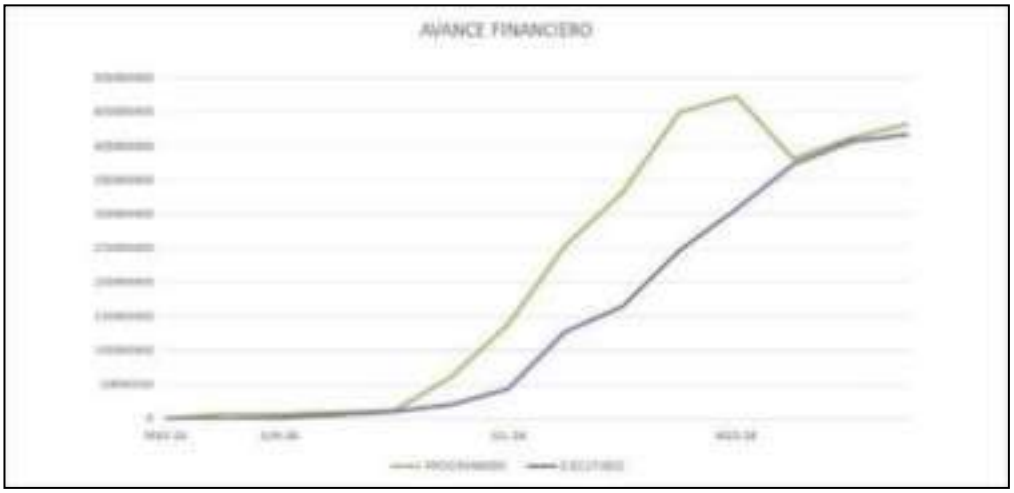


Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán

3.7.1.2.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.							
	ITEMS DE PAGO	INFORMACIÓN INICIAL				AVANCE 31/08/2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	ACUMULADO	Valor total
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	73.00	$ 39,920.00	$ 2,914,160.00	296.17	$ 11,823,106.40
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	306.00	$ 920,653.00	$ 281,719,818.00	70.94	$ 65,311,123.82
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14499.00	$ 10,181.00	$ 147,614,319.00	3330.54	$ 33,908,227.74
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	349.00	$ 250,131.00	$ 87,295,719.00	273.60	$ 68,435,841.60
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	69.80	$ 511,663.00	$ 35,714,077.00	10.94	$ 5,597,593.22
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	165.87	$ 8,522,898.21
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 920,653.00	$ 28,724,374.00	15.68	$ 14,435,839.04
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3.20	$ 700,995.00	$ 2,243,184.00	3.09	$ 2,166,074.55
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	33.30	$ 1,404,094.50
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,007,990.00	$ 24,191,760.00	18.00	$ 18,143,820.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,181.00	$ 23,579,196.00	1157.34	$ 11,782,878.54
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1167.07770	$ 3,397.00	$ 3,964,562.95	0.00000	$ -
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	12.00	$ 712,462.00	$ 8,549,544.00	0.00	$ -
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	16964.0500	$ 2,173.00	$ 36,862,880.65	16964.0500	$ 36,862,880.65
	TOTAL OBRA				$ 696,127,523.00	$	278,394,378

Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

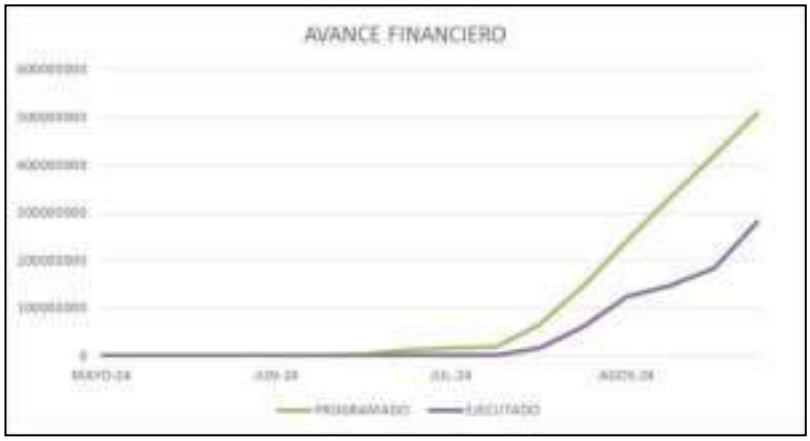


Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.7.1.2.16. CD-FC-71-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.								
No	ITEM DE PAGO	VALORES INICIALES				VALOR TOTAL EJECUTADO AL 30-AGOSTO- 2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO	TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	60.00	$ 39,920.00	$ 2,395,200.00	0.00	$ -
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	254.00	$ 983,725.00	$ 249,866,150.00	0.00	$ -
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	12015.00	$ 10,197.00	$ 122,516,955.00	0.00	$ -
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	289.00	$ 304,574.00	$ 88,021,886.00	0.00	$ -
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	57.90	$ 567,016.00	$ 32,830,226.00	0.00	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD				
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	132.00	$ 6,782,556.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 983,725.00	$ 30,692,220.00	0.00	$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	3.20	$ 766,866.00	$ 2,453,971.00	2.40	$ 1,840,478.40
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	66.00	$ 2,782,890.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,034,686.00	$ 24,832,464.00	18.00	$ 18,624,348.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,197.00	$ 23,616,252.00	1158.00	$ 11,808,126.00
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1500.05	$ 3,397.00	$ 5,095,668.00	0.00	$ -
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	8.00	$ 714,568.00	$ 5,716,544.00	0.00	$ -
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	15460.91	$ 2,181.00	$ 33,720,236.00	0.00	$ -
	VALOR TOTAL BÁSICO OBRA				$ 634,511,700.00		$ 41,838,398.40

Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

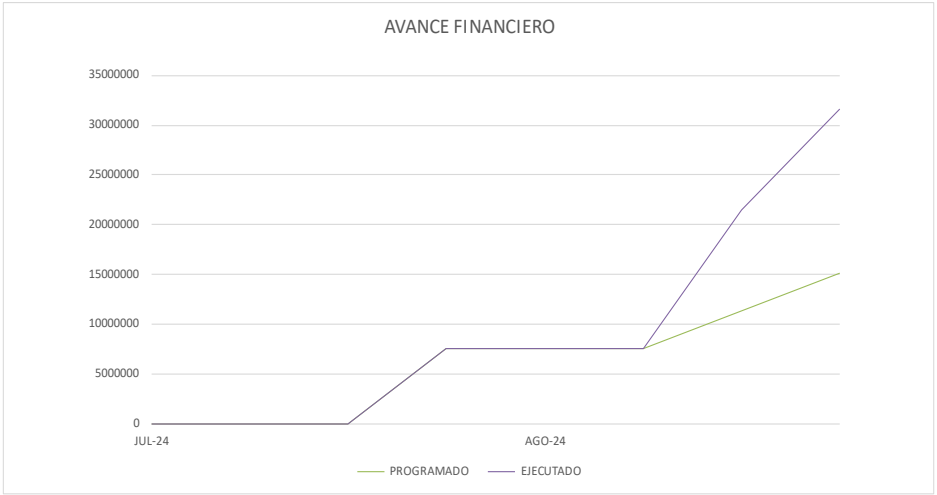


Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

4. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

5. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

6. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

7. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

8. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

9. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

10. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

11. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 11 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, los convenios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052 se encuentran en etapa de ejecución de actividades de obra y los municipios de Santiago, Abrego, Pamplonita, la Playa de Belén, Cáchira y Ocaña 1814 se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de Construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Ocaña 1814, su ejecución termino satisfactoriamente el 24 de agosto de 2024.

El convenio de La Playa de Belén 1863, su ejecución termino satisfactoriamente el 26 de agosto de 2024.

El convenio de Cáchira 1859, entra en SUSPENSIÓN indefinida, hasta esclarecer la denuncia del presunto hurto cibernético a las cuentas bancarias.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Gramalote, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Abrego, Gobernació-1943, Gobernació-2052, Gobernación 2033 (Herrán, Mutiscua, Santiago y Gramalote).

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 97 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El contrato entra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 98 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 99 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato esta suspendido desde el 30 de julio de 2024 hasta el 29 de enero de 2024.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
70	28/06/2024 al 04/07/2024
71	05/07/2024 al 11/07/2024
72	12/07/2024 al 18/07/2024
73	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 100 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	CATERPILLAR 2022	-
VOBROCOMPACTADOR	SD 100 No2 AÑO 2011	8 TON
MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND 2011	-

Tabla 101 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	RENNY LEONARDO	ING DE OBRA	1.092.359.216	27/10/2023	02/11/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
2	OSCAR CAÑIZARES VARGAS	AUX	88.171.718	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
3	LUIS ANTONIO DURAN VILLAMIZAR	AUX	88.257.606	27/10/2023	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
4	JAIRO TARAZONA MORENO	AUX	91.490.633	27/10/2023	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
5	NELSON ESTEBAN DIAZ MORA	AUX	1.004.991.818	27/10/2023	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
6	CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX	1.004.991.932	27/10/2023	25/11/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
7	JAIRO ANDRES ROZO GELVEZ	AUX	1.007.080.128	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
8	EDWIN ANTONIO GALVIS CASTELLANOS	AUX	1.094.780.151	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
9	UBERTH DURAN GELVEZ	AUX	1.102.348.142	27/10/203	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
10	VICTOR MANUEL FLOREZ FLOREZ	AUX	1.193.224.618	27/10/203	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
11	SIFREDO DIAZ SALCEDO	AUX	88.171.331	30/11/203	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
12	LUIS DAVID ROZO GELVEZ	AUX	88.171.562	30/11/203	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
13	MILLER RENE RORRADO SEPULVEDA	AUX	88.171.136	04/11/2023	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
14	OSCAR IVAN ARIAS OYOLA	AUX	1.090.367.242	12/11/2023	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
15	MIGUEL ANGEL HERRERA TARAZONA	AUX	1.098.732.667	27/12/2023	01/02/2014	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
16	FREDY ANTONIO RODRIGUEZ CELIS	AUX	1.094.778.561	12/01/2024	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
17	JOSE ALONSO RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX	1.004.991.887	12/01/2024	16/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
18	TITO HENRIQUE RINCON GALVIS	AUX	1.094.778.045	16/01/2024	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
19	JORGE ELIECER VILLAMIZAR BLANCO	AUX	91.497.367	18/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
20	JHOAN ORTEGA RANGEL	AUX	1.094.780.602	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
21	JHON JAIRO DURAN RAMIREZ	AUX	1.004.991.841	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
22	ELADIO DURAN DURAN	AUX	88.171.338	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
23	JAIRO BALAGUERA FOREZ	AUX	88.171.234	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
24	JHON EIDER MORA MORA	AUX	1.007.189.638	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
25	ELVER ALFONSO ROPERO ROPERO	AUX	1.094.574.245	30/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
26	RAFAEL ORTEGA ACEVEO	AUX	88.170.481	31/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
27	LUIS FERNANDO DURAN RAMIREZ	AUX	1.004.491.950	19/02/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
28	NEFTALY DURAN VILLAMIZAR	AUX	13.508.598	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
29	YENYNNER SANCHEZ FLOREZ	AUX	1.005.083.673	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
30	ELKIN TORRES JAIME	AUX	1.007.189.229	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
31	FREDY DURAN DURAN	AUX	1.007.189.830	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
32	JESUS AGUSTIN CORONADO VILLAMIZAR	AUX	1.007.189.839	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
33	JEINER OSWALDO CLARO VEGA	AUX	1.094.778.757	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
34	VICTOR PEREZ VARGAS	AUX	1.094.780.736	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
35	SAUL PEREZ SANABRIA	AUX	1.094.781.031	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

Tabla 102 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Para el mes de julio de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo se han presentado días soleados y algunos días con precipitaciones leves.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha el contratista no ha realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 103 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación observada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra	Fecha
29	05/06/2024
30	13/06/2024
31	18/06/2024
32	27/06/2024

Tabla 104 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

4.4.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
69	26/07/2024 al 01/08/2024
70	02/08/2024 al 08/08/2024
71	09/08/2024 al 15/08/2024
72	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 105 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 106 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de agosto de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347		$ 865,403,347	$ 690,291,848.64		$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262,829,510		$ 262,829,510	$ 172,572,962	$ 90,256,548	$ 517,718,886.64		$ 2,396,467,941	$ 2,396,467,941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530,799,834		$ 530,799,834	$ 172,572,962	$ 358,226,872	$ 345,145,924.32		$ 1,865,668,107	$ 1,865,668,107				
TOTALES			$2,628,344,516.41	$0.00	$ 6,596,491,237					$ 2,659,297,450.6	$ 2,659,297,450.6				

Tabla 107 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de julio de 2024, se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 108 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
04	17/04/2024

Tabla 109 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. en este periodo se han realizado actividades de construcción de Placa huellas y Alcantarillas. El presente contrato de obra se encuentra suspendido desde el 31 de julio de 2024 hasta el 19 de agosto del 2024.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
74	26/07/2024 al 01/08/2024
75	19/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 110 Reporte informes semanales Municipio de Playa

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA		-
VIBROCOMPACTADOR		10 TON
MOTONIVELADORA		-
VOLQUETAS SENCILLAS	-	-

Tabla 111 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	OBRERO	1.091.671.635	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
3	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	OBRERO	1.091.594.046	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
4	CARRASCAL TRIGOS DEIBIS	OBRERO	5.469.436	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
5	CARRASCAL TRIGOS LEONEY	MAESTRO	5.469.435	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
6	CARRASCAL TRIGOS YENY ENRIQUE	OBRERO	88.284.585	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
7	CARRASCAL TRIGOS DARINEL	OBRERO	1.091.593.035	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 3 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de abril de 2024.

En la tabla No. 92, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente Informe.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1,483,468,803	$ 1,483,468,803				
2	OBRA	dic-23	$ 535,844,105		$ 535,844,105		$ 535,844,105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 947,624,698	$ 947,624,698				
3	OBRA	abr-24	$ 305,354,545		$ 305,354,545		$ 305,354,545		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 642,270,153	$ 642,270,153				
4	OBRA	jun-24	$ 420,175,840		$ 420,175,840		$ 420,175,840		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 222,094,313	$ 222,094,313				
TOTALES			$2,046,526,111.00	$0.00	$ 2,046,526,111					$ 222,094,313.00	$ 222,094,313.00				

Tabla 112 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Durante este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huella y se está a la espera de la entrega de los resultados de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 113 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1055-22 del 14 de septiembre de 2023. Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Acta de reunión	Fecha
24	12/08/2024

Tabla 114 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huellas.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 115 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
61	26/07/2024 al 01/08/2024
62	02/08/2024 al 08/08/2024
63	09/08/2024 al 15/08/2024
64	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 116 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 117 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LUIS ALBERTO MERCHAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426529	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
9	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
10	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	SERGIO ALONSO VALERO	CONDUCTOR	1094426974	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
13	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
14	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
17	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS, GRAMALOTE
18	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	25/06/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
26	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
27	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
28	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
29	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
30	JESUS SIERRA CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
31	PABO VALDERRAMA BARERA	AYUDANTE DE OBRA	PT 5887690	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
32	RONALDO GELVES SALCEDO	AYDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
33	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
34	ALVARO CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	13413038	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
35	JHON CARLOS BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	10926444525	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
36	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANDE DE OBRA	13412587	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
37	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
38	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
39	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
40	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
41	ALCIDES MOGOLLON CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	6663632	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
42	REYNEL BAUTISTA ACEVEDO	AYUDANDE DE OBRA	1007929750	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
43	URIEL LASSO GALVAN	AYUDANDE DE OBRA	1092647060	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
44	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
45	JOSE ANDELFO GARCEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644904	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
46	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
47	EDGAR ELIECER CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	1004941363	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
48	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
49	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
50	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
51	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
52	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
53	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
54	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
55	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
56	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
57	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
58	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
59	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
60	JHON DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
61	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
62	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
63	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
64	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
65	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
66	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
67	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
68	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
69	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
70	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
71	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
72	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
73	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
74	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
75	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
76	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
77	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
78	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
79	BRAYAN OROZTEGUI	OPERADOR	1116810907		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
80	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
81	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
82	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
83	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
84	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
85	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
86	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
87	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
88	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
89	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
90	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
91	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
92	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
93	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
94	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
95	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
96	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
97	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
98	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACRES	GRAMALOTE
99	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
100	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
101	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
102	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
103	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
104	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE

Tabla 118 Reporte afiliaciones a seguridad social
Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2,057,114,694.00	$ 30,400,000.00	$ 2,087,514,694.00						$ 14,810,512,632.00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1,410,068,530	$ -	$ 1,410,068,530						$ 13,400,444,102.00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2,160,465,319	$ -	$ 2,160,465,319						$ 11,239,978,783.00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1,565,952,191	$ -	$ 1,565,952,191						$ 9,674,026,592.00				
TOTALES			$7,193,600,734.00	$30,400,000.00	$ 7,224,000,734					$ -	$ 9,674,026,592.00				

Tabla 119 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024

Tabla 120 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
55	27/08/2024
56	16/08/2024
57	20/08/2024
58	26/08/2024

Tabla 121 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se han adelantado actividades de construcción de placa huella.

4.8.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
64	26/07/2024 al 01/08/2024
65	02/08/2024 al 08/08/2024
66	09/08/2024 al 15/08/2024
67	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 122 Reporte informes semanales Gobernación 2052

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-728-22 del 27 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg
Motoniveladoras		
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg

Tabla 123 Equipo Mínimo Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/10 /2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
2	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	SST	1.090.448.010	7/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
4	JOSE ANDRES OSORIO CACERES	VIGILANTE	1.090.461.533	16/04/2024	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
5	OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	OPERADOR PAJARITA	13.388.186	20/03/2024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
6	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1.090.472.764	14/03/2024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
7	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
8	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
9	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
10	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
16	LUIS ANTONIO TARAZONA GARCIA	AYUDANTE	88.261.764	28/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
17	DANIEL ALBERTO CAMARGO GALVIS	AYUDANTE	1.090.425.897	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
18	LUIS ALBERTO PARRA GALLO	AYUDANTE	1.090.390.418	10/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
19	RAMIRO RAVELO PINZON	AYUDANTE	5.634.789	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
20	GREGORI ALEXIS CARRILLO	AYUDANTE	1.232.402.729	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
21	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL	1.120.564.035	28/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
22	LUIS ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE	1.094.266.383	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
23	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL	11.202.858	20/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
24	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	OFICIAL	13.506.458	12/02/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
25	OSCAR PEÑARANDA RODRIGUEZ	OFICIAL	5.398.337	1/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
26	ALEXANDER ZUÑIGA SANCHEZ	OFICIAL	1.090.441.784	2/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
27	EDINSON FABIAN RODRIGUEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.269.347	9/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
28	PEDRO JOSE ORDUZ HERNANDEZ	OFICIAL	88.267.721	9/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
29	ANDRES CAMILO LOPEZ LOPEZ	OFICIAL	1.114.091.588	10/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
30	ERMIR BADILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.148.221.318	12/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
31	JEAN CARLOS FLOREZ FLOREZ	OFICIAL	1.090.378.596	15/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
32	ALEXANDER ROLON MIRANDA	AYUDANTE	88.312.383	18/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
33	WILMER ARBEY PADILLA DUARTE	OFICIAL	1.092.357.805	22/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
34	JESUS ALBEIRO AMAYA ZAMBRANO	AYUDANTE	5.519.424	21/05/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

Tabla 124 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1,020,577,853.68	$ 8,550,000.00	$ 1,029,127,853.68						$ 5,016,654,006				
2	PARCIAL	19/06/2024	$ 3,731,818,889	$ -	$ 3,731,818,889.34						$ 1,284,835,116				
3	PARCIAL	16/08/2024	$ 982,708,961	$ -	$ 982,708,960.85						$ 302,126,156				
TOTALES			$5,735,105,703.67	$8,550,000.00	$ 5,743,655,703.87					$ -	302,126,155.63				

Tabla 125 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 126 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el plan de calidad presentado por el contratista se encuentra aprobado con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09 de junio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-092-24 del 17 de enero de 2024.
Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
23	02/08/2024

Tabla 127 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER., en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se continua con la construcción de Placa Huellas.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
60	26/07/2024 al 01/08/2024
61	02/08/2024 al 08/08/2024
62	09/08/2024 al 15/08/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
63	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 128 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		

Tabla 129 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842		ACTIVO	INDEPENDIENTE
2	DIEGO ARMANDO	PROFESION AL SST	91541702		ACTIVO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE
3	HUGO ALEJANDRO GOMEZ ASCANIO	RESIDENTE DE OBRA	88283744		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
4	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1091673791		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
5	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	PROFESION AL SOCIAL	1091676848		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
6	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	INGENIERO AMBIENTAL	13176940		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
7	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1007912734		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
8	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	1091683385		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
9	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
10	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	88.276.106		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
11	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	91467070		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
12	JHONATAN PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.467		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
13	JHANCARLOS PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.466		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
14	MICHAEL ANDREY SANCHEZ VELASQUEZ	AUXILIAR DE OBRA	1.004.945.016		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
15	HUBER VEGA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	5.472.092		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

Tabla 130 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre - enero de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 1,234,699,282	$ 1,234,699,282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	RP 1834,V(2023-12-299)	$ 650,008,570	$ 650,008,570				
3	OBRA	FEBRERO 2024	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	RP 1834,V(2023-12-299)	$ 249,999,008	$ 249,999,008				
TOTALES			$2,249,990,131.00	$0.00	$ 2,249,990,131					$ 249,999,008	$ 249,999,008				

Tabla 131 Estado Financiero y Presupuestal en el municipio de Ocaña - 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 132 Garantías Municipio de Ocaña 1814

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
01-2024	17/06/2024
2	18/06/2024

Tabla 133 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024

4.10.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
13	09/02/2024 al 15/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
12	26/01/2024 al 01/02/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONA	
15	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
17	22/03/2024 al 28/03/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
21	03/05/2024 al 09/05/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
12	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
23	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
20	31/05/2024 al 06/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
15	26/07/2024 al 01/08/2024
16	02/08/2024 al 08/08/2024
17	09/08/2024 al 15/08/2024
18	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
12	26/07/2024 al 01/08/2024
13	02/08/2024 al 08/08/2024
14	09/08/2024 al 15/08/2024
15	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	
11	26/07/2024 al 01/08/2024
12	02/08/2024 al 08/08/2024
13	09/08/2024 al 15/08/2024
14	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
7	26/07/2024 al 01/08/2024
8	02/08/2024 al 08/08/2024
9	09/08/2024 al 15/08/2024
10	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-071-2023 - MUNICIPIO DE GRAMALOTE	
2	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 134 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA		
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS		

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO		
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

Tabla 135 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024

CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 136 Garantías Gobernación 2033

4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
7	11/01/2024
8	19/01/2024
9	29/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
5	06/01/2024
6	10/01/2024
7	19/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
3	05/01/2024
4	17/01/2024
5	24/01/2024
CD-FC-070-2023, MUNICIPIO DE PAMPLONA	
5	20/02/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
6	11/01/2024
7	17/01/2024
8	22/01/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
1	20/02/2024

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
8	08/08/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
9	05/03/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
1	04/05/2024
2	17/05/2024
3	20/05/2024
4	21/05/2024
5	22/05/2024
6	24/05/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
2	21/06/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
1	14/05/2024
2	17/05/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	
1	28/05/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
1	03/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
1	24/06/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
4	21/08/2027

Tabla 137 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Valor Total:	$ 5.056.701.345,20 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 138 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1114-24	1-ago-24	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PARA RECIBO DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1133-24	12-ago-24	GIC-INVIAS-NTS-1133-24- REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1114-24
GIC-INVIAS-NTS-1154-24	16-ago-24	REITERACIÓN No. 2 COMUNICACIONES GIC-INVIAS-NTS-1114-24 y GIC-INVIAS-NTS-1133-24 "SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PARA RECIBO DE OBRA".
GIC-INVIAS-NTS-1202-24	27-ago-24	REITERACIÓN 2 OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1088-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1011-24 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
GIC-INVIAS-NTS-1232-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.

Tabla 139 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1234-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE HERRAN

Tabla 140 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1152-24	16-ago-24	RESPUESTA OFICIO OK-174-2022 - APROBACIÓN PLANOS RECORD OCAÑA LÍMITES MORRISON
GIC-INVIAS-NTS-1198-24	26-ago-24	APROBACIÓN INFORME FINAL SST OCAÑA MORRISON - 1758
GIC-INVIAS-NTS-1199-24	26-ago-24	APROBACIÓN INFORME FINAL SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1225-24	29-ago-24	APROBACIÓN INFORME FINAL AMBIENTAL - OCAÑA 1758
GIC-INVIAS-NTS-1229-24	30-ago-24	REITERACION DE OFICIO GIC-INVIAS-952-24 ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 141 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1186-24	23-ago-24	RESPUESTA OFICIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CON ASUNTO: TRASLADO DE OFICIO MATTICES-CACHI-088-2024, PARA REVISIÓN Y CONCEPTO Y SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1213-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - CACHIRA
GIC-INVIAS-NTS-1221-24	28-ago-24	ALCANCE OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1100-24 SOLICITUD SUSPENSIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE OBRA No 160 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA Y CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. Y GIC-INVIAS-NTS-1186-24; RESPUESTA OFICIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CON ASUNTO: TRASLADO DE OFICIO MATTICES-CACHI-088-2024, PARA REVISIÓN Y CONCEPTO Y SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1228-24	29-ago-24	RESPUESTA AL OFICIO SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y SUBSANACIÓN DE ACTIVIDADES INCONCLUSAS EN EL MARCO DEL CONTRATO N°160 DE 2022 DE FECHA 20-08-2024
GIC-INVIAS-NTS-1233-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE CACHIRA

Tabla 142 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente de Diseño Geométrico y topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1153-24	16-ago-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-061-2024 CON ASUNTO: ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN MODIFICATORIO No 3 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1173-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-1210-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-1230-24	30-ago-24	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO

Tabla 143 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Bitácora con reportes diarios.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1116-24	5-ago-24	RESPUESTA OFICIO 300- 0405 DE FECHA 02-08-2024 CON ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. MP-LP-004-2022
GIC-INVIAS-NTS-1128-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1138-24	13-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST – JULIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1161-24	21-ago-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CLP-GIC-064- 2024 CON ASUNTO: REITERACION SOLICITUD ADICIONAL – CONTRATO
GIC-INVIAS-NTS-1175-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1216-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 -LA PLAYA
GIC-INVIAS-NTS-1235-24	30-ago-24	SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN
GIC-INVIAS-NTS-1244-24	30-ago-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CLP-GIC-065- 2024, ENTREGA INFORMES SST-AMBIENTAL – SOCIAL – OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL
GIC-INVIAS-NTS-1247-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO, COMPONENTE SOCIAL

Tabla 144 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados con observaciones el Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1136-24	13-ago-24	RESPUESTA COMUNICADO, AJUSTES A COMPONENTE GEOMÉTRICO EN ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN NO. 1
GIC-INVIAS-NTS-1236-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.

Tabla 145 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, estructural e

Hidráulico, aprobado con observaciones Diseño Geométrico, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1120-24	6-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1130-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1141-24	14-ago-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

GIC-INVIAS-NTS-1163-24	22-ago-24	OBSERVACIONES GENERALES ESTUDIOS Y DISEÑOS.
GIC-INVIAS-NTS-1177-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1178-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1188-24	23-ago-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-1030-24 – SOLICITUD INICIO OBRAS DRENAJE MUNICIPIO DE LOS PATIOS
GIC-INVIAS-NTS-1214-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - 1943
GIC-INVIAS-NTS-1220-24	28-ago-24	RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO: CAMBIO DE TRAMO A INTERVENIR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE GRAMALOTE. N.DE S.
GIC-INVIAS-NTS-1227-24	29-ago-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590- 349, CON ASUNTO: RECONOCIMIENTO PRESUPUESTO P.A.G.A PARA ACTA PARCIAL N° 05
GIC-INVIAS-NTS-1237-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
GIC-INVIAS-NTS-1246-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO- COMPONENTE SOCIAL

Tabla 146 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.

- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1131-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1146-24	15-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST – JULIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1147-24	15-ago-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 3. Cto. No. 02332 DE 2022
GIC-INVIAS-NTS-1238-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
GIC-INVIAS-NTS-1243-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME FINAL SST -

Tabla 147 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico, Estructural e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos se encuentra observado en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Geométrico y Topografía se encuentran aprobados con Observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos

necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1117-24	6-ago-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4
GIC-INVIAS-NTS-1118-24	5-ago-24	APROBACIÓN INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.
GIC-INVIAS-NTS-1119-24	5-ago-24	APROBACIÓN INFORME MES DE JULIO DE 2024, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.
GIC-INVIAS-NTS-1179-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1211-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1231-24	30-ago-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-951-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.
GIC-INVIAS-NTS-1241-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME FINAL SST

Tabla 148 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1109-24	1-ago-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - PAMPLONITA	JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1110-24	5-ago-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - PAMPLONITA	JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1111-24	1-ago-24	ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA DE LA REFERENCIA - LAS PALMAS	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1113-24	2-ago-24	SOLICITUD DE APROBACION PARA AMPLIAR EL ALCANCE EN EL TRAMO No. 1. - MUTISCUA	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS SECRRETARIA DE VIAS GOBERNACION DE NORTE DE	GOBERNACION 2033

			SANTANDER Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1115-24	5-ago-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA ACTA DE MODIFICACION. - RICAURTE	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1125-24	8-ago-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-968-24, GIC-INVIAS-NTS-1089-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - LOURDES	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1126-24	6-ago-24	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA - MUTISCUA	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1129-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024 - HERRAN	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1132-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024 - MUTISCUA	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1134-24	12-ago-24	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA - HERRAN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1142-24	14-ago-24	REVISION No.2 COMPONENTE TOPOGRAFICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1143-24	14-ago-24	REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1144-24	14-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL JULIO MUTISCUA DEL COMPONENTE SOCIAL. - MUTISCUA	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1145-24	14-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL JULIO DEL COMPONENTE SOCIAL. - HERRAN	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1148-24	15-ago-24	SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1149-24	15-ago-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN CTO. CD-FC-082-2023	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-071-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1150-24	15-ago-24	SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1155-24	20-ago-22	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-968-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1089-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1156-24	20-ago-24	REVISION No. 2 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1157-24	20-ago-24	RESPUESTA OFICIO No. 042 CON ASUNTO: PLANOS RECORD Y ANEXOS TOPOGRÁFICOS RINCON LA COPITA.	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1158-24	20-ago-24	REVISIÓN No.3 COMPONENTE TOPOGRAFÍA MUNICIPIO LOURDES FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1159-24	21-ago-24	APROBACIÓN INFORMES SST MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024 - PAMPLONA	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Pamplonita Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1160-24	21-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024. - PAMPLONA	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Pamplonita Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1164-24	22-ago-24	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA INICIO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO PLACA HUELLA DEL CORREDOR VIAL BELLAVISTA, MUNICIPIO DE VILLA CARO.	EFRAIN PACHECO Secretario de Vías Departamental Gobernación de Norte de Santander Cúcuta Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1167-24	22-ago-24	RESPUESTA CORREO “DISEÑO GEOMETRICO CONTRATO No. CD-FC-054-2023, VIA PARAMO-PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA”	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACIÓN 2033

			Contratista Cúcuta – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1168-24	22-ago-24	REVISION No.1 CONCEPTO ESTRUCTURAL PLACA HUELLA MUNICIPIO MUTISCUA FARO DEL CATATUMBO –OBSERVACIONES	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1169-24	22-ago-24	REVISION No.1 CONCEPTO ESTRUCTURAL ALCANTARILLAS MUNICIPIO HERRAN FARO DEL CATATUMBO –OBSERVACIONES	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1170-24	22-ago-24	REVISIÓN NO.1 - OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO - GRAMALOTE	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-071-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1171-24	22-ago-24	REVISION PLAN DE CALIDAD MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1172-24	22-ago-24	REVISION PLAN DE CALIDAD MUNICIPIO GRAMALOTE FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-071-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1173-24A	22-ago-24	REVISION No.2 CONCEPTO TOPOGRAFÍA MUNICIPIO MUTISCUA FARO DEL CATATUMBO –APROBACIÓN	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1174-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - MUTISCUA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1176-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - HERRAN FARO	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1180-24	22-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN GR-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INICIAL - APROBACIÓN - GRAMALOTE	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1187-24	23-ago-24	RESPUESTA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA CONTRATO No. CD-FC-081-2023. PARA APROBACION DE HOJA DE	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1189-24	26-ago-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1122-24; RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE CÁCOTA, COMPONENTE AMBIENTAL.	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1190-24	26-ago-24	REVISION No. 2 COMPONENTE DISEÑO HIDRAULICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1191-24	26-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: TOPOGRAFIA CONTRATO REFERENCIA –	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores	GOBERNACION 2033

		APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1192-24	26-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: COMPONENTE ESTRUCTURAL – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1193-24	26-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: DISEÑO GEOMETRICO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1194-24	26-ago-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-011, REVISION COMPONENTE TOPOGRAFICO	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1195-24	26-ago-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-011, APROBACION ALCANTARILLA	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1197-24	26-ago-24	ALCANCE OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-006, APROBACIÓN DE LOS DEMAS COMPONENTES CTO. CD-FC-074-2023.	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033

			SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1200-24	27-ago-24	ALCANCE OFICIO N°010- CD-FC-082-2023, N°015- CD-FC-082-2023. CD-FC-082-2023. APROBACIÓN.	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1201-24	27-ago-24	ALCANCE OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-006, APROBACIÓN COMPONENTES FALTANTES CTO. CD-FC-074-2023.	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1203-24	27-ago-24	REITERACIÓN 3 GIC-INVIAS-NTS-968-24, GIC-INVIAS-NTS-1089-24, GIC-INVIAS-NTS-1155-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - LOURDES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1204-24	27-ago-24	ENTREGA DE DOCUMENTO PAGA. - MUTISCUA	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1205-24	27-ago-24	ENTREGA DE DOCUMENTO PAGA. - HERRAN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1206-24	27-ago-24	ENTREGA DE DOCUMENTO PAGA. - GRAMALOTE	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista	GOBERNACIÓN 2033

			DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1208-24	28-ago-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2. - SILOS	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1209-24	28-ago-24	CERTIFICACIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - SILOS	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1212-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - CACHIRA FARO	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1215-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - HERRAN FARO	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1217-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - MUTISCUA FARO	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1218-24	28-ago-24	ENTREGA DE INFORME MES DE AGOSTO SOCIAL - PAMPLONITA FAR0	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Pamplonita– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1219-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - GRAMALOTE FARO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1222-24	28-ago-24	RESPUESTA COMUNICADO No. WRGR-CD-FC-058-2023-010 - REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1223-24	28-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN CON ASUNTO: REMISION DOCUMENTO PAGA GRAMALOTE - OBSERVACIONES	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1224-24	29-ago-24	RESPUESTA CORREO “SUBSANACION OBSERVACIONES V.0 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO CD-FC-082-2023” – COMPONENTE TOPOGRAFÍA APROBACIÓN - HERRÁN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1226-24	29-ago-24	SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRAMITE DE DESEMBOLSOS PAGOS ACTAS PARCIALES Y ACTAS FINALES DE OBRA PARA LIQUIDACIÓN CONTRATOS DE OBRA.	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías Gobernación Norte de Santander Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1239-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2033 de 2021.	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION - 2033

GIC-INVIAS-NTS-1240-24	30-ago-24	GIC-INVIAS-NTS-1240-24 APROBACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES-MUNICIPIO DE EL ZULIA.	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero YENNI MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS Contratista Zulia – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1242-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME FINAL SST - CACHIRA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1245-24	30-ago-24	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO, CON ASUNTO: ENTREGA INFORMES SST-AMBIENTAL – SOCIAL – OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL - PAMPLONITA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1248-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL, AGOSTO DEL COMPONENTE SOCIAL. - HERRAN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1249-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL, AGOSTO DEL COMPONENTE SOCIAL. - MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033

Tabla 149 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1112-24	1-ago-24	RESPUESTA SOLICITUD DE AVAL MAYOR ANCHO DE VIA SEGÚN INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONAL DE RECURSOS AL CONTRATO No. 2590 - 2022 DERIVADO DEL CONVENIO 1943-2021	JUAN JOSE OYUELA SOLER Subdirector Vías Regionales joyuela@invias.gov.co Instituto Nacional de Vías - Invias Calle 25G No. 738-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C.	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1121-24	6-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047971 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, COMPONENTE SOCIAL.	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1122-24	29-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE CÁCOTA, COMPONENTE SOCIAL.	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1123-24	6-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1127-24	9-ago-24	INFORMES SEMANALES CONTRATO DE INT	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1135-24	12-ago-24	ACTA DE COSTOS NO. 23 E INFORME MENSUAL NO. 22 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2024.	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1151-24	16-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1162-24	21-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-055119 RECIBIDO EL 21 DE AGOSTO DE 2024 – CERTIFICACIONES HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO Subdirectora de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-	22-ago-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DE MARZO 2024	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO	INVIAS

NTS-1165-24		A MAYO 2024 – MUNICIPIO DE CACHIRA – CONVENIO 1859 DE 2021	Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	
GIC-INVIAS-NTS-1166-24	22-ago-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DE MAYO 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1814 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1181-24	22-ago-24	RESPUESTA OFICIOS INVIAS 2024S-VBOG-044554 y 2024S-VBOG-044563	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1182-24	23-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1183-24	23-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-039300 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE EL ZULIA, COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL.	Angie Juliet Mila Diaz Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1184-24	23-ago-24	RESPUESTA OFICIOS INVIAS 2024S-VBOG-044554 y 2024S-VBOG-044563	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1185-24	23-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE CÁCOTA, COMPONENTE AMBIENTAL.	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1196-24	26-ago-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-737-24; RESPUESTA OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-047971	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1207-24	28-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1112-24	1-ago-24	RESPUESTA SOLICITUD DE AVAL MAYOR ANCHO DE VIA SEGÚN INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONAL DE RECURSOS AL CONTRATO No. 2590 - 2022 DERIVADO DEL CONVENIO 1943-2021	JUAN JOSE OYUELA SOLER Subdirector Vías Regionales joyuela@invias.gov.co Instituto Nacional de Vías - Invias Calle 25G No. 738-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C.	INVIAS

Tabla 150 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.

- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.

- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cáchira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cáchira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.

- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.

- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023	24/04/2023

6	feb-23	$	143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (notacredito)-24/05/2023 FE516 (RADICADA)-26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$	188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$	143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$	127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$	152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$	163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$	165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	sep-23	$	179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$	198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$	173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$	268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$	271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM712 24/04/2024	
18	feb-24	$	261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM713 24/04/2024	
19	mar-24	$	230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM719 24/05/2024	
20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM738 26/06/2025	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024	7888 el 25/07/2024	PAGA	FEM749 24/07/2026	
23	jul-24	$	246,312,626.00	2024E-VUVRAZ-075481 12-08-2024	10236 el 04/09/2024	En cuentas por pagar		
	TOTAL	$	3.623.038.292,49					

Tabla 151 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 152 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%
Jhon Jairo Galvis	Residente Interventoría	100%
Oscar Mauricio García	Residente Interventoría	100%
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Juan Alex Díaz	Profesional Ambiental	13%
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	95%
Felipe Stand Villarreal	Especialista en Estructuras	25%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	25%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	10%
Jairo Alonso Zorro Roa	Especialista Hidráulico	27%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	30%
Diana Patricia Aponte	Especialista de Pavimentos	20%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
William Luna Melo	Conductor	100%
Jesús Manuel Silva Martínez	Conductor	100%
Jhon Wilmer Rodríguez	Conductor	100%
Cristian Aleizer Rivera Cáceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Eiler Andrés Parra Chacón	Inspector de Intv. La Playa	100%
Cristian Quintero Vega	Inspector de Intv. Cachira	23%
Michael Smith Rodríguez	Inspector de Intv. Arboledas	100%
Nicolas Mazo Rodríguez	Inspector de Intv. Abrego	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	100%
Santos Eduardo Maldonado Murillo	Inspector Gramalote	100%
David Alexander Álvarez Ortiz	Inspector Los Patios	100%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector Arboledas	100%
Luis Eduardo Estupiñán González	Inspector Ocaña	83%

Tabla 153 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20
5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40
6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00

15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20
16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
TOTALES		**$3.253.537.793,02**	**$618.172.180,67**	**$3.871.709.973,68**		$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52

Tabla 154 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
ADICION No.1			
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 911,340,270.00	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1,367,010,404.00	24/06/2022	31/12/2029

Tabla 155 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Ocaña 1814, Abrego, La Playa, Cáchira, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 23 de ejecución, me complace informar que dentro del marco contractual se ha dado inicio a 11 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla y 520 metros lineales de Placa Huella. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril y a la fecha del presente informe, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. En el presente periodo, el contrato presenta un retraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, a la fecha del presente Informe se tienen ejecutados 542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato se SUSPENDE desde el 30 de julio del 2024 (INDEFINIDAMENTE).

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023. Aunque el contratista ha recibido observaciones únicamente en los componentes de diseño de pavimentos, lamentablemente el contrato presenta un retraso del 28.15%. Es importante destacar que el contratista ha completado con éxito la ejecución del corredor 1, donde se realizaron 1150 metros lineales de placa huella y se instalaron 6 alcantarillas, actividades que se han llevado a cabo al 100%. Para el corredor 2, se han realizado 412 metros lineales y 4 alcantarillas. En este corredor 2, existen dificultades principalmente a la complicada accesibilidad de las

volquetas al lugar de acopio del material de la obra. El contrato se prorrogo hasta el 11 de noviembre del 2024.

En La Playa de Belén, se firmó el acta de inicio el 06 de marzo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1175 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. El contratista continúa ejecutando actividades de obra de placa huella en los frentes de obra, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 2659.05 metros lineales y 60451.44 m2 de mejoramiento periódico.

Municipio de Gramalote: 1829.50 metros lineales y 31560.65 m2 de mejoramiento periódico.

Municipio de Los Patios: 1671.30 metros lineales y 15236.68 m2 de mejoramiento periódico.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato termina su ejecución al 100% de su programación. Ejecutando 4004 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico.

En Ocaña 1814, se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1692 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con acta de inicio de 16 de los 17 contratos a ejecutar los cuales se cuenta con acta de inicio.

En proceso de liquidación se encuentran los siguientes contratos de obra: Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Cúcuta, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia.

En proceso de ejecución se encuentran los siguientes contratos de obra:, Herrán, Mutiscua, Santiago y Gramalote.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 ml de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 ml de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, se presenta un atraso del 3.25%, dándose un avance de 296 metros lineales de placa huella, 2 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 282 ml de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 ml de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 320 ml de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 ml de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 m de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 385 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 396 ml de placa huella, 2 alcantarillas y mantenimiento de 16699.60 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presenta un avance de 223 ml de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69m2 de mejoramiento periódico. Existe un avance de 80.80%

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presenta un avance de 232 ml de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. Existe un avance de 87.42%

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presente un avance de 50m de placa huella, 3 alcantarillas y 16964.05 m2 de mejoramiento. Existe un avance de 25.09%.

En Gramalote, donde se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presente un avance de 2 alcantarillas. Existe un avance de 6.55%.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 23 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29/7/2022	29/3/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/7/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18/6/2023	3/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/1/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	10	2022	3	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27 9 2022	27 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27 9 2022	27 12 2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27 9 2022	30 12 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 8 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19 10 2022	19 7 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19 10 2022	18 1 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 1 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10 8 2022	10 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10 8 2022	10 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10 8 22	10 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10	8	2022	1	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10	8	2022	1	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	31/07/2023			31/07/2028		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 5 - Terminación

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.658.435.877,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	1481
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	12
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	33	500
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	1	10
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.658.435.877,00		$ 2.658.435.877,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.658.435.877,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.123.494.623,47		$ 1.123.494.623,47	$ 1.123.494.623,47
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.560.734,32	$ 2.006.539,52	$ 12.567.273,84	$ 12.567.273,84
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.136.061.897,31**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.658.435.877,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.136.061.897,31
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 42,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 41
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **45**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

El contrato de obra se encuentra suspendido

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	5	7	2023	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	5	7	2023	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:
Contrato de obra suspendido

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ago-24

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 8 MESES

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 4.314.324.054,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 30/07/2024 **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 179.688.569,00

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/11/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	2401,35
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	13
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	91	1565
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	10
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.494.012.623,00		$ 4.494.012.623,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.494.012.623,00	$ -	**$ 4.494.012.623,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.614.626.808,78	$ -	$ 2.614.626.808,78	$ 2.614.626.808,78
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.023.684,01	$ 2.854.499,96	$ 17.878.183,97	$ 17.878.183,97
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2.632.504.992,75**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.494.012.623,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.632.504.992,75

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 58,58%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 17

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 SAN VICENTE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA



CORREDOR 2 SAN VICENTE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. 252 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA			CORREDOR 2 SAN VICENTE	I	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	A	I	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 2 SAN VICENTE	I	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	A	I	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			CORREDOR 2 SAN VICENTE	A	I	I	I	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL ACTIVO				1	2	0	0	1	2	0	0	3	0	0	1	2	2	0	2	0	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				2	1	3	3	2	1	3	3	0	3	3	2	1	1	3	1	3	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	97%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	26	28%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	64	69%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se encuentra en ejecucion de obra fisica el Proyecto en el corredor No. 2

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1124002	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO P RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 4.314.324.054	
				MUNICIPIO	Adicional No.1	$ 179.688.569	
			TOTAL			$ 4.494.012.623	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.494.012.623,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969.311.826	$ -	$ 969.311.826	$ 172.572.962	$ 796.738.863	$ 690.291.848,64		$ 3.524.700.798	$ 3.524.700.798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865.403.347	$ -	$ 865.403.347		$ 865.403.347	$ 690.291.848,64		$ 2.659.297.451	$ 2.659.297.451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262.829.510		$ 262.829.510	$ 172.572.962	$ 90.256.548	$ 517.718.886,64		$ 2.396.467.941	$ 2.396.467.941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530.799.834		$ 530.799.834	$ 172.572.962	$ 358.226.872	$ 345.145.924,32		$ 1.865.668.107	$ 1.865.668.107				
TOTALES			**$2.628.344.516,41**	**$0,00**	**$ 6.596.491.237**					**$ 2.659.297.450,6**	**$ 2.659.297.450,6**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 859.994.438,84		$ 859.994.438,84
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.545.300,90	$ 863.607,17	$ 5.408.908,07
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 864.539.739,74	$ 863.607,17	**$ 865.403.346,91**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A.ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	100%	102,5%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
2	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	100%	105,0%	SI	EDAD 28 DIAS 14 Mpa
3	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	82,9%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
4	19/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	100%	102,3%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
5	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	81,8%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
6	19/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	100%	102,8%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
7	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	81,2%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
8	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	74,7%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
9	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	82,3%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
10	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	71,1%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
11	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	80,6%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
12	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	73,4%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
13	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	87,8%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
14	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	73,0%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
15	19/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	80,5%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
16	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	69,7%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
17	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	82,5%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
18	21/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	74,1%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
19	21/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	72,1%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
20	21/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	71,54%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	19/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	195,8%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
2	26/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	215,8%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
3	21/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	75,30%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
4	28/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	95,60%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023
PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24-11-2022	24-11-2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24-11-2022	24-7-2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24-11-2022	24-7-2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	31 5 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	16 4 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16 1 2023	15 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16 1 2023	15 12 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	11 3 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	11 3 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 898.802.524,60	16 1 2023	11 11 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203.786,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	16	1	2023	11	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **16/02/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:
LA INTERVENTORIA DA APROBACION POR MEDIO DE OFICIO **GIC-INVIAS-NTS-314-22** DEL 27 DE FEBEREO DE 2023

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 665,00 (En meses según las órdenes sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 octubre	%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P												
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ P												
				$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P												
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ P												
				$ E												
				% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P				-	-							
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ P												
				$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	2,42%	% P		2,21%	5,72%	5,46%	3,24%	0,00%	5,33%	4,91%	6,69%	7,21%		
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$155.190.903,94	$ P		$ 98.320.217,59	$ 255.160.563,00	$ 243.391.580,35	$ 144.555.971,16		$ 237.350.302,04	$ 218.959.481,58	$298.064.665	$321.362.586		%
				$ E			$47.270.962	$107.919.942			$388.956.704	$188.098.063				
				% E		0,00%		2,42%	0,00%		5,33%	4,91%				
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	2%	% P		0,03%	0,89%	0,52%	0,60%	0,00%	0,09%	0,46%	0,44%	0,43%	0,43%	
	$ 154.378.902,55	3,46%	$44.111.899,72	$ P		$ 1.141.167,36	$ 39.613.987,58	$ 23.225.156,51	$ 26.930.914,93		$4.035.621	$20.378.593	$19.579.150	$19.317.053	$19.055.311	
				$ E			$ 18.586.201,15	$25.525.699			$ 42.252.531,90					
				% E		0,00%	0,42%	0,57%	0,00%	0,00%	0,09%	0,46%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	0,08%	0,00%	% P		0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
	$ 3.777.590,00	0,08%	$0,00	$ P		$2.266.554									$3.777.590	
				$ E												
				% E												
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	9,19%	2,39%	% P		0,89%	1,07%	1,19%	1,01%	0,00%	0,89%	1,19%	1,19%	1,48%		
	$ 409.487.845,00	9,19%	$106.466.839,70	$ P		$ 39.627.855,97	$ 47.553.427,00	$ 52.837.141,29	$ 44.911.570,10		$ 39.627.855,97	$52.837.141	$52.837.141	$66.046.427		
				$ E			$24.569.271		$81.897.569		$81.897.569					
				% E			0,55%		1,84%	0,00%	1,84%	1,84%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**49%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**$ 2.195.439.566,73**													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**3,17%**	**7,68%**	**7,17%**	**4,86%**	**0,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$141.355.795**	**$342.327.978**	**$319.453.878**	**$216.398.456**	**$0**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**49,26%**	**52,43%**	**60,11%**	**67,28%**	**72,13%**	**72,13%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.195.439.567**	**$2.336.795.362**	**$2.679.123.339**	**$2.998.577.217**	**$3.214.975.674**	**$3.214.975.674**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**49,26%**	**0,00%**	**9042643345,00%**	**1334456091,00%**	**8189756900,00%**	**0,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.195.439.567**	**$ -**	**$ 0,01**	**$ 0,03**	**$ 0,02**	**$ -**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**49,26%**	**49,26%**	**9042643394,26%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.195.439.567**	**$2.195.439.567**	**$2.195.439.567**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20% I = 5% U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 542021764 93 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 665,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre	%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P							$ 41.525.272,06					
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ P							$359.645.820					
				$ E							$21.126.266					
				% E							$81.897.569					
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P												
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ P												
				$ E												
				% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P												
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ P												
				$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	15519090394,00%	% P		2,21%	5,72%	5,46%	3,24%	0,00%	5,33%	4,91%				
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$0,02	$ P		$ 98.329.417,59	$ 255.160.563,00	$ 243.391.580,35	$ 144.555.971,16		$ 237.350.302,04	$ 218.959.481,58	$298.064.665	$321.362.586		%
				$ E			$47.670.302	$107.919.942			$388.956.791	$188.098.063				
				% E				2,42%	0,00%	0,00%	8,73%	4,22%				
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	#¡REF!	% P		0,03%	0,89%	0,52%	0,60%							
	$ 154.378.902,55	3,46%	$18.586.201,16	$ P		$ 1.141.167,36	$ 39.613.987,58	$ 23.225.156,51	$ 26.930.914,93		$4.035.621	$20.378.593	$19.579.150	$19.317.053	$19.317.053	
				$ E			$ 18.586.201,15	$25.525.699			$ 42.252.531,90					
				% E			0,42%	0,57%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	0,08%	0,00%	% P												
	$ 3.777.590,00	0,08%	$0,00	$ P		$2.266.554									$3.777.590	
				$ E												
				% E												
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	9,19%	10646683970,00%	% P		0,89%	1,07%	1,19%	1,01%							
	$ 409.487.845,00	9,19%	$0,02	$ P		$ 39.627.855,97	$ 47.553.427,00	$ 52.837.141,29	$ 44.911.570,10		$ 39.627.855,97	$52.837.141	$52.837.141	$66.046.427		
				$ E			$24.569.271		$81.897.569		$81.897.569					
				% E			0,55%	0,00%	1,84%	0,00%	1,84%	0,00%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**#¡REF!**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**$ 1.908.256.124,57**													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**3,12%**	**7,68%**	**7,17%**	**4,86%**	**0,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$141.355.795**	**$342.327.978**	**$319.453.878**	**$216.398.456**	**$0**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**42,81%**	**45,93%**	**53,61%**	**60,78%**	**65,64%**	**65,64%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.125**	**$2.049.611.919**	**$2.391.939.897**	**$2.711.393.775**	**$2.927.792.231**	**$2.927.792.231**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**42,81%**	**0,00%**	**$71.840.232**	**1334456491,00%**	**818975690,00%**	**0,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.125**	$ -	$ 18.586.201,16	$ 0,03	$ 0,02	$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**42,81%**	**42,81%**	**7184023272,81%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.125**	**$1.908.256.125**	**$1.926.842.326**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20% I = 5% U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 6/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/08/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.203.091.392,61
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 65.529.031,39
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1175
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	20	1175
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		5
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.268.620.424,00		$ 2.268.620.424,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.268.620.424,00	$ -	**$ 2.268.620.424,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.104.628.574,52		$ 2.104.628.574,52	$ 2.104.628.574,52
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.231.808,42	$ 1.944.043,60	$ 12.175.852,02	$ 12.175.852,02
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2.116.804.426,54**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.268.620.424,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.116.804.426,54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 93,31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 24
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 20
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A					
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A					
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																						2	2	2	2	2	2	2	2					
TOTAL ACTIVO																						0	2	2	2	2	0	0	2					
TOTAL EN REPARACIÓN																						0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL INACTIVO																						2	0	0	0	0	2	2	0					

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10	63%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	6	38%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JHON MAYKEL REYES YARURO
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 – 436123 NTS

Firma

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	0916-02	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 2.203.091.392,61	
					Adicional 1	$ 65.529.031	
			TOTAL			$ 2.268.620.424,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.268.620.424,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1.483.468.803	$ 1.483.468.803				
2	OBRA	dic-23	$ 535.844.105		$ 535.844.105		$ 535.844.105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 947.624.698	$ 947.624.698				
3	OBRA	abr-24	$ 305.354.545		$ 305.354.545		$ 305.354.545		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 642.270.153	$ 642.270.153				
4	OBRA	jun-24	$ 420.175.840		$ 420.175.840		$ 420.175.840		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 222.094.313	$ 222.094.313				
TOTALES			**$2.046.526.111,00**	**$0,00**	**$ 2.046.526.111**		**$ 2.046.526.111**			**$ 222.094.313,00**	**$ 222.094.313,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.104.628.574,52		$ 2.104.628.574,52
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.231.808,42	$ 1.944.043,60	$ 12.175.852,02
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 2.114.860.382,94	$ 1.944.043,60	**$ 2.116.804.426,54**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	742
Lluvias moderadas																						2										2
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JHON MAYKEL REYES YARURO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 – 436123 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1									
2									
3									
4									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1									
2									
3									
4									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	1	2023	6	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **10/04/2023**

OBSERVACIONES:
SE ENCUENTRA APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-433-22 EL 10 DE ABRIL DE 2023

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indíquese la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.203.091.392,61 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.268.620.423,61

PLAZO ACUMULADO: 17,97 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 65.529.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 / ago-23	2 / sep-23	3 / oct-23	4 / nov-23	5 / dic-23	6 / ene-24	7 / feb-24	8 / mar-24	9 / abr-24	10 / may-24	11 / jun-24	12 / jul-24	11 / ago-24
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1.076.212.492	47,99%	13,13%	% P	9,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	6,87%	5,55%	6,70%	5,96%	4,42%	4,72%	2,96%	0,86%
	$1.076.212.492	10,13%	$227.209.627	$ P	$210.328.443	$0	$0	$0	$16.881.184	$154.033.633	$124.423.445	$150.217.125	$133.658.144	$ 99.006.032,86	$ 105.763.807,59	$ 66.397.453,27	$19.394.610
			$294.318.650	$ E		$268.200.990	$0	$0	$26.117.660	$73.620.261	$109.697.706	$152.589.323	$43.430.624	$ 210.216.807,80	$ 58.128.744,00	$ 90.673.379,00	$31.484.569
				% E		11,96%	0,00%	0,00%	1,16%	3,28%	4,89%	6,80%	1,94%	9,37%	2,60%	4,04%	1,40%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$40.260.415	1,80%	0,00%	% P						0,58%	0,34%	0,88%					
	$40.260.415	0,00%	$0	$ P						$12.909.456	$7.669.918	$19.681.042					
				$ E			$0			$8.358.596	$31.904.948	$0					
				% E			0,00%			0,37%	1,42%						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$954.963.398	42,59%	33,96%	% P	0,00%	9,95%	5,05%	4,04%	3,87%	5,05%	5,11%	4,25%	2,85%	2,25%		0,00%	
	$954.963.398	22,91%	$513.664.650	$ P	$0	$223.173.002	$113.178.564	$90.542.851	$86.770.232	$113.178.564	$114.642.695	$95.344.100	$63.840.266	$ 50.520.500,13			
			$761.512.938	$ E		$295.342.199	$110.270.201	$82.413.031	$273.487.508	$38.389.308	$0		$60.664.907	$ 94.483.310,60			
				% E		13,17%	4,92%	3,68%	12,20%	1,71%	0,00%	0,00%	2,71%	4,21%		0,00%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$71.550.426	3,19%	2,18%	% P		0,68%	0,88%	0,76%	0,73%		0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$71.550.426	3,04%	$68.220.070	$ P		$15.157.344	$19.830.606	$16.969.593	$16.262.526		$0		$2.623.290				
			$48.977.150	$ E		$26.106.747			$22.870.403	$19.945.749	$0						
				% E		1,16%			1,00%	0,85%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4.550.000	0,20%	0,00%	% P					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
	$4.550.000	0,00%	$0	$ P					$0								$4.550.000
				$ E													$4.550.000
				% E													
ITEM NO PREVISTO	$94.850.758	4,23%	0,18%	% P	0,00%	0,11%	0,34%	0,27%	0,25%	0,32%	0,25%	0,25%	1,95%	0,21%	0,21%	0,11%	
	$94.850.758	0,98%	$22.012.251	$ P	$0	$2.550.880	$7.652.641	$6.122.112	$5.686.618	$7.108.273	$5.686.618	$5.686.618	$43.671.194	$ 4.738.848,56	$ 4.738.848,56	$ 2.369.424,28	
			$17.273.103	$ E			$17.273.103					$5.757.701	$37.273.748				
				% E	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	
GPP7				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
GPP8				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
GPP8				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E						Reprogramación No.1							
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.242.387.488,99**	**100%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.242.387.488,99**	**37%**	**49%**														

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9,38%	10,74%	6,27%	5,07%	5,60%	12,81%	11,26%	12,08%	10,87%		1,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	$210.328.443	$240.881.227	$140.661.811	$113.634.557	$125.600.562	$287.229.926	$252.422.680	$270.928.885	$243.792.894		$23.945.610
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9,38%**	**20,12%**	**26,39%**	**31,46%**	**37,06%**	**49,87%**	**61,13%**	**73,21%**	**84,08%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$210.328.443**	**$451.209.669**	**$591.871.480**	**$705.506.037**	**$831.106.598**	**$1.118.336.524**	**$1.370.759.204**	**$1.641.688.088**	**$1.885.480.983**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	26,30%	5,10%	3,68%	14,38%	6,26%	6,31%	6,86%	5,03%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$589.649.936	$127.543.304	$82.413.031	$322.475.571	$140.313.405	$141.602.655	$158.347.024	$141.369.280		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**26,30%**	**31,39%**	**35,07%**	**49,45%**	**55,71%**	**62,02%**	**68,88%**	**73,91%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$589.649.936**	**$717.193.240**	**$799.606.271**	**$1.122.081.842**	**$1.262.395.247**	**$1.403.997.901**	**$1.562.344.925**	**$1.703.714.205**		
		-9,38%	6,17%	5,00%	3,60%	12,38%	5,83%					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES								
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO							EJECUTADO
BARRAS	$ Valor							$ Valor
CURVAS								

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Sergio Andres Arias Anzola — Representante legal o apoderado del Contratista — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: N/A — Titular Gerencia: N/A — Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma: Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO — Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND — ORDENADOR DEL PAGO — Fecha de Firma:

Revisó Firma: Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Director Territorial — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO							MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN							1
PÁGINA							

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.203.091.392,61 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.268.620.424,00

PLAZO ACUMULADO: 17,97 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 65.529.031,39

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ago-23	2 sep-23	3 oct-23	4 nov-23	5 dic-23	6 ene-24	7 feb-24	8 mar-24	9 abr-24	10 may-24	11 jun-24	12 jul-24	10 ago-24
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1.076.212.492	47,99%	13,13%	% P	9,38%				0,75%	6,87%	5,55%	6,70%	5,96%	4,42%	4,72%	2,96%	0,86%
	$1.076.212.492	10,13%	$227.209.627	$ P	$210.328.443				$16.881.184	$154.033.633	$124.423.445	$150.217.125	$133.658.144	$ 99.006.032,86	$ 105.763.807,59	$ 66.397.463,27	$19.395.610
	$1.076.212.492	10,13%	$294.318.650	$ E		$268.200.990	$0		$26.117.660	$73.620.261	$109.697.706	$152.589.323	$43.430.624	$ 210.216.807,80	$ 58.128.744,00	$ 90.673.379,00	$37.484.569
				% E		11,96%	0,00%		1,16%	3,28%	4,89%	6,80%	1,94%	9,37%	2,59%	4,04%	1,40%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$40.260.415	1,80%	0,00%	% P						0,58%	0,34%	0,88%					
	$40.260.415	0,00%	$0	$ P						$12.909.456	$7.669.918	$19.661.042					
			$0	$ E			$0			$8.358.596	$31.904.948	$0					
				% E			0,00%			0,37%	1,42%						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$954.963.398	42,59%	33,96%	% P	0,00%	9,95%	5,05%	4,04%	3,87%	5,05%	5,11%	4,25%	2,85%	2,25%		0,00%	
	$954.963.398	22,91%	$513.678.037	$ P	$0	$223.186.389	$113.178.564	$90.542.851	$86.770.232	$113.178.564	$114.643.698	$95.344.100	$63.840.266	$ 50.520.500,13			
			$761.512.938	$ E		$295.342.199	$110.270.201	$82.413.031	$273.487.508	$38.389.308	$0		$60.664.907	$ 94.483.310,60			
				% E		13,17%	4,92%	3,68%	12,20%	1,71%	0,00%	0,00%	2,71%	4,21%		0,00%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$71.550.426	3,19%	2,18%	% P		0,68%	0,88%	0,76%	0,73%		0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$71.550.426	3,04%	$68.220.069	$ P		$15.157.344	$19.830.606	$16.969.593	$16.262.526		$0		$2.623.290	$0			
			$48.977.150	$ E		$26.106.747			$22.870.403		$0						
				% E		1,16%			1,020%		0,000%				0,000%	0,000%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4.550.000	0,00%	0,00%	% P					0,00%						0,00%	0,00%	
	$4.550.000	0,00%	$0	$ P					$0								
				$ E													
				% E													
ITEM NO PREVISTO	$94.850.758	4,23%	0,00%	% P	0,00%	0,11%	0,34%	0,27%	0,25%	0,32%	0,25%	0,25%	1,95%	0,21%	0,21%	0,11%	
	$94.850.758	0,98%	$22.012.251	$ P	$0	$2.550.880	$7.652.641	$6.122.112	$5.686.618	$7.108.273	$5.686.618	$5.686.618	$43.671.194	$4.738.849	$ 4.738.848,56	$ 2.369.424,28	
			$17.273.103	$ E			$17.273.103					$5.757.701	$37.273.748		$0	$0	
				% E													
GPP7				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
GPP8				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
GPP8				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.242.387.488,99**	**100%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.242.387.488,99**	**37%**	**49%**														

Reprogramación No.1

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9,38%	10,74%	6,27%	5,07%	5,60%	12,81%	11,26%	12,08%	10,87%	0,86%
	VALOR (Miles de Pesos)	$210.328.443	$240.894.613	$140.661.811	$113.634.556	$125.600.562	$287.229.926	$252.422.680	$270.928.885	$243.792.894	$19.395.610
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9,38%**	**20,12%**	**26,40%**	**31,46%**	**37,06%**	**49,87%**	**61,13%**	**73,21%**	**84,08%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$210.328.443**	**$451.223.056**	**$591.884.867**	**$705.519.423**	**$831.119.985**	**$1.118.349.911**	**$1.370.772.591**	**$1.641.701.475**	**$1.885.494.369**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	26,30%	4,92%	3,68%	14,38%	6,26%	6,31%	6,80%	4,64%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$589.649.936	$127.543.304	$82.413.031	$322.475.571	$140.313.405	$141.602.655	$158.347.024	$141.369.280	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**26,30%**	**31,21%**	**34,89%**	**49,27%**	**55,53%**	**61,84%**	**68,65%**	**73,29%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$589.649.936**	**$717.193.240**	**$799.606.271**	**$1.122.081.842**	**$1.262.395.247**	**$1.403.997.902**	**$1.562.344.926**	**$1.703.714.206**	
		-9,38%	**6,17%**	**4,62%**	**3,43%**	**12,21%**	**5,69%**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES								
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO							EJECUTADO
BARRAS	$ Valor							$ Valor
CURVAS								

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Eslarido Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-F
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: MP-LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA BELEN NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observa (Indicar nc de vaca incapacida licencias otr
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1091668650	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.126.667	$ 78.500	5	SANITAS	79285718	$ 45.100	PORVENIR	79285718	$ 180.300	$ 45.100			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cu corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de confo la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29/3/2023	29/9/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se solicita al contratista de obra, realizar la actualización de pólizas de acuerdo a la terminación del onjeto contratado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 21,03

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 7.565.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 24.463.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTC** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	14.143
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150.715,56
	Mejoramiento	m2	145.947,74
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	106
	Boxculvert	Und	17
	Gavion	m3	27

Se anexa Otras obras (Boxculvert) los cuales por error de edicion no se incluyeron al cuadro de alcance del mes anterior.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	1448,4	6719,50
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	7.716,02	99.728,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	4,95	15,45
	Boxculvert	Und	0	0
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 23.770.799.444,00		$ 23.770.799.444,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 386.852.974,00	$ 73.502.065,00	$ 460.355.039,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.389.525.261,00	$ 73.502.065,00	**$ 24.463.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.891.825.538,18		$ 1.891.825.538,18	$ 9.333.028.429,64
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -	$ 191.226.119,59
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -		$ -	$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ 1.891.825.538,18	**$ 9.546.454.549,23**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 24.463.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 9.546.454.549,23
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **39,02%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 94
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **128**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL SECCION DE PLACA HUELLA TRAMO No1 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



CONCRETO DE 14 MPA PARA ELEMENTOS DE FRANJA CENTRAL Y SOBRENCHO PLACA HUELLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA VEREDA CHICAGUA BAJO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS PLACA HUELLA VEREDA POTREROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8	8	8		8	8		8	8	8		8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
			TOTAL ACTIVO	8	8	8		8	8		8	8	8		8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
2024	4624	MEJORAMIENTO VIAS TERCEARIAS		INVIAS Y GOBERNACION	ADICIONAL No2 TIEMPO Y VALOR	$ 7.565.000.000	
			TOTAL			$ 24.463.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 24.463.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00						$ 22.375.512.632,00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530	$ -	$ 1.410.068.530						$ 20.965.444.102,00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319	$ -	$ 2.160.465.319						$ 18.804.978.783,00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191	$ -	$ 1.565.952.191						$ 17.239.026.592,00				
TOTALES			**$7.193.600.734,00**	**$30.400.000,00**	**$ 7.224.000.734**					**$ -**	**$ 17.239.026.592,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 7.033.600.733,00		$ 7.033.600.733,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 160.000.000,00	$ 30.400.000,00	$ 190.400.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 7.193.600.733,00	$ 30.400.000,00	**$ 7.224.000.734,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (ARBOLEDAS)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	21	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	735
Lluvias moderadas					3				4																		2					9
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (GRAMALOTE)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas									3																							3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (LOS PATIOS)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	20/08/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS (VEREDA SANTO DOMINGO)	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	96,17%	SI	
					2	≥ 95%	95,63%	SI	
1	20/08/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS (VEREDA POTREROS)	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,19%	SI	
					2	≥ 95%	95,30%	SI	
1	20/08/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS (VEREDA CINERA)	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	100,53%	SI	
					2	≥ 95%	102,07%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	2/07/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL TRAMO 3 PR3+355 VEREDA JUAN BUENO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2672	SI	
2	24/06/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLA Y VIGA RIOSTRATRAMO 2 PR1+875 VEREDA CHICAGUA BAJO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3284	SI	
3	8/07/2024	CONCRETO DE 21 MPA BORDILLO Y HUELLAS TRAMO 3 PR3+335 VEREDA JUAN BUENO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	2468	SI	Se verificara a los 28 dias
4	28/06/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL TRAMO 2 VEREDA CHICAGUA BAJO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2314	SI	
5	29/06/2024	CONCRETO DE 21 MPA CUNETA Y BORDILLO TRAMO 4 PR1+616 VEREDA CINERA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3998	SI	
6	3/07/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO TRAMO 1 PR1+350 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	3374	SI	
7	2/07/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL PR3+355 VEREDA JUAN BUENO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	3212	SI	
8	3/07/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO TRAMO 1 PR1+350 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	3437	SI	
9	4/07/2024	CONCRETO DE 21 MPA LOSA SOBREANCHO TRAMO 2 PR1+860 VEREDA CHICAGUA BAJO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3334	SI	
10	9/07/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLA Y VIGA RIOSTRA TRAMO 1 PR1+280 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3175	SI	
11	9/07/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLA PR7+110 VEREDA SAN ISIDRO, GRAMALOTE	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3117	SI	
12	10/07/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLA PR7+100 VEREDA SAN ISIDRO, GRAMALOTE	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3166	SI	
13	6/08/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS TRAMO 2 PR2+100 VEREDA JUAN BUENO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3869	SI	
14	13/08/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS TRAMO 1 PR0+506 VEREDA CHICAGUA BAJO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3730	SI	
15	16/08/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS TRAMO 1 PR0+490 VEREDA CHICAGUA BAJO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3268	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10	4	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10	4	2023	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.388.908.197,80	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/08/2024

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI ------ NO X VERSIÓN No. ------ FECHA DE VERSIÓN: ------

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES 1

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ETIVIAL TRICUA 2590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 16.868.027.326,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 24.463.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 7.595.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	0 / 0	MES 1 / ABRIL	MES 2 / MAYO	MES 3 / JUNIO	MES 4 / JULIO	MES 5 / AGOSTO	MES 6 / SEPTIEMBRE	MES 7 / OCTUBRE	MES 8 / NOVIEMBRE	MES 9 / DICIEMBRE	MES 10 / ENERO	MES 11 / FEBRERO	MES 12 / MARZO	MES 13 / ABRIL	MES 14 / MAYO	MES 15 / JUNIO	MES 16 / JULIO	MES 16 / AGOSTO
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%		% P													6,75%	4,06%	4,64%	4,64%	5,90%	24,67%
				$ P													$ 465.430,74	$ 279.801,25	$ 319.719,95	$ 319.719,95	$ 406.648,54	$ 1.700.143,40
				$ E																		
				% E																		
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,36	3,00%		% P				-									0,71%	3,06%	2,04%	2,65%	9,92%	66,04%
				$ P													$ 5.206,31	$ 22.434	$ 14.953,95	$ 19.453,68	$ 72.697,08	$ 416.618,99
				$ E																		
				% E																		
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%		% P													10,11%	25,68%	17,12%	17,12%	21,40%	8,56%
				$ P													$ 22.017,00	$ 55.937,00	$ 37.288,00	$ 37.288,00	$ 46.610,00	$ 18.644,00
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.163.087,49	37,46%		% P													8,64%	0,09%	5,63%	6,71%	11,77%	32,34%
				$ P													$ 791.910,66	$ 8.464,06	$ 515.498,69	$ 614.423,65	$ 1.078.269,02	$ 2.963.501,11
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.195.071,36	8,97%		% P													1,48%	5,41%	10,37%	14,48%	29,38%	14,70%
				$ P													$ 32.480,53	$ 118.665,35	$ 227.569,37	$ 317.960,09	$ 644.822,39	$ 322.685,75
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%		% P													52,06%	1,87%	11,30%	11,30%	14,12%	9,35%
				$ P													$ 214.826,48	$ 7.716,27	$ 46.629,67	$ 46.629,67	$ 58.287,08	$ 38.592,53
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.069.408,42	12,55%		% P													9,16%	0,54%	5,08%	7,61%	11,53%	68,44%
				$ P													$ 280.764,54	$ 16.647,73	$ 155.796,67	$ 233.662,67	$ 353.897,06	$ 2.100.568,83
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 855.974,58	3,50%		% P													4,11%	2,18%	11,16%	18,72%	34,46%	21,06%
				$ P													$ 35.153,91	$ 18.370,52	$ 95.503,00	$ 160.245,94	$ 294.987,89	$ 179.784,19
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%		% P													33,18%	0,00%	9,37%	13,64%	17,04%	27,07%
				$ P													$ 77.206,54	-	$ 21.798,42	$ 31.731,06	$ 39.663,82	$ 62.999,72
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 23.770.799,31**	**97,17%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

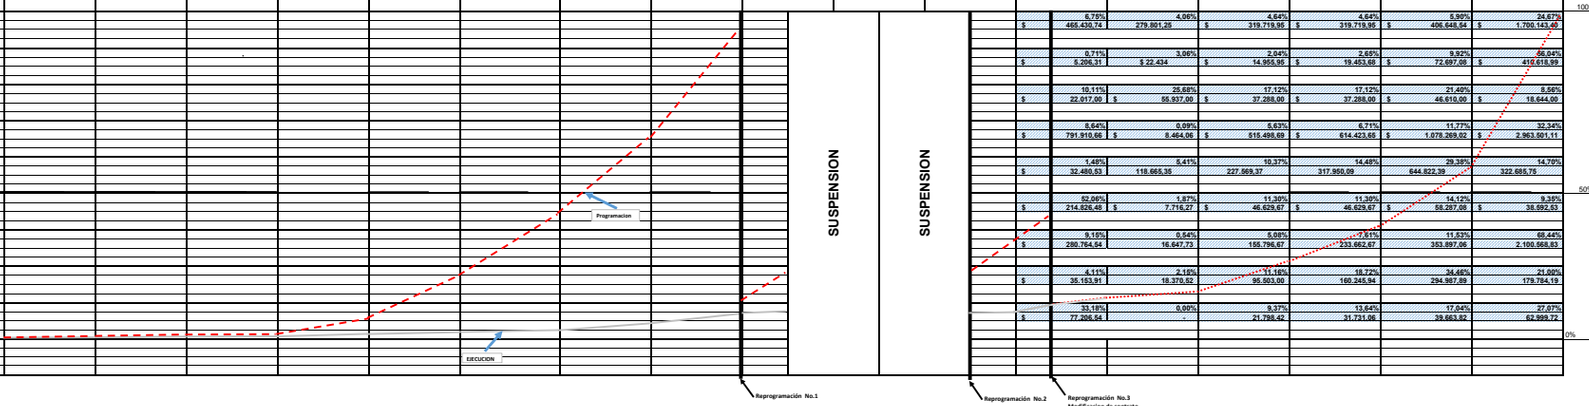

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	5,35%	8,51%	10,56%	17,76%	47,50%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 835.733,97	$ 2.266.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 903.926,92	$ 1.438.409,79	$ 1.784.754,77	$ 8.027.184,39
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	15,67%	24,18%	34,74%	52,50%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 2.647.232,92	$ 4.085.642,71	$ 5.870.397,48	$ 8.870.842,94	$ 16.898.027,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR (Miles de Pesos)																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR (Miles de Pesos)																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ 214.987,50		%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $ -		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ 40.847,63		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 692.227,88		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:
Considerando el adicional y la prórroga No. 2 realizada al contrato, la interventoria, mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1251-24, solicitó su entrega de la reprogramacion, pero hasta la fecha no ha sido recibida.

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022


OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RSVNL-TEGUA 2590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 18 MESES y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16.888.027.320,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 7.565.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 24.463.027.326,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%	10,78%	% P													6,75%	4,06%	4,64%	4,64%	5,90%	24,67%				
			2.561.610,88	$ P													$ 465.430,74	279.801,25	$ 319.719,95	$ 319.719,95	$ 406.548,52	$ 1.700.143,48				
				$ E													465.430,74	310.142,63	329.880,85	624.034,63	421.883,56	$ 410.138,47				
				% E													6,75%	4,50%	4,79%	9,06%	6,12%					
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,36	3,00%	0,22%	% P													0,71%	3,06%	2,04%	2,65%	9,92%	56,04%				
			52.896,67	$ P													$ 5.206,31	$ 22.434	$ 14.955,95	$ 19.453,68	$ 72.697,08	$ 410.819,99				
				$ E													5.206,31	19.951,06	3.653,87	24.095,43						
				% E													9,71%	2,73%	0,99%	3,29%						
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%	0,09%	% P													10,11%	25,68%	17,12%	17,12%	21,40%	8,56%				
			22.017,00	$ P													$ 22.017,00	$ 65.937,00	$ 37.288,00	$ 37.288,00	$ 46.610,00	$ 18.644,00				
				$ E													$ 22.017,00									
				% E													10,11%									
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.163.087,49	37,46%	16,00%	% P													8,64%	0,09%	5,63%	6,71%	11,77%	32,34%				
			3.804.389,33	$ P													$ 791.910,66	$ 8.464,06	$ 515.488,69	$ 614.423,65	$ 1.078.269,02	$ 2.963.591,11				
				$ E													792.899,97	207.463,60	690.622,31	488.179	773.607,98	851.616,94				
				% E													8,65%	2,26%	7,54%	5,33%	8,44%					
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.195.071,36	8,97%	1,13%	% P													1,48%	5,41%	10,37%	14,48%	29,38%	14,70%				
			269.396,89	$ P													$ 32.480,53	118.665,35	227.569,37	317.950,09	644.822,39	$ 322.685,75				
				$ E													31.491,23	36.156,41	25.171,84	52.509,08	48.218,45	75.308,88				
				% E													1,43%	1,65%	1,17%	2,37%	2,24%					
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%	1,13%	% P													52,06%	1,87%	11,30%	11,30%	4,12%	9,35%				
			267.437,21	$ P													$ 214.826,48	$ 7.716,27	$ 46.629,67	$ 46.629,67	$ 58.287,08	$ 38.592,75				
				$ E													214.826,48		52.610,74	12.755						
				% E													52,06%		12,75%							
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.069.408,42	12,55%	8,17%	% P													9,16%	0,54%	5,05%	5,41%	11,53%	68,44%				
			1.942.231,59	$ P													$ 280.764,64	16.647,73	155.796,67	233.662,67	353.897,06	2.100.568,83				
				$ E													280.764,64	50.657,96	221.473,88	497.120,26	440.246,73	451.968,22				
				% E													9,16%	1,65%	7,23%	16,20%	14,34%					
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 855.974,58	3,50%	1,01%	% P													4,11%	2,16%	11,16%	18,72%	34,46%	21,09%				
			239.288,91	$ P													$ 35.163,91	18.370,63	$ 95.503,00	160.245,94	294.987,69	179.784,19				
				$ E													35.163,91	-	$ 11.775,43	34.991,36	64.588,17	102.731,03				
				% E													4,11%	0,00%	1,38%	4,09%	8,34%					
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%	0,73%	% P													33,16%	-	0,00%	9,37%	13,64%	27,07%				
			173.759,94	$ P													$ 77.206,54	-	21.798,42	31.731,06	39.663,82	62.999,72				
				$ E													77.206,54	4788,98		16.858,98	74.905,44					
				% E													33,16%	2,06%		7,24%	32,19%					
TOTAL OTROS ITEMS				% P																						
				$ P																						
				$ E																						
				% E																						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 23.770.799,31	97,17%	39,26%																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 9.333.028,43																							

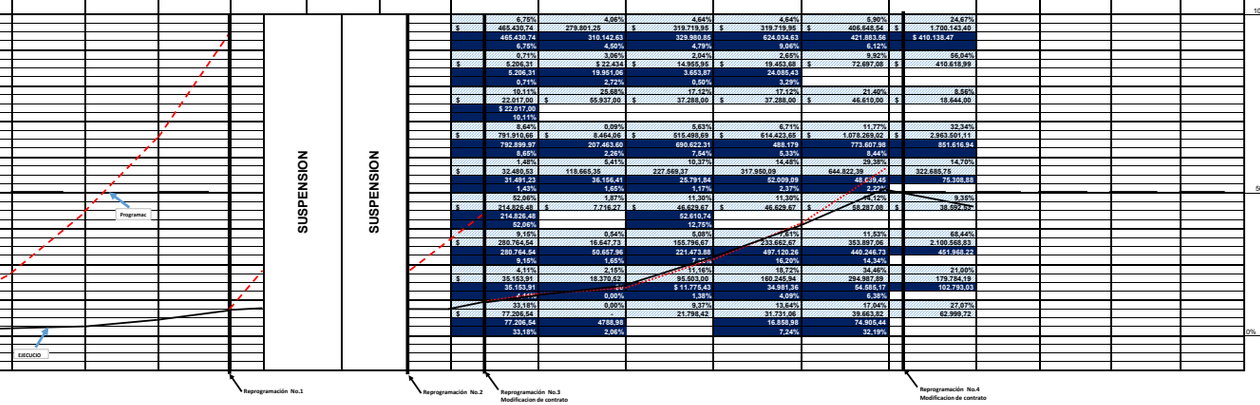

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	5,35%	8,51%	10,56%	17,76%							
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 835.733,97	$ 2.266.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 903.926,92	$ 1.438.409,79	$ 1.784.754,77	$ 3.000.445,46							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	15,67%	24,18%	34,74%	52,50%							
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 2.647.232,92	$ 4.085.642,71	$ 5.870.397,48	$ 8.870.842,94							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,05%	0,04%	0,77%	0,41%	0,91%	2,28%	2,67%	8,27%	8,27%	8,27%	4,38%	3,73%	7,90%	10,28%	10,74%	7,73%						
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,60	$ 129.399,36	$ 69.207,82	$ 154.041,58	$ 384.482,79	**451.300,60**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 740.324,93	$ 629.160,64	$ 1.335.908,92	$ 1.737.268,29	$ 1.813.868,33	$ 1.891.825,54						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,05%	0,09%	0,85%	1,26%	2,17%	4,45%	7,12%	8,27%	8,27%	8,27%	12,65%	16,38%	24,28%	34,56%	45,30%	39,02%						
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16	$ 751.447,95	**$ 1.202.749,87**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 2.138.422,83	$ 2.767.583,47	$ 4.103.492,39	$ 5.840.760,68	$ 7.654.629,01	$ 9.546.454,55						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84		%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47	$ 160.694,22	%
	$ 214.987,50		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00	$ 22.200,00	%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44	$ 30.531,90	%
	$ 40.847,63		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 692.227,88		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**	**$ 9.546.454,55**	**39,02%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se cacula con respecto al valor básico de obra (A) o el valor básico de obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	.....	———

OBSERVACIONES:
Considerando el adicional y la prórroga No. 2 realizada al contrato, la interventoría, mediante el comunicado GIC- INVIAS-NTE-1251-24, solicitó su entrega de la reprogramación, pero hasta la fecha no ha sido recibida.

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencial: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-SV02590-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios
1	ARISTOBULO ZABALAMONTAÑEZ	5439750	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.300.000
2	CESAR ANDRES CARDENASCOLL	1090393766	RESIDENTEDE OBRA	$ 2.200.000
3	EDWARHERNANDEZ RENGIFO	88261502	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.500.000
4	HENRY HOMEROSILVA	1098819129	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.500.000
5	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	1004877143	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.300.000
6	SUAREZ VILLALBAFREDIS JOSE	1101387669	TOPOGRAFO	$ 1.500.000
7	GARCIAPALACIOLUISEDUARDO	1093761965	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.900.000
8	WILSON ENRIQUERODRIGUEZ	1005057039	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.300.000
9	WILLIAM PACHECO	13392290	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.500.000
10	GIRALDO COLLANTES FRANKLYN AARON	79685180	LOGISTICA	$ 2.200.000
11	ANGELICA CAROLINALOPEZ BERRIO	1093773719	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.500.000
12	DARLY JUDITHRODRIGUEZ GALVIS	1090393766	RESIDENTE SST	$ 1.500.000
13	DAYANAMELINA SALAZARORTEGA	88261502	ING AMBIENTAL	$ 1.300.000
14	LUIS RAMONNUÑEZ	1094426602	INSPECTOR OBRA	$ 1.800.000
15	NATALIA HURTADO	1090506478	COORDINADOR SST	$ 2.500.000
16	NELSONMENDOZA	1094426430	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.500.000
17	SERGIO ALONSO VALERO	1094426974	CONDUCTORVOLQUETA	$ 1.500.000
18	ANGIE STELLA DUARTE	1090508619	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.800.000
19	GUSTAVO NIÑO GARCIA	1090497738	COMPRAS	$ 2.500.000
20	HECTOR FABIO ACOSTA GARCIA	1090423766	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000
21	ELIAN ALEXIS CARRILLO	1007953522	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.300.000
22	LEIDY JAIME	1091664068	AUXILIAR INGENIERIA	$ 2.000.000
23	WILLIAM PABON	13278653	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.300.000
24	BRAYAN ALBERTO FUENTES AVELLANEDA	1094427498	RESIENTE DE OBRA	$ 2.200.000
25	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRIGUEZ	1092646457	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000
26	CARLOS ALBERTO PINEDA	1007909639	AUXILIAR TOPOGRAFIA	$ 1.500.000,00
27	DANIEL STEVEN CARDENAS	1005036929	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00
28	DANIEL FERNANDO JAIMES MANCIPE	1092647041	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00
29	SERGIO ALBERTO LAGUADO	1093766200	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.600.000,00
30	WILLIAM JOEL FLOREZ BAUTISTA	1005543179	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000,00
31	ALVARO ROJAS	1094427632	AUXILIAR INGENIERIA	$ 1.500.000,00
32	LEDY MARIA CARVAJAR	60397386	CONTADORA	$ 2.500.000,00
33	FERNANDO SOTO	1093789563	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000,00
34	GEOVANNY ANDRES ROJAS SANCHEZ	1.090.515.100	AUXILIAR INGENIERIA	$ 1.800.000,00
35	LUIS ALBERTO RUIZ MARCIALES	1092645020	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000,00
36	JESUS SIERRA CALDERON	1007444967	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
37	FRANCISCO SANDOVAL	1090462244	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
38	FABIO URIBE	1098621938	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
39	RAMON GELVEZ	1092647522	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
40	EDWIN ENRIQUE HOYOS	1096183008	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
41	FRANKI BRAVO DIAZ	1068577126	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
42	JESUS ENRIQUE LOPEZ CARDENAS	1092645869	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
43	HEILER PEREZ	11.98414	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
44	ALVARO CRUZ	13413081	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
45	ANGEL MARIA JAIMES	13412578	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
46	DOUGLAS URIBE	1.093.889.177	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
47	RONALD SALCEDO	1.092.644.428	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
48	YOSSER CARVAJAL	1004941773	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
49	DIEGO JESUS BOHADA	1092644511	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
50	LUIS ANGEL ANTOLINES	1092645613	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
51	VEGA CARRILLO EDWIN SANTIAGO	10926449 12	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
52	CONTRERAS ORTEGA JOSE FERNANDO	10074449 89	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
53	MOYA ALVAREZ JOSE GREGORIO	7175554	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
54	VEGA CARRILLO EDWIN SANTIAGO	88168922	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
55	EDUARD CARRILLO	1092646081	MAESTR O DE	$ 1.300.000,00
56	ANDRES MAURICIO MENDOZA	1005011478	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
57	JESUS ADRIAN CRUZ	1092647112	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
58	DEIBY ANDRES MOGOLLON	1007929730	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
59	LUIS MIGUEL ESPINEL	1092645837	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
60	ALGEMIRO CRUZ	#	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
61	SERGIO GUTIERREZ MARQUEZA	1090505404	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
62	AUGUSTO MEDINA	1683558	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
63	FREDY MONCADA	13412374	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
64	JAVIER COLMENDARES	4535674	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
65	JHON DIAZ	1092644442	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
66	MANUEL BUSTOS	13412179	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
67	ADRIAN ROJAS	1092644875	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
68	JUAN CALDERON MONCADA	1004941521	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
69	ESNEIDER RODRIGUEZ LAGUADO	1092644157	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
70	EDWIN RODRUIGUEZ LAGUADO	1092644009	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
71	JORGE RODRIGUEZ	1092644019	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
72	DIAZ GALVIS JESUS	1092644524	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
73	JHON JAIRO BELEÑO	1085100485	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
74	EDER VANEGAS ARENILLA	1051743874	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
75	CRISTIAN DANIEL FULLEDAS	1007883115	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
76	JOSE ANTONIO MORA	1051747008	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
77	JOSE DE JESUS MORA	1002426166	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
78	JOSE BELEÑO GUTIERREZ	1049894465	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
79	RAFAEL MORABELEÑO	73584569	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
80	JOSEDELAHOS BELEÑO	1127055805	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
81	YULIS PAOLA BEÑEO	1065660929	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
82	JOSEDELCARMEN VILLAMIZAR	13481520	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
83	YOMEL FERNANDEZ	6202934	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
84	JUAN CARLOS GALINDO	1116791522	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
85	CARLOS ALBERTO GONZALES	C1051747361	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
86	TAILER RODRIGUEZ	1002423994	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
87	JOSE HUMBERTO BELEÑO	1049894465	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
88	ARLEY CONTRERAS	1007381932	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
89	CIRO ALFONSO BUENO	5440926	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
90	ORLANDO MARQUEZ SANDOVAL	88168729	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
91	WILFREDO FLOREZ	1094779285	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
92	MANUEL FLOREZ	88168156	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00
93	JOSE FLOREZ	88168781	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00

Días del Mes

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13																							X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17														X	X	X	X	X	X	X	X	X									
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
47	X																														
48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	X	X																													
85										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,0696	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
2	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.200.000	$ 0,0696	V	NUEVA EPS		$ 88.000	PORVENIR	0	$ 88.000	$ 13.200			
3	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,0696	v	COMPENSAR		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
4	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	v	NUEVA EPS		$ 60.000	COLFONDOS	0	$ 60.000	$ 9.000			RETIRO DE TRABAJADOR 30/8/2024
5	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,0696	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
6	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
7	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.900.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 76.000	PORVENIR	0	$ 76.000	$ 11.400			
8	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
9	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
10	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.200.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 88.000	PORVENIR	0	$ 88.000	$ 13.200			
11	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
12	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
13	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO COMO INDEPENDIENTE 23/8/2024
14	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,07	V	PORVENIR		$ 72.000	NUEVA EPS	0	$ 72.000	$ 10.800			
15	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 100.000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	$ 100.000	$ 15.000			
16	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 60.000,00	PROTECCION	0	$ 60.000	$ 9.000			
17	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 60.000	PROTECCION	0	$ 60.000	$ 9.000			RETIRO EL 22/8/2024
18	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,01	I	NUEVA EPS		$ 72.000	PORVENIR	0	$ 72.000	$ 10.800			
19	Union Temporal Edivial-Troja 2591	$ 2.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 100.000	PORVENIR	0	$ 100.000	$ 15.000			
20	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,01	I	COOSALUD		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
21	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
22	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000	$ 0,01	I	SANITAS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 80.000	$ 12.000			
23	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 3.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 132.000	PROTECCION	0	$ 132.000	$ 19.800			
24	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.200.000	$ 0,07	V	COMPENSAR		$ 88.000	COLPENSIONES	0	$ 88.000	$ 13.200			
25	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
26	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
27	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
28	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
29	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.600.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 64.000	PORVENIR	0	$ 64.000	$ 9.600			
30	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
31	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
32	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.500.000	$ 0,01	I	SANITAS		$ 100.000	PORVENIR	0	$ 100.000	$ 15.000			
33	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
34	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 72.000	PORVENIR	0	$ 72.000	$ 10.800			
35	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	PORVENIR		$ 52.000	SANITAS	0	$ 52.000	$ 7.800			
36	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO
37	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
38	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
39	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
40	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
41	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SALUDTOTAL		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
42	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
43	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
44	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/8/2024
45	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/8/2024
46	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 14/8/2024
47	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 01/08/2024
48	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/8/2024
49	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/8/2024
50	CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/8/2024
51	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
52	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
53	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
54	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
55	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
56	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
57	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
58	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
59	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,070	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
60	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,070	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
61	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,070	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO
62	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
63	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO
64	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
65	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
66	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
67	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
68	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
69	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
70	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
71	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
72	EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
73	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
74	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
75	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
76	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
77	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
78	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
79	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
80	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
81	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
82	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMPESER		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
83	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V			$ 52.000		0	$ 52.000	$ 7.800			
84	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 2/08/2024
85	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
86	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
87	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
88	JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
89	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
90	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 24/08/2024
91	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
92	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 17/08/2024
93	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 18/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**		
		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

94	DANIEL COBOS	1092154012	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 18/08/2024
95	JOSE VEGA	1092154858	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
96	KEVIN ACEVEDO	1099735198	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V		$ 52.000		0	$ 52.000	$ 7.800			
97	FRANKLIN COBOS	1193528907	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
98	OMARR ALEXIS IBARRA CRISTANCHO	C1092156234	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/08/2024
99	JOSE TOBIAS ARAQUE	C1963182	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 15/08/2024
100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	C1094859029	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 19/08/2024
101	CARDENAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	C1090479342	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIRO ALFONSO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
102	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	88167804	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
103	RODOLFO RODRUIGUEZ	1094533183	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
104	SERGIO BOTELLO DURAN	1094533180	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
105	JOSE ASCENCION CRUZ GRIMALDOS	13411827	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
106	JOSE ABELARDO HINESTROZA MENDOZA	1092155483	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
107	JUAN CARLOS IBARRA RODRIGUEZ	88168951	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
108	RAMON ALEXI IBARRA MENDOZA	1094533562	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
109	FREDY LABERTO VEGA CONTRERAS	1092644479	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO EL 01/08/2024
110	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	1092157554	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
111	LUIS ANDELFO VEGA SALAZAR	1004896992	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
112	PEDRO ALEXIS SANCHEZ	1092156588	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
113	LUIS ALFREDO HINESTROZA	1092154860	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
114	BRENDA ROCIO CRUZ	1092647055	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRENDA CRUZ	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
115	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	1094242516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
116	CESAR GABRIEL LAGUADO	1004941387	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			SE RETIRO EL 10/08/2024
117	JOSE RICARDO LAGUADO LAGUADO	88179263	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
118	HUGO RAMON PEÑALOZA	1004941337	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
119	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABÓN	1004941319	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
120	JOSE NICASIO VILLAMIZAR LAGUADO	13411728	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COOSALUD	$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
121	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	1092646678	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMPENSAR	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
122	HEYSON CONTRERAS CRUZ	1004941117	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE	$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
123	ERINSON FABIAN GARCIA PARADA	1093884815	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERINSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS	$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

para el presente formato no se adjunta el numero de la planilla,ya que no se ha cancelado la planilla de seguridad social

El contratista adjunta la certificación de fecha .... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre:

Director de Obra Willian Quintero Pabon.

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 11/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.159.028.732,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 886.753.127,50
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 6.045.781.859,50
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	4004
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	33444,82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	22
	Gavion	m3	40,98

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	27,6	4004
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformacion	m2	0	33444,82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	0	22
	Gavion	m3	40,98	40,98

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5.040.831.650,00		$ 5.040.831.650,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391.912,00		$ 50.391.912,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 52.777.454,00	10.027.716,00	$ 62.805.170,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
VALOR A RECONOCER CON REAJUSTE DE PRECIOS, PARA ACTUALIZAR LAS CONDICIONES EXONOMICAS DEL CONTRATO.	$ 886.753.127,50		$ 886.753.127,50
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.035.754.143,50	$ 10.027.716,00	**$ 6.045.781.859,50**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 186.181.580,26		$ 186.181.580,26	$ 5.978.031.089,73
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 59.664.911,50
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				
VALOR EJECUTADO			$ 186.181.580,26	**$ 6.037.696.001,23**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 6.045.781.859,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 6.037.696.001,23
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **99,87%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICACION DE OBRAS EJECUTADAS



VISTA GENERAL PLACA HUELLA TERMINADA TRAMO NO2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO No. 2332 de 2023 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg	La Garita - La Mutis		A			A	A																									
Motoniveladores			La Garita - La Mutis																															
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg	La Garita - La Mutis		A			A	A																									
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg	La Garita - La Mutis																															
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg	La Garita - La Mutis																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	5	0		5	5		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	5	0		5	5		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	15	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	8220	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.		INVIAS Y MUNICIPIO	2332 DE 2022	$ 5.159.028.732	
2024	2599	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	Otro si modificatorio No1 Contrato No 2332 de 2022	$ 886.753.127,50	
			TOTAL			$ 6.045.781.859,50	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 6.045.781.859,50**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	$ 1.029.127.853,68						$ 5.016.654.006				
2	PARCIAL	19/06/2024	$ 3.731.818.889	$ -	$ 3.731.818.889,34						$ 1.284.835.116				
3	PARCIAL	16/08/2024	$ 982.708.961	$ -	$ 982.708.960,85						$ 302.126.156				
TOTALES			**$5.735.105.703,87**	**$8.550.000,00**	**$ 5.743.655.703,87**					**$ -**	**302.126.155,63**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 5.690.105.703,87		$ 5.690.105.703,87
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 45.000.000,00	$ 8.550.000,00	$ 53.550.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 5.735.105.703,87	$ 8.550.000,00	**$ 5.743.655.703,87**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15/07/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,29%	SI	
					2	≥ 95%	95,98%	SI	
					3	≥ 95%	95,22%	SI	
					4	≥ 95%	97,41%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	16/08/2024	BORDILLO Y CUNETAS PR2+765 TRAMO No5 VEREDA LA GARITA - LA MUTIS	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3169 PSI	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 12 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 6 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28 12 2022	28 6 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	5	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA N° 02332 DE 2022 por ajuste de precios se incrementa el valor asegurado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

FECHA DE INICIO: 11/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **9/06/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato orinicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATC 11/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 5.159.028.732,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 5.159.028.732,00

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS (En meses según las anómosas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
					0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Construccion Placa Huella	$ 5.457.655,55	90,27%		% P																$ 4.418.910,80	$ 452.608,17	$ 514.784,29
				$ P																80,97%	8,29%	9,43%
				$ E																		
				% E																		
Construccion Muros en Gavion	$ 13.860,96	0,23%		% P																$ 1.888,99	$ 7.022,48	$ 5.777,98
				$ P																20,84%	62,11%	41,69%
				$ E																		
				% E																		
Construccion Alcantarillas	$ 452.840,49	7,49%		% P																$ 416.294,90	0,00	$ 46.142,28
				$ P																91,71%		10,19%
				$ E																		
				% E																		
Transporte		0,00%		% P																$ 1.230,25	0,00	$ 12.352,45
				$ P																#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
				$ E																		
				% E																		
Señalizacion y seguridad	$ 5.893,94	0,10%		% P																	0,00	$ 2.619,53
				$ P																0,00%		44%
				$ E																		
				% E																		
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,79%		% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.977.976,69**	**98,88%**	**0,00%**																			
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ -**																			

Reprogramación No.1 · Reprogramación No.2 · Reprogramación No.3 · Reprogramación No.4

100% · 50% · 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																			**81,98%**	**8,05%**	**9,97%**
	VALOR (Miles de Pesos)																			4.956.368,92	486.436,18	602.976,76
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																			**81,98%**	**90,03%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)																			4.956.368,92	5.442.805,10	**$ 6.045.781,86**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																					
	VALOR (Miles de Pesos)																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																					
	VALOR (Miles de Pesos)																					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIO N
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		
	$ 10.027,72		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 67.805,17		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 67.805,17		
VALOR A RECONOCER CON REAJUSTE DE PRECIOS PARA ACTUALIZAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.	$ 886.753,13		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 6.045.781,86**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ -**	**0,00%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia,
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: ANDREA FÁJARDO CORREDOR
Reoresentante Legal
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275540 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 5.159.028.732,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 5.159.028.732,00

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 11	MES 11	MES 11	MES 11	MES 11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos (AJUSTE DE PRECIOS)	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Construccion Placa Huella	$ 4.582.497,90	88,82%	91,30%	% P																96,43%	9,88%	13,25%
	$ 5.457.655,55	90,27%	$ 5.457.655,55	$ P																$ 4.608.319	$ 755.912,85	$ 128.823,70
				% E																100,56%	15,72%	
Construccion Muros en Gavion	$ 10.661,64	0,21%	0,23%	% P																$ 2.886,99	$ 2.222,48	$ 5.777,98
	$ 13.860,96	0,23%	$ 13.860,96	$ P																27,10%	67,74%	54,19%
				$ E																		$ 13.860,96
				% E																		
Construccion Alcantarillas	$ 388.039,95	7,52%	7,58%	% P																$ 416.291,90	0,00	$ 46.142,29
	$ 452.840,49	7,49%	$ 452.894,89	$ P																107,02%		11,89%
				$ E																$ 415.291,90		$ 37.602,98
				% E																107,02%		
Transporte	$ 9.536,62	0,18%	0,00%	% P																$ 1.238,25	0,00	$ 12.362,45
		0,00%	$ 0,00	$ P																12,95%		129,53%
				$ E																		
				% E																		
Señalizacion y seguridad	$ 2.369,74	0,05%	0,00%	% P																	0,00	$ 2.619,53
	$ 5.893,94	0,10%	$ 0,00	$ P																0,00%		111%
				$ E																		
				% E																		
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%	0,80%	% P																		
	$ 47.725,75	0,79%	$ 47.725,75	$ P																$ 47.725,75		
				$ E																		
				% E																100,00%		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.040.831,60**	**97,71%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 5.977.976,69**	**98,88%**																				

Programación

Reprogramación No.1 Reprogramación No.2 Reprogramación No.3

100% 50% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El orcentaie prooramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP v el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																			**96,07%**	**8,05%**	**9,93%**
	VALOR (Miles de Pesos)																			4.956.368,92	486.436,18	600.351,42
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																			**81,98%**	**90,03%**	**99,96%**
	VALOR (Miles de Pesos)																			4.956.368,92	5.442.805,10	6.043.156,52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																			**99,46%**	**-2,67%**	**2,98%**
	VALOR (Miles de Pesos)																			5.131.001,57	720.512,85	180.287,64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																			**99,46%**	**96,79%**	**99,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)																			5.131.001,57	5.851.514,42	**$ 6.031.802,06**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391,91	$ -	%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45	$ 50.138,58	%
	$ 52.777,45		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00		%
	$ 5.000,00		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.027,72	$ 9.526,33	%
	$ 10.027,72		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.197,08	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 67.805,17		
VALOR A RECONOCER CON REAJUSTE DE PRECIOS PARA ACTUALIZAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.159.028,68**	**$ 6.031.802,06**	**99,77%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 6.045.781,86**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407
PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 2/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/05/2024
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.499.989.139,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2024
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1692
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Batea		
	Alcantarillas	und	8
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	m	97	1692
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	0	8
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.499.989.139,00		$ 2.499.989.139,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.499.989.139,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.150.142.345,67		$ 2.150.142.345,67	$ 2.150.142.345,67
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.369.428,87	$ 1.970.191,49	$ 12.339.620,36	$ 12.339.620,36
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2.162.481.966,03**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.499.989.139,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.162.481.966,03
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 86,50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 28
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **28**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA TRAMO 3



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA TRAMO 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA			TRAMO 3	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	I							
VIBRADOR DE CONCRETO			TRAMO 3	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	I							
VOLQUETA 1			TRAMO 3	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A							
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
TOTAL ACTIVO															1	1	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3							
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL INACTIVO																2	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0							

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	26	36%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	11	15%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		NACION	Contrato Principal	$ 2.499.989.139	
			TOTAL			$ 2.499.989.139	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.499.989.139,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO* AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE 2023	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 1.234.699.282	$ 1.234.699.282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584.690.712	$ -	$ 584.690.712	$ -	$ 584.690.712	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 650.008.570	$ 650.008.570				
3	OBRA	FEBRERO 2024	$ 400.009.562	$ -	$ 400.009.562	$ -	$ 400.009.562	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 249.999.008	$ 249.999.008				
TOTALES			**$2.249.990.131,00**	**$0,00**	**$ 2.249.990.131**					**$ 249.999.008**	**$ 249.999.008**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.249.990.131,00		$ 2.249.990.131,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL			**$ 2.249.990.131,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	22	24	24	20	24	21	24	20	24	21	22	24	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24								555
Lluvias moderadas			2			4		3		4		3	2							2	0											20
Lluvias intensas																					1											1
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24								

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	70%	78,30%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	80%	85,90%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	19/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	100%	149,30%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
4	13/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	70%	161,30%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
5	20/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	80%	174,80%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	70%	134,56%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	19/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	80%	144,95%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	16/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	70%	193,22%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
4	23/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	80%	204,30%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 270.000.000,00	2 5 2023	20 1 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 135.000.000,00	2 5 2023	20 9 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 270.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29 12 22	20 9 24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**


Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **19/04/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ x NO ____ APROBADO: SI ____ x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN			1
PÁGINA			

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CO1.PCONTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA OBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 490,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/06/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.499.989.139,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 may-24	10 jun-24	11 jul-24	12 ago-24	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2.429.407.588,24	90,88%	88,17%	% P	5,05%	14,44%	16,03%	17,20%	9,82%	11,67%	8,00%	2,08%	0,00%	0,00%	3,52%	3,97%	%
		87,81%	$2.356.933.745,00	$ P	$135.070.161,00	$385.946.298,00	$428.532.109,00	$459.877.284,00	$262.548.543,00	$311.986.265,00	$213.840.184,00	$55.662.088,99			$93.974.639,00	$106.092.222,99	
				$ E	$44.842.560,00	$244.825.171,00	$407.397.138,00	$561.806.335,00	$129.769.133,00	$382.172.959,00	$245.590.153,00	$155.383.477,00		$37.705.598,00	$147.441.221,00	$131.494.594,00	
				% E	1,68%	9,16%	15,24%	21,02%	4,85%	14,30%	9,19%	5,81%	0,00%	1,41%	5,52%		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND	$173.558.176,76	6,49%	2,02%	% P	0,00%	0,22%	2,01%	0,77%	0,00%	2,09%	0,74%	0,22%					
				$ P	$0,00	$5.751.578,00	$53.776.265,00	$20.546.433,00	$0,00	$55.800.690,00	$19.679.383,00	$22.042.041,00					
		6,65%	$207.070.501,00	$ E				$53.963.922,00	$15.177.555,00	$40.553.247,00	$6.323.145,00	$45.526.316,00	$45.526.316,00				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	2,02%	0,57%	1,52%	0,24%	1,70%	1,70%				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (0) UND	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
		0,00%	$0,00	$ E													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2.796.016,00	0,10%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,07%	0,03%					
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.864.010,67	$932.005,33					
		0,10%	$2.796.016,00	$ E								$2.796.016,00					
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%					
ITEM'S NO PREVISTOS	$67.494.983,00	2,52%	2,52%	% P	0,84%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	$22.498.328,00	$44.996.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
		2,52%	$67.494.983,00	$ E	$22.498.328,00	$44.996.655,00											
				% E	0,84%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					%
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 2.673.256.764,00	97,09%	92,71%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5,89%	16,34%	18,04%	17,97%	9,82%	13,76%	8,81%	2,94%	0,00%	0,00%	3,52%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$157.568.489,00	$436.694.531,00	$482.308.374,00	$480.423.717,00	$262.548.543,00	$367.786.955,00	$235.583.577,67	$78.636.115,32	$0,00	$0,00	$93.974.639,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,89%	22,23%	40,27%	58,24%	68,06%	81,82%	90,64%	93,58%	93,58%	93,58%	97,09%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$157.568.489,00	$594.263.020,00	$1.076.571.394,00	$1.556.995.111,00	$1.819.543.654,00	$2.187.330.609,00	$2.422.914.186,67	$2.501.550.301,99	$2.501.550.301,99	$2.501.550.301,99	$2.595.524.940,99	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,52%	10,84%	15,24%	23,03%	5,42%	15,81%	9,42%	7,62%	1,70%	1,41%	5,52%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$67.340.888,00	$289.821.826,00	$407.397.138,00	$615.770.257,00	$144.946.688,00	$422.726.206,00	$251.913.298,00	$203.705.809,00	$45.526.316,00	$37.705.598,00	$147.441.221,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,52%	13,36%	28,60%	51,63%	57,06%	72,87%	82,29%	89,91%	91,62%	93,03%	98,54%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$67.340.888,00	$357.162.714,00	$764.559.852,00	$1.380.330.109,00	$1.525.276.797,00	$1.948.003.003,00	$2.199.916.301,00	$2.403.622.110,00	$2.449.148.426,00	$2.486.854.024,00	$2.634.295.245,00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS				

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Luis Javier Carrascal — Representante legal o apoderado del Contratista — Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma: Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: N/A — Titular Gerencia: N/A — Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma — Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO — Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND — ORDENADOR DEL PAGO — Fecha de Firma:

Revisó Firma: Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Director Territorial — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 27/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.499.989.139,00

PLAZO ACUMULADO: 480,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/06/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 may-24	10 jun-24	11 jul-24	12 ago-24
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2.229.396.727,24	90,14%	100,61%	% P	5,46%	15,60%	17,33%	18,59%	10,62%	12,61%	8,65%	2,25%	0,00%	0,99%	5,60%	2,29%
		99,20%	$2.488.426.339,00	$ P	$135.070.161,00	$385.946.298,00	$428.532.109,00	$459.877.284,00	$262.548.543,00	$311.986.265,00	$213.840.184,00	$55.662.069,89			$93.974.639,00	$106.036.222,00
				$ E	$44.842.560,00	$244.826.171,00	$407.397.138,00	$561.806.335,00	$129.769.133,00	$382.172.959,00	$245.690.153,00	$155.383.477,00		$37.705.598,00	$147.441.221,00	$131.494.594,00
				% E	1,81%	9,90%	16,47%	22,72%	5,25%	15,45%	9,93%	6,28%	0,00%	1,52%	5,96%	5,32%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND	$173.558.176,76	7,02%	2,18%	% P	0,00%	0,23%	2,17%	0,83%	0,00%	2,26%	0,80%	0,89%				
		7,19%	$207.070.301,00	$ P	$0,00	$5.751.578,00	$53.776.265,00	$20.546.433,00	$0,00	$55.800.690,00	$19.879.383,00	$22.042.041,00				
				$ E				$53.963.922,00	$15.177.555,00	$40.553.247,00	$6.323.145,00	$45.526.316,00	$45.526.316,00			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	2,18%	0,61%	1,64%	0,26%	1,84%	1,84%			
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (0) UND	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		0,00%	$0,00	$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
				$ E												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2.796.016,00	0,11%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%				
		0,11%	$2.796.016,00	$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.864.010,67	$932.005,33				
				$ E								$2.796.016,00				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%				
ITEM'S NO PREVISTOS	$67.494.983,00	2,73%	2,73%	% P	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		2,73%	$67.494.983,00	$ P	$22.498.328,00	$44.996.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
				$ E	$22.498.328,00	$44.996.655,00										
				% E	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.473.245.903,00**	**109,23%**	**105,52%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**6,37%**	**17,66%**	**19,50%**	**19,42%**	**10,62%**	**14,87%**	**9,53%**	**3,18%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$157.568.489,00**	**$436.694.531,00**	**$482.308.374,00**	**$480.423.717,00**	**$262.548.543,00**	**$367.786.955,00**	**$235.583.577,67**	**$78.636.115,32**	**$0,00**	**$0,00**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**6,37%**	**24,03%**	**43,53%**	**62,95%**	**73,57%**	**88,44%**	**97,96%**	**101,14%**	**101,14%**	**101,14%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$157.568.489,00**	**$594.263.020,00**	**$1.076.571.394,00**	**$1.556.995.111,00**	**$1.819.543.654,00**	**$2.187.330.609,00**	**$2.422.914.186,67**	**$2.501.550.301,99**	**$2.501.550.301,99**	**$2.501.550.301,99**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**2,72%**	**11,72%**	**16,47%**	**24,90%**	**5,86%**	**17,09%**	**10,19%**	**8,24%**	**1,84%**	**1,52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$67.340.888,00**	**$289.821.826,00**	**$407.397.138,00**	**$615.770.257,00**	**$144.946.688,00**	**$422.726.206,00**	**$251.913.298,00**	**$203.705.809,00**	**$45.526.316,00**	**$37.705.598,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**2,72%**	**11,72%**	**16,47%**	**24,90%**	**5,86%**	**17,09%**	**10,19%**	**8,24%**	**1,84%**	**1,52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$67.340.888,00**	**$357.162.714,00**	**$764.559.852,00**	**$1.380.330.109,00**	**$1.525.276.797,00**	**$1.948.003.003,00**	**$2.199.916.301,00**	**$2.403.622.110,00**	**$2.449.148.426,00**	**$2.486.854.024,00**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')		$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30
VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 2 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**
Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7/11/2023	7/6/2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **460-74-994000006724** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	7	2	2024	27	2	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **40-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7/11/2023	7/6/2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAYO RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-067-2023 **PLAZO INICIAL:** 3 MESES

FECHA DE INICIO: 21/02/2024 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 749.903.341,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 5/08/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	384,5
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo	m2	14387
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml		385
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo	m2		14387
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	0	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 749.903.341,00		$ 749.903.341,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 749.903.341,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 516.189.373,44		$ 516.189.373,44	$ 516.189.373,44
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24.302.635,29	$ 4.617.500,71	$ 28.920.136,00	$ 28.920.136,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 545.109.509,44**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 749.903.341,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 545.109.509,44

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 72,69%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 22

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **25**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE PLACA HUELLA TRAMO 1



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos - La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			**TRAMO 2**	A																												
PULIDORA			**TRAMO 2**	A																												
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	2																												
			TOTAL ACTIVO	2																												
			TOTAL EN REPARACIÓN	0																												
			TOTAL INACTIVO	0																												

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN PACHECO POSADA
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1210370568193 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SATANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-067-2023 DEL 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	164	2.3.2.02.02.009.32		NACION	CD-FC-067-2023 DEL 2023	$ 729.524.346	$ 729.524.346
		2.3.2.02.02.009.60		NACION	CD-FC-067-2023 DEL 2023	$ 20.426.682	$ 20.426.682
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 749.951.027,69**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									164 DEL 2023	$ 749.951.028	$ 749.951.028				CONTRATO PRINCIPAL
1	PARCIAL	ABRIL	$ 413.609.505	$ 1.356.305,12	$ 414.965.810,12				164 DEL 2023	$ 334.985.218	$ 334.985.218				PRESENTE TRAMITE
TOTALES			**$ 413.609.505**	**$ 1.356.305**	**$ 414.965.810**										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 720.983.205		**$ 720.983.205**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)			
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	$ 7.138.448	$ 1.356.305,12	**$ 8.494.753**
GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP) 2,8%	$ 20.425.383		**$ 20.425.383**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 749.903.341**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24																											120
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El contrato de obra finalizó el 05 de agosto de 2024

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN PACHECO POSADA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1210370568193 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1									
2									
3									
4									
5									
6									

OBSERVACIONES:

El contrato de obra finalizó el 05 de agosto de 2024

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS MARIO PACHECO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 4,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00

VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 260.000.000,00	16	11	23	21	5	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/02/204**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	7	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 224.971.002,00	24	5	2024	5	7	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

OBSERVACIONES:

El contrato de obra finalizó el 05 de agosto de 2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 21/02/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 5/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **17/04/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _
No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS MARIO PACHECO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CO-FC-067-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 749.903.341,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 749.903.341,00

PLAZO ACUMULADO: 166,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ABRIL	2 MAYO	3 JUNIO	4 JULIO	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$ 601.450.300,04	84,25%	18,72%	% P	3,24%	10,44%	12,47%								%
	$ 601.450.300,04	26,14%	$ 186.592.164,48	$ P	$ 23.116.018,28	$ 74.490.320,09	$ 88.985.826,11	$ 133.478.739,16							
			$ 430.729.583,35	$ E	$ 244.051.534,00	$ 115.619.666,81	$ 71.058.382,54	$ 138.317.340,42							
				% E	10,61%	5,02%	3,09%								
COSNTRUCCION D EALCANTARILLAS	$ 50.898.246,00	7,13%	3,51%	% P	0,77%	0,00%									
	$ 50.898.246,00	0,77%	$ 5.504.683,47	$ P	$ 5.504.683,47	$ -									
			$ 25.090.220,45	$ E	$ 24.179.807,65	$ 910.412,80									
				% E	3,39%	0,13%									
TRANSPORTE	$ 18.530.463,00	2,60%	0,00%	% P				-							
	$ 18.530.463,00	0,00%	$ 31.367.164,04	$ P	$ 5.559.139,04	$ -	$ 25.808.025,00								
			$ 18.530.465,15	$ E		$ 18.530.465,15									
				% E											
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$ 5.035.849,00	0,71%	0,00%	% P											
	$ 5.035.849,00	0,00%	$ -	$ P				$ 5.035.849,00							
			$0	$ E				$ 5.035.850,00							
				% E											
CONFORMACION D ELA CLAZADA EXISTENTE	$ 37.935.266,00	5,31%	5,86%	% P	4,79%										
	$ 37.935.266,00	4,79%	$ 34.179.840,78	$ P	$ 34.179.840,78										%
			$ 41.839.104,45	$ E	$ 41.839.104,45										
				% E	5,86%										
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 713.850.124,04**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 713.850.124,04**	**32%**	**$ 0,28**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**8,80%**	**10,44%**	**12,47%**	**0,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 68.359.681,57**	**$ 74.490.320,09**	**$ 114.793.851,11**	**$ 138.514.588,16**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**8,80%**	**19,23%**	**31,70%**	**31,70%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 68.359.681,57**	**$ 142.850.001,66**	**$ 257.643.852,77**	**$ 396.158.440,93**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**19,85%**	**5,15%**	**3,09%**	**0,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 310.070.446,10**	**$ 135.060.544,76**	**$ 71.058.382,54**	**$ 143.353.190,42**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**19,85%**	**25,01%**	**28,10%**	**28,10%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 310.070.446,10**	**$ 445.130.990,86**	**$ 516.189.373,40**	**$ 659.542.563,82**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
El contrato de obra finalizó el 05 de agosto de 2024

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-067-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 166,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 749.903.341,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 749.903.341,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ABRIL	2 MAYO	3 JUNIO	4 JULIO	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$ 601.450.300,04	84,25%	50,38%	% P	3,24%	10,44%	0,00%							
	$ 601.450.300,04	13,67%	$ 186.592.164,48	$ P	$ 23.116.018,28	$ 74.490.320,09	$ 88.985.826,11	$ 133.478.738,12						
			$ 430.729.884,00	$ E	$ 244.051.534,00	$ 115.619.967,00	$ 71.058.383,00	$ 138.317.249,42						
				% E	34,19%	16,20%								
COSNTRUCCION DE ALCANTARILLAS	$ 50.898.246,00	7,13%	3,51%	% P	0,77%	0,00%								
	$ 50.898.246,00	0,77%	$ 5.504.683,47	$ P	$5.504.683	$0								
			$ 25.090.220,45	$ E	$24.179.808	$910.413								
				% E	3,39%	0,13%								
TRANSPORTE	$ 18.530.463,00	2,60%	0,00%	% P										
	$ 18.530.463,00	0,00%	$ 31.367.164,04	$ P	$ 5.559.139,04		$ 25.808.025,00							
			$ 18.530.465,15	$ E		$ 18.530.465,15								
				% E										
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$ 5.035.849,00	0,71%	0,00%	% P										
	$ 5.035.849,00	0,00%	$ -	$ P				$ 5.035.849,00						
			$ -	$ E				$ 5.035.850,00						
				% E										
CONFORMACION D ELA CLAZADA EXISTENTE	$ 37.935.266,00	5,31%	5,86%	% P	5,31%									
	$ 37.935.266,00	5,31%	$ 37.935.265,81	$ P	$ 37.935.265,81									
			$ 41.839.104,45	$ E	$ 41.839.104,45									
				% E	5,86%									
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 713.850.124,04	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 713.850.124,04**	20%												

%

%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**9,32%**	**10,44%**	**0,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 72.115.106,60**	**$ 74.490.320,09**	**$ 114.793.851,11**							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9,32%**	**19,76%**	**19,76%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 72.115.106,60**	**$ 146.605.426,69**	**$ 261.399.277,80**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**43,44%**	**16,32%**	**0,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 310.070.446,10**	**$ 135.060.844,95**	**$ 71.058.383,00**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**43,44%**	**59,76%**	**59,76%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 310.070.446,10**	**$ 445.131.291,05**	**$ 516.189.674,05**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.216.911,63

VALOR ACUMULADO: $ 620.216.911,63
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 81.081.861,60	4/7/2023	10/9/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 81.081.861,60	4/7/2023	10/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 81.081.861,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22/4/2024	6/6/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000067697 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (45 días), a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **6/05/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:WILFRAN RODRIGO REL SOTO
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 MUNICIPIO DE CUCUTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **17/04/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre:
Director de la Obra YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: RANDY MARCELA SOTO PEREZ
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:54202-365909



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-054-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO PICA PICA,, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 22/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,07

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 620.245.837,49
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 620.245.837,49
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	301
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16699,6
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	150	301
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	16699,6
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 596.325.964,99		$ 596.325.964,99
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1.121.801,00		$ 1.121.801,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.904.217,00	1.121.801,23	$ 5.904.217,77
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
VALOR GISAP	$ 16.893.855,49	0,00	$ 16.893.855,49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 620.245.838,48**	$ 1.121.801,23	**$ 620.245.839,25**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

$ 621.367.639,71

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 596.325.954,99		$ 596.325.954,99	$ 596.325.954,99
AJUSTES				$ 1.121.801,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.904.217,00	$ 1.121.801,23	$ 7.026.018,23	$ 5.904.217,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ 16.893.855,49		$ -	$ 16.893.855,49
VALOR EJECUTADO	$ 619.124.027,48		$ 603.351.973,22	**$ 620.245.828,48**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 596.325.964,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 596.325.954,99
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL PARAMO -PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION PLACA HUELLA



UBICACIÓN: CORREDOR VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TERMINADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	0	4	2	3	4	0	3	0	3	3	3
TOTAL ACTIVO				0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	3	3	4	0	0	4	2	3	4	0	3	0	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	38	41%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	55	59%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre_CRISTIAN CAMILO PRECIADO PALACIOS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202-230246 NTS

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-054-2023

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 620.245.837	
			TOTAL			$ 620.245.837	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 620.245.837**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ACTA PARCIAL No 1	jul-24			$ -	NA0	NA	NA		NA	NA				
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 596.325.964,99		$ 596.325.964,99
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 1.121.801,00		$ 1.121.801,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.904.217,00	$ 1.121.801,23	$ 5.904.217,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP	$ 16.893.855,49		$ 16.893.855,49
VALOR TOTAL	$ 620.245.838,48	$ 1.121.801,23	**$ 620.245.838,48**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CONTRATISTA

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	2	3	**4**	**5**	6	**7**	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**	20	21	22	23	24	**25**	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	24	20	19	**22**	21	21	**24**	17	18	18	**21**	24	24	24	24	20	18	**24**	**24**	24	19	20	19	19	**24**	24	20	24	19	19	21	659
Lluvias moderadas	0	2	3	**2**	1	1	**0**	4	4	2	**3**	0	0	0	0	2	4	**0**	**0**	0	2	3	4	3	**0**	0	2	0	3	3	2	50
Lluvias intensas	0	2	2	**0**	2	2	**0**	3	2	4	**0**	0	0	0	0	2	2	**0**	**0**	0	3	1	1	2	**0**	0	2	0	2	2	1	35
Total horas	24	24	24	**24**	24	24	**24**	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	24	**24**	**24**	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre CRISTIAN CAMILO PRECIADO PALACIOS
Residente de Obra
Matricula Profesional No.54202-230246 NTS



Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSOSRIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	12/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-414-13	SEGUNDO TRAMO	3	2000Psi alos 7 dias-2700 Psi a los 14 dias	2010 psI alos 7 dias 2750 a los 14 dias	SI	
2	15/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-414-13	PRIMER TRMO	3	2000Psi alos 7 dias-2700 Psi a los 14 dias	2013 alos 7 dias 2830 a los 14 dias	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CONTRATISTA



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: JOSE ERENESTO RICO OSORIO

FECHA DE INICIO: 22/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 22/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ---

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: --- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ---

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: --- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ---

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI X NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ---

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ---

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre:CRITIAN CAMILO PRECIADO PALACIOS
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:54202-230246 NTS



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: CD-FC-054-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 620.245.837,49 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 620.245.837,49

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 jun-30	MES 2 jul-30	MES 3 ago-31						
Construcción Placa Huella	$ 451.334.825,00	73,61%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						100%
	$ 451.334.825,00	73,61%		$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Construcción Alcantarillas	$ 47.136.000,00	7,69%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ 47.136.000,00	7,69%		$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						50%
Transporte	$ 9.591.060,00	1,56%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ 9.591.060,00	1,56%		$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Señalización y seguridad	$ 5.651.840,00	0,92%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ 5.651.840,00	0,92%		$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 69.133.795,00	11,28%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ 69.133.795,00	11,28%		$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						0%
TOTAL OTROS ITEMS	$7.574.227	4,94%		% P									
	$7.574.227	4,94%		$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 590.421.747,00**	**100,00%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 590.421.747,00**	**100,00%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	96,14									
	596.325.964,99									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	96,14									
	596.325.964,99									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	10,91									
	67.665.846,76									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	96,14									
	596.325.964,99									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.492.630,00	$ 4.492.630,00	100,00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 4.492.630,00	$ 4.492.630,00	100,00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 853.600,00	$ 853.600,00	100,00%
	$ -		
GISAP	$ 12.854.851,24	$ 12.854.851,24	100,00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 22.693.711,24	$ 22.693.711,24	100,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 22.693.711,24		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 613.115.458,24**	**$ 613.115.458,24**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 613.115.458,24**	**$ 613.115.458,24**	

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado esta por debajo de 96,14 % vs 96,14% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente no se presenta un atraso del con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma: _____
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CONTRATISTA

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-082-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,10

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 527.697.300,22
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 527.697.300,22
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	280
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	13441,69
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	30	30
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	0
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 502.322.383,00		$ 502.322.383,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 954.497,49		$ 954.497,49
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.023.671,00		$ 5.023.671,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.023.671,00		$ 5.023.671,00
VALOR GISAP	$ 14.373.078,22	0,00	$ 14.373.078,22
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 527.697.300,71**	$ -	**$ 527.697.300,71**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 227.868.800,00		$ 227.868.800,00	$ 227.868.800,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954.497,49	$ 181.354,52	$ 1.135.852,01	$ 1.135.852,01
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 228.823.297,49	$ 181.354,52	$ 229.004.652,01	**$ 229.004.652,01**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 432.058.539,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 417.476.359,85
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-2,76%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA CONCRETO DE 21 Mpa, HUELLAS, CUNETA Y BORDILLO Y 14 Mpa, CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHO



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CONCRETO DE 21 Mpa, HUELLAS, CUNETA Y BORDILLO Y 14 Mpa, CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	**4**	5	6	**7**	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		HERRAN	I	A	A	**A**	A	A	**I**	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		HERRAN	I	A	A	**A**	A	A	**I**	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		HERRAN	I	A	A	**A**	A	A	**I**	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			HERRAN	I	A	A	**A**	A	A	**I**	A	A	A	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	50	40%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	74	60%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202- 271837 NTS

Firma

Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 527.697.300,2	
			TOTAL			$ 527.697.300,2	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 527.697.300**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 417.476.359,85		$ 417.476.359,85
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954.497,00	$ 181.354,43	$ 1.135.851,43
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 418.430.856,85	$ 181.354,43	**$ 418.612.211,28**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	2	**3**	**4**	5	6	**7**	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**	20	21	22	23	24	25	**26**	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	19	20	21	**19**	23	24	**18**	19	19	24	**18**	24	18	24	21	21	19	**24**	**19**	17	17	19	19	17	20	**20**	19	17	21	22	21	623
Lluvias moderadas	2	2	2	**3**	1	0	**3**	3	4	4	**3**	0	4	0	2	1	2	**0**	**3**	4	3	3	2	5	4	**2**	3	4	0	2	2	73
Lluvias intensas	3	0	1	**2**	0	0	**1**	2	1	0	**3**	0	2	0	1	2	3	**0**	**2**	3	4	2	3	2	0	**2**	2	3	3	0	1	48
Total horas	24	22	24	**24**	24	24	**22**	24	24	28	**24**	24	24	24	24	24	24	**24**	**24**	24	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Jhon Rivera Vargas

Firma
Nombre JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS
Residente de Obra
Matricula Profesional No 54202-271837 NTS

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	14/08/2024	ENSAYO DE DENSIDAD METODO CONO DE ARENA PARA SUBBASE KM 00.080	Inv. E-161-13-13	in situ	1	95%	97,00%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena
2	14/08/2024	ENSAYO DE DENSIDAD METODO CONO DE ARENA PARA SUBBASE KM 00.170	Inv. E-161-13-13	in situ	1	95%	98,00%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena
3	14/08/2024	ENSAYO DE DENSIDAD METODO CONO DE ARENA PARA SUBBASE KM 00.240	Inv. E-161-13-13	in situ	1	95%	96,00%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 14/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma
Nombre:LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-082-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 527.697.300,22 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 527.697.300,22

PLAZO ACUMULADO: _____ (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 / jun-30	MES 2 / jul-31	MES 3 / ago-31						
Construcción Placa Huella	$ 420.345.226,00	79,66%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						100%
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Construcción Alcantarillas	$ 43.863.795,00	8,31%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						50%
Transporte	$ 3.657.433,00	0,69%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Señalización y seguridad	$ 7.760.742,00	1,47%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0							
				% E	0,00%	0,00%							
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 26.695.187,00	5,06%		% P	0,00%	0,00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0,0	$0,0							
				% E	0,00%	0,00%							0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 502.322.383,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 502.322.383,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	20,14								
	106.259.202,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	81,88								
	432.058.539,80								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	43,18								
	227.868.800,00								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	79,11								
	417.476.359,85								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.023.671,00 / $ -	$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.023.671,00 / $ -	$ 3.516.569,70	70,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954.497,49	$ 668.148,24	70,00%
GISAP	$ 14.373.078,22 / $ -	$ 16.783.193,63	116,77%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 25.374.917,71	$ 20.967.911,57	82,63%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 25.374.917,71		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 527.697.300,71**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 527.697.300,71**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 81,88% vs 80,80% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un atraso del 1,06% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma: _____
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CON CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto de 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PLACA HUELLA UBICADA EN EL CORREDOR HERRÀN - LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER

CON CONTRATO DE INTERVETORIA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOM NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Laura Rios Duarte	1110528446	DIRECTOR OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	30833290	$ 52.000	COLPENSIONES	30833290	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
2	Jhon Alexander Rivera Vargas	1090405439	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	30833290	$ 52.000	PROTECCION	30833290	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
3	Luis Francisco Ortiz Leal	88306154	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 52.000	PORVENIR	30833290	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
4	Néstor Yohany Mogollón Chona	1148457223	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 52.000	PROVENIR	30833290	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
7	Sergio Chona Rozo	148456738	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	COLPENSIONES	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
	Daniel Alfonso Sarmiento	5455822	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	PORVENIR	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
	Silfredo Chona Rozo	1148456736	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	PORVENIR	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
	Yonan Fabian González Chona	1148959152	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	PORVENIR	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
8	Wilson Espinosa Contreras	1094508582	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	PORVENIR	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
9	Javier Andrés Camperos Chona	1094506920	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	COLPENSIONES	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
12	Iván Darío Camperos Delgado	5455537	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 910.000,00	$ 63.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 36.400	COLPENSIONES	30833290	$ 145.600	$ 36.400	$ -	$ -	RETIRADO
13	Jesús Alberto González	1148456964	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	NUEVA E.P.S	30833290	$ 39.900	COLPENSIONES	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
14	Omar Alberto Rozo Ochoa	5455728	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 996.667,00	$ 69.400,00	V	COMFAORIENTE	30833290	$ 39.900	PORVENIR	30833290	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
15	Álvaro Enrique Jaimes Torres	88033628	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MG INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	COMPENSAR	7930404033	$ 52.000	PORVENIR	7930404033	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
16	Pedro Yesid Meaury Blanco	1092361134	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MG INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	7930404033	$ 52.000	PORVENIR	7930404033	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
17	Gloria Márquez Salazar	60390105	PROFESIONAL SST	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	GLORIA MAQUEZ SALAZAR	$ 1.300.000,00	$ 31.900,00	III	NUEVA E.P.S	8631901988	$ 163.300	COLPENSIONES	8631901988	$ 209.000	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
18	Álvaro Rodríguez Castro	88251179	MAESTRO OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	9470734259	$ 162.500	COLPENSIONES	9470734259	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra LAURA RIOS DUARTE
Matrícula Profesional No.: 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-081-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 17/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,10

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 601.770.256,56
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 601.770.256,56
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	300
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16201,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	70	240
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	0
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 572.833.669,00		$ 572.833.669,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1.088.462,12		$ 1.088.462,12
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.728.748,00		$ 5.728.748,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.728.748,00		$ 5.728.748,00
VALOR GISAP	$ 16.390.629,44	0,00	$ 16.390.629,44
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 601.770.256,56**	$ -	**$ 601.770.256,56**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 514.072.891,74		$ 514.072.891,74	$ 514.072.891,74
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.088.462,12	$ 206.807,80	$ 1.295.269,92	$ 1.295.269,92
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 515.161.353,86	$ 206.807,80	$ 515.368.161,66	**$ 515.368.161,66**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 521.941.256,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 514.072.891,74
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-1,31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	31/08/2024
	(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 2 VEREDA LA ARADITA PARTE BAJA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION CONCRETO 21 Mpa Y 14 MpaCONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TRAMO 2



UBICACIÓN: TRAMO 2 VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDA:INSTALACION DE ACERO PLACA HUELLA TRAMO 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA-LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		MUTISCUA	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		MUTISCUA	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		MUTISCUA	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			MUTISCUA	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	4	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				4	4	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	96	42%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	40	42%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma_____
Nombre LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Residente de Obra
Matricula Profesional 70202-282878 TLM

Firma_____
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 601.770.256,6	
			TOTAL			$ 601.770.256,6	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 601.770.257**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 514.072.891,74		$ 514.072.891,74
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.080.462,00	$ 205.287,78	$ 1.285.749,78
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 515.153.353,74	$ 205.287,78	**$ 515.358.641,52**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**	20	**21**	22	23	24	**25**	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	20	21	20	19	21	19	21	20	19	20	20	24	18	21	19	20	19	**24**	**19**	21	20	20	18	21	**24**	22	19	20	22	20	20	631
Lluvias moderadas	2	2	3	3	1	2	2	4	3	2	3	0	4	3	2	2	2	**0**	**3**	3	2	4	3	1	**0**	0	3	4	2	3	2	70
Lluvias intensas	2	1	1	2	2	3	1	0	2	2	1	0	2	0	3	2	3	**0**	**2**	0	2	0	3	2	**0**	2	2	0	0	1	2	43
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**24**	**24**	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Residente de Obra
Matricula Profesional No 70202-282878 TLM

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	8/08/2024	Ensayo de densidad para subbase k0+050	Inv. E-161-13-13	in situ	1	95%	95,80%	SI	Ensayo densidad método cono de arena
2	8/08/2024	Ensayo de densidad para subbase k0+050	Inv. E-161-13-13	in situ	1	95%	100,00%	SI	Ensayo densidad método cono de arena
3	8/08/2024	Ensayo de densidad para subbase k0+050	Inv. E-161-13-13	in situ	1	95%	95,00%	SI	Ensayo densidad método cono de arena
1	10/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-414-13	HUELLA	3	21Mpa	1920 PSI 7 Dia-.2730 Psi 14 días	SI	
1	12/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-414-13	CONTRAHUELLA	3	14 Mpa	1540 7 DIAS- 2120 A LOS 14 DIAS	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA



Firma
Nombre: Jairo Andrés Quintero Gómez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 17/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ x

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma
Nombre:LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-081-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 601.770.256,56 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 601.770.256,56

PLAZO ACUMULADO: _____ (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES 1 / jun-24	MES 2 / jul-31	MES 3 / ago-24						
Construcción Placa Huella	$ 478.555.257,00	79,52%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						100%
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Construcción Alcantarillas	$ 48.434.266,00	8,05%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						50%
Transporte	$ 4.069.226,00	0,68%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Señalización y seguridad	$ 11.333.040,00	1,88%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 30.441.880,00	5,06%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 572.833.669,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 572.833.669,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	15,66									
	89.704.429,00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	86,73									
	521.941.453,36									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	31,07									
	177.959.011,00									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	85,43									
	514.072.891,74									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.728.748,00	$ -	0,00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.728.748,00	$ 4.010.123,60	70,00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.088.462,12	$ 761.923,48	70,00%
	$ -		
GISAP	$ 16.390.629,56	$ 16.783.193,63	102,40%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 28.936.587,68	$ 21.555.240,71	74,49%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 28.936.587,68		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 601.770.256,68**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 601.770.256,68**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 86,73% vs 85,43% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un atraso del 0,68,% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma: _____
Nombre: YENNY MIELNA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNID **UNIDAD EJECUTORA :** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CON **CONTRATO DE OBRA No:** CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** Sociedad Consorcio Construcciones y Vías del Norte SAS

MES **MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Agosto del 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA - LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER

CON **CONTRATO DE INTERVETORIA No:** 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOM **NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Laura Rios Duarte	1110528446	DIRECTOR OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	7939607026	$ 52.000	COLPENSIONES	7939607026	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
2	José Ariel Suarez Gamboa	5605393	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 52.000	PROTECCION	7939607026	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
3	Carlos Alberto Delgado Otalora	88259424	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	COMPENSAR	7939607026	$ 52.000	PORVENIR	7939607026	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
4	Leopoldo Mendoza García	13353119	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	7939607026	$ 52.000	COLPENSIONES	7939607026	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
7	Pablo Bautista Rodríguez	5463398	CELADOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 52.000	PROVENIR	7939607026	$ 208.000	$ 3.500	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
8	Wilson Orduz Villamizar	1094280194	AYUDANTE OBRA	$ 86.667,00	X	X																												SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 6.100,00	V	SANITAS	7939607026	$ 3.500	PORVENIR	7939607026	$ 13.900	$ 5.200	$ -	$ -	RETIRADO
9	Diomedes Flórez Rincón	1094247850	AYUDANTE OBRA	$ 130.000,00	X	X	X																											SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 130.000,00	V	SANITAS	7939607026	$ 5.200	PORVENIR	7939607026	$ 20.800	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRADO
12	Oscar Rozo Granados	1005061144	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 52.000	PORVENIR	7939607026	$ 208.000	$ 1.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
13	Robinson Amaya Figueroa	1005043614	OFICIAL OBRA	$ 43.334,00	X																													SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 1.800	PORVENIR	7939607026	$ 7.000	$ 36.400	$ -	$ -	RETIRADO
14	Edwin Alberto Contreras Villamizar	5463042	AYUDANTE OBRA	$ 910.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 910.000,00	$ 63.400,00	V	SANITAS	7939607026	$ 36.400	PORVENIR	7939607026	$ 145.600	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRADO
15	German Estiven Sánchez Solano	1094808162	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	COOSALUD	7939607026	$ 52.000	PORVENIR	7939607026	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
	Elkin Armando Mantilla Pinillos	1005060963	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 52.000	COLPENSIONES	7939607026	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
16	Breyner Duvan Mantilla Pinillos	1094282706	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 52.000	PORVENIR	7939607026	$ 208.000	$ 48.600	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
17	Edilson Yair Cañas Vera	1005060297	AYUDANTE OBRA	$ 1.213.334,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 84.500,00	V	SANITAS	7939607026	$ 48.600	COLPENSIONES	7939607026	$ 194.200	$ 48.600	$ -	$ -	RETIRADO
	Javier Hernández Vera	1005012473	AYUDANTE OBRA	$ 1.213.334,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 84.500,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 48.600	PORVENIR	7939607026	$ 194.200	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
18	Rubén Francisco Flórez	1094277873	AYUDANTE OBRA	$ 43.334,00	X																													SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7939607026	$ 1.800	PORVENIR	7939607026	$ 7.000	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRADO
	Arturo Sánchez Vera	17549062	MAESTRO OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARTURO SANCHEZ	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	8631825777	$ 162.500	PORVENIR	8631825777	$ 208.000	$ 162.800	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
	Gloria Márquez Salazar	60390105	PROFESIONAL SST	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GLORIA MAQUEZ SALAZAR	$ 1.300.000,00	$ 31.900,00	III	NUEVA E.P.S	8631901988	$ 163.300	COLPENSIONES	8631901988	$ 209.000	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra LAURA RIOS DUARTE
Matrícula Profesional No.: 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-058-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 3,07

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 731.291.151,02
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 731.291.151,02
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	380
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16964,65
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	3
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	102	102
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	8804,65	16964,65
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	3	3
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 696.127.523,00		$ 696.127.523,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.961.275,00	1.322.642,00	$ 8.283.917,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.961.275,00		$ 6.961.275,00
VALOR GISAP	$ 19.918.436,02	0,00	$ 19.918.436,02
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 729.968.509,02	$ 1.322.642,00	**$ 731.291.151,02**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 219.835.204,60		$ 219.835.204,60	$ 278.394.378,60
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.392.254,50	$ 264.528,00	$ 1.656.782,50	$ 4.141.958,50
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO				**$ 282.536.337,10**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 510.362.208,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 282.536.337,10
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-31,15%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA



UBICACIÓN: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	**4**	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**	20	21	22	23	24	**25**	26	27	28	29	30	31
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		SANTIAGO	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		SANTIAGO	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			SANTIAGO	A	A	A	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	CATERPILLAR		SANTIAGO	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				4	4	4	0	4	3	0	3	3	2	0	3	3	3	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	4	0	1	4	1	1	2	4	1	1	1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	42	34%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	82	66%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS PALENCIA ORTIZ

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 54202-360920 NTS

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 731.291.151	
			TOTAL			$ 731.291.151	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 731.291.151**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ 731.291.151**	**$ 731.291.151**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -		$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO	$ -		$ -
GISAP	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	**4**	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**	20	21	22	23	24	**25**	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	24	24	24	24	17	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	24	24	726
Lluvias moderadas	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lluvias intensas	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALENCIA ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-360920 NTS

Firma Oscar Mauricio García
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el presente periodo no se han realizado ensayos a materiales.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/06/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 731.291.151,02

VALOR ACUMULADO: $ 731.291.151,02 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22	11	2023	22	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (45 días), a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 14/06/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- NO x VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **3/07/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- NO x FECHA DE APROBACIÓN: -------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-058-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731.291.151,02 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 731.291.151,02


PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 jun-24	MES 2 jul-24	MES 3 ago-24	MES 4 sep-24	MES 5	MES 6
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas Actividades de Mantenimiento periódico	$ 696.127.523,00 $ 696.127.523,00	100,00% 100,00%	38,64% $282.536,34	% P $ P $ E % E	1,13% $8.277 $0,0 0,00%	19,20% $140.429 $61.044,3 8,35%	49,45% $361.656 $221.492,0 30,29%	30,21% $220.929 $0,0 0,00%		
				% P $ P $ E % E						
				% P $ P $ E % E						
				% P $ P $ E % E						
				% P $ P $ E % E						
TOTAL OTROS ITEMS				% P $ P $ E % E						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**								

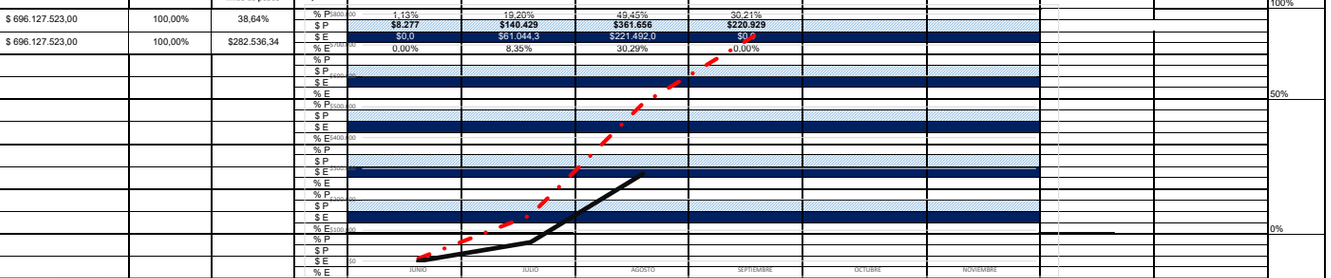

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,13%	19,20%	49,45%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$140.429	$361.656					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,13%	20,33%	69,79%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$148.706	$510.362					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	8,35%	30,29%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$221.492					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	8,35%	38,64%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$282.536					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.961.275,00 $ -	$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.961.275,00 $ -	$ 3.480.637,50	50,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.322.642,00 $ -	$ 661.321,00	50,00%
GISAP	$ 19.918.436,02 $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.163.628,02	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 731.291.151,02**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 731.291.151,02**	**$ 4.141.958,50**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado asciende a 69,79% vs 38,64%, se presenta un atraso de obra de 31,15% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Representante legal

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: CD-FC-058-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731.291.151,02 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 731.291.151,02


PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		
					jun-24	jul-24	ago-24	sep-24				
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas Actividades de Mantenimiento periódico	$ 696.127.523,00	100,00%	38,64%	% P	1,13%	19,20%	49,45%	30,21%				
	$ 696.127.523,00	100,00%	$282.536,34	$ P	$8.277	$140.429	$361.656	$220.929				
				$ E	$0,0	$61.044,3	$221.492,0	$0,0				
				% E	0,00%	8,35%	30,29%	300,00%				
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**										

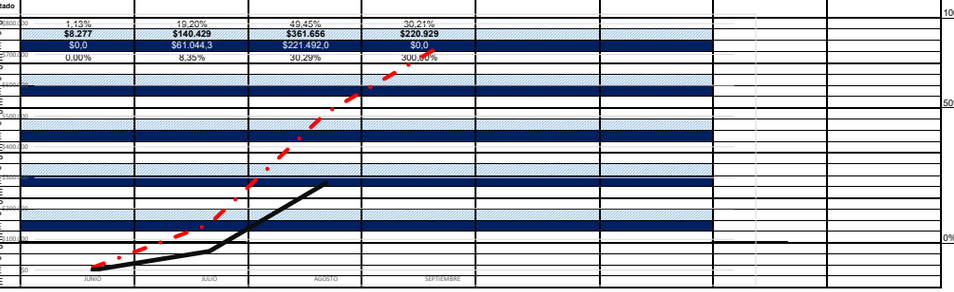

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,13%	19,20%	49,45%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$140.429	$361.656					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,13%	20,33%	69,79%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$148.706	$510.362					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	8,35%	30,29%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$221.492					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	8,35%	38,64%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$282.536					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.961.275,00	$ -	0,00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.961.275,00	$ 3.480.637,50	50,00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.322.642,00	$ 661.321,00	50,00%
	$ -		
GISAP	$ 19.918.436,02	$ -	0,00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.163.628,02	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 731.291.151,02**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 731.291.151,02**	**$ 4.141.958,50**	

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado asciende a 69,79% vs 38,64%, se presenta un atraso de obra de 31,15% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma: _____
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Representante legal

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-071-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 5/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 92,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 666.564.206,31
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 666.564.206,31
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	350
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	15460,91
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	4
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml		0
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 634.511.700,00		$ 634.511.700,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1.205.681,00		$ 1.205.681,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.345.690,00		$ 6.345.690,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.345.690,00		$ 6.345.690,00
VALOR GISAP	$ 18.155.445,31	0,00	$ 18.155.445,31
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 666.564.206,31**	$ -	**$ 666.564.206,31**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 31.674.934,40		$ 31.674.934,40	$ 31.674.934,40
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.205.681,00	$ 229.079,39	$ 1.434.760,39	$ 1.434.760,39
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 32.880.615,40	$ 229.079,39	$ 33.109.694,79	**$ 33.109.694,79**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 15.090.181,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31.674.934,40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2,49%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO E INSTALACION DE CONCRETO DE LIMPIEZA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 36"



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 36"

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN					**5**	6	**7**	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**	20	21	22	23	24	**25**	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA								I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		GRAMALOTE					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR								I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			GRAMALOTE					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4
TOTAL EN REPARACIÓN								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	108	93%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	44	41%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	56	52%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma_____
Nombre JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202-45708 NTS

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA- ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 666.564.206,3	
			TOTAL			$ 666.564.206,3	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 666.564.206**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 634.511.700,00		$ 634.511.700,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.080.462,00	$ 205.287,78	$ 1.285.749,78
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 635.592.162,00	$ 205.287,78	**$ 635.797.449,78**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.
CONTRATISTA
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA- ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	**9**	10	**11**	12	13	14	15	16	17	18	**19**	20	**21**	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco					23	24	21	23	19	24	21	24	18	24	21	24	19	24	23	22	24	23	21	21	24	24	22	22	24	22	24	605
Lluvias moderadas					1	0	2	1	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	1	2	0	1	3	1	0	0	2	2	0	2	0	31
Lluvias intensas					0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12
Total horas					24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Residente de Obra
Matricula Profesional No 54202-45708 NTS



Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

ESTAN PROGRAMADAS TOMAS DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2024

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.
CONTRATISTA
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

FECHA DE INICIO: 5/08/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 5/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ---

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: --- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ---

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: --- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ---

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---X-- NO ------- APROBADO: SI ---X-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ---

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ---

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.
CONTRATISTA
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-45708 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: CD-FC-071-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA- ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/08/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 666.564.206,31 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 666.564.206,31

PLAZO ACUMULADO: _____ (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES 1	MES 2	MES 3						
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-24	sep-31	oct-24						
Construcción Placa Huella	$ 495.630.417,00	74,36%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						100%
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Construcción Alcantarillas	$ 94.348.835,00	14,15%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$31.674.934,0	$0,0	$0,0						
				% E	4,99%	0,00%	0,00%						50%
Transporte	$ 5.095.668,00	0,76%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Señalización y seguridad	$ 5.716.544,00	0,86%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 33.720.236,00	5,06%		% P	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%						0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 634.511.700,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 634.511.700,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	2,26 15.090.181,87									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2,26 15.090.181,87									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	2,26 31.674.934,00									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4,75 31.674.934,00									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.345.690,00	$ -	0,00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.345.690,00	$ 143.412,59	2,26%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.205.681,10	$ 27.248,39	2,26%
	$ -		
GISAP	$ 18.155.445,31	$ 410.313,06	2,26%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	**$ 32.052.506,41**	$ 580.974,05	1,81%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 32.052.506,41		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 666.564.206,41**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 666.564.206,41**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 2,27% vs 4,77% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un avance de del 2,5% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma: _____

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATISTA

R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO

Aprueba Firma: _____

Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

FECHA: 9/08/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 24
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021

CONTRATISTA: (GOBERNACION DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. El especialista ya dio el aval de los planos récords a la espera que se pueda liquidar la próxima semana.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. La interventoría y el contratista se han reunido para hacer mesas de trabajo donde se pueda avanzar y gestionar en el proceso de liquidación, actualmente llevan 2 entregas de documentos se está a la espera de los últimos documentos para poder liquidar.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación, la interventoría y el contratista están en mesas de trabajo con el contratista y ya se ha recibido documentos preliminares de liquidación como los manuales de mantenimiento, los certificados, paz y salvo, informes trimestrales y queda pendiente temas de plano récords.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. Se hizo visita de obra junto con el ingeniero Wilmar, INVIAS, la comunidad y la interventoría donde se visualizó unos desgastes en las losas, la comunidad señalizo las que estaban con desgaste y se dejó el compromiso de hacer los respectivos arreglos para el día lunes 6 de agosto. El contratista no cumplió con el compromiso pactado y la interventoría a través de oficio le solicito el cumplimiento, informaron que están esperando el concepto del técnico del especialista para iniciar las reparaciones el lunes.

-El ingeniero Wilmar Ropero Gestor Técnico del INVIAS pregunta si se hizo el recorrido con el contratista, la junta de acción comunal y la interventoría que se había dejado como compromiso. Señala que se debe hacer ese recorrido, para dejarlo en acta y que estén presentes todas las partes, previo a las reparaciones.

5)Abrego convenio 1971 de 2021. Este contrato está en ejecución, el tramo Santa Lucia con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas termino al 100% se está ejecutando el tramo Brisas del Tarra lleva 324 metros de placa huella y 4 alcantarillas. El Municipio aprobó la prórroga hasta el 11 noviembre, con la finalidad de terminar el tramo Brisas del Tarra, actualmente se tiene un programado de 97.72% ejecutado de 64.18% y un atraso de 33.54%.

6)Ocaña 1814 de 2021. El contrato está avanzando y va hasta el 24 de agosto, se ha ejecutado 1557.17 de placa huella y 8 alcantarillas, está próximo a terminar, tiene un programado de 96.86% para pasar a proceso de liquidación.

7)La Playa 1863 de 2021. Esta suspendido hasta el 23 de agosto, esta próximo a terminar falta 18 metros de placa huella, lo cual no se ha podido terminar porque en la obra se están presentando grupos al margen de la ley. Se espera que en una semana pueda el contratista terminar toda la obra, para pasar el contrato a proceso de liquidación.

8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, la próxima semana se tiene programado una reunión con el municipio de Cachira para poder revisar el proceso de como va con lo del tema del hurto cibernético.

9)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista presenta actividades en las veredas Cinera, Juan bueno y Chicagua bajo, potreros
lleva ejecutado 2241.20 metros de placa huella y 3 alcantarillas.

Gramalote.
lleva ejecutado 1540.90 metros de placa huella y 3 alcantarilla. Hay actividades en las veredas Boyacá y San Isidro.

Patios
el contratista lleva ejecutado 1489 metros de placa huella 2 alcantarilla.
-El programado de este convenio es de 52.59% y ejecutado 45.30% Con un atraso de 7.20%, el contratista solicito una prorroga hasta el 30 de diciembre para dar por terminado las obras en todos los municipios.

10)Gobernación 2052 de 2021 este proyecto próximo a terminar, están instalando las señales. lleva un avance físico de 3976.40 metros de placa huella 22 alcantarillas. Programado 90.03% ejecutado 96.79% avance de 6.76% especificado en:
- TRAMO 1: 238 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 2: 1410 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 3 A: 517 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 3 B: 791.50 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 4: 700.80 metros de placa huella termina esta semana.
- TRAMO 5: están ejecutando actividades, llevan 319.10

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Cachira. Este contrato termino el 5 de agosto se ejecutaron 385 metros de placa huella y 1 alcantarilla y 14387.23 de actividad de mejoramiento, ya se instalaron las señales. Pasa a proceso de liquidación

-Pamplonita. el proyecto avanza, se le aprobó la prórroga que termina el 22 de agosto, el contratista tiene atraso de 2.50% y ejecutado lleva 266.73 de placa huella en donde se especifica en Tramo N°1 160m, tramo N°2 31m y tramo N°3 60m, 2 alcantarilla y 16699.60 de actividades de mejoramiento. el programado es de 93.24% ejecutado 90.74%

-Herrán. Tiene un atraso grande 38.46%, el contratista solicito 45 días de prórroga, lleva ejecutado 70 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 de actividades de mejoramiento. Este contrato ha presentado dificultad para el ingreso a la obra, por cuestiones climáticas.

-Mutiscua. Se hizo visita de obra con el Gestor Técnico el ingeniero Wilmar, representantes del INVIAS, la comunidad, la alcaldía y la Interventoría, se logró llegar a un acuerdo de hacer traslado del segundo tramo al primero con la finalidad que la curva quede completa, se levantó acta donde se dejó como constancia los 18 metros que se trasladaban de un tramo a otro. El contratista solicito un mes de prórroga, tiene ejecutado 173 metros de placa huella, 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 75.22% ejecutado de 67.20% y un atraso de 8.02% se finaliza el 17 de septiembre de 2024.

-Santiago. El contratista está ejecutando actividades de mejoramiento, se espera que la próxima semana empiece con el vaciado de la placa huella.

-Gramalote. El contratista esta enviando la información de estudios y diseños a la espera de la firma del acta de inicio.

-Villa Caro. Sin iniciar, revisando las cotizaciones.

-Proceso de Liquidación se encuentra Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia.

-Los municipios que ya tienen firmada el acta de liquidación son El Zulia, Villa de Rosario, San Cayetano y Salazar de las Palmas.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
CRISTIAN MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS - OCAÑA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8

FECHA: 16/08/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación a la espera que se pueda liquidar la próxima semana.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. La interventoría y el contratista se han reunido para hacer mesas de trabajo donde se pueda avanzar y gestionar en el proceso de liquidación, el contratista ha realizado entregas de documentos.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación, la interventoría y el contratista está en mesas de trabajo, se ha podido recibir documentos para avanzar en la liquidación.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría reitera oficio de cumplimiento de compromisos para el recibo de obra además se programa protocolo de visita para que junto con el contratista y la comunidad se haga la revisión del mantenimiento de las losas.

5)Abrego convenio 1971 de 2021. Este contrato está en ejecución, el tramo Santa Lucia con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas termino al 100% se está ejecutando el tramo Brisas del Tarra lleva 351 metros de placa huella y 4 alcantarillas. El Municipio aprobó la prórroga hasta el 11 noviembre con la finalidad de terminar el tramo Brisas del Tarra, actualmente se tiene un programado de 65.88% ejecutado de 64.88%

6)Ocaña 1814 de 2021. El contrato está avanzando y va hasta el 24 de agosto, se ha ejecutado 1566.39 de placa huella y 8 alcantarillas, actualmente tiene un programado de 97.87% y ejecutado 96.80% con un atraso 1.07%.

7)La Playa 1863 de 2021. Esta suspendido hasta el 23 de agosto, esta próximo a terminar falta 15 metros de placa huella, lo cual no se ha podido terminar porque en la obra se están presentando grupos al margen de la ley. El municipio realizo solicitud extemporánea de adición al contrato de obra, pero no hicieron el trámite correspondiente, por lo tanto, no se logró hacer la adición y se espera que en la semana que les queda activa pueda el contratista terminar toda la obra, para pasar el contrato a proceso de liquidación.

8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, la interventoría cometió el error de prorrogar el contrato por seis meses quedando hasta el 29 de enero de 2025, fecha extemporánea del convenio. Por lo cual, para corregir se hizo un oficio el cual se esta estudiando por parte del área jurídica de Gavinco para poder emitirlo.

El 13 de agosto el ingeniero Elías Jaimes solicito una reunión en donde manifestó que el contratista reinicie y termine la obra para que posteriormente haga el respectivo cobro al municipio, además se programó reunión para el 09 de septiembre donde se va tratar el tema, convocó a INVIAS Norte de Santander, el contratista, la interventoría y el alcalde de Cachira. El contratista insiste en la terminación unilateral del contrato de obra por falta de recurso y no han querido firmar el acta de suspensión.

9)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista lleva ejecutado 2409.70 metros de placa huella y 3 alcantarillas. Porcentaje de avance de 56.07%, se habilito el paso por Castro, los frentes de Santo Domingo, Juan Bueno y Cinera.

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 1605.50 metros de placa huella y 3 alcantarilla. Porcentaje de avance de 59.92%, la comunidad no ha dejado realizar algunas alcantarillas, la interventoría se está presentando en la zona para conciliar el tema de la instalación de las alcantarillas, junto con el contratista, especialistas, municipio y comunidad.

Patios
el contratista lleva ejecutado 1545.10 metros de placa huella 2 alcantarilla. Porcentaje de avance de 59.54%

-El programado de este convenio es de 60.55% y ejecutado 46.74% Con un atraso de 13.81%, se tramito el aval para la adición y prorroga del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2024 por un valor de $7.565.000.000, se espera que la próxima semana se incorpore la nueva metafísica.

10)Gobernación 2052 de 2021. Este proyecto terminó y se está haciendo tratamiento de fisura e instalando las señales informativas, la obra física de 4000 metros de placa huella 22 alcantarillas. Programado 92.05% ejecutado 98.02% avance de 5.97% especificado en:
- TRAMO 1: 238 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 2: 1410 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 3 A: 517 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 3 B: 791.50 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 4: 700.80 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 5: 342.70 metros de placa huella ya termino.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Pamplonita. Esta en ejecución y termina el 22 de agosto, el contratista tiene atraso de 2.50% y ejecutado de metafísica lleva 276.74 de placa huella, 2 alcantarilla y 16699.60 de actividades de mejoramiento. el programado es de 96.56% ejecutado 94.06%

-Herrán. Tiene un atraso grande 31.45%, este contrato tiene una prórroga de 45 días hasta el 30 de septiembre. Lleva ejecutado 100 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 de actividades de mejoramiento. Este contrato ha presentado dificultad para el ingreso a la obra, por cuestiones climáticas.

-Mutiscua. A este contrato se le aprobó un mes de prórroga va hasta el 17 de septiembre, Se está interviniendo el tramo 1 pues hasta no finalizar con este tramo no se puede iniciar el vaciado en el tramo 2, tiene ejecutado 173 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 89.29% ejecutado de 74.61% y un atraso de 14.69%

-Santiago. El contratista ya ejecuto las actividades de mejoramiento 16964.05 y 3 alcantarillas, se espera el vaciado de la placa huella. El alcalde del municipio nos pidió el favor que no fueran a cerrar la vía, porque se presentan ferias y toda la comunidad llega al pueblo. Es por ello que se presenta un atraso, este contrato termina el 14 de septiembre.

-Gramalote. Inicio el 05 de agosto, se hizo la respectiva socialización en sitio, se verifico con el contratista la alcantarilla, ya tiene insumos en la obra. A la espera que la próxima semana empiecen los vaciados. La interventoría le solicito mediante oficio toda la documentación pre-constructiva. La obra finaliza el 04 de noviembre de 2024

-Villa Caro. Sin iniciar.

-Proceso de Liquidación se encuentra Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia.

-Los municipios que ya tienen firmada el acta de liquidación son El Zulia, San Cayetano y Salazar de las Palmas.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIAR LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN FIRMADAS	16/08/2024	GAVINCO SAS
CONVOCATORIA REUNIÓN 20 AGOSTO TEMA: MATRIZ.	20/08/2024	GAVINCO SAS
CUMPLIR CON LAS ACTAS DE COSTOS EN LA FECHA ESTIPULADA.	5/09/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
CRISTIAN MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - OCAÑA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
CUMPLIR CON LAS ACTAS DE COSTOS EN LA FECHA ESTIPULADA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053-2022

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Norte de Santander 1053 del 2022.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. Esta semana se hizo reunión entre la interventoría y el contratista para consolidar el paquete de todos los documentos de la liquidación, se está en espera que el contratista radique la documentación.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. La interventoría y el contratista se han reunido para hacer mesas de trabajo donde se pueda avanzar y gestionar el proceso de liquidación. El contratista ha realizado entregas parciales de documentos, queda pendiente algunos y se espera que la próxima semana se pueda recibir toda la documentación.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación, este proyecto ejecutó 1770 metros de placa huella. La interventoría y el contratista realizaron mesas de trabajo y se pudo recibir documentos de manera parcial, quedaron pendientes otros documentos que ya fueron solicitados por el ingeniero residente de la interventoría para avanzar en el proceso de liquidación.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación y se están realizando las subsanaciones por parte del contratista. Debido al mantenimiento en las losas no se ha podido adelantar en la parte documental, el contratista la semana pasada llevo los materiales y han avanzado en las actividades, hasta el momento la comunidad está contenta por el mantenimiento.

5)Abrego convenio 1971 de 2021. Este contrato está en ejecución, la interventoría no había podido ingresar debido al orden público, pero ya se tiene el inspector en sitio, se ha ejecutado de placa huella 1150 metros lineales en el tramo Santa Lucia y 6 alcantarillas, se está ejecutando el tramo Brisas del Tarra lleva 382 metros de placa huella y 4 alcantarillas. Este contrato se prorrogo hasta el 11 noviembre actualmente se tiene un programado de 36.83% ejecutado de 66.09% y un avance de 29.27%.

6)Ocaña 1814 de 2021. El contrato está avanzando y va hasta el 24 de agosto, se ha ejecutado 1566.39 de placa huella y 8 alcantarillas, el contratista esta con el sello de juntas, instalando las señales verticales y realizando el aseo de la obra. Para pasar este contrato a proceso de liquidación.

7)La Playa 1863 de 2021. Este contrato ya termino solo falta las señales, se ejecutó 608 metros de placa huella y 2 alcantarillas en el corredor 1 y 545 metros de placa huella con 3 alcantarillas en el corredor 2. El municipio hizo solicitud extemporánea de adición al contrato de obra, pero la interventoría a través de oficio GIC-INVIAS-NTS-1161-24 no procedió a dicha solicitud por no haber cumplido con los requisitos de tiempo y gestión adecuada.

8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, la interventoría remitió oficio donde se ratifica la suspensión que ya está en curso hasta tanto se solucione todo el tema del hurto, no es viable hacer la liquidación sin dejar resuelto el tema. Se tiene programada reunión entre el contratista, INVIAS, el municipio y la interventoría.

9)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista lleva ejecutado 2554.10 metros de placa huella y 3 alcantarillas. se habilito el paso por Castro y se activaron los frentes de Santo Domingo, Juan Bueno y Cinera.

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 1733.50 metros de placa huella y 3 alcantarilla.

Patios
Se le solicita al contratista que inicie las actividades del box convert pendientes por construir, que se implemente un frente adicional para esta actividad. Para el ancho de la vía de 7 metros de longitud de 1240 metros, se lleva ejecutado 320 metros completos y la piedra pegada en 80 metros para un total de 400 metros. El avance de obra física general es de 1613.70 metros de placa huella y 2 alcantarillas.

-El programado de este convenio es de 32.48% y ejecutado 33.82% Con un avance de 1.37%, se firmó adición y prorroga del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2024 por un valor de $7.565.000.000.

10)Gobernación 2052 de 2021. Este proyecto ya termino, el contratista finaliza actividades de gaviones y esta instalando las señales verticales. La interventoría da viabilidad a la solicitud del contratista donde pide el traslado del recurso de compensación ambiental al componente de mejoramiento de vía. Se espera que terminen las señales para pasar a proceso de liquidación.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Pamplonita. Este contrato termino el 22 de agosto, el contratista ejecuto a corte de la semana pasada 294.7 de placa huella, 2 alcantarilla y 16699.60 de actividades de mejoramiento el programado es de 98.66% ejecutado 99.92%.

-Herrán. Tiene un avance, este contrato tiene una prórroga de 45 días hasta el 30 de septiembre. Lleva ejecutado 150 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 de actividades de mejoramiento.

-Mutiscua. presenta un pequeño avance, este contrato se le aprobó un mes de prórroga va hasta el 17 de septiembre, ya termino el tramo 1 y se está ejecutando el tramo 2 tiene adelantado la cuneta y el bordillo para iniciar con el vaciado. Actualmente tiene ejecutado 200 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 79.82% ejecutado de 76.60% y un atraso de 3.22%

-Santiago. El contratista ya ejecuto las actividades de mejoramiento 16964.05 y 3 alcantarillas, se inició con el vaciado de la placa huella. este contrato termina el 14 de septiembre, pero posiblemente demore 15 días más por el atraso que se presento al no poder cerrar la vía por las festividades del municipio.

-Gramalote. Este contrato inicio el 05 de agosto, ya están instalando las alcantarillas. No se tiene porcentaje porque el contratista hasta esta semana nos entregó toda la documentación de preconstrucción.

-Villa Caro. Sin iniciar.

-Proceso de Liquidación se encuentra Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia.

-Los municipios que ya tienen firmada el acta de liquidación son El Zulia, San Cayetano y Salazar de las Palmas.

-Se esta presentando una dificultad con las actas de pagos del FARO a los contratistas, pues hay unas actas que se libraron hace meses por parte de la interventoría y aún están a la espera de pago.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIAR COPIA DEL ALCANCE DE VILLA CARO.	22/08/2024	GAVINCO SAS
CUMPLIR CON LAS ACTAS DE COSTOS EN LA FECHA ESTIPULADA.	5/09/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, caracteristicas, georreferenciacion y demas elementos tecnicos descritos en el proyecto con codigo BPIN 2021004540033, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Y LA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificar y recepcionar la obra comprendida en el contrato, que consistía en la construcción de una alcantarilla y 384.5 metros lineales de placa huella, distribuidos en los siguientes tramos:

Tramo 1: 124 metros
Tramo 2: 130 metros
Tramo 3: 130.5 metros

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el Municipio de Cachira, el dia 8 de agosto del 2024 a las 9 am, se llevó a cabo el recorrido de recepción de obra, conforme a las disposiciones acordadas en el contrato de obra. La reunión tuvo lugar en el corredor de los Mangos en cada uno de sus tramos ejecutados, y estuvieron presentes los siguientes participantes: Por el Municipio MANUEL ALEXIS SEPULVEDA Secretario de Planeacion, Contratista CARLOS MARIO PACHECO Director de Obra, Interventoria ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES Residente de Obra y CRISTIAN QUINTERO VEGA Inspector de obra, JOSE ORLANDO S. Concejal, WILSON HERNANDO G. Concejal, GUSTAVO SANTAMARIA M. Presidente de los Mangos, VICTOR JULIO ORTIZ Lider comunal.

Revisión de la Obra:
Se realizó una inspección detallada de la alcantarilla y de los tramos de placa huella construidos. Se verificó que la obra cumplía con las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato.

Verificación de Metros Construidos:
La medición de los tramos de placa huella se realizó con precisión, confirmando los siguientes metrajes:

Tramo 1: 124 metros
Tramo 2: 130 metros
Tramo 3: 130.5 metros

Después del recorrido de entrega de obra, se llevó a cabo una reunión con la comunidad para socializar los alcances finales del proyecto ejecutado. Durante el encuentro, tanto la comunidad como la alcaldía expresaron su profunda gratitud y satisfacción por el excelente trabajo realizado, destacando el impacto positivo que ha tenido en la vereda. La reunión sirvió para reafirmar el compromiso con el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de los lazos entre los vecinos y las autoridades municipales.

Luego de la inspección y verificación, se concluyó que la obra se encuentra en conformidad con los requisitos establecidos. Todos los participantes coincidieron en que la obra fue ejecutada de acuerdo con las especificaciones y estándares acordados.

Se acepta a satisfacción la obra de alcantarilla y los 384.5 metros lineales de placa huella.
Se acuerda que la Empresa Ejecutora procederá con la entrega de la documentación final correspondiente, así como con cualquier trámite pendiente para la formalización de la recepción definitiva.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING RESIDENTE	GAVINCO	
CRISTIAN QUINTERO VEGA	INSPECTOR	GAVINCO	
CARLOS MARIO PACHECO	DIRECTOR DE OBRA	MATICCES	
MANUEL ALEXIS SEPULVEDA	SECRETARIO DE PLANEACION	ALCALDIA	
Jose orlando S.A	concejal		Jose orlando
WILSON HERNANDO	concejal		WILSON H G
Victor Julio Ortiz M.	Lider.		
Gustavo Santamaria M.	Presidente los Mangos		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	12/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1863 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONVENIO 1863 DE 2021 MUNICIPIO DE LA PLAYA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
El ingeniero Jairo Quintero director de proyecto Interventoría hace la apertura de la reunión informando que los temas a tratar serán: -Solicitud de adición de trabajos sobre el convenio 1863 de 2021 -Respuesta del INVIAS Ocaña por los recursos de interventoría, que se basan también en la ejecución de los contratos de obra. El contrato esta suspendido hasta el 19 de agosto y termina el 26 agosto. Ingeniero Wilmar Rangel Ropero Gestor Técnico de INVIAS Aclara que los recursos que el municipio quiera adicionar al contrato deben tener primero presente que el contrato se deriva de un convenio suscrito con el Instituto Nacional de Vías y el recurso debe ser agregado al convenio para poder adicionarlo al contrato de obra. Señala que la Interventoría no puede hacer seguimiento y control a recursos que no estén incorporados al convenio. Además, explica que la solicitud debió ser dirigida al INVIAS con anticipación, ya que se debe pasar a un comité previo, se agenda el caso para el estudio y aprobación. Dicha solicitud debe estar sustentado por los soportes, tener el CDP, con unos formatos MEPIS con los respectivos soportes, también tener en cuenta que la interventoría es multiproyectos la cual solo cuenta con recursos para una metafísica inicial propuesta. Por lo tanto, se debe tener en cuenta los recursos de la interventoría. El ingeniero Jairo manifiesta que la interventoría no cuenta con recursos para hacer acompañamiento a obras adicionales, también resalta que falta 20 metros para terminar la obra, pero que esta muy difícil el ingreso por cuestiones de orden público. Ingeniero Wilmar Rangel Ropero explica que el INVIAS por el momento no cuenta con recursos para adicionar a la interventoría. La secretaria de planeación agradece la explicación y postura del INVIAS y la interventoría respecto al tema de la adición del recurso. El ingeniero Sergio Arias aclara que por parte del municipio se hizo la respectiva solicitud porque se estaba estudiando la adición con recurso de parte del INVIAS por una gestión que la administración estaba realizando. Ingeniero Wilmar Rangel Ropero indica que INVIAS planta central no recibió reporte de parte de INVIAS territorial de algún trámite para adicionar recursos, por lo tanto, no se tiene estipulados recursos. El ingeniero Brayan Camilo Criado relaciona que al INVIAS territorial Ocaña llegó una solicitud por parte del municipio sobre una adición a la cual se le dio respuesta con el conducto regular que debe seguir para poder tramitar dicha solicitud.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
		2 de 2

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH SEPULVEDA	COORDINADORA DE PROYECTOS	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO GOMEZ	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑARES	INGENIERA RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
JUAN GABRIEL CORREDOR	NADOR DE ZONA NORTE DE SAN	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	TERRITORIAL DE VIAS - OCAÑA	
CLAUDIA RANGEL	CONTRATISTA	CONSORCIO AD VIAS	
SERGIO ARIAS	CONTRATISTA	CONSORCIO AD VIAS	
ANGIE MARCELA ORTIZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE LA PLAYA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	27/08/2024. (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 55
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión temporal Edival - Inga 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander Municipio de Los Patios, Cranalote y Arboledas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores SAS.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento y control Contrato de obra (Mesa de trabajo Verificación Observaciones a la fecha de Estudios y Diseños)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se Realiza Mesa de Trabajo con Acompañamiento de las Especialistas del Contratista de Obra Ingeniera Hernando García e Interventoría. Ingeniero Iván Pinilla, Con el Fin de Verificar y Corroborar las Observaciones que se tienen a la fecha en las Vereda de:

① Santo Domingo
② Chicagua Bajo
③ Helechal
④ Cinera
⑤ Juan Bueno

De Acuerdo a lo Hablado y Verificado Tramo por Tramo, se llega a la Conclusion de Realizar un Cambio en el Vehiculo de Diseño la Presente se Realizara Mediante Comunicado de Aclaracion a la Observaciones Con Base en el Tipo de Vehiculo liviano que transita sobre los Corredores Viales.

El Contratista Realizara las entregas de Acuerdo a lo hablado en la Mesa de Trabajo y se Establece Como Compromiso la entrega para el dia 31 de Agosto de 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega Subsanaciones a Estudios y Diseños "Componente Geometria"	31/08/2024	UT Edival-Toja.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
William Quintero	Director Obra.	UT Edival Toja	
Juan A. Pinilla.	Especialista Int	Bavinca	
Hernando Garcia	Especialista Cond.	U.T. Edival-Toja	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	16/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 62
(Indicar número consecutivo)

UNIDAD ESTRUCTURA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA Union Temporal Edivial - Inga 2590

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento Norte de Santander Municipio de Patios, Gramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Cantial Contrato de Obra Vereda San Isidro.

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se Realizo Recorrido Con Acompañamiento de la Secretaria de Planeacion del Municipio de Gramalote con el fin de Verifica las Actividades que se ejecutan Actualmente en la Vereda San Isidro Teniendo en Cuenta que se Viene Construyendo la Placa Huella Tramo #2 y Algunas Actividades faltantes en el Tramo #3.

El Contratista Actualmente Tiene el Siguiente Personal:

(1) Maestro
(1) Oficial
(8) Ayudante
(1) SST
(1) Residente de Obra
(2) Operadores

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De Igual Manera Se tiene la Siguiente Maquinaria.
(1) Bobcat
(1) Retroexcavadora
(1) Camion Con Vaca

Actividades Ejecutadas y/o ejecucion

* Corte, figurado y Armado de Acero de Refuerzo para elementos de Viga Riostra, Huellas, Cuneta y Bordillo.
* Armada de formaleta para Continuida de elementos de franja Central y sobreancho
* Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos estructurales Huellas, Viga Riostra Cuneta y Bordillo.

A la fecha el Contratista Tiene ejecutados 760,70 Metros que Comprenden los dos Tramos #5 y #2.

* Por Parte de la Comunidad Manifiesta la Necesidad de que Se estudie por Parte del Contratista e Interventoria la posibilidad de Cambiar el Tramo #1 Por el #2 y Parte del 4 teniendo en Cuenta que el Objeto del Contrato establece la

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Intervencion Sobre el Corredor Vial Vereda San Isidro.

El Contratista manifiesta que se Verificara la Posibilidad de estos Cambios teniendo en Cuenta el Concepto Tecnico y Aprobacion por Parte de la Interventoria.

Por lo Anterior se Verificaran Actividades de Obra Mediante Balance para Revisar las Cantidades de la Vereda. y emitir Concepto al Respecto.

Observaciones en el Recorrido.

① Se Sugiere al Contratista Verificar la Alineacion de la formaleta de Modulacion con el fin de evitar que los elementos queden desalineados, Si es el Caso revisar la formaleta que se instala.

② Se Sugiere, Verificar la Nivelacion del Acero de Refuerzo con el fin de garantizar las longitudes de Recubrimiento.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ____________ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se suscribe la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres	Residente Int	Gavinco	Jose Torres
Ruben Mendoza	Planeación	Arcadia	[signature]
Luis Ramón Núñez	Inspector de obra	ED mal Troya	[signature]
Roso Evelio Ibarra	presidente	Asociación	Roso Evelio Ibarra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	20/08/2021 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 53
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival - Traga 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander Municipio de Patios, Bramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra Vereda Chicagua Baja, Vereda Juan Bueno

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se Realizo Recorrido en los frentes de Trabajo de la Vereda Chicagua Baja y Vereda Juan Bueno con el fin de Verificar las Actividades que se ejecutan en Campo, Actualmente se tiene el Siguiente Personal:

VEREDA CHICAGUA. (Tramo Nb1)
(1) Ingeniero Residente
(1) Maestro
(3) Oficial
(9) Ayudantes
(1) SST

VEREDA JUA BUENO
(1) Ingeniero Residente
(1) Maestro
(2) Oficial
(8) Ayudantes
(1) SST

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Actualmente se tiene la siguiente Maquinaria.

- Chicagua Bajo
  - (1) Mezcladora
  - (1) Bobcat
- Juan Bueno
  - (1) Mezcladora
  - (1) Bobcat

Las Actividades que se ejecutan en Campo son:

* Chicagua Bajo

① El Contratista realiza limpieza general en el Tramo #1 teniendo en Cuenta que a la fecha se finalizan Actividades.

② Se realiza Retiro de Herramienta Menor, a el Frente de trabajo de la Vereda Yatan donde se tiene proyectado Inicio de Actividades.

* Juan Bueno

① Se Realiza Corte, figurado y Armado de Acero de Refuerzo #3 para Elementos de Viga riostra, Huellas, Cuneta y Bordillo.

② Armado de formaleta para Cuneta y Bordillos a lo largo del Tramo #2

③ Armado de Acero de Refuerzo longitudinal y transversal para Alcantarilla (Descole y Cenole.)

④ Limpieza General a lo largo del Tramo en Intervencion.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dando Continuidade Se le Realizan las siguientes Observaciones al Contratista teniendo en Cuenta lo evidenciado en Campo y de Acuerdo al seguimiento general del Contrato.

① Se le Reitera al Contratista la Nivelacion superior de los elementos laterales (Bordillos) teniendo en Cuenta que se evidencia irregularidades en el Alineamiento del Mismo, se debe Cambiar la Tabla y/o Instalar Tres mas Seguido para evitar el Quiebre de la misma.

② Se le solicita al Contratista Mantener en Campo Saltarin y/o Rana Con el fin de que se Vibren las Areas Reducidas, ya que se evidencia en Campo la Necesidad.

③ Se le Reitera al Contratista el Cambio del equipo que se tiene Actualmente para el Vibrado, teniendo en Cuenta que se hace Necesario Tener Uno de Mayor Capacidad.

④ Se le solicita al Contratista Realizar los Cortes de las losas, de Curva Con el Fin de Indycar la Dilatacion y/o Junta de Acuerdo a Diseños.

⑤ Teniendo en Cuenta que a la fecha, la Interventoria no ha recibido las Actas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Realizadas con las comunidades de los diferentes frentes donde se ha manifestado no estar de acuerdo con la ejecución de algunas obras de drenaje (Alcantarillas y/o Box Culver), se solicita remitir las mismas para validación de la información.

⑥ Para finalizar se le reitera al contratista la presentación y/o subsanación de observaciones que se tienen a la fecha de Estudios y Diseños Veredas (Juan bueno, Cinera y Chicaguá Bajo).

Se debe tener en Cuenta, las Presentación de Diseños a las Nuevas Tramas con el fin de no obtener Inicio Físico sin las Misma

Componente Ambiental

- Realizar Limpieza Periodica de los Solidos Generados en la obra, Dando un Uso Adecuado del Punto Ecologico
- Realizar las debidas Capacitaciones en el Manejo del uso del Agua
- Capacitacion en el Cuidado del Medio Ambiente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Pitres	Residente Int	Gavinco	
Brayan Avellaneda	Residente Obra	UT. EDELVIAL TROSA	
Juan Alex Diaz R.	Arc Ambiental	Gavinco	
Nicolas Mateo Rodriguez	Inspector Interventoría	Gavinco.	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/8/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5A
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 02590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EQIVIAL -TROJA 02590.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales en el departamento de N/Santander municipio De los Patios, Oiramatle y Cubaleda"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1459
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Tramos a ejecutar con el adicional.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

tramos a intervenir con el adicional a raíz de la Solicitud de la vereda de Corozal se amplio la. Seccion de la Placa huella a 7metros.

→ Respetar tiempos de Fraguado.

→ Alcance definitivo

→ Pr de los tramos a intervenir.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se desarrollo la reunión con la intervención del ing Jorge arias Por Parte de la Gobernación Mencionando Que ya se lograron los recursos Para el adicional.

- el ing William Quintero Directa de obra Por la Parte Contratista. explica los tramos a ejecutar
- la Comunidad menciona que el Contratista esta dejando tramos sin intervenir, espondiendo el directo de obra que estamos limitados a la aProbacion de diseños de interventoria.
- Se realizara el empalme de la alcantarilla en California
- Se menciona que los tramos Son tramo 3, tramo 2, tramos del 2 al 12, la comunidad Pide q le Pavimente todo.
- Interviene el Presidente de la junta de california Diciendo q' el hablo con la Comunidad Para q' dijeran. Cuales eran los Puntos criticos A intervenir.
- el ingeniero Jose de interventoria Propone q' Se haga un recando para mostrar los Puntos a intervenir
- se culmina la reunion, mencionado que el dia 28/08/24 a la 7:00AM se realizara una visita tecnica a los tramos a ejecutar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Visita tecnica con veeduria y Acción Comunal. Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS Comunidad Rds.	28/08/24 (7:00Am)	

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
*Manuel Orlando C	California	Comunidad	
Manuel Delgado	California	Comunidad	
Franklin Velota	California	Comunidad	Franklin Velota.
Jorge Enrique Duran	California	comunidad	
plor del carmen Herrera	California	Comunidad	
Matilde Manrique	California	comunidad	Matilde Manrique
Efraiy Garnica	California	Comunidad	
Alba Gonsalve	California	comunidad	
Mario A. Otero	Pres. Vda Corozal	Comunidad	
ENRIQUE LOZANO	CALIFORNIA	COMUNIDAD	
ANA Isabel Perez	COROZAL	COMUNIDAD	
Carmen Alicia Perez	California	Comunidad	
Miguel Angel Perez	California.	Comunidad	
Sotrzoa	Sotrzoa	Sotrzoa	
RODOLFO MANRIQUET	CALIFORNIA	COMUNIDAD	
Guarnote Ospeda	Cpt California	Comunidad	
Carlos Galvez	Presidente California	Comunidad	
Alba Rodriguez	Local Corozal		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Luis Leonidas Garcia S.	Callonia	Comunidad	
Juan Francisco Flores Bravo	California	Comunidad	
Tito Bonilla M	California	Comunidad	
JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO	Supervisor. Gobernacion	Secretaria de Vias.	
Jose H. Torres S	Residente Int.	GAVINCO	Jose Torres
JUAN A. PINILLA C	Especialist. Int.	GAVINCO	
Cesar Cardenas	Resid. Obra	Edival-Tierra	
Natalia Hurtado	Coordinado SSI-Seed	Edival-Tierra	
Miguel Delgado	Veedor		Miguel

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUAL ALTO FRIO, MUNICIPIO SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- VERIFICACION AVANCE
- COMPROMISOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DÍA DE HOY 21-AGOSTO-2024 SE REALIZO REUNION EN OBRA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA

EN EL DÍA DE HOY SE VERIFICO EL AVANCE DE OBRA FISICO, LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA Y DA A CONOCER, A FECHA DEL 15 DE AGOSTO DE 2024, EL PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO ASCIENDE A 45.43% Vs 20.19% PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO, ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO DEL 25.24%.

CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

SE EVIDENCIA QUE EL PERSONAL DE OBRA CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PERSONAL.

→ LA OBRA y/o AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA SEÑALIZADA.

→ LA INTERVENTORÍA RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

→ SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA, EVALUAR LOS RENDIMIENTOS Vs LA FECHA DE TERMINACIÓN, EN ARAS DE QUE SI ES EL CASO SE SOLICITE PRORROGA DE TIEMPO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, PARA SER EVACUADA POR LA INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 21/08/24
(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

FECHA: 21/08/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA SOLICITUD PRÓRROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA	INMEDIATO	CONTRATISTA DE OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR MAURICIO GARCIA	RES. INTERVENTORIA	GAVINCO	
Cristian Alvarez Cuevas	Inspect Interventoria	GAVINCO	
Jose Francisco Mesa V	Aux Res de Obra	Walter Rene	Jose Francisco M

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 09/08/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 23
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2332
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UT Placa Huella la Mutis 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de las Platas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Recorrido por el Corredor Vial la Garita - la Mutis. Municipio de las Platas, Norte de santander obra Derivados Convenio 2352-2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
El el Recorrido por el Corredor Vial la Garita - la Mutis se observan 6 tramos de Placa Huella terminados en su totalidad Tramo #1 Con longitud 238 metros, tramo # 2 Con longitud de 1410 metros y 10 Alcantarillas, tramo #3A Con longitud de 518 mts y 1 Alcantarilla, tramo #3B Con longitud de 791 metros y 6 Alcantarillas, Tramo #4 Con longitud de 700 metros y 4 Alcantarillas, tramo #5 Con longitud de 347 mt y 1 Alcantarilla, la Anterior Para un ejecutado de 4004 Metros y 22 Alcantarillas.
Se observa a lo largo del Recorrido en algunos puntos de los tramos de Placa Huella

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Presenta fisuras en el Concreto, Debido a esta la Interventoria realiza la observacion para el Reparo de las Mismas, Segun Criterio del Contratista esto obedece a fisuras por Retraccion y no Comprometen la integridad de la estructura, a la Cual se Procede a Implementar la Reparacion Aplicando los Productos Sika Rood y Sika Flex, Reparacion Avalada por la Firma Interventora Antes de Recibo de las obras.

La Firma Interventoria realiza la observacion en Cuanto al Retiro de Materiales Sobrantes y Basuras en Ambos Margenes de la Via.

Queda Como Trabajo Final la terminacion de Muros en Gaviones y Señalizacion Vertical para el Dia 30 de Agosto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Rojas Bravo	Apoyo Supervisión	INVIAS Bogotá	
Jairo A. Quintero	Financiero	Financiero	
Victor H. Vivas	Residente Int	Financiero	

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 61 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.010.861,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		-$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.642.442.323,92	97,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.601.184.885,32	96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (41.257.438,60)	-1,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.642.442.323,92	97,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.613.584.505,68	96,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28.857.818,24)	-1,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.089.552,62	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.211.972,28	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 99% Avance o Atraso Físico % -3%
Meta Física Ejecutada % 97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1692			Prog	1661,7				98,2%
					Ejec	1566,39				92,6%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
MEZCLADORA	1	1
MINICARGADOR		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN Vereda el Hatillo y la Madera	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL SI	X X	NO NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL SI		NO NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 , 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:

La interventoría durante la semana recibió informe del mes de julio

La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1117-24, APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4
GIC-INVIAS-NTS-1118-24, APROBACIÓN INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.
GIC-INVIAS-NTS-1119-24, APROBACIÓN INFORME MES DE JULIO DE 2024, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continua con actividades de fundida de secciones en concretos de 21mpa y 14 mpa para placa huella en el tramo 3 en el PR4 +862 AL PR4+768, ademas se continua en actividades de corte, figurado e instalacion de acero.

ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•El lunes 5 de agosto se aprueba el informe mes de Julio del municipio de Ocaña, Buenavista. Asimismo, se envía al correo oficio y documentación del informe trimestral y Balance de Estado Social del proyecto, para recibir correcciones o subsanar lo pendiente por parte de Invias.

ACTIVIDADES AMBIENTALES


* La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecucion de la obra, se entabla diálogo con él encargado del Área Ambiental, quien manifiesta que la obra se suspendió por un tiempo y a la fecha después de iniciar No tiene mayor información de este componente.

* Se le solicita al contratista verificar la información que no se ha presentado hasta la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado e instalacion de acero, vaciado de huella y cunetas según diseño de 14 mpa y 21 mpa .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR4+820 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA



TRAMO 3 PR4+0810 ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ACEROS



TRAMO 3 PR4+0770 ACTIVIDAD DE CICLOPEO DE 14 MPA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 62 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.010.861,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		-$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.669.531.876,54	98,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.635.529.832,58	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (34.002.043,96)	-1,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.669.531.876,54	98,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.647.929.452,94	98,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.602.423,59)	-0,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.089.552,62	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.344.947,26	1,27%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.871.709.974,49	76,57%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -3%
Meta Física Ejecutada % 97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1692			Prog	1680,6				99,3%
					Ejec	1566,39				92,6%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
MEZCLADORA	1	1
MINICARGADOR		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 , 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana recibió informe del mes de julio y se dió aprobación
La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realizan actividades de fundida de secciones en concretos de 21mpa y 14 mpa para placa huella en el tramo 3 en el PR4 +862 AL PR4+768 y cunetas de 21 mpa según diseño establecidos en la cartilla de colombia rural, ademas se continua en actividades de corte, figurado e instalacion de acero y adecuacion de cunetas

ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de posibles correcciones por parte de Invias de la documentación del informe trimestral y Balance de Estado Social del proyecto para poder subsanar.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecucion de la obra, se entabla diálogo con él encargado del Área Ambiental, quien manifiesta que la obra se entregan informes trimestrales, lo que para este periodo seria Julio y Agosto, a la fecha después de iniciar No tiene mayor información de este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado e instalacion de acero, vaciado de huella y cunetas según diseño de 14 mpa y 21 mpa .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR4+862 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14 MPA



TRAMO 3 PR4+0780 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA



TRAMO 3 PR4+0770 ACTIVIDAD DE ACEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 63 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.010.861,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.685.967.081,00	99,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.678.555.010,37	99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.412.070,63)	-0,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.685.967.081,00	99,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.690.954.630,73	99,7%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.987.549,73	0,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.435.204,46	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.025.177,79	1,59%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.871.709.974,49	76,57%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %: -3%
Meta Física Ejecutada %: 97%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	1	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,98				98%
*	Placa Huellas	ml	1692			Prog	1692,0				100,0%
						Ejec	1566,39				92,6%
*	Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
						Ejec	8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 . 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana envío oficio integral con solicitud de entrega del informe del mes de agosto

La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1179-24, SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se finalizaalizan actividades de fundida de secciones en concretos de 21mpa y 14 mpa para placa huella en el tramo 3 en el PR4 +862 AL PR4+768 y cunetas de 21 mpa según diseño establecidos en la cartilla de colombia rural, ademas se continua en actividades de sello de junta del PR4+910 al PR 4+768.

ACTIVIDADES SOCIALES


•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de posibles correcciones por parte de Invias de la documentación del informe trimestral y Balance de Estado Social del proyecto para poder subsanar.
•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de información documental por parte del profesional social del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con actividades de sello de junta en el tramo 3.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR4+862 ACTIVIDAD DE ADECUACION DE CUNETAS



TRAMO 3 PR4+0862 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA



TRAMO 3 PR4+0862 ACTIVIDAD DE SELLO DE JUNTAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 24 del 26/07/2024 al 1/08/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-067-2023	VALOR INICIAL:	$ 749,903,341.00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268,536,435.20
						VALOR ADICIONES:	$ 500,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 DE MAYO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 749,903,341.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5,056,701,345.20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 749,903,341.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749,903,341.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,000,000.00	$ 2,038,536,435.20	$ 2,978,164,910.00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40,000,000.00	$ 2,038,536,436.00	$ 1,544,501,856	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0.80)	$ 1,433,663,054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 749,909,031.25	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 693,914,307.02	92.53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 677,557,719.44	90.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16,356,587.58)	-2.18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 28,920,136.00	3.86%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 722,834,443.02	96.39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 706,477,855.44	94.21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16,356,587.58)	-2.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,726,886.00	2.76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 62,273,559.00	8.30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se Solicito al contratista de obra la programacion ajustado a la prorroga del contrato de obra a la fecha no se ha tenido respuesta

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,966,998,898.22	78.45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,623,038,292.49	71.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65,738,700.44	1.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65,738,700.44	1.30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262,954,801.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 77.47%
Meta Física Ejecutada % 76.29%
Avance o Atraso Físico % -1.18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	0.5	0.5	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	384.5			Prog	384	384	100%
					Ejec	385	385	100.16%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	1	1	100%
* Actividades de mantenimiento	m2	14387.23			Prog	14387.2	14387.2	100%
					Ejec	14387.2	14387.2	100%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA		1
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-431-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	18

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

La interventoría está a la espera de la entrega de los informes del mes de julio y las planillas de seguridad social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 31 de julio 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1:-Vaciado de Concreto de 21Mpa con acelerante para placa huella tramo 1, -Figurado y amarre de acero para placa huella.

El día sabado (27 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella, -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada

El día lunes (29 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

El día martes (30 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1:-Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada, -Instalación de señalizacion, -Ya se termino el Vaciado de concreto de 14Mpa, concreto de 21Mpa para placa huella, solo faltan los bordillos y terminar de instalar las señales para terminar Dios mediante el fin de semana.

El día miercoles (31 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1:-Vaciado de concreto de 21Mpa para Bordillos. -Visita de la ingeniera Adriana con el fin de supervisar los procesos constructivos.

El día jueves (1 de Agosto) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 21Mpa para Bordillos.

ACTIVIDADES SOCIALES


•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Por tanto, se encuentra a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra para revisión y concepto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara comité de entrega para la proxima semana dado a que ya terminaron actividades de placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: -Figurado y amarre de acero para placa huella, tramo 1.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: -Visita de la ingeniera Adriana con el fin de supervisar los procesos constructivos. tramo 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción. Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual. Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ORTE DE SANTANDE — SEMANA No.: 1 del 8/08/2024 al 15/08/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO: N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.371,51	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.545.090,93	1,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.545.090,93	1,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.974.026,60	1,80%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.545.090,93	1,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.519.117,54	2,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11.974.026,60	1,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.545.090,93	1,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.545.090,93	1,13%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: $ -

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: jun-24

VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 1,13% — Avance o Atraso Físico %: 1,80%
Meta Física Ejecutada %: 2,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,23	0,23	23%
					Ejec	0,23	0,23	23%
* Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog		350,00	100,00%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	1,00	1,00	25,00%
					Ejec			
Actividades de mantenimiento	m2	15460,91			Prog			
*					Ejec			
Señalización vertical.	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1500,05			Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra en revisión de documentos preconstructivos presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

se envian documentos revisados con sus respectivas observaciones para subsanacion por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 08 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista realiza acopio de materiales de obra: acero, triturado, arena,

Se realiza vicita tecnica , ubicación del tramo de la obra, revision cronograma de obra a ejecutar acividades realizadas por parte del contratista.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoria revisando asi los soportes y documentos de estos componentes, actas de vcindad, se hacen las respectivas recomendaciones uso de los EPP entre otras responsabilidades

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el avance de obra segun lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

_Continuar con el acopio de agregados petreos,cemento para la ejecución de las actividades.

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta de inicioCto. CD-FC-071-2023 vereda la Garza- Zumbador Municipio de Gramalote. .



Observaciones diseño geometrico.Cto. CD-FC-071-2023 vereda la Garza- Zumbador Municipio de Gramalote.



Aprobacion documentos precontractuales.Cto. CD-FC-071-2023 vereda la Garza- Zumbador Municipio de Gramalote.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se reviso y aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 2 del 15/08/2024 al 22/08/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:							
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20
					VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO:		N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 666.564.206	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 666.564.206	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.317.636,40	1,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 21.481.100,40	3,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.163.464,00	1,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.317.636,40	1,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.455.127,00	5,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 22.137.490,60	3,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.317.636,40	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.481.100,40	3,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revisión el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventores alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:
Acumulado:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1,70%
Meta Física Ejecutada % 5,02%
Avance o Atraso Físico % 3,32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,23	0,23	23%
					Ejec	0,23	0,23	23%
* Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	1,00	1,00	25,00%
					Ejec	1,00	1,00	25,00%
Actividades de mantenimiento *	m2	15460,91			Prog			
					Ejec			
Señalización vertical.	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1500,05			Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se encuentra en revisión el balance Y documentos preconstructivos presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoría.

Se envían documentos revisados con sus respectivas observaciones para subsanación por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 15 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista continua realizando acopio de materiales de obra: acero, triturado, arena, cemento.

Se inicia la construcción de una alcantarilla de 36", previamente aprobada por la interventoría.

Se realizan visita técnica con el fin de observar y verificar el tramo de vía donde se va a desarrollar el proyecto de placa huella para hacer chequeo de medidas de anchos, ubicación de alcantarillas, actividades realizadas por parte de la interventoría.

Se realiza inspección de obra por parte de los componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoría revisando así los respectivos cumplimientos de estos componentes, actas de vecindad, uso de los EPP entre otras responsabilidades

COMPONENTE SST

•La interventoría realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

•Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Continuar el avance de obra según lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

•Continuar con el acopio de agregados petreos, cemento para la ejecución de las actividades.

•Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación alcantarilla de 36" vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación de solado para instalación de tubería de 36" vereda la Garza-Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación relleno alcantarilla de 36" vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se reviso y aprobó al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoría

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ORTE DE SANTANDE | SEMANA No.: 3 del 23/08/2024 al 29/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO: N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 666.564.206	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 666.564.206	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.090.181,87	2,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31.674.934,40	4,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 16.584.752,53	2,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.090.181,87	2,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43.648.961,00	6,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 28.558.779,14	4,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.317.636,40	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.481.100,40	3,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.879,78	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 2,26% | Avance o Atraso Físico %: 4,28%
Meta Física Ejecutada %: 6,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,31	0,31	31%
					Ejec	0,31	0,31	31%
* Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	1,00	1,00	25,00%
					Ejec	2,00	2,00	50,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	15460,91			Prog			
					Ejec			
Señalización vertical.	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1500,05			Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra revision de documentos preconstructivos presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

se envian documentos revisados con sus respectivas observaciones para subsanacion por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista continua realizando acopio de materiales de obra: subbase, triturado, arena, cemento.

Se inicia la construccion de la segunda alcantarilla de 36", previamente aprobada por la interventoria.

Se verifica la ubicación de la segunda alcantarilla, para recomendaciones al desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista.

Se dan recomendaciones teniendo en cuenta de los componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoria revisando asi los respectivos cumplimientos de estos componentes, actas de vcindad, uso de los EPP entre otras responsabilidades

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el avance de obra segun lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

_Continuar con el acopio de agregados petreos,cemento para la ejecución de las actividades.

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



excavacion caja de encole alcantarilla de 36" vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



instalacion de acero caja de encole para alcantarilla 36" vereda la Garza-Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



instalacion concreto 21 Mpa piso caja de encole alcantarilla de 36" vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se reviso y aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 2/08/2024 al 8/08/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 239.420.185,49	32,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 124.318.968,10	17,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (115.101.217,39)	-15,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.485.175,10	30,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 239.420.185,49	32,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.318.968,10	17,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (115.101.217,39)	-15,74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 90.713.754,14	12,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.274.619,00	8,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 32,74% | Avance o Atraso Físico %: -15,74%
Meta Física Ejecutada %: 17,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,30	0,30	30,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	124,41	124,41	32,74%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	1	1	32,74%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
					Ejec	14250	14250,00	84,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargadodor	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1086-24 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-005 "DOCUMENTACIÓN INICIAL".

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Conformación calzada existente.
- Subase Granular.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 08 de agosto de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 32,74% vs 17,00% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 15,74%.

De acuerdo al atraso de obra que se viene presentando, se solicitará al contratista de obra, la entrega de un plan de contingencia en aras de nivelar el atraso que se viene presentando y ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicita al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Durante la semana se realiza recorrido por la obra, donde hace presencia la interventoría y contratista para inspección.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA.
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la presente semana se realizo visita en obra, el persona en obra se encuentra utilizando los elementos de protección personal.
Se esta a la espera que el contratista de obra, realice entrega de los pagos de seguridad social, asi mismo el informe mensual del componente sst.
Se recomienda al contratista de obra, instalar PMT conforme a lo presentado y avalado por esta Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.



INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.



CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los compoenentes de estudios y diseños. Solicitar nuevamente la entrega de documentos pendientes en la etapa de preconstrucción.

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contigencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 9/08/2024 al 15/08/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 332.242.160,19	45,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 147.636.353,10	20,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (184.605.807,09)	-25,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.485.175,10	30,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 332.242.160,19	45,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 147.636.353,10	20,19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (184.605.807,09)	-25,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 92.821.974,70	12,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.317.385,00	3,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 45,43% | Avance o Atraso Físico %: -25,25%
Meta Física Ejecutada %: 20,19%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
						Ejec	0,30	0,30	30,00%
*	Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	172,64	172,64	45,43%
						Ejec			
*	Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	1	1	45,43%
						Ejec	3	3	100,00%
*	Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
						Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
						Prog			
						Ejec			
*						Prog			
						Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargadodor	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales pétreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se realizó la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1142-24 - REVISION No. 2 COMPONENTE TOPOGRAFICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1143-24 - REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Subbase Granular.
- Concreto 14 Mpa - para obra de drenaje transversal.
- Concreto resistencia 21 Mpa para obras de drenaje transversal.
- Acero de refuerzo para obras de drenaje transversal.
- Conformación calzada existente.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 15 de agosto de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 45,43% vs 20,19% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 25,24%.

De acuerdo al atraso de obra que se viene presentando, se solicitará al contratista de obra, la entrega de un plan de contingencia en aras de nivelar el atraso que se viene presentando y ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicita al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría está ala espera de la documentación de inicio de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecución de la obra, registro fotográfico, anotaciones diarias en la bitácora de obra, revisión de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VACEO EN CONCRETO DE 21MPA PARA CAJA DE DESCOLE - OBRA DE DRENAJE TRASNVERSAL



FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA OBRA DE DRENAJE TRASNVERSAL.



CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los componentes de estudios y diseños.

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contingencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 10 del 16/08/2024 al 22/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 420.186.119,53	57,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 183.463.361,10	25,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (236.722.758,43)	-32,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.141.958,50	50,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 420.186.119,53	57,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 183.463.361,10	25,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (236.722.758,43)	-32,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.943.959,34	12,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.827.008,00	4,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 57,46% | Avance o Atraso Físico %: -32,37%
Meta Física Ejecutada %: 25,09%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	218,34	218,34	57,46%
					Ejec	15,00	15,00	3,95%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	2	2	57,46%
					Ejec	3	3	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
*					Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargadodor	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1143-24 - REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Acero de refuerzo para la placa huella.
- Concreto resistencia 21 Mpa para riostras y huellas.
- Concreto Resistencia 14 MPa para piedra pegada.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 22 de agosto de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 57,46% vs 25,09% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 32,37%.

De acuerdo al atraso de obra que se viene presentando, se solicitará al contratista de obra, la entrega de un plan de contingencia en aras de nivelar el atraso que se viene presentando y ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Durante la verificación del avance de obra fisica, se ha solicitado al contratista de obra, evaluar los rendimientos de obra y si es el caso solicitar prórroga de tiempo con sus respectivos soportes.

Se solicita al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:
1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoria está ala espera de la documentación de inicio de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPA PARA HUELLAS.



ENSAYO DE DENSIDAD PARA EL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.



VERIFICACIÓN AVANCE DE OBRA FISICO, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los compoenentes de estudios y diseños.

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contigencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 11 del 23/08/2024 al 29/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 510.362.208,68	69,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 282.536.337,10	38,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (227.825.871,58)	-31,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.141.958,50	50,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 510.362.208,68	69,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 282.536.337,10	38,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (227.825.871,58)	-31,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 90.176.089,15	12,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 99.072.976,00	13,55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.880	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 69,79% | Avance o Atraso Físico %: -31,16%
Meta Física Ejecutada %: 38,64%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	265,20	265,20	69,79%
					Ejec	102,00	102,00	26,84%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	2	2	69,79%
					Ejec	3	3	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
*					Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargadodor	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1143-24 - REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Acero de refuerzo para la placa huella.
- Concreto resistencia 21 Mpa para riostras y huellas.
- Concreto Resistencia 14 MPa para piedra pegada.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 29 de agosto de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 69.79% vs 38.64% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 31.15%.

De acuerdo al atraso de obra que se viene presentando, se solicitará al contratista de obra, la entrega de un plan de contingencia en aras de nivelar el atraso que se viene presentando y ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Durante la verificación del avance de obra física, se ha solicitado al contratista de obra, evaluar los rendimientos de obra y si es el caso solicitar prórroga de tiempo con sus respectivos soportes.

Se solicita al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría está a la espera de la documentación de inicio de obra y el informe del mes de agosto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO PARA CORROBORAR LA RESISTENCIA



VACEO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los compoenentes de estudios y diseños.

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contigencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 12 del 2/08/2024 al 9/08/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.054,59	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 537.329.858,36	89,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 436.985.590,12	72,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (100.344.268,24)	-16,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 537.329.858,36	89,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 448.959.616,72	74,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (88.370.241,64)	-14,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.313.159,73	6,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.885.222,84	9,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,29%
Meta Física Ejecutada % 74,61%
Avance o Atraso Físico % -14,69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	50,00	50	100,00	10000%
					Ejec	0,52	0,25	0,77	77%
* Construcción De Placa Huella	ML	300			Prog	172,00	128	300,00	100,00%
					Ejec	170,00		170,00	56,67%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
					Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
					Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	14,29	14,29		89,29%
					Ejec				
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1227,94		1227,94	89,29%
					Ejec	998,63		998,63	72,62%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra en revisión el balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

_GIC-INVIAS-NTS-1082-24 ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 01 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista continua realizando instalación del acero de refuerzo 60000 psi de placa huella tramo 1

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa con descarga de piedra en elementos de huellas tramo 1..

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes y el respectivo uso de los EPP.

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el corte figurado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella.

_Continuar con los distintos suministros de agregados petreos, agua y cemento para la ejecución de las actividades

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Huellas construidas en concreto ciclopeo con instalación de piedra redonda. Cto. CD-FC-081-2023



Placa Huella construida tramo 1 vereda la Aradita Cto. CD-FC-081-2023



placa huellas construida tramo 1 Vereda La Aradita. Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se le aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

la interventoria le parobo al contratista prorroga por un (1) mes para teiminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido q a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarollen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 13 del 9/08/2024 al 15/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 480.309.459,46	79,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 448.959.616,72	74,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (31.349.842,74)	-5,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 480.309.459,46	79,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 460.933.643,32	76,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19.375.816,13)	-3,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.313.159,73	6,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.885.222,84	9,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,82% | Avance o Atraso Físico %: -3,22%
Meta Física Ejecutada %: 76,60%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	50,00	50	100,00	10000%
						Ejec	0,52	0,25	0,77	77%
*	Construcción De Placa Huella	ML	300			Prog	172,00	128	300,00	100,00%
						Ejec	170,00	30	200,00	66,67%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
						Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
*	Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
						Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
	Señalización vertical.	UND	16			Prog	12,77	12,77		79,82%
						Ejec				
*	Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1097,63		1097,63	79,82%
						Ejec	1025,99		1025,99	74,61%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra en revisión el balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

_GIC-INVIAS-NTS-1082-24 ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 09 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista continua realizando instalación del acero de refuerzo 60000 psi de placa huella tramo 2

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa con descarga de piedra en elementos de cuneta tramo 2

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes y el respectivo uso de los EPP.

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el corte figurado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella tramo 2.

_Continuar con los distintos suministros de agregados petreos, agua y cemento para la ejecución de las actividades

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



construccion de cunetas en concreto 21 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



chequeo ancho de placahuella 4,1 m tamo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



descole alcantarilla de 36" tramo 2 vereda la Aradita parte baja. Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se le aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

la interventoria le parobo al contratista prorroga por un (1) mes para teiminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido q a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarollen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 14 del 15/08/2024 al 22/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 517.593.750,51	86,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 488.200.209,78	81,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.393.540,72)	-4,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 517.593.750,51	86,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 500.174.236,39	83,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.419.514,12)	-2,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.313.159,73	6,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.885.222,84	9,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 86,01% | Avance o Atraso Físico %: -2,89%
Meta Física Ejecutada %: 83,12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	50,00	50	100,00	10000%
					Ejec	0,52	0,25	0,77	77%
* Construcción De Placa Huella	ML	300			Prog	172,00	128	300,00	100,00%
					Ejec	170,00	30	200,00	66,67%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
					Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
					Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	13,76	13,76		86,01%
					Ejec				
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1182,84		1182,84	86,01%
					Ejec	1115,67		1115,67	81,13%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra en revisión el balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

organización de documentos y anexos presentados por el contratista com´ponentes, tecnico, ambiental, scocial y de seguridad

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 15 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista continua realizando instalación del acero de refuerzo 60000 psi de placa huella tramo 2

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa con descarga de piedra en elementos de cuneta tramo 2 2

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes y el respectivo uso de los EPP.

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el corte figurado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella tramo 2.

_Continuar con los distintos suministros de agregados petreos, agua y cemento para la ejecución de las actividades

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



acero de refuerzo, construccion de cunetas en concreto 21 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



instalacion de acero de refuerzo sobreancho curva tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



concreto 21 Mpa sobreancho tramo 2 vereda la Aradita parte baja. Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se le aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

La interventoria le aprobo al contratista prorroga por un (1) mes para terminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarollen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 15 del 23/08/2024 al 30/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL: $ 601.770.256,56	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 601.770.256,56	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 521.941.453,36	86,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 514.072.891,74	85,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.868.561,62)	-1,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 521.941.453,36	86,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.046.918,34	87,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.105.464,98	0,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.313.159,73	6,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.885.222,84	9,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.879,78	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 86,73%
Meta Física Ejecutada % 87,42%
Avance o Atraso Físico % 0,68%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	50,00	50	100,00	100%
					Ejec	0,52	0,25	0,77	77%
* Construcción De Placa Huella	ML	300			Prog	172,00	128	300,00	100,00%
					Ejec	172,00	60	232,00	77,33%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
					Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
					Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	13,88	13,88		86,73%
					Ejec				
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1192,77		1192,77	86,73%
					Ejec	1174,79		1174,79	85,43%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ revisión de documentosy anexos del balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

organización de documentos y anexos presentados por el contratista com´ponentes, tecnico, ambiental, scocial y de seguridad

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

El contratista continua realizando instalación del acero de refuerzo 60000 psi de placa huella tramo 2

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa placahuella y elementos de cuneta y vgas riostras tramo 2 2

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes y el respectivo uso de los EPP.

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar la instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella tramo 2.

_Continuar con el suminuistro de agregados petreos y cemento para la ejecución de las actividades

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



instalacion de concreto 14 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



instalacion de acero de refuerzo, tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



concreto 21 Mpa huellas tramo 2 vereda la Aradita parte baja. Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se le aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

la interventoria le parobo al contratista prorroga por un (1) mes para teiminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido q a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarollen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 13 del 2/08/2024 al 9/08/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-082-2023	VALOR INICIAL:	$ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.544.501.856,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.433.663.054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 473.270.433,75	89,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 298.383.371,53	56,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (174.887.062,22)	-33,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.907.011,68	1,69%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 473.270.433,75	89,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 307.290.383,21	58,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (165.980.050,54)	-31,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.299.000,00	8,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.978.768,64	6,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobavión u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89,69% | Avance o Atraso Físico %: -31,45%
Meta Física Ejecutada %: 58,23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100,00%
					Ejec	0,62	0,62	62,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	100,00	100,00	35,71%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	9,87	9,87	89,69%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	1002,81	1002,81	89,69%
					Ejec	876,83	876,83	78,42%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

_GIC-INVIAS-NTS-1084-24 - APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD - HERRAN

_GIC-INVIAS-NTS-1083-24 - ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

_GIC-INVIAS-NTS-1078-24 - RESPUESTA OFICIO N. 007– CD - 082 – 2023 - 002, CONTRATO No. CD-FC-082- 2023. APROBACIÓN

_GIC-INVIAS-NTS-1091-24 - APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 19 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2024

_Durante la semana se han presentado lluvias de media y alta intensidad lo cual ha generado diversas afectaciones Hidrologicas y topograficas dificultando el acceso de los materiales, suministros y demas elementos o herramientas necesarias para la ejecución adecuada de las actividades de obra lo cual a su vez se encuentra relacionada directamente con la afectación de los rendimientos y el avance considerable de la ejecución del proyecto

_En obra se evidencio por parte del interventor instalacion de subbase asi mismo construccion de placahuella en un tramo de 30 mts 30

_La interventoria realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos realizados en la construcción de las huellas en concreto ciclopeo con el descargue de piedra redonda seleccionada pero debido a las dificultades del suministro de materiales se ha afectados los rendimientos, asi mismo se le manifiesta al contratista de obra implementar las medidas adecuadas con el fin de prevenir afectaciones futuras debido a que se presenta un atraso considerable con respecto a las actividades ejecutadas y las programadas el cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e informacion presentada en el informe del mes de julio y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.

_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias co respecto a la construccion dela placa huella, revision de documentacion presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Realizar las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Aunar esfuerzos y tomar mdidas estrategicas adecuadas para la ejecución de los transportes de los suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua para la ejcución de las actividades

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emitición de conceptos sobre el balance financiero y el alcance fisico definito.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HHERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HHERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HHERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecucuon de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 14 del 9/08/2024 al 15/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-082-2023	VALOR INICIAL:	$ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 381.186.853,15	72,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 373.383.371,53	70,76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.803.481,62)	-1,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.907.011,68	1,69%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 381.186.853,15	72,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 382.290.383,21	72,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.103.530,06	0,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.299.000,00	8,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.978.768,64	6,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobavión u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,24% | Avance o Atraso Físico %: 0,21%
Meta Física Ejecutada %: 72,45%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	0,62	0,62	62,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	150,00	150,00	53,57%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
*					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	7,95	7,95	72,24%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	807,70	807,70	72,24%
					Ejec	876,83	876,83	78,42%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

Se hacen anotaciones en bitacora del estado del tiempo,se presentan lluvias constantes, el clima en esta zona esmuy variable, como consecuencia de esta situacion se presenta atraso de obra de acuerdoal cronograma establecido

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 9 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024

_Durante la semana se han presentado lluvias de media intensidad lo cual ha generado afectaciones, dificultando el acceso de los materiales, suministros y demas elementos o herramientas necesarias para la ejecución adecuada de las actividades de obra lo cual a su vez se encuentra relacionada directamente con la afectación de los rendimientos y el avance considerable de la ejecución del proyecto

_En obra se evidencio por parte del interventor instalacion de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, en un tramo de 60 mts

_La interventoria realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos realizados en la construcción de las huellas en concreto ciclopeo con el descargue de piedra redonda seleccionada pero debido a las dificultades del suministro de materiales se ha afectados los rendimientos, asi mismo se le manifiesta al contratista de obra implementar las medidas adecuadas con el fin de prevenir afectaciones futuras debido a que se presenta un atraso considerable con respecto a las actividades ejecutadas y las programadas el cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e informacion presentada en el informe del mes de julio y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.

_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias co respecto a la construccion dela placa huella, revision de documentacion presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Realizar las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Aunar esfuerzos y tomar mdidas estrategicas adecuadas para la ejecución de los transportes de los suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua para la ejcución de las actividades

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emitición de conceptos sobre el balance financiero y el alcance fisico definito.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecucuon de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 15 del 16/08/2024 al 22/08/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-082-2023 | VALOR INICIAL: $ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14 DE AGOSTO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A -
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 412.409.786,42	78,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 406.617.324,30	77,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.792.462,12)	-1,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 8.907.011,68	1,69%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 412.409.786,42	78,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 415.524.335,98	78,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.114.549,56	0,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.299.000,00	8,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.978.768,64	6,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobavión u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 78,15% | Avance o Atraso Físico %: 0,59%
Meta Física Ejecutada %: 78,74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	0,62	0,62	62,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	180,00	180,00	64,29%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	8,60	8,60	78,15%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	873,86	873,86	78,15%
					Ejec	876,83	876,83	78,42%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 280 m | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicitó mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos y anexos a informes entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

_Se hacen anotaciones en bitacora del estado del tiempo,se presentan lluvias constantes, el clima en esta zona esmuy variable, como consecuencia de esta situacion se presenta atraso de obra de acuerdo al cronograma establecido

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024

_Durante la semana se han presentado lluvias de media intensidad lo cual ha generado algunos retrasos, dificultando el desarrollo de las actividades programadas, dificultad en los suministros y demas elementos o herramientas necesarias para la ejecución adecuada de las actividades de obra y el avance normal de la ejecución del proyecto

_En obra se evidencio por parte del interventor instalacion de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, en un tramo de 60 mts y construccion de cunetas.

_La interventoria realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos realizados en la construcción de las huellas en concreto ciclopeo con el descargue de piedra redonda seleccionada pero debido a las dificultades del suministro de materiales se ha afectados los rendimientos, asi mismo se le manifiesta al contratista de obra implementar las medidas adecuadas con el fin de prevenir afectaciones futuras debido a que se presenta un atraso considerable con respecto a las actividades ejecutadas y las programadas el cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e informacion presentada en el informe del mes de agosto y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.

_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias co respecto a la construccion dela placa huella, revision de documentacion presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


_Realizar las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Aunar esfuerzos y tomar mdidas estrategicas adecuadas para la ejecución de los transportes de los suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua para la ejcución de las actividades

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emitición de conceptos sobre el balance financiero y el alcance fisico definito.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA
MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA
MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA
MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecucuon de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 23/08/2024 al 30/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES			
INTEGRANTES:				
CONTRATO No.	CD-FC-082-2023	VALOR INICIAL:	$	527.697.300,22
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$	-
			$	-
			$	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:				
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A
		VALOR AMORTIZADO:		N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 432.058.539,80	81,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 417.476.359,85	79,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.582.179,95)	-2,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.907.011,68	1,69%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 432.058.539,80	81,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 426.383.371,53	80,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.675.168,27)	-1,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.299.000,00	8,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.978.768,64	6,44%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobavión u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.879,78	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 81,88% | Avance o Atraso Físico %: -1,08%
Meta Física Ejecutada %: 80,80%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	0,62	0,62	62,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	223,00	223,00	79,64%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	9,01	9,01	81,88%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	915,49	915,49	81,88%
					Ejec	876,83	876,83	78,42%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 280 m
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos y anexos a informes entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

Se hacen anotaciones en bitacora del estado del tiempo,se presentan lluvias constantes, el clima en esta zona esmuy variable, como consecuencia de esta situacion se presenta atraso de obra de acuerdoal cronograma establecido

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

_Durante la semana se han presentado lluvias de media intensidad lo cual ha generado algunos retrasos, dificultando el desarrollo de las actividades programadas, dificultad en los suministros y demas elementos o herramientas necesarias para la ejecución adecuada de las actividades de obra y el avance normal de la ejecución del proyecto

_En obra se evidencio por parte del interventor instalacion de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, en un tramo de 60 mts y construccion de cunetas.

_La interventoria realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos realizados en la construcción de las huellas en concreto ciclopeo con el descargue de piedra redonda seleccionada pero debido a las dificultades del suministro de materiales se ha afectados los rendimientos, asi mismo se le manifiesta al contratista de obra implementar las medidas adecuadas con el fin de prevenir afectaciones futuras debido a que se presenta un atraso considerable con respecto a las actividades ejecutadas y las programadas el cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e informacion presentada en el informe del mes de agosto y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.

_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias co respecto a la construccion dela placa huella, revision de documentacion presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Realizar las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Aunar esfuerzos y tomar mdidas estrategicas adecuadas para la ejecución de los transportes de los suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua para la ejcución de las actividades

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emitición de conceptos sobre el balance financiero y el alcance fisico definito.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE BORDILLO PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HHERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE BORDILLO PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HHERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HHERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecucuon de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecíficas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 2/08/2024 al 8/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA , MUNICIPIO PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-PAMPLONITA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA DIVIDIDA EN TRES TRAMOS: TRAMO No.1 DE 155 MTEROS LINEALES, TRAMO No.2 DE 31 METROS LINEALES CORRESPONDIENTA UNA CURVA Y TRAMO No.3 DE 116 METROS LINEALES.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-054-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.245.837,49
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE JULIO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.245.837,49
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE AGOSTO 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 620.245.837	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 620.245.837	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.245.837,49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 598.893.819,24	96,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 568.360.784,73	91,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30.533.034,51)	-4,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.998.480,00	2,42%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 598.893.819,24	96,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 583.359.264,73	94,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.534.554,51)	-2,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.552.018,25	3,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.552.018,25	3,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista de obra presenta la entrega del flujo de caja y cronograma ajustado a l prorroga del plazo contractual del contrato de obra No, CD-FC-054-2023. el cual a sido revisado y avalado por parte del interventor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97,59% | Avance o Atraso Físico %: -3,54%
Meta Física Ejecutada %: 94,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,97	0,97	96,56%
					Ejec	0,58	0,58	58,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	302			Prog	300,00	300,00	99,34%
					Ejec	276,74	276,74	91,63%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,00	2,00	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16699,60			Prog	16124,72	16124,72	96,56%
					Ejec	16699,60	16699,60	100,00%
Señalización Vertical	UND	8			Prog	7,72	7,72	96,56%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	5180,94			Prog	5002,59	5002,59	96,56%
					Ejec	4747,54	4747,54	92%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación. El contatista presenta la modificación y balance financiero definitivo de cantidades

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Motoniveladora	1	100%
Vibro compactador	1	100%
Vibrador para concreto	1	100%
Mezcladora de concreto	1	100%
Volquetas	1	100%
Herramienta menor	1	100%
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 155 ml | TRAMO Y/O SECTOR 2: 31 ml
TRAMO Y/O SECTOR (n): 116 ml

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Durante la semana se encuentran en revisión por parte de la interventoria los documentos entregados por el contratista para emisión de conceptos y sigue pendiente la entrega de la documentacin faltante del componente SST.

*El contratista de obra realiza la entrega del acta parcial para revisión y concepto por pate del interventor.

*GIC-INVIAS-NTS-1071-24 - RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO SOLICITUD DE PRÓRROGA AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CD-FC-054-2023.

*GIC-INVIAS-NTS-1068-24 - REVISION No.2 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO DE PAMPLONITA FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 02 AGOSTO DEL 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024

Durante este periodo el contratista viene realizando las siguientes actividades:

_Se continua realizando activdades de corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo para elementos de placa huella primer tramo.
_Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa en la construcción de la placa huella del tramo 1, cunetas, bordillos y vigas riostras.
_Se realizan las excavaciones de vigas riostras y bordillos primer tramo.
_Se realiza construcción de huellas en concreto ciclopeo con instalación de piedra pegada primer tramo.
_Se realizan chequeos de medidas, espesores, longitudes y verificación de cumplimiento de las especificaciones tecnicas por parte de la interventoria

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoria realiza visita de obra para verificar el cumplimiento del componente sst y se solicita al contratista de obra la entrega de docuntos y soportes anexos a informe componentes ambiental, social y de seguridad..

COMPONENTE SOCIAL

_•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. La documentación inicial
2. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA.
3.. Las actas de vecindad.
4. Las evidencias fotográficas.
5. El informe mensual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


_Realizar el vaciado de concreto reforzado y ciclopeo, realizar instalacion del acero y descarga de piedra redonda.

_Continuar con la instalación del acero de cada uno de los elementos que conforman la construcción del metraje faltante de placa huella.

_Continuar realizando los chequeos por parte del interventor

_Entregar los documentos pendientes por el contratista de obra para revisión y concepto por parte del interventor.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vaciado de concreto de resistencia de 21 Mpa de en tramo 1. CD-FC-054-2023



Avance en metraje lineal de elementos construidos. Tramo 1 Contrato de obra. CD-FC-054-2023



concreto de 3000 Mpa Placa huella curva del tramo 1.Contrato de obra. CD-FC-054-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista mejorar el avance de obra puesto que el porcentaje de atraso presentado a la fecha supere el 4,9% y se requiere garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 17 del 9/08/2024 al 15/08/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA , MUNICIPIO PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-PAMPLONITA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA DIVIDIDA EN TRES TRAMOS: TRAMO No.1 DE 155 MTEROS LINEALES, TRAMO No.2 DE 31 METROS LINEALES CORRESPONDIENTA UNA CURVA Y TRAMO No.3 DE 116 METROS LINEALES.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-054-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.245.837,49
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE JULIO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.245.837,49
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE AGOSTO 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 620.245.837	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 620.245.837	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.245.837,49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 611.931.998,24	98,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 604.774.154,73	97,51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.157.843,51)	-1,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.998.480,00	2,42%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 611.931.998,24	98,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 619.772.634,73	99,92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.840.636,49	1,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.552.018,25	3,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.552.018,25	3,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista de obra presenta la entrega del flujo de caja y cronograma ajustado a l prorroga del plazo contractual del contrato de obra No, CD-FC-054-2023. el cual a sido revisado y avalado por parte del interventor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 99,00%
Meta Física Ejecutada %: 99,92%
Avance o Atraso Físico %: 0,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,99	0,99	98,66%
					Ejec	0,58	0,58	58,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	302			Prog	300,00	300,00	99,34%
					Ejec	294,47	294,47	97,51%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,00	2,00	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16699,60			Prog	16475,76	16475,76	98,66%
					Ejec	16699,60	16699,60	100,00%
Señalización Vertical	UND	8			Prog	7,89	7,89	98,66%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	5180,94			Prog	5111,49	5111,49	98,66%
					Ejec	5051,70	5051,70	98%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación. El contatista presenta la modificación y balance financiero definitivo de cantidades

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Motoniveladora	1	100%
Vibro compactador	1	100%
Vibrador para concreto	1	100%
Mezcladora de concreto	1	100%
Volquetas	1	100%
Herramienta menor	1	100%
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 155 ml
TRAMO Y/O SECTOR (n): 116 ml
TRAMO Y/O SECTOR 2: 31 ml

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Durante la semana se encuentran en revisión por parte de la interventoria los documentos entregados por el contratista para emisión de conceptos y sigue pendiente la entrega de la documentacin faltante del componente SST.

*El contratista de obra manifiesta la entrega final la semana 18-22 de agosto para revisión, concepto y observaciones por pate de la interventoria.

la interventoria hace seguimiento y control de las actividades desarrolladas deacuerdo a las especificaciones y normas

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 09 AGOSTO DEL 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

Durante este periodo el contratista viene realizando las siguientes actividades:

_Se continua realizando actividades de armado e instalación del acero de refuerzo para elementos de placa huella primer tramo.
_Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa en la construcción de la placa huella del tramo 1, cunetas y vigas riostras.
_Se realizan las excavaciones de vigas riostras y bordillos primer tramo.
_Se realiza construcción de huellas en concreto ciclopeo con instalación de piedra pegada primer tramo.
_Se realizan chequeos de medidas, espesores, longitudes y verificación de cumplimiento de las especificaciones tecnicas por parte de la interventoria

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoria realiza visita de obra para verificar el cumplimiento del componente sst y se solicita al contratista de obra la entrega de docuntos y soportes anexos a informe componentes ambiental, social y de seguridad..

COMPONENTE SOCIAL

_•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•Se le recomienda al contratista enviar documentos
2. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA.
3.. Las actas de vecindad.
4. Las evidencias fotográficas.
5. El informe mensual.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar con la instalación del acero de cada uno de los elementos que conforman la construcción del metraje faltante de placa huella.

_Continuar realizando los chequeos por parte del interventor

_Entregar los documentos pendientes por el contratista de obra para revisión y concepto por parte del interventor.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vaciado de concreto de resistencia de 21 Mpa de en tramo 1. CD-FC-054-2023



elementos construidos placa huella. Tramo 1 Contrato de obra. CD-FC-054-2023



concreto de 3000 Mpa Placa huella curva del tramo 1.Contrato de obra. CD-FC-054-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 18 del 16/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA , MUNICIPIO PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-PAMPLONITA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA DIVIDIDA EN TRES TRAMOS: TRAMO No.1 DE 155 MTEROS LINEALES, TRAMO No.2 DE 31 METROS LINEALES CORRESPONDIENTA UNA CURVA Y TRAMO No.3 DE 116 METROS LINEALES.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-054-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.245.837,49	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE JULIO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.245.837,49	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE AGOSTO 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 620.245.837	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 620.245.837	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.245.837,49	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 620.245.837,49	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 620.245.837,49	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.998.480,00	2,42%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 620.245.837,49	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 635.244.317,49	102,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.998.480,00	2,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.552.018,25	3,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.552.018,25	3,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista de obra presenta la entrega del flujo de caja y cronograma ajustado a l prorroga del plazo contractual del contrato de obra No, CD-FC-054-2023. el cual a sido revisado y avalado por parte del interventor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % 2,42%
Meta Física Ejecutada % 102,42%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	302			Prog	302,00	302,00	100,00%
					Ejec	302,00	302,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,00	2,00	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16699,60			Prog	16699,60	16699,60	100,00%
					Ejec	16699,60	16699,60	100,00%
Señalización Vertical	UND	8			Prog	8,00	8,00	100,00%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	5180,94			Prog	5180,94	5180,94	100,00%
					Ejec	5180,94	5180,94	100%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación. El contatista presenta la modificación y balance financiero definitivo de cantidades

TRAMO Y/O SECTOR 1: 155 ml
TRAMO Y/O SECTOR (n): 116 ml
TRAMO Y/O SECTOR 2: 31 ml

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Motoniveladora	1	100%
Vibro compactador	1	100%
Vibrador para concreto	1	100%
Mezcladora de concreto	1	100%
Volquetas	1	100%
Herramienta menor	1	100%
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Durante la semana se encuentran en revisión por parte de la interventoria los documentos entregados por el contratista para emisión de conceptos.

*El contratista de obra manifiesta la entrega final la semana 15-22 de agosto 2024 para revisión, concepto y observaciones por parte de la interventoria.

La interventoria hace seguimiento y control de las actividades desarrolladas de acuerdo con las especificaciones y normas

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 16 AGOSTO DEL 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024

Durante este periodo el contratista viene realizando las siguientes actividades:

_Se continua realizando actividades de armado e instalación del acero de refuerzo para elementos de placa huella primer tramo.
_Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa en la construcción de la placa huella del tramo 1, cunetas y vigas riostras.
_Se realizan las excavaciones de vigas riostras y bordillos primer tramo.
_Se realiza construcción de huellas en concreto ciclopeo con instalación de piedra pegada primer tramo.
_Se realizan chequeos de medidas, espesores, longitudes y verificación de cumplimiento de las especificaciones tecnicas por parte de la interventoria

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoria realiza visita de obra para verificar el cumplimiento del componente sst y se solicita al contratista de obra la entrega de docuntos y soportes anexos a informe componentes ambiental, social y de seguridad..

COMPONENTE SOCIAL

_•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•Se le recomienda al contratista enviar documentos
2. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA.
3.. Las actas de vecindad.
4. Las evidencias fotográficas.
5. El informe mensual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar realizando los chequeos por parte del interventor

_Realizar seguimiento a la entregar los documentos pendientes por el contratista de obra para revisión y concepto por parte del interventor.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vaciado de concreto de resistencia de 21 Mpa de en tramo 1. CD-FC-054-2023



construccion placa huella. Tramo 1 Contrato de obra. CD-FC-054-2023



concreto de 21 Mpa y 14 Mpa Placa huella tramo 1.Contrato de obra. CD-FC-054-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista garantizo la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

El contratista de obra, garantizo el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 61 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.010.861,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		-$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.642.442.323,92	97,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.601.184.885,32	96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (41.257.438,60)	-1,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.642.442.323,92	97,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.613.584.505,68	96,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28.857.818,24)	-1,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.089.552,62	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.211.972,28	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 99% Avance o Atraso Físico % -3%
Meta Física Ejecutada % 97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1692			Prog	1661,7				98,2%
					Ejec	1566,39				92,6%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
MEZCLADORA	1	1
MINICARGADOR		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN Vereda el Hatillo y la Madera	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL SI	X X	NO NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL SI		NO NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 , 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:

La interventoría durante la semana recibió informe del mes de julio

La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1117-24, APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4
GIC-INVIAS-NTS-1118-24, APROBACIÓN INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.
GIC-INVIAS-NTS-1119-24, APROBACIÓN INFORME MES DE JULIO DE 2024, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continua con actividades de fundida de secciones en concretos de 21mpa y 14 mpa para placa huella en el tramo 3 en el PR4 +862 AL PR4+768, ademas se continua en actividades de corte, figurado e instalacion de acero.

ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•El lunes 5 de agosto se aprueba el informe mes de Julio del municipio de Ocaña, Buenavista. Asimismo, se envía al correo oficio y documentación del informe trimestral y Balance de Estado Social del proyecto, para recibir correcciones o subsanar lo pendiente por parte de Invias.

ACTIVIDADES AMBIENTALES


* La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecucion de la obra, se entabla diálogo con él encargado del Área Ambiental, quien manifiesta que la obra se suspendió por un tiempo y a la fecha después de iniciar No tiene mayor información de este componente.

* Se le solicita al contratista verificar la información que no se ha presentado hasta la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado e instalacion de acero, vaciado de huella y cunetas según diseño de 14 mpa y 21 mpa .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR4+820 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA



TRAMO 3 PR4+0810 ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ACEROS



TRAMO 3 PR4+0770 ACTIVIDAD DE CICLOPEO DE 14 MPA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 62 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.010.861,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		-$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.669.531.876,54	98,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.635.529.832,58	98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (34.002.043,96)	-1,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.669.531.876,54	98,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.647.929.452,94	98,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.602.423,59)	-0,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.089.552,62	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.344.947,26	1,27%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.871.709.974,49	76,57%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -3%
Meta Física Ejecutada % 97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1692			Prog	1680,6				99,3%
					Ejec	1566,39				92,6%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
MEZCLADORA	1	1
MINICARGADOR		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 , 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana recibió informe del mes de julio y se dió aprobación
La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realizan actividades de fundida de secciones en concretos de 21mpa y 14 mpa para placa huella en el tramo 3 en el PR4 +862 AL PR4+768 y cunetas de 21 mpa según diseño establecidos en la cartilla de colombia rural, ademas se continua en actividades de corte, figurado e instalacion de acero y adecuacion de cunetas

ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de posibles correcciones por parte de Invias de la documentación del informe trimestral y Balance de Estado Social del proyecto para poder subsanar.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecucion de la obra, se entabla diálogo con él encargado del Área Ambiental, quien manifiesta que la obra se entregan informes trimestrales, lo que para este periodo seria Julio y Agosto, a la fecha después de iniciar No tiene mayor información de este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado e instalacion de acero, vaciado de huella y cunetas según diseño de 14 mpa y 21 mpa .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR4+862 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14 MPA



TRAMO 3 PR4+0780 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA



TRAMO 3 PR4+0770 ACTIVIDAD DE ACEROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 63 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.010.861,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.685.967.081,00	99,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.678.555.010,37	99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.412.070,63)	-0,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.685.967.081,00	99,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.690.954.630,73	99,7%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.987.549,73	0,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.435.204,46	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.025.177,79	1,59%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.871.709.974,49	76,57%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %: -3%
Meta Física Ejecutada %: 97%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	1	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,98				98%
*	Placa Huellas	ml	1692			Prog	1692,0				100,0%
						Ejec	1566,39				92,6%
*	Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
						Ejec	8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 . 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana envío oficio integral con solicitud de entrega del informe del mes de agosto

La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1179-24, SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se finalizaalizan actividades de fundida de secciones en concretos de 21mpa y 14 mpa para placa huella en el tramo 3 en el PR4 +862 AL PR4+768 y cunetas de 21 mpa según diseño establecidos en la cartilla de colombia rural, ademas se continua en actividades de sello de junta del PR4+910 al PR 4+768.

ACTIVIDADES SOCIALES


•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de posibles correcciones por parte de Invias de la documentación del informe trimestral y Balance de Estado Social del proyecto para poder subsanar.
•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de información documental por parte del profesional social del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con actividades de sello de junta en el tramo 3.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR4+862 ACTIVIDAD DE ADECUACION DE CUNETAS



TRAMO 3 PR4+0862 ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA



TRAMO 3 PR4+0862 ACTIVIDAD DE SELLO DE JUNTAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 62 del 2/08/2024 al 8/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | GOBERNACION - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.232.011.511,44	60,55%	ok
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.684.511.919,80	45,48%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.547.499.591,63)	-15,08%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	80,68%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.232.011.511,44	60,55%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.897.938.039,39	46,74%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.334.073.472,04)	-13,81%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.361.168.571,59	8,06%	ok
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 243.309.028,34	1,44%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-5 del 25/07/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 1.565.952.191,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 59,80% | Avance o Atraso Físico % -10,72%
Meta Física Ejecutada % **49,08%**

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	90,00%				90,00%	1,09%
					Ejec	93,10%				93,10%	1,1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	278,03	625,33	239,31	364,5	1507,19	12,10%
					Ejec	307	547,00	173,4	370,40	1397,80	11,22%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	2,91	9,54	2,50	7,47	22,42	4,41%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,63%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,87			Prog	15917,42	11505,25	10713,54	5944,56	44080,77	1,15%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,26	1,08%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog	210,00	406,30	288,24	155,14	1059,69	9,0%
					Ejec	218,9	298	183	312	1011,90	8,6%
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	3,43	7,47	4,63	5,54	21,07	4,32%
					Ejec	0	1	0,5	0,3	1,80	0,37%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523,93			Prog	6265,02	17912,66	10161,08	8813,17	43151,92	1,13%
					Ejec	0	0	10218,38	8998,80	19217,18	0,50%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	593,20	247,70	315,7		1156,56	8,0%
					Ejec	908,80	696,70	0		1605,5	11,1%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	10,27	7,29	1,72		19,29	3,89%
					Ejec	3	0,5	0		3,5	0,71%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,96			Prog	21615,03	2439,44	13471,02		37525,49	0,98%
					Ejec	15987,00	15573,65	0		31560,65	0,83%
					Prog	0					
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	1454,45				1454,45	11,58%
					Ejec	1545,10				1545,1	12,30%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	3,88				3,88	0,9%
					Ejec	2,00				2,00	0,5%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	144264,35				144264,35	1,23%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,13%
					Prog	0					
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	109	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 145

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
El contratista continua con pendientes a observaciones de estudios y diseños, los cuales se encuentran en proceso de revisión. Una vez verificadas por la interventoría, se emitirá el respectivo concepto sobre las mismas.
Se realiza mesa de trabajo con el fin de verificar cantidades de obra contractuales y alcance de obras adicional con el fin de dar aprobacion por parte de la interventoria a la solicitud de modificacion.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Actualmente se continua sin actividades en las veredas de Helechar, Santo Domingo y Volcán teniendo en cuenta que a la fecha se tiene incomunicado el Municipio de Arboledas con el corregimiento de castro corredor que comunica con las veredas mencionadas.
A continuacion se referencia los frentes de trabajo en ejecucion para el presente Municipio.

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Dando continuidad al tramo en ejecucion se realizan excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostras
Se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella en varillla corrugada de 3/8 de acuerdo a diseños.
Se realiza armado de formaleta de madera a lo largo del tramo dando continuidad a los elementos de franja central y sobreancho con el fin de modular los elementos de viga riostra y huellas.
Con concreto elaborado en obra de 14 Mpa se realiza vaciado del mismo a lo largo del tramo No3 para franja central y sobreancho.
Durante toda la semana el contratista realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en situ para continuidad de cunetas, bordillos, huellas y viga riostra.
A lo largo de la semana, se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa, preparado en obra, en todos los elementos de la placa huella conforme a las especificaciones.
Durante la semana se presentan algunas lluvias en el presente corredor vial las cuales retrasan actividades programadas.

Tramo 2 - Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Chicagua Bajo
Se realiza instalacion de acero de refuerzo, armado de formaleta y vaciado de concreto de 21Mpa para elementos de rampa de acceso sobre el tramo en ejecucion.
Se da continuidad al vaciado de elemento de concreto de 14 Mpa con el fin de modular elementos como viga riostra y huella PR1 +589.
Durante la semana se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillos dando continuidad al mismo dentro del corredor vial en ejecucion.
El contratista mantiene continua las actividades de vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para continuidad de los elementos estructurales.
Se realiza replanteo y compactacion de la subrasante en el tramo No1 con el fin de dar inicio a actividades de ejecucion de placa huella en el presente y tramo.
Se da inicio a actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para viga riostra para el tramo No1.
El contratista tienen proyectado dar inicio de vaciado de concreto de 21 Mpa para la proxima semana.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Dando continuidad con el tramo No2 durante la semana el contratista realiza actvidades de excavacion sin clasificar para elementos de placa huellla.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para elementos de sobreancho, franja central y curvas de transicion.
Se realiza vaciado de elementos de sobreancho y franja central en concreto de 14 Mpa teniendo en cuenta el elemento a modular de placa huella continuo.
Durante la semana se realiza continuamente vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos curva de transicion, huella y viga riostra.

Tramo 1 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros
Durante la semana se continuan actividades de excavacion para el presente tramo y de igual manera una vez conformado se realiza instalacion de subbase granular a lo largo del tramo.
Se continuan las actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversa No3 para los diferentes elementos.
Se continua actividades de vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos a lo largo del tramo No1.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
A continuacion se referencian los frentes de trabajo en ejecucion en el presente Municipio.
Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá
El contratista durante la semana mantiene actividades de ejecucion en la placa huellla a lo largo del tramo No4 PR actual de referencia PR5+622
Se da continuidad al vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo a lo largo del tramo en ejecucion.
Se continua la instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos de viga riostra y huellas.
Se realiza armado de formaleta para elementos de frenja central y sobreanchos a lo largo del tramo No5 en ejecicion.

Tramo 5 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro
Durante la semana se da continuidad en el vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos de placa huella cuneta y boordillo a lo largo del tramo en ejecucion PR de referencia Pr6+820.
Se realiza armado de formaleta de madera para franja central y sobreancho a lo alrgo del tramo en ejecucion No5.
Se realiza insgtalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal No3 para los diferentes elementos de placa huella dando continuidad al tramo de referencia.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de sobreancho y franja central para continuacion de lo elementos de placa huella y asi mismo la modulacion de elementos estructurales.


3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Durante toda la semana se realiza actividades de placa huella en el tramo No1 continuando con un ancho de seccion de 7 metros.
Se continua con el vaciado de elementos de concreto de 21 Mpa (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) a lo largo del tramo en ejecucion PR actual de avance PR0+980.
Se da continuidad con el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de sobreancho en seccion transversal de 7 metros.
Se da continuidad a las actividades de excavacion de la subrasante y de igual manera se continua con el extendido, compactacion y humectacion de subbase granular en el tramo No1 PR0+915.


ACTIVIDADES SOCIALES
Durante la semana se realiza seguimiento y control al cumplimiento de los diferentes programas planificados para el presente contrato.
Se verifica informacion enviada por el contratista de obra referente al informe mensual del presente mes.
ACTIVIDADES SST
Se valida informacion presentada por el contratista con el fin de verificar y validar con lo relacionado por parte de la interventoria.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Se realiza verificacion de informacion enviada por parte del contratista con el fin de dar validacion y/o aprobacion a la misma.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la placa huella en los diferentes frentes de los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



REPLANTEO DE TERRRENO PARA NIVELACION DE SUBRASANTE CHICAGUA BAJO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



LISPIEZA GENERAL DE PLACA HUELLA



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO POCETA ALCANTARILLA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO PARA LOSA DE DESCOLE



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO



VISTA GENERAL TERMINACION CONCRETO DE 21 MPA VEREDA CINERA



VISTA MODULACION CON CONCRETO DE 14 MPA



VISTA GENERAL DE ACTVIDADES



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO POTREROS



VACIADO CONCRETO DE 14 MPA PARA SOBREANCHO



VISTA GENERAL ACTVIDADES EN CAMPO

GRAMALOTE



VISTA GENERAL ACABADO DE CONCRETO SECCION TRANSVERSAAL VEREDA BOYACA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



VISTA GENERAL ACTIVIDADES



VISTA ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL VEREDA SAN ISIDRO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA ELEMENTOS DE FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL

LOS PATIOS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS CENTRO



EXTENDIDO DE GEOTEXTIL 2400 N



VISTA GENERAL DE ACTIVIADES A LA FECHA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se lleva a cabo un seguimiento en campo de cada una de las actividades que se ejecutan, verificando el cumplimiento de todos los componentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 63 del 9/08/2024 al 15/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACION - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.937.427.729,59	32,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.060.301.661,64	32,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 122.873.932,05	0,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 213.426.119,59	30,83%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.937.427.729,59	32,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.273.727.781,23	33,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 336.300.051,64	1,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.489.690,20	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 375.789.741,84	1,54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-5 del 25/07/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 1.565.952.191,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33,57%
Meta Física Ejecutada %: **35,54%**
Avance o Atraso Físico %: 1,97%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo RINCONADA**	**Tramo SANTO DOMINGO**	**Tramo VOLCAN**	**Tramo CHICAGUA BAJO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog	41,54%				41,54%	0,41%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Proq	310,99	631,55	147,24	390,0	1479,80	7,75%
					Ejec	307	547,00	173,4	429,60	1457,00	7,64%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	1,69	0,90	0,87	1,42	4,88	0,58%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,38%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	188,88	258,61	184,83	344,40	976,72	5,54%
					Ejec	218,9	309	183	386,2	1097,10	6,22%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	0,00	0,77	1,06	0,96	2,79	0,34%
					Ejec	0	1	0,5	0,5	2,00	0,25%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo BOYACA**	**Tramo SAN ISIDRO**	**Tramo SANTA ANITA**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	849,39	623,33	2,8		1475,54	6,84%
					Ejec	972,80	760,70	0		1733,5	8,04%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	4,60	0,81	0,11		5,52	0,67%
					Ejec	3	0,5	0		3,5	0,42%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	1505,27				1505,27	9,31%
					Ejec	1613,70				1613,7	9,98%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,44				1,44	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	18	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 141

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se realiza actualizacion presupuestal teniendo en cuenta el Adicionla No2 en tiempo y valor donde se adiciona $7.565.000.000 millones al presente contrato, por lo tanto el valor Acomulado del mismo quedaria en $24.463.027.326,00.
El contratista aún tiene pendientes en relación con las observaciones de los estudios y diseños, los cuales están siendo revisados. Una vez la interventoría finalice la verificación, se emitirá el concepto correspondiente.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Actualmente, las veredas de Helechar, Santo Domingo y Volcán permanecen sin actividad debido a que el municipio de Arboledas continúa incomunicado con el corregimiento de Castro Corredor, que enlaza con estas veredas.
Seguidamente, se indican los frentes de trabajo actualmente en ejecución para este municipio.

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Durante la semana se continuan actvidades en el tramo No3 de placa huella tradicional referencia PR0+863.
Durante la semana se da continuidad a las actvidades de estabiliacion de la subrasante mediante la escarificacion, mezcla de cemento y compactacion de la misma a lo largo del tramo.
Se realiza armado de formaleta de madera para continuacion de elementos de franja central y sobreancho que sirve a la vez como modulacion de elementos estructurales.
Se realiza vaciado de concreton de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo, asi mismo se realiza el retiro de formaleta utilizada.
Se realiza intalacion de acero de refuerzo #3 tanto longitudinal como transversal para viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Durante toda la semana se realiza vaciado de elementos en concreto de 21 Mpa elaborado en obra viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Se realizan toma de muestras de concreto para el seguimiento y control de resitencia de los concretos.

Tramo 2 - Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Chicagua Bajo
Se realiza instalacion de acero de refuerzo, armado de formaleta y vaciado de concreto de 21Mpa para elementos de rampa de acceso sobre el tramo en ejecucion.
Se da continuidad al vaciado de elemento de concreto de 14 Mpa con el fin de modular elementos como viga riostra y huella PR1 +589.
Durante la semana se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillos dando continuidad al mismo dentro del corredor vial en ejecucion.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Durante las semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos de placa huella seccion tradicional (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
Se da inicio a actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para viga riostra para el tramo No1.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Durante la semana se continuan actividades de estabilizacion de la subrasante mediante la escarificacion, mezclado de cemento y compactacion de la mismo a lo largo del tramos No2 en ejecucion.
Se realizan excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra espesor de 10 cm de acuerdo a dimension del elementos.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para losas curvas de transicion PR2+023 tramo 2 en ejecucion.
Durante la semana se continuia con el vaciado de elementos faltantes de cuneta y bordillo a lo largo del tramo No2 en ejecucion.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para curva C2 tramo 2 de placa huella en ejecucion PR2+023.

Tramo 1 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros
Durante la semana se continuan actividades en el tramo No1, placa huella tradicional y Zona de Cruce ubicada en el PR3+289.
Se realiza excaciones sin clasificar para los elementos de placa huella viga riostra de acuerdo a la longitud de diseño.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para elementos de de franja central y sobreancho dando continuidad a la placa huella y de igual manera modulando los elementos estructurales.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 longitudinal y transversal para los elementos de placa huella seccion tradicional de acuerdo a diseños.
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa y 14Mpa elaborado en obra para los elementos de la seccion transversal de placa huella de acuerdo a su especificacion.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
A continuación, se detallan los frentes de trabajo que están en ejecución en este municipio.
Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá
Durante la semana se realizan actividades de contruccion de placa huella a lo largo del tramo No4 placa huella seccion tradicional PR5+558.
Se está llevando a cabo el armado de la formaleta para los elementos de la franja central y los sobreanchos a lo largo del tramo No. 4 en ejecución.
Se continúa con el vaciado de concreto de 14 MPa para elementos de franja central y sobreancho y a la vez modular elementos como la viga riostra y la huellas.
Se avanza con la colocación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los componentes de la viga riostra y las huellas
Se mantiene la continuidad en el vaciado de concreto de 21 MPa para los elementos de viga riostra, huellas, cuneta y bordillo a lo largo del tramo en desarrollo PR5+622 hasta PR5+558.

Tramo 5 y 2 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro
Durante la semana se finalizan actividades en el tramo No5 de placa huella dejando pendiente ventanas para construccion de obra de drenaje.
Se inician actividades en el tramo No2 de placa huella PR de referencia PR6+462 tramo de 141 metros.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para elementos de franja central y sobreancho.
Se procede con el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de sobreancho y la franja central, permitiendo la continuación de los elementos de placa huella y la modulación de los elementos estructurales.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos de riostra, huella, cuneta y bordillo tramo No2.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella seccion placa huella tradicional PR6+462 hasta PR6+398.


3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
A lo largo de la semana, se siguen realizando las actividades de placa huella en el tramo No. 1, con una nueva sección transversal y un ancho de 7 metros.
Durante la semana se realiza extendido, compactacion y humectacion de subbase granular para continuidad del tramo No1.
Se realiza instalacion de geotextil 2400 N para estabilizacion de subrasante a lo largo del corredor vial en ejecucion tramo No1.
Se continua con el vaciado de elementos de concreto de 21 Mpa (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) a lo largo del tramo en ejecucion PR actual de avance PR0+980.
Se continúa con el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de sobreancho en una sección transversal de 7 metros
Se da continuidad a la excavacion de elementos de viga riostra a lo largo del tramo de seccion de 7 metros PR0+980 hasta PR0+911.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella seccion de 7 metros a lo largo del tramos No1.

ACTIVIDADES SOCIALES
Durante la semana se revisa el Informe Trimestral de la Unión Temporal Edivial Troja 02590, incluyendo las comunicaciones y documentación del año 2023-2024 con sus anexos correspondientes, con el fin de verificar faltantes a la fecha y requerir al contratista la entrega de la subsanacion.
ACTIVIDADES SST
Durante la semana se lleva a cabo un seguimiento de las labores en campo y se verifica la información relacionada con el componente de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Se realiza seguimiento del cumplimiento del presente componente y programas estrategicos en campo de acuerdo al documento PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la placa huella en los diferentes frentes de los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CURVA DE TRANSICION VEREDA CHICAGUA



ARMADO DE ACERO PARA PLACA HUELLA TRADICIONAL



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



CONCRETO DE 21 MPA PARA CURVA DE TRANSICION VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA



VISTA SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA EN EJECUCION VEREDA CINERA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



VISTA GEBERAL ACABADO DE CONCRETO ELEMENTOS PALCA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS DE PALCA HUELLA VEREDA POTRERERO S



VACIADO DE CONCRETO DE 14MPA PARA SOBREANCHOS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES PLACA HUELLA

GRAMALOTE



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONCRETO DE 14 MPA VEREDA BOYACA



INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 36 PULGADAS



VISITA EN CAMPO DE ESPECIALISTAS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA SAN ISIDRO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRNAJA CENTRAL Y SOBREANCHO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA

LOS PATIOS



ARMADO ACERO DE REFUERZO TRAMO No1



VISTA GENERAL DE ACABADO DE CONCRETO DE 21 MPA ELEMENTOS ESTRUCTURALES



COMPACTACION Y HUMECTACION DE SUBBASE GRANULAR TRAMO No1 CONTINUIDAD.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el período se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1130-24 del 09 de agosto de 2024 se da aprobacion al informe SST del mes de julio del 2024.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1112-24 del 09 de agosto de 2024 la interventoria emite comcepto de aval mayor ancho de via según informe de justificacion para adicional de recurso al contrato y asi mismo se avala prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.
3. Se lleva a cabo un seguimiento en campo de cada una de las actividades que se ejecutan, verificando el cumplimiento de todos los componentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 64 del 16/08/2024 al 22/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | GOBERNACION - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.977.114.868,24	32,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.384.883.631,98	34,28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 407.768.763,75	1,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	30,83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.977.114.868,24	32,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.598.309.751,57	35,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 621.194.883,34	2,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.687.138,65	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 375.789.741,84	1,54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-5 del 25/07/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 1.565.952.191,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 34,88%
Meta Física Ejecutada %: 36,97%
Avance o Atraso Físico %: 2,09%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	41,54%				41,54%	0,41%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Prog	310,99	631,55	147,24	404,4	1494,18	7,83%
					Ejec	307	547,00	173,4	449,40	1476,80	7,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	1,69	0,90	0,87	1,42	4,88	0,58%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,38%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ———**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	208,47	319,10	184,83	344,40	1056,79	5,99%
					Ejec	218,9	394,15	183	386,2	1182,25	6,71%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	0,42	0,77	1,06	1,52	3,76	0,46%
					Ejec	0,25	1	0,5	1,5	3,25	0,40%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	877,05	674,31	2,8		1554,19	7,21%
					Ejec	1011,20	818,30	0		1829,5	8,48%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	5,12	1,20	0,11		6,43	0,78%
					Ejec	5	0,75	0		5,75	0,69%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS											
Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	1534,44				1534,44	9,49%
					Ejec	1671,30				1671,3	10,34%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,44				1,44	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	128	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	70	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 164

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
La interventoría mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1163-24 le solicita al contratista realizar la subsanación de observaciones pendientes en los componentes de estudios y diseños en general.
El contratista aún tiene pendientes en relación con las observaciones de los estudios y diseños, los cuales están siendo revisados. Una vez la interventoría finalice la verificación, se emitirá el concepto correspondiente.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Teniendo en cuenta que la Alcaldía Municipal y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo han trabajado de manera conjunta para habilitar el paso vehicular hacia el corregimiento de Castro, se ha logrado abrir el tránsito. Por lo tanto, esta semana se habilitarán frentes de trabajo en las veredas de Santo Domingo y Volcán, donde se reanudarán las actividades físicas.

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

A lo largo de la semana, se mantienen las actividades en el tramo No 3 dando continuidad a los elementos.
Debido a la necesidad en el terreno, se implementa un filtro francés en el costado lateral para tratar las aguas de infiltración encontradas.
Se lleva a cabo una excavación sin clasificar para el filtro francés, se coloca el geotextil no tejido junto con la tubería correspondiente, se llena el área con material granular y finalmente se procede a sellar todo el elemento.
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elemento de curva de transición a lo largo del tramo No3 y de igual manera de placa huella tradicional.
Teniendo en cuenta que no se ha ejecutado el boxculvert ubicado en el PR0+834 se deja ventana a lo largo del tramo para dar continuidad a la placa huella en ejecucion.
Durante toda la semana se realiza corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo #3 para lo diferentes elementos curva de transicion, viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Durante la semana, se realiza el vaciado de elementos de concreto con una resistencia de 21 MPa, fabricado en el sitio.

Tramo 1 - Placa huella finalizada- Vereda Chicagua Bajo

Durante la semana el contratista finaliza actividades de placa huella en el tramo No1 con untotal de 79 metros, a la fecha se tienen pendientes algunas obras de drenaje en los cuales se tiene a la fecha la ventana para la ejecucion de las mismas.
Se realiza armado de formaleta para modulacion del area final de la placa huella tramo No1 y se realiza en vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franaj central y sobrenacho
Se lleva a cabo la instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal de calibre #3 en los elementos de viga riostra, huellas, cunetas y bordillos.
Durante la semana, se procede al vaciado de concreto de 21 MPa, fabricado en el sitio, para los diversos elementos de la placa huella en la sección tradicional, que incluye vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
El contratista realiza limpieza general del tramo No1 y procede a recoger los equipos y herramienta menor de campo para dar traslado a otro frente de trabajo.
A la fecha el contratista esta a la espera de los 28 dias de fraguado del concreto del presente tramo No1 para volver a dar inicio a actividades en el corredor vial en los tramos faltantes 3, 4 y 5.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Durante la semana el contratista continua actividades en el tramo No2 logrando empalmar esta placa huella con una existente.
Se realiza trabajos en ventana de placa huella No2 area final, lugar donde queda ubicada alcantarilla PR1+070 donde se realiza lo siguiente:
Se realiza compactacion de toda el area de la zanja de la alcantarilla PR1+070.
Se realiza corte, figurado y armado de acero e refuerzo longitudinal y transversal No3 para el area faltante en placa huella No2.
Se realiza armado de acero de refuerzo de 1/2" y 3/8" para alcantarilla de acuerdo a diseños para elementos de encole y descole.
Se realiza armado de formaleta para elemento de encole alcantarilla PR1+070 y se procede a realizar el vaciado respectivo de la misma.
Se inicia el armado del cabezote de descole de alcantarilla PR1+070 y se procede a retranquear el elemento para su posterior fundición.
Se realiza resane de alcantarillas de acuerdo a las observaciones realizadas por parte de la interventoria.

Tramo 1 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros

Durante la semana el contratista continua actividades en el tramo No1 donde realiza las siguientes actividades:
Se realizan excavaciones sin clasificar para los elementos de placa huella y viga riostra, siguiendo la longitud especificada en el diseño y alcance.
Se lleva a cabo la instalación de formaleta de madera para las secciones de la franja central y el sobreancho, asegurando la continuidad de la placa huella y modulando los componentes estructurales de manera similar.
Se procede a instalar refuerzo de acero #3 en dirección longitudinal y transversal para los elementos de la placa huella en la sección tradicional, de acuerdo con los diseños.
A lo largo de la semana, se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, preparado en sitio, para los elementos de la sección transversal de la placa huella, conforme a sus especificaciones.
Se realiza una excavación sin clasificar para zanja destinada a alcantarilla en la ubicación PR3+250.
Se instala una tubería de PVC de 36" para la alcantarilla, conforme a las especificaciones del plano hidráulico
Se procede a rellenar la zanja de la alcantarilla con material seleccionado de la excavación, con el objetivo de habilitar el paso en esa área.

Tramo 5 - Vereda Santo Domingo
El contratista reanuda actividades fisicas realizando actividades de escarificacion, mezclado de cemento y compactacion para estabilizacion de la subrasante a lo largo del tramo No5.

Tramo 5 - Vereda Volcan
El contratista reanuda actividades fisicas realizando replanteo y nivelacion de terreno en el tramo No5 para dar inicio a la ejecucion de placa huella.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

A continuación, se detallan los frentes de trabajo que están en ejecución en este municipio.
Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá
A lo largo de la semana, se llevan a cabo tareas de construcción de la placa huella en el tramo No. 4, en la sección tradicional PR5+558.
Se continúa con la instalación de la formaleta para los elementos de la franja central y los sobreanchos en el tramo No. 4 en proceso
Se avanza con la colocación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los componentes de la viga riostra y las huellas
Durante la semana, se realiza el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborado en el lugar, para los componentes de la sección transversal de la placa huella, de acuerdo con los diseños.

Se lleva a cabo una excavación sin clasificar para zanja de alcantarilla doble en la ubicación PR5+780
Se realiza extendido de material para formar un colchón para la tubería de la alcantarilla en la misma ubicación.
Se instala una tubería de PVC de 36" para la alcantarilla doble ducto, siguiendo las especificaciones del plano hidráulico
Se realiza el relleno con material seleccionado de la excavación para la zanja de la alcantarilla, con el propósito de habilitar el paso en el sector.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro
Se sigue con la instalación de la formaleta de madera para la franja central y el sobreancho, la cual también se utiliza para modular los elementos estructurales de la placa huella
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elabora en obra para elementos de franja central y sobreancho dando continuidad a la placa huella tramo No2.
Se lleva a cabo la instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de riostra, huella, cuneta y bordillo en el tramo No2
Durante toda la semana se realiza vaciado de elementos de placa huella en concreto de 21 Mpa elaborado en obra

Se realiza una excavación sin clasificar para zanja destinada a alcantarilla en la ubicación PR6+338.
Se extiende el material necesario para crear un colchón para la tubería de la alcantarilla en el mismo sitio PR6+338.
Se instala una tubería de PVC de 36" para la alcantarilla, conforme a las especificaciones del plano hidráulico

Se procede a rellenar la zanja de la alcantarilla con material seleccionado de la excavación, con el objetivo de habilitar el paso en esa área.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Durante la semana, se continúan llevando a cabo las actividades de colocación de placas huella en el tramo No. 1, con una nueva sección transversal de 7 metros de ancho
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo faltantes para terminacion de seccion transversal completa.
Se llevan a cabo actividades de extendido, compactación y humectación de la subbase granular para asegurar la continuidad del tramo No. 1
Se instala geotextil de 2400 N para estabilizar la subrasante a lo largo del corredor vial en ejecución del tramo No. 1
se sigue con el vaciado de concreto de 21 MPa para elementos como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos a lo largo del tramo en ejecución.
se avanza con el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de sobreancho en una sección transversal de 7 metros
El contratista tiene pendiente a la fecha la reanudacion de obras de drenaje a lo largo del corredor vial las cuales se tienen a la fecha detenidas temporalmente.


ACTIVIDADES SOCIALES
Durante la semana la interventoría recibe informe trimestral social para revisión, se observa y se le da indicación al contratista de ajustar o agregar información faltante respecto a los archivos que fueron enviados.
ACTIVIDADES SST
Durante la semana se realiza inspeccion en campo, con el fin de verificar el cumplimiento en el presente componente y de igual manera se verifica que el personal en campo este de acuerdo a lo relacionado por el contratista.
ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza seguimiento en campo con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades y/o programas PAGA, en todos los frentes de trabajo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguir con la construcción de la placa huella en los distintos frentes de los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VISTA GENERAL TRAMO No1 ARMADO DE ACERO VEREDA CHICAGUA



VACIADO DE COCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VISTA VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA AREA FINAL DE TRAMO No1



VISTA GENERAL TRAMO No2 VEREDA JUAN BUENO



VISTA GENERAL INTERVENCION ALCANTARILLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VISTA GENERAL ARMADDO DE ACERO DE REFEURZO VEREDA CINERA

CINERA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA CURVA DE TRANSICION



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOBRENCHO Y FRANJA CENTRAL.



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA VEREDA POTREROS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL No3 PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



ESCARIFICACION SUBRASARANTE VEREDA SANTO DOMINGO



VISTA GENERAL CAPA MEZCLA DE CEMENTO



COMPACTACION GENERAL SUELO CEMENTO



REPLANTEO GENERAL SUBRASANTE VEREDA VOLCAN



VISTA GENERAL COMPACTACION DE SUBRSANTE



VISTA GENERAL INICIO DE ARMADO DE ACERO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES

GRAMALOTE



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO TRAMO 4 VEREDA BOYACA



VISTA GENERAL POCETA DE ENCOLE ALCANTARILLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL TRAMO No2 DE PLACA HUELLA EN EJECUCION VEREDA SAN ISIDRO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE FORMALETA PARA BORDILLOS

LOS PATIOS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA LOS PATIOS



VISTA GENERAL EXCAVACIONES (CAJEO ESTRUCTURA) TRAMO No1



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1163-24 del 21de agosto de 2024 se le realizan observaciones generales al contratista de obra de avance actual de estudios y diseños y subsanaciones pendientes.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1177-24 del 22 de agosto de 2024 se le solicita al contratista de obra realizar la entrega del informe del mes de agosto de 2024 en la semana correspondiente del 26 al 30 para validacion de la informacion y aprobacion de la misma.
3. Se lleva a cabo un seguimiento en campo de cada una de las actividades que se ejecutan, verificando el cumplimiento de todos los componentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 65 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173,538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.017.000.442,58	32,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.333.028.429,64	38,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.316.027.987,06	5,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	30,83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.017.000.442,58	32,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.546.454.549,23	39,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.529.454.106,65	6,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.885.574,34	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 948.144.797,66	3,88%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-5 del 25/07/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 1.565.952.191,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.879,78	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 38,75% | Avance o Atraso Físico %: 1,42%
Meta Física Ejecutada %: 40,17%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	41,54%				41,54%	0,41%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Prog	310,99	671,24	211,49	404,4	1598,11	8,37%
					Ejec	307	617,00	261,4	449,40	1634,80	8,57%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	1,69	0,90	1,04	1,42	5,05	0,60%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,38%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo POTREROS	Tramo CINERA	Tramo HELECHAR	Tramo JUAN BUENO	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	280,84	370,15	180,06	420,84	1251,90	7,10%
					Ejec	284,3	442	183	431,2	1340,50	7,60%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	0,79	0,77	1,28	1,92	4,77	0,59%
					Ejec	0,5	1	0,5	1,5	3,50	0,43%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	924,00	820,98	2,8		1747,80	8,10%
					Ejec	1054,00	888,90	0		1942,9	9,01%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	6,75	1,26	0,11		8,12	0,98%
					Ejec	6	0,75	0		6,75	0,81%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	1692,80				1692,80	10,47%
					Ejec	1801,30				1801,3	11,14%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,44				1,44	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	128	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	70	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 164

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante esta semana, la interventoría está revisando la información enviada por el contratista de obra relacionada con los componentes de estudios y diseños, que incluyen subsanaciones pendientes.

El 27 de agosto de 2024, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación del especialista en vías de la interventoría y del contratista de obra, con el propósito de revisar los asuntos pendientes hasta la fecha, de acuerdo con la comunicación enviada por la interventoría bajo la referencia GIC-INVIAS-NTS-1163-24, el 21 de agosto de 2024.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

El contratista durante la semana continua con actividades de placa huella en el tramo No3
Se realiza excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra para continuidad corredor vial en ejecucion.
Se realiza armado de formaleta de madera con el fin de modular elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo en ejecucion.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho para modulacion de elementos estructurales huellas y viga riostra.
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para continuidad de los elementos estructurales huella, viga riostra, cuneta y bordillo, teniendo en cuenta la seccion tradicional en ejecucion.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Durante la semana el contratista continuan actividades en el tramo No2 de la Vereda Juan Bueno.
Se realiza excavaciones sin clasificar para la continuidad de elementos de viga riostra de acuerdo a dimensiones de la misma.
Se realiza armado de acero de refuerzo por instalar en el tramo teniendo en cuenta las ventanas que se tenian en los puntos de localizacion de alcantarilla.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para curva de transicion placa huella ventana faltante PR2+070.
Se realiza resanes en alcantarilla de acuerdo a observaciones realizadas por la interventoria.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de alcantarilla (Poceta de encole y cabezal descole) PR1+070.
Se realiza desencofre de elementos y limpieza general de los mismos para poner en funcionamiento.

Tramo 2 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros

Durante la semana el contratista continua actividades en el tramo No2 donde realiza las siguientes actividades:
Se continuan excavaciones sin clasificar para viga riostras a lo largo del tramo No2
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella y armado de franja central y sobreancho.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 a lo largo del tramo intervenido para huellas viga riostra, cuneta y bordillo.
Durante la semana, se realiza la colocación de concreto de 21 MPa y 14 MPa, mezclado en el lugar, para los componentes de la sección transversal de la placa huella.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #4 y #3 para poceta de encole alcantarilla PR3+250 de acuerdo a planos.
Una vez instalado el acero de la poceta de encole se realiza armado de formaleta para el elemento de acuerdo a dimensiones de diseño.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elemento de encole alcantarilla PR3+250
Se realiza compactacion de subbase granular con el fin de dar continuidad al los elementos en el presente tramo.

Tramo 5 - Vereda Santo Domingo

Se finalizan actividades de estabilizacion de la subrasante a lo largo del tramo No5 de acuerdo a especificaciones
Se realizan excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra a lo largo del tramo dando inicio desde el PR5+820.
Se realiza armando de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho a lo largo del tramo, dando modulacion a elementos estructurales de placa huella.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 longitudinal y transversal para elementos de viga riostra, huella, cuneta y bordillo
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa en huellas, viga riostra, cuneta y bordillo seccion de placa huella tradicional.

Tramo 5 - Vereda Volcan

Una vez replanteado el terreno se realizan excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra de acuerdo a dimensiones
Teniendo en cuenta el proceso constructivo que se viene realizando en las diferentes veredas se realiza instalacion de formaleta de madera para elementos de franja central y sobreancho.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central y sobreancho a lo largo del tramo.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo de acuerdo a diseños.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

A continuación, se detallan los frentes de trabajo que están en ejecución en este municipio.
Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá
A lo largo de la semana, se continuan actividades para ejecucion de placa huella tramo No4
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo a lo largo del corredor vial en ejecucion.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para elementos de concreto franja central y sobreancho dando continuidad a los mismo en el tramo.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo de 3/8" longitudinal y transversal para elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
A lo largo de la semana, se realiza el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborado en sitio, destinado a los elementos de la sección transversal de la placa huella, conforme a los planos de diseño.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para losas faltantes tramo de placa huella No4 teniendo en cuenta que se tenia pendiente.
Durante la semana se realizan actividades en el tramo de placa huella No2 dando continuidad a cada uno de los elementos de la seccion transversal.
Se da continuidad en el armado de formaleta para elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo No2.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para continuidad de franja central y sobreancho a lo larlo del tramo No2.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella y se procede al vaciado de concreto de 21 Mpa de huellas y viga riostra.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo area final tramo de placa huella No2.

Se realiza el armado de formaleta para poceta de encole alcantarilla PR6+3338
Se realiza el armado de formaleta para poceta de encole alcantarilla PR6+3338
Se extiende el material necesario para crear un colchón para la tubería de la alcantarilla en el mismo sitio PR6+338.
Se instala una tubería de PVC de 36" para la alcantarilla, conforme a las especificaciones del plano hidráulico
Se procede a rellenar la zanja de la alcantarilla con material seleccionado de la excavación, con el objetivo de habilitar el paso en esa área.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Se realiza socializacion con la comunidad y veeduria de las vereda de corozal - califonia con el fin de darles a conocer el nuevo alcance del proyecto de acuerdo al adicional realizado al proyecto.
Se realiza recorrido con a lo largo de todo el corredor vial para verificar los nuevos tramos incluidos dentro del alcance con el recurso adicional.
Durante la semana, se continúan llevando a cabo las actividades de colocación de placas huella en el tramo No. 1, con una nueva sección transversal de 7 metros de ancho
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo faltantes para terminacion de seccion transversal completa.
Se llevan a cabo actividades de extendido, compactación y humectación de la subbase granular para asegurar la continuidad del tramo No. 1
Se instala geotextil de 2400 N para estabilizar la subrasante a lo largo del corredor vial en ejecución del tramo No. 1
se sigue con el vaciado de concreto de 21 MPa para elementos como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos a lo largo del tramo en ejecución.
se avanza con el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de sobreancho en una sección transversal de 7 metros
El contratista tiene pendiente a la fecha la reanudacion de obras de drenaje a lo largo del corredor vial las cuales se tienen a la fecha detenidas temporalmente.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se revisa la documentación enviada por el contratista de la obra relacionada con el informe trimestral, y, además, se realiza una inspección en el campo para verificar el cumplimiento de los programas del PAGA.

ACTIVIDADES SST

Duarante la semana se verifica en campo el personal que se tienen a la fecha y de igual manera se inspecciona el cumplimiento en el componente.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza la supervisión en campo para asegurar que se estén cumpliendo las actividades y/o programas del PAGA en todos los frentes de trabajo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la placa huella en los diferentes frentes de los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



PROGRAMADO

MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION | TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL | PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CUNETA Y BORDILLO VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO



COMPACATACION DE SUELO - CEMENTO ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE



INSTALACION DE FORMALETA DE MADERA PARA MODULACION DE PLACA HUELLA VEREDA CINERA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA POTREROS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO



EXTENDIDO DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA PLACA HUELLA



VISTA GENERAL ACTVIDADES TRAMO No5 VEREDA SANTO DOMINGO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CUNETA Y BORDILLO



VISTA GENERAL ACABADO DE CONCRETO PLACA HUELLA VEREDA VOLCAN




ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PLACA HUELLA VEREDA VOLCAN

GRAMALOTE



VACIADO DE CONCRETO DE 14 Mpa PARA FRANAJA CENTRAL Y SOBREANCHO VEREDA BOYACA



ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE DESCOLE ALCANTARILLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA VIGA RIOSTRA, HUELLAS.



VISTA GENERAL DE SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO No3 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL



VISTA GENERAL ARMADO DE FORMALETA PARA ALCANTARILLA

LOS PATIOS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA ELEMENTOS



VISTA GENERAL SECCION PLACA HUELLA



EXTENDIDO DE SUBBASE GRANULAR TRAMO No1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1220-24 del 26de agosto de 2024 se da respuesta a la comunidad de acuerdo a la solicitud enviada para cambio de tramo.
2. Se lleva a cabo un seguimiento en campo de cada una de las actividades que se ejecutan, verificando el cumplimiento de todos los componentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 65 del 2/08/2024 al 8/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 886.753.127,50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 6.045.781.859,50
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 – AGOSTO - 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.565.160.660,36	92,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.866.705.387,06	97,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 301.544.726,70	4,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.565.160.660,36	92,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.926.370.298,56	98,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 361.209.638,20	5,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.355.559,76	2,02%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 74.855.877,58	1,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 92,05% | Avance o Atraso Físico % 5,97%
Meta Física Ejecutada % 98,02%

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
						Ejec	0,950						0,95	95,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003,00						4003,00	100,00%
						Ejec	238	1410	517,00	791,5	700,80	342,70	4000,00	99,9%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
						Ejec	22						22,00	100,0%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
						Ejec	33444,82						33444,82	100,0%
*														

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	
Total	5	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI
PERMISO MINERO: SI x NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
El contratista se encuentra verificando las observaciones pendiente que se tienen a la fecha con el fin de dar cumplimiento al 100% de la documentacion solicitada.
Se realiza mesa de trabajo con el contratista de obra e interventoria con el fin de verificar balance definitivo de actividades ejeuctadas a la fecha.

ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista de obra a la fecha culmina actividades fisicas de placa huella finalizando en el tramo No5
Se realiza recorrido a lo largo de todos los tramos 1,2,3A,3B,4 Y 5 ejecutados en el corredor vial La Garita - La Mutis con el acompañamiento del Invias, Director de Interventoria, personal de campo donde se realizan observaciones a los mismos los cuale el contratista de obra tiene compromiso actualmente.
El contratista realiza tratamiento de fisuras presentes por temperatura a lo largo del corredor vial de acuerdo a las diferentes observaciones realizadas en campo.

Durante la semana el contratista ejecuta actividades de encofrado para armado de gaviones en el PR9+770
Se realiza instalacion de malla para gaviones de acuerdo a especificaciones para inicio del llenado del mismo.
Se realiza instalacion de piedra para gaviones y se procede a la adeacuacion de la misma dentro de la malla.

El contratista tienen pendienta la instalacion de señalizacion a lo largo del corredor vial de acuerdo a lo contemplado.

ACTIVIDADES SOCIALES
Durante la semana la interventoria se encuentra verificando toda la informacion del componente con el fin de emitir comunicado de presentacion de documentos faltantes.


ACTIVIDADES SST
Se verifica informacion enviada por el contratista de obra referente a seguridad social del personal y asi mismo pendientes que se tenga a la fecha

ACTIVIDADES AMBIENTALES
La interventoria se encuentra en verificacion de documentacion referente al presente componente con el fin de emitir comunicado de documentos faltantes a la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta la continuidad de actividades de ejecucion de gaviones en el punto critico establecido y asi mismo la instalacion de señalizaccion vertical de referencia.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISITA TECNICA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL LA GARITA - LA MUTIS



VISTA GENERAL DE PLACA HUELLA TERMINADA



INSTALACION DE GAVIONES PR9+770

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Se realiza seguimiento a la obligaciones contractuales en campo y se verifica el desarrollo de actividades que se vienen ejecutando con el fin de realizar las diferentes observaciones en campo.
1. Se realiza comité en campo con el fin de realizar las diferentes observaciones evidenciadas a lo largo del recorrido realizado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 66 del 9/08/2024 al 15/08/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11- MAYO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ 886.753.127,50
VALOR ACUMULADO: $ 6.045.781.859,50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 – AGOSTO - 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.723.496.002,85	94,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.972.137.144,80	98,78%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 248.641.141,95	4,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.723.496.002,85	94,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.031.802.056,30	99,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 308.306.053,45	5,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.335.342,49	2,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 105.431.795,74	1,74%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % -0,23%
Meta Física Ejecutada % 99,77%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
* Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
					Ejec	0,950						0,95	95,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	4004			Prog	4004,00						4004,00	100,00%
					Ejec	238,6	1410,9	518,30	790,2	701,20	344,80	4004,00	100,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
					Ejec	22						22,00	100,0%
Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
*					Ejec	33444,82						33444,82	100,0%

OBSERVACION: se actualiza la meta fisica ejecutada de los tramos de placa huella teniendo en cuenta la verificacion definitiva realizada en campo.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema — PERMISO MINERO: SI x NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTIN MORA ZAMBRANO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista se encuentra verificando las observaciones pendiente que se tienen a la fecha con el fin de dar cumplimiento al 100% de la documentacion solicitada.

Se realiza mesa de trabajo con el contratista de obra e interventoria con el fin de verificar balance definitivo de actividades ejeuctadas a la fecha.

ACTIVIDADES TECNICAS

A la fecha el contratista tiene finalizado la totalidad de los 6 tramos de placa huella proyectados a ejecutar a lo llargo del corredor vial La Garita - La Mutis.
Se realiza actividades de tratamiento de fisura a lo largo del corredor vial de acuerdo a observaciones realizadas por parte de la interventoria.

El contratista a la fecha tienen finalizado las atividades de gaviones en el PR9+770.

Durante la semana no se ejecuta ninguna actividad referente a la instalacion de postes de referencia, a la fecha se esta corroborando la informacion del codigo de ruta nacional y tramo de vial para la elaboracion de los mismos.

Durante la semana se le solicita al contratista de obra la entrega de la totalidad de documentos faltantes referentes a los diferentes componentes.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana, la interventoría recibió el informe trimestral Nº 4 para su evaluación. Durante el proceso de revisión, se identificó la ausencia de algunos oficios o documentos necesarios. Por lo tanto, se está a la espera de esta información para poder concluir la revisión.

ACTIVIDADES SST

Se envia solicitud al contratista de obra de entrega de informe final, especificando la finalización de las actividades y de anexo la planilla de seguridad social paga con fecha de terminación de obra el 30 de agosto.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoría está verificando la documentación relacionada con el componente actual, con el propósito de emitir un comunicado sobre los documentos faltantes hasta la fecha.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta la instalacion total se la señalizacion de postes de referencia a lo alrgo del corredor vial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL ACABADO DE GAVIONES



VISTA FRONTAL ELEMENTOS CONFORMADOS (GAVIONES)



SELLADO DE FISURAS EN CAMPO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1140-24 la interventoria da viabilidad a la solicitud del traslado del recurso de obras de compensacion ambiental con el fin de dar cumplimento al alcance total socializado con las comunidades.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1146-24 se da aprobacion al informe mensual ambiental y sst del mes de Julio.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1147-24 se da aprobacion al acta parcial No3 y acta de modificacion No3 con sus respectivos anexos para el tramite correspondiente.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 67 del 16/08/2024 al 22/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11- MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 886.753.127,50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 de NOVIEMBRE de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 6.045.781.859,50
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de AGOSTO de 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.881.831.345,34	97,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.972.137.144,80	98,78%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 90.305.799,46	1,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.881.831.345,34	97,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.031.802.056,30	99,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 149.970.710,96	2,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.335.342,49	2,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 105.431.795,74	1,74%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: -0,23%
Meta Física Ejecutada %: 99,77%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
* Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
					Ejec	0,950						0,95	95,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	4004			Prog	4004,00						4004,00	100,00%
					Ejec	238,6	1410,9	518,30	790,2	701,20	344,80	4004,00	100,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
					Ejec	22						22,00	100,0%
Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
*					Ejec	33444,82						33444,82	100,0%

OBSERVACION: se actualiza la meta fisica ejecutada de los tramos de placa huella teniendo en cuenta la verificacion definitiva realizada en campo.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales las cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
El contratista se encuentra verificando las observaciones pendiente que se tienen a la fecha con el fin de dar cumplimiento al 100% de la documentacion solicitada.

ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista finaliza el tratamiento de fisura a lo largo de todo el corredor vial de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoria.

Durante la semana el contratista no ejecuta ninguna actividad en campo, a la fecha se tienen pendiente la instalacion de postes de referencia a lo largo del corredor vial con el fin de dar por finalizado la totalidad de actividades fisicas.
Una vez realizada visita a campo se le solicito al contratista de obra realizar una limpieza general a lo largo de todo el corredor vial, teniendo en cuenta que se encuentran escombros y diferente materiales.

ACTIVIDADES SOCIALES
Se realiza la verificacion de la totalidad de los documentos enviados por parte del contratista de obra con el fin de verificar la informacion y validar la misma.


ACTIVIDADES SST
Se realizar actividades administrativas que tienen que ver con la verificacion final de la informacion del componente.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana la interventoria se encuentra verificando la informacion total del proyecto con el fin de validar la informacion faltante.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que se tienen en cuenta la señalizacion de postes de referencia a lo alrgo del corredor vial se tiene proyectado la instalacion de la misma.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Se lleva a cabo un seguimiento en campo de cada una de las actividades que se ejecutan, verificando el cumplimiento de todos los componentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 68 del 23/08/2024 al 29/08/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	11- MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ 886.753.127,50	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 de NOVIEMBRE de 2023	VALOR ACUMULADO: $ 6.045.781.859,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 de AGOSTO de 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.043.156.517,39	99,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.972.137.144,80	98,78%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (71.019.372,59)	-1,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.043.156.517,39	99,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.031.802.056,30	99,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.354.461,09)	-0,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 163.950.514,16	2,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.879,78	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 99,77%
Avance o Atraso Físico % -0,23%

	Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
						Ejec	1,000						1	100,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4004			Prog	4004,00						4004,00	100,00%
						Ejec	238,6	1410,9	518,30	790,2	701,20	344,80	4004,00	100,0%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
						Ejec	22						22,00	100,0%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
*						Ejec	33444,82						33444,82	100,0%

OBSERVACION: se actualiza la meta fisica ejecutada de los tramos de placa huella teniendo en cuenta la verificacion definitiva realizada en campo.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durante la semana se realiza mesa de trabajo contratista e interventoria de obra con el fin de revisar las observaciones que se tienen el los componentes con el fin de subsanar observaciones.

ACTIVIDADES TECNICAS
Se lleva a cabo un levantamiento topográfico final para los planos de registro de los diferentes tramos de la placa huella construidos: tramo 1, tramo 2, tramo 3A, tramo 3B, tramo 4 y tramo 5.

El contratista realiza la logistica para el traslado de postes de referencias a sitio para instalacion de los mismos con el fin de dar finalizacion a la totalidad de actividades de obra del presente objeto del contrato.
En la fecha de corte, el avance programado y el avance real de las obras fisicas son ambos del 100%, lo que indica que se ha cumplido con el objeto del contrato dentro del plazo acordado.

ACTIVIDADES SOCIALES
Se verifica y valida la información contenida en todos los documentos enviados por el contratista de obra.


ACTIVIDADES SST
Se verifica la información final del componente mediante actividades administrativas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
La interventoría está completando y validando la información faltante del proyecto mediante una revisión total durante la semana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se ha planeado una reunión con la comunidad de la vereda La Garita - La Mutis con el objetivo de recorrer las obras ejecutadas y levantar un acta de recibo a satisfacción por parte de las comunidades. Este paso es necesario para iniciar el proceso de liquidación del contrato de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1243-24 del 30 de agosto de 2024 se le solicita al contratista informe final correspondiente al mes de agosto de 2024.
2. Teniendo en cuenta la finalizacion del plazo contractual del contrato se ha venido solicitando al contratista la documentacion requerida para liquidacion del contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 70 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	12 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.431.402.904,67	98,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.942.919.404,39	65,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.488.483.500,27)	-33,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.449.281.088,64	99,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.960.797.588,36	65,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.488.483.500,27)	-33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 57.711.552,19	1,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 76.424.148,47	1,70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.018.454.478,90	79,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94,91% | Avance o Atraso Físico %: -25,20%
Meta Física Ejecutada %: 69,71%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1007		2157	90%
					Ejec	1150	351		1501	62,5%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	7		13	100%
					Ejec	6	4		10	76,9%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

La interventoría durante la semana recibió informe del mes de julio
La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realizan actividades en el tramo de San Vicente en instalacion de sello de junta, en el tramo de San Juan instalacion de sub base y compactacion

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se recibe información extemporánea del informe mensual de este municipio, que era para el día 5 de agosto y llegó el el 8 del mismo mes en horas de la tarde.
Se está revisando la información por orden de llegada.

ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.
•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera del envío de la documentación asignada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


En el tramo de San Vicente se continuara con el vaciado de concreto en la placa huella, en el tramo de San Juan se continuara con la instalacion y compactacion de la sub base.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO SAN VICENTE CORTE PARA SELLO DE JUNTA



TRAMO SAN VICENTE INSTALACION DE SELLO DE JUNTA



TRAMO DE SAN VICENTE INSTALACION SELLO DE JUNTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 71 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.637.195.690,36	36,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.952.437.048,37	65,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.315.241.358,01	29,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.655.073.874,33	36,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.970.315.232,34	66,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.315.241.358,01	29,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 74.297.864,20	1,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.373.213,56	0,74%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN	$ 65.738.700,44	1,30%
PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 63,40% — Avance o Atraso Físico %: 6,96%
Meta Física Ejecutada %: 70,36%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	786		1936	81%
					Ejec	1150	382		1532	63,8%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6			6	46%
					Ejec	6	4		10	76,9%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	19	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 35

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana recibió informe del mes de julio
La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realizan actividades en el tramo de San Vicente en corte, figurado e instalación de acero para huella, cuneta y viga riostra, fundida de concreto para huellas, cunetas, vigas y contrahuella.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de la obra y No se tiene más información por esta semana


ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.
•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría informa que la fecha de terminación inicial es el 16 de agosto del 2024, con una prórroga de fecha de terminación actual del 11 de noviembre del 2024.
•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En el tramo de San Vicente se continuara con el vaciado de concreto en la placa huella, en el tramo de San Juan se continuara con la instalación y compactación de la sub base.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

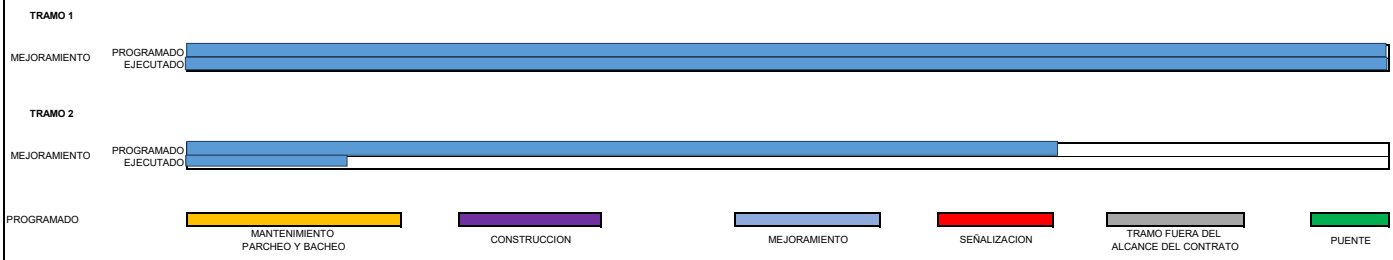

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO SAN VICENTE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



TRAMO SAN VICENTE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



TRAMO DE SAN VICENTE INSTALACION DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 72 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.705.078.005,10	37,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.982.108.315,17	66,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.277.030.310,07	28,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.722.956.189,07	38,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.999.986.499,14	66,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.277.030.310,07	28,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.882.314,74	1,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.561.794,80	0,64%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN	$ 65.738.700,44	1,30%
PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 73,08% — Avance o Atraso Físico %: -2,09%
Meta Física Ejecutada %: 70,98%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	412		1562	65,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6			6	46%
					Ejec	6	4		10	76,9%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	19	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana envío oficio integral con solicitud de entrega del informe del mes de agosto
La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1153-24, RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-061-2024 CON ASUNTO: ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN MODIFICATORIO No 3 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1173-24, SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 ABREGO

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realizan actividades en el tramo de San Vicente en corte, figurado e instalación de acero para huella, cuneta y viga riostra, fundida de concreto para huellas, cunetas, vigas y contrahuella.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

* La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecucion de la obra, se entabla diálogo con él encargado del Área Ambiental, quien manifiesta que la obra se entregan informes trimestrales, lo que para este periodo seria Julio y Agosto, a la fecha 22 Agosto información de este componente.


ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.
•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría informa que la fecha de terminación inicial es el 16 de agosto del 2024, con una prórroga de fecha de terminación actual del 11 de noviembre del 2024.
•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación y compactación de la sub base. Corte y figurado de acero y acopio de material petreo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

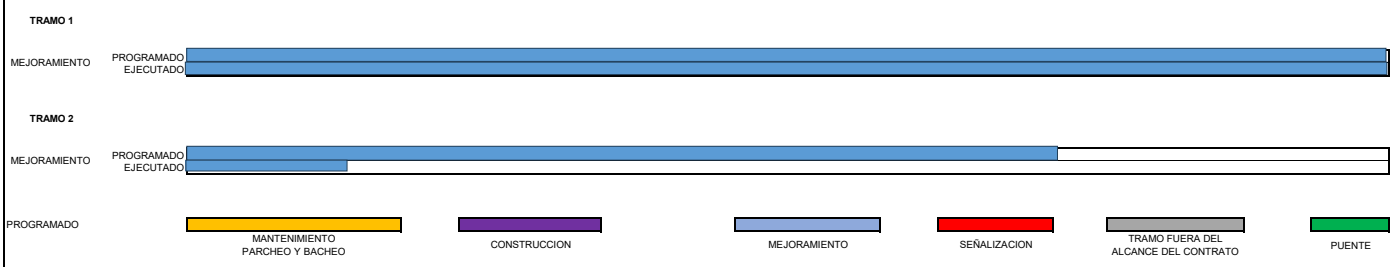

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO SAN VICENTE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



TRAMO SAN VICENTE INSTALACION DE ACERO



TRAMO DE SAN VICENTE FUNDIDA DE HUELLAS CUENTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 73 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.769.331.541,01	39,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.034.536.931,85	67,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.265.205.390,85	28,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.787.209.724,98	39,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.052.415.115,82	67,92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.265.205.390,85	28,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 64.253.535,90	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.616,68	1,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023

PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.149.931.879,78	82,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 73,08%
Meta Física Ejecutada % 70,98%
Avance o Atraso Físico % -2,09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	412		1562	65,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6			6	46%
					Ejec	6	4		10	76,9%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son : Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC -INVIAS–NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana envío oficio integral con solicitud de entrega del informe del mes de agosto
La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1210-24, SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - ABREGO

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realiza actividad en el tramo de San Vicente en instalacion de sello de junta

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El 22 agosto se entrega información del trimestral incompleta.


ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.
•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría informa que la fecha de terminación inicial es el 16 de agosto del 2024, con una prórroga de fecha de terminación actual del 11 de noviembre del 2024.
•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social en este caso el informe mensual o evidencias como actas de reunión o evidencias fotográficas de las actividades en ejecución.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación y compactación de la sub base. Corte y figurado de acero y acopio de material petreo.se da por terminado el tramo san vicente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

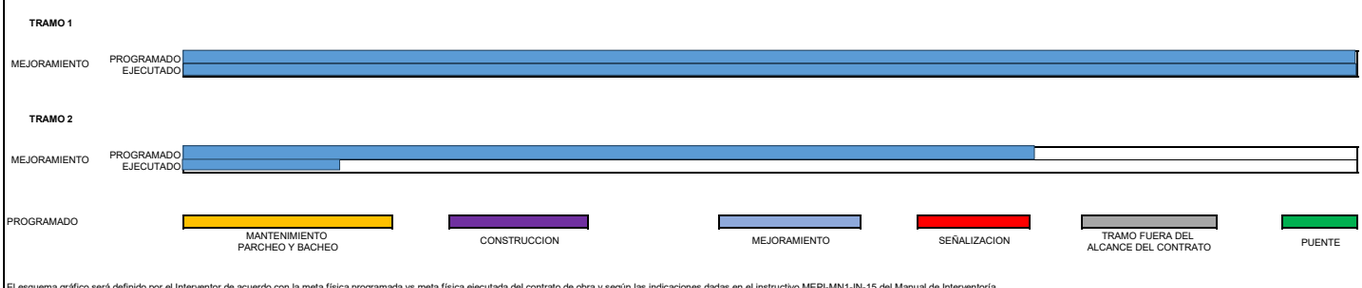

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO DE SAN VICENTE INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS



TRAMO DE SAN VICENTE INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS



TRAMO DE SAN VICENTE INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 75 del 19/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No.: LP-004 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ 65.529.031,39

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.268.620.424,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26 DE AGOSTO DE 2024 — $ -; $ -; $

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436,00	$ 1.793.173.538	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,80)	$ 1.184.991.372	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.268.620.424,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.225.506.728,32	98,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (43.113.695,70)	-1,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,00	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.268.620.424,02	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.237.682.580,32	98,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30.937.843,70)	-1,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.494.086,77	0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.204.774,80	1,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP 0127-03 - 27/01-2023

PERIODO FACTURADO: feb-24

VALOR FACTURA: $ 305.354.545,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.084.193.179,34	80,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.871.709.974,49	76,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 62.167.920,50	1,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 62.167.920,50	1,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: jun-24

VALOR FACTURA: $ 262.954.801,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -1,36%

Meta Física Ejecutada %: 98,64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1	100%
					Ejec	1	1		1	100%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	629	545		1174	99,9%
					Ejec	622	545		1167	99,3%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2	3		5	100%
					Ejec	2	3		5	100%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Aprobado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-194-24 del 02-Feb-24

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES
La interventoría durante la semana envío oficio integral con solicitud de entrega del informe del mes de agosto

La interventoría está a la espera de la planilla de seguridad social, para corroborar con el formato MEPI

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1161-24, RESPUESTA OFICIO OFC-CLP-GIC-064- 2024 CON ASUNTO: REITERACION SOLICITUD ADICIONAL – CONTRATO
GIC-INVIAS-NTS-1175-24, SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realizo actividad en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES


ACTIVIDADES SOCIALES

•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social.
•Se informa que el 31 de julio hasta el 19 de agosto fue suspendida la obra por motivos de orden público.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua actividades de sello de junta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

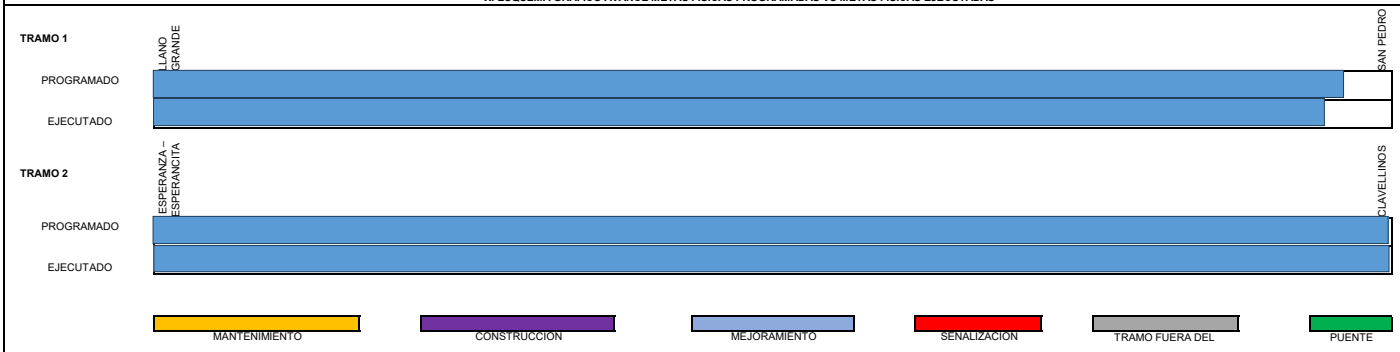

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PAMPLONITA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de agosto de 2024


ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

SILOS

El contratista hace entrega del informe de hidrología e hidráulica, en su sexta versión, para el proyecto cuyo objeto corresponde a “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES, MUNICIPIO DE LOS SILOS FARO DEL CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER.

Esta revisión, realizada el 22 de agosto, presenta un avance del 86% ya que presentó información incorrecta de las alcantarillas existentes las cuales no coinciden tanto en formatos de inspección, memorias y planos.


La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

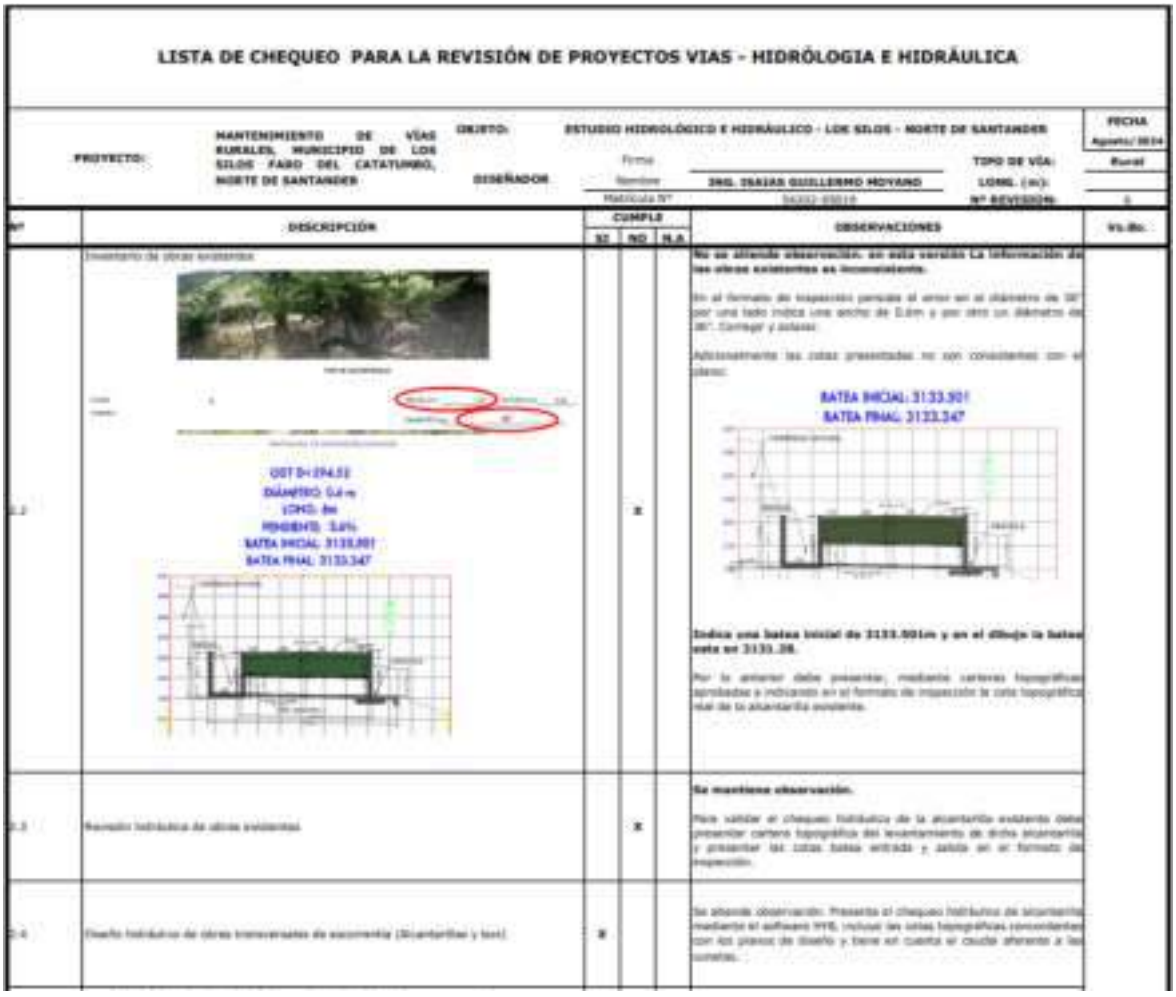

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES, MUNICIPIO DE LOS SILOS FARO DEL CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - LOS SILOS - NORTE DE SANTANDER		FECHA: Agosto/ 2024
		DISEÑADOR:	Firma: / Nombre: ING. ISAIAS GUILLERMO MOYANO / Matrícula N°: 54202-85518	TIPO DE VÍA: / LONG. (m): / N° REVISIÓN:	Rural / / 6

N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.2	Inventario de obras existentes		X		**No se atiende observación, en esta versión La información de las obras existentes es inconsistente.** En el formato de inspección persiste el error en el diámetro de 36" por una lado indica una anchi de 0.6m y por otro un diámetro de 36". Corregir y aclarar. Adicionalmente las cotas presentadas no son consistentes con el plano: BATEA INICIAL: 3133.901 BATEA FINAL: 3133.347 **Indica una batea inicial de 3133.901m y en el dibujo la batea esta en 3131.28.** Por lo anterior debe presentar, mediante carteras topográficas aprobadas e indicando en el formato de inspección la cota topográfica real de la alcantarilla existente.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes		X		**Se mantiene observación.** Para validar el chequeo hidráulico de la alcantarilla existente debe presentar cartera topográfica del levantamiento de dicha alcantarilla y presentar las cotas batea entrada y salida en el formato de inspección.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Se atiende observación. Presenta el chequeo hidráulico de alcantarilla mediante el software HYE, incluye las cotas topográficas concordantes con los planos de diseño y tiene en cuenta el caudal aferente a las cunetas.	

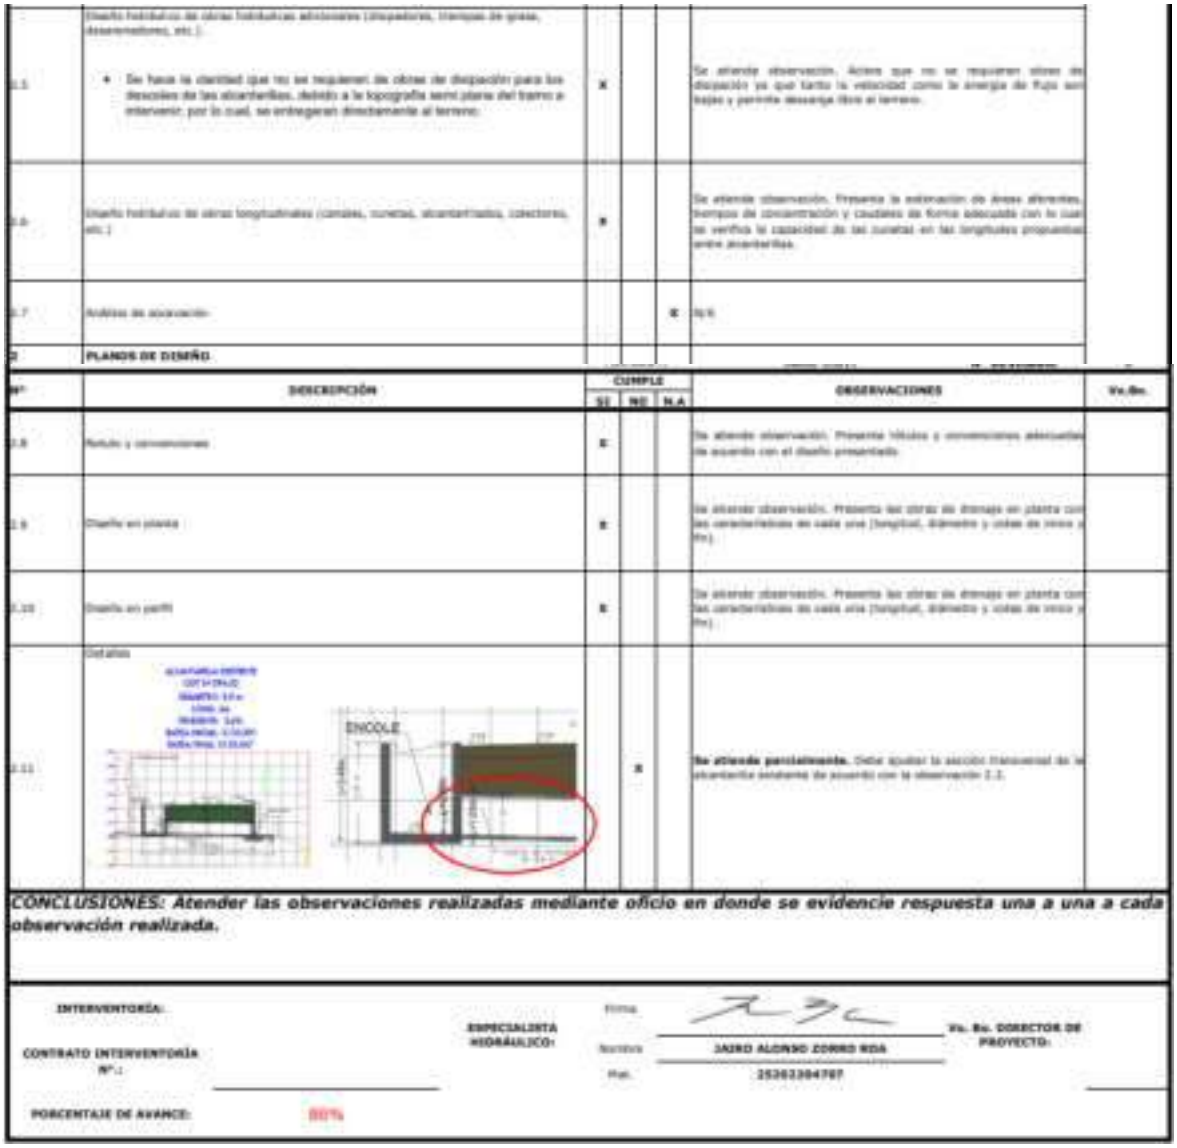

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.7	Análisis de socavación			X	N/A	
3	PLANOS DE DISEÑO					
3.8	Rotulo y convenciones	X			Se atiende observación. Presenta rótulos y convenciones adecuadas de acuerdo con el diseño presentado.	
3.9	Diseño en planta	X			Se atiende observación. Presenta las obras de drenaje en planta con las características de cada una (longitud, diámetro y cotas de inicio y fin).	
3.10	Diseño en perfil	X			Se atiende observación. Presenta las obras de drenaje en planta con las características de cada una (longitud, diámetro y cotas de inicio y fin).	
3.11	Detalles		X		**Se atiende parcialmente.** Debe ajustar la sección transversal de la alcantarilla cerrada de acuerdo con la observación 2.3.	

CONCLUSIONES: Atender las observaciones realizadas mediante oficio en donde se evidencie respuesta una a una a cada observación realizada.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.: 1053 DE 2022

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma / Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO RODA / Mat.: 25302394787

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 89%

SANTIAGO

El contratista hace entrega del informe de hidrología e hidráulica, en su segunda versión, para el proyecto cuyo objeto corresponde a “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

Esta revisión, realizada el 22 de agosto, presenta un avance del 89% ya que faltó complementar la información y análisis de precipitación junto con presentación adecuada de planos (formatos).

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO PEDL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - SANTIAGO			FECHA: Agosto / 2024
		DISEÑADOR	Firma		TIPO DE VÍA:	Rural
			Nombre	CRISTIAN CAMILO OSORIO MOLINA	LONG. (m):	
			Matrícula Nº	MP: 5410220930 NTS	Nº REVISIÓN:	0

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	Cuencas Hidrográficas Santiago					
	Cuencas Hidrográficas Santiago-LOCALIZACION					
	ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO TRAMO SANTIAGO-LAS LAJAS (1)					
	PLANOS ALCANTARILLAS SANTIAGO – LAS LAJAS.kmz					
	PLANOS ALCANTARILLAS SANTIAGO - LAS LAJAS					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación Santiago Camino [14020030]. La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos de profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta imagen con el tramo a intervenir.	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de Google Earth.	
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables entre climatológicas de la estación Santiago Camino [14020030].	
1.4	Análisis de la precipitación		X		**No se atiende observación.** Se solicita presentar el régimen de precipitaciones. El régimen de Precipitación es útil para medir el comportamiento de la precipitación en un mes o un año para una zona dada, indicando que tan alejado está por encima o por debajo respecto a su valor histórico (valor media o normal). Posibilita la identificación de tendencias del comportamiento de la lluvia a lo largo de una año. **Ya que no se esta de acuerdo con la observación se debe responder mediante oficio justificando la respuesta.**	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta imagen con la ubicación de la estación frente al trazo vial a intervenir.	
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Presenta las curvas IDF de la estación Santiago Camino [14020030]. Realizó el calculo mediante método estadístico y anexa los soportes respectivos para la validación de los parámetros adoptados.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.7	Balance hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de la cuenca como son tipo de terreno y pendiente (en anexo de tiempo de concentración).	
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, mediante planos e imágenes, la delimitación de las cuencas aferentes a los tramos de cunetas indicando la magnitud.	
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Presenta, en el capítulo 7.5, el cálculo de las áreas aferentes a cada tramo de cuneta	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Presenta el cálculo de los tiempos de concentración utilizando las ecuaciones de Kirpich, Temez, VT Chow y FAD. Finalmente realiza un promedio entre estos métodos, como el TC de hayor a 10 minutos, adopta un TC igual a este último valor para la estimación de los caudales.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Presenta el cálculo de caudales mediante el método racional utilizando coeficientes de escorrentía adecuados	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización		X		**Se atiende parcialmente.** Los planos debe tener las respectivas coordenadas (grilla de coordenadas).	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Se atiende observación. Presenta planos con la delimitación de las cuencas aferentes.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
1	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados	
2.2	Inventario de obras existentes	X			Presenta formato de inspección de obras existente con el respectivo registro fotográfico. Concluye que las obras existentes deben ser reemplazadas.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes En el topic EXISTED LAS LAJAS se encuentra 3 alcantarillas existentes como se puede observar en el capítulo 9.1, dichas alcantarillas se encuentran en mal estado y con un diámetro de 32" por lo que se recomienda construir las alcantarillas en otro sentido puesto cumpliendo con las especificaciones técnicas que se necesitan el proyecto vehicular dichas vías. Tabla 17. Alcantarillas existentes (Fuente: Autor) [illegible] [illegible] [illegible] ALCANTARILLA 1 [illegible] [illegible] ALCANTARILLA 2 [illegible] [illegible] ALCANTARILLA 3 [illegible] [illegible] Fuente: Autor			X	De acuerdo con lo presentado en el informe, se propone el reemplazo de las tres alcantarillas existentes.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta el chequeo de capacidad hidráulica de las obras transversales propuestas realizado software HY8. Se diseñaron 3 alcantarillas. Se observa capacidad hidráulica adecuada debido a la magnitud de los caudales.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampa de grasa, desarenadores, etc.). Mediante la modelación de las 3 alcantarillas en el Software HY-8 podemos evidenciar que las velocidades a la salida de las alcantarillas son menores a 5 m/s por lo cual no necesitamos obras de disipación, solo debido a que el caudal es muy inferior a la capacidad hidráulica de la alcantarilla, adicional a esto el desnivel se reduciría hacia el terreno ya que este favorece la disipación y filtración del agua por lo que esta sirve con vegetación densa. Estas elementos naturales actúan como mecanismos de disipación al permitir que el agua se infiltre y se distribuya de manera eficiente sin causar erosión.	X			De acuerdo con las conclusiones del informe no se requieren estructuras de disipación de energía a la descarga de las alcantarillas.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (cunetas, cunetas, encamillados, canaletas, etc.)	X			Se atiende observación. Indica, en planos, que las cunetas, aguas abajo de la alcantarilla 2 descargan en alcantarilla existente la cual se encuentra fuera del límite de intervención del proyecto.	
	[illegible]					



2.7	Diseño de subdrenaje La vía en estudio presenta indices altos de humedad, por lo cual teniendo en cuenta que muchos de los problemas y de las fallas de las vías existentes se relacionan con las deficientes condiciones de drenaje, se procede a realizar un diseño con filtro geodren que permita los procesos de captación, conducción y evaluación para un correcto manejo del agua infiltrada en el pavimento.	X			En el capítulo 6 presenta el diseño de los sistemas de subdrenaje, los cuales presentados son adecuados y se avala la información. Se deben implementar subdrenajes de acuerdo con lo indicado en el informe de hidrología e hidráulica.
2.8	Análisis de socavación			X	N.A.
3	**PLANOS DE DISEÑO**				
3.9	Bombeo y convenciones		X		Debe presentar la grilla de coordenadas en los planos de diseño.
3.10	Diseño en planta	X			Se atiende observación. Mejora la escala de los diseños con lo cual se logra una mejor interpretación y se visualiza correctamente la implantación de las obras de drenaje.
3.11	Diseño en perfil	X			Se atiende observación. Mejora la escala de los diseños con lo cual se logra una mejor interpretación y se visualiza correctamente la implantación de las obras de drenaje.
3.12	Detalles	X			Se atiende observación. Presenta el detalle de implantación de las obras transversales indicando cotas y las características geométricas de las obras propuestas. Se visualiza el perfil del terreno con lo cual se establece que las obras propuestas cuentan con descarga libre.

CONCLUSIONES: Atender cada observación y presentar la respectiva respuesta debidamente soportada.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma: Nombre: **JAIRO ALONSO ZORRO ROA** Mat.: **25202204707**

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 83%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para el proyecto de Silos, a la fecha se han realizado observaciones a la documentación presentada y no se ha logrado subsanar el componente debido a errores en la información de obras existentes.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO ZORRO ROA
MP 25202204707 CND
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de Agosto de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE MUTISCUA

Placa Huella

Mutiscua – Minas de Cal – La Aradita – La Meseta

Se dio la aprobación del diseño estructural de la placa huella.

MUNICIPIO DE SANTIAGO

Placa Huella

Vía Rural – La Laja – Cuperena – Cachuela – Alto Frio

Se dio la aprobación del diseño estructural de la placa huella para tráfico liviano C1.

MUNICIPIO DE HERRAN

Placa Huella

Vereda Siberia

Se dio la aprobación del diseño estructural de la placa huella.

Alcantarilla

Vereda Siberia

Se dio la aprobación del diseño estructural de la Alcantarilla

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos de los Municipios: Santiago – Herrán - Mutiscua.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: LA PLAYA, OCAÑA 1814, HERRAN, OCAÑA 1758, GOBERNACION 2033, GOBERNACIÓN 1943, GOBERNACIÓN 2052, LA PLAYA, ABREGO

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO OCAÑA 1758 MORRINSON – LIMITES:

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1225-24 con asunto "APROBACION INFORMES FINAL AMBIENTAL" se da aprobación al componente ambiental con el informe final presentado.

2. MUNICIPIO DE LA PLAYA

Este contrato estuvo suspendido a través del oficio de aprobación GIC-INVIAS-NTS-1116-24. Por lo tanto, el contratista presenta informe de cumplimiento del componente ambiental correspondiente al periodo de actividades reportadas desde el levantamiento de la suspensión 19 de agosto de 2024 hasta el 26 de agosto 2024 fecha en que se termina las actividades de obra.

3. MUNICIPIO OCAÑA 1814

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1184-24 del 23 de agosto, se le solicita aclaración al INVIAS frente a un concepto emitido ya que se evidencia que la información es del contrato de proyecto Buena vista, pero hacen mención a Morrison.

4. MUNICIPIO LOS PATIOS, LA MUTIS- GOBERNACIÓN 2052

La interventoría a través del oficio GIC-INVIAS-NTS-133-24 aprueba el documento paga y lo remite al INVIAS. además, está organizando junto al profesional ambiental del contratista realizar mesas de trabajo con la finalidad de entregar todos los informes del área ambiental para el proceso de liquidación.

5. MUNICIPIO VILLA DE ROSARIO- GOBERNACION 2033

Se remite comunicado al INVIAS No. GIC-INVIAS-NTS-1252-24, dando respuesta al comunicado 2024S-VBOG-047967 - entrega observaciones subsanadas informe PAGA - municipio de Villa de Rosario, componente ambiental.

6. MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS- GOBERNACION 2033

Se remite oficio GIC-INVIAS-NTS-1196-24 el día 26 agosto de 2024 Alcance oficio GIC-INVIAS-NTS-737-24 respuesta oficio INVIAS 2024S-VBOG-047971.

7. MUNICIPIO DE GRAMALOTE – GOBERNACIÓN 2033

Se le solicita al contratista mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1206-24 del 27/08 la presentación del PAGA. Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1223-24 del 28 de agosto, se le realizan observaciones al documento PAGA presentado por el contratista.

8. MUNICIPIO HERRÁN – GOBERNACIÓN 2033

Se le solicita al contratista de Herrán la entrega del documento PAGA mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1205-24 del 27 de agosto de 2024.

9. MUNICIPIO MUTISCUA – GOBERNACIÓN 2033

Se le solicita al contratista de Mutiscua la entrega del documento PAGA mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1204-24 del 27 de agosto de 2024.

10. MUNICIPIO CACOTA – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado al INVIAS No. GIC-INVIAS-NTS-1189-24 el 26 de agosto de 2024, dando respuesta al comunicado 2024S-VBOG-047969 - entrega observaciones subsanadas informe PAGA - municipio de Cacota, componente ambiental.

11. MUNICIPIO RICAURTE – GOBERNACIÓN 2033

Se le solicita al contratista la documentación completa del área ambiental específicamente del PAGA para poder continuar con el proceso de liquidación y cierre del contrato de obra, esta solicitud se realiza mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1148-24 del 15 de agosto de 2024.

12. MUNICIPIO PUERTO SANTANDER – GOBERNACIÓN 2033

Se le solicita al contratista la documentación completa del área ambiental específicamente del PAGA para poder continuar con el proceso de liquidación y cierre del contrato de obra, esta solicitud se realiza mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15 de agosto de 2024

13. MUNICIPIO ZULIA – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1183-24 del 23 de agosto, dando respuesta al comunicado 2024S-VBOG-039300 - entrega observaciones subsanadas informe PAGA - municipio de el Zulia, componentes social y ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se han subsanado las observaciones del PAGA de los municipios de Zulia y Cacota, se continúa requiriendo a los contratistas de los municipios de Herrán y gramalote del convenio de la Gobernación 2033 para la entrega del PAGA.

Se les solicita a los contratistas de Puerto Santander y Ricaurte, toda la información y documentación final soporte de la implementación del PAGA para poder continuar con la liquidación de los contratos.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: GOBERNACION 2033

PERIODO: del 1 al 31 de agosto de 2024

GOBERNACIÓN 2033

Pamplonita

Se envía aprobación mediante comunicado **GIC-INVIAS-NTS-1167-24** del 22/08/2024 de correo recibido el **14-agosto-2024**.

Deflexión menor a 150°

Se soporta por parte del contratista que no es posible cumplir con este requerimiento debido a la geometría del terreno, sin embargo, esta interventoría deja constancia que se dejó la recomendación de ajustar las curvas a solicitud según normatividad. (Deflexiones menores a 150°)

Herrán

Contratista hace entrega mediante comunicado **No. 016- CD-FC-082-2023** del 31/07/2024 el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Mutiscua

Se envía aprobación mediante comunicado **GIC-INVIAS-NTS-1194-24** del 26/08/2024 de oficio **SCCVN-CD-FC-081-2023-0011** recibido el 31/07/2024

Santiago

Se envía aprobación con observaciones mediante comunicado **GIC-INVIAS-NTS-1156-24- del 20/08/2024** de oficio recibido **NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024**, las cuales se presentan a continuación:

1. Por ser tramos tan cortos se recomienda etiquetar el abscisado máximo cada 50 metros.
2. Por favor realizar el diseño de la losa de transición en el inicio y final del tramo, donde no se realizan empalmes con placa huella existente. Persiste.
3. Entre las abscisas K0+400 a K0+430 se está generando mucho relleno. Se recomienda revisar la triangulación que se generó o verificar en campo en el momento que se esté ejecutando la obra.

Gramalote

Se envían observaciones mediante comunicado **GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024** de oficio **SCCY-CD-FC-071-2023-001** recibido el **21/08/2024**, las cuales se presentan a continuación:

1. Se hace necesario anexar la imagen de sección típica utilizada para el diseño geométrico con su respectiva estructura.
2. Recordemos que existen unas escalas convencionales para la presentación de planos. (1:250 - 1:500 - 1:750 - 1:1000)
3. El cuadro de convenciones corresponde al levantamiento topografico no al diseño geométrico. Corregir
4. Por favor ubicar el abscisado del eje y puntos geométricos en el plano de modulación.
5. Ocultar o eliminar el abscisado del levantamiento topografico para evitar confusiones
6. Revisar el sentido de la curva ya que esta invertido.

7. Para el presente diseño se debe trabajar la modulación tipo Colombia rural en tramos con anchos de 5 metros (piedra pegada al centro y a los bordes), en este caso hasta inicio de transición en curvas con sobreancho y finalizando la transición de las mismas.
8. Por favor escalar el perfil de acuerdo a unidades trabajadas o indicar la relación de escalas utilizadas.
9. Por favor escalar el perfil de acuerdo a unidades trabajadas o indicar la relación de escalas utilizadas.
10. El abscisado presenta incoherencias. Corregir
11. La sección K0+461.515 o K1+762 está diseñada por fuera de los puntos topográficos lo que hace que las áreas no sean reales, por favor recortar el alineamiento hasta donde se tomó topografía.
12. El abscisado de las secciones es diferente al de diseño en planta. Corregir
13. Los peraltes en curvas están invertidos.
14. Solo se está solicitando sobreanchos en curvas de tipo 8 a tipo 12, la curva 2 (tipo 5), curva 4(tipo 6), deberían ir sin sobreancho y con modulación tipo Colombia rural.
15. Por ser un tramo de más de 200m se debería diseñar por lo menos una (1) zona de cruce.

CONCLUSIONES

- Los diseños geométricos del municipio de Santiago están aprobados con observaciones, pendientes de la subsanación.
- Los municipios de Pamplonita y Mutiscua cumplen con los requerimientos mínimos de diseño, por lo cual quedan aprobados.
- El diseño geométrico del municipio de Gramalote esta con observaciones, pendiente de la subsanación de las mismas.

Gicela Córdoba Londoño.

GICELA CORDOBA LONDOÑO

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SANTIAGO.

PERIODO: del 01 al 31 de agosto de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO DE SANTIAGO.

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. No se da viabilidad al protocolo reparación de losas con desgaste superficial.

No se da viabilidad y se deja como observación que el contratista debe incorporar al respectivo informe los registros fotográficos de los daños presentados, para lograr identificar las características de las losas. Además, debe incluir la cantidad de losas afectadas y presuntas causas de daños.

Lo anterior, es importante para su estudio y revisión. Se recomienda hacer la respectiva subsanación con la finalidad de dar aprobación a dicho protocolo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado, asimismo, recomienda hacer las subsanaciones al protocolo de reparación de losas para su respectiva aprobación.

Cordialmente,



DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
MP 54202-207920 NTS
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

REPORTES EJECUCUION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ago-24

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	**3**	4	5	6	7	**8**	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	**25**	26	27	28	29	30	**31**
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
VEHÍCULO	FOTON - BJ2037Y3MDV	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 FI - TCJ98F	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D-6 - QBA78F	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	AKT AK180TTX - VHB75D	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - PWS43G	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	HONDA XR 150L BRAHMA - HUL01 E	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	Yamaha SZ15RR - IES44E	A	A			A	A		A	A			A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 25-04-2024 a 24-03-2025
TECOMECANICA: Desde 04-01-2024 hasta el 04-01-2025
SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 31-10-2023 hasta el 31-10-2024
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2024 hasta el 17-03-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT MOTOCICLETA CBP 23E : Desde 21-02-2024 hasta el 20-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 24-02-2024 hasta el 24-02-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA TCJ98F : Desde 09-11-2023 hasta el 08-11-2024.
TECNOMECANICA: Desde 27-10-2023 hasta el 27-10-2024
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 10-05-2024 hasta el 09-05-2025**.**
TECNOMECANICA: Desde 11-11-2023 hasta el 11-11-2024
SOAT MOTOCICLETA PWS43G: Desde 29-04-2024 hasta el 28-04-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2024
SOAT MOTOCICLETA QBA78F: Desde 22-02-2024 hasta el 21-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 07-02-2024 hasta el 07-02-2025
SOAT MOTOCICLETA VHB75D: Desde 01-07-2024 hasta el 01-07-2025.
TECNOMECANICA: Desde 01-05-2024 hasta el 01-05-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 27-03-2023 hasta el 26-08-2024.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023
SOAT MOTOCICLETA HUL01E: Desde 26-04-2024 hasta el 25-04-2025.
TECNOMECANICA: Desde 26-04-2024 hasta el 26-04-2025.
SOAT MOTOCICLETA IES44E: Desde 27-14-2023 hasta el 26-12-2024**.**
TECNOMECANICA: Desde 05-01-2024 hasta el 05-01-2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL


No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18.491.977	DIRECTOR	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SANITAS	9472764025	$ 260.000	PORVENIR	9472764025	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA	37.335.038	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9472764025	$ 220.000	COLFONDOS	9472764025	$ 880.000	$ 220.000			
3	JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ	1.090.395.213	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 220.000	PORVENIR	9472764025	$ 880.000	$ 220.000			
4	JHON JAIRO GALVIS	88.236.608	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	COMFAORIENTE	9472764025	$ 220.000	PROTECCION	9472764025	$ 880.000	$ 220.000			
5	OSCAR MAURICIO GARCÍA	1.093.743.247	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 220.000	PORVENIR	9472764025	$ 880.000	$ 220.000			
6	GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ	1.090.177.481	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	COMPENSAR	9472764025	$ 120.000	COLPENSIONES	9472764025	$ 480.000	$ 120.000			
7	DIEGO MAURICIO CAMARGO GOMEZ	1.090.450.253	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SANITAS	9472764025	$ 120.000	PORVENIR	9472764025	$ 480.000	$ 120.000			
8	JUAN ALEX DÍAZ RIVEROS	88.235.802	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 455.000	X X X X	13%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 455.000	$ 65.000	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 37.400	PORVENIR	9472764025	$ 149.400	$ 132.100			
9	DIANA ALFONSO FUENTES	1.090.514.259	SECRETARIA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	9472764025	$ 52.000	PORVENIR	9472764025	$ 208.000	$ 52.000			
11	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9472764025	$ 80.000	PROTECCION	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
12	CRISTIAN RIVERA CACERES	1.090.526.660	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9472764025	$ 80.000	COLPENSIONES	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
13	SHIRLE ADRIANA LIZARAZO RINCON	1.090.505.972	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SALUD TOTAL	9472764025	$ 80.000	PORVENIR	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
14	NICOLAS MAZO RODRIGUEZ	1.090.529.410	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9472764025	$ 80.000	PORVENIR	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
15	EILER ANDRES PARRA CHACON	1.091.673.434	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9472764025	$ 80.000	PORVENIR	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
16	CRISTIAN QUINTERO	1.007.447.354	INSPECTOR	$ 466.667	X X X X X X X	23%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 466.667	$ 32.500	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 18.700	PORVENIR	9472764025	$ 74.700	$ 52.700			
18	MICHAEL SMITH RODRIGUEZ	1.090.429.296	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 80.000	PROTECCION	9472764025	$ 320.000	$ 107.700			
19	WILLIAM LUNA MELO	1.091.656.642	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 52.000	COLPENSIONES	9472764025	$ 208.000	$ 52.000			
20	JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ	88.243.936	CONDUCTOR	$ 1.545.100	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.545.100	$ 107.600	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 61.900	PROTECCION	9472764025	$ 247.300	$ 61.900			
21	JHON WILMER RODRIGUEZ ARMAS	1.090.423.971	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 87.500	V	SANITAS	9472764025	$ 50.300	PROTECCION	9472764025	$ 201.100	$ 50.300			

22	DIANA ROCIO SUAREZ RINCÓN	33.377.736	PROFESIONAL CALIDAD	$ 3.325.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		95%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.325.000			SANITAS	1066307876	$ 253.200	PORVENIR	1066307876	$ 324.000	$ -			
23	SANTOS EDUARDO MALDONADO MURRILLO	1.093.886.906	INSPECTOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9472764025	$ 80.000	COLPENSIONES	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
24	DAVID ALEXANDER ALVAREZ ORTIZ	88.256.291	INSPECTOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COOSALUD	9472764025	$ 80.000	PORVENIR	9472764025	$ 320.000	$ 80.000			
25	LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN	88.241.378	INSPECTOR	$ 1.666.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							83%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.666.667	$ 116.100	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 66.700	PORVENIR	9472764025	$ 266.700	$ 71.500			
26	PAOLA ANDREA LEON PACHECO	1.090.450.071	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	9472764025	$ 140.000	PORVENIR	9472764025	$ 560.000	$ 140.000			
27	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	1.031.120.730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 3.617.250		X	X									X	X								X	X										27%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.617.250	$ 18.900	I	SANITAS	9472764025	$ 144.700	PORVENIR	9472764025	$ 578.800	$ 144.700			
28	GICELA CORDOBA	52.707.067	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 1.500.000		X	X				X	X	X			X	X	X					X	X	X		X			X	X					25%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SANITAS	9472764025	$ 180.000	PROTECCION	9472764025	$ 240.000				
29	FELIPE STAND	79.533.915	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 1.500.000		X	X			X							X	X							X		X				X	X				25%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.500.000			COMPENSAR	9472764025	$ 187.500	COLPENSIONES	9472764025	$ 240.000	$ -			
30	JAVIER MILLAN	79.345.746	ESPECIALISTA GEOTECNIA	$ 600.000		X		X			X					X		X						X			X					X		X		10%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 600.000	$ 41.760	V	SURA	9472764025	$ 72.000	PORVENIR	9472764025	$ 96.000				
31	DIANA APONTE LOZANO	60.422.959	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 1.200.000		X	X											X	X												X	X				20%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.200.000	$ 229.700	V	COMPENSAR	9472724261	$ 132.000	COLPENSIONES	9472724261	$ 528.000	$ 132.000			
32	GIANCARLO AVENA CORRALES	11.036.578	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.800.000		X			X				X			X		X			X	X			X		X			X			X			30%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.800.000	$ 125.280	V	SURA	9472764025	$ 216.000	PORVENIR	9472764025	$ 288.000				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 75.575.684																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha 2/09/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES $ 268.536.435,20

VALOR ADICIONES $ 500.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.101.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/2024

ADICION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ---------- NO x VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ---------- NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- NO x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ---------- NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **7** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 7

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ---------- **x** NO ----------

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **0**
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	100%	Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Angeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresion	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manometro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automatico	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatico	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automatico	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MAQUINA SEMIAUTOMATICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERIA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE PARA INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE PARA INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE PARA INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE PARA INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS Y RAMPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 31 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para modulacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de geotextil 2400N.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general corte a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación y humectación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta para modulación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tuberia de PVC.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto de 14 Mpa para modulacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en ccampo.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista excavación para poceta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Concreto elaborado en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general elaboración de la mezcla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista arma de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de lluvias a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general corte a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuacion de terreno para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de terreno para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista genera vaciado de concreto para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de terreno.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: limpieza en campo de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: armado de poceta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de acero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general parrilla de fondo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Losa de curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado acero de refeurzo placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista movimiento de tierra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero para elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista excavación viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acabado de concreto de 21 Mpa para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista vaciado de concreto de 14 Mpa para modulación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de elementos de franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de acero de refuerzo placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 al 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para siobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Retiro de material de excavación tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero para huellas #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para sección de 7 mts.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sibreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalacion de geotextil 2400 N tramo No1 en ejecucion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Retiro de material de excavacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de placa huella tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella ejecutada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para placa huella.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo instalado.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo longitudinal en viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo y cuneta..

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero longitudinal y transversal viga riostra tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Tubería de PVC de 36” para alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de tubería instalada para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: visita en campo de especialista hidráulico contratista de obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general instalación de acero de refuerzo para elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza placa huella en ejecución tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo para curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para placa huella en ejecucion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero placa huella tradicional.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de concreto sección transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para viga y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de curvas de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elemento de curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Losa de curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Tubería de PVC de 36” para alcantarilla a ejecutar.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de concreto curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo elementos de viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Ejecucion de filtro francés en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista de tubería para filtro y geotextil.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto elementos etructurales.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalacion de acero de refuerzo #3 para elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 al 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreancho sección de 7 mts.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar (cajeo estructura).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación cajeo estructura palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Replanteo niveles excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general movimiento de tierras excavacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo sección 7 mts.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa bordillo de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavaciones.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES: Vista general de excavaciones.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elemento de cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general extendido de subbase granular para tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular y replanteo de niveles.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal sección de 7 mt.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de material de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte actual de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Sección transversal de placa huella tramo 2 en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para bordillos.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo instalado.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación geotextil para filtro francés.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo..

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto 14 Mpa tramo 4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado poceta e encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general concretos en general sección transversal tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general avance tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para cuneta 2 tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal No3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa huellas y viga riostra finalización tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras para seguimiento resistencia del concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Retiro de herramienta menor una vez terminado el tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acero de refuerzo para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general material de campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero ventana y de poceta alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



}

UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Terminación de poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo en ejecución tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero fondo cabezal alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo elementos de viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Ejecucion de filtro francés en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista de tubería para filtro y geotextil.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo #3 instalado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Perfilado excavación para poceta de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto solado poceta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 al 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 longitudinal y transversal a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección de 7 mts placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Inicio instalación de formaleta de madera para continuidad de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuacion de terreno para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavación (Cajeo) estructura de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acopio de subbase granular para extendido sobre el tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Retiro de material procedente de excavacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Retiro de material sobrante de excavacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Recorrido con la comunidad a lo largo del corredor vial vereda corozal - california.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordilllos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones para adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavaciones adecuación de taludes para anchos de vía.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general cabezal de descole.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 longitudinal y transversal tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de estructura para adecuación de elemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para estructura obra de drenaje.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cabezote de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto para cabezote de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo descole cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza y nivelación de terrenos para escarificacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de mezcla SUELO - CEMENTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactacion de suelo cemento tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividad de estabilización de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para instalación de tubería Alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalacion de tuberia de PVC de 36” para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación y nivelación de terreno.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado formaleta para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general terminado concreto placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acabado de concreto de 21 Mpa para bodillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos de curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado acero dde refuerzo placa huella elementos de curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Perfilación de excavación para poceta de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa fondo poceta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Perfilado de excavación para cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 apra viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 al 29 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**21 AL 23 AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD; TERMINACION PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**21 AL 23 AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**21 AL 23 AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO LANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISTA DEL TRAMO TERMINADO

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0820 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE CONCRETO DE 21 MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0810 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+800 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+768 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0790 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0830
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTROS DE MATERIALES

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**2 AL 8 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+770 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0862 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA DE CONCRETO DE 14 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+086210 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION Y ADECUACION PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+780 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+890 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUAION DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0790 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0820
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE VIGA RIOSTRA DE CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**9 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+770 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACEROS PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0862 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION Y EXCAVACION PARA CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0790 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACEROS EN CUNETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+862 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA EN CUNETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+890 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0800 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETOS DE 21 MPA EN BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0770
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 AL 22 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+800 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE DE SELLO DE JUNTAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RECORRIDO DE ENTREGA CON MUNICIPIO, VEEDURIA Y CONTRATISTA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 AL 24 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RECORRIDO DE ENTREGA CON MUNICIPIO, VEEDURIA Y CONTRATISTA

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella recorrido realizado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Inspección de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Visita técnica para verificación de actividades ejecutadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de piedra para gaviones .

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general malla instalada para gaviones.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de gaviones instalados.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto terminado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación en campo de actividades ejecutadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella tramo 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 3A.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 3A.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Alcantarilla tramo en ejecución..

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general recorrido tramo 3B.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 AL 08 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación área final del tramo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de gaviones ejecutados en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista lateral gaviones ejecutados.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista frontal de gaviones.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general base gavión.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Sellado de fisuras observadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Sellado de fisuras en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 AL 15 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cierre actual del tramo de placa huella No5 y final.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Topografía para planos récord placa huellas ejecutadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de puntos levantamiento topográfico.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general topografía en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de datos en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de datos topográfico tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 AL 30 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista tramo No5 final placa huella.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE EL CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 3

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION PLACA HUELLA TRAMO 3

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENTREGA DE OBRA A COMUNIDAD Y MUNICIPIO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENTREGA DE OBRA A COMUNIDAD Y MUNICIPIO

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 DE AGOSTO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO 21 MPA PARA LOSA DE PISO DESCOLE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO EN CONCRETO 14MPA, CONCRETO LIMPIEZA PARA CAJA ENCOLE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CAJA DE DESCOLE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO 21 MPA PARA LOSA DE PISO DESCOLE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FORMALETEO PARA CAJA DE DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRASNVERSAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CAJA DE DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRASNVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PREPARACIÓN CONCRETO IN SITU RESISTENCIA 21 MPA PARA CAJA DE DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRASNVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA CAJA DE DESCOLE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REUNIÓN EN OBRA PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRA FISICO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENSAYO DE DENSIDADES AL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENSAYO DE DENSIDADES AL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENSAYO DE DENSIDADES AL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CUNETAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO PARA CORROBORAR LA RESISTENCIA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONCRETO RESISTENCÍA 21 MPA – MEZCLA IN SITU.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO 21MPA PARA LOSA DE PISO CAJA ENCOLE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA – MEZCLA IN SITU.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA – MEZCLA IN SITU.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SEÑALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN FORMALETA PARA VACEO EN CONCRETO REFORZADO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA PARA HUELLAS Y RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA PARA HUELLAS Y RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA.

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1101-24	1-ago-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1102-24	1-ago-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1103-24	1-ago-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1104-24	1-ago-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1105-24	1-ago-24	RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO: MODIFICACION No. 02 Y ACTA DE RECIBO No. 02 Y/O FINAL	1	ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1109-24	1-ago-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - PAMPLONITA	1	JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1110-24	5-ago-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - PAMPLONITA	1	JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1111-24	1-ago-24	ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA DE LA REFERENCIA - LAS PALMAS	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1112-24	1-ago-24	RESPUESTA SOLICITUD DE AVAL MAYOR ANCHO DE VIA SEGÚN INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONAL DE RECURSOS AL CONTRATO No. 2590 -2022 DERIVADO DEL CONVENIO 1943-2021	1	JUAN JOSE OYUELA SOLER Subdirector Vías Regionales joyuela@inviais.gov.co Instituto Nacional de Vías - Inviás Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C.	INVIAS	JAQG	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1113-24	2-ago-24	SOLICITUD DE APROBACION PARA AMPLIAR EL ALCANCE EN EL TRAMO No. 1. - MUTISCUA	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS SECRETARIA DE VIAS GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1114-24	1-ago-24	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PARA RECIBO DE OBRA	1	LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	JAQG	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1115-24	5-ago-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA ACTA DE MODIFICACION - RICAURTE	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1116-24	5-ago-24	RESPUESTA OFICIO 300- 0405 DE FECHA 02-08-2024 CON ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. MFLP-004-2022	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander Doctora ANGIE MARCELA ORTIZ ACOSTA Secretaria de Planeación e Infraestructura LA PLAYA Norte de Santander	LA PLAYA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1117-24	6-ago-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	1	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA - 1814	JAQG	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1118-24	5-ago-24	APROBACIÓN INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.	1	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Unión Temporal GBE Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA - 1814	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1119-24	5-ago-24	APROBACIÓN INFORME MES DE JULIO DE 2024, OCAÑA BUENAVISTA COMPONENTE SOCIAL.	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Unión Temporal GBE Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA - 1814	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1120-24	6-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL	1	ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1121-24	6-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047971 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, COMPONENTE SOCIAL.	2	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1123-24	6-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1124-24	6-ago-24	NOVEDAD DESPLOME DE TECHO EN PVC.	3	Señores RENTAVIAS S.A.S CÚCUTA Señor JOSE LUIS SANTOS PADILLA	OFICINA	DMAF	LAFC	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1125-24	8-ago-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-968-24, GIC-INVIAS-NTS-1089-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - LOURDES	2	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES PBB LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1126-24	6-ago-24	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA - MUTISCUA	2	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista	MUTISCUA	JJGP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1127-24	9-ago-24	INFORMES SEMANALES CONTRATO DE INT	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	DMAF	JAQG	2024S-VUVRAZ-074384
GIC-INVIAS-NTS-1128-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Director de Obra CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1129-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024 - HERRAN	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1130-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024	1	UNION TEMPORAL PLACA EDIVAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1131-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1132-24	9-ago-24	APROBACIÓN INFORME SST JULIO 2024 - MUTISCUA	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C.Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1133-24	12-ago-24	GIC-INVIAS-NTS-1133-24- REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1114-24	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander	Cto. LP-OP-01-2022 - SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1134-24	12-ago-24	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA - HERRAN	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1135-24	12-ago-24	ACTA DE COSTOS NO. 23 E INFORME MENSUAL NO. 22 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2024.	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-075481
GIC-INVIAS-NTS-1136-24	13-ago-24	RESPUESTA COMUNICADO, AJUSTES A COMPONENTE GEOMÉTRICO EN ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN NO. 1	2	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Cúcuta – Norte de Santander	PAMPLONITA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1137-24	13-ago-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL LA PLAYA	1	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	PLAYA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1138-24	13-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST – JULIO 2024	1	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1139-24	14-ago-24	REITERACIÓN REPARACIÓN CIELO RASO	4	Señores RENTAMAS S.A.S CÚCUTA Señor: JOSE LUIS SANTOS PADILLA CÚCUTA	RENTAMAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1140-24	14-ago-24	RESPUESTA COMUNICADO PHM2022 – 070-2024, CON ASUNTO: SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS - APROBACION	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	PATIOS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1141-24	14-ago-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVAL – TRIJIA 2590	GOBERNACIÓN 1943	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1142-24	14-ago-24	REVISION No.2 COMPONENTE TOPOGRAFICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1143-24	14-ago-24	REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1144-24	14-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL JULIO MUTISCUA DEL COMPONENTE SOCIAL - MUTISCUA	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1145-24	14-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL JULIO DEL COMPONENTE SOCIAL - HERRAN	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1146-24	15-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST – JULIO 2024	1	Señor: HUGO PEREZ ALVAREZ RDIRECTOR DE OBRA UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista CÚCUTA – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2052	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1147-24	15-ago-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 3. Cto. No. 02332 DE 2022	1	Señor: HUGO PEREZ ALVAREZ RDIRECTOR DE OBRA UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista CÚCUTA – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1148-24	15-ago-24	SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1149-24	15-ago-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN CTO. CD-FC-082-2023	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-071-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1150-24	15-ago-24	SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1151-24	16-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-077468
GIC-INVIAS-NTS-1152-24	16-ago-24	RESPUESTA OFICIO OK-174-2022 - APROBACIÓN PLANOS RECORD OCAÑA LÍMITES MORRISON	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL Director de Obra CONSORCIO OK 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander.	OCAÑA 1758	JAQG	AGDP	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1153-24	16-ago-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-061-2024 CON ASUNTO: ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN MODIFICATORIO No 3 - APROBACIÓN	1	SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1154-24	16-ago-24	REITERACIÓN No. 2 COMUNICACIONES GIC-INVIAS-NTS-1114-24 y GIC-INVIAS-NTS-1133-24 "SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PARA RECIBO DE OBRA"	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1156-24	20-ago-24	REVISION No. 2 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1157-24	20-ago-24	RESPUESTA OFICIO No. 043 CON ASUNTO: PLANOS RECORD Y ANEXOS TOPOGRÁFICOS RINCON LA COPITA.	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1158-24	20-ago-24	REVISIÓN No.3 COMPONENTE TOPOGRAFÍA MUNICIPIO LOURDES FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1159-24	21-ago-24	APROBACIÓN INFORMES SST MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024 - PAMPLONA	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Pamplonita Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1160-24	21-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024. - PAMPLONA	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Pamplonita Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1161-24	21-ago-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CLP-GIC-064- 2024 CON ASUNTO REITERACION SOLICITUD ADICIONAL – CONTRATO	1	Ingeniero DEIBY JANER MESA Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1162-24	21-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-055119 RECIBIDO EL 21 DE AGOSTO DE 2024 – CERTIFICACIONES HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	1	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO Subdirectora de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS S Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1163-24	22-ago-24	OBSERVACIONES GENERALES ESTUDIOS Y DISEÑOS.	3	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1164-24	22-ago-24	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA INICIO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO PLACA HUELLA DEL CORREDOR VIAL BELLAVISTA, MUNICIPIO DE VILLA CARO.	1	EFRAIN PACHECO Secretario de Vias Departamental Gobernación de Norte de Santander Cucuta Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1165-24	22-ago-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DE MARZO 2024 A MAYO 2024 – MUNICIPIO DE CACHIRA – CONVENIO 1859 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-079263
GIC-INVIAS-NTS-1166-24	22-ago-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DE MAYO 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1814 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-079311
GIC-INVIAS-NTS-1167-24	22-ago-24	RESPUESTA CORREO "DISEÑO GEOMETRICO CONTRATO No. CD-FC-054-2023, VIA PARAMO-PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA"	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1168-24	22-ago-24	REVISION No.1 CONCEPTO ESTRUCTURAL PLACA HUELLA MUNICIPIO MUTISCUA FARO DEL CATATUMBO –OBSERVACIONES	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1169-24	22-ago-24	REVISION No.1 CONCEPTO ESTRUCTURAL ALCANTARILLAS MUNICIPIO HERRAN FARO DEL CATATUMBO –OBSERVACIONES	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1170-24	22-ago-24	REVISIÓN NO.1 - OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO - GRAMALOTE	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-071-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1171-24	22-ago-24	REVISION PLAN DE CALIDAD MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1172-24	22-ago-24	REVISION PLAN DE CALIDAD MUNICIPIO GRAMALOTE FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-071-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1173-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1173-24A	22-ago-24	REVISION No.2 CONCEPTO TOPOGRAFÍA MUNICIPIO MUTISCUA FARO DEL CATATUMBO –APROBACIÓN	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1174-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - MUTISCUA	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1175-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Director de Obra CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1176-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - HERRAN FARO	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1177-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024	1	UNION TEMPORAL PLACA EDIVAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1178-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SALR	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1179-24	22-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Buena vista – Norte de Santander	OCAÑA 1814	SALR	JAQG	
GIC-INVIAS-NTS-1180-24	22-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN GR-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INICIAL – APROBACIÓN - GRAVALOTE	2	VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1181-24	22-ago-24	RESPUESTA OFICIOS INVIAS 2024S-VBOG-044554 y 2024S-VBOG-044563	1	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-080550
GIC-INVIAS-NTS-1182-24	23-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-079727
GIC-INVIAS-NTS-1183-24	23-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-039300 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE EL ZULIA, COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL.	1	Angie Juliet Mila Diaz Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-079722
GIC-INVIAS-NTS-1184-24	23-ago-24	RESPUESTA OFICIOS INVIAS 2024S-VBOG-044554 y 2024S-VBOG-044563	1	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-079720
GIC-INVIAS-NTS-1185-24	23-ago-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE CÁCOTA, COMPONENTE AMBIENTAL.	1	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-080511
GIC-INVIAS-NTS-1186-24	23-ago-24	RESPUESTA OFICIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CON ASUNTO: TRASLADO DE OFICIO MATTICES-CACH-088-2024., PARA REVISIÓN Y CONCEPTO Y SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA	1	Arquitecto MANUEL ALEXIS SEPULVEDA JAIMES Secretario de Planeación Municipio de Cachira Carrera 6 No. 5-110 Barrio Centro Cachira– Norte de Santander	CACHIRA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1187-24	23-ago-24	RESPUESTA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA CONTRATO No. CD-FC-081-2023. PARA APROBACION DE HOJA DE	1	Doctor VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1188-24	23-ago-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-1030-24 – SOLICITUD INICIO OBRAS DRENAJE MUNICIPIO DE LOS PATIOS	3	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1189-24	26-ago-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1122-24; RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE CÁCOTA, COMPONENTE AMBIENTAL.	2	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	GOBERNACION 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1190-24	26-ago-24	REVISION No. 2 COMPONENTE DISEÑO HIDRAULICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1191-24	26-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO TOPOGRAFIA CONTRATO REFERENCIA – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1192-24	26-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: COMPONENTE ESTRUCTURAL – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1193-24	26-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-001 CON ASUNTO: DISEÑO GEOMETRICO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1194-24	26-ago-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-011, REVISION COMPONENTE DISEÑO GEOMTERICO	1	VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1195-24	26-ago-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-011, APROBACION ALCANTARILLA	1	VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1196-24	26-ago-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-737-24; RESPUESTA OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-047971	1	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1197-24	26-ago-24	ALCANCE OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-006, APROBACIÓN DE LOS DEMAS COMPONENTES CTO. CD-FC-074-2023.	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1198-24	26-ago-24	APROBACIÓN INFORME FINAL SST OCAÑA MORRISON - 1758	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Consorcio Ok 2022 Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA 1758	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1199-24	26-ago-24	APROBACIÓN INFORME FINAL SOCIAL	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Consorcio Ok 2022 Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA 1758	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1200-24	27-ago-24	ALCANCE OFICIO N°010- CD-FC-082-2023, N°015-CD-FC-082-2023. CD-FC-082-2023. APROBACIÓN.	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1201-24	27-ago-24	ALCANCE OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-006, APROBACIÓN COMPONENTES FALTANTES CTO. CD-FC-074-2023.	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1202-24	27-ago-24	REITERACIÓN 2 OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1088-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1011-24 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	2	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1203-24	27-ago-24	REITERACIÓN 3 GIC-INVIAS-NTS-968-24, GIC-INVIAS-NTS-1088-24, GIC-INVIAS-NTS-1155-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - LOURDES	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1204-24	27-ago-24	ENTREGA DE DOCUMENTO PAGA. - MUTISCUA	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1205-24	27-ago-24	ENTREGA DE DOCUMENTO PAGA. - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1206-24	27-ago-24	ENTREGA DE DOCUMENTO PAGA. - GRAMALOTE	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1207-24	28-ago-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-081474
GIC-INVIAS-NTS-1208-24	28-ago-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2. - SILOS	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1209-24	28-ago-24	CERTIFICACIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - SILOS	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1210-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - ABREGO	1	SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1211-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Buena vista – Norte de Santander	OCAÑA - 1814	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1212-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - CACHIRA FARO	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1213-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - CACHIRA	1	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PEREZ ALVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	CACHIRA	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1214-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - 1943	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIMAL – TROJA 2590 AURO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1215-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - HERRAN FARO	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1216-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 -LA PLAYA	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Director de Obra CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1217-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - MUTISCUA FARO	1	VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1218-24	28-ago-24	ENTREGA DE INFORME MES DE AGOSTO SOCIAL - PAMPLONITA FARO	1	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista Pamplonita– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1219-24	28-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024 - GRAMALOTE FARO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1220-24	28-ago-24	RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO: CAMBIO DE TRAMO A INTERVENIR CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE GRAMALOTE. N.DE S.	2	Ingeniero ROSO EVELIO IBARRA COMUNIDAD VEREDA SAN ISIDRO Gramalote – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1221-24	28-ago-24	ALCANCE OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1100-24 SOLICITUD SUSPENSIÓN A TERMINO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE OBRA No 160 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA Y CONSTRUCTORA MATICCES PAR LTDA. Y GIC-INVIAS-NTS-1186-24; RESPUESTA OFICIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CON ASUNTO: TRASLADO DE OFICIO MATTICES-CACHI-088-2024, PARA REVISIÓN Y CONCEPTO Y SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA	1	Arquitecto MANUEL ALEXIS SEPULVEDA JAIMES Secretario de Planeación Municipio de Cachira Carrera 6 No. 5-110 Barrio Centro Cachira– Norte de Santander	CACHIRA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1222-24	28-ago-24	RESPUESTA COMUNICADO No. WRGR-CD-FC-058-2023-010 - REVISION No. 2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1223-24	28-ago-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN CON ASUNTO: REMISION DOCUMENTO PAGA GRAMALOTE - OBSERVACIONES	1	VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1224-24	29-ago-24	RESPUESTA CORREO "SUBSANACION OBSERVACIONES V.0 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO CD-FC-082-2023" – COMPONENTE TOPOGRAFÍA APROBACIÓN - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1225-24	29-ago-24	APROBACIÓN INFORME FINAL AMBIENTAL - OCAÑA 1758	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Consorcio Ok 2022 Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA 1758	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1226-24	29-ago-24	SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRAMITE DE DESEMBOLSOS PAGOS ACTAS PARCIALES Y ACTAS FINALES DE OBRA PARA LIQUIDACIÓN CONTRATOS DE OBRA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vias Gobernación Norte de Santander Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1227-24	29-ago-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590- 349, CON ASUNTO: RECONOCIMIENTO PRESUPUESTO P.A.G.A PARA ACTA PARCIAL N° 05	3	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVAL – TRIJIA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1228-24	29-ago-24	RESPUESTA AL OFICIO SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y SUBSANACIÓN DE ACTIVIDADES INCONCLUSAS EN EL MARCO DEL CONTRATO N°160 DE 2022 DE FECHA 20-08-2024	7	Arquitecto MANUEL ALEXIS SEPULVEDA JAIMES Secretario de Planeación Municipio de Cachira Carrera 6 No. 5-110 Barrio Centro Cachira– Norte de Santander	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1229-24	30-ago-24	REITERACION DE OFICIO GIC-INVIAS-952-24 ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA - 1758	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1230-24	30-ago-24	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO	1	Doctor HUBER DARIO SANCHEZ ORTEGA Alcalde municipal Calle 14 con Carrera 5ª - Palacio Municipal Abrego - Norte de Santander	ABREGO	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1231-24	30-ago-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-951-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA - 1814	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1232-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.	1	DOCTOR DANIS CARLWIS RAMIREZ VILORA Alcalde Municipio Santiago Carrera 3 N° 3-61 Barrio El Centro Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1233-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE CACHIRA	1	Doctor HERMAN FERNANDO JAIME MORA Alcalde Municipal Cachira Norte de Santander	CACHIRA	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1234-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE HERRAN	1	SEÑOR SALVADOR AVELLANEDA ALCALDE MUNICIPIO HERRAN HERRAN – NORTE DE SANTANDER	HERRAN	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1235-24	30-ago-24	SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN	1	CLAUDIA ALEXA CARRASCAL PACHECO SECRETARIA HACIENDA Y SALUD LA PLAYA LA PLAYA DE BELÉN – NTE DE SANTANDER	LA PLAYA	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1236-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	1	FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N.3-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1237-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.	1	EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vias GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION - 1943	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1238-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vias GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION - 2052	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1239-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2033 de 2021.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vias GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION - 2033	DMAF	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1240-24	30-ago-24	GIC-INVIAS-NTS-1240-24 APROBACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES- MUNICIPIO DE EL ZULIA.	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero YENNI MILEÑA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS Contratista Zulia – Norte de Santander	ZULIA	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1241-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME FINAL SST	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Buenavista Norte de Santander	OCAÑA - 1814	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1242-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME FINAL SST - CACHIRA	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1243-24	30-ago-24	SOLICITUD ENTREGA INFORME FINAL SST -	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor: HUGO PEREZ ALVAREZ RDIRECTOR DE OBRA UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista CÚCUTA – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1244-24	30-ago-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CLP-GIC-065- 2024 , ENTREGA INFORMES SST-AMBIENTAL – SOCIAL – OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	1	Señores CONSORCIO LA PLAYA 2022 Representante Legal DEYBI JANET MEZA VELASQUEZ Cisalta Norte de Santander	LA PLAYA	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1245-24	30-ago-24	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO, CON ASUNTO: ENTREGA INFORMES SST-AMBIENTAL – SOCIAL – – OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL - PAMPLONITA	1	Doctor VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1246-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO-COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1247-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO, COMPONENTE SOCIAL	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1248-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL, AGOSTO DEL COMPONENTE SOCIAL - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1249-24	30-ago-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL, AGOSTO DEL COMPONENTE SOCIAL - MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
PHS2022-059-2023	6-ago-24	Entrega parcial documentacion liquidacion	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	U.T. COLOMBIA	PAMPLONITA	6/08/2024	20243845
PHE2022-065-2022	6-ago-24	Entrega parcial No. 2 documentacion liquidacion	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	U.T. PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	6/08/2024	20243818
correo	8-ago-24	Soportes correo Gavinco - Cheques	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Tesorería Norte de Santander	Ricaurte	8/08/2024	20243847
2024S-VBOG-053659	6-ago-24	CONMINACIÓN A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE RADICACIÓN OPORTUNA ACTAS DE COSTOS.	2 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	9/08/2024	20243852
2024S-VBOG-053938	8-ago-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-1092-24 radicado No. 2024E-VUVRAZ-067906 del 24/07/2024. Subsanación observaciones 2024S-VBOG-047959. CI 1053-2022, correspondiente al CO N° 02590-2022. Municipio de los Patios, Gramalote y Arboledas, Norte de Santander.	3 folios	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS	8/08/2024	20243863
2024S-VBOG-053762	7-ago-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-068161- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL COMPONENTE SOCIAL	3 folios	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	PAMPLONA	12/08/2024	20243877
WRGR-CD-FC-058-2023-008	8-ago-24	INFORMACION PARA TRAMITE DE VALLA	1 FOLIO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION 2033	SANTIAGO	12/08/2024	20243879
MATICCES – LOURDES – 026 - 2024	12-ago-24	Subsanaciones componente hidráulico y topografia	1 FOLIO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION 2033	LOURDES	13/08/2024	20243891
UTET-02590-348	12-ago-24	ALCANCE COMUNICACION UTET-02590-323, UTET-02590-327, UTET-02590-334, PERDIDA DE BANCA POR CRECIENTE SUBITA.	1 FOLIO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/08/2024	20243896
OFC-CLP-GIC-064- 2024	10-ago-24	REITERACION SOLICITUD ADICIONAL – CONTRATO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	LA PLAYA	LA PLAYA	13/08/2024	20243897
WRGR-CD-FC-058-2023-009	9-ago-24	ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOMÉTRICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION 2033	SANTIAGO	13/08/2024	20243908
OFC-CADV-GIC-058-2024	9-jul-24	ENTREGA DE INFORMES AREA AMBIENTAL – SST JULIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	13/08/2024	20243911
GIC-IDER-CTG-20243918-21	14-ago-24	INFORMES SST - AMB JULIO 2024 CSIO LA PLAYA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	14/08/2024	20243918
OFC-CADV-ABO-045-2024	19-jun-24	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS - ANEXO 10 – ANEXO 11	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	14/08/2024	20243030-1
PAMPLONITA	14-ago-24	Entrega informes de SST contrato No. CD-FC-054-2023-Pamplonita	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION 2033	PAMPLONITA	15/08/2024	
OFC-CADV-GIC-061-2024	14-ago-24	ENTREGA DE REPROGRAMACION MODIFICATORIO No 3	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VÍAS	ABREGO	15/08/2024	20243944
PHS2022 – 0101 – 2024	15-ago-24	PROTOCOLO REPARACION DE LOSAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	16/08/2024	20243956
Pamplonita	13-ago-24	Entrega informes de SST contrato No. CD-FC-054-2023-Pamplonita	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	PAMPLONITA	16/08/2024	20243957
SCCVN-CD-FC-081-2023-0011	31-jul-24	Presentación subsanación observaciones topográficas, estructurales, geométricas e hidráulicas.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	MUTISCUA	2/08/2024	20243783
016-CD-FC-082-2023	31-jul-24	Presentación subsanación observaciones topográficas, estructurales, geométricas e hidráulicas	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION 2033	HERRAN		
Alcaldía de Cachira	16-ago-24	Traslado de oficio MATTOICES-CACHI-088-2024 para revisión y concepto y solictud de pronunciamiento sobre liquidación bilateral contrato de obra	012 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Alcaldía de Cachira	Cachira	16/08/2024	20243973
OFC-CADV-GIC-062-2024	20-ago-24	ENTREGA INFORMES TRIMESTRALES – SEGUIMIENTO AMBIENTAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	20/08/2024	20243995
correo	21-ago-24	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.01 - RICAURTE ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS ACTA DE MODIFICACIÓN FORMATO ENTIDAD	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	Ricaurte	21/08/2024	20244001
SCCY-CD-FC-071-2023-001	16-ago-24	TOPOGRAFIA CONTRATO EN REFERENCIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GRAMALOTE	21/08/2024	20244002
GRAMALOTE	16-ago-24	cambio de tramo a intervenir construcción de placa huella vereda san isidro municipio de Gramalote. N.de S.	004 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	COMUNIDAD - SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GRAMALOTE	21/08/2024	20244003
SCCY-071-001	20-ago-24	DOCUMENTOS INICIALES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	GRAMALOTE	21/08/2024	20244005
correo	21-ago-24	TRAZABILIDAD DE OFICIOS DE APROBACIÓN COMPONENTE SST	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1758	21/08/2024	20244007
2024S-VBOG-055119	12-ago-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-068103 - Ingeniero Ambiental	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	21/08/2024	20244016
MUTISCUA	22-ago-24	OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1113-24 DEL 01/AGOSTO/2024. SOLICITUD DE AVAL Y CONCEPTO TECNICO DE INTERVENTORIA PARA APORBACION DE SOLICITUD DE AMPLIACION ALCANCE EN EL TRAMO # 1 - VIA RURAL MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESA - MUNICIPIO DE MUTISCUA - NORTE DE SANTANDER. DE ACUERDO A PETICION CON RAD.GOB. N° 2024-08400-023452-2	CORREO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION 2033	MUTISCUA	22/08/2024	20244019
OFC-CADV-GIC-063-2024	22-ago-24	RESPUESTA A OFICIO No OFC-CADV-GIC-037 ENTREGA DOCUMENTOS – ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	22/08/2024	20244023
UTET-02590-349	22-ago-24	RECONOCIMIENTO PRESUPUESTO P.A.G.A PARA ACTA PARCIAL N° 05.	003 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	22/08/2024	20244024
200-0594-24	23-ago-24	SOLICITUD DE FIRMA DE CHEQUE DE OBRA Y NUEVA CHEQUERA.	001 FOLIOS	GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogotá D.C.	LA PLAYA	ALCALDÍA	26/08/2024	20244043

correo	23-ago-24	PAGOS - ACTA NO. 3 - CHEQUES CONTRATISTA	003 FOLIOS	GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogotá D.C.	GOBERNACION 2052	PATIOS	26/08/2024	20244044
WRGR-CD-FC-058-2023-010	27-ago-24	ENTREGA CORRECCION DE DISEÑO ESTRUCTURAL, GEOMETRICO Y TOPOGRAFICO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	GOBERNACION 2033	SANTIAGO	27/08/2024	20244084
UTET-02590-351	23-ago-24	CONCEPTO BOX CULVERT POR ESPECIALISTA EN MUNICIPIO DE GRAMALOTE	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	27/08/2024	20244085
UTET-02590-347	3-ago-24	INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	001 FOLIOS	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	27/08/2024	20244086
UTET-02590-350	23-ago-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-991-24 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 CON OBSERVACIONES A DISEÑO HIDRAULICO VEREDA CINERA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	28/08/2024	20244097
UTET-02590-353	29-ago-24	INFORME TRIMESTRAL JUNIO-JULIO-AGOSTO COMPONENTE SOCIAL.	001 FOLIOS	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	29/08/2024	20244112
2024S-VBOG-059186	27-ago-24	Respuesta a oficio GIC-INVIAS-NTS-1162-22 de 21 de agosto de 2024- aprobación profesional ambiental	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Gavino Ingenieros Consultores S.A.S jquintero@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	INVIAS	29/08/2024	20244113
correo	27-ago-24	Contrato No. CD-FC-054-2023-Pamplonita - Diseño de Mezcla y valla	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACION 2033	29/08/2024	20244114
2024-04000-021480-1	23-ago-24	SOLICITUD DE AVAL Y CONCEPTO TECNICO DE INTERVENTORIA PARA APROBACION DE SOLICITUD DE AMPLIACION ALCANCE EN EL TRAMO #1 - VIA RURAL MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA - NORTE DE SANTANDER	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SECRETARIO DE VÍAS- EICE FARO	MUTISCUA	29/08/2024	20244124
correo	29-ago-24	ENTREGA PARCIAL N°3 DOCUMENTACION PH HERRAN.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	HERRAN	29/08/2024	20244135
correo	29-ago-24	PAGA PH SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	WALTER RENE GOMEZ	SANTIAGO	30/08/2024	20244145
correo	29-ago-24	PAGA PH GRAMALOTE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO YEOSUA	GRAMALOTE	30/08/2024	20241444
GBE-218-2022	29-ago-24	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA MEDIANTE ACTA DE TERMINACION.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	30/08/2024	20245155
OFC-CLP-GIC-065- 2024	30-ago-24	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-1175-24 ENTREGA INFORMES SST AMBIENTAL - SOCIAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	30/08/2024	20244158
SCCY-071-002	29-ago-24	DISEÑO HIRAULICO, SUELOS Y PAVIMENTOS	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GRAMALOTE	30/08/2024	20244160
correo	30-ago-24	ENTREGA INFORME SOCIO-AMBIENTAL AGOSTO HERRÁN FARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	RENZO ADRIANO ORTEGA	HERRAN	30/08/2024	20244168
correo	30-ago-24	ENTREGA INFORME SOCIO-AMBIENTAL AGOSTO HERRÁN FARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS	MUTISCUA	30/08/2024	20244196
UTET-02590-359	30-ago-24	INFORME TRIMESTRAL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE AÑO 2023 COMPONENTE AMBIENTAL.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	30/08/2024	20244174
COMUNICADO	30-ago-24	Entrega de informe social del mes de agosto.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	2/09/2024	20244181
UTET-02590-360	30-ago-24	INFORME TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO AÑO 2024 COMPONENTE AMBIENTAL.	001 FOLIOS	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	2/09/2024	20244182

BITACORA

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

agosto 1 - 2024
placa huella corredor 2
Clima: Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de Concreto.
Actividades en obra: Se realiza figurado e instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, conetas, vigas y bordillos en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 2 - 2024
placa huella corredor 2
Clima: Soleado
hora de inicio: 7 AM - 12PM; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de huellas, vigas y conetas en concreto 21Mpa en el tramo san Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 5 - 2024
placa huella corredor 2
Clima: nublado
hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra,

SST, Profesional Social y ambiental p/ 505
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza figurado e instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, contras, bordillos, vigas. excavación para instalación de vigas en el tramo San Vicentes
Adriana Gutierrez de P.
agosto 6 - 2024
placa huella corredor 2
Clima: Soleado
hora de inicio: 7Am - 12PM ; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional ambiental y social.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas, contras, vigas en concreto 21MPa, fundida de piedra pegada en concreto 14MPa en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P

agosto 7 - 2024
placa huella corredor 2
Clima: nublado lluvia 3PM - 5PM
hora de inicio: 7AM - 12PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza replanteo, excavación para instalación de viga viostro en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P

agosto 8 - 2024
placa huella corredor 2
Clima: nublado lluvia 2Pm - 4Pm
hora de inicio: 7Am - 12Pm; 1Pm - 6Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza figurado e instalación de acero longitudinal y transversal Para huellas, contras, vigas y bordillos en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 9 - 2024
placa huella corredor 2
clima: nublado
horade inicio: 7Am - 12Pm, 1Pm - 6Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de bordillos en concreto 21MPa en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 12 - 2024
placa huella corredor 2
clima: soleado
hora de INICIO: 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.

Powered by CamScanner

Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza instalacion de acero longitudin
y transversal para huellas, cunetas, bordillos y vigas en
el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 13-2024
Placa huella corredor 2
Clima: Soleado
hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra,
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de huellas, vigas
y cunetas en concreto 21MPa para el tramo San
Vicente.

Adriana Gutierrez de P

agosto 14-2024
Placa huella corredor 2
Clima: Soleado
hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra,
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades de concreto: se realiza fundida de piedra
Pegada en concreto de 14MPa en el tramo
San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 15 -2024
Placa huella corredor 2
Clima: nublado
hora de inicio: 7Am - 12Pm ; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza excavacion, instalacion de acero longitudinal y transversal para huellas, canetas, vigas y bordillo en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 16 - 2024
placa huella corredor 2
clima: nublado.
hora de inicio: 7AM - 12Pm; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se continua con la instalacion de acero longitudinal y transversal en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 19 - 2024
Placa huella corredor 2
clima: nublado lluvia 2pm - 5Pm
hora de inicio: 7AM - 12 pm ; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.

Powered by CamScanner

Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza figurado e instalación de acero, excavación para vigas en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 20-2024
placa huella corredor 2
Clima: nublado lluvia 8AM-12PM
hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas, vigas y cureta en concreto 21mpa en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P

agosto 21-2024
placa huella corredor 2
Clima: nublado lluvia 1PM-3PM
hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-5PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se continua con fundido de huellas, vigas y cunetas en concreto 21 mpa. tramo San Vicente.
y fundido de rampa.

Adriana Gutierrez de P

agosto 22 - 2024
Placa huella corredor 2
Clima: nublado lluvia 4 PM - 5 PM
hora de inicio: 7 AM - 12 PM ; 1 PM - 5 PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de piedra pegada en concreto 14mpa tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 23 - 2024
Placa huella corredor 2
Clima: nublado lluvia 10 Am - 5 PM
hora de inicio: 7 AM - 12 PM ; 1 PM - 5 PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de bordillos, en concreto 21 MPa y se da por terminado el tramo SanVicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 26 - 2024
Placa huella corredor 2
Actividades en obra: no se realizan actividades.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 27-2024
placa huello corredor 2
Clima nublado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, maestro
5 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra
SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza instalacion de
sello de juntas en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 28-2024
placa huella corredor 2
Clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra,
SST, profesional social y ambiental.
Equipos: herramienta menor.
Actividades en obra: se realizo instalacion de sello
de juntas en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 29-2024
Placa huella
Actividades en obra: no se Faliau actividades

Adriana Gutierrez de P.

agosto 30 - 2024
placa huella
clima : soleado.
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra.
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: herramienta menor.
Actividades en obra: instalación de sello de juntas y se da por terminado todo en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

31 de Julio del 2024
Vereda Corozal- California Clima: Soleado

x Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.

* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarito

x Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con instalación de formaleta en madera para las placa huellas en ciclopeo K1+050 posteriormente se hace el vaciado en concreto ciclopeo de 14 Mpa, Interventoria toma muestras de concreto para realizar cilindros para ensayos de resistencia en laboratorio durante la jornada de trabajo se realizo descargue de arena, triturado 3/4", roca para el concreto ciclopeo, se avanzo en el retiro de material de excavación con Pajarita y volqueta.

Resid. Obra.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

01 de agosto del 2024
Vereda Corozal- California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de obra (1) Almacenista (1) Auxiliar de topografia (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (4) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria (1) SST

* Equipos disponibles en Uso: (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita

x Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con vaciado en concreto de 21 Mpa para placa huella K1+050. Adicionalmente se avanza en la excavación de la sub-rasante con maquinaria de Bulldozer, motoniveladora. avance en conformación de capa de sub-base, compactación con equipo vibro-compactador en la jornada de la mañana se realizo descargue de Cemento Cemex estructural.

02 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (1) SST (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (11) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia amarre de aceros para placa huellas y viga riostras para posteriormente realizar vaciado en concreto de 21 Mpa realizado en obra. K1+020 Nuevo diseño sección trasversal 7 Mts. Avance en excavación de la sub-rasante con equipo Bulldozer, motoniveladora topografia del contratista verifica niveles de excavación durante la jornada de la tarde personal de obra realiza vaciado en concreto ciclopeo de 14 Mpa para huellas K1+000

Jose H Torres Suarez
Residente de Interventoria

03 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (1) SST (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre de aceros para placa huellas y viga riostras K1+00 Avance en conformacion de capa de sub-base con Motoniveladora y extendido de geotextil a la subrasante. K0+900

05 de agosto del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Personal de obra inicia actividades en cunetas y bordillos. vaciado en concreto de 21 MPa para cuneta costado derecho hacia menores. Adicionalmente se avanza en conformación de capa de sub-base granular cerrado de capa Final con motoniveladora Kot930. excavación con bulldozer en sub-rasante. En la jornada de la tarde se realizo vaciado en concreto ciclopeo para huellas K1+000

Cristian Cruz
Resid Obra

Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

06 de agosto del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavación, armarre de aceros para placa huellas y viga riostras sección transversal a 7 mts Kot930. Avance en conformación de sub-base granular compactación con equipo vibro-compactador excavación de Subrasante con motoniveladora. Jornada de la tarde se realizo vaciado en concreto de 24 MPa para huellas en piedra pegado. durante la jornada se realizo descargue de Sub-base

Cristian Cruz
Resid Obra

Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

07 de Agosto del 2024 Festivo
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarito
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicio con vaciado en concreto de 21 Mpa para placa huellas y viga riostras. tambien se avanza en excavación y conformación de capa de sub-base

Res. Obra — Jose H. Torres Suarez, Residente de Interventoria

08 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (11) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador. (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre de aceros para placa huella y viga riostras posteriormente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa Kot930. Conformación de capa de sub-base, cerrado con motoniveladora capa final Kot850. Excavación de sub-rasante con maquina pajarita y volgueta Kot700 Jornada de la tarde se realizo vaciado en concreto ciclopeo de 14 Mpa K0+920

Res. Obra — Jose H. Torres Suarez, Residente de Interventoria

09 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (1) Motoniveladora (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarito
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 con fuertes lluvias de 3:00 Am a 6:00 Am. Personal de obra inicia con excavación de limpieza para cunetas y bordillos, amarre de aceros y fundida en concreto de 21 Mpa K1+190 Cunetas costado derecho, bordillos costado Izquierdo. Avance en conformación de capa de sub-base ceriado con maquina motoniveladora lluvias moderadas de 12:00 Pm a 1:00 Pm.

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleada

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarito
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Sin actividades en placa huella, solo se realizo actividades en excavación de la sub-rasante con equipo tipo pajarito y Volqueta, retiro de material de excavación

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima-Dia: Soleado
* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 personal de obra inicia con amarre de aceros para placa huellas y viga riostras en el Km0+930 Posteriormente se realizo vaciado en concreto de 21 Mpa. Jornada de la tarde se avanzo en instalación de formaleta para placas en piedra pegado, tambien se avanzo en la remoción de material saturado de excavación con pajarita y motoniveladora

Resid Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

13 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado
* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Bulldozer (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Motoniveladora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre de aceros para placa huellas y viga nostras en el Km0+900. Jornada de la tarde se avanza en el vaciado en concreto de 21 Mpa en las placa huellas y viga riostras, adicionando aditivo antisol para el curado del

concreto, tambien se avanza en la conformación de la capa de sub-base, compactación de capa Final con Vibro-compactador Kot850, Excavación con motoniveladora en Sub-rasante tramo 1 Kot600

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

14 de agosto del 2024
Veredo Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos utilizados: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutados: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavación de limpieza para cunetas y bordillos, adicionalmente se realiza instalación y amarre de aceros para los cunetas y bordillos costado derecho K1+080 hacia menores, 10:30 Am inicia el vaciado para las cunetas. Interventoria toma muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión en laboratorio. Jornada de la tarde se hace el vaciado para huellas en concreto ciclopeo de 14 mpa Kot890 7 modulos en total, contratista toma ensayos de densidades en la capa Final de la sub-base para verificar la calidad de la compactacion en el Kot850 dando resultados satisfactorios 3 ensayos en total. Se continuo con la excavación de la Sub-rasante con maquina Bulldozer; 1 Pajarita, 2 Volqueta para retiro de material en el Kot450, motoniveladora realiza perfilado de la capa. Instalación de geotextil en el Kot600 en la sub-rasante.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

15 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de ob Interventoría (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra Inicia con vaciado en concreto de 21 Mpa para placa huellas en el Km0+900 y fundido de bordillos en concreto de 21 Mpa en el Km1+030 costado derecho, avance en excavación de la sub-rasante con maquina Bulldozer, Pajarita, motoniveladora y volqueta doble, para retiro de material Km0+550

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

16 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes. (1) Inspector de interventoria (1) Residente de Interventoría
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarita
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre, instalación de aceros para cunetas y bordillas posteriormente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa Km1+140 Costado Izq. Jornada de la tarde vaciado en concreto Ciclopeo para las huellas de 14 Mpa 8 Modulos en total Km0+880. Tambien se avanza en la excavación de la Sub-rasante Km0+400 con maquina Bulldozer, Pajarita

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

17 de agosto del 2024
Vereda - Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de interventoria
* Equipo disponible en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto (1) Pajarito
* Actividades ejecutadas: Personal de obra inicia con el vaciado en concreto ciclopeo para las huellas K0+920 adicionalmente se realiza vaciado en bordillos en concreto de 21 Mpa K1+150 costado derecho. Excavación en la sub-rasante perfilado con motoniveladora K0+550 Tramo 1

Residente Obra

Ivar H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 de agosto del 2024 Festivo
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (2) operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Pajarito
* Actividades ejecutadas: Personal de obra realiza excavación para cunetas y bordillos K1+100 durante la Jornada. Avance en excavación con maquina Bulldozer en la sub-rasante K0+400

Residente Obra

Ivar H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) oficiales (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos utilizados en obra: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (1) Pajarito (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia excavación de limpieza para cunetas y bordillos, amarre de aceros y posteriormente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa K1+080 Costado Izquierdo hacia menores. Avance en la excavación de la Sub rasante con maquina Bulldozer K0+300, instalación y conformación de capa de Sub-base K0+400 con maquina motoniveladora. Jornada de la tarde se realiza vaciado en concreto ciclopeo de 14 Mpa K0+830

Residente Obra
Jose H. Nieves Suarez
Residente de Interventoria

21 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos utilizados en obra: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (1) Pajarito (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra realiza instalación y amarre de aceros para viga riostras y huellas, posteriormente se hace el vaciado en concreto de 21 Mpa K0+800. Avance en la conformación de capa de Sub-base ceriado de capa final con

maquina motoniveladora en el Km1+700. En la jornada de la tarde se continua con el vaciado de placa huellas en concreto de 21 Mpa Km1+800 total 9 Modulos. Instalación de geotextil en la sub-rasante Km1+630. durante la jornada se realizo descargue de material de sub-base en Volguetas dobles.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos utilizados en obra: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (1) Pajarito (2) Volguetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Personal de obra continua con amarre de aceros para cunetas y bordillos costado izquierdo Km1+000 adicionalmente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa. Avance en conformación de capa de Sub-base granular Km1+600 con maquina motoniveladora, se realiza limpieza demolición de los anden es de los predios para la nueva sección transversal placa huella, con maquina tipo Pajarita. Jornada de la tarde se avanza en con fundida en piedra pegada concreto de 14 mpa. Instalación de geotextil en el Km1+950. Excavación con Bulldozer en la subrasante.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

23 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) SST (1) Residente de Interventoria (1) Inspector de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Pajarita (1) Vibrocompactador (2) Mezcladoras de concreto (2) Volgurtos.
* Actividades ejecutados: Personal de obra inicia con amarre de aceros para placa huellas en el Km0+800 para posteriormente realizar vaciado en concreto de 21 Mpa 9 modulos en total, se avanza en la conformación de capa de sub-base con equipo motoniveladora Km6+20 tramo 1 Excavación en la sub-rasante con Bulldozer en el Km0+400,

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

24 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) SST (1) Inspector de Interventona (1) Residente de Interven
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Pajarito (1) Bulldozer (2) Mezcladoras de concreto (2) Volgurtas.
* Actividades ejecutados: Tramo 1 Personal de obra realiza Fundido placa huellas pendientes del dia anterior en concreto de 21 Mpa Km0+800. avance en conformación de Sub-base granular con motoniveladora Km6+600

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de Obra (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes. (1) SST (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volgurtas (2) Mezcladores de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavación para cunetas y bordillos, instalacion de Formaleta para viga riostras y placa huellas Kot780. Avance ala conformación de capa de Sub-base Kot570 Excavación de la Sub-rasante Kot300 con maquina Bulldozer Jornada de la tarde, vaciado en concreto ciclopeo de 14 Mpa Ko+780 12 modulos en total, serrado de la capa Final con Motoniveladora Ko+700

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (4) Operadores
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat. (1) Pajarita (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volgurtas (2) Mezcladores de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre de aceros para cunetas y bordillos, adicionalmente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa Ka+000 costado derecho serrado de capa Final de sub-base Ko+650 con Motoniveladora Jornada de la tarde Fundida en ciclopeo Ko+760

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

28 de agosto del 2024
Vereda Corozal- California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente dr obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos utilizados en obra: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Pajarito (1) Bulldozer. (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutados: Tramo 1 Personal de obra realiza amarre de aceros para placa huellas y viga riostras posteriormente se hace vaciado en concreto de 21 mpa. Kot780, por parte de la Interventoria se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia en laboratorio, avance en la conformación de capa de sub-base granular con maquina motoniveladora. Por otra parte contratista e Interventoria se reune con las comunidades de las veredas Corozal y California para realizar recorrido en los tramos pendientes por ejecutar.

Residente Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

29 de agosto del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudante (1) Inspector de Interventorio (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Obra: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Pajarito (1) Bulldozer. (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicio con excavacion de limpieza para Cunetas y bordillos, amarre de aceros costado derecho Kot920.

Jornada de la tarde se realizo vaciado en concreto

ciclopeo para huellas en el Kot 740 total 7 Modulos durante la jornada se realizo descargue de material de arena, triturado, cemento.

Residt Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

30 de agosto del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) SST (1) Almacenista (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (1) Pajarito (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavación para viga riostras, amarre de aceros para placa huellas Kot 740, Jornada de la tarde continuan con el vaciado en concreto de 21 mpa, 8 Modulos en total. avance en excavación de la Sub-rasante con maquina Bulldozer en el Kot 280 Tramo 1.

Residt Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

31 de agosto del 2024
Vereda corozal california Clima Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibrocompactador (1) Pajarita (1) Bulldozer. (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continuan con amarre de aceros, vaciado en concreto de 21 mpa placa huellas kot 670. Sin actividad en excavación.

Residt Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

01 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficial, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el retiro de escombros, relleno, replanteo y compactación del terreno, instalación y compactación de subbase granular, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para

huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestro, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos. Adicional la maquinaria realiza el perfilado y ampliación de la vía.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, además la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el perfilado y replanteo del descole y encole, vaciado de solado en descole y encole de la alcantarilla,

instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para elementos del desarde.

Observaciones: En la vereda Cinera se le solicita al contratista mantener herramientas manuales para la compactación (Pitón, Pava compactadora, Canguro) con intención de compactar las zonas que presenten daños por paso de vehículos o cambio climático. Adicional a esto se localizo una naciente de agua de cuenca hidrológica que atraviesa el tramo a ejecutar.

En el corredor vial que conduce hacia el frente de trabajo en la vereda Potreros, se evidencia otra alcantarilla con fractura de tubería de concreto debido al constante tránsito de vehículos de carga con agregados y materiales para la obra. Para solucionar este inconveniente se programará demolición, excavación e instalación de tubería de PVC 36" para continuar con el tránsito por el corredor y mitigar futuros daños.

Residente Obra

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoría

02 Agosto 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para rampa de acceso, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, rampa de acceso, cunetas y bordillos.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Carrera — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se inicia proceso de descapote y replanteo para inicio de construcción de filtro para la naciente de la cuenca hidrológica.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras. Adicional se continuan actividades para mejoramiento mediante la construcción de

obras de drenaje donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para placa del descole de alcantarilla

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

03 Agosto de 2024

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera — Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, excavación para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo fraguado para huellas y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

05 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo — Clima: Lluvioso.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se inicia el replanteo y ampliación de vía en el tramo No 1, traslado de herramientas al tramo No 1

Vereda Potreros — Clima: Lluvioso.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella.

Vereda Cinera — Clima: Lluvioso.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno — Clima: Lluvioso.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo longitudinal para

huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella. Se suspenden las actividades por el mal estado del clima.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

06 Agosto de 2024

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cerro. Se espera pronta solución para retomar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la limpieza de placa huella en el tramo No 2, Replanteo y compactación del terreno en el tramo No1, figurado de acero de refuerzo para vigas riostras, excavación sin clasificar para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella

Vereda Cinera – Clima: Nublado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (4) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se continúa el proceso constructivo del filtro para la naciente de la cuenca hidrológica.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

08 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cachiro. Se espera pronto solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la excavación sin clasificar para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobreanchos y franja central, excavación sin clasificar para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para la estabilización de la subrasante.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

09 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Lluvioso

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Potreros – Clima: Lluvioso.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para

huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Lluvioso.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerso figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella. Adicional se continua con la elaboración de filtro y la escarificación, adición de cemento y compactación para la estabilización de subrasante.

Vereda Juan Bueno – Clima: Lluvioso.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerso figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

10 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredes Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Soleado

No se realizaron actividades de obra debido a que se laboró el día festivo 07 Agosto de 2024. Se continuarán labores con normalidad el día 12 de agosto de 2024.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (7)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2)maestros, (1)Oficial, (10)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2)maestros, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobrancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación

de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

12 Agosto de 2024

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losa de sobreancho

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobreanchos y franja central, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras, aplicación de antisol para garantizar un curado y optimizar el desarrollo de las resistencias del concreto.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

18 Agosto de 2024.
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (8) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21MPa para losa de sobreancho, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se continua el proceso de instalación y compactación de subbase granular.

Vereda Cinera — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Observaciones: En el frente de Cinera, se realiza la recomendación de mantener una distancia segura de los bordes de la vía, que garantice la estabilidad de la cuneta y los bordillos, esto debido al replanteo y localización previa que se encontraba muy cerca al borde del terreno.

Res. Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

14 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cachirá. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para hombo central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas de madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, instalación y compactación de subbase granular. Adicional se inician las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de elementos de alcantarilla, instalación de cama de arena, inserción de tubería de 36" PVC, relleno de la tubería con material excavado sin clasificar.

Vereda Cinera — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, Adicional se continúa el proceso constructivo del filtro

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de los elementos de alcantarilla.

Observaciones: En el frente cinera se realizan recomendaciones con la ejecución del proceso constructivo del filtro para aumentar su eficiencia. En el frente de Juan Bueno se recomienda tener presente el adecuado recubrimiento para el acero, de esta manera

garantizar la durabilidad de la estructura de la placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

16 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Vdián, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Agodantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la limpieza de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Carrera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo fregurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella. Adicional se continúa el proceso constructivo de filtro.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo fiqurado para losas de sobreanchos, vigas riostras, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras. Adicional se continua con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el relleno en laterales de la poceta y descole de la alcantarilla con el material excavado sin clasificar.

Observaciones: Se le recomienda al contratista mantener en los sitios herramientas o equipos para la compactación, en caso de ser necesario para las cunetas o rellenos faltantes de alcantarillas.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

16 Agosto de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cástro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes

de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas, vigas riostras y rampa de acceso, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas, bordillos y rampa de acceso.

Vereda Potreros – Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos y rampa de acceso, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos y rampa de acceso. Adicional se continúa con la instalación y compactación de subbase granular.

Vereda Cimora – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la excavación, adición de cemento y compactación para la estabilización de

la sobrecarga, instalación y anclaje de acero de refuerzo figurado para losas de sobrancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella. Adicional se termina la construcción del filtro

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (4) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobrancho y vigas riostras.

Observaciones. Se restringe visita técnica a las veredas Santo Domingo y Volcán, ya que se planea ejecutar labores en estos frentes de trabajo. Se visualizan diversos derrumbes en las vías de acceso a los tramos en las veredas.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

17 Agosto de 2024.
Continúa la suspensión de actividades frentes en las veredas Volcán, Santo Domingo y Hebechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagüa Bajo – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclopeo de

11 MPa para franja central

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 11 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Cimera – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para la estabilización de la subrasante, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 Agosto de 2024.

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se inician actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella en el tramo No 5 donde se ejecuta el replanteo y compactación del terreno, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreancho. Adicional se continúa con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el replanteo del encole de la alcantarilla, vaciado de solado en concreto pobre para encole de la alcantarilla, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para encole de alcantarilla.

Vereda Cirera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2)maestros, (1)Oficial, (10)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta las excavaciones sin clasificar para vigas riostras, instalación y amarre

de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado en concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el vaciado en concreto de 21 MPa para placa de cuneta, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para descole de alcantarilla.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se inician las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella con el Tramo No 5 donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para la estabilización de la subrasante, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Observaciones: Se realiza visita técnica con acompañamiento del residente y componente ambiental de interventoría a los diferentes frentes de trabajo para dar seguimiento y recomendaciones para tener en cuenta en el avance constructivo. Se realiza un acta con las observaciones realizadas.

21 Agosto de 2024

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo y compactación del terreno, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para rampa de acceso, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2)maestros, (1)Oficial, (10)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclopeo de 14 MPa para sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras. Adicional se realiza la excavación, adición de cemento y compactación para la estabilización de la subrasante.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de alcantarilla.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, instalación y amarre de acero de refuerzo para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

22 Agosto de 2024

Vereda Volcán – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huela donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos y rampa de acceso, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos y rampa de acceso. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para encole de alcantarilla.

Vereda Cirera — Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de descole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21 MPa para aletas y muro pantalla (Descole de alcantarilla).

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja Central. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Residente Obra

José H. Pérez Suárez
Residente de Interventoría

23 Agosto de 2024.

Vereda Volcán - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retrocargador, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de

concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, Vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. De igual manera se instala y compacta la subbase granular. Adicional se continúa con el mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para placa de cuneta, replanteo de descole y vaciado de solado en concreto pobre para descole de alcantarilla.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volqueta.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo fijado para losa de sobrecimiento y vigas riostras. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de desole de alcantarilla.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (1) Ayudantes, (1) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de elementos de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, excavaciones sin clasificar para vigas riostras, instalación de vigas riostras.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

24 Agosto de 2024

Vereda Volcán – Clima: Nublado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, limpieza de placa huella y relleno de bordillos.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Cirera – Clima: Nublado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo – Clima: Nublado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas

Continúa las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21MPa para huellas, vigas riostras, cunetas, bordillos y rampa de acceso.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

26 Agosto de 2026.
Vereda Volcán – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se continúa con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de cuneta de alcantarilla.

Vereda Cinera – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la limpieza de placa huella. Adicional se continúa con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de elementos de alcantarilla.

Vereda Santo Domingo – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella

Residente Obra

Jose H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

27 Agosto de 2024

Vereda Volcán — Clima: Nublado con Lluvias.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas de madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ó peo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de cmole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21 MPa para cmole de alcantarilla.

Vereda Cimera — Clima: Nublado con lluvias.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúa las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para

estabilización de la subrasante, instalación y anarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado con lluvias
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y anarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de elementos de alcantarilla, instalación de cama de arena, inserción de tubería de PVC 36", relleno de tubería con material excavado sin clasificar.

Vereda Santo Domingo – Clima. Nublado con lluvias.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella. donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14MPa para franja central, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

28 Agosto de 2024

Vereda Volcán — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, ( ) Oficial, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central. Adicional se realiza el replanteo del terreno con maquinaria.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo para cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se continúa con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo para placa de descole de alcantarilla.

Vereda Cinera — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, tuercas y tornillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para franja central y sobreanchos. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de elementos de atuentallo, instalación de cama de arena, inserción de tubería de PVC 36", relleno de tubería con material excavado sin clasificar.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo y empradización de la vía, excavaciones sin clasificar para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.
- Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y viga riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

Jose H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

29 Agosto de 2024
Vereda Volcán – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo y compactación del terreno, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado huellas, vigas riostras y losa de sobreancho, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, vaciado de concreto de 14 MPa para franja central y sobreanchos. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de Obras de drenaje donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para descole de alcantarilla

Vereda Cimera – Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (1) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el) vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para

la modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de elementos de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Res. Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

30 Agosto de 2024
Vereda Volcán – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo y compactación del terreno, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14MPa para franja Central.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para descole de alcantarilla.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, ( ) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo. – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Res. Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

31 Agosto de 2024.
Vereda Volcán - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas

de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se continúan con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para placa de descole de alcantarilla.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

Lemplanteo y nivelación para instalación de formaleta para piedra pegada

Vereda Boyaca Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy, instalación y cimiento de acero, viga viosta concreta, nueva instalación de formaleta para piedra pegada y solado vaciado de concreto de 21 MPa y vaciado de concreto de 14 MPa ciclopeo

Ing Residente Obra

Jose H. Rincon Suarez
Residente de Interventoria

1 de agosto del 2024
Vereda San Isidro Clima = soleado
*Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (1) operador (8) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy excavación encontrando tramo $ X7 + 107,00 instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (1) operador (8) Ayudantes

Scanned with ACE Scanner

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy, amarre de acero viga riostra cuneta y muros, instalación de formaleta para pisara pegada y bordillo, vaciado de concreto de 21 MPA y vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo

Residente Obra

Jose H. Tovar Suarez
Residente de Interventoria

2 de agosto del 2024
Vereda San Isidro Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, Vibrocompactador, Bocat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy continuación de excavación e instalación de filtro, excavación para viga riostra, instalación y amarre de acero para cuneta viga riostra y nuevo, vaciado de concreto 21 MPA

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de obra, Residente de interventoria (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso: Retroexcavadora Vibrocompactador, mezcladora de concreto, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy, excavación para viga riostra, instalación y amarre de acero para viga riostra cuneta y muros

Scanned with ACE Scanner

Vaciado de concreto de 21 MPA para Bordillo cuneta rasante y viga riostra

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

5 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (2) Ayudantes (1) operario

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el día de hoy excavación para viga riostra, instalación y armado de acero para viga cuneta y riostra, vaciado de concreto de 21 MPA, vaciado de concreto de 14 MPA

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra

Actividades Ejecutadas

No se realizaron Actividades debido de la obra de construcción debido que la mezcladora de concreto presenta fallas mecánicas, se espera que el día de mañana se realice

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

6 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

Scanned with ACE Scanner

* Personal de trabajo = inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (1) operador (8) Ayudantes
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy excavación para viga riostra e instalación y armado de acero instalación de formaleta para placa pegada vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA ciclopeo

Vereda Boyacá clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora de concreto, Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy excavación para viga riostra instalación y armado de acero para cuneta huella y viga riostra vaciado de concreto de 21 MPA

Residente Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoría

8 de agosto del 2024
Vereda San Isidro clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora de concreto, Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy excavación para viga riostra instalación y amarre de acero para cuneta huella y viga riostra vaciado de concreto

Scanned with ACE Scanner

de 21 MPA tramo 5 , inicio tramo 3 con sobre concreto y compactación

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria , Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto , vibrocompactador , Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy excavación para viga viostra , instalación y amarre de acero cuneta , nueva , viga , vaciado de concreto de 21 tramo 4 , vaciado de concreto viga nueva

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

9 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = lluvias
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de obra , Residente de interventoria (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto , Vibrocompactador , Bobcat
Actividades Ejecutadas
Fuertes lluvias en las horas de la mañana Actividades ejecutadas el dia de hoy instalación y amarre de acero para cuneta , nueva , viga

Vereda Boyaca Clima = lluvias
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria , Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora , vibrocompactador , BOBcat

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas
fuertes lluvias en las horas de la mañana
Actividades Ejecutadas instalación y amarre
de acero para viga, muela y viga riostra

Ing. Residente Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

12 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado
Personas de trabajo = inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora de concreto, vibrocompactador Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy replanteo y excavación
para viga riostra, instalación y amarre de
acero, cuneta, muela y viga, vaciado de
concreto de 21 MPA

Vereda Boyaca Clima = Soleado
Personas de trabajo = inspector de interventoria
Residente de obra, residente de interventoria
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy, se replanteo
y se compactaron el terreno para la instalación
de formaleta para piedra pegada y vaciado
de concreto de 14 MPA ciclopeo, se realizo
instalación y amarre de acero para viga riostra, cuneta

Ing. Residente

Jose H. Reyes Suarez

Scanned with ACE Scanner

024

13 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrocompactador, Barca

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy, Replanteo para la instalación de formaleta para cabeza pegada y bordillo / vaciado de concreto de 14 MPA y vaciada de concreto de 21 MPA

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrocompactador, Barca

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy, se realizo excavación para viga viadya, instalación y armado de acero para cabeza, media y viga, se realizo el vaciado de concreto de 21 MPa se realizo actividad de demolición de cabezote de alcantarilla existente y excavación para la instalación de nueva tubería de 36"

Ing Cali
Residente Obra

Jose H. Ramos Suarez
Residente de Interventoria

14 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

Scanned with ACE Scanner

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Se realizo el dia de hoy visita tecnica por parte de la alcaldia y representante legal, se realizo actividades de limpieza, excavacion para viga reata, se instalo formaleta para piedra pegada, para vaciar concreto de 14 MPA ciclopeo, y Se realizo instalacion y amarre de acero para cuneta nueva y viga riostra

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Se realizo el dia de hoy visita tecnica por parte de la alcaldia y representante legal, se realizaron actividades de limpieza, excavacion para viga riostra instalacion de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPA, se realizo instalacion y amarre de acero para cuneta nueva y viga

Perit. Obra

Ing. H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

15 de agosto del 2024

Vereda San Isidro clima = Soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Se realizo el dia de hoy actividades instalacion

Scanned with ACE Scanner

de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo y vaciado de concreto de 21 MPA para corona, nariz y viga viostra

Vereda Quevedo clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) Maestro (1) oficial (8) ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Se realizo el día de hoy excavación para viga viostra, se realizo instalación de formaleta para piedra pegada, asi mismo se realizo vaciado de 14 MPa ciclopeo, se realizo corte figurado y armado de acero de refuerzo para placa nariz, viga viostra y corona

Ing. Residente Obra

Ing. H. Mikes Suarez
Residente de Interventoría

· 16 de agosto del 2024

Vereda San Isidro clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Se realizo el día de hoy corte figurado y armado de acero de refuerzo para placa nariz viga viostra y corona a si mismo se realizo enrocado de concreto de 21 MPa

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyacá Clima = Soleado
*Personal de trabajo = Inspector de interventoría
Residente de interventoría, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponibles y en uso = Retroexcavadora
mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Se realizo el dia de hoy continuacion de encofrado
de concreto de 21 MPa para Bordillo, cuneta,
placa huella y viga riostra, se realizo corte
figurado y armado alcantarilla x5: 420.00 y
instalacion de formaleta y encofrado de concreto de
21 MPa

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 de agosto del 2024
Vereda San Isidro Clima = Soleado
*Personal de trabajo = inspector de interventoria
Residente de obra, Residente de interventoria
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora,
mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Se realiza el dia de hoy actividades de limpieza
excavacion para viga riostra, se realiza corte
figurado y armado de acero de refuerzo para
placa huella, viga riostra y cuneta a si mismo
se realiza encofrado de concreto de 21 MPa
Via 4.10 ramal 2

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

Scanned with ACE Scanner

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, vibrocompactador, mezcladora de concreto, Bobca
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy, excavación para viga riostra, corte figurado y armado de acero de refuerzo para pisada nueva, muro y viga riostra, a si mismo encofrado de concreto de 21 MPA

Residente Obra

Ing. H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

21 de agosto del 2024
Vereda Boyaca Clima = Soleado
*Personal de trabajo = inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) Maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) Operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador Bobca
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy, excavación para viga riostra, instalación de formaleta para pisada fundida y encofrado de concreto de 14 MPA ciclopeo, corte figurado y armado de acero de refuerzo para pisada nueva cuneta y viga, terminación Alcantarilla K5+472000

Vereda San Isidro Clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobca
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy, excavación para viga riostra, corte figurado y armado

Scanned with ACE Scanner

de acero de refuerzo para placa nueva, viga viejita, cuneta y a si mismo en vaciado de concreto de 21 MPA

Residente Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

23 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

x Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) Maestro (1) Oficial (8) Ayudantes (1) operador

x Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy continuación de excavación e instalación de filtro trino 5, instalación de formaleta para bordillo y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA, corte figurado y armado de acero para viga viejita, Excavación e instalación de tubería alcantarilla X6 + 338po trino 2.

Vereda Boyaca Clima Soleado

x Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) Maestro (1) Oficial (8) Ayudantes (1) operador

x Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, BOBCAT

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy excavación para viga viejita, instalación y amarre de acero para cuneta huella y viga nueva y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA

Jose, H, Pinto Suarez,

Scanned with ACE Scanner

23 de agosto del 2024

Vereda San Isidro

Clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría, Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (6) Ayudantes (1) oficial (1) operario

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Botas

Actividades Ejecutadas

Actividades Realizadas el día de hoy, Continuación de excavación e instalación de sitio tramo 5, corte figurado y armado de acero de refuerzo para viga, losa, cuneta a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA

Vereda Boyacá

Clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoría, Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponibles y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Botas

Actividades Ejecutadas

Actividades Realizadas el día de hoy, se realizo excavación, para viga riostra corte figurado y armado de acero de refuerzo y así mismo vaciado de concreto de 21 MPa corte figurado y armado de acero de refuerzo para alcantarilla K6+780,00 doble de 60 y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPa

Perito Obra

José H. Inés Suárez
Residente de Interventoría

26 de agosto del 2024

Vereda San Isidro

Clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoría

Scanned with ACE Scanner

Residente de interventoria + Residente de obra
(1) Maestro (1) Oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponibles y en uso = retroexcavadora
vibrocompactador, mezcladora de concreto + Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy, Retiro de
y instalación de formaleta para placa pegada
y a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA
cicopa + y encofrado de concreto de 21 MPA Revizo
excavación de talud de tierra ampliación via 5 mt
tramo 4 + terminación de pegado en concreto
de 21 MPA tramo 2

Vereda Boyaca clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria
residente de interventoria + residente de obra
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
Vibrocompactador + Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades no realizadas el dia de hoy debido
de la clase de construcción debido por falta de
pagos al contratista

Residente Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

27 de agosto del 2024
Vereda San Isidro clima - soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria + Residente de obra
(1) Maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora de concreto + vibrocompactador + Bocat
Actividades Ejecutadas
fuertes lluvias en las horas de la madrugada
Actividades Realizadas el dia de hoy + continuación
de excavación de talud de tierra tramo 2

Scanned with ACE Scanner

032

Via S mT, construcción de instalación de formaleta y encofrado de concreto de 1u mPA vaciado concreto, corte figurado y amarre de acero para muro, concreto viga y a si mismo encofrado de 21 mPA

Vereda Boyacá clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades no realizadas dentro de la obra de construcción debido por falta de pagos al contratista, se espera que reinicie el día de mañana

Ing. Residente Obra

Ing. H. Pinto Suárez
Residente de Interventoría

28 de agosto del 2024
Vereda San Isidro clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra, 11 maestro 11 oficial 6el Ayudantes 11 operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, BOBcat
Actividades Ejecutadas
fuertes lluvias en las horas de la madrugada
Actividades realizadas el día de hoy, Replanteo para instalación de formaleta para piedra pegada, a si mismo vaciado de concreto de 1u mPA ciclopeo, corte figurado y amarre de acero para cuneta muros y viga viostra a si mismo vaciado de concreto de 21 mPA corte figurado y amarre de acero de refuerzo

Scanned with ACE Scanner

para placa alcantarilla K7 + 420,000 a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (3) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, BOBCAT
Actividades Ejecutadas
Iniciaron actividades el dia de hoy, actividades realizadas replanteo del terreno, limpieza instalacion de formaleta para placa apoyo

Cristian Ruiz
Resid. Obra

Jose H. Ramos Suarez
Residente de Interventoria

24 de agosto del 2024

Vereda San Isidro Clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, BOBCAT
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y armare de acero de refuerzo para cuneta recta y alcantarilla y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA Tramo 4, corte figurado y armare de acero para cunetas y muro de descole y a si mismo Vaciado de concreto de 21 MPA Alcantarilla K7 + 420,00 Tramo 5

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residentes de interventoria, Residente de obra

034

(1) maestro (1) oficial (5) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy continuación vaciado de concreto de viga viostra con Algerado y armado de acero de refuerzo para misma conexión y viga viostra x a.s. mismo

Ver Foto
Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

· 30 de agosto del 2024
Vereda San Isidro Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy continuación vaciado de concreto de viga viostra Acontaina $1.420.000 tramo 5, Reparcheo de terreno donde comenzó tramo 2

Vereda Borasca Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial, (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy excavación para viga viostra con Algerado y armado de acero de refuerzo para misma conexión y viga viostra x a.s. mismo

Scanned with ACE Scanner

vaciado de concreto de 21 MPa, demolición de Boca X5 + 495,00 e caixa fundo + armado de acero de refuerzo de escala de alcantarilla doble duro y a mismo vaciado de concreto de 21 MPa X5 1780,00

Cesar Coll
Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Julio 31 - 2024
Placa huella
Clima nublado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto
Actividades en obra: se realiza fundida de conetas, huellas, vigas y bordillo en concreto 21 Mpa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 19 - 2024
placa huella
Clima soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto
Actividades en obra: se retoman actividades en instalación de acero longitudinal y transversal para huellas conetas, bordillos en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

líder

agosto 20 - 2024
placa huella
Clima soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas, vigas, cunetas en concreto 21MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 21 - 2024
placa huella
Clima soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestra, 5 obreros.
personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: Mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza instalacion de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas, vigas y bordillo en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder

agosto 22 - 2024
placa huella
clima nublado lluvia 4PM - 6PM
hora de inicio 7AM-12PM 1PM- 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Fundida de huellas, cretas y rampa en concreto 21M en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

agosto 23 - 2024
placa huella
clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM · 1PM - 6PM
personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de piedra pegada en concreto 14MPa en el tramo 2 llano grande Corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder

Powered by CamScanner

agosto 26 - 2024
Placa huella
Clima Soleado
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
personal de obra: Ing residente, maestro, 5 oficios.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades de obra: Se realiza fundida de bordillos en concreto 21MPa, Se da por terminado la placa huella tramo 2 lleno grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Julio 31 /2024
Clima: Soleado
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Opital
5 Ayudantes.
Personal de interventoría: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo: Equipo menor, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrador de Concreto
Actividad: Se Continua con Actividad de Acero y
concreto de 21 mpa y 14 mpa en el PR 41+320

Adriana Gutierrez de P. Hgo

AGOSTO 1/2024
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Opital
5 Ayudantes.
Personal de interventoría: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Equipo menor, 1 retroexcavadora, 1 vibrador.
Actividad: Se Continua con Actividad de Acero
y concreto de 21 mpa y 14 mpa en el PR 41+320.

Adriana Gutierrez de P. Hgo

AGOSTO 2/2024
Clima: Soleado
Hora de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario y
5 Ayudantes
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Herramienta menor, 1 Martillo, 1 Volqueta, 1 Vibrador de Concreto
Actividad: Se Continua con Obras de Pozo Lateral y cuneta de
24 Mts en el PR4+790.

Adriana Gutierrez de P. H.D

AGOSTO 3/2024
Clima: Soleado
Hora de labores 7am - 1pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Herramienta menor, 1 Martillo, 1 Volqueta, 1 Vibrador de Concreto
Actividad: Se Continua con Actividad de Obras y cuneta de
24 Mts en el PR4+790.

Adriana Gutierrez de P. H.D

AGOSTO 5/2024
Hora de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario y
5 Ayudantes
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, 1 Social, 1 SST,
1 Ambiental y 1 Inspector de Obra
Equipo Herramienta Menor, 1 Volqueta, 1 Martillo

Actividad: Se realiza actividad de Cuneta de 14 Mts en el PR41860 y adecuacion de anden para vigas y cunetas, se toma muestras de Concreto de 210 kg/cm2 en PR41930. por parte de laboratorio.

Adriana Gutierrez de P. #7°

AGOSTO 6/2024
Clima: Sabado.
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario y 5 Ayudantes
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental 1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Herramienta Menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador, 1 Vibrador de C.
Actividad: Se Continua con Actividad de Cuneta de 14 mts y Anden en el PR41840, se presentan Lluvias en la Tarde/Noche (dia anterior) y noche anterior.

Adriana Gutierrez de P. #8°

AGOSTO 8/2024.
Clima: Sabado.
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario y 5 Ayudantes
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental 1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo: Herramienta Menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador, 1 Vibrador de C.
Actividad: Se Continua con Actividad de 14 mts y adecuacion de Anden de Vigas Riostras, Cuneta en PR41920, se presentan lluvias en la noche Anterior

Adriana Gutierrez de P. #9°

AGOSTO 9/2024
Clima Soleado.
Hora de Inicio 7am - 11pm y 1pm a 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes.
Personal de Instrumentación: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: 16 y Herramienta menor, 1 Perforadora, 1 Volqueta
Actividad: Se Continua con Actividad de Concreto de 14 Mpa en
PR4 + 340 y se Toman muestras de 14 mpa en obra por
Instrumentación, se entregan Horas gravadas de 3pm a
5pm en el puesto.

Adriana Gutierrez de P. #1D

AGOSTO 10/2024
Hora de Inicio 7am a 1pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes.
Personal de Instrumentación: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: Herramienta menor, 1 Perforadora, 1 Volqueta de C.
Actividad: Se realizan Adecuación de excavación y acero de pre-
cortes y actividad de Concreto de 14 mpa en PR4 + 720,
se presentan Horas en el Sitio en horas de la noche antes

Adriana Gutierrez de P. #1D

AGOSTO 12 / 2024
Clima Soleado.
Hora de labores : 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra : Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes.
Personal de Interventoría : Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo : Herramienta menor, 1 Volqueta, 1 Vibrador de C.
Actividad : Se continua con actividades de Muros en el
PR4+700 y se realizan muestras de Cilindros para este
punto por parte de la Interventoría, se continua con adecuación
de excavación de canal en PR4+840, se presenta lluvias
parcial sobre las horas nocturnas.

Adriana Gutierrez de P.

AGOSTO 13 / 2024
Hora de labores : 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra : Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes.
Personal de Interventoría : Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra
Equipo : Herramienta menor, 1 Volqueta, 1 Mezcladora
Actividad ejecutada : Se Continua con actividades de Concreto ciclopeo
MR4 mg/21 mpa en PR4+830 en zonas de cunetas y
Aleta para Vigas muertas y Cuneta en este punto, se
evidencia lluvias en hora de la mañana de 8am a 9:30am
y en hora de la Tarde de 3pm a 4pm.

Adriana Gutierrez de P.

AGOSTO 14 /2024
Clima Soleado
Hra de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes
Personal de Intervención: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Topografo de Obra
Equipo: Herramienta menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador de C.
Actividad: Se Continua con actividades de Atraq y concreto de
21 Mpa en Cunetas en el PR41800, se realizan Toma de
muestras de actividad para ensayo en de resistencia en este
punto.

Adriana Gutierrez de P. H/gp

AGOSTO 15 /2024
Clima Soleado
Hra de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes
Personal de Intervención: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Topografo de Obra
Equipo: Herramienta menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador de C.
Actividad: Se Continua con actividades de Atraq y Concreto
21 Mpa en cunetas y Viga Rostros en el PR04+419 y
PR41800.

Adriana Gutierrez de P. H/gp

AGOSTO 16/2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes
Personal de Inspección: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Ob.
Equipos: Herramienta menor, 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta, 1 Vibrocompactador
Actividad: Se Continua actividad de Excavación y Retiro
para culminar en el PR4+460 al PR4+800 y
actividad de Vigas Riostras.

Adriana Gutierrez de P. H/P

AGOSTO 17 / 2024
Hora de Inicio 7am - 1pm
Clima Soleado.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes.
Personal de Inspección: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Ob.
Equipos: Herramienta menor, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador
Actividad a Continuar en actividad de Viga y Concreto de
94 vigas para Cortar en el PR4+600 al PR4+765.

Adriana Gutierrez de P. H/P

AGOSTO 20 / 2024
Clima Soleado
Hora de labores 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Oficial
5 Ayudantes.
Personal de Interventoría: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social, 1 Topógrafo de Obra.
Equipo Herramienta menor, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrador de C.
Actividad: Se realizan en actividad de Concreto de 21 Mpa en bordillo para Cuneta en el PR4+262 y actividad de Sello de pinta en el PR4+910. se presento presencia de lluvias en horas de la mañana de 10 am a 12 pm.

Adriana Gutierrez de P. Hgp

AGOSTO 21 / 2024
Clima Soleado
Hora de labores 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Oficial
5 Ayudantes.
Personal de Interventoría: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Topógrafo de Obra.
Equipo: Herramienta menor, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrador de C
Actividad: Se realizan en actividad de Concreto de 21 Mpa en bordillo para cuneta en el PR4+000 y actividad de sello de pinta en el PR4+262 a PR4+000 se evidencia lluvia en horas de la Tarde desde 3:00 pm a 4:00 pm

Adriana Gutierrez de P. Hgp

AGOSTO 22/2024
Clima Soleado.
Hora de Inicio: 7am - 12 pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Oficial
5 Ayudantes
Personal de Interventoría: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo: Herramienta menor, 1 mezcladora, 1 Vibrador de C.
Actividad: Se Continua en actividad de Sello de Junta
en el PR4 + 900.

Adriana Gutierrez de P. Hgo

AGOSTO 23/2024
Clima Soleado.
Hora de Inicio 7am - 12 pm y 1pm - 5 pm.
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 1 Oficial
5 Ayudantes
Personal de Interventoría: 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Herramienta menor, 1 Mezcladora, 1 vibrador de C.
Actividad: Se Continua en Actividad de Sello de Junta
en el PR4 + 760.
Adriana Gutierrez de P. Hgo
Actividad: Se C)

Agosto 24 / 2024
Clase Sabado
Hora de Inicio 7:00 a 12:00 pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, SST, Social
Personal de Interventoria Residente de Obra, SST, Residente Social, Arquitecto de Obra
Actividad: Revisión de Obra con Verificación de Barreras, componentes Social del Personal de Obra y Interventoria y acompañamiento de Alcaldia de Oiña.
Se da fecha de apertura el dia Sabado 31 de Agosto del 2024.

Adriana Gutierrez de P

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

se realiza armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo en curva, a si mismo acero en la cuneta de alcantarilla existente ubicada en curva en el tramo 5.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

1 agosto 2024.
Vereda la mutis
- Clima: mañana y tarde soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (3) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades ejecutadas:
Continua con vaciado de concreto 21 mpa Premezclado en cuneta y bordillo en curva. se realiza excavación para la colocación del acero de la viga riostra. se realiza aseo a lo largo del tramo 5 lo que ya se encuentra terminado. se realiza excavación de terreno entre los tramos 1 y 2 para la armada de gaviones. se realiza actividades de replanteo y nucleado Para inicar armado de gaviones, se realiza armado de mallas para canastas y armado de Tableros en tabla para formaletear los gaviones.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

2 agosto 2024.
Vereda la Mutis
- Clima: Mañana y tarde soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de interventoria, (1) Maestro

(2) Oficiales, (1) Ayudante
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora
Actividades ejecutadas
El Contratista Realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa en elementos faltante Area final Tramo de Placa Huella #5, Con el fin de dar por terminado labores de Construccion de Placa Huella.
Se realiza Recorrido a lo largo de todo el Corredor Vial Vereda la Garita - Jo Mutis Desde el Tramo #1 hasta el final Tramo #5, se le Solicita al Contratista el Repaso y sellado de Fisuras con la Aplicacion de Sika Rapid y Sika Flex. Se Realiza Acta en Campaña del Invias (Apoyo Supervision) y Interventoria.

José H. Rivas Suarez
Residente de Interventoria

3 Agosto 2024
El Contratista No ejecuta Ninguna Actividad en Campo.

José H. Rivas Suarez
Residente de Interventoria

05 Agosto 2024
Vereda la Mutis
• Clima: Mañana y Tarde Soleado
• Personal en Obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de Interventoria, (1) Maestro (2) Oficiales, (1) Ayudante.
• Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora
• Actividades ejecutadas
Se Continua con el encofrado, Instalacion de Malla Galvanizada e instalacion y llenado con piedra para la Construccion de la estructura de

Contencion GAVIAN Ubicada en el PR9 + 770 con el fin de dar estabilidad al terreno. De igual manera se realizo Aseo general en los Tramos 1 y 2 de placa Huella ejecutada. Se Realizo Sellado de fisuras a lo largo de los Tramos Ejecutados.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 Agosto 2024
Vereda la Mutis
- Clima: Mañana y Tarde Soleado
- Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, (1) Maestro (2) Oficiales (1) Ayudante.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora
- Actividades ejecutadas.

Durante el Dia el Contratista se encuentra finalizando las Actividades de Construccion de Gavianes mediante el Tejado con piedra y Amarre final de Mallas Galvanizadas. Se Realizo Sellado de Fisuras.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 Agosto 2024
Dia Festiva, No se ejecutan Actividades.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 Agosto 2024
Vereda la Mutis
- Clima: Mañana y Tarde Soleado
- Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, (1) Maestro (2) Oficiales, (1) Ayudante

• Equipo disponible y en uso: Ninguno
Actividades ejecutadas
Durante el Día el Contratista realiza Actividades de Sellado de fisuras a lo largo de las Tramos Ejecutado donde se realizaron observaciones.
De igual Manera se Realiza limpieza y Aseo General en las Areas Aledañas a la Vía y/o Tramos Ejecutados.
A la fecha el Contratista tiene pendiente la instalacion de Poste de referencia a lo largo de Corredor Vial, por lo tanto Se espera en las proximas Días la instalacion de los Mismos

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 Agosto 2024.
No se ejecuta Ninguna Actividad en Campo teniendo en Cuenta que a la fecha Se analizo la ejecucion de obras Proyectadas.
Se tiene pendiente la instalacion de Postes de Referencia.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 Agosto 2024.
No Se ejecutan Actividades - Se tiene pendiente instalacion de Postes de Referencia.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 al 15 Agosto 2024.
No Se ejecutan Actividades en Campo - Se tiene pendiente instalacion de postes de Referencia

a lo largo del Corredor Vial Vereda la Caña - la Mutis.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

16 al 22 Agosto de 2024.
Durante el Presente Periodo el Contratista NO realiza Actividades en Campo, ya la fecha no se ha instalado los postes de Referencia a lo largo del Corredor Vial.
La interventoria realiza Recorrido el Dia 22 de Agosto para Inspeccion de las Actividades Finales y se Realiza la Solicitud de limpieza de escombros evidenciados.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

23 al 29 Agosto de 2024.
Durante la Semana el Contratista se encuentra realizando la logistica para la ejecucion, traslado e instalacion de Postes de Referencia a lo largo del Corredor Vial Vereda La Caña con el Fin de dar Cumplimiento a la Totalidad de Actividades de Obra.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

30 al 31 Agosto de 2024.
Durante los Dos Dias el Contratista Realiza la Instalacion de Postes de Referencia a lo largo de Corredor Vial, Dando Cumplimiento a la Totalidad de Actividades.
El Dia 31 de Agosto se Finaliza la Meta

Fisca del Contrato de Obra 02332 de 2022, dando Cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

José H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE EL CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Julio - 30 - 2024
Placa Huella
Clima: Nublado: lluvias durante la madrugada Hasta los 11:30 am
Horario Laboral: 7:00 am 12:00pm 1:00pm 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente SST maestro, 2 oficiales, 6 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector SST Social y Ambiental
Equipos: Niveladora, Rodillo
Actividades de obra: Vaciado de concreto de limpia para pilote fundido instalacion de señalizacion, Ciclo de hoy se termino el vaciado de concreto para pilote fundido y placa Huella, solo faltando pendiente los Bordillos.
Adriana Gutierrez dep.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

Julio - 31 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Horario Laboral: 7:00 am 12:00pm 1:00pm 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, maestro, 2 oficiales, 6 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente Inspector, SST Social y Ambiental
Equipos: Niveladora, Rodillo
Actividades de obra: Vaciado de concreto de limpia para Bordillo visita de la ingeniera Adriana Gutierrez con el fin de supervisar los procesos constructivos
Adriana Gutierrez dep
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

AGOSTO - 01 - 2024
Placa Huella
Clima Despejado
Horario Laboral: 7:00 am 12:00pm 1:00 pm 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente SST, maestro, 2 oficiales, 6 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector SST, Social y ambiental

lider==

Scanned with CamScanner

Equipo: Mezcladora Pulidora
Actividades de obra: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

AGOSTO - 02 - 2024
placa Huella
Clima: Despejado
Horario Laboral: 7:00 am 12:00pm 1:00pm 5:00pm
personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro, 2 oficiales, 6 obreros
personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Equipos: Mezcladora, Pulidora
Actividades de obra: Mejoramiento de abobados, Limpieza de los tramos 1, 2 y 3
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

Agosto - 03 - 2024
placa Huella
Clima despejado
Horario Laboral: 7:00 am 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
personal de obra: Ing Residente, SST maestro, 2 oficiales, 6 obreros
personal de interventoria: Ing Residente, Inspector SST Social y Ambiental
Equipos: Mezcladora, Pulidora
Actividades de obra: Se terminan los mejoramientos de acabados
Se da por terminado el proyecto de mejoramiento de vía entre los arroyos y la carrera con la totalidad de 384 ml de placa huella en 3 tramos cumpliendo con los exigencias
Se programa entrega de obra para el día Jueves 8 de agosto junto con la comunidad, contratista, dejados por la alcaldía como el secretario de planeación y la interventoria
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

líder

líder

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

"BITACORA DE OBRA"

Contrato de obra: No. CD-FC-054-2023

Objeto: Mantenimiento de vias rurales vda Paramo-Pica-Pica municipio de Pamplonita, Norte de Santander.

Contratista: Jose Ernesto Rico Osorio

Interventoria: Cavinco Ingenieros Consultores SAS

Dia 20/05/2024
hora de inicio 7:00 am
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoria: 1 ing residente, 1 ing inspector.
Personal de obra: 1 ing residente, 1 operador, 1 oficial, 1 ayudante.
Maquinaria en obra = Motoniveladora
Actividades realizadas: Se da inicio. la obra. con la actividad de perfilado o conformación de calzada existente donde se replantea la (Vista) via y su respectivo control esta actividad se inicio en la entrada principal de la vereda el paramo municipio de pamplonita

Nota: Durante el periodo comprendido entre el 22 de abril al 19 de mayo el contratista enfoco sus actividades laborales en el campo administrativos a si mismo se mantuvo realizando el suministro de material construccion de campamento instalacion de los zonas de acopio. y demas actividades preconstructivas

Ing. Interventoria

Director

Dia. 21/05/2024
Hora de trabajo: 7:00 am a 5:00 pm
Estado del tiempo = lluvias moderadas
Personal de obra: 1 ing residente, 1 operador, 1 oficial, 1 ayudantes
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector
Maquinaria en obra: Motoniveladora
Actividades realizadas en obra: En esta actividad no se pueda realizar ninguna actividad, las condiciones climaticas, de la zona no dejan avanzar en la obra. dia completamente lluvioso.

Dia. 22/05/2024
hora de inicio = 7:00 AM.
Estado del Tiempo = Dia nublado.
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector
Personal de obra = 1 ing residente, 1 operador, 1 oficial
1 ayudante
Maquinaria en obra = Motoniveladora
Actividades realizadas = Se continua con la actividad de conformación de calzada, perfilado y conteo.

Residente interventoria

OSCAR PICO
DTO. OBRAS

Dia 23/05/2024
hora de Trabajo = 7:00 am - 5 pm.
Estado del Tiempo = Dia lluvioso.
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector
Personal de obra = 1 ing. residente, 1 operador, 1 oficial,
1 ayudante
Maquinaria en obra = Motoniveladora.
Actividades realizados: Se continua con la actividad de conformación de calzada, su perfilado y conteo, en los horas de la tarde se presentan lluvias fuertes en la zona, lo cual nos hace parar las actividades.

Residente interventoria

OSCAR PICO.
DTO. OBRAS

Dia 24/05/2024.
hora de trabajo - 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Condiciones favorables se labora
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector
Personal de obra: 1 ing. residente, 1 operador, 1 oficial,
1 ayudante.
Maquinaria en obra = Motoniveladora.
Actividades realizadas = Se continua con la actividad de conformación de calzada, su perfilado y conteo

Fecha= 25/05/2024
Hora de trabajo = 7:00am- 5:00 pm
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de enfomentacion = 1 ing residente, 1 ing. inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial,
1 operador, 1 ayudante.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas = En este dia nos llego el primer dia) viaje de acero que corresponde al Tramo 1 de placa huella ubicada en la zona de pica-pica, para esto debemos hacer el trasbordo. en la entrada de la vereda y su respectivo descargue en el lugar cerca al Tramo a intervenir.

Ds inturtuda

DTO. CBLD

27/05/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de enfomentacion = 1 ing residente, 1 ing inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial,
1 operador, 1 ayudante,
Maquinaria de obra = Retroexcavadora y
vibrocompactador.
Actividades ejecutadas = Ya con la llegada del acero, el maestro da inicio a la actividad del figurado. y armado. realizando. los flejes para los lugares restros Se continua con el perfilado de la cuneta, con la llegada. del vibro compactador se da inicio a una nueva actividad: la compactacion del Tramo mejorado por la motoniveladora.

Ds inturtuda

DTO_CBLD.

28/05/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 Pm

Estado del tiempo = Soleado en la mañana, lluvioso en la tarde.
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector.
Personal de obra: 1 ing residente, 1 oficial, 1 operador, 1 ayudante,
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, vibrocompactadora
Actividades ejecutados = Se continuo con el perfilado de la via. y. su respectiva compactacion, por otra parte, el maestro de la obra. sigue figurando. el acero (estribos para la vostar y bordillo.)

Ing interventoria

DTO. OBRAS.

29/05/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Soleados
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial
1 operador, 1 ayudante.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, vibrocompactador
Actividades ejecutados en obra = Se continuo con el perfilado de la via, y su respectiva compactacion por otra parte, el maestro de obra sigue figurando el acero.

Ing Interventoria

DTO. OBRAS

30/05/2024
Horario labora = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector.
Personal de obra = 1 ing residente, 1 oficial, 1 operador, 1 ayudante.
Maquinaria en obra = Motoniveladora, vibrocompactador
Actividades realizados en obra = Se continuo

realizando el perfilado de la via y su respectiva compactación, por otra parte el maestro de obra sigue figurando el acero cruce.

Residente de Interventoría



OTO. OBRA

31/05/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial
2 ayudante, 2 operadores
Maquinaria en obra = Motoniveladora, vibrocompactador
Actividades ejecutadas en obra: En esta dia nos llego el segundo viaje de acero que corresponde al frame 2 y frame 3 de la placa huella - ubicado en la zona de la vereda el Paramo, para esto debemos hacer el fresbordo en el la entrada de la vereda y su respectivo descargue en el lugar. cerca al frame a intervenir se continua con el perfilado y cunetas de la via con su respectiva compactación.

Residente de Interventoría



OTO. OBRA

01/06/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ing residente 1 ing inspector
Personal de obra = 1 ing residente, 1 oficial, 2 operadores, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, motoniveladora, Vibrocompactadora.
Actividades ejecutadas en obra = Por un lado: Se continuo con el perfilado, y cunetas de la

tambien se realiza la compactación de lo
mejorado por la motoniveladora y se continua
con el figurado del acero.

Residente

DTO_OBRAS.

02/06/2024
Horario laboral = 7:00am - 5:00pm.
Estado del Tiempo = Soleado
Maquinaria en obra = Motoniveladora, Vibrocompactador,
Herramienta menor =

03/06/2024 Residente

DTO_OBRAS

Dia no laborado, dia festivo en todo el territorio Nacional

Residente


DTO OBRAS.

04/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00pm
Estado del tiempo = Soleado
Personal de Interventoria = 1 Ingeniero residente
1 ingeniero inspector
Personal de obra = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra
2 Operadores, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibrocompactador
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con el perfilado
y compactación de la via; por otro lado también se continua
con el corte y Figurado de acero para vigas riostras.


Residente

DTO_OBRAS

05/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Clima Soleado
Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingenrero inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra 3 operadores, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se inicia actividad desuministro e instalación de subbase granular, por otro lado se continua con el corte y Figuración de acero para vigas nortes.

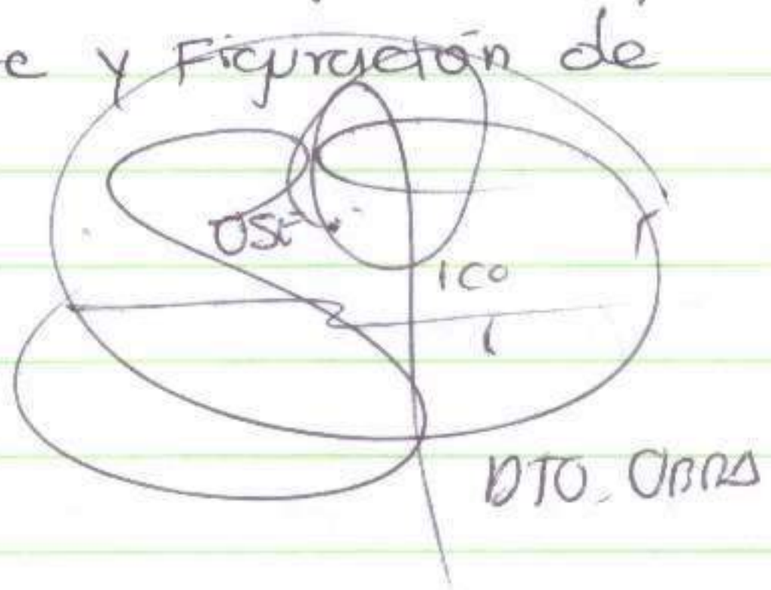


06/06/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Clima soleado
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra 3 operadores, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con Suministro e instalación de subbase y su respectiva compactación, por otro lado se continua con el figurado de hierro.

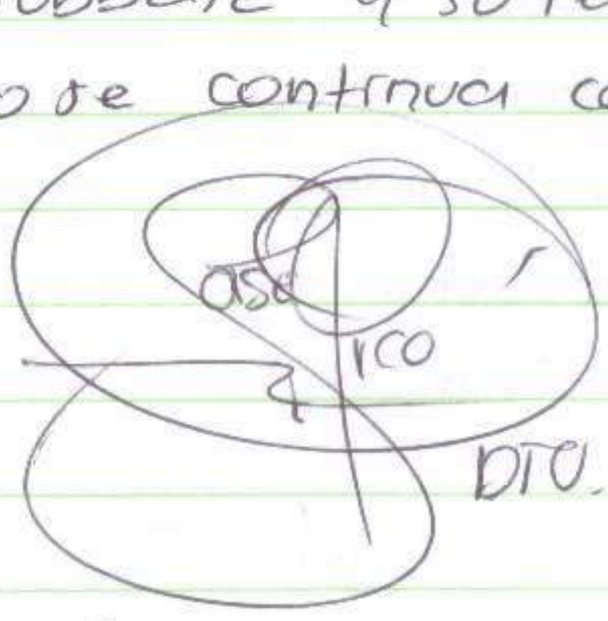

07/06/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5-00 Pm
Estado del tiempo = Clima lluvioso
Personal interventoría = 1 ingeniero residente. 1 ingeniero inspector.


personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra.
3 operadores, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora
Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con la actividad de suministro e instalación de subbase y su respectiva compactación, tambien el replantes de calzada por otro lado se continua con el corte y figurado de acero para vigas riostras.

RD Inspector

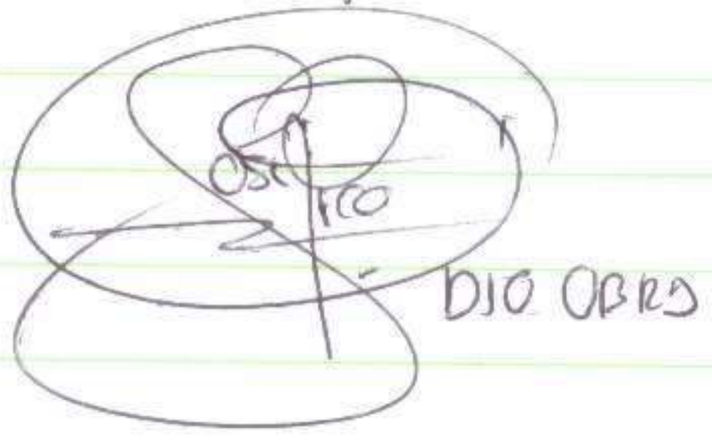


08/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Soleado.
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
3 operadores, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora
Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con suministro e instalación de subbase granular.

RD Interventor.

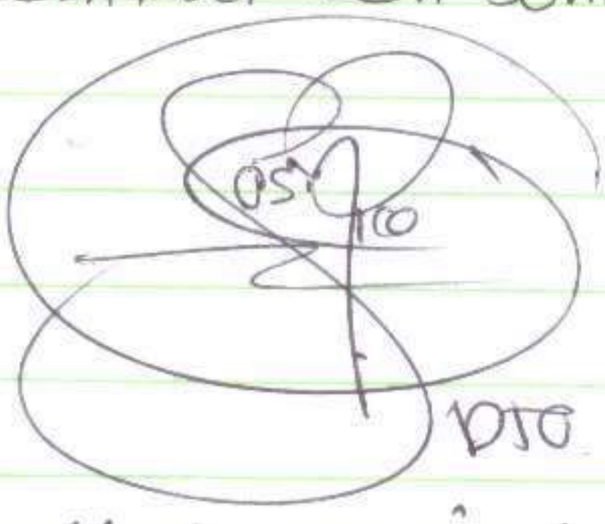

10/06/2024.
Dia festivo no laborado en todo el territorio nacional

RD Interventor.

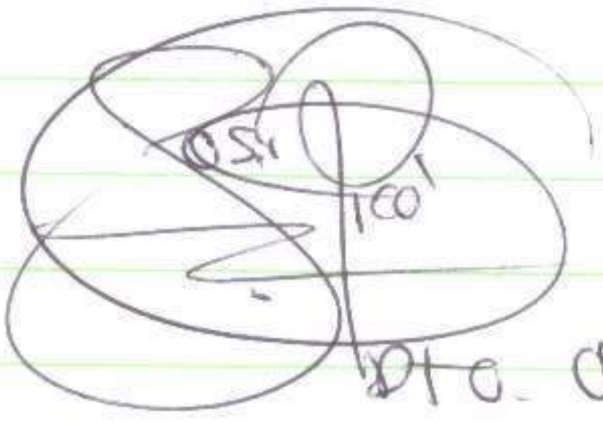

11/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Clima seco
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 maestro de obra
3 operadores, 2 ayudantes.


Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora y Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con el Suministro, instalación y compactación de subbase granular asi mismo se continua con corte y figuración de acero para vigas.

Ing. Residente




12/06/2024.
Horario laboral = 7:00am - 5:00 Pm
Estado del tiempo = Soleado.
Personal Interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
3 operadores, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Motoniveladora, vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con actividad de suministro, instalación y compactación de subbase granular, se inicia acopio de material de agregados (arena, triturado), se continua con actividad de corte y figuración de acero para vigas viostra.

Ing. Residente

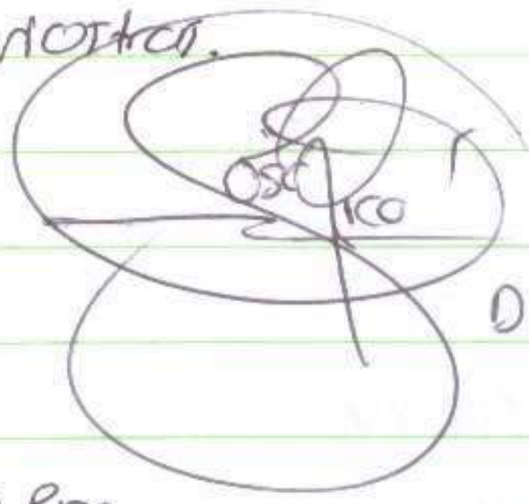


13/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Dia soleado.
personal Interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 maestro de obra
2 operadores, 2 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con la Compactación de la subbase granular a si mismo se continua con el Figurado del hierro y el acopio de material de agregados (arena, triturado).




14/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Soleado
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra 1 Operador, 2 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra : Retroexcavadora
Actividades ejecutadas en obra = Se inicia con el replanteo de la placa huella, la ubicación de los vigas riostras y la colocación de hierro en campo; por otro lado se continúa con el acopio de material.

Rs interventoría

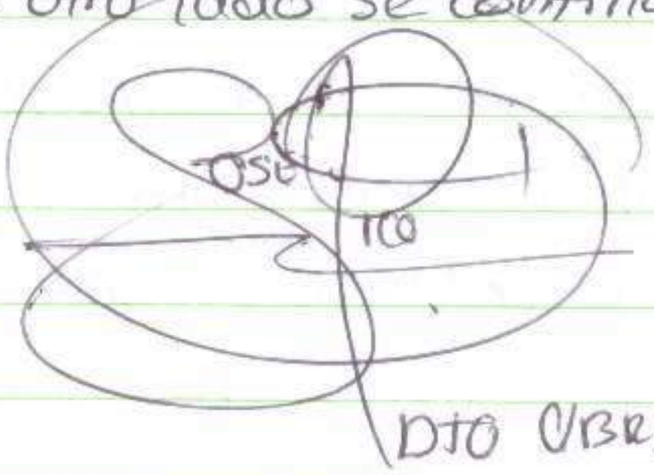


15/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Clima lluvioso
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 operador 2 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas en obra = En este día no fue posible realizar ninguna actividad en obra por las ~~condiciones~~ climáticas

Rs interventoría

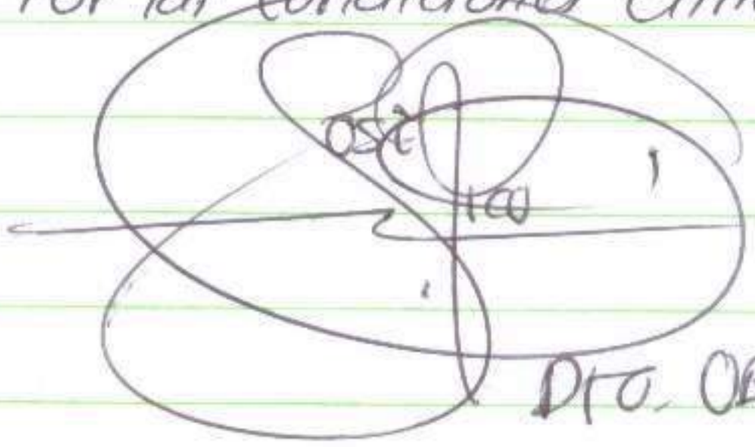

17/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Clima lluvioso
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 operador 6 ayudantes de obra.

Actividades ejecutadas en obra.= Se inicia con la excavación de las vigas riostras ya replanteadas y la colocación y figurado de hierro en campo con su respectivo amarre también se continua con el acopio de materiales (arena, triturado) se recibe cemento.

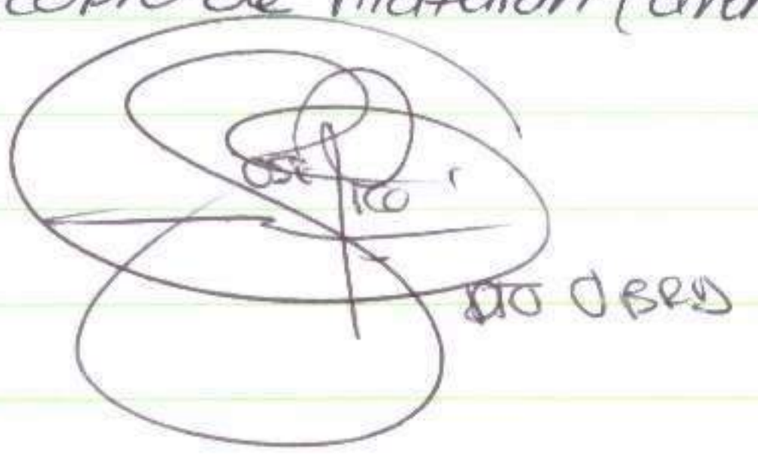

Residente

18/06/2024.

Horario laboral: 7:00 am - 5:00 pm


Estado del tiempo: Soleado.

personal interventoria: 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector

Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Operador, 6 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = Retroexcavadora.

- Actividades ejecutadas en obra = Se inicia con la encofrada y la colocación de las tablas para proceder a iniciar la actividad del vaciado de concreto de 21 Mpa para losas, huellas y vigas riostras, asi mismo se continua con el corte y amare de acero para huellas y vigas riostras.

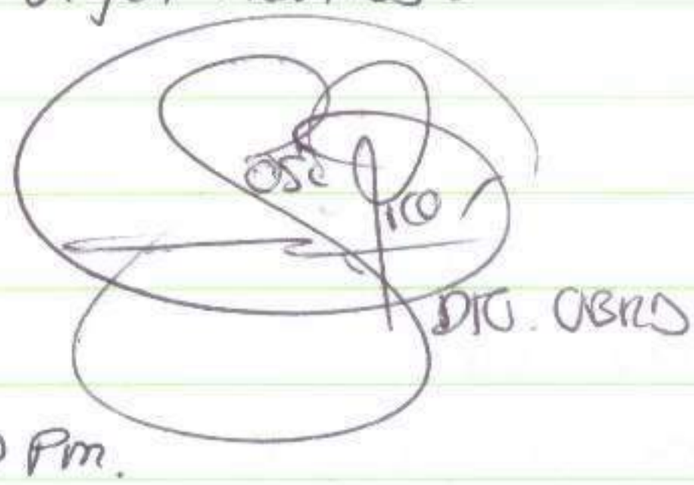

Residente

19/06/2024.

Horario laboral: 7:00 am - 5:00 Pm.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal interventoria: 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector

Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Operador 6 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = Retroexcavadora.

Actividades ejecutadas en obra = Se continua con vaciado de concreto de 21Mpa para huella, asi mismo se figura hierro y su respectiva colocacion y amarre; en este dia se recibe cemento.

Residente



20/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo: Día lluvioso
Personal Interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 operador, 6 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con el replanteo de la placa huella; excavaciones de viga riostras
Colocación y amarre de hierro de huellas y su respectivo
Vaciado de Concreto de 21 Mpa.
Observaciones = Se presenta un dia lluvioso, en las horas de la mañana y en la tarde lo que complica el avance de obra.

Residente

OBS 100

DIO OBRS

21/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Día lluvioso
Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 operador, 6 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con corte y figurado de acero, a si mismo se realizo actividad de vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, tambien se inicio con la actividad de excavación para alcantarillas instalación de tubería de 36 pulgadas para alcantarillo. Se realizo comite de obra con ingeniero residente de obra de interventoría; personal social, ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista estubo presente el Profesional de obra. Se realizo acta del comite y se Firmo.


Residente

OBS 100

DIO OBRS


22/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Soleado
Personal interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector
Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 operador, 6 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con la colocacion y armado de hierro en huella y su respectivo vaciado de Concreto de 21 Mpa; tambien se concluye la excavación y Colocacion de tubería de 36 pulgadas para la primera alcantarilla.

Res interventoria

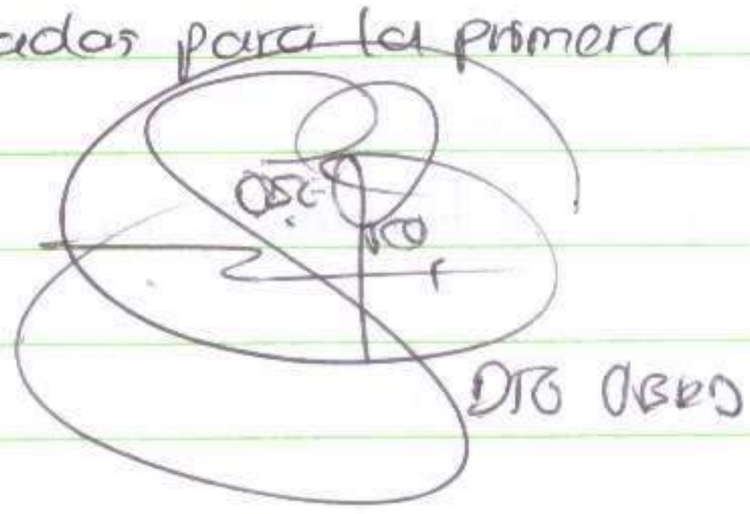

24/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = clima seco
personal interventoría = 1 Ingeniero residente. 1 Ingeniero inspector.
Personal en obra. = 1 Ingeniero residente. 1 maestro de obra
1 Oficial, 1 operador. 8 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas en obra = se inicia con la excavación para la segunda alcantarilla, y por otro lado se hace respectivo vaciado de concreto de 21Mpa para huella y viga riostra.


Res. interventoria

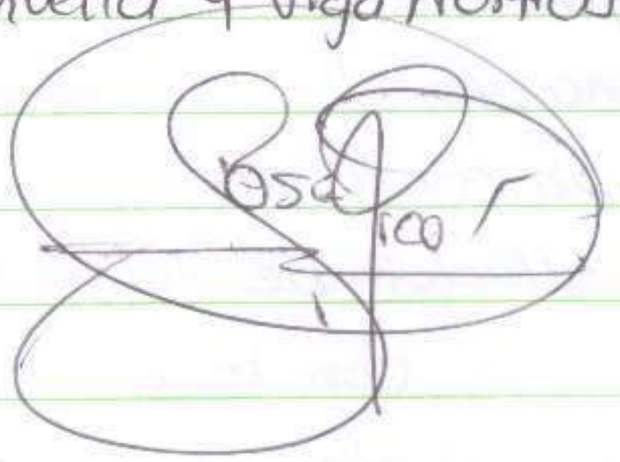

25/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Dia nublado.
personal interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial,
1 operador, 8 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas en obra = Se inicia con la actividad.


de vaciado y colocacion de piedra pegada con concreto de 14 Mpa a si mismo se continuo con corte y Figurado de acero para huellas; tambien se realizo actividad de vaciado de concreto Pobre para solado de la tubera para la alcantarilla, se instalo la tubera de 36" para la segunda alcantarilla dejando esta actividad faminada.

Residente interventoria.

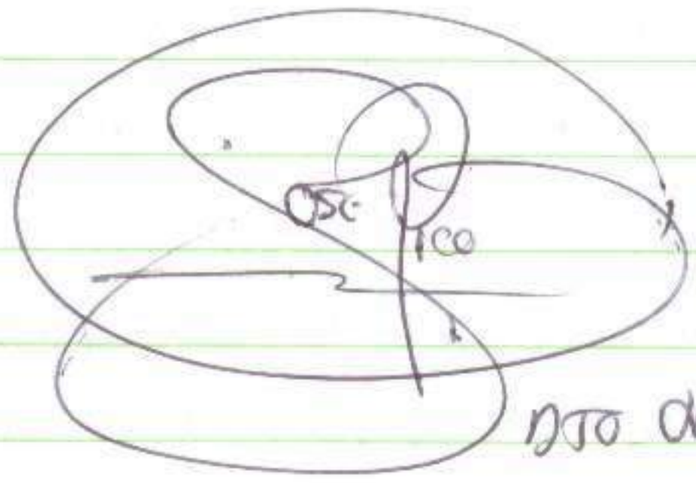


26/06/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Dia lluvioso
Personal Interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector
Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de Obra, 1 Oficial 8 ayudantes de obra.
Maquinaria Obra: N.A.
Actividades ejecutadas en obra = Se continua con vaciado de Concreto de 21 Mpa para huellas y Vigas riostras, tambien Se realiza el vaciado de concreto Pobre para. poceta y escole de la primera alcantarilla.

Residente interventoria

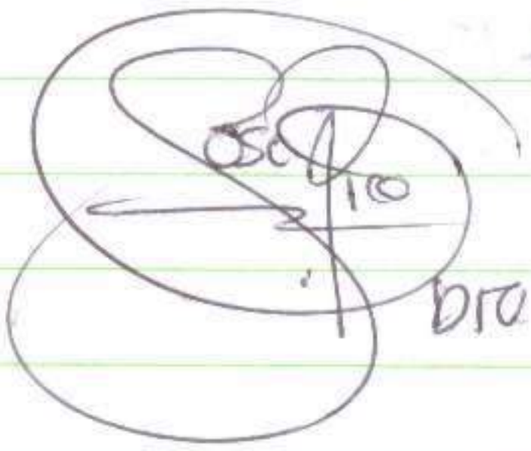

27/06/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Clima lluvioso
Personal interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector
Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial 8 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = N.A.
Actividades ejecutadas en obra: Se trabaja Figurando el hierro para la primera alcantarilla, tambien en las excavaciones de las vigas riostras, Colocación y amarre de hierro de huellas y vigas con su respectivo vaciado de concreto de 21 Mpa.

Residente interventoria



28/06/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Dia Soleado

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 8 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividades ejecutadas en obra = Se continua con el vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada y tambien concreto de 21 Mpa para huellas y vigas riostras; por otra parte se avanza en el corte y Figuración de acero para alcantarilla.

Res interventoría

Obra

DTO OBRA

29/06/2024.

Observación: Dia no trabajado por condiciones climaticas

Res. interventoría

Obra

DTO OBRA

01/07/2024.

Dia festivo no laborado en todo el territorio Nacional.

Res interventoría

Obra

DTO. OBRA

02/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Dia lluvioso

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

Personal en Obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial 7 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividades ejecutadas en obra: Se trabaja en el amarre de hierro de la primera alcantarilla y el vaciado de concreto de 21 Mpa.

Res interventoria.

Obra

DTO. OBRA

03/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Día nublado - lluvioso

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 8 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividades ejecutadas en obra: Se continua con la actividad de vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y vigas nottros, corte y figuración de acero para alcantarilla, vaciado de concreto de 21 Mpa para alcantarilla dejando caja o poceta completamente fundida.

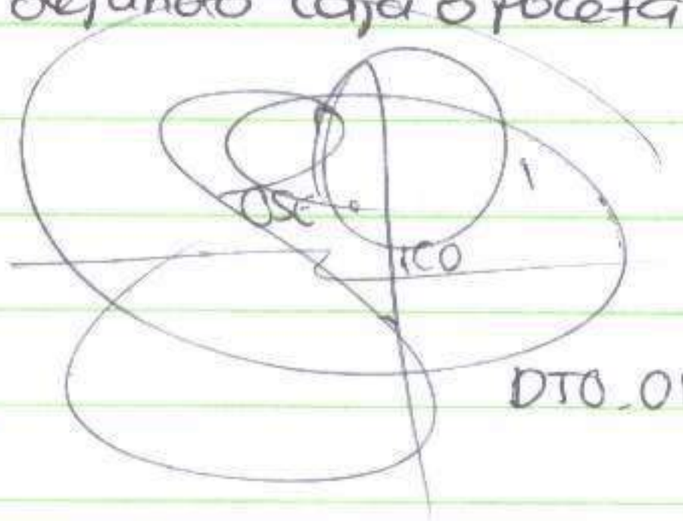

Res interventoría

04/07/2024

Horario laboral: 7:00 am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Día soleado.

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente. 1 Maestro de obra, 1 oficial, 7 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutadas en obra = Se continua con el encofrado y figurado de hierro para la alcantarilla.

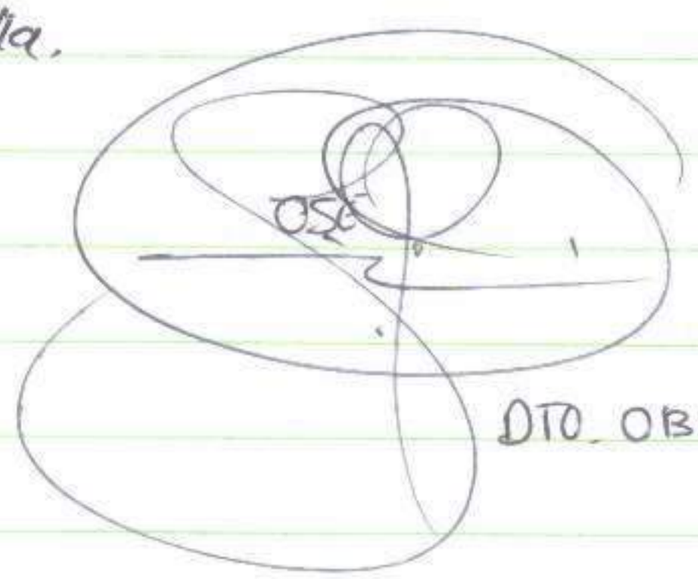

Res interventoría.

05/07/2024.

Horario laboral = 7:00am - 5:00pm.

Estado del tiempo = Día nublado.


personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

personal en obra = 1 Ingeniero residente. 1 maestro de obra, 1 oficial 7 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A

Actividad ejecutadas en obra = Se continua con el replanteo de la placa huella en este caso la segunda curva, se realiza

las excavaciones de las vigas riostras, Colocacion y amarre de hierro en las huellas y vigas para realizar el respectivo Vaciado de concreto de 21MPa. por otro lado se continua con el encofrado de los aletas de la alcantarilla.

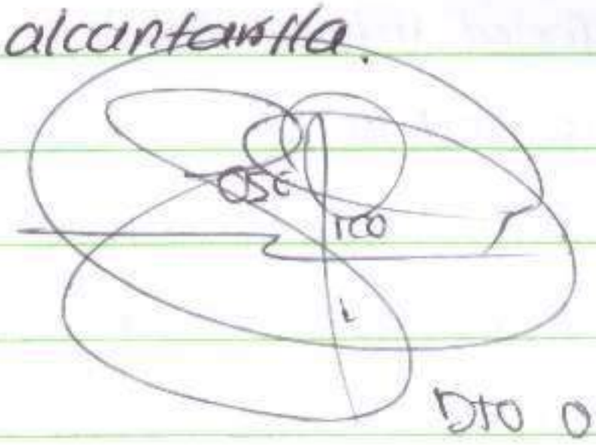

Res Interventoria

06/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Día nublado.

Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A

Actividad ejecutada en obra = se continua con el Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostras también con el vaciado de concreto de 14 MPa para la colocación de la piedra pegada.

Se Funde los aletas de la alcantarilla dejando esta actividad terminada.



Res Interventoria

08/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 Pm.

Estado del tiempo = Soleado.


Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.

Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero, 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de concreto de 14 mpa para la colocación de piedra pegada.


Se replantea la segunda alcantarilla y se vacia el concreto pobre.

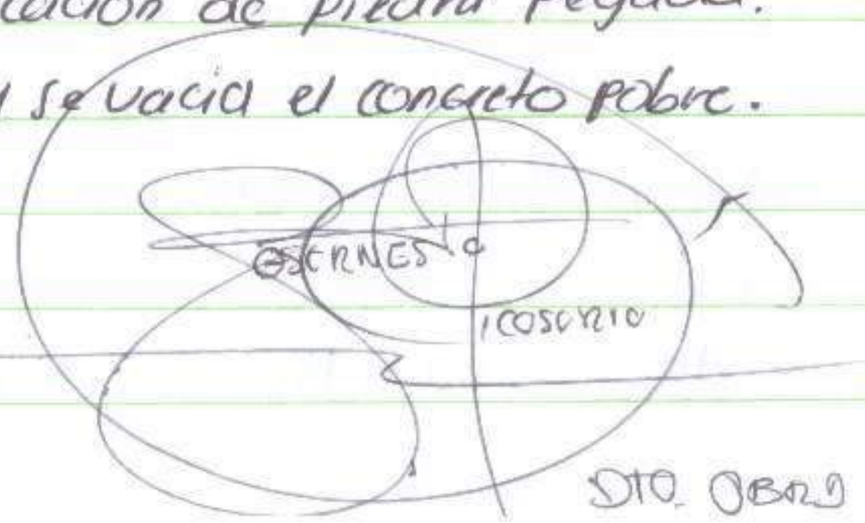

Res interventoria


09/07/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Soleado.
personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra.
Maquinaría en obra = N.A
Actividad ejecutada en obra = Se trabaja en la actividad de corte y Figurado de acero para la alcantarilla numero dos; Por otro lado se continua con la actividad de la Piedra pegada.

Res interventoría

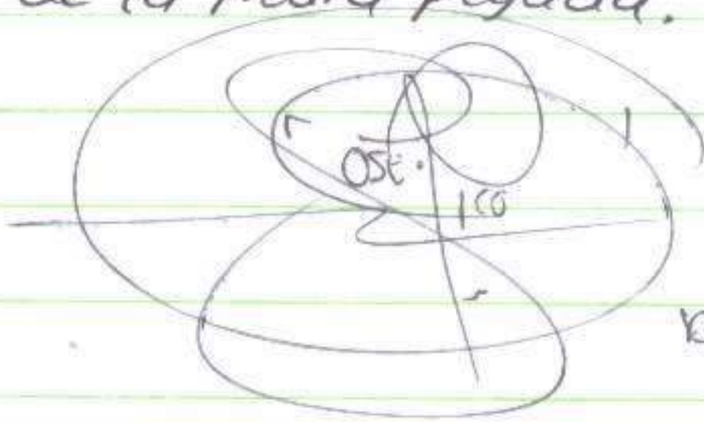


10/07/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal Interventoría = 1 Ingeniero residente. 1 Ingeniero Inspector.
personal en obra = 1 Ingeniero residente. 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra.
Maquinaría en obra = N.A.
Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de concreto de 14Mpa para la Piedra pegada y se continua con el corte y Figurado de acero para la alcantarilla.

Res interventoría

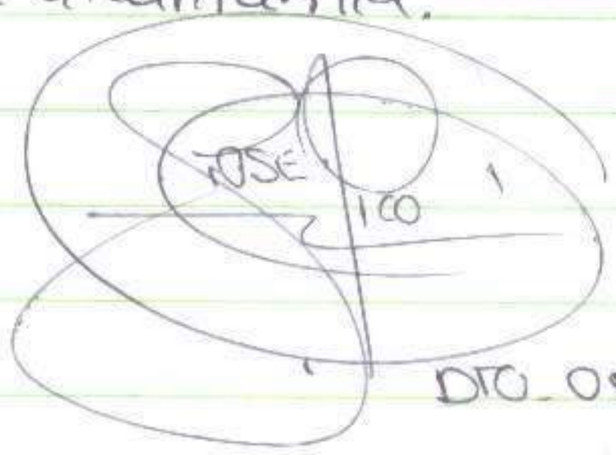

11/07/2024
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm
Estado del tiempo = Soleado.
personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector
personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra.
Maquinaría en obra = N.A.
Actividad ejecutada en obra = Se termina la Piedra pegada en el primer tramo de placa huella; Se inicia con la excavación de cuneta y bordillos. luego se procede con

la colocacion del hierro y su respectivo amarre.
por otro lado se funde los pisos de la caja y la placa
escole esto en la alcantarilla.

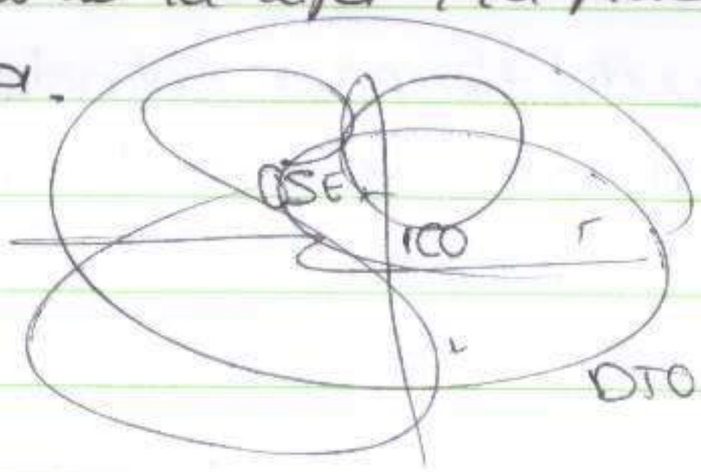

Res Interventoría

12/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm


Estado del tiempo = Dia lluvioso

Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se inicia con el replanteo de cuneta y bordillos, con su respectiva colocacion de hierro. Se procede al vaciado en concreto de 21Mpa.
por otro lado se continua con el armado y figurado de hierro en la alcantarilla.

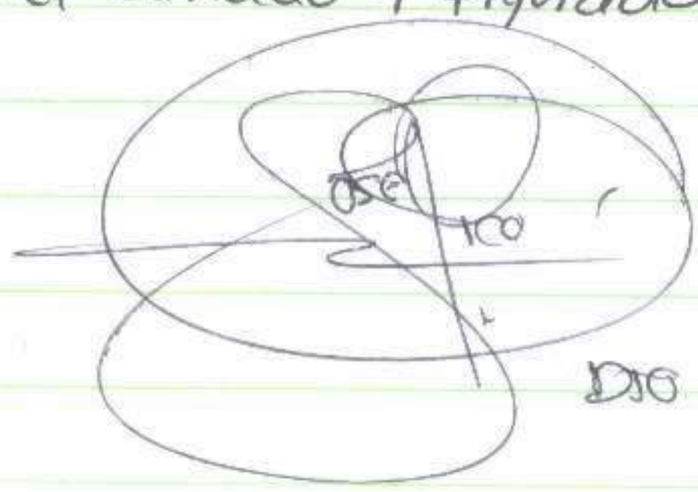

Res Interventoría

13/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00pm


Estado del tiempo = Dia nublado

Personal interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 7 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillos.
por otro lado se funde la poceta o caja de la alcantarilla.

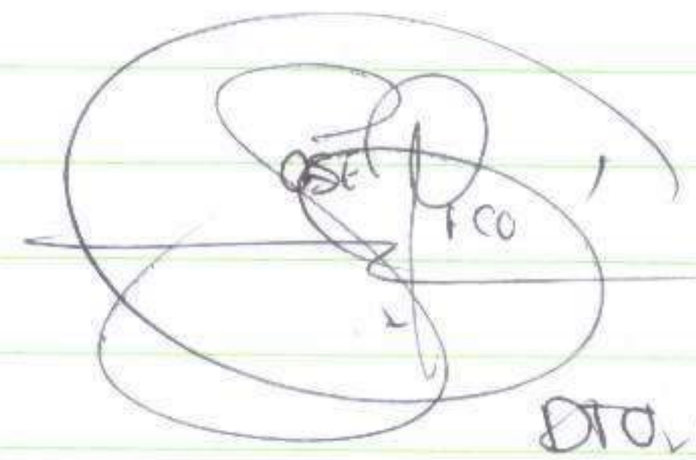

Res Interventoría

15/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Dia soleado


Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se realiza el replanteo total de la cuneta y bordillo se procede a realizar su debida excavación en todo el tramo faltante. Por otro lado se realiza la Fundida de concreto de 21 Mpa para aleta de alcantarilla dejando esta actividad finalizada.

Edwar
Res interventoria

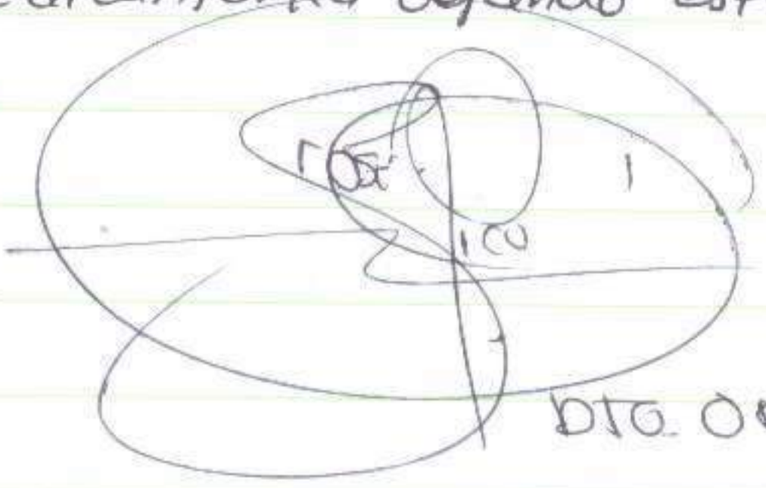

16/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Día Soleado


personal interventoria = 1 Ingeniero residente. 1 Ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra. 1 Oficia 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el corte y Figurado de hierro para cuneta y bordillo; y su respectiva encofrada. En las horas de la tarde se realiza la Fundida con concreto de 21MPa.

Edwar
Res interventoria

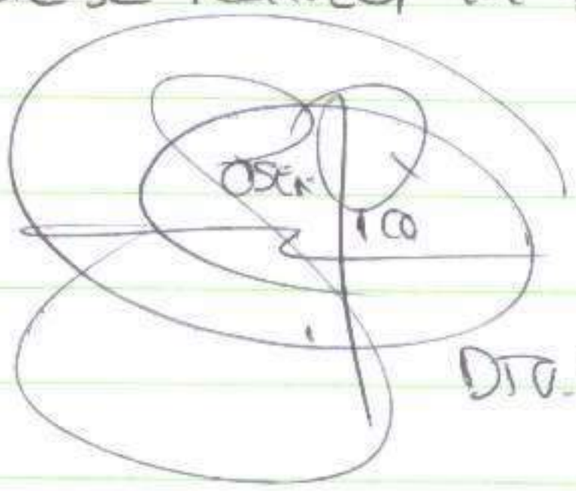

17/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm


Estado del tiempo = Dia lluvioso

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A

Actividad ejecutada en obra: Se continua con el vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas y bordillos

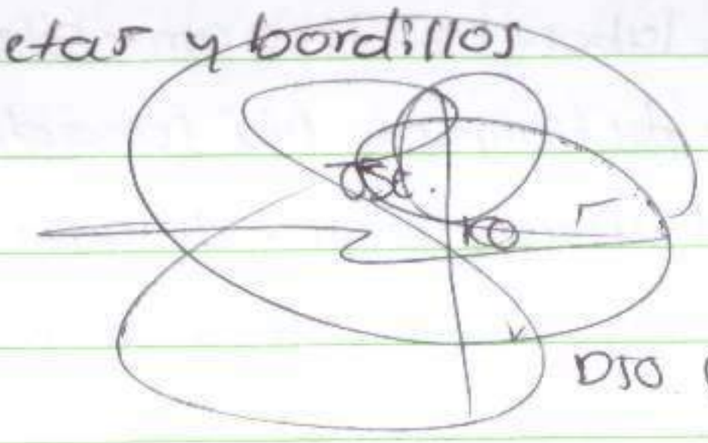

Edwin
Res Interventoría

18/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm

Estado del tiempo = Día Soleado

Personal Interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector


personal en obra = 1 Ingeniero Residente, 1 maestro de obra

1 Oficial, 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra: Se continua con el vaciado de Concreto de 21Mpa para cunetas y bordillos.

también se continua con el corte y figurado de hierro para cunetas y bordillos respectivamente.

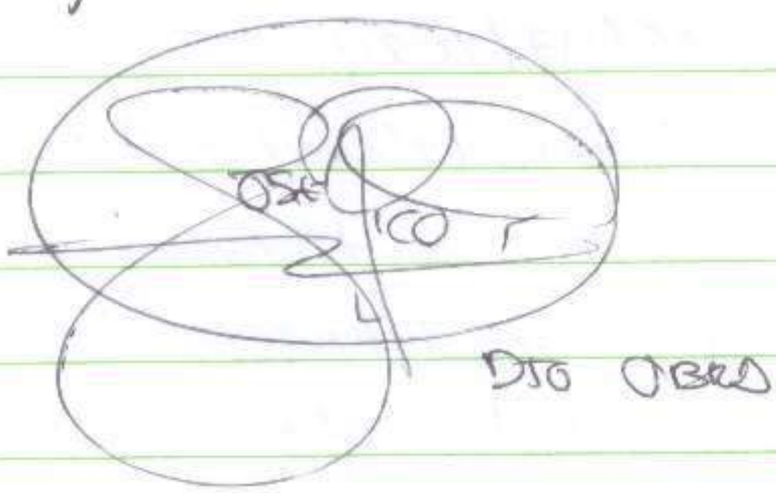

Edwin
Res Interventoría

19/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Día nublado


Personal Interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra

1 oficial, 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el corte y amoire de hierro para cuneta y bordillos, se prosigue a encofrar el tramo ya replanteado. Con su respectiva fundida.

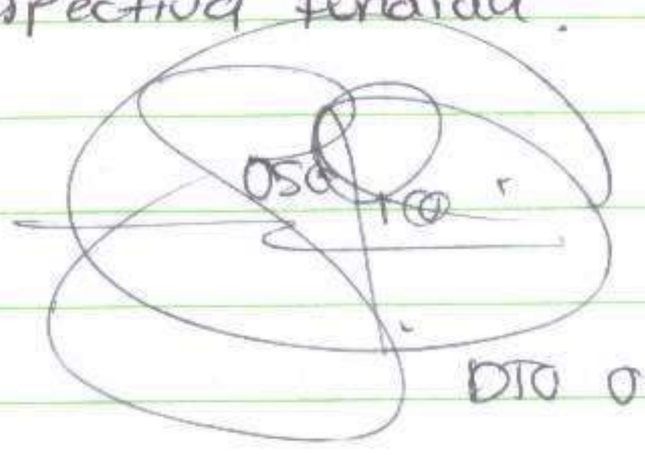

Edwin
Res Interventoría.

20/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Día nublado

Personal Interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 maestro de obra
1 oficial, 5 ayudantes de obra
Maquinaria en obra = N.A.
Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillos.



Res interventoria

22/07/2024.

Horario laboral. 7:00am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Dia con lluvia


Personal interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial
5 ayudander de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra. = Se da por terminada la actividad de cuneta y bordillo para este tramo; se prosigue con el replanteo de la curva correspondiente al segundo tramo.

También se inicia con la excavación de vigas riostras

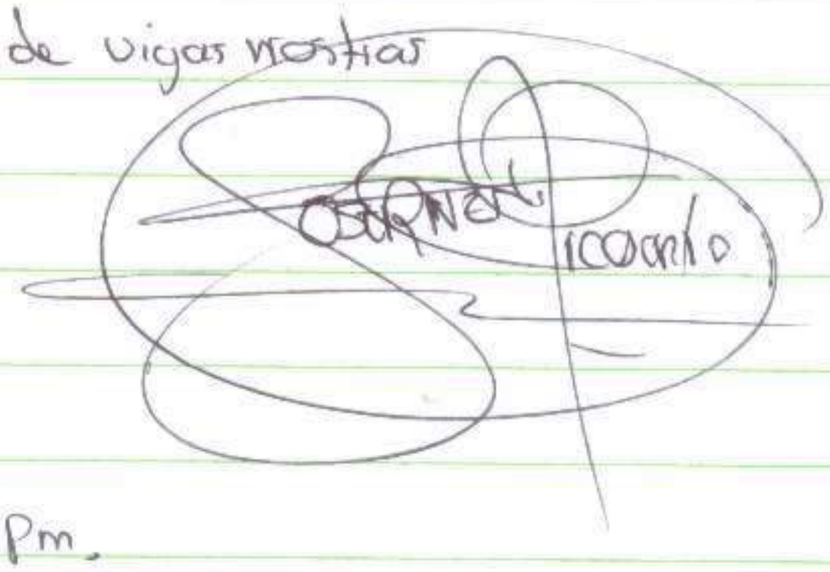

Res Interventoria

23/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Dia nublado.

Personal interventoria = 1 Ingeniero residente. 1 Ingeniero inspector.

personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial
5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el replanteo de la curva y se coloca el hierro y su respectivo amarre en las horas de la tarde se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa.

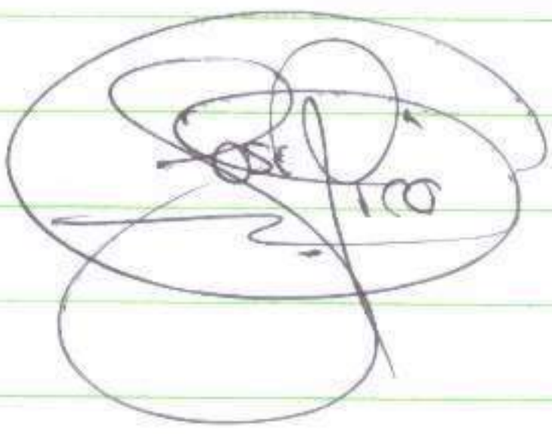

Res interventoria

24/07/2024

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Dia soleado.


Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de Concreto de 21 Mpa y se continua con la excavación de vigas norte con la colocación de hierro y su respectivo amarre.





25/07/2024

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Dia Soleado.


Personal Interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero Inspector

Personal en obra = 1 Ingeniero residente. 1 Maestro de Obra, 1 Oficial 5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = se replantea la primera rampa y se hace su respectiva Fundida; también se Funde concreto de 14 Mpa para la pieda pegada de este tramo.





26/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Dia Soleado.

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 ingeniero inspector

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se replantea la segunda rampa y se hace el vaciado de concreto de 21 Mpa; luego se procede a replantear la cuneta y bordillo de este tramo.

Rs interventoria

27/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 1:00 pm.

Estado del tiempo = Dia soleado.

Personal interventoria = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra. = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra; 1 Oficial 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se inicia con el corte y figurado de hierro para cuneta y bordillo; tambien se procede hacer la excavación para cuneta y bordillo.

Rs. interventoria

29/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = dia lluvioso

Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficial; 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se realiza el vaciado de concreto de 21 mpa para cuneta y bordillo.

Rs interventoria

30/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = dia nublado.


personal Interventoria = 1 Ingeniero residente. 1 Ingeniero inspector.

personal en obra = 1 Ingeniero residente. 1 Maestro de obra 1 oficial, 5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en Obra = Se concluye la actividad de Fundida para

Cuneta y bordillo dejando por concluido este tramo de placa huella.



Res interventoria

31/07/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5: pm

Estado del tiempo = Dia nublado

Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se inicia con el replanteo de tercer y ultimo tramo de Placa huella; se prosigue con la compactación del tramo donde se ubico la alcantarilla con material seleccionado "subbase granular".



Res interventoria

01/08/2024

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Dia soleado

personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector

personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se inicia con la excavación de vigas riostras y colocación de hierro de vigas riostras y de huella ya sea, longitudinal O vertical; en las horas de la tarde se inicia a encofrar.




Res interventoria

02/08/2024.

Horario laboral = 7:00am - 5:00 pm.


Estado del tiempo = Dia soleado.

Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
1 Maestro de obra, 1 oficial, 5 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = N.A.
Actividad ejecutada en obra = se inicia con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra. dejando fundido 30 ml de huella; se continua con el replanteo de las siguientes viga riostras




Rs interventoria

03/08/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 12:00 pm.
Estado del tiempo = Dia nublado
Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial
5 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra = N.A.
Actividad ejecutada en obra = se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huella; con su respectiva excavación y colocación de hierro

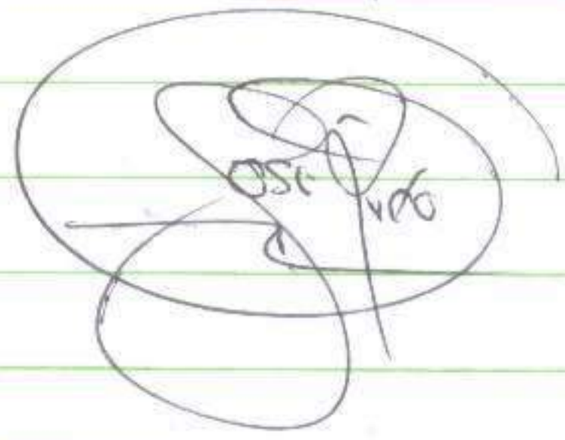

Rs. interventoria

05/08/2024.
Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.
Estado del tiempo = Dia nublado.
Personal interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra
5 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: N.A.
Actividad ejecutada en obra: se realiza el encofrado de las cajones de piedra pegada. con su respectivo vaciado de concreto de 14 Mpa esto para el tramo ya fundido anteriormente.



Res. interventoria

06/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm

Estado del tiempo = Día Soleado


Personal interventoría = 1 ingeniero residente, Ingeniero inspector.


Personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el replanteo de las Vigas riostras y su respectiva excavación.

Luego se procede a colocar el hierro longitudinal y transversal con su debido amarre dejando listo para fundir el siguiente día





07/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00pm


Estado del tiempo = Día Soleado

Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra dejando terminado 30 metros lineales





08/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm

Estado del tiempo = Día nublado


Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.

personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se encofra las cajones donde va la Piedra pegada y se realiza el vaciado de concreto de 14mpa para esta actividad.

Continuando con el Figurado de hierro en las horas de la tarde.



Res interventoría

09/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Día nublado


personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra y

5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se hace el replanteo de la zona donde quedara ubicado el sobre ancho de la placa huella y se realiza la excavacion y colocacion de hierro y así en las horas de la tarde realiza el vaciado de concreto de 21 mpa.

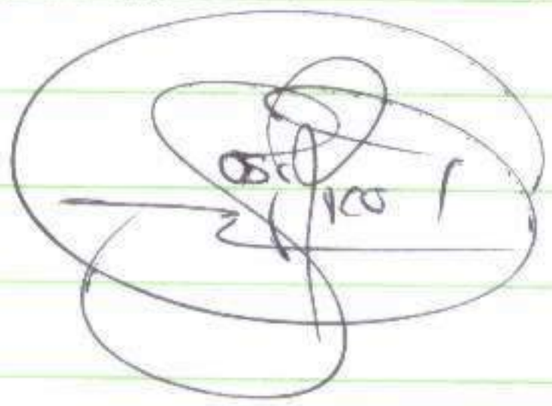

Res Interventoría

10/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = día nublado


Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra y

5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de concreto de 21 mpa para huella y viga de arriostrar.

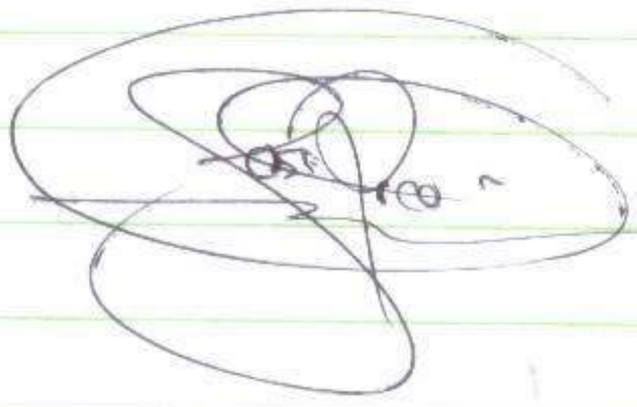

Res. interventoría

12/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm

Estado del tiempo = día nublado.

Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.


personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra y

5 ayudantes de obra.

Plafunario en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con la excavación de vigas riostras y la colocación y figurado de hierro.

Tambien Se realiza la encofrada en madera para la huella.



Res interventoria

13/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm


Estado del tiempo = Dia Soleado

Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se realiza el vaciado de concreto de rampa para huella y bordillo; en las horas de la tarde se replantea la rampa y se realiza su debida fundido



Res interventoría

14/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm


Estado del tiempo = Dia soleado.

Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de concreto de rampa



Res interventoría

15/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm

Estado del tiempo = Dia soleado

Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector

Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A

Actividad ejecutada en obra = se continua con el vaciado de concreto de limpa para la piedra pegada dejando asi por terminada esta actividad.

Ing residente
Ing interventoria



16/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Dia soleado

personal interventoría = 1 ingeniero residente. 1 Ingeniero inspector.

personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = En este dia se realiza la excavación de cuneta y bordillo de todo el tramo comprendido. Dejando asi listo para la colocacion del hierro de bordillo y cuneta.

Ing. residente
Ing. interventoría



17/08/2024

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 Pm

Estado de tiempo = Dia soleado


Personal interventoría = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.

Personal en obra = 1 ingeniero residente. 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = se continua con el figurado y amarre de hierro y se deja un tramo encofrado para proseguir con la Fundida.

Ing residente
Ing interventoria



19/08/2024,

Horario laboral = 7:00 am - 5:00pm.

Estado del tiempo = Dia soleado


Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra y

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra y 5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se inicia con el vaciado de Concreto de 21 MPa para cuneta y bordillo

Residente



20/08/2024

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm

Estado del tiempo = Día soleado.


Personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 Maestro de obra 5 ayudantes de obra.

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el Vaciado de concreto de 21 MPa para cuneta y bordillo dejando mas del 50 % terminado

Residente

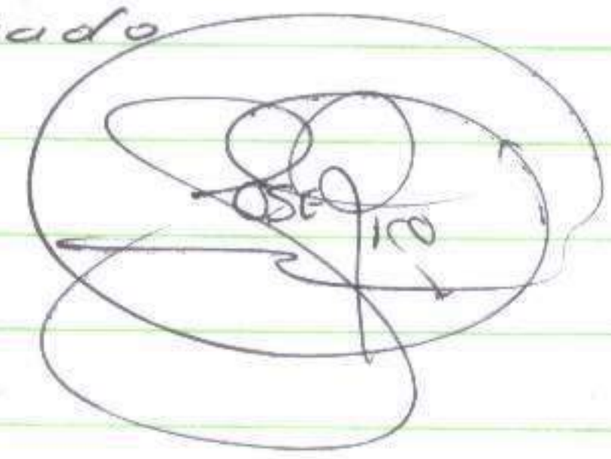

21/08/2024.

Horario laboral = 7:00 am - 5:00 pm.

Estado del tiempo = Día soleado


personal interventoría = 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero inspector.

Personal de obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes de obra

Maquinaria en obra = N.A.

Actividad ejecutada en obra = Se continua con el vaciado de Concreto para cuneta y bordillo dejando por terminada esta actividad. tambien se realiza un aseo general en la obra. dando por terminada las actividades en campo

Residente

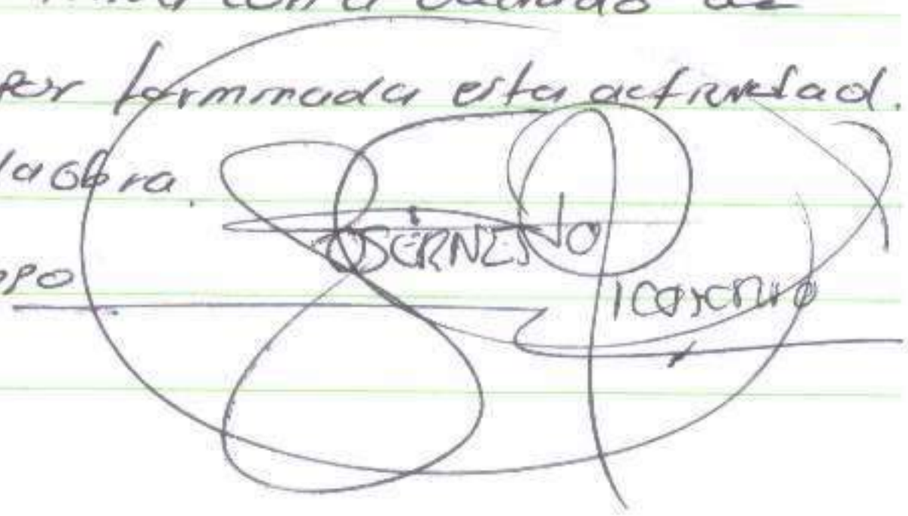

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Miércoles 03/julio/2024.

Ubicación: vereda La Sabana, municipio de Herrán, N.D.S.
Estado del Tiempo: Nublado, lluvias intermitentes (Todo el día).
Personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra
Operador de Retrocargador.
Operador de Vibrocompactador.
Actividades Realizadas:
- Instalación de cantilla - Acero de refuerzo - Pegada alcantarilla escuela PROTOS.
- Encofrado de Formaleta madera para placa pegada de alcantarilla escuela PROTOS, Fundida de placa interior (pegada-Madera)
- Se realiza excavación de cunetas y manejo de aguas
- Fundida de losa interior - placa de pegada alcantarilla escuela PROTOS.
- Limpieza de cunetas - placa huella
- Tendido de material (cargue y extendido).
- Nota: Traslado de Retrocargador * Sabana - Bernal (cantera sub base. - Inicio de explotación material (04/julio/2024).

Alexander Rivera
Ing. Residente obra

Jueves 04/julio/2024

Ubicación: vereda La Sabana, municipio de Herrán, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado, lluvias intermitentes (Jornada tarde).
Personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de Obra
Operador de Retrocargador.

líder

Powered by CamScanner

Operador de Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:

- Compactación de Sub rasante - plena huella.
- Conformación de suelo (desniveles - Alcantarilla escuela.), Instalación de cama en piedra (canto rodado), Afirmado y compactación de mejoramiento suelo (sub-base).
- Instalación de Cunetilla aceros - cabezal y aletas - Desnivel. Alcantarilla Escuela.
- Fundida de placa inferior - Desnivel
- Encofrado de muros cabezal poseta - Encole de alcantarilla Escuela.
- Selección - material cantera sub-base, Cargue de volquetas.
- Llegada de material sub-base.

Alexander Rivera
Ing. Residente obra

Viernes 05/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio de Herrán, N.D.S.
Estado del tiempo: lluvias todo el día.
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra
Operador de Retrocargador.
Operador de Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:

- Fundida de poseta - Encole Alcantarilla Escuela.
- Selección - material cantera Sub-base

Nota: Por presencia de lluvias y el estado inseguro y saturación de la vía, se suspende transporte de material sub-base y agregados de río. (Herrán - Sabana).

Alexander Rivera - Ing. Residente obra

líder

Sábado 06/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio de Herrán, NDS
Estado del tiempo: Soleado - Lluvias en jornada tarde).
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra
Operador de Vibrocompactador
operador de Retrocargador.

Actividades Realizadas:
.Excavado de dados, (Cabezal y aletas) de alcantarilla existente.
.Trasiego de Material (Roca - canto rodado)., Acopio de Material. (Arena y filtrante).
Nota: Según diseños iniciales en alcantarilla PR0+275 se proyecta "alcantarilla." con boca de entrada (caja vertedora), el cual no es un elemento de captación y conducción como lo requiere el comportamiento del terreno ya que en esta Ubicación se encuentra fluyendo quebrada con caudal moderado en días secos, Se sugiere realizar alcantarilla con Encole y desole con aletas de captación, conducción y entrega.

Alexander Rivera
Ing. Residente Obra

Lunes 08/Julio/2024

Ubicación: Vereda La Sabana, municipio de Herrán, NDS.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de Obra.
Operador de Vibrocompactador - Operador Retrocargador.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
- Demolición de alcantarilla existente - PR 0+275.
- Descapote de escombros - Alcantarilla Escuela PR 0+00.
- Fundida de Muros, cabezal, aletas de cabezales - Alcantarilla Escuela. - PR 0+00.
- Desvío de quebrada existente, manejo, contención y colección de afluente quebrada. "se instalan tubos provisionales - parantes de Flujo" (Desvío de Quebrada).
- Instalación de colchón de piedra (canto rodado) como mejoramiento de suelo - Alcantarilla PR 0+275.
- Instalación y Compactación de sub-base (capa 0.15 M, como mejoramiento de suelo - Alcantarilla PR 0+275.
- Instalación de tubería concreto Ø 36"
- Atraque de tubería concreto. (cuna de piedra - tubos de tubería).
- Relleno y compactación de alcantarilla - PR 0+275.
- Instalación de sub-base en sobre ancho de vía - calzada sobre alcantarilla, compactación con vibro.
- Llegada de Material vía - Arena y triturado.

Alexander Rivera
Ing. Residente obra


Martes 09/julio/2019

Ubicación: Vereda la Siberia, municipio de Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: parcialmente nublado.
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
2 Ayudantes de Obra
operador de Retroexcavadora
operador de Vibrocompactador.
Actividades Realizadas:
- Limpieza de cuneta y desarenador, limpieza de canal natural
- Mejoramiento de suelo - cuneta y desarenador. Instalación de

líder

Powered by CamScanner

Colchon en piedra – canto Rodado).
. Instalación y compactación de capa Sub-base como Mejoramiento de Suelo – Alcantarilla PRO + 275
. Se realiza selección de Material y Corte de Volquetas. Sub-base.
. Llegada Material Sub-base – conformación de suelo placa huella.
. Llegada Material rio – triturada




Alexander Rivera
Ing. Residente Obra

Miercoles 10/julio/2024

Ubicación: Vereda La Sabana, municipio de Chiscá, N.D.S.
Estado del tiempo: parcialmente nublado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
2 Ayudantes de Obra
Operador de Retroexcavador
Operador de Retrocargador

Actividades Realizadas:
. Llegada de Material Sub-base
. Corte, Figurado y amarre de acero. Cunetilla de entrada y salida de alcantarilla
. Instalación de cunetilla acerca desde de alcantarilla PRO+275.
. Fundida de placa inferior desde alcantarilla PR 0+275.
. Extensión de Subbase y Compactación con Obra.
. Llegada de Material rio. – (Arena).



Alexander Rivera
Ing. Residente Obra.

Powered by CamScanner

Jueves 11/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sibora, municipio Ferrú, NDS
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
- Instalación de Cunetilla Cerros (Encole - Abscisado PRO+275).
- Fundida de plena Inferior (Encole - Abscisado PRO+275
- Encofrado de Muros Cabezal y aletas (Encole abscisado PRO+275
- Regado de material Sub-base
- Trasiego de material Sub-base, riego, nivelación y compactación para huello.
- Fundida de muros Cabezal y aletas. (Encole abscisado PRO+275

Alvaro Rivera
Ing. Residente Obra


Viernes 12/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sibora, municipio Ferrú, NDS.
Estado del tiempo: nublado. - Horas fundida de la tarde
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador vibrocompactador
Actividades Realizadas:
- Riego, nivelación y compactación de material Sub-base

lider=

Powered by CamScanner


. Retiro y reemplazo de material relleno de cunetones (alcantarilla PRO +275) - Extracción de material - Formación de colchones; se realiza reemplazo y consolidación de Falla.
. Excavación de roca dura y datos cuneta alcantarilla PRO +275
. Excavación de roca dura y datos cuneta alcantarilla PRO +275



Alexander Rivera
Ing Residente obra

Sábado 13/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Herrán, N.D.S.
Estado del tiempo: Unión Constante
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
. Corte Figurado y cunetas de cuero - Riego y bandillos plena huella
. Nivelación y compactación de sub base - plena huella



Alexander Rivera
Ing. Residente Obra

Lunes 15/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Herrán, N.D.S.
Estado del tiempo: Nublado, lluvias intermitentes durante el día
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de Obra.
Operador Retrocargador

Powered by CamScanner

Operador Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

. Corte, Figurado y amarre de acero - Pasantes y bastillas Viga Losa.

Nota 1: Debido a fuertes lluvias en jornada de la mañana se hace imposible el paso de material por mal estado de vía

Arnulfo Rivera
Ing Residente obra

Martes 16/Julio/2024

Ubicación: Vereda La Sabana, municipio Girón, N.D.S.
Estado del tiempo: Lluvias constantes durante toda la jornada
Personal en Obra: Ingeniero Residente.
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador.
Operador Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:

. Corte, Figurado y amarre de acero. - Pasantes y bastillas Viga Losa
. Realización de conformación y compactación de sub rasante existente. - Tramo Sabana - Tullira (derecha).

Arnulfo Rivera
Ing. Residente obra

Miércoles 17/Julio/2024

Ubicación: Vereda La Sabana, municipio Girón, N.D.S.
Estado del tiempo: Lluvias - Soleado con intermitencias
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.

Powered by CamScanner

2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador

Actividades Predecesoras:
- Corte, Figurado y anclaje de acero - Pintura y bordillos Placa huella
- Conformación y compactación de sub rasante existente - Tramo Sitoria - Talleres (Bateria)
- Riego imprimante asfaltico via.

Manuel Pinzon
Ing Residente obra

Jueves 18/Julio/2019

Ubicación: Vereda la Sitoria, municipio Honda, Nds.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
2 Ayudantes de Obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador

Actividades Predecesoras:
- Corte, Figurado y anclaje de acero - Pintura y bordillos Placa huella
- Conformación y compactación de sub rasante existente - Tramo Sitoria - Talleres (Bateria)
- Riego de sellado de puntos Críticos - Tramo Sitoria Peñalosa
- Riego imprimante asfaltico via.

Manuel Pinzon
Ing. Residente obra

Viernes 19/Julio/2019

Ubicación: Vereda la sitoria, municipio Honda, Nds.

lider=

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Soleado, Nublos en jornada de la tarde.
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
2 Ayudante de obra
Operador Retroexcavador
Operador Vibrocompactador

Actividades Realizadas:
- Corte, Figurado y amarre de acero - Pilotes y bordillos plaza Huella
- Retiro Debido a Caracteristicas Humus y Saturación del material sub base Se realiza cambio y estabilización de areas con roca y material seleccionado). Areas derrumbe de quebradas Ko+225.
- Acopio Material Sub-base.

Alexander Duran
Ing Residente Obra

Sábado 20/julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, Municipio Honda, N.D.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de obra
Operador Retroexcavador.
Operador Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:
- Corte, Figurado y amarre de acero - Pilotes y bordillos plaza Huella.
- Cambio y estabilización de areas Contenido Saturado + derrumbe de Quebrada Ko+005 - Entrada - se sustituye material por roca y Material Seleccionado
- Conformación, conformación y compactación de Sub base.

Alexander Duran
Ing Residente Obra

lider

Powered by CamScanner

Lunes 22/Julio/2019.

Ubicación: Vereda La Siberia, municipio de Ibagué, N.D.S.
Estado del tiempo: Nublado.
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de Obra.
Operador Retrocargador.
Operador Vibrocompactador.
Actividades Realizadas:
- Corte, figurado y amarre de acero - Postes y bordillos. placa huella.
- Riego y conformación de capa Material de río Cantera - Triturado)
- Transporte de Material río (provisional - Acopio ppal.).


Nilson Parra
Ing Residente Obra

Martes 23/Julio/2019.

Ubicación: Vereda La Siberia, Municipio Ibagué, N.D.S.
Estado del tiempo: Nublado - Seco
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
2 Ayudantes de Obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
- Reunión la JAC de Siberia se reune y decide comprar 11 viajes de Recebo Cantera - Bagdal; se realiza extensión de Material, acopio. con maquinaria de obra.
- Cajeo y Limpieza de Sub rasante de placa huella.
- Compactación de Sub rasante estabilizada.
- Corte, figurado y amarre de acero - Postes y bordillo placa huella

Powered by CamScanner


- Llegada de concreto (Tambores (Hernán - Silvania).



Alexander Rivera
Ing. Residente Obra

Miercoles 24/Julio/2024

Ubicación: Vereda La Silvania, Municipio Hernán, N.D.S.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
2 Ayudantes de Obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
- Cargue y retiro de escombros.
- Acopio de Material Sub base, - Arena y Triturado
- Nota 1: La Maquinaria de obra se dispone a realizar trabajos de extensión y compactación de material recibo - Bagual de la JAC de Silvania.
- Corte, Figurado y Armado de acero - Pasadores y canastillas para losa



Alexander Rivera
Ing. Residente obra.

Jueves 25/Julio/2024

Ubicación: Vereda La Silvania, municipio Hernán, N.D.S.
Estado del tiempo: nublado, lluvias intermitentes
personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de obra.
2 Ayudantes de Obra
Operador Retrocargador.
Operador Vibrocompactador.

lider

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
- Limpieza de desde y excavación de alcantarilla las piedras para - toma agua potable general
- Excavación para instalación de tubería - Nivelación de pendiente
- Instalación de tubería concreto Sanitario - Agua lluvias 8"
- Arreglo y relleno de excavación para tubería concreto Sanitario 8".
- Excavación, instalación y relleno de tubería para de Mejoramiento Suministro de Agua potable - Drenaje.
- Desmonte de Arboles. Cobertura vegetal y Piedras.
- Acopio de Material para reforma.

Nota:
- Se recibe visita de fiscalización.
- Explicación avance de obra; contratiempos y complicaciones del proceso en desarrollo; Componente ambiental, Social y Salud.
- Socialización de actividades adicionales y Aclaraciones pendientes en campo - Retención de cartas. - Visita.
- Definir claves nivel de proyecto - proximo Inicio de alcantarilla Mayor para
- Socialización de estado del tiempo y afectaciones en el desarrollo de obra.
- Planteamiento proximo - Tiempo.
- Instalación de Retroexcavadora Sanitario - Pluvial.
- Corte, Figurado y armado acero.

Atentamente
Ing. Residente Obra


Viernes 26/Julio/2024.

Ubicación: Vereda la Sabana, Municipio Ibagué, N.O.S
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra.
Operador Vibrocompactador.
Operador Retroexcavadora

lider=

Powered by CamScanner


Actividades Realizadas:
. Extracción Material Sub base, carga de volquetes Rend-Sitoria
. Acopio de Sub base.
. Corte, Figurado y amarre de acero - Pilastras y bandillas



Nestor Pinos
Ing. Residente Obra

Sábado 27/Julio/2024.

Ubicación: Vereda La Sabana, Municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Nublado, lluvioso.
personal en Obra: Ingeniero Residente.
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de obra.
Operador Retroexcavadora
Operador Vibrocompactador.
Actividades Realizadas:
. Acopio de Material Sub base
. Replanteo y Nivelación de capota Sub base. (Instalación de estacas - Niveles).
. Extracción de material Sub base. - Manual.
. Compactación de Sub base con Vibrocompactador.
. Extracción Material Sub base, carga de volquetes Rend-Sitoria
. Corte, Figurado y amarre de acero - Pilastras y bandillas.



Nestor Pinos
Ing. Residente Obra

Lunes 29/Julio/2024.

Ubicación: Vereda La Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: parcialmente nublado.

Powered by CamScanner

Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador.
Operador vibrocompactador.

Actividades Realizadas:
- Replanteo y nivelación de capeta Sub base, obtención de material manualmente por capas.
- Compactación de Sub base con vibrocompactador.
- Extracción de material, carga de volquetes Sand-Sphere.
- Corte, Figurado, armado de acero - para losa.

Alexander Rivera
Ing. Residente obra

Martes 30/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Fuertes lluvias - Todo el día.
Personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador vibrocompactador.

Actividades Realizadas:
- Limpieza de cunetas - Fuertes lluvias, evacuación de agua estancada extracción y colchones.
- Se suspenden actividades en campo por gran magnitud de lluvias. Nota 1

Alexander Rivera
Ing. Residente obra

Powered by CamScanner

Miércoles 31/Julio/2024

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: nublado - parcialmente
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
2 ayudantes de obra
Operador Retrocargador.
Operador Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:

Nota: Debido a las fuertes lluvias del día anterior, hoy Miércoles 31 de Julio de 2024 amanece la quebrada aguas bastante crecida por el abundante material de arrastre que trajo la creciente de ese día, se observa poco de gran cantidad sobre pasado 1,5 m. de diámetro aprox.
- Se dispone de Retroexcavadora de orugas para realizar excavación de limpieza y conformación de pozo donde estará el filtro.
- Acopio de material sub base
- Cargue de volquetas.
- Cribado y Nivelación manual de sub base.
- Compactación de sub base con Vibrocompactador.
- Corte, figurado y armado de acero - Placa huella

Alexander Rivera
Ing. Residente obra

Jueves 01/Agosto/2024

Ubicación: Vereda la Sabana municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: parcialmente nublado
personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.

líder=

2 Ayudantes de obra.
operador Retrocargador.
operador Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:
. Toma de Niveles. - Instalacion de estacas - cotas
. Conformacion manual - carpeta Sub base.
. Acopio de Material Sub base
. Compactacion de Subbase - Vibrocompactador.
. Conformacion de Sub base por capas
. Corte, Figurado y armada de acero - placa huella

Alcides Rivera
Ing. Residente Obra

Viernes 02/agosto/2024.

Ubicacion: Vereda la Sibaria, Municipio de Herrán, N.DS
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
2 Ayudantes de obra
operador Retrocargador
operador Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:
. Riego y compactacion de Material Sub base - Vibrocompactador
. Acopio de Material Sub base
. Traslado de Retrocargador - Raul - Sibaria
. Instalacion de Estacas - cotas Bloques de Niveles
. Nivelacion de cotas

Alcides Rivera
Ing. Residente Obra

Powered by CamScanner

Sábado 03/agosto/2024

Ubicación: vereda la Sabana, Municipio de Ocaña, N.D.S.
Estado del tiempo: Nublado, lluvias intermitentes
personal en Obra: Ingeniero Residente.
Maestro de obra.
2 Ayudantes de obra.
Operador Retrocargador.
operador Vibrocompactador.
Actividades Realizadas:
. Nivelación y extensión de material Sub base granular
. Control de niveles (Retrocargador).
. Compactación de capa de Sub base por capas - Vibrocompactador.

Adriana Ruiz
Ing Residente obra

Lunes 05/agosto/2024

Ubicación: vereda la Sabana, Municipio Ocaña, N.D.S.
Estado del tiempo: Nublado, con lluvias en la tarde
personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
11 Ayudante de Obra
Operador Retrocargador.
Operador Vibrocompactador.
Actividades Realizadas:
. Replanteo de estructura - Placa huella.
. Excavaciones para instalación de Vigas Pilotes
. Instalación de Vigas Pilotes, cabezas de huellas.
. Encofrado de placa huella - formaleta Madera
. Toma Muestras de densidades Compactación Sub base.
. Transporte de material Sobrante. Arena - triturado Volquetas y

Retroexcavadora
. Conformación de subbase tramo capilla - alcantarilla PK 0+275
. Corte de cuneta cuneta lateral - boca transición

Alcalde - Fiscal
Ing. Residente Obra

Martes 06/agosto/2024

Ubicación: vereda la soberbia, municipio Honda, N.S.
Estado del tiempo: soleado, lluvias en jornada de la tarde
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
11 Ayudantes de obra.
Operador Retroexcavadora
Operador Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
. Excavación de boca - placa huella - cuneta
. Fundida de boca - placa huella - cuneta
. Acopio de piedra bola - Concreto Ciclopeo - placa huella
. Toma Resistencias Cilindros - Ensayo resistencia de Materiales
. Instalación y anclaje de aceros - placa huella
. Encofrado de boca - placa huella
. Pegillas y acabados de boca - placa huella - cuneta
. Se realiza encope de área trabajo - Puentes Lluvias
. Transporte de Material - Retroexcavadora
. Conformación de Subbase.

Alcalde Honda
Ing. Residente Obra

Miércoles 07/agosto/2024

Ubicación: vereda la Soberbia, municipio Honda, N.S.
Estado del tiempo: Soleado, Lluvias en Jornada de la tarde
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.

Powered by CamScanner

11 Ayudantes de obra
Operador de Retrocargador
Operador de Vibrocompactador.

Actividades Realizadas:
. Excavaciones para Vigas Riostras.
. Fundida de losa - pluma huella - curva 1 - Tira 2. lateral
. Encofrado de losas - pluma huella
. Excavación, carga, nivelación manual por capas de Sub base.
. Conformación y extensión de Material Sub base - Retrocargador.
. Compactación de Sub base - Vibrocompactador.
. Detalles y acabados de losa - pluma huella - curva 1 - Tira lateral
. Encofre de cinco trabajos por llenar.

Alexander Rivera
Ing Residente Obra.

Lunes 05/agosto/2024

Ubicación: vereda la Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
. Encofrado de losas - pluma huella
. Fundida de losas - pluma huella - curva 1 - Tira 1 Lateral
. Fundida de losas - Huella peatonal - Concreto ciclopeo
. Excavaciones para Vigas Riostras
. Conformación de Sub base por capas; excavación, carga, nivelación.
. compactación de Sub base por capas - Vibrocompactador.
. Detalles y acabados de losa

Alexander Rivera
Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 09/agosto/2024

Ubicación: vereda la Siberia, municipio Herrán, NDS
Estado del tiempo: lluvias intermitentes
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
11 ayudantes de obra
operario Retrocargador
operario Vibrocompactador
Actividades Realizadas:
. Instalación de acero - Placa huella.
. Encofrado de losas - Huellas - formaleta laterales
. Fundida de base de transición Ko+000
. Fundida de rampa - Acceso continuidad Vial. (NP).
. Reunión en oficina - Exposición avance de obra - cambio Maestro Herrán.
. Traslado de material Herrán - Siberia - Concreto.
. Excavaciones para Vigas Riostras.
. Nivelación y compactación de sub base para losas - Placa - Viga
. Fundida losas - huellas - Placa huella - Riostras
. Detalles y acabados de losas

Nombre Ingeniero
Ing. Residente Obra

Sábado 10/agosto/2024

Ubicación: Vereda la Siberia, municipio Herrán, NDS.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 ayudantes de obra
Actividades Realizadas:
. Excavaciones para Vigas Riostras
. Fundida de base piedra pegada - Concreto ciclopeo

líder=

Powered by CamScanner

- Instalación y armado de acero – Placa huella – Huellas
- Vaciado de Losas
- Encofrado de losas – Huellas – Formaleta madera
- Detalle y acabados de losas

Alexander Ramos
Ing. Residente obra

Lunes 12/agosto/2019.

Ubicación: Vereda La Sabana, Municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
11 ayudantes de obra.
Operador Retrocargador.
Operador Vibrocompactadores.

Actividades Realizadas:

- Fundida de losas – Huellas – Placa huella + Pasitos
- Limpieza y paisajismo de areas Antrosocicles (Escuela – Parqueadero) # Polideportivo alrededor alcantarilla.
- Instalacion de vigas bordillos
- Encofrado de bordillos.
- Fundida de bordillos
- Excavacion, nivelacion por capas de sub base granular – Retrocargador
- Compactacion de sub base – Vibrocompactador
- Riego de sub base – Toma de niveles
- Instalacion y armado de acero (Huellas – Pasitos).
- Fundida de losa piedra pegada – concreto Ciclopeo
- Detalle y acabados de losas.

Alexander Ramos
Ing. Residente obra

Martes 13/agosto/2019.

Ubicación: Vereda La Sabana, Municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado

Powered by CamScanner

Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 Ayudantes de obra.
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador

Actividades Realizadas:
- Instalación y armado de aceros (cunetas y bordillos).
- Encofrado de cunetas y bordillos.
- Encofrado de losas - Huellas.
- Extensión y nivelación de sub base - Retrocargador.
- Compactación de sub base. - Vibrocompactador
- Acopio de Material Sub base.
- Excavación para Vigas Riostras
- Instalación y armado de aceros (huellas y riostras).
- Fundida de cunetas y bordillos.
- Detallar y acabados de losas.

Alexander Ramos
Ing. Residente obra

Miercoles 14/agosto/2024.

Ubicación: Vereda la Sabana, Municipio de Floresta, NDS
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 ayudantes de obra
Operador Retrocargador
Operador Vibrocompactador

Actividades Realizadas:
- Compactación de sub-base - vibrocompactador
- Nivelación y extensión de sub-base. - Retrocargador
- Fundido de losas. - Huellas. (Riostras)
- Instalación y armado de aceros (Huellas y riostras)
- Encofrado en losas - Huellas.

lider

Powered by CamScanner

- Acarreo interno de Material (Carga y Retiro). - Retrocargador.
- Acopio de Material Ribera.

Nota 1: - Se realiza visita de Interventoría, Jefe Maestro residente
- Especificaciones obra de obra; procesos de desarrollo, cuidado, seguridad, actividades SST, civil, Jefe Maestro especificaciones contratista.
- Realización de acta - Visita
- Balance recibo de obra - Según necesidades de actividades no previstas.

Nota 2: Traslado de Retrocargador. - Siberia/Florida

- Detalle y acabados de losas.

Alexis Ramos
Ing. Residente obra

Jueves 15/agosto/2024

Ubicación: Vereda la Siberia, Municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
11 Ayudantes de Obra
Operador Retrocargador.

Actividades Realizadas:
- Compactación de Sub-base - Retrocargador.
- Fundida de losas - Huellas. (Rastras)
- Grafilado de losas - Huellas
- Instalación y amarre de acero (Huellas, Rastras)
- Excavación para Vigas Rastras.

Nota: Traslado de Retrocargador - Siberia/Florida
- Acopio de Material - Concreto
- Detalle y acabados de losas

Alexis Ramos
Ing. Residente obra

Viernes 16/agosto/2024

Ubicación: Vereda la Siberia, Municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
11 Ayudantes de Obra.

Actividades Realizadas:
. Relleno y apisonado de bordillos. - Limpieza de placa huella
. Fundida de losas - Huellas (Chaflan).
. Acopio de Material - Concreto.
. Encofrado de losas - Huellas
. Detalle y acabado de losas

Alexander Rivera
Ing. Residente Obra

Sabado 17/agosto/2024.

Ubicación: Vereda la Siberia, Municipio de Ibagué, N.O.S.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
11 Ayudantes de Obra.
Actividades Realizadas:
. Fundida de losas - Piedra pequeña - Concreto ciclopeo. - Cortes
. Encofrado de losas - Piedra: Laterales
. Detalle y acabado de losas.

Alexander Rivera
Ing. Residente Obra

Martes. 20/agosto/2024.

Ubicación: Vereda la Siberia, Municipio Ibagué, N.O.S.
Estado del tiempo: Nublado.
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra.
11 ayudantes de Obra.
Actividades Realizadas:
. Fundida de losas - Piedra pequeña - Concreto ciclopeo - Cortes

líder

Powered by CamScanner

- Colocación de losas - Piedra laja
- Detalle y acabados de losas

Alexander Ramirez
Ing Residente Obra

Miércoles 21/agosto/2024

Ubicación: Vereda La Siberia - Municipio Herrán, N.S.
Estado del tiempo: parcialmente nublado
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 ayudantes de obra

Actividades Realizadas:
- Fundida losas - Piedra pegada - Concreto ciclopeo - Laterales
- Replanteo, compactación y nivelación de sobre cuello - capilla
- Relleno y limpieza de afluente sobre - Conducción Cuneta
- Limpieza de ejes
- Detalle y acabados de losas

Alexander Ramirez
Ing Residente Obra

Jueves 22/agosto/2024

Ubicación: Vereda La Siberia, Municipio Herrán, N.S.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
Personal en Obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
11 ayudantes de Obra

Actividades Realizadas:
- Fundida de losas - Piedra pegada - Concreto ciclopeo - Laterales
- Excavación Pozo Rastreo
- Mapeo Madrid Aguas y tributarios
- Instalación y anclaje de accesos (Escalera y Viga Rastreo)
- Encofrado de losas - Escalera
- Detalle y acabados de losas

Alexander Ramirez
Ing Residente Obra

Viernes. 23/agosto/2024.

Ubicación: Vereda la sabana, municipio Honda, NDS.
Estado del tiempo: parcialmente nublado, lluvia en jornada de la tarde.
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 ayudantes de obra.
Actividades Realizadas:
- Fundida de losas - Huellas
- Excavación para Pilotes
- Instalación y armada de aceros (Huellas y Pilotes).

Notas: Se realizan pruebas resistencia de compresión. (Cilindros)
Toma de Medidas.

Nombre Firma
Ing. Residente obra.

Sábado 24/agosto/2024

Ubicación: Vereda la sabana, municipio Honda, NDS.
Estado del tiempo: Soleado
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
11 ayudantes de obra.
Actividades Realizadas:
- Excavación para Vigas Pilotes
- Instalación y armada de aceros (Huellas, Pilotes).
- Encofrado de losas - Huellas.
- Acopio de Material - Concreto

Nombre Firma
Ing. Residente Obra

líder

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

"Bitacora de obra"

Contrato No CD-FC-061-2023

Objeto= Mantenimiento de vias rurales las minas de cal-La arenita-La Mesa, municipio de Motiscua Norte de Santander.

Contratista= Sociedad consorcio Construcciones y Vias del Norte SAS

Interventoria= Gavinco Ingenieros Consultores.

Ing. Res Interventoria.

Miercoles 31 de Julio de 2024
Estado del clima: se Presenta dia Nublado
Personal de obra: 1 INS Residente, 3 oficiales 7 ayudantes
Personal de interventoria: 1 INS Residente
Maquinaria en obra: 1 mezcladora de concreto de 1 bulto
1 mezcladora de concreto de 2 bultos, 1 rana, 1 vibrador de concreto
Actividades ejecutadas en obra: el contratista realizo la fundida de 29 mt de bordillo al igual que 8 huellas de concreto de 1' MPA. Despues de eso, se armo 2 huellas de 90 y 4 de 45 de concreto de piedra pegada, se realizo traslado de material ya que el camion se quedo varado. se descargo 150 bultos de cemento, y 200 Ø 1/2

Interventoria — Directora obra

Jueves 01 de Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 INS Residente, 3 oficiales, 7 ayudantes
Equipos en obra: 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos, 1 rana, 1 vibrador de concreto
Personal de interventoria: 1 INS Residente
Actividades ejecutadas en obra: el contratista replanteo el tramo y se armo otro cajon de 90 y 2 de 45cm de concreto de piedra pegada Tambien se fundio 15 mt lineales de cuneta y bordillo y 6 huellas de 90 de 1MPA Despues de empezo la excavacion de los ultimos vastros para la cuneta 2 del tramo 1

Interventoria — Directora Obra

Viernes 02 de Agosto de 2024
Estado del clima: se Presenta dia soleado
Personal de obra: 1 INS Residente, 3 oficiales, 7 ayudantes
Personal de interventoria: 1 INS Residente
Equipos en obra: 1 mezcladora de concreto de 1 bulto. 1 mezcladora de concreto de 2 bultos, 1 rana, 1 vibrador de concreto

Actividades ejecutadas en obra: el contratista empezo el armado de la parrilla de la curva 1, se dejo armada hasta la mitad, se dividio en 3 partes y se inicio la fundida de 1 de esas 3 partes

Residente de interventoria — Daniela Rios Directora Obra

Sabado 03 de Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta dia Nublado

Personal de obra: 1 INC Residente, 3 oficiales, 6 ayudantes

Personal de interventoria, 1 INC Residente

Equipos en obra: 1 rana compactadora, 1 vibrador de concreto, 1 trompo de 1 bulto, 1 mezcladora de 1 bultos

Actividades ejecutadas en obra, el contratista continuo fundiendo las dos partes restantes de la curva 1 se fundio todo hasta la mitad de la curva

Residente de interventoria — Daniela Rios Directora Obra

Lunes 05 de Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta dia Nublado

Personal de obra: 1 INC Residente, 3 oficiales, 5 ayudantes

Equipos en obra: 1 rana compactadora, 1 vibrador de concreto a gasolina, 1 trompo de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 1 bultos

Personal de interventoria, 1 INC Residente

Actividades ejecutadas en obra. El contratista empezo tema de excavacion para las viga riostra y para el bordillo. Despues de eso, se empezo armar la parrilla restante de la curva 1

Residente de interventoria — Daniela Rios Directora Obra

Martes 06 de Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta dia Nublado y lluvioso

Personal de obra: 1 INC Residente, 3 oficiales, 5 ayudantes

Personal de interventoria,

Equipos en obra: 1 vibrador de concreto a gasolina, 1 rana compactadora, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto,

1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra: el contratista continuo con el armado de la parrilla de la cuneta 2, También realizo el armado del bordillo y cuneta, se encofro y se empezo a fundir 1 de 3 paños iguales. como llego material. se descargo 200 bultos de cemento y 3 rollos de alambre

Ing interventoria. Residente Obra

Miercoles 07 de Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 ING Residente, 3 oficiales, 5 ayudantes
Personal de interventoria, 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concretos, 1 rana compactadora 1 de mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra: el contratista continuo con la fundida de la cuneta 1 al terminarla se realizo el armado de la losa de transicion y se fundio de una vez. Despues de terminar se empezo a encofrar la cuneta y se dejo lista para la fundida se tomo la decision de trabajar todo el dia para no trabajar el dia sabado.

Ing interventoria Residente Obra

Jueves 08 de Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 ING residente, 3 oficiales, 5 ayudantes
Personal de interventoria, 1 ING residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana compactadora 1 mezcladora de concreto de 1 bulto y una de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra: el contratista empezo a fundir el tramo faltante de cuneta. despues de eso se realizo una rampa en la entrada de la finca para facilitar el paso de vehiculos a la misma. Al terminar se empezo a trasladar todo el material, formaletas, y equipos para su limpieza y traslado al tramo 2

Ing interventoria Residente Obra

Viernes 09 de Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día lluvioso
Personal de obra. 1 ING Residente, 3 oficiales, 7 ayudantes
Personal de interventoría: 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana compactadora
1 mezcladora de concreto de 1 bulto y 1 mezcladora de concreto de 7 bultos
Actividades ejecutadas en obra: el contratista INICIO el día desarmando el campamento. después se empezo a montar todo al camion para traslado hacer tramo 2. En total se hicieron 2 viajes, se le hizo limpieza general al tramo 1. También se realizo la construccion del campamento en el tramo 2. por otro lado, se realizo la actividad de cerramiento con alambre de los tramos afectados durante la ejecucion del tramo 1

Residente Interventoría — Directora de obra

Sabado 10 de Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día soleado
Personal de obra. 1 ING residente, 1 oficial 1 ayudante
Personal de interventoría, 1 ING Residente
Equipos en obra, 1 vibrador de concreto. 1 rana compactadora
1 mezcladora de concreto de 1 bulto y 1 de 7 bultos
Actividades ejecutadas: El contratista realizo limpieza y orden de los materiales, herramientas y demas en el tramo 2.

Residente Interventoría — Directora de Obra

Lunes 12 de Agosto 2024
Estado del clima: se presenta día soleado
Personal de obra. 1 ING residente, 3 oficiales, 6 Ayudantes
Personal de interventoría. 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana compactadora
1 mezcladora de concreto de 1 bulto. 1 mezcladora de concreto de 7 bultos
Actividades ejecutadas en obra: el contratista empezo

la actividad de excavacion de la nueva alcantarilla. Se empezo con el descole, y se realizo el solado. Se subio material para el contrafrado de la alcantarilla. asi como tambien los bultos de cemento. por otro lado se empezo la figurado de acero de estribos y ganchos para vigas y bordillos. Tambien se empezaron armar los cajones para las huellas de 55 cm de piedra pegada

Residente de interventoria — Directora Obra

Martes 13 de Agosto 2024

Estado del clima: se presenta dia soleado

Personal de obra, 1 INS residente, 3 oficiales, 6 Ayudantes

Equipos en obra, 1 vibrador de concreto, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos, 1 rana

personal de interventoria: 1 INC residente

Actividades ejecutadas: se realizo el armado de acero para la placa de descole de la alcantarilla al igual que la excavacion del dentellon de la misma se encofro y se fundio, mientras tanto se continuo con el armado de las vigas y los bordillos. Llego la tur-bo y se descargo 120 bultos de cemento, 700 Ø 1/2 300 Ø 1/4 y 150 Ø 3/8

Residente de interventoria — Directora obra

Miercoles 14 de Agosto 2024

Estado del clima: se presenta dia soleado

Personal de obra: 1 INS Residente, 3 oficiales, 6 ayudantes

Personal de interventoria 1 INC residente

Equipos en obra, 1 vibrador de concreto, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos, 1 rana

Actividades ejecutadas: el contratista continuo con el armado del acero de las aletas de la alcantarilla despues se realizo el encofrado de las mismas.

Residente interventoria. — Directora obra

Jueves 15 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día soleado
Personal de obra. 1 INC Residente, 3 oficiales, 6 ayudantes
Personal de interventoría. 1 INC Residente
Equipos en obra. 1 vibrador de concreto, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos.
Actividades Ejecutadas: El contratista empezo la fundida de las aletas de la alcantarilla. una vez terminada esta actividad. Se tomo la desicion de empezar armar bordillo y cuneta.

Abdul
Rs interventoría

Laura Ríos
Directora Obra

Viernes 16 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día soleado
Personal de obra. 1 INC Residente. 3 oficiales. 7 ayudantes
Personal de interventoría. 1 INC Residente
Equipos en obra. 1 vibrador de concreto. 1 mini compactadora 1 mezcladora de concreto de 1 bulto y 1 mezcladora 2 bul
Actividades ejecutadas en obra. Se inicio el dia descargando 250 bultos de cemento. Despues de eso se continuo con el armado de la cuneta, se fundio y se fundio una parte. Tambien se descofro el muro y las aletas de la alcantarilla y se resano. Llego otro camion con concreto y se descargaron 236 bultos mas.

Abdul
Rs interventoría

Laura Ríos
Directora obra

Sabado 17 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra. 1 INC Residente. 3 oficiales, 7 ayudantes
Personal de interventoria. 1 INC Residente
Equipos en obra. 1 vibrador de concreto, 1 mini, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra. Se realizo el armado de las vigas riostra al igual que el armado de los bordillos de 35 y 45 cm

mientras otra cuadrilla continuaba con el figurado de los ganchos y los estribos de las mismas

Ing Interventoria — Directora Obra

Martes 20 Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta dia soleado

Personal de obra: 1 ING Residente, 3 oficiales 7 ayudantes

Personal de interventoria 1 ING Residente

Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana. 1 mezcladora de concreto de 1 bulto y 1 mezcladora de 2 bultos

Actividades ejecutadas en obra el contratista empezo la realizacion de excavacion del encole de la alcantarilla se volvio hacer otra reunion junto con interventoria correctivos, y vecinos de la comunidad y se dejaron todos los temas claros respecto al tramo 2. se continuo con el armado de la cuneta se encofro y se fundio en total 21.20 mt lineales de cuneta estilo batea

Ing Interventoria — Directora Obra

Miercoles 21 Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta dia soleado

Personal de obra: 1 ING Residente, 3 oficiales, 4 ayudantes

Personal de interventoria: 1 ING Residente

Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana compactadora 1 mezcladora de concreto de 1 bulto y 1 mezcladora de 2 bultos

Actividades ejecutadas en obra, el contratista empezo a dar movido toda la piedra especificada por todo el tramo a fundir. se armaron 3 cajones de 90 cm y 3 cajones de 55 cm de piedra pegada por otro lado se continuo con la excavacion manual del encole de la alcantarilla

Ing Interventoria — Directora Obra

Jueves 22 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día lluvioso
Personal de obra: 1 ING Residente, 3 oficiales, 5 ayudantes
Personal de interventoria, 1 ING Residente
Actividades ejecutadas: se fundieron los 3 cajones de 90 cm de piedra pegada y los 3 cajones de 55 cm de piedra pegada. Despues de eso, se empezo la excavacion de las vigas riostra del sobre ancho del tramo 2. La actividad de excavacion de la alcantarilla se paro, ya q las volquetas llegaran con material. Debido a q el lio es tan angosto no se siguio excavando.

Residente Interventoria — Directora Obra

Viernes 23 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día lluvioso
Personal de obra: 1 ING Residente, 3 oficiales, 5 ayudantes
Personal de interventoria, 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 pala, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra: El contratista continuo con el armado de la parrilla del sobre ancho. una vez terminada esta actividad, se dividio el tramo en 2 partes iguales, se encofro y se empezo a fundir una parte.

Residente Interventoria — Directora Obra

Sabado 24 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta día soleado
Personal de obra: 1 ING residente 3 oficiales, 4 ayudantes
Personal de interventoria, 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra, el contratista continuo con la actividad de fundida de 1 de los 2 cortes del sobre ancho del tramo 2, al terminar se INICIO la actividad de excavacion del bordillo

se armo y se encofro todo la parte del bordillo del sobre ancho.

Residente Interventoría — Directora Obra

Lunes 26 Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta día Nublado

Personal de obra: 1 ING residente 3 oficiales, 4 ayudantes

Personal de Interventoría: 1 ING Residente

Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana, 1 Mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto 2 bultos

Actividades ejecutados en obra: se continuo con la fundida de la parte faltante del sobreancho, se fundio junto con el bordillo, al terminar, se hizo la excavacion de la losa de transicion, se armo el acero y se dejo lista para la fundida

Residente Interventoría — Directora Obra

Martes 27 Agosto de 2024

Estado del clima: se presenta día Nublado

Personal de obra: 1 ING Residente, 3 oficiales 5 ayudantes

Personal de interventoria 1 ING Residente

Actividades ejecutados: el contratista inicia el día fundiendo la rampa de acceso al terminar se armaron 7 cajones de 90 cm y 7 cajones de 35 cm para piedra pegada. Tambien se retomo la actividad de excavacion del costado de la alcantarilla. Se alcanzo a fundir todos los cajones armados de piedra pegada

Residente Interventoría — Directora Obra

Miercoles 28 Agosto 2024

Estado del clima: se presenta día Soleado

Personal de obra: 1 ING residente, 3 oficiales, 6 ayudantes

Personal de interventoria: 1 ING residente

Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 mezcladora de 2 bultos 1 mezcladora de 1 bulto

Actividades ejecutadas en obra: el contratista

Continuo armado los cajones para las huellas de piedra pegada. en total se armaron 8 cajones de 90 cm y 8 cajones de 55 cm. Por otra parte, se le hizo el solado al encole de la alcantarilla

Ing interventoria — Directora Obra

Jueves 29 Agosto de 2024
Estado del clima: soleado
Personal de obra. 1 ing residente. 3 oficiales, 5 ayudantes
Personal de interventoria. 1 ing residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto. 1 mezcladora de concreto de 1 bulto. 1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra: el contratista empezo con el armado de la parrilla de las huellas de 90 de concreto de 21 MPA al igual que el armado del bordillo. Tambien se armo el acero de la placa del encole de la alcantarilla y se fundio. Se fundieron 6 huellas de 90 y 12 mt de bordillo

Ing interventoria — Directora Obra

Viernes 30 Agosto de 2024
Estado del clima: se presenta dia Nublado
Personal de obra. 1 ing residente. 3 oficiales. 4 ayudantes
Personal de interventoria. 1 ing residente
Equipos en obra 1 vibrador de concreto 1 mezcladora de 1 bulto. 1 mezcladora de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra: se empezo armar los muros de la alcantarilla. Se armaron las parrillas y se encofro. al terminar se inicio la fundida de esta despues el contratista continuo con la fundida de 4 huellas de 90 cm de concreto de 21 MPA Se fundio junto con bordillo.

Ing interventoria — Directora Obra

Sabado 31 Agosto 2024
Estado del clima: se encuentra dia Nublado
Personal de obra. 1 Ing Residente 3 oficiales. 4 ayudantes
Personal de interventoria. 1 Ing Residente
Equipos en obra: 1 vibrada de concreto. 1 revolvedora de concreto de 1 bulto, 1 revolvedora de concreto de 6 bultos
Actividades realizadas en obra: el contratista continuo con el armado de las parrillas para los huellas de ZIMPA al terminar. se empezo a fundir estas huellas, en total fueron 7 huellas de 90 cm y se alcanzo a fundir 6mt de bordillo.

Residente Interventoria.

Daniela Directora Obra.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

5 de agosto de 2024

- Observación: Durante el Periodo compliendido entre el 5 al 19 de agosto de 2024 el contratista se encontraba realizando actividades ejecutivas.

Fecha = 20 de agosto del 2024

clima : Soleado

Personal : 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de dora, 1 operador de maquinaria

Equipos : Topográficos, Herramienta menor

Maquinaria = 1 Pajarita

Actividades : El contratista inicia con el armado de acero de refuerzo Para bordillos, viga riostras y Parrillas, Suministro de agregados Pétreos, Implantación del diseño geométrico con equipos topográficos, suministro de tubería de concreto de 36". Así mismo se recibe visita Por Parte de la comunidad en la cual manifiestan la reubicación de una de las alcantarillas, dándole Prioridad al punto mas critico Por lo cual la alcantarilla ubicada en el K1+660 se desplaza 3 m.

Residente.

Fecha: 21 de agosto del 2024

clima: soleado

Personal: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de dora, 1 Operador de maquinaria.

Equipos: Topográficos, Herramienta menor.

Maquinaria: 1 Pajarita

Actividades: El contratista continua con el acero de refuerzo Para bordillos, viga riostras y Parrillas, se continua con la implantacion del diseño geometrico con equipos topográficos, se da inicio a las excavaciones Para la instalación de las alcantarillas Por lo que se encuentra con un material saturado, Por lo cual se Procede a removerlo Por completo ya que se encuentra contaminado y no es adecuado Para el relleno de la alcantarilla.

Fecha: 22 de agosto del 2024
clima: soleado
Personal: 1 director de obra, 1 residente de dora, 1 residente de interventoría, 1 maestro de dora, 6 ayudantes de obra, 1 operador de maquinaria.
equipos: Herramienta menor, compactador manual tipo canguro, Mezcladora de concreto.
Maquinaria: 1 Pajarita
Actividades: El contratista continua con el armado de acero de refuerzo para bordillos, viga riostras y Parrillas, suministro de agregados Pétreos, suministro de tubería de concreto de 36", se avanza con la excavación para alcantarillas, instalación de solado e instalación de 6 tubos de concreto, relleno con material seleccionado de la Planta ya que el existente estaba contaminado, mismo que es compactado con el compactador tipo canguro.

Fecha: 23 de agosto del 2024
clima: soleado
Personal: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de obra, 1 operador de maquinaria
equipos: Herramienta menor, compactador tipo canguro, mezcladora de concreto, martillo demoledor.
Maquinaria: 1 Pajarita
Actividades: El contratista continua con el armado de acero de refuerzo para bordillos, vigas riostras y Parrillas, suministro de agregados Pétreos, se avanza con la excavación para alcantarillas, y se procede a demoler algunas rocas que se encontraban obstaculizando la vía y el descole de una de las alcantarillas.

Fecha: 24 de agosto del 2024

clima: soleado

Personal: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de obra, 1 operador de maquinaria

Equipos: Herramienta menor, compactador tipo canguro, mezcladora de concreto, martillo demoledor.

Maquinaria: 1 Pajanta

Actividades: el contratista continua con el armado de acero de refuerzo Para bordillos, viga riostras y parrillas, suministro de agregados Pétreos, se avanza con la excavación para alcantarillas, instalación de sdado, e instalación de 6 tubos de concreto, relleno con material seleccionado de la planta ya que el existente estaba contaminado mismo que es compactado con el compactador tipo canguro.

Rs. Interventoria

Fecha: 26 de agosto del 2024

clima: soleado

Personal: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de obra.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora de concreto

Maquinaria:

Actividades: El Contratista continua con el armado de acero de refuerzo Para bordillos, viga riostras y Parrillas, asi como el acero correspondiente Para los alcantarillas.

Rs Interventoria

Fecha: 27 de agosto del 2024

clima= soleado

Personal: 1 residente de dora, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de dora, 1 operador de maquinaria.

Equipos= Herramienta menor, mezcladora de concreto

Maquinaria: 1 Pajarita

Actividades: El contratista continua con el armado de acero de refuerzo para bordillas, vigas riostras y parrillas, se avanza con la demolición y excavación para alcantarillas, se presenta una laja en el sector donde se hace la excavación de la tercera alcantarilla, lo que impide seguir avanzando con esta excavación, asi mismo se han presentado desplazamientos de material del terreno donde se construyo la alcantarilla en el K1+663 por lo que se presenta constante flujo de agua, se retira el material contaminado y se le suministra material para que el agua filtre. Por otro lado se avanza con la instalación del acero de la alcantarilla ubicada en el K1+593, fundiendo asi el piso del tanque de la misma

Residente

Fecha: 28 de agosto del 2024

clima: soleado

Personal: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de obra, 1 operador de maquinaria.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora de concreto, taladro demoledor.

Maquinaria: 1 Pajarita

Actividades: el contratista continua con el armado de acero de refuerzo para bordillos, viga riostras y parrillas y el acero correspondiente de las alcantarillas, se procede a demoler la Laja que se encontraba en la alcantarilla ubicada en la K1+480 pero esta roca no presenta rotura, por lo cual imposibilita seguir las actividades en esta alcantarilla. en el sitio se acopian materiales pétreos.

Residente

29 de agosto del 2024

Clima: Soleado

Personal: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obra, 6 ayudantes de obra, 1 operador de maquinaria

Equipos: Herramienta menor, mezcladora de concreto, taladro demoledor.

Maquinaria: 1 Pajarito

Actividades: El contratista continua con el armado de acero de refuerzo para bordillos, viga riostras y parrillas y el acero correspondiente de las alcantarillas, se inicia con el armado y encofrado de las formaletas para las alcantarillas, asi como el vaciado de concreto de la caja de la alcantarilla ubicada en el K1+663, asi mismo se inician con la excavacion de la caja de la Placa huella.

Residente.

No interventoria

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONTRATO No : CD-FC-058-2023

CONTRATISTA : WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO CONTRATO : "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER".

INTERVENTOR : GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.
NIT: 900.916.608-4

PLAZO O DURACIÓN : TRES (03) MESES.

FECHA ACTA DE INICIO : 14 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATANTE : EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS.

Powered by CamScanner

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2024
SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO PARA EL CONTRATO CD-FC-058-2023, QUE TIENE POR OBJETO "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER"
EL PLAZO Y/O DURACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SON TRES (03) MESES.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

SABADO, 15 DE JUNIO DE 2024 AL LUNES, 24 DE JUNIO 2024
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, HA REALIZADO ENTREGA DE LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.
DURANTE ESTE PERIODO ESTE PERIODO SE HA REALIZADO ENTREGA A LOS AJUSTES Y DISEÑOS, Y, OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MARTES, 25 DE JUNIO DE 2024
EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO SOCIALIZACION AL PROYECTO, DANDO A CONOCER EL OBJETO CONTRATADO, EL VALOR, PLAZO Y/O DURACIÓN, ALCANCE FISICO, UBICACIÓN DEL ALCANCE DE OBRA.
LA COMUNIDAD ESTUVO DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LA SOCIALIZACIÓN.
EN ESTA SOCIALIZACION, HIZO PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, INVIAS, ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL SANTIAGO, COMUNIDAD AREA DE INFLUENCIA.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MIERCOLES, 26 DE JUNIO DE 2024 AL MARTES, 02 DE JULIO/24
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUA REALIZANDO ENTREGAS PARCIALES DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES, 03 DE JULIO/24
EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO SOCIALIZACION DEL PROYECTO, EN LA UBICACION DONDE SE VAN A REALIZAR LA INTERVENCIÓN.
EN ESTA SOCIALIZACIÓN HIZO PRESENCIA; CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, INVIAS, ADMINISTRACCION MUNICIPAL SANTIAGO, COMUNIDAD AREA DE INFLUENCIA.
SE DIO A CONOCER EL ALCANCE, VALOR, PLAZO DE EJECUCIÓN.
LA INTERVENTORIA HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA INMEDIATA DE LOS AJUSTES Y DISEÑOS.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

JUEVES, 04 DE JULIO DE 2024 AL MARTES, 23 DE JULIO DE 2024.
DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUA REALIZANDO ENTREGA DE LOS AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
DE LA MISMA MANERA LA INTERVENTORÍA HA SOLICITADO LA ENTREGA INMEDIATA DE LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑO, DE IGUAL MANERA EL INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MIERCOLES, 24 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CUNA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTE DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCHARGADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
SE DIO INICIO CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
SE DIO INICIO A LA COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DIAMETRO INTERNO 36" PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

JUEVES, 25 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CUNA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR.
MARUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCHARGADOR, (1) MEZCLADORA
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DIAMETRO 36" PARA OBRA DE DRENAJE TRASNVERSAL.
SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

VIERNES, 26 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL EXCAVACIÓN.
LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

SABADO, 27 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE INTERVENTORIA, INSPECTOR INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA,
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO INTERNO 36"
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.
SE REQUIERE QUE EL CONTRATISTA DE OBRA

Powered by CamScanner

AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES 04:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024.
EN EL DÍA DE HOY NO SE PRESENTO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

LUNES, 29 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE DIO CON LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CALZADA.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

MARTES, 30 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA, (1) RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCONPACTADOR, (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE CALZADA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES, 31 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) MEZCLADORA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO ACTIVIDAD DE RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIONES.
SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBBASE.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.
OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

01 AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA, (1) RESIDENTE INTERVENTORÍA, GESTOR INVIAS, DIRECTOR INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO ACTIVIDAD DE LA CONFORMACIÓN DE CALZADA.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE REALIZO RECORRIDO EN EL PROYECTO, CON GESTOR TECNICO INVIAS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES, 02 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO: (1) MOTONIVELADORA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN

Powered by CamScanner

DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

SABADO, 03 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE.
SE TERMINARON LABORES A LAS 04:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

DOMINGO, 04 DE AGOSTO DE 2024.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE PRESENTO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

LUNES, 05 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO, PRECIPITACIONES EN LA TARDE.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR

Powered by CamScanner

MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE PRESENTARON PRECIPITACIONES DESDE LAS 02:00 P.M. HASTA LAS 07:00 P.M.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.
SE DIO INICIO AL FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MARTES, 06 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) INSPECTOR INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MEZCLADORA.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA,

Powered by CamScanner

AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MIERCOLES, 07 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE PRESENTO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

JUEVES, 08 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) MEZCLADORA,
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

VIERNES, 09 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: PRECIPITACIONES EN HORAS DE LA MAÑANA.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, INSPECTOR INTERVENTORÍA, RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) MEZCLADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.
SE ESTA REALIZANDO CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.
DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE REALIZO COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR
SE TERMINARON LABORES A LAS OCHO P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

SABADO, 10 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.
SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14MPA - CONCRETO DE LIMPIEZA PARA CAJA ENTOCE Y CAJA DESCOLE.
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA EN ARAS DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUL
SE TERMINARON LABORES A LAS 04:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

DOMINGO, 11 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE REPORTA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

LUNES, 12 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MARTES, 13 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, RESIDENTE INTERVENTORÍA, (1) INSPECTOR INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE

Powered by CamScanner

CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21MPa - PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL,
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MIERCOLES, 14 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, INSPECTOR INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) MOTONIVELADORA, (1) VIBROCOMPACTADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
DE LA MISMA SE CONTINUA EJECUTANDO ACTIVIDAD DE CONCRETO 21MPa PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

JUEVES, 15 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES

Powered by CamScanner

DE OBRA, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA, RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARÍA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE TRASVERSAL.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA OBRAS DE DRENAJE TRASVERSAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

VIERNES, 16 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) AYUDANTES DE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, INSPECTOR INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

SABADO, 17 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (10) AYUDANTES DE OBRA, INSPECTOR INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.

Powered by CamScanner

HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21MPA, PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO TOMA DE DENSIDADES AL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.
SE TERMINARON LABORES A LAS 04:00 P.M

OSCAR MAURICIO GARCÍA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

DOMINGO, 18 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE REPORTA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

LUNES, 19 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE REPORTA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MARTES, 20 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (2) OFICIALES, (10) AYUDANTES, INSPECTOR INTERVENTORIA, RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M
EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES

Powered by CamScanner

VARIAS.
SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE LA MISMA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 03:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MIERCOLES, 21 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (2) OFICIALES, (10) AYUDANTES DE OBRA, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA, (1) RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
EN EL DÍA DE HOY SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - MEZCLA PARA VIGAS RIOSTRAS, HUELLAS Y CUNETAS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

JUEVES, 22 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (2) OFICIALES, (10) AYUDANTES DE OBRA, (1) INSPECTOR INTERVENTORIA, (1) RESIDENTE INTERVENTORIA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.

Powered by CamScanner

EN EL DÍA DE HOY, SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 14MPA - MEZCLA PARA PIEDRA PEGADA.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA.
LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA,

MAGRNES, 23 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO, EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTARON PRECIPITACION EN EL SECTOR IMPOSIBILITANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (1) OFICIAL, (10) AYUDANTES DE OBRA, (1) INSPECTOR INTERVENTORIA, (1) RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO, 24 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (1) OFICIAL, (10) AYUDANTES DE OBRA, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

(1) RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 21 MPA - MEZCLA IN SITU.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE REPORTA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

LUNES, 26 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (1) OFICIAL, (10) AYUDANTES DE OBRA, (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA, (1) RESIDENTE INTERVENTORÍA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (2) MEZCLADORAS.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA - MEZCLA IN SITU.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MARTES, 27 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: Nublado con lluvias moderadas en

Powered by CamScanner

la tarde
Personal de obra = 1 residente, 1 maestro general, 2 oficiales 12. obreros, .
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ing inspect
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras tipo trompo, herram 1a menor
Actividades en obra = El contratista de obra continua realizando la instalacion del acero de refuerzo para elementos estructurales de la placa huella en la zona de los huellas, bordillos y cenefas, por otra parte se realiza vaciado de concreto de 21 mpa en huellas y se realiza vaciado de concreto de 14MPA con instalacion de piedra rodonda (concreto ciclopleo) por obra parte interventoria realiza chequeo de medidas y especificaciones tecnicas a si como se evidencian las acopios de materiales petreos
OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Miercoles 28 de agosto de 2024
Estado del clima = Soleado, nubado y con precipitaciones en la tarde.
Personal de obra = 1 residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales 12 obreros
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras de concreto, tipo trompo, herramienta menor
Actividades en obra = El contratista de obra continua realizando vaciado de concreto de 21 MPA y realiza excavaciones manuales de vigas riostras asi como se realiza la instalacion del acero respectivo por otra parte interventoria continua realizando los chequeos de los medidas y los longitudes de los elementos ya construidos
OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Jueves 29 de agosto de 2024.
Estado del clima: Nubado con precipitaciones moderadas parcialmente.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 12 ayudantes.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente 1 ingeniero inspector.
Maquinaria en obra: 2 mezcladores de concreto de capacidad de 1 bulto, tipo trompo, herramienta menor.
Actividades realizadas en obra: El contratista de obra continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA y continua realizando el vaciado de concreto de 14 MPA (ciclopeo) a si mismo continua con el figurado, armado e instalación del acero de refuerzo y se realiza el desencofrado de los formaletas del anden de la alcantarilla N. 1. por otra parte el inspector de interventoria realiza las respectivas chequeos y mediciones de los cantidades del acero instalado y concreto de elementos construidos

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Viernes 30 de agosto de 2024
Estado del clima: Nubado con precipitaciones moderadas parcialmente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra 2 oficiales, 12 ayudantes.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Maquinaria en obra: 2 mezcladores de concreto de capacidad de un bulto, herramienta menor
Actividades en obra: El contratista de obra continua realizando el vaciado de concreto de refuerzo de 21 MPA o 3000 PSI, 4D por otra parte realiza el resanteo de la llegada de los cunetas al anden de la alcantarilla y el cual formaletean e instala el acero de los bordillos y los cunetas por otra parte se continuan realizando excavaciones de bordillos

y vaciado de concreto con piedra rodonda para concreto de 14 MPA (ciclopeo) a si mismo se realiza el instalado de acero transversal para el anclaje de la alcantarilla No 2 con la placa ya vaciada, por otra parte el interventor revisa y evidencia el avance de la ejecución y los elementos construidos revisando y midiendo los elementos con el fin de verificar (Vo) que cumplan con las medidas correctas por último se realizan acopios de material petreo. arena, triturado, cemento y se toman muestras del concreto por parte del interventor y contratista.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 31 de agosto de 2024
Estado del clima = Soleado, parcialmente nublado
Personal de obra = 1 residente de obra, 1 maestro general, 2 oficiales, 12 ayudantes
Personal de interventoria = 1 ingeniero inspector, 1 ingeniero residente.
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de (sic) 1 bulto,
Actividades ejecutadas en obra = El contratista de obra realiza el vaciado de concreto de 21 MPA en huellas a si como en bordillos por otra parte se evidencia la instalación de la formaleta del anclaje de la alcantarilla No 2 asi como posteriormente se realizo el vaciado de concreto para la misma, a demas se continuan realizando excavaciones manuales en bordillos y vigas muertas como la instalación de acero respectivamente por otra parte el interventor evidencia el uso de los implementos de protección SST del personal de obra a si mismo se realiza el chequeo de medidas y forma de muestras por parte del contratista con respecto al concreto de 21 MPA

OSCAR MAURICIO GARCIA.
