INFORME No. 01 Y FINAL
DEL 04/12/2024 AL 17/01/2025

IMPLEMENTSACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, COMO MECANISMO Y CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES DECEMBRINAS, FOMENTO TURISTICO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA



PRESENTADO POR:
LOGISTICA Y MONTAJES SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

JOSE MIGUEL SAENZ SIERRA
RESIDENTE OBRA

Puerto Berrio, 20 de enero de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de obra civil suscrito tubo como fecha de inicio el 04 de diciembre de 2024, pero desde el día en que nuestra empresa supo que íbamos a ser adjudicatarios del presente contrato (29/11/2024), se empezó a laborar al interior de nuestras bodegas en el diseño, armado y construcción de las figuras navideñas que harían parte del alumbrado navideño, con el fin de que una vez contáramos con el acta de inicio formal del presente contrato, nuestro personal se desplazaría a campo para desarrollar las actividades de instalación del alumbrado navideño en al zona urbana del municipio de Puerto Berrío – Antioquia, en los lugares que ha bien designó la Administración Municipal de Puerto Berrío.

Los lugares a intervenir son los siguientes:

- Calle 50 entre carreras 7 y 13 (separador central)
- Calles 50 y 51 entre carreras 4 y 7, y las carreras 4, 5 y 7 entre calles 50 y 51 con techo de luz.
- Palacio Municipal (exterior).
- Parque Enrique Olaya Herrera y Parque Obrero.
- Ciudadela Educativa y Cultural América.
- Calle 51 entre carreras 5 y 7, con figuras navideñas de piso.
- Iglesia Nuestra Señora de los Dolores.

Las actividades de desmonte del alumbrado navideño iniciaron el día 13/01/2025 y terminaron el día 17/01/2025, resaltando que todas las actividades se desarrollaron bajo la debida supervisión y/o control de la interventoría.

Otro aspecto a resaltar es que la administración municipal de Puerto Berrío recibió la totalidad de los elementos instalados del alumbrado navideño en una bodega de su propiedad, ubicada en la carrera 8 con la calle 42, Barrio la Milla N°2 (antigua bodega de ASOLIMON).

2. CONTRATO OBRA CIVIL

2.1. Especificaciones contrato

CONTRATO No.:	149-2024
OBJETO CONTRATO:	"IMPLEMENTSACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, COMO MECANISMO Y CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES DECEMBRINAS, FOMENTO TURISTICO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA"
CONTRATANTE:	Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja- E.I.C.E.
NIT CONTRATANTE:	901.105.143-5
RPTE LEGAL:	Isabel Cristina Roldan Ospina
CONTRATISTA:	Logística y Montajes Servicios Integrales S.A.S.
NIT CONTRATISTA:	900.698.588-9
RPTE LEGAL:	Tatiana Saenz Rico,
VALOR CONTRATO:	$703.926.177.
PLAZO EJECUCION:	Cuarenta y cinco (45) días
FECHA DE INICIO:	04/12/2024
FECHA FIN:	17/01/2025

2.2. Estado de las pólizas del contrato

A continuación, se presenta el cuadro con la póliza de seguro de cumplimiento No 520 – 47 – 994000049289 (anexo 0), y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.520 – 74 – 994000023599 (anexo 0), expedidas ambas por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia identificada con NIT 860.524.654-6, con los siguientes amparos y vigencias:

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
Cumplimiento	20%	$140.785.235.40	2024	12	03	2025	05	17
Pago Salarios y P. Sociales	10%	$70.392.617.70	2024	12	03	2028	01	17
Calidad del Bien	20%	$140.785.235.40	2024	12	03	2025	05	17
Responsabilidad Civil		$260.000.000	2024	12	03	2025	01	17

2.3. Valor actas pagadas y/o aprobadas:

A la fecha del presente informe no se ha generado Acta de cobro de obra ejecutada

2.4. Profesionales y técnicos de la obra

CARGO	NOMBRE	% DEDICACIÓN	OBSERVACIONES
Residente de obra	JOSE MIGUEL SAENZ SIERRA	100	A.N.205 - 42817
Tecnólogo SISOMA	IVAN MESA CONEO	100	S 201960038061
Almacenista	YEFERSON ESTIVEN ARIAS MUÑOZ	100	C.C. 1.035.440.906
Vigilancia nocturna	JUAN MANUEL CANO CALVO	100	C.C. 1.000.644.625

3. INFORMACIÓN PARA TRAZABILIDAD EN LA OBRA

3.1. Actividades desarrollas en el periodo de tiempo

2	OBRAS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO					VALOR CORTE 1	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VLR. UNITARIO**	CANT. CORTE 1	V/ TOTAL CORTE 1
1	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 bastones de 0,5m de alto.	CADENETA BASTONES	CADENETA 11 MT 11 BASTONES 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805
2	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 regalos de 0,5m de alto.	CADENETA REGALOS	CADENETA 11 MT 11 REGALOS 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805
3	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 campanas de 0,5m de alto.	CADENETA CAMPANAS	CADENETA 11 MT 11 CAMPANAS 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805

4	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 espirales de 0,5m de alto.	CADENETA ESPIRALES	CADENETA 11 MT 11 ESPIRALES 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805
5	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 corazones de 0,5m de alto.	CADENETA CORAZONE	CADENETA 11 MT 11 ESTRELLA 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805
6	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 asteriscos de 0,5m de alto.	CADENETA ASTERISCO	CADENETA 11 MT 11 ASTERISCO 0,5 x 0,5m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805
7	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 bolas navideñas de 0,5m de alto.	CADENETA BOLAS NAVIDEÑAS	CADENETA 11 MT 11 BOLAS 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	15	$23.222.805

8	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta por cadeneta de 11 ml, con 11 flores de 0,5m de alto.	CADENETA FLORES	CADENETA 11 MT 11 FLORES 0,5 x 0,5 m	UNIDAD	$1.548.187	16	$24.770.992
9	Instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de luz cascada cálida, caída 1 mt x 10 mt ancho, tipo Led, 110 V	LUZ CASCADA	10 x 1	UNIDAD	$676.135	56	$37.863.560
10	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Línea de bombillo pingpong, elaborada en cable dúplex, socket a prueba de intemperie, bombillo LED 1W cada 0,50 mt por 10 mt.	CADENETA PING PONG	CADENETA PINGPONG 1W CADA 0,5	UNIDAD	$ 1.096.500	60	$65.790.000
11	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	CHIVA	5 x 2.5 x 2,5 m	UNIDAD	$ 17.753.700		$ 0,00
12	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	PESEBRE	* Jose: 1m x 2m x 0,18m * Maria: 1m x 1,8m x 0,18m * Niño: 1m x 1,20m x 0,18m	JUEGO	$ 4.399.625	1	$4.399.625

13	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	VACA Y BURRO	Vaca y burro: 1,5m x 1,0m x 0,18m	UNIDAD	$1.271.200	2	$2.542.400
14	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	REY MAGO	2m x 1m x 0,18m	UNIDAD	$2.089.225	3	$6.267.675
15	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	PASTOR	2m x 1m x 0,18m	UNIDAD	$2.089.225	1	$2.089.225
16	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	OVEJAS	1,5m x 1m x 0,18m	UNIDAD	$1.271.200	3	$3.813.600

17	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	COPO DE NIEVE	1,5 x 1,5	UNIDAD	$892.045	13	$11.596.585
18	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	ESTRELLA ARABESCO	1,5 x 0,8	UNIDAD	$674.470	20	$13.489.400
19	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en estructura de hierro, pintura tipo intemperie, decorada con luces led.	REGALO GIGANTE 3D	3 m x 3m x 3,8 m	UNIDAD	$15.057.200		$ 0,00
20	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en estructura de hierro, pintura tipo intemperie, decorada con luces led.	REGALO GIGANTE 3D	1,5 x 1,5 x 1.8m	UNIDAD	$ 3.376.205		$ 0,00
21	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	TRINEO	3.5m x 1,7m x 1,2m	UNIDAD	$ 7.272.100		$ 0,00
22	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en estructura de hierro, pintura tipo intemperie, decorada con luces led.	RENO	2,3 m x 2,3m x 0,8m	UNIDAD	$ 6.471.100		$ 0,00

23	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Estructura elaborada en hierro, pintura tipo intemperie y madera inmunizada.	BANCA	1,2m x 0,6m x 0,47m	UNIDAD	$451.825	0	$ 0,00
24	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Estructura con arena, borde elaborado en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	ARENERO	3,5 m x 3,5 m x 0,9m	UNIDAD	$ 2.349.525		$ 0,00
25	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Palma sembrada en tierra abonada, en matera de barro, decorada con luces led.	MATERA PALMERA	0,4 m x 1,5m x 0,4m	UNIDAD	$486.625	0	$ 0,00
26	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Estructura en hierro, forrado de guirnalda verde, más 50 figura plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	ARBOL NAVIDAD + 50 ESTRELLAS 50X50 (cm)	8 mt	UNIDAD	$21.992.200	1	$21.992.200
27	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	TREN	1,6m x 2,2 m x 0,18m	UNIDAD	$ 2.089.225	1	$2.089.225,00

28	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	CABALLO DE MADERA	1,4m x 1,4m x 0,18m	UNIDAD	$ 2.089.225	1	$2.089.225
29	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	CARRITO	1,6m x 1,2m x 0,18m	UNIDAD	$ 2.089.225	1	$2.089.225
31	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	OSO PELUCHE	1,2m x 1,6m x 0,18m	UNIDAD	$ 2.089.225	1	$2.089.225
32	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura volumétrica (Gruesa 2 caras), elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	PELOTA	Diámetro 1,4m x 0,18m	UNIDAD	$ 2.089.225	1	$2.089.225
33	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	CADENETA PECES	CADENETA 11 MT 15 PECES 0,5 x 0,5m	UNIDAD	$1.548.187	10	$15.481.870

34	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	ARBOL CAPAS	2,4m x 2,8m x 2,4m	UNIDAD	$ 4.225.575	5	$21.127.875
35	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	CAMPANAS MOÑO	1,2m x 1,5m	UNIDAD	$682.845	15	$10.242.675
36	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	COPO DE NIEVE	1m de diámetro	UNIDAD	$595.400	17	$10.121.800
37	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	ASTERISCO	0,8m de diámetro	UNIDAD	$352.400	16	$5.638.400
38	Instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Manguera tipo LED diámetro 9mm, 2 vías, 110v, la cual se instalará desde la cúpula de la Iglesia nuestra señora de los Dolores (a una altura de 30m aproximadamente), hasta entregar en un poste de altura 4m.	MANGUERA LED	1MT	ML	$18.135	986	$17.881.110

39	Instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Luz lluvia cálida, caída 0.6 mt x 6 mt ancho, tipo Led, 110 V, INSTALADA	LUZ LLUVIA	6 m x 0.8m	UNIDAD	$278.140	20	$5.562.800
	OBRAS EXTRAS						
O.E. 1	Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figuras plana, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led mono color, luz fija, la cual está compuesta (tipo vegetación marina (alga), altura H= 0,5m, ancho B=0,5m.			UNIDAD	$123.981	65	$8.058.765
O.E. 2	Instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de reflector LED MULTICOLOR IP 65, 200 W, en piso.			UNIDAD	$663.740	21	$13.938.540
O.E. 3	Ajuste Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led, decorada con tela sintética.	CHIVA	5 x 2.5 x 2,5 m	UNIDAD	$14.499.460	1	$14.499.460
O.E. 4	Ajuste Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en estructura de hierro, pintura tipo intemperie, decorada con luces led.	REGALO GIGANTE 3D	3 m x 3m x 3,8 m	UNIDAD	$11.471.640	1	$11.471.640

O.E. 5	Ajuste Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en estructura de hierro, pintura tipo intemperie, decorada con luces led.	REGALO GIGANTE 3D	1,5 x 1,5 x 1.8m	UNIDAD	$ 2.566.925	2	$5.133.850
O.E. 6	Ajuste Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	TRINEO	3.5m x 1,7m x 1,2m	UNIDAD	$ 5.114.490	1	$5.114.490
O.E. 7	Ajuste Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Figura 3D, elaborada en estructura de hierro, pintura tipo intemperie, decorada con luces led.	RENO	2,3 m x 2,3m x 0,8m	UNIDAD	$ 4.978.680	3	$14.936.040
O.E. 8	Ajuste Fabricación, instalación, mantenimiento, desmonte, embalaje y entrega en el almacén municipal de Estructura con arena, borde elaborado en varilla de 5,5 mm, pintura tipo intemperie, delineada con manguera led.	ARENERO	3,5 m x 3,5 m x 0,9m	UNIDAD	$ 2.701.835	1	$2.701.835
VALOR COSTO DIRECTO							$529.532.172
VALOR COSTO ADMINISTRACIÓN				**25,69%**			$136.036.815
VALOR COSTO UTILIDAD				**5,00%**			$26.476.609
COSTO TOTAL DE LA OBRA							$692.045.596
POLIZAS (0,5%)				**0,50%**			$1.366.822
VALOR TOTAL OBRA + POLIZAS:							$693.412.418
VALOR TOTAL OBRAS + POLIZAS (OBRA):							**$693.412.418**

3.2. Análisis comparativo Obra programada y obra ejecutada

Porcentaje programado de montaje y puesta en marcha del alumbrado navideño al 08/12/2024 100%

Porcentaje ejecutado de montaje y puesta en marcha del alumbrado navideño al 08/12/2024: 100%

Porcentaje ejecutado de desmonte y entrega en bodega municipal 17/01/2025 100%

Porcentaje adelanto o atraso en Obra 0%

A la fecha del presente informe no se ha generado Actas de cobro de obra ejecutada.

3.3. Balance obra extra y adicional

A la fecha del presente informe se requirió desarrollar un acta de cambio de obra adicional y extra N°1, el día 06/12/2024, lo anterior obedeció a la necesidad establecida por parte del ente municipal de ajustar los espacios requeridos para goce y disfrute de la comunidad de los espacios de equipamiento municipal objeto de desarrollo del presente contrato, en donde se resaltó la necesidad de incluir 2 items de obra extra, y ajustar en cantidades de materiales a instalar 6 items contractuales, los cuales fueron debidamente revisados y avalados por parte de la firma interventora.

3.4. Registro fotográfico




















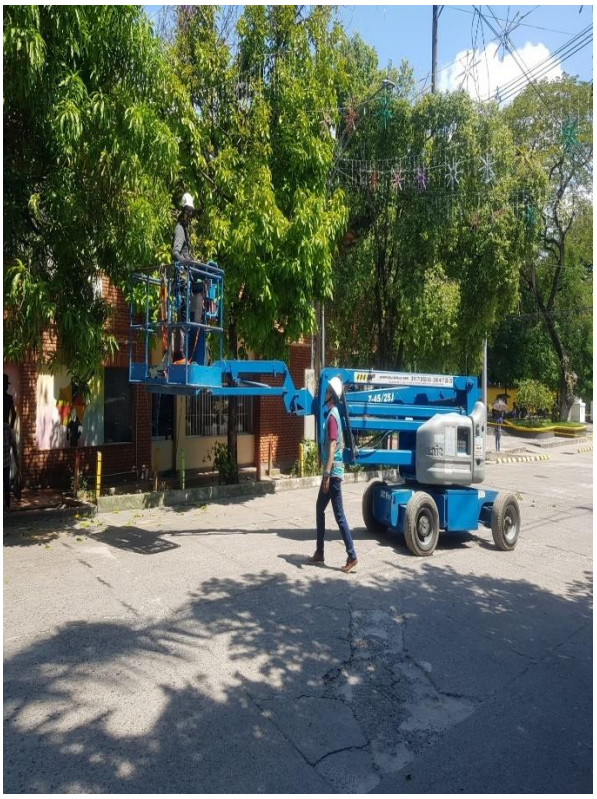


UP617























EN FUNCIONAMIENTO

















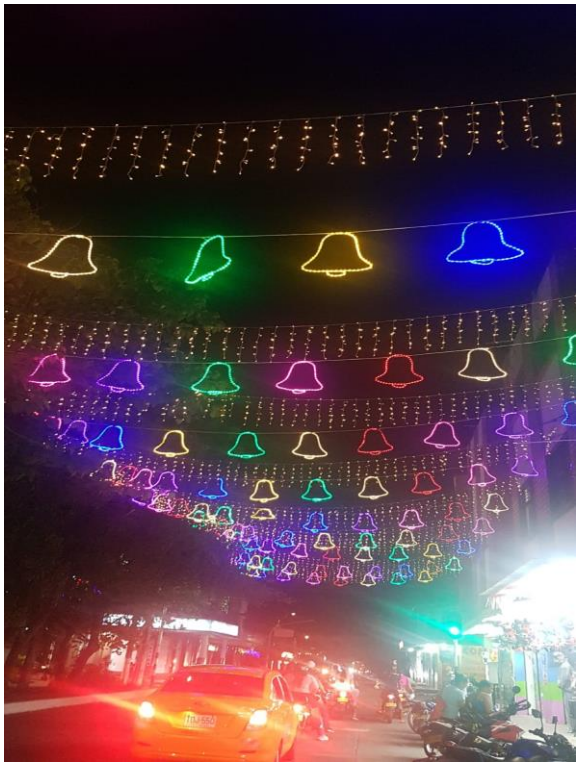

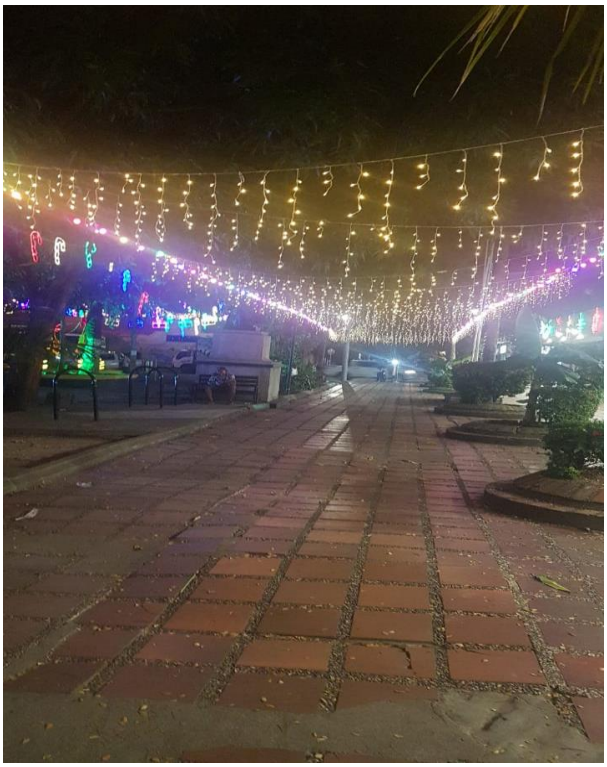














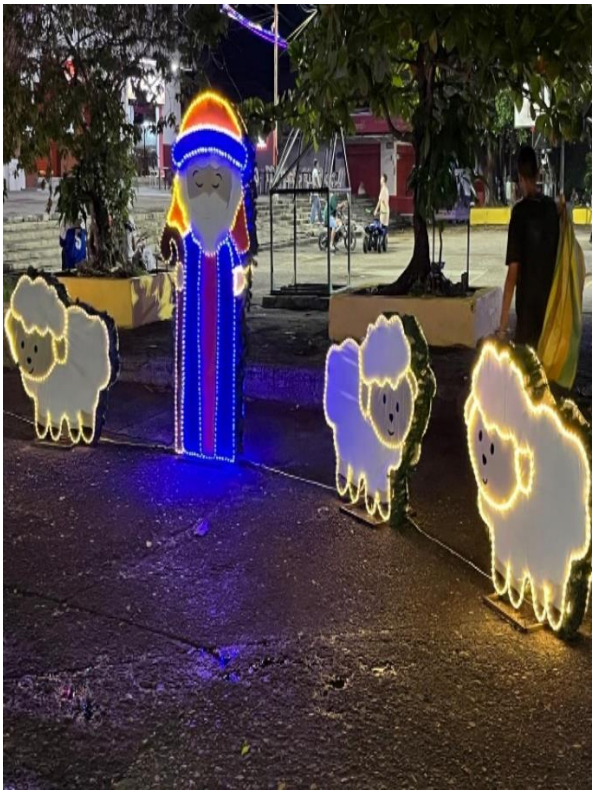

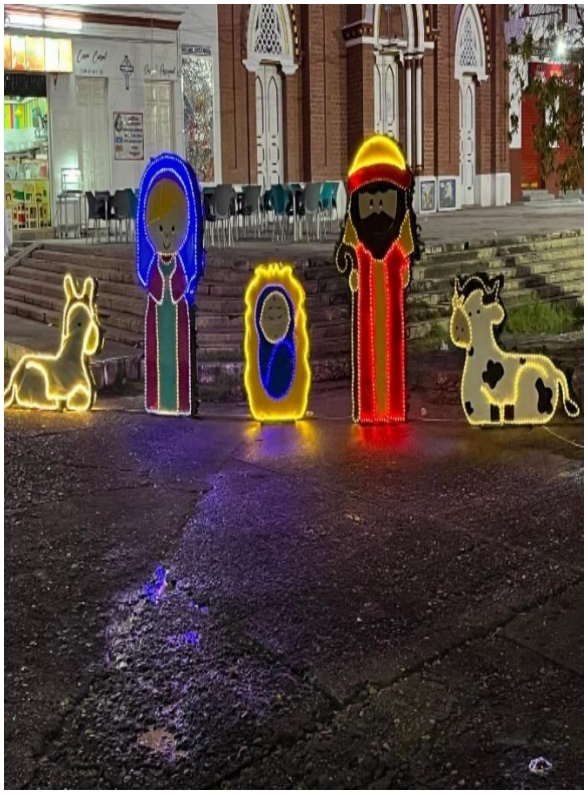





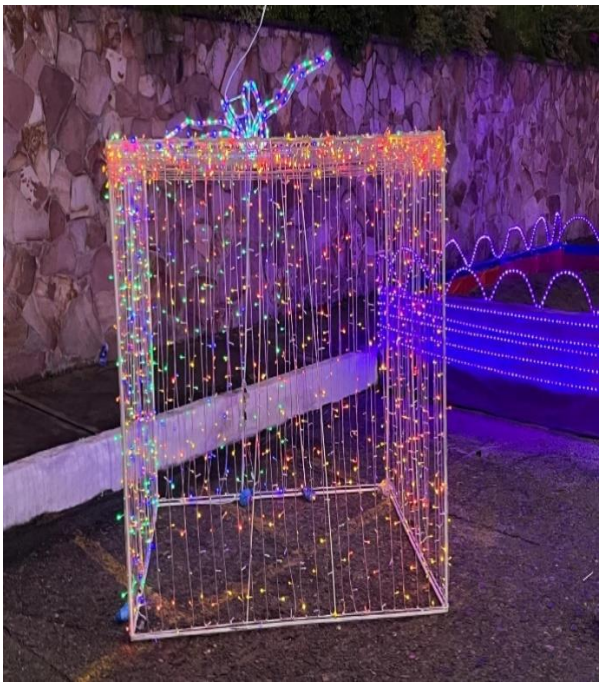















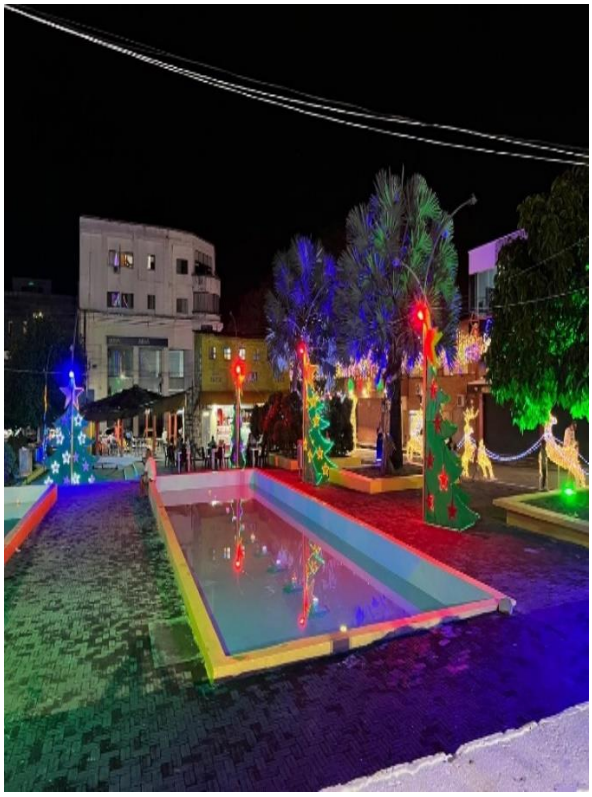








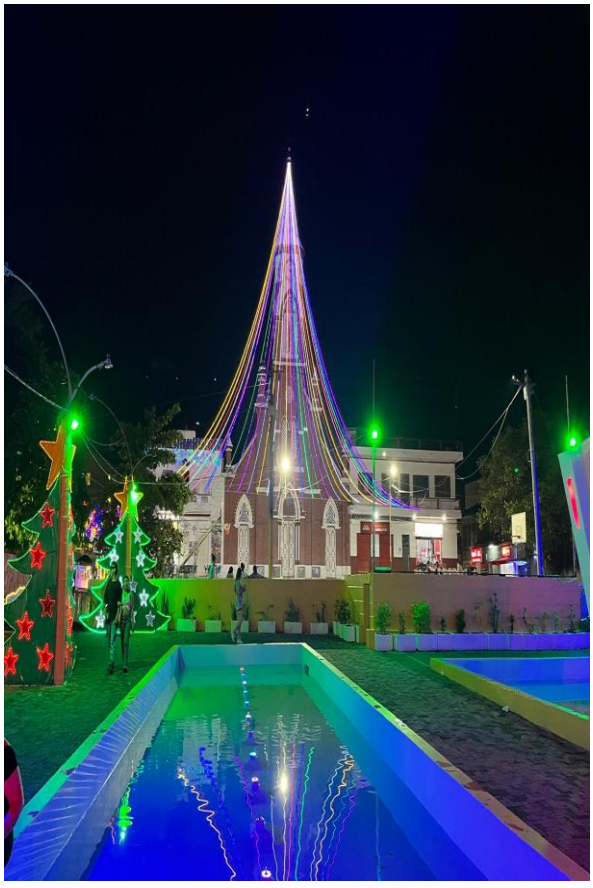



REGISTRO FOTOGRAFICO DESMONTE Y ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL



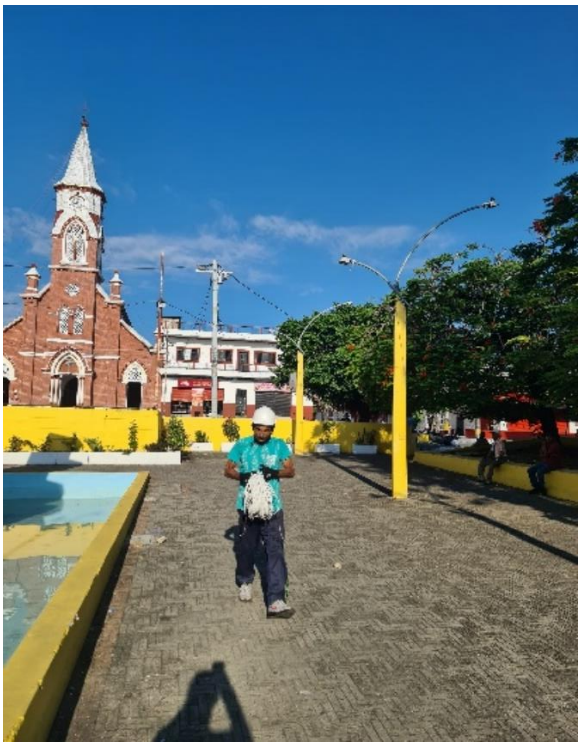



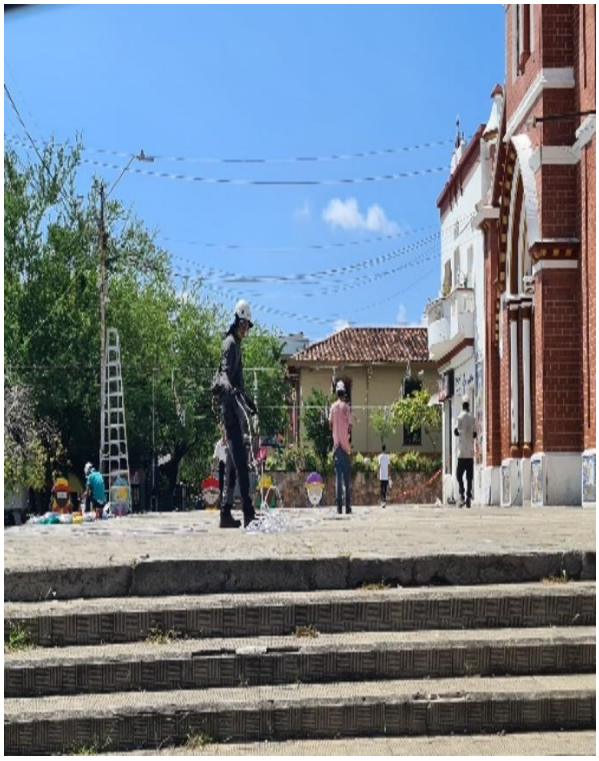

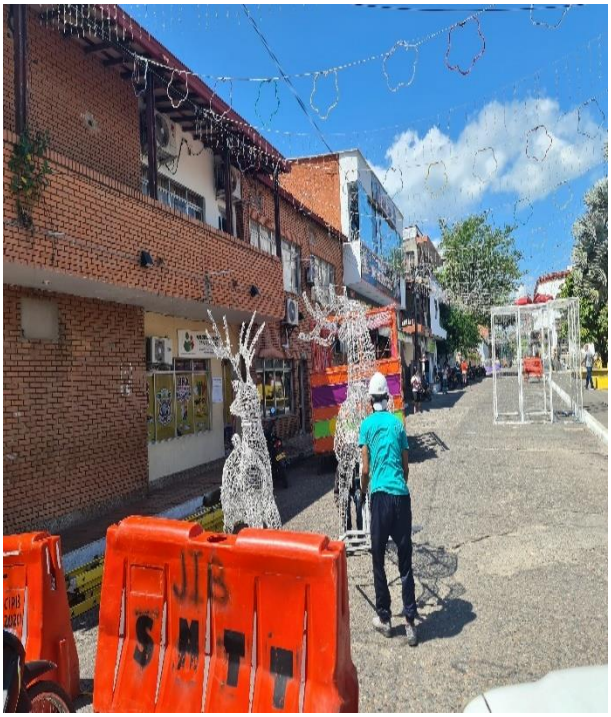
SMT

















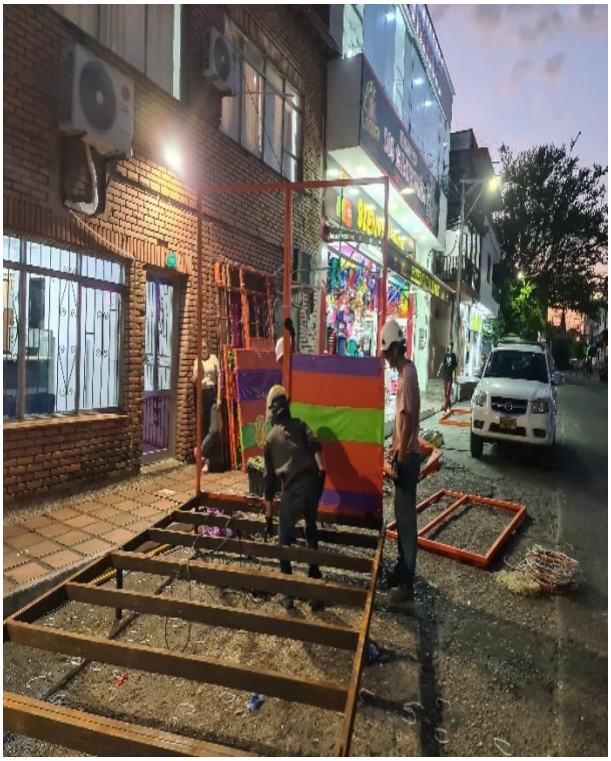




comisaria

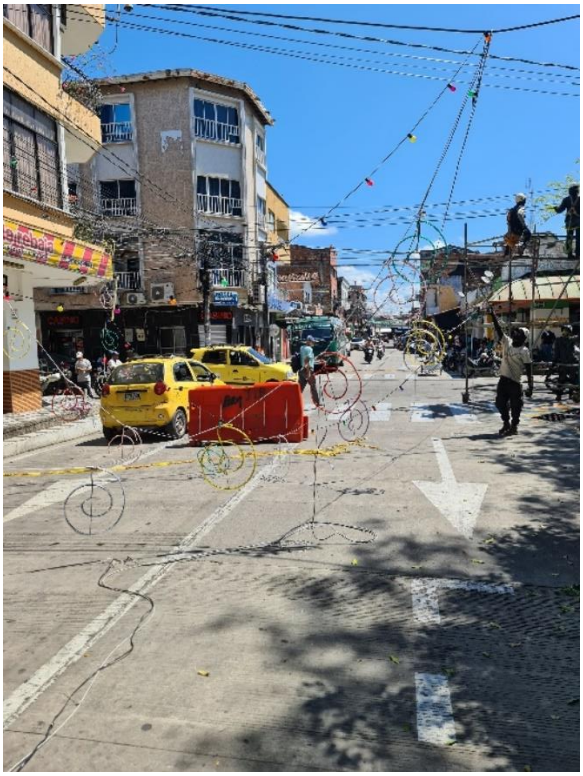














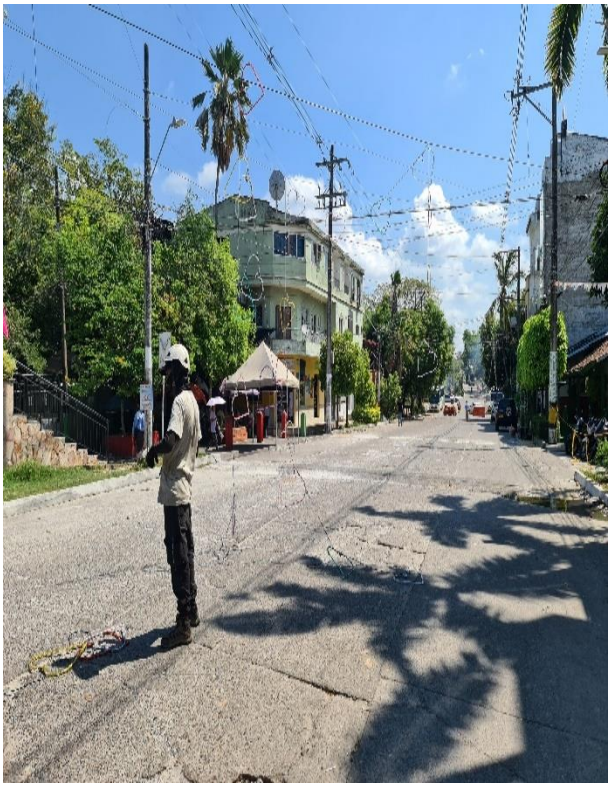




éxito


















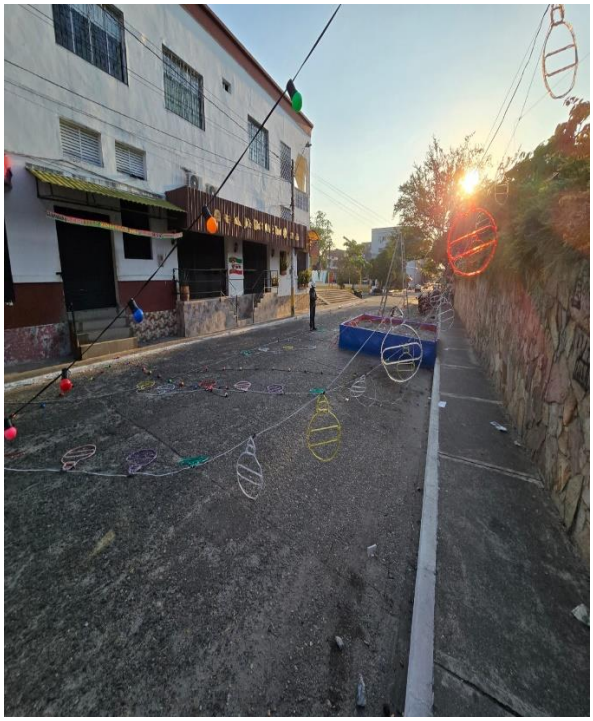

ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL












TORNO
FRESADORA
SOLDADURA
PRENSA HIDRÁULICA 90
CEL: 311 634 5406








Iglesia Cristiana











3.5. Actas de vecindad

No se requirió el desarrollo de las mismas, ya que las intervenciones se desarrollaron en zonas de espacio público y equipamiento municipal.

4. MANEJO AMBIENTAL

4.1. Quejas y reclamos presentada por la comunidad

Hasta la fecha no se han recibido quejas y/o reclamos por el desarrollo de la obra, ni tampoco en el ente municipal.

4.2. Accidentes de los trabajadores:

En el desarrollo de las actividades de ensamble, montaje y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño, no se presentaron accidentes laborales.

4.3. Verificación de la inversión ambiental

Cumplimiento de la inversión ambiental

ACTIVIDAD	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
1. Información de divulgación	x		Se realizaron las reuniones de socialización e información del proyecto con el personal que participó en el desarrollo de la obra, sin ningún contratiempo.
2. Manejo de residuos sólidos	x		Se dispuso de lugares y recipientes para el acopio, recolección y disposición final con la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios responsable del servicio de aseo, que para el caso concreto es la empresa AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P.
3. Señalización	x		Durante el desarrollo de las actividades de ensamble y montaje de las figuras navideñas, se demarcó las zonas de trabajo, de acopio y de tránsito para el normal y correcto desarrollo del presente contrato.
4. **Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional**	x		Durante el desarrollo de las actividades de traslado y montaje del alumbrado navideño se desarrollaron las siguientes actividades: • Señalización y cierres totales de vías. • Acompañamiento de los agentes de tránsito para el cierre de vías. • Se contó con los elementos de protección persona y de seguridad y salud en el trabajo como: guates, cascos, gafas, arnés, de seguridad, Andamio multidireccionales, equipo de MANLIFE, entre otros.
4.3 Transporte de Materiales y Equipos	x		Para el transporte de las figuras navideñas al lugar de instalación se dispuso de una camioneta 4 x 4 y 4 moto carguero.
4.4 Elementos de Protección Personal - EPP	x		En lo relacionado con dotación de seguridad, tapones oídos, tapabocas, guante entre otros, durante el mes se suministró a todos los frentes de obra de los EPP requeridos y se lleva un registro de tal actividad
4.5 Dotación	x		Durante el desarrollo de la obra se doto al personal que labora en la misma de los elementos de protección personal como lo es la dotación básica de guantes, gafas, bluyeans, camisa, etc.

5. INFORMACION ADMINISTRATIVA

A continuación, se presenta el listado de equipos herramientas e insumos, así como el listado de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto durante el mes de septiembre de 2024.

5,1 Equipos e insumos

A continuación, se presenta un listado de los equipos en obra en los diferentes frentes en intervención durante el mes de septiembre de 2024

Equipos

- 1 Man LIFE.
- 1 Camioneta 4 x 4
- 1 Moto carguero.
- 1 Moto soldador.
- 1 Tronzadora.
- 1 Pulidora
- 1 Planta eléctricas.
- Herramienta de mano en cada frente de obra.
- 2 taladros de mano
- 1 cortadora de pavimento.
- 6 cuerpos de Andamios multidireccional

Insumos

- Cables de diferentes calibres,
- Manguera LED Luminosa de diferentes colores.
- Varilla de hierro
- Lona plástica
- Perfiles metálicos.
- Reflectores
- Extensiones LED
- ETC.

5.2 Personal operativo en obra

CARGO	NOMBRE	% DEDICACIÓN	OBSERVACIONES
Residente de obra	JOSE MIGUEL SAENZ SIERRA	100	A.N.205 - 42817
Tecnólogo SISOMA	IVAN MESA CONEO	100	S 201960038061
Almacenista	YEFERSON ESTIVEN ARIAS MUÑOZ	100	C.C. 1.035.440.906
Vigilancia nocturna	JUAN MANUEL CANO CALVO	100	C.C. 1.000.644.625
Coordinador de alturas	TATIANA RICO SÁENZ	100	C.C. 1.128.267.068
Operador Man Lift – Trabajador certificado en alturas	JAIRO ALONSO RICO SÁENZ	100	C.C. 1.037.589.120
Trabajador certificado en alturas	NIDIER DE JESÚS SILVA RIVERA	100	C.C. 1.017.137.248
Ayudante de seguridad	JUAN JOSE OSORIO ROJAS	100	C.C. 1.036.689.188
Ayudante de seguridad	YUDY ANDREA RAMOS LAVERDE	100	C.C. 1.037.946.093
Ayudante de seguridad	BRANDON HERNANDEZ GOMEZ	100	C.C. 1.033.488.433

JOSE MIGUEL SAENZ SIERRA
Ingeniero Residente Electricista de Obra

IVAN MESA CONEO
Tecnólogo SISOMA
