INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.º 2314 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA.

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN AGOSTO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Calle 1 No. 3 -97 Tipacoque-B		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		$0.00
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**HERNANDO DE JESÚS PÉREZ**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Hernando De Jesús Pérez	21/07/2023	30/09/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Héctor Iván Ayala Dueñas	20/02/2023	30/06/2023
	Norman Eduardo Ortiz Tobar	27/12/2022	19/02/2023
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO	**CRISTIAN FERNANDO PÉREZ ACOSTA**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Cristian Fernando Pérez Acosta	04/01/2024	ACTUAL
	Rodrigo salcedo corredor	28/12/2022	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No 169522, con rubro de afectación presupuestal A03- 03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	22/12/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	radicado No. 2-2022060095 con cargo al cupo de aprobación de vigencias futuras	14/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 3522682-4	FECHA INICIAL:	FECHA VENCIMIENTO:

		27-DIC-2022	01 -MAY-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	**28 DE DICIEMBRE DE 2022**		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: 07/09/2023
	PRORROGA N°01		FECHA: 25/07/2023
	PRORROGA N°02		FECHA: 07/09/2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION N° 01		FECHA: 23/04/2024
	REINICIO N° 01		FECHA: 24/06/2024
	SUSPENSION N° 02		FECHA: 25/06/2024
	REINICIO N° 02		FECHA: 25/07/2024
	SUSPENSION N° 03		FECHA: 26/07/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°01 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 23/08/2024
	REINICIO		FECHA: 26/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27/09/2024		
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/01/2024		
	FECHA: 01/07/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	1.323.645.000,000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$147.072.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del	NO APLICA	29/12/2022	$588.286.800,00

	acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	08/03/2024	$367.679.250,00
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	01/04/2024	$367.679.250,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro	100%	DD/MM/AAAA	$147.071.700,00

	fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.323.645.300,00**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$0,00**

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: **SURAMERICANA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522682-4	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	27/12/2022	27/01/2024
			27/12/2022	28/10/2024

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR		
LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023	***ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***		**$1.323.645.000,00**		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE,** con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		NIT: 800.099.187-6 CC: 37.444.976		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024

	(Dos meses (02)				
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:					**$1.323.645.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-101030283**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009631**
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**13/04/2023**
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**10/04/2023**

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORÍA C.M.A. No. 002 DE 2023	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"**	**$147.072.000,00**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	**GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**	CC: 88.204.293

Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$147.072.000,00**		

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-10103287**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009643**
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**14/04/2023**
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**13/04/2023**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO_2024	**SI**	**NO**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**$458.058.073,39**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**100%**

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% AVANCE DE OBRA	0,00	0,00	0,00	8.74 %	23.05 %	27.05 %	41.63 %	48.17 %	90.05 %	96.68%	98.37 %	99.31%
	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
	99.31 %	99.31 %	100,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: NUMERO 12
AVANCE: 100.00 %
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: $1.323.645.300,00
Pendiente por recibir: $147.071.700,00

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE ABRIL DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE MAYO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JUNIO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JULIO DE 2023: ACTIVIDADES

	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**

	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA

MES DE AGOSTO DE 2023: ACTIVIDADES

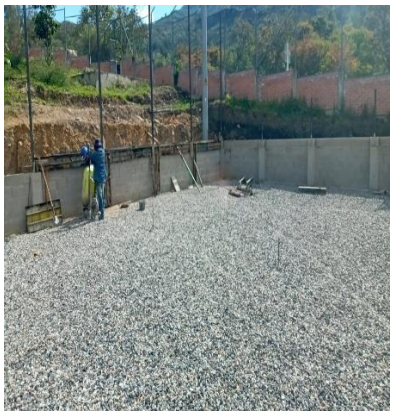
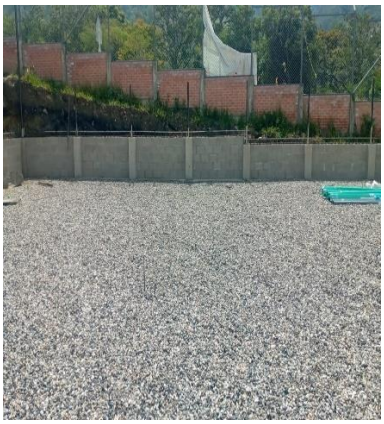
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA

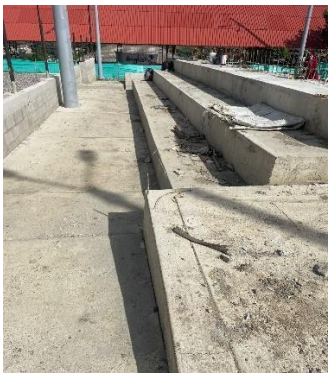
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**
	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
RELLENO GRAVILLA	**RELLENO GRAVILLA**

	
RELLENO GRAVILLA	**TUBERIA SANITARIA**
	
TUBERIA SANITARIA	**TUBERIA SANITARIA**
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**

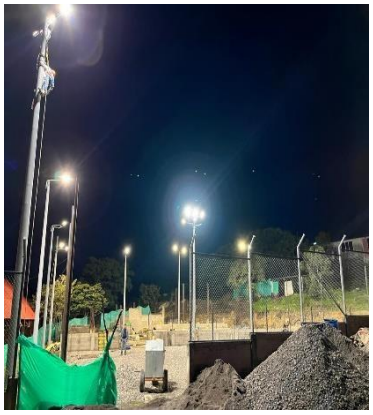
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**

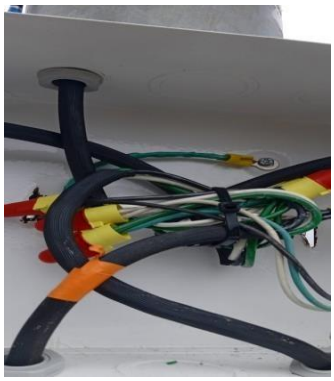
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**

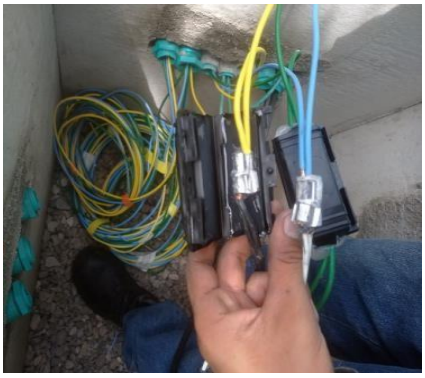
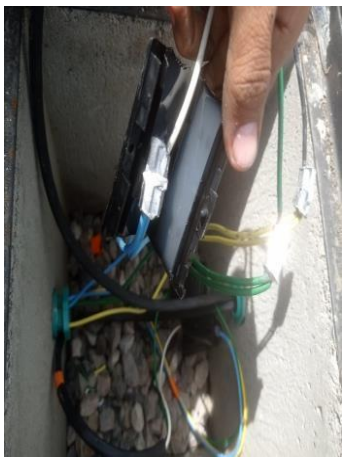
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**

MES DE OCTUBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.	**SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.**
	

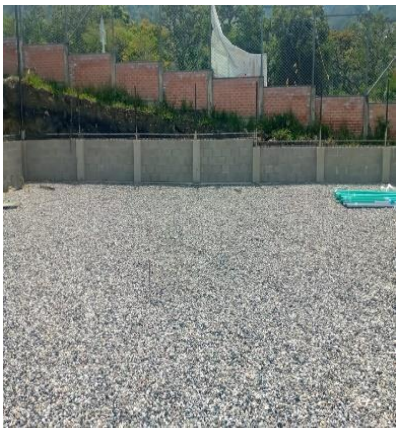
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.**
	
SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf**
	

SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET**
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).	**. ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTADO POR BT - CONCENTRICO 2X8+8 AWG**

	
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG**
	

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL
	
CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.	CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.
	
CAJA DE PASO A.L. 60x60 cm.	TUBERIA PVC DE 3/4"
	
TUBERIA PVC DE 1"	TUBERIA PVC DE 1"

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	

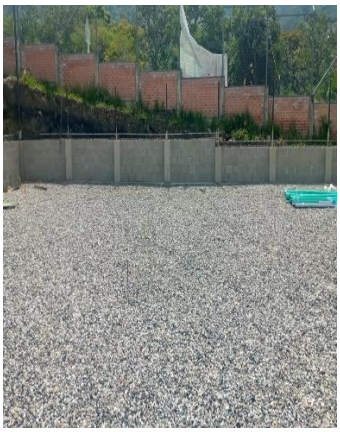
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**

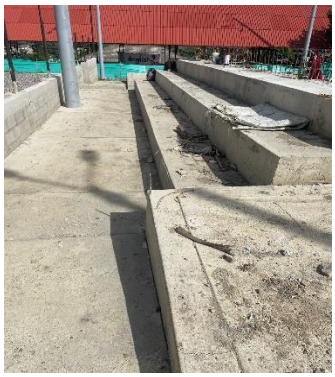
	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

MES DE NOVIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
TUBERIA PVC DE 1"	**TUBERIA PVC DE 1"**

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**

	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA CANCHA SINTETICA**

	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
MES DE DICIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES	
	

CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO	**CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA COLUMNAS DEL TEATRO	**COMPACTACION SENDERO PEATONAL**
	
INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO	**INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO**
	

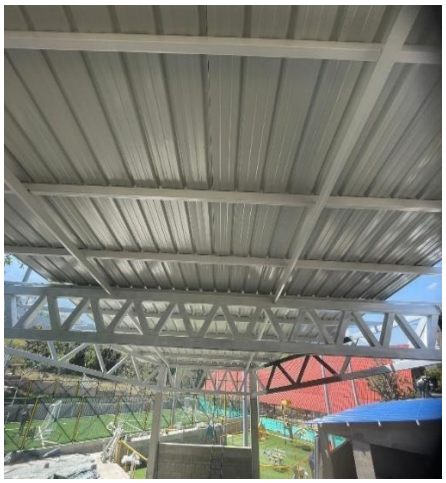
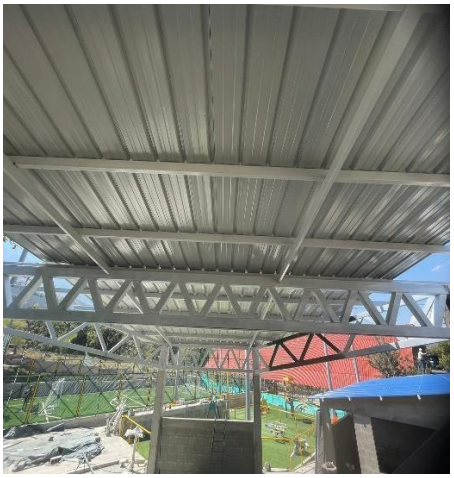
MAMPOSTERIA MURO LADRILLO SPLIT PARACAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA	**CONCRETO PARA GRADAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS	**CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS**
	
CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO	**CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO**
	

MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO**
	
VIGAS AEREAS PARA AREA DE BAÑOS, CAFETERIAY SALA COMUNITARIA	**JUEGOS INFANTILES EN EL SITIO**

MES DE FEBRERO DE 2024: ACTIVIDADES

	
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION	**SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIO CANASTA ROTOMOLDEADORA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80	**SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE SILLAS DOBLES**

	
SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**
	
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	**SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS**
	
SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS	**SUMINISTRO E INSTALACION PORTERIAS DE FUTBOL**

	
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA**
	
INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO	**INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO**
	
INSTALACION DE GRAMA PARA PAISAJISMO AREA JUEGOS	**SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80**

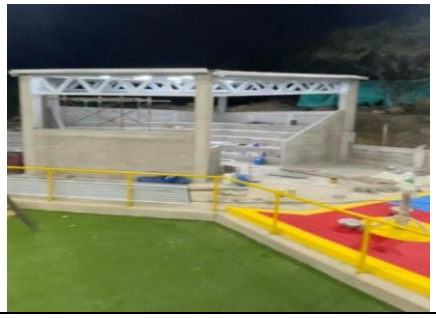
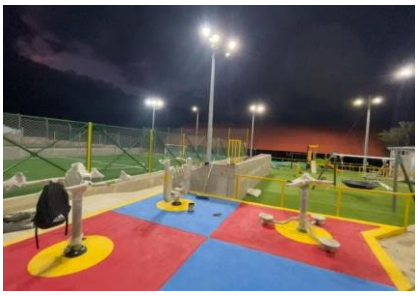
	
INSTALACION PUERTAS DE BAÑOS	**INSTALACION PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS**
	
PUERTA ACCESO BAÑO DE MJERES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"**
	
ALISTADO PISOS	**CANALETA Y BAJANTE TIPO AMAZONAS O**

	SIMILAR
	
CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA	**CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA**

MES DE MARZO DE 2024: ACTIVIDADES

	
CANCHA SINTETICA - CERRAMIENTO	**BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE**
	

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA PARQUE	SUMINISTRO E INSTALACION CANCHA
	
PLACA SACUDETE AL PARQUE	**CICLOPARQUEADERO M100**
	
CANECA TIPO M-120	**VENTANA TIPO PERSIANA- PUERTA CAFETERIA**
	

SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIO CANASTA
	
CHEQUEO DE ILUMINACION	**CHEQUEO DE ILUMINACION**

MES DE ABRIL DE 2024: SUSPENDIDO –Falta de documentación, obra culminada
MES DE MAYO DE 2024: SUSPENDIDO- Falta de documentación, obra culminada
MES DE JUNIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE JULIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE AGOSTO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada

El contrato está Ejecutado al 100%

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	20/03/2024
25/04/2024	10/05/2024	14/06/2024	23/07/2024	30/08/2024	17/09/2024
24/08/2024					

CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Supervisor del contrato
