INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.º 2314 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA.

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN OCTUBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Calle 1 No. 3 -97 Tipacoque-B		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		$0.00
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**PAHOLA ANDREA ARDILA PUERTO**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Pahola Andrea Ardila Puerto	01/10/2024	ACTUAL
	Sergio Sanjuán Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Hernando De Jesús Pérez	21/07/2023	30/09/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Héctor Iván Ayala Dueñas	20/02/2023	30/06/2023
	Norman Eduardo Ortiz Tobar	27/12/2022	19/02/2023
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO	**CRISTIAN FERNANDO PÉREZ ACOSTA**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Cristian Fernando Pérez Acosta	04/01/2024	ACTUAL
	Rodrigo salcedo corredor	28/12/2022	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No 169522, con rubro de afectación presupuestal A03- 03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	22/12/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	radicado No. 2-2022060095 con cargo al cupo de aprobación de vigencias futuras	14/12/2022	

FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 3522682-4	FECHA INICIAL: 27-DIC-2022	FECHA VENCIMIENTO: 01 -MAY-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	**28 DE DICIEMBRE DE 2022**		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: 07/09/2023
	PRORROGA N°01		FECHA: 25/07/2023
	PRORROGA N°02		FECHA: 07/09/2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION N° 01		FECHA: 23/04/2024
	REINICIO N° 01		FECHA: 24/06/2024
	SUSPENSION N° 02		FECHA: 25/06/2024
	REINICIO N° 02		FECHA: 25/07/2024
	SUSPENSION N° 03		FECHA: 26/07/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°01 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 23/08/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°02 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 25/10/2024
	REINICIO		FECHA: 25/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27/12/2024		
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/01/2024		
	FECHA: 01/07/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	1.323.645.000,000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$147.072.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	Del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	29/12/2022	$588.286.800,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	08/03/2024	$367.679.250,00
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	01/04/2024	$367.679.250,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio	100%	DD/MM/AAAA	$147.071.700,00

	designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.323.645.300,00**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$0,00**

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: **SURAMERICANA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522682-4	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	27/12/2022	27/01/2024
			27/12/2022	28/10/2024

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR		
LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023	***ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***		**$1.323.645.000,00**		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE,** con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		NIT: 800.099.187-6 CC: 37.444.976		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:					**$1.323.645.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**				
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-101030283**				
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009631**				
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**13/04/2023**				
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**10/04/2023**				

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORÍA C.M.A. No. 002 DE 2023	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"**	**$147.072.000,00**
Adicional en valor (adjuntar	DD/MM/AAAA	$ 0,00

celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
Nombre contratista	**GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**		CC: 88.204.293		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$147.072.000,00**		

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-10103287**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009643**
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**14/04/2023**
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	**13/04/2023**

EXTRACONTRACTUAL	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO_2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**$458.058.073,39**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**100%**

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% AVANCE DE OBRA	0,00	0,00	0,00	8.74 %	23.05 %	27.05 %	41.63 %	48.17 %	90.05 %	96.68%	98.37 %	99.31%
	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
	99.31 %	99.31 %	100,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: NUMERO 12
AVANCE: 100.00 %
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: $1.323.645.300,00
Pendiente por recibir: $147.071.700,00

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE ABRIL DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE MAYO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JUNIO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JULIO DE 2023: ACTIVIDADES

	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**
	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**

MES DE AGOSTO DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA

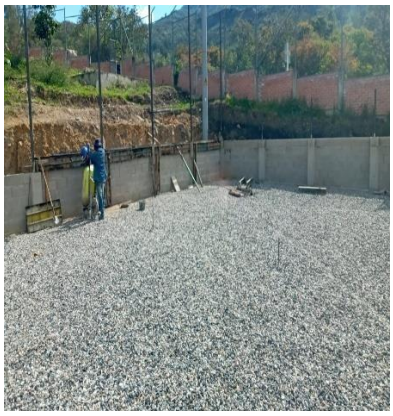
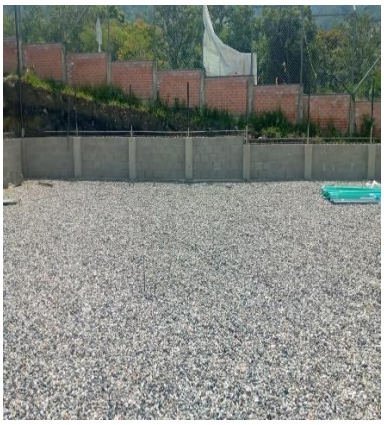
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

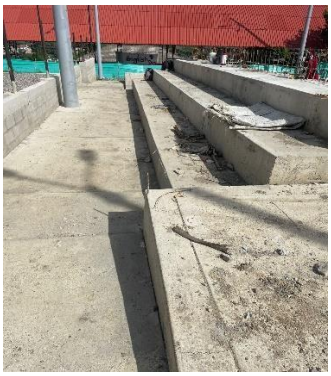
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**

	
RELLENO GRAVILLA	**RELLENO GRAVILLA**
	
RELLENO GRAVILLA	**TUBERIA SANITARIA**
	
TUBERIA SANITARIA	**TUBERIA SANITARIA**

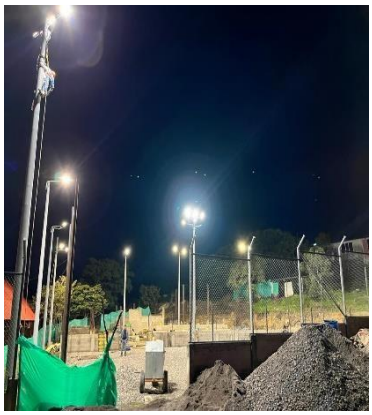
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

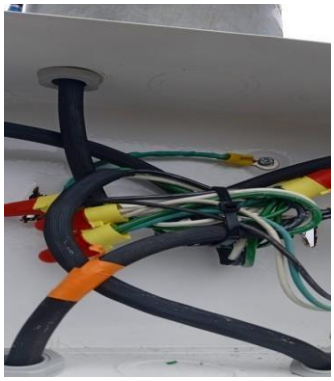
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

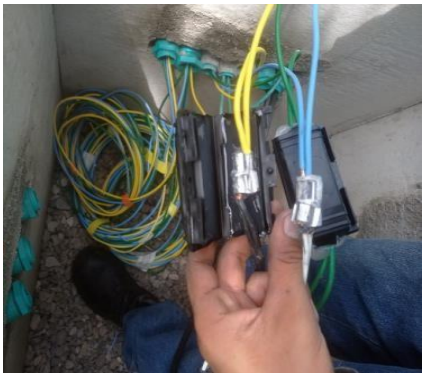
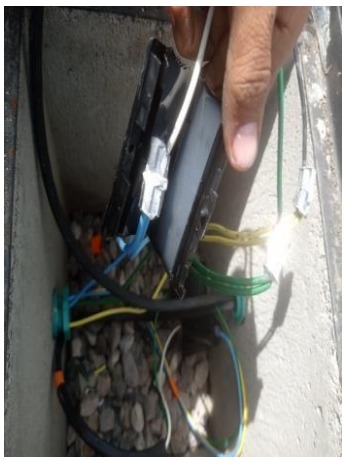
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**

MES DE OCTUBRE DE 2023: ACTIVIDADES

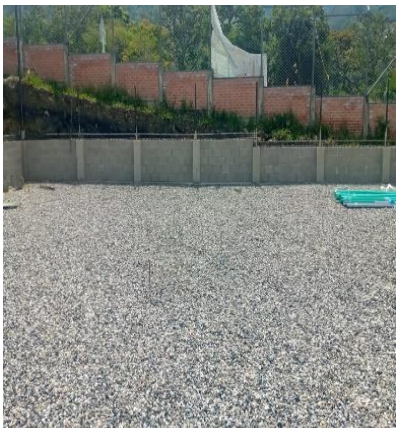
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.	**SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.**
	
SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf**

	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET**
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).	**. ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTADO POR BT - CONCENTRICO 2X8+8 AWG**

	
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG**
	

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL
	
CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.	CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.
	
CAJA DE PASO A.L. 60x60 cm.	TUBERIA PVC DE 3/4"
	
TUBERIA PVC DE 1"	TUBERIA PVC DE 1"

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	

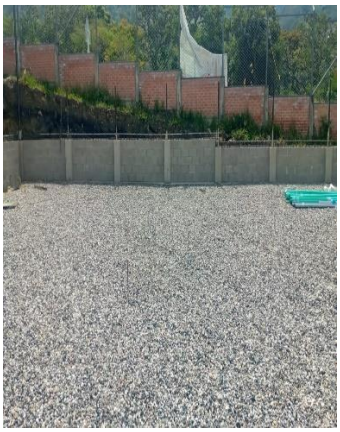
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**

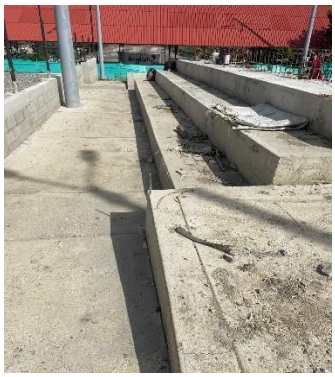
	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

MES DE NOVIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
TUBERIA PVC DE 1"	**TUBERIA PVC DE 1"**

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**

	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA CANCHA SINTETICA**

	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
MES DE DICIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES	
	

CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO	**CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA COLUMNAS DEL TEATRO	**COMPACTACION SENDERO PEATONAL**
	
INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO	**INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO**
	

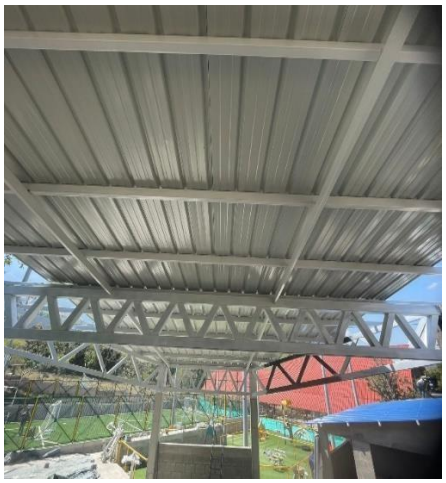
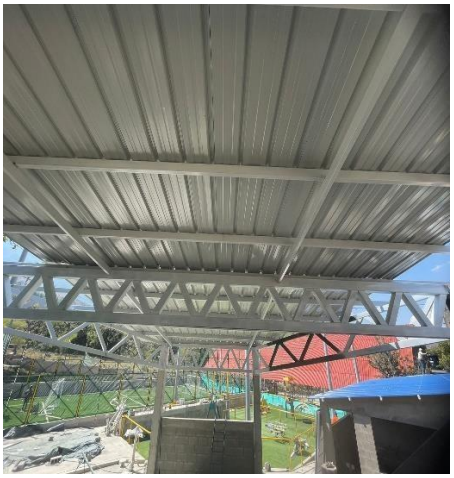
MAMPOSTERIA MURO LADRILLO SPLIT PARACAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA	**CONCRETO PARA GRADAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS	**CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS**
	
CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO	**CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO**
	

MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO**
	
VIGAS AEREAS PARA AREA DE BAÑOS, CAFETERIAY SALA COMUNITARIA	**JUEGOS INFANTILES EN EL SITIO**

MES DE FEBRERO DE 2024: ACTIVIDADES

	
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION	**SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIO CANASTA ROTOMOLDEADORA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80	**SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE SILLAS DOBLES**

	
SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**
	
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	**SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS**
	
SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS	**SUMINISTRO E INSTALACION PORTERIAS DE FUTBOL**

	
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA**
	
INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO	**INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO**
	
INSTALACION DE GRAMA PARA PAISAJISMO AREA JUEGOS	**SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80**

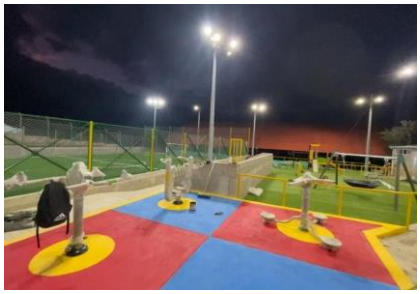
	
INSTALACION PUERTAS DE BAÑOS	**INSTALACION PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS**
	
PUERTA ACCESO BAÑO DE MJERES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"**
	
ALISTADO PISOS	**CANALETA Y BAJANTE TIPO AMAZONAS O**

	SIMILAR
	
CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA	**CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA**

MES DE MARZO DE 2024: ACTIVIDADES

	
CANCHA SINTETICA - CERRAMIENTO	**BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE**
	

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA PARQUE	SUMINISTRO E INSTALACION CANCHA
	
PLACA SACUDETE AL PARQUE	**CICLOPARQUEADERO M100**
	
CANECA TIPO M-120	**VENTANA TIPO PERSIANA- PUERTA CAFETERIA**
	

SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIOCANASTA
	
CHEQUEO DE ILUMINACION	CHEQUEO DE ILUMINACION

MES DE ABRIL DE 2024: SUSPENDIDO –Falta de documentación, obra culminada
MES DE MAYO DE 2024: SUSPENDIDO- Falta de documentación, obra culminada
MES DE JUNIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE JULIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE AGOSTO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE OCTUBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada

El contrato está Ejecutado al 100%

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	20/03/2024
25/04/2024	10/05/2024	14/06/2024	23/07/2024	30/08/2024	17/09/2024
24/08/2024	19/09/2024	18/10/2024			

CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Supervisor del contrato
