NOVIEMBRE DE 2023

																														Fecha:	30	11	2023
CONTRATO No.:	C.O No. 1507 DE 2021				**PROYECTO:**															NOVIEMBRE DE 2023												
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO																															

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	NOVIEMBRE DE 2023																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
do Martínez Tarache	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Baquero Medina Rafael Fernando	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Moreno González Armando	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Diego alexander duque Vargas	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Franco baquero **Nicolas**	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Eva Liliana Martínez Tarache	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	

DICIEMBRE DE 2023

																														Fecha:	31	12	2023
CONTRATO No.:	C.O No. 1507 DE 2021					**PROYECTO:**														DICIEMBRE DE 2023													
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO																															

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	DICIEMBRE DE 2023																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Eduardo Martínez Tarache	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Baquero Medina Rafael Fernando	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Moreno González Armando	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Diego alexander duque Vargas	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Franco baquero **Nicolas**	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Eva Liliana Martínez Tarache	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

ENERO 2024

Fecha:	31	1	2024

CONTRATO No.: C.O No. 1507 DE 2021 **PROYECTO:** ENERO DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	ENERO DE 2024																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	#	31
Eduardo Martínez Tarache		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Baquero Medina Rafael Fernando		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Moreno González Armando		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Diego alexander duque Vargas		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Franco baquero Nicolas		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Eva Liliana Martínez Tarache		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X

FEBRERO 2024

Fecha:	29	2	2024

CONTRATO No.: C.O No. 1507 DE 2021 **PROYECTO:** FEBRERO DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	FEBRERO DE 2024																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	#	31
Eduardo Martínez Tarache	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Baquero Medina Rafael Fernando	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Moreno González Armando	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Diego Alexander duque Vargas	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Franco Baquero Nicolas	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Eva Liliana Martínez Tarache	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		

MARZO 2024

Fecha: 31 | 3 | 2024

CONTRATO No.: C.O No. 1507 DE 2021 **PROYECTO:** MARZO DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	MARZO DE 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	31
Eduardo Martinez Tarache	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Baquero Medina Rafael Fernando	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Moreno González Armando	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Diego Alexander duque Vargas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Franco Baquero Nicolas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Eva Liliana Martínez Tarache	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		

ABRIL 2024

Fecha: 30 | 4 | 2024

CONTRATO No.: C.O No. 1507 DE 2021 **PROYECTO:** ABRIL DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	ABRIL DE 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	31
Eduardo martinez tarache																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Baquero Medina Rafael Fernando																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Moreno González Armando																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Diego Alexander duque Vargas																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Franco Baquero Nicolas																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Eva Liliana Martinez Tarache																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	

MAYO 2024

Fecha: 31 | 5 | 2024

CONTRATO No.: C.O No. 1507 DE 2021 **PROYECTO:** MAYO DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	MAYO DE 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	31
Eduardo Martínez Tarache		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Baquero Medina Rafael Fernando		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Moreno González Armando		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Diego Alexander duque Vargas		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Franco Baquero Nicolas		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Eva Liliana Martínez Tarache		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

JUNIO 2024

Fecha: 16 | 06 | 2024

CONTRATO No.: C.O No. 1507 DE 2021 **PROYECTO:** JUNIO DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

DISPONIBILIDAD PERSONAL

DÍA	JUNIO DE 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	31
Eduardo Martínez Tarache	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X														
Baquero Medina Rafael Fernando	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X														
Moreno González Armando	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X														
Diego Alexander duque Vargas	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X														
Franco Baquero Nicolas	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X														
Eva Liliana Martínez Tarache	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X														

2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

RELACIÓN DE ACTAS			
	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
	ACTA DE INICIO	06/12/21	Acta por la cual se inician actividades de obra
	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	07/07/22	Acta por la cual se suspende el contrato de obra
	ACTA DE REINICIO 01	15/06/23	Acta por la cual se reinicia el contrato de obra
	ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA 01	26/06/23	Por la cual se modifican cantidades de obra, se adiciona recurso y se prorroga el contrato por 5 meses.
	ACTA DE PRORROGA 02	13/12/23	Por la cual se prorroga el contrato por 3 meses
	ACTA DE SUSPENSION 02	13/03/24	Acta por la cual se suspende el contrato de obra
	ACTA DE REINICIO 02	17/04/24	Acta por la cual se reinicia el contrato de obra
	ACTA DE PRORROGA 03	17/04/24	Por la cual se prorroga el contrato por 1 mes
	MODIFICACION 02	16/05/2024	Por el cual se modifica el contrato de obra
	ACTA DE PRORROGA 4	16/05/2024	Por la cual se prorroga el contrato por 1 mes
	ACTA DE TERMINACION	16/06/2024	Por la cual se da terminación al contrato de obra
	ACTA DE RECIBO FINAL	31/10/2024	Por la cual se hace entrega a la entidad contratante de las actividades finales del proyecto terminado y en servicio.

2.1.1.1 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES (copias)

RELACIÓN DE ACTAS			
	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
	SOCIALIZACIÓN	25/11/2021	Socialización ante la comunidad
	COMITÉ DE OBRA	20/12/2021	Comité de obra en presencia de supervisión
	COMITÉ	21/12/2021	Socialización ante la veeduría de charrascal
	SEGUIMIENTO	12/01/2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	ACTA DE REUNIÓN	17/12/2021	Reunión coordinación con la EAAV
	SEGUIMIENTO	20/01/2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	21/01/2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	21/01/2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	16/02/2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	08-03-2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	31-03-2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	15-04-2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	29-04-2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	13-05-2022	Seguimientos inconvenientes de obra
	SEGUIMIENTO	26-05-2022	Seguimientos inconvenientes de obra

RELACIÓN DE ACTAS			
	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
	COMITÉ SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN	02/06/2022	comité solicitud de suspensión y/o adición a la entidad contratante
	COMITÉ	10/10/23	Verificación tramites ambientales y paga
	COMITÉ	12/10/23	Verificación componente legal cerramiento de los colegios
	COMITÉ	19/12/23	Comité realizado el sitio de la obra en compañía de la secretaria de planeación y llanogas, con la intención de revisar factibilidad de instalar red de gas natural en el sector
	SEGUIMIENTO	28/05/24	Seguimiento permisos ambientales

2.1.1.2 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO (enviada y recibida)

CORRESPONDENCIA MES 1 (06 DICIEMBRE 2021 / 05 ENERO2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
03/12/201		FISICO	SOLICITUD DE DOCUMENTACION Y ACTIVIDADES PARA INICIIO DEL CONTRATO DE OBRA	ECOBRAS S.A.
20/12/2021		FISICO	SOLICITUD INFORME TOPOGRAFICO DE GEOREFERENCIACION Y LEVANTAMIENTO VIAL INICIAL	ECOBRAS S.A.
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
03/12/201		FISICO	MAQUINARIA PARA EL PROYECTO	ECOBRAS S.A.
03/12/201		FISICO	ENTREGA DOCUMENTOS PARA ACTA DE INICIO	ECOBRAS S.A.
10/12/21		FISICO	COPIA ENTREGA DE ACTA DE INICIO CONTRATO 1507 A CORMACARENA	ECOBRAS S.A.
13/12/21		FISICO	ACOMETIDAS DE SERVICIOS PUBLICOS	ECOBRAS S.A.
22/01/21		FISICO	RESPUESTA INFORME DE GEOREFERENCIACION	ECOBRAS S.A.
22/01/21		FISICO	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS	ECOBRAS S.A.

CORRESPONDENCIA MES 2 (06 ENERO 2022 / 05 FEBRERO 2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**

14/01/22		FISICO	SOLIICUITD DE SUSPENSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
06/01/22		FISICO	TUBERIA DE GAS EN SERVIDUMBRE TGI	ECOBRAS
20/01/22		FISICO	PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS	ECOBRAS
20/01/22		FISICO	CITACION COMITÉ DE OBRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
26/01/22		FISICO	ENTREGA DISEÑO DEFICINITO EMPALME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

CORRESPONDENCIA MES 3 (06 FEBRERO 2022 / 05 MARZO 2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
22/02/2022		FISICO	SOLICITUD SUSPENSION DE OBRA E INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
21/02/2022		FISICO	SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA MES 4 (06 MARZO 2022 / 05 ABRIL 2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
10/03/2022		FISICO	ENTREGA INFORME EJECUTIVO DE CESIONES Y POSTES DE ENERGIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
11/03/2022		FISICO	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE MATERIALES A USAR	ECOBRAS
28/03/2022		FISICO	ENTREGA ACTUALIZACION DE INFORME CESIONES PREDIALES, POSTERIA, DISEÑO ESTRUCTURAL BOX COULVERT Y DISEÑO GEOMÉTRICO FINAL DE LA VIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

28/03/2022		FISICO	SOLICTUD TRAMITE DE GESTION PREDIAL SOBRE EL PROYECTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
31/03/2022		FISICO	ENTREGA INFROME HIDRAULICO ACTUALIZADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
31/03/2022		FISICO	RESPUESTA AL OFICIO 2022-0011 DEL 29 DE MARZO CUYO ASUNTO ES MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	ECOBRAS
31/03/2022		FISICO	APROBACION CONCEPTO TECNICO MEJORAMIENTO SUBRASANTE	ECOBRAS
04/04/2022		FISICO	ENTREGA DOCUMENTACION PROFESIONALES Y MAQUINARIA ECOBRAS S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
24/03/2022		FISICO	SOLICITUD ENTREGA DE RASANTE	ECOBRAS
28/03/2022		FISICO	ENSAYOS DE LABORATORIO SUBBASE GRANULAR	ECOBRAS
28/03/2022		FISICO	SOPORTE AFILIACION PERSONAL DE OBRA	ECOBRAS
29/03/2022		FISICO	MEJORAMIENTO SUBRRASANTE	ECOBRAS
29/03/2022		FISICO	INFORME ESTABILIDAD DE LADERAS	ECOBRAS
30/03/2022		FISICO	ENTREGA ENSAYOS CBR Y CONCEPTO TECNICO MEJORAMIENTO SUBRASANTE	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA MES 5 (06 ABRIL 2022 / 05 MAYO 2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
08/04/2022		FISICO	ENTREGA PLANOS DEL DISEÑO GEOMETRICO REVISADO POR LA INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
19/04/2022		FISICO	ENTREGA PLANOS DEL AREA DE CESOIONES NECESARIAS PARA TRAMITES PERTINENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
25/04/2022		EMAIL	OBSERVACIONES ENSAYOS DE LABORATORIO	ECOBRAS
28/04/2022		FISICO	RESPUESTA OFICIO FECHA 19/04/2022 CUYO ASUNTO ES: SU INFROEM RADICADOEL 28 DE MARZO DE 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/04/2022		FISICO	OBASERVACION ESTRUCTURAL ALCANTARILLADO K1+445.00	ECOBRAS
28/04/2022		FISICO	RECORDATORIO ACVTA DE COMITÉ 31 DE AMRZO DE 2022	ECOBRAS

02/05/2022		FISICO	ENTREGA INFORME DISEÑO GEOMETRICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
18/04/2022		FISICO	DISEÑO PLANTA PERFIL CORREDOR VIAL CARACOLI - CHARRASCAL	ECOBRAS
18/04/2022		FISICO	APROBACION INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES	ECOBRAS
19/04/2022		FISICO	RECODATORIO SU INFORME RADICADO EL 28 DE MARZO DE 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
20/04/2022		FISICO	TRAMO DE PRUEBA SUBBASE GRANULAR Y CANAL RECOLECTOR	ECOBRAS
21/04/2022		FISICO	RETIRO DE CERCA SWINGLEA	ECOBRAS
21/04/2022		FISICO	ENSAYOS DE LABORATORIO BASE GRANULAR	ECOBRAS
02/05/2022		FISICO	REUNION CON LA COMUNIDAD	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
04/05/2022		FISICO	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ECOBRAS
05/05/2022		FISICO	DESEQUILIBRIO ECONOMICO CONTRATO DE OBRA	ECOBRAS
04/05/2022		FISICO	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA MES 6 (06 MAYO 2022 / 05 JUNIO 2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
17/05/2022		FISICO	REMISION DE OFICIO CON RADICADO 2022-0026 "DESEQUILIBRIO ECONOMICO CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
17/05/2022		FISICO	REMISION DE OFICIO CON RADICADO 2022-0026 "DESEQUILIBRIO ECONOMICO CONTRATISTA	ECOBRAS
17/05/2022		FISICO	APROBACION MODIFICACION PMT	ECOBRAS
18/05/2022		FISICO	RETIRO DE CERCA VIVA DE SWINGLEA	ECOBRAS
18/05/2022		FISICO	INICIO DE ACTIVIDADES NUEVAS	ECOBRAS
18/05/2022		FISICO	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ECOBRAS
26/05/2022		FISICO	SOLICITUD COMITÉ TECNICO PARA TRATAR TEMA CORRESPOPNDIENTE AL ATRASO DE EJECUCION PRESENTADO EN EL PROYECTO DE LA REFERENCIA	ECOBRAS

RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
12/05/2022		FISICO	DESEQUILIBRIO ECONOMICO	ECOBRAS
12/05/2022		FISICO	MODIFICACION PMT	ECOBRAS
12/05/2022		FISICO	TRASLADO OFICIO 202200033873	
13/05/2022		FISICO	DOCUMENTACION ZODME "EL CHALECO" ENVIADO POR LA PERSONERIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
23/05/2022		FISICO	PROGRMACION DE OBRAS	ECOBRAS
02/06/2022		FISICO	APUS NUEVOS	ECOBRAS
02/06/2022		FISICO	ENTREGA PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIA Y CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO DENOMINADO LOTE PARTE HACIENDA SANTA SANTANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

CORRESPONDENCIA MES 7 (06 JUNIO 2022 / 06 JULIO 2022)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
09/06/2022		FISICO	ENTREGA DE PÓLIZAS CORREGIDAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
09/06/02022		FISICO	SOLICITUD SUSPENSIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
14/06/2022		FISICO	ENTREGA INFORMES PARA SOLICITUD SUSPENSIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/06/2022		FISICO	SOLICITUD APROVECHAMIENTO FORESTAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/06/2022		FISICO	ENTREGA DE INFORME ESTUDIO Y DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA VÍA CHARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
07/06/2022		FISICO	ENSAYOS DE LABORATORIO TIPO SUB-BASE GRANULAR CANTERA ZAFIRO	ECOBRAS
14/06/02022		FISICO	ENSAYOS DE LABORATORIO SUBBASE GRANULAR	ECOBRAS

14/06/02022		FISICO	ENTREGA PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIA Y CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO DENOMINADO RANCHO E LUNA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
17/06/2022		FISICO	ESPECIES ARBÓREAS EMSA	ECOBRAS
23/06/2022		FISICO	AJUSTE EL DISEÑO Y DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO	ECOBRAS
24/06/2022		FISICO	PARAMENTOS FINCAS EL TRUEQUE - LICAFOR – STANFORD- NN	ECOBRAS
24/06/2022		FISICO	PERMISOS DE PREDIOS PARA DISPONER MATERIAL DE EXCAVACIÓN	ECOBRAS
28/06/2022		FISICO	ESTADO DE LA VÍA ACCESO CHARRASCAL	ECOBRAS
01/07/2022		FISICO	DOCUMENTOS ACTA DE MODIFICACIÓN NUMERO 01	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA MES 8 (07 JULIO 2022 / 30 JUNIO 2023)

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
22/07/2022		FISICO	SOLICITUD ACLARAMIENTO SUSPENSION CONTRATO DE OBRA	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
25/07/2022		FISICO	ENTREGA COPIA RESPUESTA OFICIO DEL CONTRATISTA A OFICIO SOLICITUD ACLARAMIENTO SUSPENSION CONTRATO DE OBRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
26/07/2022		FISICO	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE OBRA E INTERVENTORÍA MES 5 Y MES 6 DE EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/07/2022		FISICO	RESPUESTA AL OFICIO CUYO ASUNTO ES ACLARAMIENTONDEL CONTRATO DE OBRA. DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
28/07/2022		FISICO	ENTREGA COPIA OFICIO RESPUESTA A OFICIO CUYO ASUNTO ES ACLARAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 POR PARTE DEL CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/07/2022		FISICO	SOLICITUD COMITÉ TECNICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
4/08/2022		FISICO	ENTREGA COPIA OFICIO RESPUESTA A OFICIO CUYO ASUNTO ES ACLARAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 POR PARTE DEL CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
16/08/2022		FISICO	COPIA OFICIO REMISION DE LA COMUNIDAD	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

9/09/2022		FISICO	SOLICITUD SECOP 2	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
22/09/2022		FISICO	SOLICITUD COPIA DE ACTAS DE PRORROGA DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1507-2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987-2021	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
22/09/2022		FISICO	TRASLADO SOLICITUD DEL CONTRATISTA SOBRE REAJUSTE DE PRECIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
25/10/2022		FISICO	SOLICITUD INFORMACIÓN ACERCA DE LA SUSPENSION DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
1/11/2022		FISICO	SOLICITUD DE AMPLIACION 01 A SUSOENSION DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
4/11/2022		FISICO	REITERACION SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS TRAMITES PREDIALES Y AMBIENTALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
4/11/2022		FISICO	REVISION PAQUETE DE MODIFICACION 01, ADICION 01 Y PRORROGA 01	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
8/11/2022		FISICO	RESPUESTA OFICIO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 CUYO ASUNTO ES "SU OFICIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 "TRASLADO SOLICITUD DEL CONTRATISTA SOBRE REAJUSTE DE PRECIOS"	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
25/11/2022		FISICO	RADICACION DE POLIZAS SUSPENSION 01	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
25/11/2022		FISICO	SOLICITUD APROBACION DE POLIZAS	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
25/11/2022		FISICO	REITERACION SOLICITUD COPIA DE ACTAS DE PRORROGA DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1507 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987-2021	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
3/01/2023		FISICO	SOLICITUD AMPLIACION 03 A SUSPENSIOIN 01 DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
13/01/2023		FISICO	APROBACION CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

24/02/2023		FISICO	SOLICITUD REVISION PAQUETES SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
24/02/2023		FISICO	SOLICITUD REVISION PAQUETES SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
24/02/2023		CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO SOLICITUD DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 01 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
24/02/2023		FISICO	SOLICITUD REVISION PAQUETE SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
24/02/2023		FISICO	SOLICITUD REVISION PAQUETE SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
6/03/2023		FISICO	SOLICITUD AMPLIACION 04 A 01DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/03/2023		FISICO	RESPUESTA TRASLADO POR COMPETENCIA, OFICIO DE COBRAS S.A. DEL 16 DE ENERO DE 2023 ¨SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1507 DE 2021¨, ENVIADO POR LA OFICINA DE CONTRATACION A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE NOTA INTERNA 1010-19.18/243 CON RADICADO N00312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
30/03/2023		FISICO	SOLICITUD AMPLIACION 05 A SUSPENSION 01 DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
31/03/2023		CORREO ELECTRONICO	TRASLADO OFICIO COMUNIDAD CARACOLÍ CHARRASCAL	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
20/06/2023		FISICO	APROBACION CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
20/06/2023		FISICO	CAMBIO DE PERSONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
21/06/2023		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
21/06/2023		FISICO	SOLICITUD COMPONENTE PREDIAL Y DISEÑOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

26/06/2023		FISICO	RESPUESTA A CUESTIONARIO ENVIADO POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
27/06/2023		FISICO	COMUNICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
27/06/2023		FISICO	COMUNICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO AJUSTADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
27/06/2023		FISICO	COMUNICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/06/2023		FISICO	REMISION POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
28/06/2023		FISICO	COMUNICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES AHUYENTAMIENTO DE FAUNA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/06/2023		FISICO	CAMBIO DE PERSONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/06/2023		FISICO	CAMBIO DE PERSONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
30/06/2023		FISICO	RADICACION INFORMES AMBIENTALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
1/07/2022		FISICO	DOCUMENTOS ACTA DE MODIFICACION N. 1.	ECOBRAS
6/07/2022		FISICO	DISEÑO ESTRUCTURAL BOX 2 X 2 (PRECONTRACTUAL)	ECOBRAS
6/07/2022		FISICO	SERVIDUMBRE TUBERIA TGI	ECOBRAS
6/07/2022		FISICO	ACTIVIDADES DE CERCA RANCHO E´ LUNA.	ECOBRAS
8/07/2022		FISICO	AJUSTE AL ESTUDIO Y DISEÑO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	ECOBRAS
8/07/2022		FISICO	ACTIVIDADES EN SERVIDUMBRE TUBO DE TGI	ECOBRAS
8/07/2022		FISICO	APU NO PREVISTOS	ECOBRAS
12/07/2022		FISICO	PLANTAS DE MATERIALES	ECOBRAS
15/07/2022		FISICO	DETALLES ALCANTARTILLAS	ECOBRAS
21/07/2022		FISICO	CANTIDADES PMT EJECUTADAS	ECOBRAS
21/07/2022		FISICO	DEFINICION DISEÑO GEOMETRICO CAÑO CORCOVADO	ECOBRAS

26/07/2022		FISICO	CITACION A SESION PLENARIA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
26/07/2022		FISICO	ACLARAMIENTO DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA	ECOBRAS
26/07/2022		FISICO	SOLICITUD COMITÉ	ECOBRAS
26/07/2022		FISICO	ACLARAMIENTO DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA	ECOBRAS
2/08/2022		FISICO	RESPUESTA A OFICIO DE FECHA 26-07-22	ECOBRAS
2/09/2022		FISICO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	ECOBRAS
21/09/2022		FISICO	SOLICITUD DE REAJUSTES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA	ECOBRAS
28/10/2022		FISICO	SU OFICIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ¨TRASLADO SOLICITUD DE CONTRATISTA SOBRE REAJUSTE DE PRECIOS¨	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
1/11/2022		FISICO	SOLICITUD DE MODIFICATORIA No. 1, ACTA DE ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA	ECOBRAS
15/11/2022		FISICO	ENTREGA DE PENDIENTES PARA MODIFICACION 01, ADICION Y PRORROGA	ECOBRAS
28/11/2022		CORREO ELECTRONICO	CITACION AUDIENCIA PUBLICA DELIBERATIVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/12/2022		FISICO	SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA	ECOBRAS
6/01/2023		CORREO ELECTRONICO	CITACION MESA TÉCNICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
6/02/2023		CORREO ELECTRONICO	TRAMITE DE AMPLIACION No. 03 A LA SUSPENSION No. 1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
6/02/2023		FISICO	SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1507 DE 2021	ECOBRAS
21/02/2023		FISICO	TRASLADO POR COMPETENCIA, OFICIO DE ECOBRAS S.A. DEL 16 DE ENERO DE 2023 ¨SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1507 DE 2021¨, ENVIADO POR LA OFICINA DE CONTRATACION A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

			MEDIANTYE NOTA INTERNA 1010-19. 18/243 CON RADICADO No.0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023	
24/02/2023		FISICO	SOLICITUD DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 01	ECOBRAS
29/03/2023		CORREO ELECTRONICO	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATO N. 1507 DE 2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
31/05/2023		WHATSAPP	MANTENIMIENTO VIA CARACOLÍ CHARRASCAL	USUARIOS VIA CARACOLÍ CHARRASCAL
15/06/2023		FISICO	SOLICITUD DE REINICIO AL CONTRATO DE OBRA DEBIDO A LA SUBSANACION DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA SUSPENSION No. 1	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA JULIO 2023

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
4/07/2023		FISICO	APROBACION CAMBIO DE INGENIERO AMBIENTAL	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
4/07/2023		FISICO	APROBACION CAMBIO DE INGENIERO ESO. EN PAVIMENTOS	OFICINA CONTRATACION ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
4/07/2023		FISICO	RADICACION INFORMES AMBIENTALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
5/07/2023		FISICO	RADICACION INFORME PAGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
5/07/2023		FISICO	RADICACION DOCUMENTACIÓN AMBIENTALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
10/07/2023		CORREO ELECTRONICO	REVISION DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN REINICIO DE OBRA	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
11/07/2023		FISICO	RADICACION DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/07/2023		CORREO ELECTRONICO	NOTIFICACION DE LA RESOLUCION PS-GJ12.6.23.1026, POR MEDIO DE LA CUAL CORMACARENA ABRE INVESTIGACION, IMPONE MEDIDA PREVENTIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
28/07/2023		CORREO ELECTRONICO	NOTIFICACION CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL	VIVIANA RUEDA

RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
5/07/2023		CORREO ELECTRONICO	CAMBIO DE PERSONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
5/07/2023		FISICO	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	ECOBRAS
5/07/2023		FISICO	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	ECOBRAS
5/07/2023		FISICO	RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA FECHA	ECOBRAS
26/07/2023		CORREO ELECTRONICO	OFICIO AUDIENCIA CONTRALORIA	VIVIANA RUEDA
26/07/2023		FISICO	NOTOFICACION DE LA RESOLUCION PS-GJ 1.2.6.23.1206, POR MEDIO DE LA CUAL CORMACARENA ABRE INVESTIGACION, IMPONE MEDIDA PREVENTIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

CORRESPONDENCIA AGOSTO 2023

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
4/08/2023		CORREO ELECTRONICO	ENTREGA INFORME COMPONENTE BIOTICO-FAUNA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
10/08/22023		FISICO	SOLICITUD COMITÉ TECNICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
11/08/2023		FISICO	RESPUESTA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION PS-GJ 12.6.23.1026, POR MEDIO DE LA CUAL CORMACARENA ABRE INVESTIGACION, IMPONE MEDIDA PREVENTIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
23/08/2023		FISICO	SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
24/08/2023		CORREO ELECTRONICO	TRASALADO OFICIO RADICADO NO 29000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**

10/08/2023		CORREO ELECTRONICO	COMPROMISOS ACORDADOS AUDIENCIA DE CONTROL SOCIAL	CONTRALORIA
11/08/2023		CORREO ELECTRONICO	COMPROMISOS AUDIENCIA 08 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
15/08/2023		CORREO ELECTRONICO	TRASLADO POR COMPETENCIA, OFICIO CON RADICADO 2743 DEL 4 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/08/2023		CORREO ELECTRONICO	TRASLADO OFICIO RADICADO NO 2900 DEL 15 DE AGOSTOS DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
28/08/2023		CORREO ELECTRONICO	INFORMES Y OBLIGACIONES INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/08/2023		CORREO ELECTRONICO	COMITÉ TECNICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
29/08/2023		CORREO ELECTRONICO	SU OFICIO RAD 2983 DEL 23/08/2023-SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

CORRESPONDENCIA SEPTIEMBRE DE 2023

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
01/09/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO. 2900 DE 15 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
01/09/22023		FÍSICO	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO. 2900 DE 15 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
05/09/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO. 2900 DE 15 DE AGOSTO DE 2023	WILLYGAR25@ GMAIL.COM
05/09/2023		CORREO ELECTRÓNICO	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA DE OBRA VÍA CHARRASCAL CARACOLÍ	WILLYGAR25@ GMAIL.COM
06/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 8 CONTRATISTA PERIODO 06 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
06/09/2023		FÍSICO	INFORME DE INTERVENTORÍA N 8 DEL CONTRATO DE OBRA 1507-2021 DURANTE EL PERIODO 06 DE JULIO DE 2022 -30 DE JUNIO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
06/09/2023		FÍSICO	INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA N 8 DURANTE EL PERIODO 06 DE JULIO DE 2022 -30 DE JUNIO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
08/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 9 DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PERIODO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

			01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023	
08/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 9 CONTRATISTA PERIODO 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
08/09/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA DERECHO D PETICIÓN SEÑOR GUSTAVO MEJÍA	MASACREMEJIA@GMAIL.COM
12/09/2023		FÍSICO	RESPUESTA TRASLADO POR COMPETENCIA OFICIO CON RADICADO 2743 DEL 04 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
14/09/2023		CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA INFORME EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DEL PROYECTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
14/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DEL PROYECTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
20/09/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO. 2900 DE 15 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
22/09/2023		FÍSICO	ENTREGA PAQUETE RECIBO PARCIAL 01 CONTRATO 1987-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
25/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DEL PROYECTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
25/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 10 CONTRATISTA PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
25/09/2023		FÍSICO	INFORME DE INTERVENTORÍA NO 10 DEL CONTRATO DE OBRA 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
27/09/2023		FÍSICO	SOLICITUD AJUSTE DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
04/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME MENSUALES DE OBRA NO 8 Y NO 9	ECOBRAS
11/09/2023		FÍSICO	PARTICIPACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL	VOCERA DE COMITÉ NUMERO 4 DE GENERO COMUNA 9
19/09/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA NO 10	ECOBRAS
27/09/2023		FÍSICO	SOLICITUD AJUSTE DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2023

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
02/10/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 10 GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA VISITA OBRAS AVANCE VÍA CARACOL CHARRASCAL 13 DE OCTUBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD INFORME MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ECOBRAS
10/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN INFORME PAGA	ECOBRAS
10/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	TRASLADO OFICIO RADICADO 2900 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA COMITÉS TÉCNICOS DE FECHA 10 DE OCTUBRE Y 12 DE OCTUBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	CITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO DEBATE CONTROL POLÍTICO – 19 DE OCTUBRE A LAS 7:30 AM CONCEJO MUNICIPAL	ECOBRAS
23/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	CUMPLIMIENTO COMITÉ DE OBRA 10 DE OCTUBRE DE 2023	ECOBRAS
25/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE CERCAS Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TERRENO	ECOBRAS, RAFAEL SANMIGUEL ROLDAN
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
04/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA VISITA OBRAS AVANCE VÍA CARACOL CHARRASCAL 13 DE OCTUBRE DE 2023	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
04/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA VISITA OBRAS AVANCE VÍA CARACOL CHARRASCAL 13 DE OCTUBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
09/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	INVITACIÓN VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS VÍA CHARRASCAL CARACOLÍ CONTRATO 1507 DE 2021	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
12/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	CITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO DEBATE CONTROL POLÍTICO – 19 DE OCTUBRE A LAS 7:30 AM CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/10/2023		COPIA CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO – EXPEDIENTE No. PM-GA 3.11.023.013	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A CORMACARENA

23/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE CERCAS Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TERRENO	RAFAEL SANMIGUEL ROLDAN
24/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	REMISIÓN OFICIO 1200-19.18/1416	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
26/10/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RE: SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE CERCAS Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TERRENO	RAFAEL SANMIGUEL ROLDAN

CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE DE 2023

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
10/11/2023		CORREO ELECTRÓNICO	INFORME ATRASO EN PROGRAMACIÓN DE OBRA	ECOBRAS
16/11/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME 11 CONTRATISTA DE OBRA CONTRATO NUMERO 1507-2021 COMPRENDIENDO EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
16/11/2023		FÍSICO	INFORME DE INTERVENTORÍA N° 11 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1507-2021 DURANTE EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
17/11/2023		FÍSICO	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 CUYO ASUNTO ES: INFORME ATRASO DE OBRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
23/11/2023		FÍSICO	SOLICITUD DE PRORROGA AL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE RESOLUCIÓN PS-GJ 1.2.6.23.0105 DEL 03 DE FEBRERO DE 2023	ECOBRAS
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
04/11/2023		CORREO ELECTRÓNICO	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 01	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
08/11/2023		CORREO ELECTRÓNICO	CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
15/11/2023		FÍSICO	ENTREGA INFORME EJECUTIVO PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACIÓN	ECOBRAS
17/11/2023		CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA A SU OFICIO RADICADO 2473 DEL 4 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

21/11/2023		CORREO ELECTRÓNICO	CITACIÓN A COMITÉ AMBIENTAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
23/11/2023		FÍSICO	SOLICITUD DE PRORROGA AL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE RESOLUCIÓN PS-GJ 1.2.6.23.0105 DEL 03 DE FEBRERO DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
24/11/2023		FÍSICO	RESPUESTA COMPONENTE FINANCIERO PARA PAGO PARCIAL No. 1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO

CORRESPONDENCIA DICIEMBRE DE 2023

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
12/12/23		FÍSICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DEL - CONTRATO DE OBRA N° 1507-2021 PARA SOLICITUD DE PRORROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/12/23		FÍSICO	SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20/12/23		CORREO ELECTRÓNICO	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ DE OBRA 19/12/2023	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
20/12/23		CORREO ELECTRÓNICO	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ DE OBRA 19/12/2023	CABERNAL@ GRUPODELLANO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
12/12/23		FÍSICO	RESPUESTA OFICIO RADICADO 4551 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
04/12/23		FÍSICO	SOLICITUD DE PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA (1507-2021)	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA ENERO DE 2024

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
18/01/24		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD COMPROBANTE DE EGRESO	TESORERIA VILLAVICENCIO
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**

09/01/24		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA Y CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO SEGÚN PRORROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
09/01/24		CORREO ELECTRONICO	CITACIÓN COMITÉ TÉCNICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/01/24		CORREO ELECTRONICO	CITACIÓN RECORRIDO DE OBRA CTO 1507 DE 2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
23/01/24		FISICO	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA NO 13	ECOBRAS
25/01/24		CORREO ELECTRONICO	TRASLADO OFICIO 2024 EE0010365 SOLICITUD DE INFORMACIÓN CAT_272_2024_1 SGR HOJA RADICADO OFICIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CORRESPONDENCIA FEBRERO DE 2024

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
06/02/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 15 CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
08/02/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NÚMERO 12 CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PERIODO 01/10/2023 AL 31/10/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/02/24		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE INFORME CONTRATO 1507 DEL 2021 Y 1987 2021	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12/02/24		FÍSICO	RETENCIÓN EN LA FUENTE RETENIDA EN PAGOS.	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
13/02/24		CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA SOLICITUD INFORME CONTRATO 1507 DEL 2021 Y 1987 DEL 2021.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
19/02/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NÚMERO 13, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA, PERÍODO 01/11/2023 AL 30/11/2023.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
26/02/24		FÍSICO	ENTREGA INFORMES MENSUALES, GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
26/02/24		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD INFORME MENSUAL PERIODO ENERO 2024.	ECOBRAS SA
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
06/02/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA N° 14	ECOBRAS SA
08/02/24		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD INFORMES CARRASCAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

16/02/24		CORREO ELECTRÓNICO	TRASLADO POR COMPETENCIAS RADICADO 0432 OFICIO.PG.GDE.1.4.24.084	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
16/02/24		CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE INFORMES.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

CORRESPONDENCIA MARZO DE 2024

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
06/03/24		FÍSICO	ENTREGA PAQUETE RECIBO PARCIAL 02 CONTRATO 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
06/03/24.		FÍSICO	ENTREGA PAQUETE RECIBO PARCIAL 02 CONTRATO 1987-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8/03/24		FÍSICO	SOLICITUD SUSPENSIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 02	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORMES OBRAS HIDRÁULICAS CONSTRUIDAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUERO 15 DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 15 DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA CONTRATO NUMERO 1507-2021 COMPRENDIENDO EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
19/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 16 DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
19/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME NUMERO 16 DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA CONTRATO NUMERO 1507-2021 COMPRENDIENDO EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
01/03/24		CORREO ELECTRÓNICO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
05/03/24		FÍSICO	ENTREGA ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA 02	ECOBRAS S.A.

13/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA 15	ECOBRAS S.A.
16/03/24		FÍSICO	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No 16	ECOBRAS S.A.
22/03/24		CORREO ELECTRÓNICO	CONVOCATORIA A MESA DE SEGUIMIENTO Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARACOLÍ- CHARRASCAL CONTRATO 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
22/03/24		CORREO ELECTRÓNICO	INVITACIÓN MESA DE DIALOGO AVANCES VÍA CHARRASCAL CARACOLÍ	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
22/03/24		CORREO ELECTRÓNICO	CONVOCATORIA A MESA DE SEGUIMIENTO Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARACOLÍ- CHARRASCAL CONTRATO 1507-2021	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CORRESPONDENCIA ABRIL DE 2024

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
01/04/2024		CORREO ELECTRONICO	INVITACIÓN MESA DE DIALOGO AVANCES VÍA CARACOLÍ CHARRASCAL	ECOBRAS S.A.
01/04/2024		FISICO	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 02	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
09/04/2024		FISICO	RESPUESTA OFICIO 1202-19.18/0221 Y ENTREGA PAQUETE PARCIAL 02 CONTRATO DE OBRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
09/04/2024		FISICO	RESPUESTA OFICIO 1202-19.18/0222 Y ENTREGA PAQUETE PARCIAL 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
15/04/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD INFORME MENSUAL MES DE MARZO DE 2024	ECOBRAS SA
16/04/2024		FISICO	SOLICITUD REINICIO A SUSPENSIÓN 02 DE OBRA E INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
17/04/2024		FISICO	SUBSANACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PARA RECIBO PARCIAL 02	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20/04/2024			ENTREGA REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA 03 CONTRATO 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
24/04/2024		CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN OFICIO 1202-19.18/0241 "DEVOLUCIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUS RESPECTIVAS CORRECCIONES	ECOBRAS S.A.
RECIBIDA				

FECHA	CONSECUTIVO / RADICADO N°	MEDIO DE ENVÍO	ASUNTO	RECIBIDO DE
01/04/2024		FISICO	OBSERVACIONES DOCUMENTOS PARA ACTA PARCIAL 02- CONTRATO DE OBRA 1987 DE 2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
01/04/2024		FISICO	OBSERVACIONES DOCUMENTOS PARA ACTA PARCIAL 02- CONTRATO DE OBRA 1507 DE 2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
16/04/2024		FISICO	OBSERVACIONES FINANCIERAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
16/04/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA Y PRORROGA DE CONTRATOS	SECRETARIA DE INGRAESTRUCTURA
23/04/2024		CORREO ELECTRONICO	ENTREGA DE INFORME MENSUALES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024	INTERVIAS CE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
26/04/2024		FISICO	RESPUESTA DE SUBSANACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL PARCIAL 02 , DEL CONTRATO EN REFERENCIA	INTERVIAS CE SECRETARIA DE INGRAESTRUCTURA

CORRESPONDENCIA MAYO DE 2024

ENVIADA				
FECHA	CONSECUTIVO / RADICADO N°	MEDIO DE ENVÍO	ASUNTO	DIRIGIDO A
02/05/2024		CORREO ELECTRONICO	ACTUALIZACION DE POLIZAS 1987-201	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
03/05/2024		CORREO ELECTRONICO	DECRETO 1082 DEL 2015 OFICIO RESPUESTA ASEGURADORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE INFORME MENSUALES Y POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ECOBRAS
11/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD COMITÉ TENCICO DE CARÁCTER URGENTE	ECOBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/05/2024		CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO 1212-19.18/0332	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14/05/2024		CORREO ELECTRONICO	REITERACION INFORMES MENSUALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
15/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20/05/2024		CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO 0347 REQUERIMINETO PERSONERIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
21/05/2024		CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO 1873 PARA SOLICITUD DE INFORMACION DNP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
22/05/2024		CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA RADICADO 1873 PARA SOLICITUD DE INFORMACION DNP	ECOBRAS
22/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD EXPEDICION POLIZAS DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA SEGÚN PRORROGA 04	ECOBRAS

31/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DOCUMENTANCION AMBIENTAL	ECOBRAS
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO Nº**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
08/05/2024		CORREO ELECTRONICO	OFICIO OBLIGACIONEES RADICADO 0322 CHARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
08/05/2024		CORREO ELECTRONICO	REITERACION DEL CUMPLIMINETO A SUS OBLIGACIENS CONTRACTUALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10/05/2024		CORREO ELECTRONICO	NOTIFICACION FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA 1507 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1987 DE 2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZA DE VIGENCIA PRORROGA 3 DEL CONTRATO 1987-2021	SECRETARIA DE INGRAESTRUCTURA
10/05/2021		CORREO ELECTRONICO	TERMINACION DEL CONTRATO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD COMITÉ TECNICO DE CARÁCTER URGENTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
15/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE PRORROGA 04 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA	ECOBRAS
16/05/2024		CORREO ELECTRONICO	REMISION REQUERIMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
17/05/2024		CORREO ELECTRONICO	URGENTE: REENVIO DE NOTIFICACION RADICADO 2024460619261 PROCEDIMINETO ADMINISTRATIVO DE CONTROL - REGALIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
17/05/2024		CORREO ELECTRONICO	REITERACION ENTREGA DE INFORMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
21/05/2024		CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE ESTADO ACTUAL DE PENDEINTES AMBIENTALES Y CONFORMACION DE MESA DE TRABAJO PARA CIERRE AMBIENTAL DEL PROYECTO CHARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
21/05/2024		CORREO ELECTRONICO	TRASLADO POR COMPENTENCIA RADICADO 1873 PARA SOLICITUD DE INFORMACION DNP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
22/05/2024		CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO 1722 DEL 14 DE MAYO DE 2024 1202-19.18/0348	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
24/05/2024		CORREO ELECTRONICO	ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA NO 4 AL CONTRATO 1507 DE 2021	ECOBRAS

CORRESPONDENCIA JUNIO DE 2024

ENVIADA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
04/06/2024		CORREO ELECTRONICO	INFORME EJECUTIVO DE OBRA PARA RESPUESTA CONTRALORÍA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20/06/2024		CORREO ELECTRONICO	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.	ECOBRAS
RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO / RADICADO N°**	**MEDIO DE ENVÍO**	**ASUNTO**	**RECIBIDO DE**
07/06/2024		CORREO ELECTRONICO	ENTREGA INFORMES MENSUALES DEL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/06/2024		CORREO ELECTRONICO	COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 1507-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12/06/2024		CORREO ELECTRONICO	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS MEDIANTE ACTA No 1202.02/0015	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2.1.1.3 COPIA DE LA BITÁCORA

Mediante el presente informe se anexará copia de la bitácora de todo el proyecto, (ver anexos)

2.2 INFORME FINANCIERO

2.2.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Los contratos de obra No. 1507 de 2021 y de interventoría no tuvieron anticipo por lo que se inicia la ejecución de éstos con recursos propios.

2.2.2 PAGOS REALIZADOS

PROGRAMADO/ FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO
$ 7.973.634.769,00 (100.00%) / $6.273.264.258, (78.68%)	$ 7.944.535.251,00 (99.64%)

2.2.3 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Dentro del desarrollo del proyecto, se hicieron 2 cobros parciales que sumados dieron el 78.68% del contrato, pero cabe aclarar que debido a que el contratista de obra no tuvo anticipo, fue una constante que el avance financiero desde sus inicios siempre estuvo por debajo del avance de ejecución ya que no había anticipo que amortizar. Por lo cual nunca hubo riesgo de que los recursos del estado estuvieran en riesgo de otra destinación ya que toda la obra se hizo con el capital del contratista de obra.

2.2.4 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	06/12/2021-05/08/2022	$4.866.749.104,00	$0.00	$4.866.749.104,00	100.00%
ADICIÓN CONTRATO	26/06/2023	$3.106.885.665,00		$3.106.885.665,00	
ANTICIPO	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
ADICIÓN	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
PARCIAL 1	06/12/2021 – 20/09/2023	$2.311.451.473,00	$0.00	$2.311.451.473,	28.99%
PARCIAL 2	21/09/2023 – 28/02/2024	$3.961.812.785,00	$0.00	$3.961.812.785,00	49.69%
RECIBO FINAL	29/02/2024-16/06/2024	$1,671,270,993.00		$ 1,671,270,993.00	20.96
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	N/A	$ 29,099,518.00	$0.00	-$ 29,099,518.00	0.36%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	$7.973.634.769,000	$0.00	$7.973.634.769,00	100.00%

2.3 INFORME LEGAL

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

dentro del presente informe la interventoria ha verificado que el contratista dentro de sus obligaciones tales como el personal y la maquinaria ofertados, las ha cumplido a cabalidad, con la instalación de materiales y ceñirse al diseño del proyecto, con algunas oportunidades de mejora.

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida.	CUMPLIÓ
2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada.	CUMPLIÓ

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del Contrato.	CUMPLIÓ
4. Constituir si fuera el caso, una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos del contrato entregados a título de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes o rendimientos al momento de la liquidación de contrato; siguiendo las reglas establecidas para su manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comisión fiduciaria.	NO APLICA, EL CONTRATO NO CUENTA CON ANTICIPO ALGUNO
5. Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversión de anticipo, para la aprobación del interventor, en forma previa a la iniciación de la ejecución de las obras.	CUMPLIÓ (SOLO EL CRONOGRAMA, EL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO NO APLICA)
6. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de donde se obtendrá el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a 10 establecido en los respectivos permisos ambientales.	CUMPLIÓ, PERO NO FUE PMA SINO PAGA
7. Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto.	CUMPLIÓ
8. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.	CUMPLIÓ
9. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato.	CUMPLIÓ
10. Acatar las indicaciones que el Municipio y la Interventoría le señalen en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.	CUMPLIÓ A LO LARGO DE TODO EL PROYECTO.
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.	CUMPLIÓ A LO LARGO DE TODO EL PROYECTO.
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	CUMPLIÓ A LO LARGO DE TODO EL PROYECTO.
13. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	CUMPLIÓ A LO LARGO DE TODO EL PROYECTO.
14. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación.	CUMPLIÓ

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
15. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.	CUMPLIÓ
16. Suscribir con el interventor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado,	CUMPLIÓ
17. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	CUMPLIÓ
18. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	CUMPLIÓ
19. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	CUMPLIÓ
20. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan.	CUMPLIÓ
21. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado, reportando la situación de manera inmediata al interventor del contrato.	CUMPLIÓ, DANDO AVISO DEL TEMA AMBIENTAL Y PREDIAL
22. Del contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, Del contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua.	CUMPLIÓ MEDIANTE APLICACIÓN DEL PAGA
23. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los demás registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y su interventor.	CUMPLIÓ
24. De igual manera será obligación del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, para ello aplicará las respectivas medidas de señalización vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes	CUMPLIÓ, MEDIANTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
25. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de garantía, ésta deberá permanecer aún después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y parámetros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.	CUMPLIÓ

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
26. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una oficina en el área urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicación entre éste y el interventor y la administración municipal, en virtud de las obras contratadas,	CUMPLIÓ La oficina del contratista de obra se ubica en la Carrera 32 No. 38-70 oficina 1302 edificio Romarco, en la ciudad de Villavicencio.
27. Cuando lo prevean las especificaciones o la interventoría lo solicite, del contratista someterá a la aprobación de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, así como las fuentes de abastecimiento de los mismos. La Interventoría podrá rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado será retirado del lugar y deberá remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregirán satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prórrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construcción, deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la Interventoría, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. Del contratista deberá suministrar para inspección y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser utilizados, según selección que de éstos haga la interventoría. Esta podrá exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estará a cargo del contratista. En relación con la calidad de los materiales, se aplicarán rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.	CUMPLIÓ
28. Será obligación de del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo en particular, Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del contratista. Cualquier omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se Obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de diseño y construcción.	CUMPLIÓ
29. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución y durante el desarrollo del objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los formatos establecidos por el Municipio de Villavicencio.	SE CUMPLIÓ A LO LARGO DE TODO DEL PROYECTO
30. La contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se requieran.	SE CUMPLIO A CABALIDAD, SE REVISÓ EL EQUIPO MINIMO DISPUESTO POR EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
31. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una socialización de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, juntas de acción comunal acompañados de la interventoría y la administración municipal, dejando la respectiva evidencia.	CUMPLIÓ, SE HIZO SOCIALIZACION E EL COLISEO DEL BARRIO CAHRRASCAL EN COMPAÑÍA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
32. El contratista deberá instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y especificaciones establecidas por la administración, una vez elaborada el acta de inicio y previo acuerdo logrado en la socialización de la obra entre el interventor, la contratista y la comunidad beneficiada. Las vallas se elaborarán en lámina galvanizada calibre 22, como mínimo y se decorarán con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel reflectivo grado ingeniería o alta intensidad. Las vallas serán soportadas sobre torres u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberán fabricar con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el interventor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90) centímetros, sobre bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, adicionalmente el contratista deberá instalar vallas de señalización preventiva, acompañadas de señalización diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecución de las obras.	CUMPLIÓ
33. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los materiales y demás elementos que se suministren para la ejecución de los trabajos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en 10 posible, corresponder a las últimas tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que, dentro del total de cada ítem, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construcción.	CUMPLIÓ A CABALIDAD ESTA OBLIGACION
34. La contratista deberá tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete días a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.	CUMPLIÓ
35. La Contratista tendrá presente las siguientes recomendaciones frente a la situación del Coronavirus COVID 2019, para evitar su contagio y propagación durante el tiempo de ejecución de la obra.	CUMPLIÓ NO SE EVIDENCIARON CASOS DE CONTAGIO DE COVID
a. Deberá garantizar la protección de todos los trabajadores. Se intentará minimizar al máximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo individualizado, siempre que las medidas de seguridad y salud lo permitan, reduciendo las labores y rectificando el programa, estableciendo turnos	CUMPLIÓ NO SE EVIDENCIARON CASOS DE CONTAGIO DE COVID

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
escalonados de trabajo para reducir el número de trabajadores en las instalaciones, así como la implantación de la jornada continuada evitando la concentración en los vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos de comida a pie de obra.	
b. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, dentro de la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la reanudación de los trabajos.	CUMPLIÓ NO SE EVIDENCIARON CASOS DE CONTAGIO DE COVID
c. Disposición de una zona dotada de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos o solución hidroalcohólica para su desinfección (siempre que pueda disponerse de la misma). Dispondrán de contenedores para los desechos, que estarán, también disponibles, como refuerzo en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.	CUMPLIÓ NO SE EVIDENCIARON CASOS DE CONTAGIO DE COVID
d. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas, aseos, vestuarios, salas de reunión y todas aquellas en las que los trabajadores no vayan ataviados con los preceptivos guantes, como mínimo una vez al día. La limpieza se realizará también sobre las herramientas de trabajo manuales, medios de obra, materiales y andamios que sean de uso compartido. Tras el cambio de usuario, la limpieza se realizará también sobre las herramientas de trabajo manuales que sean de uso compartido.	CUMPLIÓ NO SE EVIDENCIARON CASOS DE CONTAGIO DE COVID
36. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Del contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.	CUMPLIÓ
37. Del contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	CUMPLIÓ NO FUE NECESARIO ESTE EVENTO
38. OBLIGACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE:	
a. Del contratista, deberá radicar ante Cormacarena previo al inicio de actividades copia del acta de inicio del contrato.	CUMPLIÓ
b. Del contratista previamente a la ejecución del desmonte de la alcantarilla actual deberá presentar ante Cormacarena, el polígono de las coordenadas del sitio previsto para la disposición de los escombros producto de esta actividad,	CUMPLIÓ

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
el cual no debe presentar zonas de interés ecológico, como rondas, bajos, humedales y demás.	
c. Del contratista deberá radicar de MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de inicio y finalización.	CUMPLIÓ
d. Del contratista deberá allegar en un plazo de 8 días una vez firmada el acta de inicio, EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS TECNICAS, en las que se indiquen claramente las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente el manejo temporal de la fuente hídrica caño corcovado, (desviaciones, canalizaciones, trinchos, y demás), mientras el proceso constructivo de las obras de protección, el cual deberá incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias, que permitan y garanticen, el restablecimiento de las condiciones iniciales del sector a intervenir, el cual deberá ser realizado y soportado con firma y tarjeta profesional de personal idóneo en esta área, con el propósito de realizar, el respectivo análisis y aprobación por parte de la corporación, teniendo en cuenta la importancia técnica que esto requiere para el desarrollo del proyecto; además de hacer énfasis en el manejo de los residuos sólidos, sobrantes de escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración y limpieza del sitio.	CUMPLIÓ
e. Se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal del cauce de la fuente hídrica caño corcovado, mientras el proceso constructivo de las estructuras aprobadas en este permiso de ocupación de cauce, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales de la fuente hídrica caño corcovado en el sector intervenido.	CUMPLIÓ
f. Bajo ninguna circunstancia, se debe desviar el cauce de la fuente hídrica caño corcovado por 10 que el contratista junto con el programa de medidas ambientales deberá radicar el documento técnico de manejo temporal de la fuente hídrica, el cual debe garantizar, la no afectación de las condiciones de estabilidad y/o el daño o afectación de los ecosistemas acuáticos presentes.	CUMPLIÓ
g. Del contratista deberá allegar en un plazo de 8 días una vez firmada el acta de inicio el INFORME DE CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN LA FUENTE HIDRICA CAÑO RODAS, a partir de la localización de las obras a construir en una longitud de 300 mts (200 aguas abajo del final de las obras y 100 mts aguas arriba del inicio de la obra), actividad que debe ser realizada por un profesional idóneo.	CUMPLIÓ

OBLIGACIONES	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
h. Una vez terminadas las actividades de construcción del box coulvert, el contratista deberá entregar: INFORME EJECUTIVO, donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, en el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avaladas por el interventor, soportadas con anexo fotográfico, planos AS BUILT, firmados y cuantificación de las actividades realizadas. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIAS AMBIEMTALES Y RESPECTIVAS, implementado en la construcción del box coulvert y el cabezal de descarga, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes y relacionando ei personal a cargo del cumplimiento. INFORME DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS MARGENES DE LA FUENTE HIDRICA CAÑO RODAS, teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se muestre el seguimiento realizado por profesional idóneo, indicando claramente si es o no necesario tomar medidas correctivas, para garantizar la estabilidad de las mismas y la no afectación de otras áreas,	CUMPLIÓ

2.3.2 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES BRINDADAS

MES 01 (06 DICIEMBRE 2021 / 05 ENERO2022)

- Dentro del levantamiento topográfico realizado entre el contratista de la obra y la interventoría se evidenció un problema de georreferenciación con respecto al diseño inicial, este problema radicó en el levantamiento realizado por la entidad en la etapa precontractual está girado respecto al levantamiento geo referenciado que realizó el contratista de la obra y la interventoría, para este caso la interventoría verificó los amarres, las poligonales y la georreferenciación del levantamiento hecho por el contratista y pudo dar fe, de que el levantamiento que realizó el contratista estuvo más ajustado a la realidad que el levantamiento precontractual situación qué repercutió en el ajuste realizado al diseño.

- De acuerdo al problema anterior se pudo evidenciar un inconveniente en el empalme del barrio charrascal con el proyecto, el cual estaba desplazado aproximadamente 10 m hacia el norte con respecto al k00+000 del proyecto, situación que fue comentada en comité de obra, a lo cual la entidad sugirió un empalme en 25 m de la longitud situación que fue evaluada por la interventoría ya que consideró que esta longitud es muy corta para hacer una transición y así se podría generar problemas de seguridad vial teniendo en cuenta que si bien la velocidad de diseño del proyecto de 40 km/h este empalme viene precedido por una recta de 1.33 km lo cual induciría mayores velocidades de tránsito para un empalme tan brusco en 25 m.

- La licencia de Ocupación de Cauce sobre el caño corcovado mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.19.2567 y modificado mediante resolución PS-GJ-1.2.6.20.0723 ya no era vigente teniendo en cuenta el ajuste al diseño del proyecto.

- Luego de haber realizado el levantamiento topográfico e implantado de acuerdo a las áreas de cesión del plan parcial Santana, se evidenció que el punto sobre el caño corcovado tendría una luz de 44 m situación, que obligaría a la construcción de un puente o en su defecto de un pontón, situación

que incidiría en el presupuesto del proyecto aún por encima del porcentaje permitido legal para realizar una adición presupuestal al contrato de obra.

- El contratista de obra junto con la interventoría realizó el inventario forestal de los árboles objeto del aprovechamiento de acuerdo con la licencia, encontrando que existían árboles que son necesarios de aprovechamiento, pero no estaban dentro del inventario de la licencia aprobada por lo cual la entidad iba a estudiar la posibilidad de solicitar una modificación a la licencia existente de acuerdo con la cantidad de árboles y a su tipología.

- El diseño hidráulico presentado en la etapa precontractual no contemplaba las obras de drenaje necesarias para la evacuación de aguas lluvias, situación que conllevaba a la realización de un nuevo informe hidráulico para actualizar las estructuras necesarias para garantizar un buen manejo de aguas. Compromiso adquirido por el contratista de obra el cual fue revisado por la interventoría.

MES 02 (06 ENERO 2022 / 05 FEBRERO 2022)

- Conforme se hicieron verificaciones del levantamiento topográfico tanto del contratista de obra e interventoría, se decidió que el levantamiento topográfico que se adoptaría para el diseño geométrico e hidráulico sería el levantamiento hecho por el contratista e interventoría, en vez del precontractual.

- Respecto al desface del empalme de charrascal, se llegó a un consenso de cómo hacer modificación para garantizar la seguridad vial y ajustándonos a las alineaciones de vía adoptadas en el POT 2015 a futuro, dicho diseño fue revisado y aprobado por las tres partes, contratista, interventoria y entidad.

- Con respecto al caño corcovado, nos encontrábamos en la siguiente disyuntiva, si aprovechamos la coordenada de la licencia ambiental de ocupación de cauce del box, se haría necesario rediseñar un box para 44 m de luz, situación que hizo inviable la construcción de un box y cambiar la estructura del box. Situación que pudo generar una adición de recursos superior al 50% del valor del contrato, ahora Por otro lado podíamos aprovechar el carril alterno aprobado dentro del POT 2015 , pero el inconveniente fue que las áreas de cesión del plan parcial Santana sólo contemplaba el alineamiento del carril por el cual estaba proyectada la vía situación que haría que se iniciara de nuevo un proceso de cesión de predios con el plan parcial Santana para el otro carril, viéndolo desde las 2 perspectivas las 2 soluciones iban a tomar tiempo ya que generarian procesos ya sea por un lado de licencia ambiental de ocupación de cauce nuevo o proceso de cesión de predios nuevo por lo cual estábamos buscando la mejor alternativa para esta disyuntiva.

- Adicional a ello al cambiar el punto de ocupación de cauce también cambiaba el inventario forestal de los árboles que se iban a aprovechar sobre el caño.

- Para finales del segundo mes el contratista realizó el informe del diseño hidráulico para garantizar el óptimo drenaje de las aguas lluvias y escorrentías y así evitar que se sature la estructura del pavimento.

MES 03 (06 FEBRERO 2022 / 05 MARZO 2022)

- Para el tercer mes el contratista presentó el informe hidráulico determinando todas y cada una de las estructuras hidráulicas necesarias para el proyecto, la interventoría revisó y aprobó dicho informe con el apoyo de ingeniero hidráulico por parte de la interventoría.

- La obra y la interventoría se encontraba realizando el ajuste al diseño geométrico de la vía de acuerdo a varias sugerencias por parte de la entidad lo cual arrojó mayores áreas de intervención predial, situación que implicaba nuevos trámites de adquisición de predios para garantizar el trazado

del diseño geométrico ajustado dichos aumentos se generan por los aumentos de los taludes ya que en ciertos lugares se ha hecho necesario aumentar la altura de la rasante por temas de manejo de aguas y de escorrentías.

- Al finalizar el tercer mes, no se había podido solucionar los temas prediales y ambientales situación por la cual no se había podido iniciar las actividades de obra.

MES 04 (06 MARZO 2022 / 05 ABRIL 2022)

- Para el final del cuarto mes se pudieron iniciar las actividades de construcción del tramo del plan parcial Santana situación que alivian un poco el retraso generado por los ajustes al diseño y los procesos administrativos que el proyecto demanda.

- Se hizo entrega de los diseños ajustados con los rótulos de la entidad para que sea aprobado el diseño geométrico final del proyecto.

- También se hizo entrega del diseño hidráulico de las estructuras de drenaje de la vía, revisado y avalado por la interventoría.

- Se continuaron con las labores prediales y ambientales para poder liberar más tramos de ejecución del proyecto.
- El contratista de obra luego de hacer un estudio de CBR en varios puntos de la obra, hizo solicitud mediante oficio de 29 de marzo de 2022 para que se aprobara un mejoramiento de la subrasante por parte de la interventoria, por lo que la interventoria hizo la verificación en campo y observó que una vez se hace la instalación del material de 3" con un espesor de 15 cms, (dicho espesor es la reposición del descapote de la primera capa de material natural) y al ser compactado, dicho material se mezcla con el terreno natural, y se generan fallos, y este material luego debe ser retirado, a lo que la interventoría se remite a bibliografía al respecto y encontró que este problema es común con valores de CBR bajos y según la tabla 13.1 del libro PAVIMENTOS, materiales, construcción y diseño cuyo autor es HUGO ALEXANDER RONDON, donde se recomienda la instalación de material de sustitución y mejoramiento para evitar este fallo durante el proceso constructivo, por lo que esta interventoría, mediante oficio del 31 de marzo de 2022, aprueba que para los sitios donde no hay vía carreteable existente ósea terreno virgen, se debe instalar un material de mejoramiento de 30 cms para poder instalar adecuadamente la primera capa de subbase y evitar fallos durante el proceso constructivo.

- Durante la excavación se evidenciaron múltiples fallos, lo cual fue necesario remover dicho material y sustituir por material de 3", para mejorar la capacidad portante de estos sectores.

MES 05 (06 ABRIL 2022 / 05 MAYO 2022)

- Se continuó con la construcción de la estructura del pavimento, pero este fue ralentizado por las constantes lluvias que generan sobresaturación de la subbase, impidiendo que el material llegue a su compactación máxima según los ensayos de laboratorio, situación que impide la liberación de la capa y por ende la instalación de la capa subsiguiente.

- Se continuó con la gestión predial por parte de la entidad, para poder avanzar en la construcción del proyecto.

- Se continuó con la consecución de la documentación para la solicitud de permiso de ocupación de cauce para el nuevo box sobre la nueva ubicación del caño corcovado. •

MES 06 (06 MAYO 2022 / 05 JUNIO 2022)

- Debido a que sobre el tramo del plan parcial Santana que comprende desde el K1+400 hasta el k2+120, no se pudo avanzar en la instalación de capa superiores a la primera capa de subbase, se iniciaron labores desde el final del proyecto en el empalme de la vía del corredor ecológico hasta lo que comúnmente se conoce como la entrada a Juanchito, pero en lo corrido del mes se realizaron actividades de obra en el tramo que vadesde el K4+0.87 hasta el K3+520, estas actividades van desde , el descapote, excavación, la instalación del material de 3", y hasta la primera capa de subbase, desde allí, no se ha podido avanzar en la construcción de las capas subsiguientes debido a la sobresaturación de la capa de subbase.

- Para este tramo, se labor en la mitad de la calzada, para garantizar el flujo de vehículos desde y hacia los colegios que se encuentran sobre la vía.

- Se continuó con la gestión predial por parte de la entidad, para poder avanzar en la construcción del proyecto. A la fecha fue entregado al contratista los predios Rancho e luna, y dos predios Lotes parte hacienda Santa Santana cuyos propietarios son INVERSIONES PALERMO S. EN C y la firma INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. INARCO respectivamente

- Se continuó con la consecución de la documentación para la solicitud de la licencia de construcción del nuevo box sobre la nueva ubicación del caño corcovado.

MES 07 (06 JUNIO 2022 / 06 JULIO 2022)

- - Para este mes, se avanzó a paso ralentizado por las constantes lluvia, y ante la imposibilidad de abrir nuevos frentes para contrarrestar el retraso por cuestiones prediales y ambientales, por lo anterior se procedió a suspender el contrato el día 7 de Julio de 2022.

Se firma acta de suspensión el 7 de julio de 2022 por un término de 2 meses, el cual fue ampliado en 5 oportunidades, la primera ampliación se hizo el día 6 de septiembre de 2022 por un término de 2 meses, la segunda ampliación se realizó el día 5 de noviembre 2022 por un término de 2 meses también, la tercera se realizó el día 4 de enero de 2023 por un término de 2 meses también, la cuarta se realizó el día 4 de marzo por un término de un mes, y la quinta fue de fecha 4 de abril de 2023, por un término previsto de 4 meses, por lo que se tiene acta de inicio prevista para el día 4 de agosto de 2023, pero luego de varios meses de trabajo conjunto se pudo obtener las licencias de ocupación de cauce número PS-GJ.1.2.6.23 0105 de fecha 26 de diciembre de 2022 y licencia de aprovechamiento forestal número PS-GJ1.2.6.23 0704 de fecha 16 mayo de 2023 las cuales reemplazan las licencias iniciales del proyecto junto con los permisos de intervención voluntaria de los predios por parte de la entidad, por lo que se firma acta de reinicio el día 15 junio de 2023

MES 08 (07 JULIO 2022 / 30 JUNIO 2023)

- A lo largo de la construcción de la vía desde el K00+000,00 en adelante se encontró muchos fallos por lo que esta interventoría verificó y aprobó reemplazar dicho material de capacidad portante por material de crudo de rio, lo anterior con el fin de poder mejorar la capacidad portante de la subrasante y garantizar la estabilidad de la vía.

- También a lo largo de este periodo se presentaron bastantes lluvias, lo cual no han permitido avanzar en la instalación de subbase y base de manera óptima, debido a esto, la interventoría ha aprobado que sea necesario, avanzar, más en la conformación de la vía con el relleno de crudo y/o material de 3". Que con la subbase y base.

MES 09 y 10 (01 JULIO 2023 / 31 AGOSTO DE 2023)

- A lo largo de la construcción de la vía desde el K00+000,00 en adelante se encontró muchos fallos que se han hecho necesario reemplazar dicho material de capacidad portante por material de crudo de rio, lo anterior con el fin de poder mejorar la capacidad portante de la subrasante y garantizar la estabilidad de la vía.

- También a lo largo de este periodo se presentaron bastantes lluvias, lo cual no permitió avanzar en la instalación de subbase y base de manera óptima, debido a esto, se hizo necesario avanzar, más en la conformación de la vía con el relleno de crudo y/o material de 3" que con la subbase y base.

- Se hizo control de nivelación de cota rasante de vía, y se evidenció la necesidad de desinstalar los bordillos del K00+000 y ajustar al nivel final de la rasante de vía, por lo que se le solicitó al contratista la desinstalación y reinstalación de bordillos, el cual se realizó a satisfacción de la interventoría.

- De acuerdo a oficio emitido por la secretaria de infraestructura, se nos informó acerca de la apertura de un proceso sancionatorio, debido a la construcción de la alcantarilla ubicada en el K0+750, a lo cual se acató la orden de solicitarle al contratista de abstenerse de seguir adelantando actividad alguna sobre esta alcantarilla, a lo cual el contratista accedió, teniendo en cuenta que para la fecha del oficio, ya se había instalado subbase, por lo que el contratista detiene la instalación de base y carpeta asfáltica sobre esta estructura, adicional a ello, se revisó las determinantes ambientales y se determinó que dicha estructura no se encuentra sobre un sitio de protección o franja de cuerpo de agua, a la fecha nos encontramos a la espera del proceso de Cormacarena.

MES 11-18 (01 SEPTIEMBRE 2023 / 16 MAYO 2024)

- A lo largo de la construcción de la vía desde el K00+000,00 en adelante se encontraron muchos fallos que hizo necesario reemplazar dicho material de capacidad portante por material de crudo de rio, lo anterior con el fin de poder mejorar la capacidad portante de la subrasante y garantizar la estabilidad de la vía.

- También a lo largo de este periodo se presentaron bastantes lluvias, lo cual no permitió avanzar en la instalación de subbase y base de manera óptima, debido a esto, se hizo necesario avanzar, más en la conformación de la vía con el relleno de crudo y/o material de 3" que con la subbase y base.

- La secretaria de infraestructura, soportado en oficio del contratista e interventoría solicitó mediante oficio a Cormacarena, la cesación del procedimiento que dio apertura al proceso sancionatorio número PM-GA-3.11.023.043, con el fin de levantar la medida cautelar sobre la alcantarilla ubicada en el K0+755, a lo que, a la fecha, Cormacarena no ha respondido de manera contundente dicha solicitud.

- Adicionalmente la entidad solicitó a Cormacarena, la prórroga del permiso de ocupación de cauce número PS-GJ.1.2.6.23 0105 de fecha 03 de febrero de 2023.

MES 19 (MAYO 2024)

Luego de iniciar el trámite de la modificación 02, por parte del contratista, interventoría y la secretaria de infraestructura, el cual mediante oficio del 08 de mayo de 2024, se corrigieron las observaciones presentadas por la secretaria de infraestructura, se evidenció la necesidad de solicitar la viabilidad de la nueva señalización que se ajuste al nuevo trazado de la vía, junto con las bandas sonoras solicitadas por la comunidad en las instalaciones de la Contraloría general de la república mediante acta suscrita el dia 04 de abril de 2024, el cual debe cumplir con el manual de señalización del ministerio de transporte y ser viabilizado por parte de la secretaria de movilidad Municipal, por este motivo se solicitó esta viabilidad el día 9 de mayo de 2024 mediante nota interna 1202-19.18/0321, el cual fue viabilizada el dia 14 de mayo de 2024 mediante nota interna 1703-19.18/0434, una vez se cuenta con este concepto se incluyen estas actividades en la modificación 02, por lo cual se hizo necesario la solicitud de prórroga de un (01) mes calendario, con el objetivo de cumplir a satisfacción con estas actividades.

MES 20 (JUNIO2024)

Durante los 16 días del mes de junio, se presentaron varios dias de lluvias que obstaculizó la instalación de las bandas reductoras situación que obligó a la generación del acta de terminación de fecha 17 de junio, (ya que la terminación prevista quedó para el 16 de junio, el cual es un domingo por lo que se firma el siguiente día hábil) con el pendiente de la terminación de la instalación de las bandas sonoras, ya que es necesario que el pavimento este completamente seco para que las bandas se adhieran de manera efectiva. Con el compromiso previo al recibo final, de terminar dichas bandas sonoras por parte del contratista.

2.3.3 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACIONES DE PREDIOS.

- A la fecha del presente informe, el proyecto cuenta con los permisos de ocupación de cauce número PS-GJ.1.2.6.23 0105 de fecha 03 de febrero de 2023 y permiso de aprovechamiento forestal número PS-GJ1.2.6.23 0704 de fecha 16 mayo de 2023.

Debido a lo anterior, el contratista ejecutó las actividades descritas en el permiso de ocupación de cauce, en las coordenadas autorizadas por Cormacarena, con las estructuras aprobadas por Cormacarena y realizando el manejo ambiental según el permiso otorgado por esta entidad.

Respecto al aprovechamiento forestal, el contratista hizo el respectivo aprovechamiento forestal según los árboles relacionados en el permiso ambiental, haciendo entrega de la madera a los propietarios de los predios donde se ubicaron estos árboles aprovechados.

en cuanto a la legalización de predios tenemos la siguiente relación:

- PREDIO RANCHO E' LUNA

F.M.I: 230-37363
Referencia catastral: 50001-0004-0004-0018-000
Oferta de compra: DECRETO 100-24/412/2020 DEL 2020-11-11

Gestión realizada: Se suscribió PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIA del área requerida, se realizó el proceso de ADQUISICIÓN POR DACIÓN EN PAGO, previa solicitud del propietario.

- PREDIO SOTILEZA

F.M.I: 230-247

Referencia catastral: 50001000400040042000
Oferta de compra: DECRETO 100-247/411 /2020 DEL 2020-11-11

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO EL TRUEQUE

F.M.I: 230-74074
Referencia catastral: 50001000400040324000
Oferta de compra: DECRETO 1000-24/413 2020 DEL 2020-11-11

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO SAN BARTOLO

F.M.I: 230-80269
Referencia catastral: 50001000400040396000
Oferta de compra: OFICIO 1030-19/18/4565 DEL 2020-12-15

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO SAN FELIPE 2

F.M.I: 230-73687
Referencia catastral: 50001000400004032500
Oferta de compra: DECRETO 1000-24/414 DEL 2020-11-11

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO BOGOTÁ

F.M.I: 230-120697
Referencia catastral: 50001000400041399000
Oferta de compra: DECRETO 1000-247/727 DEL 2019-12-27

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO LOS GUALOS

F.M.I: 230-164046
Referencia catastral: 00-04-0004-0285-000
Oferta de compra: DECRETO 1000-24/409 2020 DEL 2020-11-11

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- LOTE PARTE HACIENDA SANTA SANTANA

F.M.I: 230-100518
Referencia catastral: 50001000400041290000
Área requerida: 3.428,348 M2

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- LOTE PARTE DE LA HACIENDA SANTANA

F.M.I: 230-100738
Referencia catastral: 50001000400041291000
Área requerida: 3.428,348 M2

Gestión realizada: Se suscribió el permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO LOTE CIMARRON

F.M.I: 230-104965
Referencia catastral: 50001000400041396000
Área requerida: 3.762,02

Gestión realizada: teniendo en cuenta que la necesidad de adquisición de este predio surgió después del cambio de diseño, se proyectó y suscribió permiso de intervención voluntaria, se está realizando el proceso de adquisición por parte del municipio de Villavicencio.

- PREDIO HACIENDA SANTANA

F.M.I: 230-29235
Referencia catastral: 50001000400041289000
Área requerida: 36179.94 M2

Gestión realizada: teniendo en cuenta la modificación en el cambio del trazado, se realizó la solicitud del cambio de DEAS, con el fin de modificar dicho el área a intervenir, a la fecha, ya se realizó el recibo material del suelo."

Pero esta gestión predial la está adelantando la alcaldía municipal, por lo que no tenemos potestad de estos trámites ya que no los adelanta el contratista sino la entidad contratante. Y la adquisición formal de estas franjas de predios la adelantan mediante diferentes mecanismos entre los propietarios y la alcaldía municipal de Villavicencio

2.3.4 CONCLUCIONES Y/O OBSERVACIONES

RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

De acuerdo al manual del interventor, esta interventoría estuvo revisando y controlando que el contratista de obra cumpliera con todas y cada una de las obligaciones contractuales, llegando a la conclusión que es viable realizar el recibo final y liquidación del contrato de obra número 1507 de 2021 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLÓGICO CRUCE CARACOLÍ HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Luego de haber realizado en campo levantamiento topográfico en campo, junto con mediciones, inspecciones y verificaciones se pudieron obtener las cantidades de recibo final, el cual se expresa mediante la siguiente tabla:

CONDICIONES INICLAES						CONIDCIONES SEGÚN MODIFICACION 02		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**									
1.1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo, plano,trans	MES	8.00	$ 14,000,000.00	$ 112,000,000.00	17.00	$ 238,000,000.00	17.00	$ 238,000,000.00	100.00%
2	**DESCAPOTE**									
2.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m, Inc retiro.5 kms	M2	9,485.00	$ 4,830.00	$ 45,812,550.00	25,288.24	$ 122,142,199.20	25,218.55	$ 121,805,596.50	99.72%
3	**EXCAVACIONES**									
3.1	EXCAVACION MECANICA Incluye retiro de sobrantes, para cajas vias	M3	16,485.22	$ 24,400.00	$ 402,239,368.00	13,090.50	$ 319,408,200.00	13,090.37	$ 319,405,028.00	100.00%
4	**RELLENOS**									
4.1	AFIRMADO TAM MAX 3', Incl explot, cargue,transp 5 km	M3	8,215.36	$ 50,000.00	$ 410,768,000.00	22,613.88	$1,130,694,000.00	22,593.29	$1,129,664,500.00	99.91%
4.2	SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km	M3	11,575.54	$ 80,000.00	$ 926,043,200.00	13,065.19	$1,045,215,200.00	13,013.15	$1,041,052,000.00	99.60%
4.3	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2'.Incl. transp 5 km	M3	5,266.60	$ 94,000.00	$ 496,940,400.00	5,712.14	$ 536,941,160.00	5,702.21	$ 536,007,740.00	99.83%
4.4	SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.	M3-KM	190,589.00	$ 1,400.00	$ 266,824,600.00	320,398.76	$ 448,558,270.65	319,068.27	$ 446,695,578.00	99.58%
5	**PAVIMENTOS RIGIDOS**									
5.1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	25,284.53	$ 2,200.00	$ 55,625,966.00	27,735.38	$61,017,836.00	27,611.19	$ 60,744,618.00	99.55%
5.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	1,896.34	$ 710,000.00	$1,346,401,400.00	-	$-	-	$ -	0.00%
6	**SEÑALIZACION**									
6.1	Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA	UND	29.00	$ 386,000.00	$ 11,194,000.00	69.00	$26,634,000.00	68.00	$ 26,248,000.00	98.55%
6.2	PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI	M2	129.80	$ 43,000.00	$ 5,581,400.00	375.44	$16,143,920.00	314.25	$ 13,512,750.00	83.70%
6.3	PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI	ML	10,000.00	$ 5,800.00	$ 58,000,000.00	12,261.00	$71,113,800.00	12,221.72	$ 70,885,976.00	99.68%
6.4	TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS	UND	1,575.00	$ 12,400.00	$ 19,530,000.00	1,531.00	$18,984,400.00	1,519.00	$ 18,835,600.00	99.22%
7	**CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS**									
7.1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGI. Inc retiro 5km	M3	731.09	$ 28,000.00	$ 20,470,520.00	1,078.74	$30,204,720.00	1,078.59	$ 30,200,520.00	99.99%

CONDICIONES INICLAES						CONIDCIONES SEGÚN MODIFICACION 02		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%
7.2	ACERO REFUERZOFIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2, G60)	KG	24,248.00	$ 4,900.00	$ 118,815,200.00	-	$-	-	$ -	0.00%
7.3	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	20.29	$ 460,000.00	$ 9,333,400.00	22.70	$10,442,000.00	22.70	$ 10,442,000.00	100.00%
7.4	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	272.98	$ 970,000.00	$ 264,790,600.00	432.75	$ 419,767,500.00	430.83	$ 417,905,100.00	99.56%
	ITEMS NO PREVISTOS									
INP 1	CERCA ALAMBRE DE PUAS 4HILOS, poste concre. c/2 m	ML	-	$ 28,350.00	$ -	4,659.66	$ 132,101,361.00	4,659.66	$ 132,101,361.00	100.00%
INP 2	DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO	ML	-	$ 10,610.00	$ -	1,353.96	$14,365,515.60	1,353.96	$ 14,365,515.60	100.00%
P 3	CORTE Y RETIRO DE SINGLE	ML	-	$ 39,175.00	$ -	1,266.19	$49,602,993.25	1,266.19	$ 49,602,993.25	100.00%
INP 4	SUMINISTROY SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada) (7 árboles por metro lineal)	ML	-	$ 23,361.00	$ -	860.32	$20,097,935.52	860.32	$ 20,097,935.52	100.00%
INP 5	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBADIESEL 6" INC INST Y	DIA	-	$ 321,591.00	$ -	182.00	$58,529,562.00	182.00	$ 58,529,562.00	100.00%
INP 6	CUNETA (20.7MPa,3000psi) SIN REFUERZO INC. FORMALE	M3	-	$ 771,751.00	$ -	67.22	$51,877,102.22	58.85	$ 45,417,546.35	87.55%
INP 7	TALAARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des	UN	-	$ 424,796.00	$ -	9.00	$3,823,164.00	9.00	$ 3,823,164.00	100.00%
INP 8	TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30m inc. transp5km, dese	UN	-	$ 692,315.00	$ -	-	$-	-	$ -	0.00%
INP 9	BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMCH=2,5CM INC. INSTA	M2	-	$ 336,018.00	$ -	252.00	$84,676,536.00	248.24	$ 83,413,108.32	98.51%
INP 10	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 30"	ML	-	$ 428,209.00	$ -	23.70	$10,148,553.30	23.61	$ 10,110,014.49	99.62%
INP 11	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 36"	ML	-	$ 459,198.00	$ -	55.84	$25,641,616.32	55.83	$ 25,637,024.34	99.98%
INP 12	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	$ 67,710.00	$ -	796.18	$53,909,347.80	738.34	$ 49,993,001.40	92.74%
INP 13	PROTECCION DE TALUDES CON MATERIAL DE DESCAPOTE	M2	-	$ 12,800.00	$ -	2,125.19	$27,202,432.00	2,125.10	$ 27,201,280.00	100.00%
INP 14	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20X50X80cm EXC-TRAN	ML	-	$ 70,152.00	$ -	101.13	$7,094,471.76	101.13	$ 7,094,471.76	100.00%
INP 15	GAVION 2x1x1/10x12/2,4mm, C13,Recubre Zn (260gr/m2)	M3	-	$ 220,360.00	$ -	124.00	$27,324,640.00	123.46	$ 27,205,645.60	99.56%
INP 16	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2 500 Mpa	KG	-	$ 9,973.00	$ -	1,890.81	$18,857,048.13	1,724.86	$ 17,202,028.78	91.22%
INP 17	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM	M3	-	$1,118,094.00	$ -	1,895.21	$2,119,022,929.74	1,893.89	$2,117,547,045.66	99.93%
INP 18	SUMINISTRO, E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CORTADO Y FIGURADO FY=4200 Mpa	KG	-	$ 7,929.00	$ -	30,000.00	$ 237,870,000.00	29,999.89	$ 237,869,127.81	100.00%
INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	-	$ 24,848.00	$ -	7,825.70	$ 194,452,993.60	7,825.60	$ 194,450,508.80	100.00%
INP 20	TALA ARBOL CLASE I 1m<H<5m inc. transp5km, desen	UN	-	$ 138,547.00	$ -	26.00	$3,602,222.00	26.00	$ 3,602,222.00	100.00%

CONDICIONES INICLAES						CONIDCIONES SEGÚN MODIFICACION 02		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%
INP 21	TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen	UN	-	$ 268,564.00	$ -	59.00	$15,845,276.00	59.00	$ 15,845,276.00	100.00%
INP 22	CORTE DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML	-	$ 5,798.00	$ -	355.03	$2,058,463.94	355.03	$ 2,058,463.94	100.00%
INP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACION DE PRECISION)	ML	-	$ 222,566.00	$ -	18.50	$4,117,471.00	18.50	$ 4,117,471.00	100.00%
INP 24	TUBERIA PVC U, MECANICA NTC 37223 ALCANT. 0=400 mm (16") (Inc. nivel precisión)	ML	-	$ 286,367.00	$ -	30.00	$8,591,010.00	30.00	$ 8,591,010.00	100.00%
INP 25	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2" (H=0.92m)	ML	-	$ 508,019.00	$ -	22.00	$11,176,418.00	21.50	$ 10,922,408.50	97.73%
					VALOR TOTAL SUBTOTAL OBRAS		$7,677,256,269.03		$7,648,203,192.62	99.62%
					PLAN MANEJO DE TRANSITO		$ 20,278,500.00		$20,232,058.00	99.77%
					PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)		$ 276,100,000.00		$276,100,000.00	100.00%
					VALOR TOTAL CONTRATO		$7,973,634,769.03		$ 7,944,535,250.62	99.64%
					VALOR TOTAL REDONDEADO AL PESO		$7,973,634,769.00		$ 7,944,535,251.00	99.64%

A solicitud de la supervisión y Con el fin de brindar claridad respecto de los mayores valores en las actividades de comisión topográfica y motobombas, esta interventoría emite concepto en los siguientes términos:

De conformidad con lo pactado en el Contrato de Obra No.1507 de 2021, cuyo objeto es *"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"*, el valor a reconocer y pagar al contratista será bajo el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, tal como se determinó desde los estudios previos y consignó en las cláusulas SEGUNDA – ESPECIFICACIONES TECNICAS y CUARTA – FORMA DE PAGO del acuerdo negocial.

Esta modalidad de pago, de acuerdo con numerosos pronunciamientos del H. Consejo de Estado, corresponde a aquel en el que las partes acuerdan el valor de las distintas unidades o cantidades de obra, de tal suerte que el costo directo total del contrato será el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra ejecutadas y de sumar todos los ítems necesarios para dicha ejecución[1]. Es decir, el valor definitivo a pagar corresponderá a la suma de los resultados que se obtengan de multiplicar los precios unitarios pactados por las cantidades de obra ejecutada; de manera que, uno es el valor estimado del contrato y otro el valor real.

En efecto, el valor estimado en el contrato puede variar, según las mayores o menores cantidades de obra que efectivamente ejecute el contratista para cumplir el objeto pactado, de conformidad con los precios unitarios definidos. Al respecto el consejo de Estado en concepto de 5 de septiembre de 2018, radicado 11001-03-06-000-2018-00124-00(2386), Consejero ponente: ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ, indicó:

[1] Ver entre otros, sentencia de 2 de marzo de 2022 con radicación 25000-23-36-000-2017-00442- 01 (64165) de 2 de marzo de 2022, Concepto 2386 de 5 de septiembre de 2018, Concepto 1920 de 9 de septiembre de 2008.

> *"La modalidad de pago consagrada a partir de unidades de medida, o de cantidades de obra variable con precios unitarios constantes o fijos, no es un requisito exclusivo o excluyente de los contratos de prestación de servicios, pues puede pactarse en otro tipo de contratos, según surja de la libertad de configuración de las partes y de su autonomía de voluntad. (...) La modalidad de pago a precio unitario generalmente utilizada para los contratos de obra, y que permite concretar la obligación de pago de la entidad estatal, según las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, canceladas de conformidad con los precios unitarios pactados. En esta modalidad, y por la misma naturaleza del contrato que impide definir con certeza su valor real, se establecen unas estimaciones de cantidades de obra, según los estudios previos y unos precios unitarios de los respectivos ítems de obra. Se trata de un valor estimado, pues el valor definitivo y que corresponde al deber de la administración de reconocerlo y pagarlo, será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente pactadas por los precios unitarios consagrados en el contrato, dentro de los límites que el mismo contrato establezca. Por lo tanto, uno es el valor estimado del contrato y otro el valor real, según las mayores o menores cantidades de obra que efectivamente ejecute el contratista para cumplir el objeto pactado"*

De manera más reciente, en sentencia de 22 de agosto de 2023, 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58.634), Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN, señaló:

> *"El contrato pactado a precios unitarios, que es el que llama la atención de la Sala en esta oportunidad, implica individualizar el valor de cada uno de los ítems requeridos para llevar a cabo la obra o el proyecto -el cual se deriva, a su vez, de apreciar todos los componentes necesarios para la ejecución de la unidad de medida del ítem correspondiente (metro lineal, metro cúbico, metro cuadrado, etc.)-. Por lo mismo, el precio será el resultado de multiplicar la cantidad finalmente ejecutada por el valor unitario respectivo (...)*
>
> *(...) Conforme a lo indicado en líneas precedentes, el valor del contrato en el sistema a precios unitarios es indicativo o estimativo, motivo por el cual el valor real dependerá de las cantidades que final y efectivamente sean ejecutadas, multiplicadas por los precios unitarios que hayan sido pactados. Por lo mismo, en principio, el reconocimiento de las mayores cantidades de obra no es más que la aplicación de la forma de precio y pago estipuladas en el contrato, es decir, la implementación del procedimiento convenido por las partes para calcular el valor final del negocio jurídico: cantidades ejecutadas por valor de ítem acordado.*
>
> *En línea con lo anterior, es pertinente tener en cuenta que, justamente, la modalidad de pago a precios unitarios se caracteriza porque su determinación final impone establecer las cantidades verdaderamente ejecutadas, multiplicándolas por los precios unitarios; de ahí que lo vinculante en estos casos no sea propiamente el valor total inicialmente estimado, ni las cantidades inicialmente previstas, sino los valores unitarios que las partes acordaron aplicar a cada uno de los ítems"*

Entonces, el contrato de obra pactado a precios unitarios permite individualizar el valor de cada uno de los ítems requeridos en el proyecto, por lo que el precio será el resultado de multiplicar la cantidad finalmente ejecutada por el valor unitario respectivo según los mayores o menores unidades utilizadas en la obra.

Ahora bien, es de destacar que las mayores cantidades de obra es diferente a obras extras o adicionales, siendo lo primero un aumento de cantidades de los ítems pactados en el contrato, y lo segundo la inclusión de actividades no previstas en el acuerdo negocial, conceptos que deben tenerse

en cuenta para efectos del presente concepto, como más adelante se explicará. Sobre esta diferencia, en la sentencia 58.634 de 22 de agosto de 2023, el órgano de cierre de lo contencioso administrativo explicó:

> *"Las mayores cantidades de obra, se repite, se presentan cuando las partes deben aumentar las cantidades de algunos ítems que sí estaban contemplados en el contrato, pero que su cálculo preliminar resultó insuficiente. Así, por ejemplo, si en un contrato de obra se habían previsto y contratado 100 metros cúbicos de excavación, pero, en la etapa de ejecución, se determinó que este número no era suficiente, las partes pueden incrementar los metros que deberán excavarse, en atención a que dicho aumento resulta esencial para cumplir la finalidad pública que se perseguía con la contratación. (...)*
>
> *-Por otro lado, las obras extras o adicionales son aquellas que no estaban convenidas en el contrato, y que, por lo tanto, implican una modificación del mismo, que debe ser pactada por las partes y, en cuanto deriven en un mayor valor -dado que se pueden compensar con cantidades de obras acordadas que ya no se vayan a ejecutar-, ameritarán la celebración de un contrato adicional en valor, fundado en la estipulación de los nuevos precios unitarios. Las obras extras también se encuentran permitidas en la contratación estatal, y son procedentes cuando las mismas resultan esenciales para el cumplimiento del objeto. En relación con este asunto, la Corporación explicó:*
>
> *20. Para resolver el punto de apelación, es preciso distinguir lo que esta Corporación ha definido como obras adicionales. Las obras adicionales se consideran obras distintas de las inicialmente previstas en el objeto contractual, o ítems no previstos pero cuya ejecución se torna necesaria para cumplirlo a cabalidad, en tal sentido su reconocimiento implica variación del contrato.*
>
> *20.1. En armonía con esta noción, su reconocimiento a través de la acción de controversias contractuales implica que la entidad contratante las haya autorizado, se consagren en el contrato a través de modificación de mutuo acuerdo, de manera unilateral o bien en la forma prevista en el respectivo contrato y en todo caso que no obedezcan a la iniciativa del contratista de realizarlas sin consentimiento de la entidad[2].*
>
> *Posteriormente, se aseveró:*
>
> *70. La Sala recuerda que es necesario que exista una modificación para que se condene a una entidad contratante a pagar obras adicionales. Ello es así, puesto que solamente con la modificación se entiende que el contratista tiene la obligación de ejecutarlas y la entidad la correlativa obligación de pagarlas. Esta es una consecuencia de la solemnidad que se exige para los contratos estatales y sus modificaciones; deben constar por escrito. Por tanto, en el caso concreto no puede accederse a esta pretensión, pues se trató, como reconoció [3].*
>
> *Como se observa, no hay duda de que, cuando las partes estimen necesario incluir una obra extra que comprenda aumentar el valor del contrato, se deberá suscribir un contrato adicional, que formalice tal modificación, dado que, de lo contrario, no podrá reconocerse su pago".*

---

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio de 2019, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero. Rad.: 73001-23-31-000-2008-00741-01 (39.974).

[3] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021, C.P.: Alberto Montaña Plata. Rad.: 47001-23-33-001-2013-00363-01 (61.641).

Así pues, las mayores cantidades de obra se presentan cuando se debe aumentar las cantidades de uno o algunos ítems determinados en el contrato, al punto que no puede ser considerado como obras extras o adicionales comoquiera que hacen parte del acuerdo ya negociado entre las partes, es decir, su variación no implica modificación del contrato.

Al no conllevar la modificación del objeto contractual o de los términos contractuales, no hay lugar a que las apartes suscriban un adicional, basta que realicen el resultado de las cantidades ejecutadas por el valor o precio unitario. Concretamente, esta posición puede ser avizorada en el pronunciamiento del Consejo de Estado en concepto de 16 de febrero de 2022, radicación 11001-03-06-000-2021-00167-00 (2473), Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas, en el que manifestó:

> *"El criterio que se ha establecido al respecto, desde el año 2002 y que la Sala hoy reitera, es que en un contrato de obra a precio unitario las mayores cantidades de obra realmente ejecutadas no son una modificación o adición del contrato. En este orden de ideas, se presenta la diferencia entre valor inicial o estimado del contrato y el valor final que resulta de multiplicar la cantidad de obras efectivamente ejecutadas por los precios pactados, tal como lo expresó en el Concepto 1439 del 18 de julio de 2002, citado en el numeral anterior.*
>
> *Esta posición fue reiterada en el Concepto 1920 de 2008 en el cual se resolvieron asuntos similares a los que son objeto de análisis en el presente caso, esto es, sobre la determinación del límite del 50% previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 para la adición de los contratos. En este concepto, analizado en el numeral anterior, la Sala hizo claridad sobre lo que debe entenderse por valor inicial del contrato, a efectos de aplicar el referido límite, e indicó que este corresponde al valor estimado previsto en el contrato original.*
>
> *(...) En síntesis, existe una posición mayoritaria en la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil y en parte de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que concluye que la adición del valor de los contratos estatales, a que se refiere el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se admite en dos casos: i) para agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades no previstas inicialmente en dicho objeto, en las condiciones mencionadas en la celebración del negocio, y/o ii) para modificar el precio del contrato, también en las condiciones establecidas en dicha celebración.*
>
> *En consecuencia, no procede hablar de contrato adicional cuando existen mayores cantidades realmente ejecutadas en los contratos de obra a precio unitario. En estos casos, existirá un valor inicial o estimado del contrato y un valor real que es el que resulte de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por las cantidades pactadas".*

Como corolario de lo expuesto, puede afirmarse que, las partes pueden reconocer las mayores cantidades de obra sin lugar a suscripción de un adicional u otrosí, toda vez que el contrato a precios unitarios presenta un valor inicial o estimado, el cual variará al final conforme resulte de multiplicar la cantidad de obras efectivamente ejecutadas por los precios pactados.

Partiendo de este escenario, se tiene que es posible modificar las cantidades de la COMISION TOPOGRAFICA Y EL MANEJO DE AGUAS, pues la naturaleza del contrato permite variar la estimación inicialmente realizada por las partes, sin que ello implique modificar el acuerdo negocial; se trata de un ajuste en las cantidades requeridas para el desarrollo del objeto contractual, con total

apego a los valores unitarios definidos para cada ítem y conforme a la unidad de medida establecida por las partes. Y es que el Contrato de obra No. 1507 de 2021 inicialmente estableció:

Comisión Topográfica:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1	1,1			COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans	MES	8,00	$ 14.000.000,00	$ 112.000.000,00
Subtotal								**$ 112.000.000,00**

Y mediante acta de modificación 01 se adicionó el ítem INP 05 MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA DIESESL 6" INCL INST Y Cuya unidad es DIA, de la siguiente manera

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**
7.4	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	272.98	$ 970,000.00
	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA			
INP 1	CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, poste concre. c/2 m	ML		$ 28,350.00
INP 2	DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO	ML		$ 10,610.00
INP 3	CORTE Y RETIRO DE SINGLE	ML		$ 39,175.00
INP 4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada)(7 arboles por metro lineal)	ML		$ 23,361.00
INP 5	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y	DIA		$ 321,591.00

Donde inicialmente se presupuestó 120 días.

Pero se debió incrementar en 4 meses la topografía y 62 días el manejo de aguas, partiendo del precio unitario indicado el acuerdo contractual y en las unidades de medidas también establecidas en el contrato, es decir, este reconocimiento de las mayores cantidades de obra no sería más que la aplicación de la forma de precio y pago estipuladas, esto es: cantidades ejecutadas por valor de ítem acordado; quedaría así:

Comisión Topográfica:
17 meses de ejecucion total

Manejo de aguas
182 días de ejecución total

Es pertinente señalar que este incremento se debió a que, el contrato de obra tuvo un plazo inicial de 8 meses, y dentro del presupuesto se contempló igual número de meses de ejecución de la comisión topográfica, 8 meses, sobre el séptimo mes de ejecución, para el 26 de junio de 2023 el contrato tuvo una prórroga de 5 meses y una adición presupuestal, en dicha adición, se tuvo en cuenta también los 5 meses de ejecución de comisión topográfica, pero una vez terminada este tiempo, y observando que

los fallos presentados en la vía y las constantes lluvias presentadas en la zona, no permitieron que se terminara de las actividades de obra, se hizo necesario una adición de 3 meses que se firmó el 13 de diciembre de 2023, pero teniendo en cuenta que dentro del proyecto no era posible una nueva adición, no se pudo adicionar al presupuesto estos 3 meses de ejecución de topografía, de igual manera se adicionó por un mes adicional el proyecto el día 17 de abril de 2024 sin adicionar este mes de ejecución de topografía, por ende ya teniendo 17 meses de ejecución del proyecto, esta interventoría certifica que durante estos 17 meses de ejecución el contratista tuvo a disposición la comisión topográfica, los primeros 7 meses esta comisión levanto de nuevo todo el trayecto y entregó información detallada para los ajustes de diseño de la via, también hizo levantamiento de las zonas de adquisición predial para este rediseño, también localizó las estructuras hidráulicas para el permiso de ocupación de cauce, adicional a ello, realizó el levantamiento de todos lo arboles necesarios para solicitar el permiso de aprovechamiento forestal, y en los 10 meses siguientes la comisión topográfica estuvo presente en el control de volúmenes de construcción, en el replanteo de las obras hidráulicas y en la medición de las actividades construidas para los planos asbuilt, una vez levantado con la topografía las cantidades y hecho el balance, el 16 de mayo de 2024 se hizo una modificación de mayores y menores cantidades de obra, donde, según actividades que se dejaron de ejecutar, fue posible, introducir estos 4 meses de topografía ejecutados faltantes sin afectar el valor del contrato de obra , y también para la fecha se adicionó un mes de ejecución del contrato el cual termino el 16 de junio. Por ende aun cuando no estaba previsto estos 4 meses de topografía, esta actividad era necesaria para llevar control de ejecución del contrato sin el cual, no se podría avanzar en la ejecución de obra sin el control topográfico de esta

Situación similar ocurrió con las horas de manejo de motobombas. Para la adición y prórroga del 26 de junio de 2026 se presupuestaron 120 días de motobomba, pero luego la presencia de las constantes lluvias, se hizo necesario 182 días de manejo de aguas con motobomba para la construcción de las estructuras hidráulicas y en especial la del box del corcovado, que una vez utilizadas los 120 días de manejo de motobombas no se había completado la construcción del box del corcovado, en obra se tomó la decisión de proseguir con el manejo de aguas, con el fin de poder sacar adelante esta construcción y no detener la ejecución de este, ya que se consideró más traumático para la construcción detener la construcción de esta estructura hasta que se surtiera una modificación que permitiera la ejecución de los días faltantes de manejo de aguas, y por consiguiente, en la modificación del 16 de junio también se observó la posibilidad de incluir estos días faltantes de manejo de aguas que si bien fueron ejecutados antes de esta modificación, también fueron necesarios para el avance del proyecto y la entrega en el menor tiempo posible, por ende esta interventoría considera viable reconocer estas actividades al contratista. esenciales para cumplir con el objeto contractual, comoquiera que el acta de modificación 02; amén que solo implica la modificación de las cantidades originalmente previstas, y sin, se reitera, alterar el precio unitario de cada ítem.

Para concluir, el Contrato de Obra No. 1507 de 2021 se estableció en precios unitarios, modalidad de pago que permite la variación en las cantidades de obra dentro de los límites permitidos, sin que se requiera un contrato adicional, pero sí ajustes en el valor de las cantidades ejecutadas. Como en el presente asunto las unidades de medida de las 2 actividades señaladas están ligadas al tiempo, lo procedente es ajustar la cantidad de meses/días definidos en cada uno, para que su pago sea el resultado de multiplicar el total del tiempo por el valor unitario determinado por las partes, pagos que en todo caso deben estar ajustados al avance real del proyecto, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual y el equilibrio económico.

Finalmente, atendiendo que este concepto tiene el alcance previsto para las interventorías, sin asumir la competencia de la entidad de interpretación de las cláusulas contractuales, ni adquirir obligaciones a nombre de esta, quedamos sujetos a los lineamientos y decisión que al respecto brinde el Municipio de Villavicencio.

Dado lo anterior se suscribió acta de recibo final el día 31 de octubre de 2024 por un valor final del proyecto de $ 7,944,535,251.00 (siete mil novecientos cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos mcte.

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito Interventor certifica que durante el periodo total del contrato, comprendido entre el 06 del mes de Diciembre del año 2021 al 16 del mes de junio del año 2024, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de mil seiscientos setenta y un millones doscientos setenta mil novecientos noventa y tres pesos mcte(1,671,270,993.00). con amortización de $00.00 y valor neto de mil seiscientos setenta y un millones doscientos setenta mil novecientos noventa y tres pesos mcte (1,671,270,993.00)

2.3.5 RELACION DE COMITES TECNICOS

NUMERO	OBJETIVO	FECHA
01	Aspectos importantes para la iniciación de ejecución de obras del proyecto	20 de diciembre de 2021
02	Primer acercamiento con la Comunidad y la Veeduria	21 de diciembre de 2021
03	Ver el avance de los Diseños y permisos del proyecto	12 de enero de 2022
04	Primer acercamiento con la E.A.A.V – E.S.P	17 de enero de 2022
05	Seguimiento técnico al contrato de Obra	20 de enero de 2022
06	Revisión de y aprobación de tramos para inicio de actividades	08 de marzo de 2022
07	Diseño definitivo Vía	31 de marzo de 2022
08	Análisis el avance de obra, inconveniente y posibles soluciones	15 de abril del 2022
09	Análisis el avance de obra, inconveniente y posibles soluciones	29 de abril 2022
10	Acta de socialización de Proyecto	07 de mayo de 2022
11	Análisis el avance de obra, inconveniente y posibles soluciones	13 de mayo de 2022
12	Análisis el avance de obra, inconveniente y posibles soluciones	26 de mayo de 2022
13	Análisis de solicitud de adicción	02 de junio de 2022
14	Aspectos importantes para reinicio de obra	11 de diciembre de 2022
15	Revisión de temas ambientales	20 de julio de 2023
16	Verificación de planes ambientales y presupuesto paga	10 de octubre de 2023
17	Revisión de componente legales de cerramiento de colegios	12 de octubre de 2023
18	Revisión de viabilidad de instalación de red de Gas	19 de diciembre de 2023
19	Visita a la obra de la Contraloría	26 de febrero de 2024
20	Revisión de permisos ambientales	28 de mayo de 2024
21	Audición de la contraloría	04 de abril de 2024

2.3.6 CAMBIO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Durante la ejecución del contrato de interventoría se realizó el siguiente cambio de personal. (Anexos)

Profesional Entrante	Profesional saliente	Cargo
Rafael Alfredo Villar Ospina	David Leonardo Rodríguez Bermúdez	Director de Interventoría
David Ricardo Rodríguez Buitrago	Diana Milena Barrero	Inspector de Interventoría
Hugo Fernando Molano	Roció Del Pilar Herrera	Ingeniero Ambiental
Leonardo Ospina Tovar	David Mauricio Bustos Barragán	Topógrafo

2.3.7 CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Esta interventoría certifica que cada una de las actividades ejecutadas por la empresa ECOBRAS S.A en el contrato de Obra 1507 de 2021, estuvieron ceñidas a las especificaciones técnicas, a los estándares de calidad y la normatividad de construcción de vías del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En cada una de las actividades y los procesos, esta interventoría ejerció supervisión y control garantizando la correcta ejecución de los procesos contractivos y la calidad de los materiales.

En este orden de ideas, el concepto de la interventoría a los trabajos ejecutados en el contrato de obra 1507 de 2021, es favorable y a satisfacción de todas las partes.

Aprobación del Informe:

Elaboró: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA Director de la Interventoría	Elaboró: DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO Rep. Legal interventoría

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Código: 1104-F-GDM-25 Versión:2 Fecha:30/09/2024 Página 1 de 1

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja No.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000- DESPACHO ALCALDE
Código y nombre de la oficina productora	1010-OFICINA DE CONTRATACIÓN
Código y nombre de la serie documental	1010-20 CONTRATOS
Código y nombre de la subserie documental	1010-20.06 Contrato De Obra
Nombre del expediente	ECOBRAS / R.L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones

RESPONSABLES			
Elaborado por		**Responsable del área u oficina productora**	
Nombres y apellidos:		**Nombres y apellidos:**	
Cargo:		**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente			


ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

INFORME CONTRATISTA – FINANCIERA

VILLAVICENCIO: Cra. 32 N° 38-70 Of. 1302 – Ed. Romarco Tels. 6715423 – 6715100 Cel. 315-8660074 *BOGOTA: Cra. 15 N° 73-34 Of. 305 Ed. El Cóndor 1 * Tel. 317-6394118 Planta de Asfalto KM. 10 Vía Acacias (Sector Minero de la Cuncia) Tel. 6659739 – email: info@ecobras.co – licitaciones@ecobras.co

CONTRATO DE OBRA N°. 1507 DE 2021

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

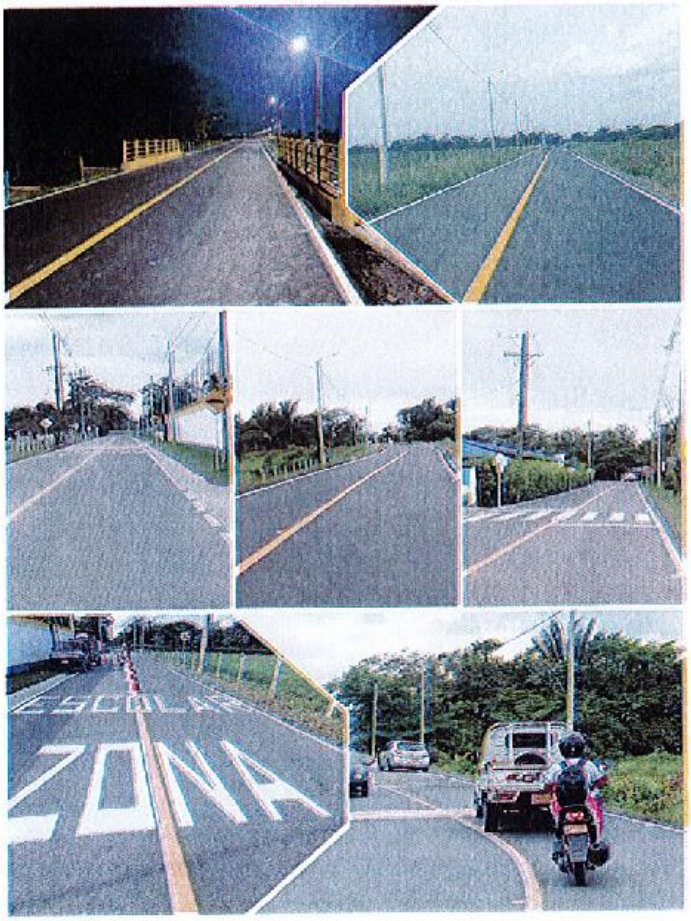

PERIODO DEL INFORME

06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 16 DE JUNIO DE 2024

REVISION Y APROBACION


Objeto del Contrato:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	
Título de Documento:	Informe de Obra Final de Liquidación (06 de diciembre de 2021 al 16 de junio de 2024).	
Documento No:	I INFM-LIQUIDACIÓN	
APROBACION		
	Nombre:	RAFAEL FERNANDO BAQUERO M.
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	31-10-2024
	Nombre:	EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE
Responsable por la revisión:	Firma:	
	Fecha:	31-10-2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 5
2.1 Generalidades 5
2.2 Localización del Proyecto 6
2.3 Avance en Tiempo 7
2.4 Avance Físico 7

3. INFORME CONTRATO DE OBRA 10
3.1 Condiciones Iniciales del Contrato de Obra 10
3.2 Condiciones actualizadas del proyecto. 12
3.2 Condiciones finales del proyecto. 18

4 ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 21
4.1 Actas generadas 21
4.2 Avance financiero y Control Presupuestal 22
4.3 Control de Pólizas 23

5 AVANCE TECNICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO. 28
5.1 Actividades ejecutadas. 28
5.2 Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 54
5.3 Aspectos logísticos 64
5.5 Instalaciones administrativas 65
5.6 Seguridad Industrial y señalización de obra 65
5.5 Control de calidad. 65

6 CONCLUSIONES 71

7 ANEXOS 72

1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de Villavicencio mediante Licitación Pública LP-008-2020 con objeto "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO", adjudicada mediante resolución No. 1010-673.21/188 del 30 de julio de 2021 y modificada en su artículo primero mediante la resolución No. 1010-67.21/232 del 27 de agosto de 2021, a EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. Identificado con NIT. 800.079.482-9, representado legalmente por RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA y suscribiendo para ello el **contrato de obra pública No. 1507 de 2021** el día 27 de agosto de 2021.

La ejecución del contrato corresponde al cumplimiento de las actividades cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO",** suscrito por un valor inicial de $ 4.866.749.104,00 M/CTE y adicionado por un valor de $ 3.106.885.665,00 mediante Acta de Adición 1 y Prórroga 1 del 26 de junio de 2023, teniendo de este modo el contrato por un valor total de $ 7.973.634.769,00.

De esta forma en el presente informe final de liquidación, describe todas las actividades ejecutadas por EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. desde inicio hasta la terminación del contrato de obra 1507 de 2021, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente.

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

2.1 Generalidades

La secretaria de infraestructura con el fin de mejorar la transitabilidad y aumentar la malla vial de la ciudad ha decidido invertir en la conectividad de un carreteable existente de 1940 mts que va desde el punto en el que se intercepta el predio denominado Finca Rancho e´Luna con el plan parcial Santana hasta el cruce del corredor ecológico con el acceso a Caracoli y que presenta falencias en la estructura de soporte, en sus drenajes superficiales, que tiene en su mayor porcentaje baches y material suelto, que generan lentitud y no permite un flujo vehicular permanente afectando los tiempos de recorrido y transitabilidad de los habitantes del sector, generando sobre costos en los transportes y aumentando el valor del mantenimiento de los vehículos y motos.

Con el fin de complementar la accesibilidad del sector entre Caracoli y Charrascal, se continuó con el carreteable a través de una vía completamente nueva en una longitud de 2160 mts que va hacia el noroccidente y a lo largo del plan parcial Santana en una longitud de 830 mts, en donde gira luego hacia el sur occidente buscando las vías urbanas del barrio Charrascal, pero antes pasando por el plan parcial Charrascal 2.

El municipio consciente de esta necesidad y con el conocimiento que, dotándolo de una excelente red vial se mejora la condición de vida de las comunidades, ya que se tiene una mayor facilidad de acceso a servicios como salud, educación, transporte y que además mejoran las ventajas competitivas del municipio, propiciando una mayor actividad económica, con el objeto de optimizar sus esfuerzos para el mejoramiento de la malla vial, adjudicó el contrato de obra 1507 de 2021, para realizar el **MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**

Se decide entonces invertir recursos en infraestructura vial y ofrecer una solución técnica y socioeconómica eficaz para el adecuado desarrollo social del municipio.


En el siguiente cuadro se muestran los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".
N° DE CONTRATO	1507 de 2021
CONTRATISTA	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.866.749.104,00
FECHA DEL CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2021
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO INCIAL	HASTA EL 5-AGOSTO-2022 (8 MESES).

SUSPENSIÓN 1	07 DE JULIO DE 2022 AL 14 DE JUNIO DE 2023
REINICIO 1	15 DE JUNIO DE 2023
ACTA ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 Y MODIFICACIÓN 1	26 JUNIO DE 2023
VALOR ADICIÓN 1	$ 3.106.885.665,00
TIEMPO PRÓRROGA 1	5 MESES
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO	$ 7.973.634.769,00
TIEMPO PRÓRROGA 2	3 MESES
SUSPENSIÓN 2	13 DE MARZO DE 2024 AL 16 DE ABRIL DE 2024
REINICIO 2	17 DE ABRIL DE 2024
TIEMPO PRÓRROGA 3	1 MES
MODIFICACIÓN No. 2	16 DE MAYO DE 2024
TIEMPO PRÓRROGA 4	1 MES
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE JUNIO DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS C.E.
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	99.64 %

2.2 Localización del Proyecto

El proyecto se localiza hacia el costado sur del casco urbano "predominante" del municipio de Villavicencio, el cual está situado en el piedemonte de la Cordillera Oriental.

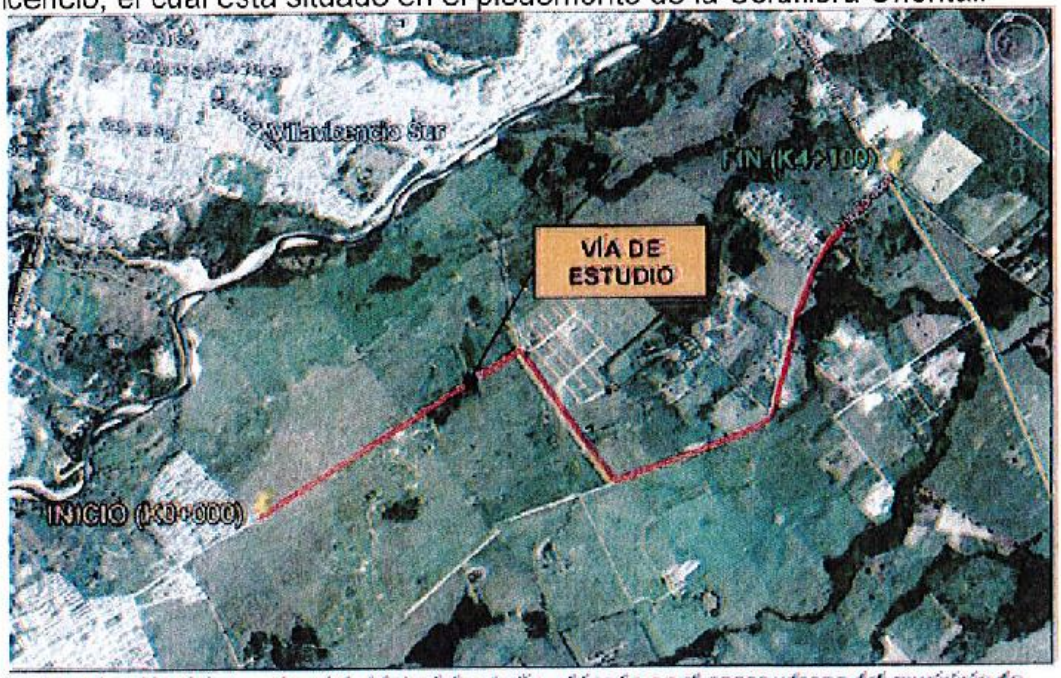

Localización del corredor vial objeto del estudio, ubicado en el casco urbano del municipio de Villavicencio. FUENTE: Google Earth 2018

2.3 Avance en Tiempo

CONTRATO N°	PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS DE EJECUCION	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
1507 DE 2021	18 MESES	06-DIC-21	16-JUNIO-24	540	100.00%

2.4 Avance Físico

En la siguiente tabla se muestra el histórico del avance físico presentado durante el desarrollo del contrato de obra:

MES	% PROGRAMADO ACUM	VALOR PROGRAMADO ACUM	%EJECUTADO ACUM	VALOR EJECUTADO ACUM
DIC-2021	0,24%	$ 19.468.012,08	0,24%	$ 19.468.012,08
ENE-2022	0,45%	$ 35.538.333,57	0,45%	$ 35.538.333,57
FEB-2022	4,56%	$ 363.838.660,82	4,56%	$ 363.838.660,82
MAR-2022	10,82%	$ 862.887.085,92	10,82%	$ 862.887.085,92
ABR-2022	13,31%	$ 1.061.652.094,74	13,31%	$ 1.061.652.094,74
MAY-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
JUN-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
JUL-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
AGO-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
SEP-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
OCT-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
NOV-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
DIC-2022	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
ENE-2023	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
FEB-2023	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
MAR-2023	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
ABR-2023	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
MAY-2023	15,55%	$ 1.239.749.926,08	15,55%	$ 1.239.749.926,08
JUN-2023	17,32%	$ 1.381.090.335,82	16,66%	$ 1.328.325.867,90
JUL-2023	23,64%	$ 1.884.630.775,73	20,07%	$ 1.600.510.664,28
AGO-2023	25,85%	$ 2.061.179.142,98	29,47%	$ 2.349.591.315,27
SEP-2023	28,95%	$ 2.308.634.870,10	39,52%	$ 3.151.073.152,00
OCT-2023	35,55%	$ 2.834.608.813,66	47,09%	$ 3.754.702.676,00
NOV-2023	42,16%	$ 3.361.828.750,31	55,00%	$ 4.385.594.459,00
DIC-2023	49,59%	$ 3.954.465.751,13	60,33%	$ 4.810.154.311,00
ENE-2024	62,85%	$ 5.011.263.961,37	70,94%	$ 5.656.575.548,10
FEB-2024	85,16%	$ 6.790.562.236,48	84,98%	$ 6.775.994.826,70
MAR-2024	85,99%	$ 6.856.528.537,43	85,99%	$ 6.856.528.537,86
ABR-2024	88,60%	$ 7.064.289.797,24	92,52%	$ 7.377.097.205,76
MAY-2024	95,86%	$ 7.643.151.119,98	96,16%	$ 7.667.487.062,04
16/06/2024	100,00%	$ 7.973.634.769,00	99,64%	$ 7.944.535.251,00


PROGRAMADO
EJECUTADO
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO MEDIDO EN RECURSOS
$ 8.000.000.000.000,00
$ 7.000.000.000.000,00
$ 6.000.000.000.000,00
$ 5.000.000.000.000,00
$ 4.000.000.000.000,00
$ 3.000.000.000.000,00
$ 2.000.000.000.000,00
$ 1.000.000.000.000,00
$ 0,00
dic-21
ene-22
mar-22
abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sep-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24


PROGRAMADO
EJECUTADO
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO MEDIDO EN % AVANCE
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
dic-21
ene-22
mar-22
abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sep-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24

%PROGRAMADO ACUMULADO	%FINAL EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE A FAVOR DE LA ENTIDAD
100.00%	99.64%	0.36%

RESUMEN PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor programado del contrato	$ 7.973.634.769,00
Valor ejecutado del contrato	$ 7,944,535,251.00
Tiempo de ejecución	540 DIAS

Dichos porcentajes de avance corresponde al desarrollo de las siguientes actividades:

- COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans.
- DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms.
- EXCAVACION MECANICA Incluye retiro de sobrantes, para cajas vías.
- AFIRMADO TAM MAX 3",Incl explot,cargue,transp 5 km
- SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km
- BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km
- SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.
- IMPRIMACION ASFALTICA
- Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA
- PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI
- PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI
- TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS
- EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGI. Inc retiro 5km
- CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie
- CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS
- CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, poste concre. c/2 m
- DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO
- CORTE Y RETIRO DE SINGLE
- SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada)(7 arboles por metro lineal)
- MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y
- CUNETA (20.7MPa,3000psi) SIN REFUERZO INC. FORMALE
- TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des
- BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMOH=2,5CM INC. INSTA
- SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 30"
- SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 36"
- EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms
- PROTECCION DE TALUDES CON MATERIAL DE DESCAPOTE
- SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20X50X80cm EXC-TRAN
- GAVION 2x1x1/10x12/2,4mm,C13,Recubre Zn (260gr/m2)

- MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa
- SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM
- SUMINISTRO, E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CORTADO Y FIGURADO FY=4200 Mpa
- SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA
- TALA ARBOL CLASE I 1m<H<5m inc. transp5km, desen
- TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen
- CORTE DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACION DE PRECISION)
- TUBERIA PVC U, MECANICA NTC 37223 ALCANT. 0=400 mm (16") (Inc. nivel precision)
- BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2" (H=0.92m)
- PLAN MANEJO DE TRANSITO
- PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)

Actividades que se reportan en el periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2021 al 16 de junio de 2024.

3. INFORME CONTRATO DE OBRA

3.1 Condiciones Iniciales del Contrato de Obra

Las condiciones iniciales pretendían la construcción de una vía nueva pavimentada de 6 mts de ancho entre el Pr 0+000 ubicado en el barrio Charrascal hasta el PR 2+150 (sector finca e´Luna) y continua con la adecuación de un carreteable existente hasta el PR 4+086 en el punto en donde empalma el corredor Ecológico con el acceso a Caracolí, de acuerdo con las actividades y cantidades pactadas inicialmente:



SECTOR CHARRASCAL



SECTOR CARACOLI

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. 1507 DE 2021
INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES								
1	1.1			COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans	MES	8,00	$ 14.000.000,00	$ 112.000.000,00
Subtotal								**$ 112.000.000,00**
DESCAPOTE								
2	2.1			DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,inc retiro 5 kms	M2	9485,00	$ 4.830,00	$ 45.812.550,00
Subtotal								**$ 45.812.550,00**
EXCAVACIONES								
3	3.1			EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(xa cajas vias	M3	16495,22	$ 24.400,00	$ 402.239.368,00
Subtotal								**$ 402.239.368,00**
RELLENOS								
4	4,1			AFIRMADO TAM MAX 3",incl explot,cargue,transp 5 km	M3	8.215,35	$ 50.000,00	$ 410.768.000,00
	4,2			SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km	M3	11.575,54	$ 80.000,00	$ 926.043.200,00
	4,3			BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" ,Incl. transp 5 km	M3	5.286,60	$ 94.000,00	$ 496.940.400,00
	4,4			SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.	M3-KM	190.589,00	$ 1.400,00	$ 266.824.600,00
Subtotal								**$ 2.100.576.200,00**
CARPETA ASFALTICA								
5	5,1			IMPRIMACION ASFALTICA	M2	25.284,53	$ 2.200,00	$ 55.625.966,00
	5,2			SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	1.896,34	$ 710.000,00	$ 1.346.401.400,00
Subtotal								**$ 1.402.027.366,00**
SEÑALIZACION								
6	6,1			Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP48-47-48 INC INSTA	UND	29,00	$ 386.000,00	$ 11.194.000,00
	6,2			PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI	M2	129,80	$ 43.000,00	$ 5.581.400,00
	6,3			PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI	ML	10.000,00	$ 5.800,00	$ 58.000.000,00
	6,4			TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS	UND	1.575,00	$ 12.400,00	$ 19.530.000,00
Subtotal								**$ 94.305.400,00**
CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS								
7	7,1			EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGL Inc retiro 5km	M3	731,09	$ 28.000,00	$ 20.470.520,00
	7,2			ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	24.246,00	$ 4.900,00	$ 118.815.200,00
	7,3			CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	20,29	$ 460.000,00	$ 9.333.400,00
	7,4			CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	272,98	$ 970.000,00	$ 264.790.600,00
Subtotal								**$ 413.409.720,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 4.570.370.604,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 4.570.370.604,00**
PLAN MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 20.278.500,00
PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)	$ 276.100.000,00
VALOR TOTAL	**$ 4.866.749.104,00**

3.2 Condiciones actualizadas del proyecto.

Una vez replanteado y plasmado los diseños en campo se realiza un análisis detallado de cantidades y actividades contempladas en el presupuesto inicial, respecto a los planos de diseños del proyecto y se evidencia la necesidad de incluir actividades y cantidades no previstas, necesarias para el buen funcionamiento y garantía de estabilidad del proyecto, en beneficio de la comunidad, es por ello por lo que el 26 de junio de 2023 se firma ACTA DE ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 por medio de la cual se actualizan las condiciones del contrato 1507 de 2021. Esta actualización comprendió la inclusión de 18 ítems no previstos, necesarios para la ejecución del objeto del contrato y se incluyó un adicional presupuestal por $ 3,106,885,665.00, teniéndose el presupuesto de obra que se muestra a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 26/06/23					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
1	PRELIMINARES				
1.1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans	MES	13.00	$ 14,000,000.00	$ 182,000,000.00
2	DESCAPOTE				
2.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	36,830.49	$ 4,830.00	$ 177,891,266.70
3	EXCAVACIONES				
3.1	EXCAVACION MECANICA Incluye retiro de sobrantes, para cajas vias.	M3	10,715.87	$ 24,400.00	$ 261,467,228.00
4	RELLENOS				
4.1	AFIRMADO TAM MAX 3",Incl explot,cargue,transp 5 km	M3	21,689.07	$ 50,000.00	$ 1,084,453,500.00
4.2	SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km	M3	12,973.38	$ 80,000.00	$ 1,037,870,400.00
4.3	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	5,713.94	$ 94,000.00	$ 537,110,360.00
4.4	SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.	M3-KM	316,730.95	$ 1,400.00	$ 443,423,330.00
5	PAVIMENTOS RIGIDOS				
5.1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	27,856.92	$ 2,200.00	$ 61,285,224.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 26/06/23					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
5.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	-	$ 710,000.00	$ 0.00
6	**SEÑALIZACION**				
6.1	Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA	UND	29.000	386,000	$ 11,194,000.00
6.2	PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI	M2	129.800	43,000	$ 5,581,400.00
6.3	PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI	ML	12,261.00	$ 5,800.00	$ 71,113,800.00
6.4	TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS	UND	1,575.00	$ 12,400.00	$ 19,530,000.00
7	**CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS**				
7.1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGI. Inc retiro 5km	M3	839.120	$ 28,000.00	$ 23,495,360.00
7.2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	$ 4,900.00	$ 0.00
7.3	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	28.13	$ 460,000.00	$ 12,939,800.00
7.4	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	516.30	$ 970,000.00	$ 500,811,000.00
	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA				
INP 1	CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, poste concre. c/2 m	ML	4,987.00	$ 28,350.00	$ 141,381,450.00
INP 2	DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO	ML	2,260.00	$ 10,610.00	$ 23,978,600.00
INP 3	CORTE Y RETIRO DE SINGLE	ML	1,210.00	$ 39,175.00	$ 47,401,750.00
INP 4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada)(7 arboles por metro lineal)	ML	1,210.00	$ 23,361.00	$ 28,266,810.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 26/06/23					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
INP 5	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y	DIA	120.00	$ 321,591.00	$ 38,590,920.00
INP 6	CUNETA (20.7MPa,3000psi) SIN REFUERZO INC. FORMALE	M3	311.52	$ 771,751.00	$ 240,415,871.52
INP 7	TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des	UN	62.00	$ 424,796.00	$ 26,337,352.00
INP 8	TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30m inc. transp5km, dese	UN	9.00	$ 692,315.00	$ 6,230,835.00
INP 9	BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMOH=2,5CM INC. INSTA	M2	75.00	$ 336,018.00	$ 25,201,350.00
INP 10	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 30"	ML	24.00	$ 428,209.00	$ 10,277,016.00
INP 11	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 36"	ML	65.00	$ 459,198.00	$ 29,847,870.00
INP 12	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	209.78	$ 67,710.00	$ 14,204,203.80
INP 13	PROTECCION DE TALUDES CON MATERIAL DE DESCAPOTE	M2	4,721.30	$ 12,800.00	$ 60,432,640.00
INP 14	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20X50X80cm EXC-TRAN	ML	80.00	$ 70,152.00	$ 5,612,160.00
INP 15	GAVION 2x1x1/10x12/2,4mm,C13,Recubre Zn (260gr/m2)	M3	42.00	$ 220,360.00	$ 9,255,120.00
INP 16	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	9,305.83	$ 9,973.00	$ 92,807,042.59
INP 17	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM	M3	1,893.56	$ 1,118,094.00	$ 2,117,178,074.64
INP 18	SUMINISTRO, E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CORTADO Y FIGURADO FY=4200 Mpa	KG	41,577.82	$ 7,929.00	$ 329,670,534.78
VALOR TOTAL SUBTOTAL OBRAS					$ 7,677,256,269.03

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 26/06/23					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
PLAN MANEJO DE TRANSITO					$ 20,278,500.00
PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)					$ 276,100,000.00
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO					**$ 7,973,634,769.03**
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO REDONDEADO AL PESO					**$ 7,973,634,769.00**

Posteriormente el 16 de mayo de 2024 se aprueba acta de modificación de cantidades No. 2 incluyéndose 7 ítems no previstos sin afectar el valor del contrato correspondiente a $7,973,634,769.00.

Por tanto, las condiciones contractuales con las cuales termina el proyecto corresponden a:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 16/05/24					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
1	**PRELIMINARES**				
1.1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans	MES	17.00	$ 14,000,000.00	$238,000,000.00
2	**DESCAPOTE**				$0
2.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	25,288.24	$ 4,830.00	$122,142,199.20
3	**EXCAVACIONES**				$0
3.1	EXCAVACION MECANICA Incluye retiro de sobrantes, para cajas vias.	M3	13,090.50	$ 24,400.00	$319,408,200.00
4	**RELLENOS**				$0
4.1	AFIRMADO TAM MAX 3",Incl explot,cargue,transp 5 km	M3	22,613.88	$ 50,000.00	$1,130,694,000.00
4.2	SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km	M3	13,065.19	$ 80,000.00	$1,045,215,200.00
4.3	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	5,712.14	$ 94,000.00	$536,941,160.00
4.4	SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.	M3-KM	320,398.76475	$ 1,400.00	$448,558,270.65
5	**PAVIMENTOS RIGIDOS**				$0
5.1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	27,735.38	$ 2,200.00	$61,017,836.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 16/05/24					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
5.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	-	$ 710,000.00	$0
6	SEÑALIZACION				$0
6.1	Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA	UND	69.00	386,000	$26,634,000.00
6.2	PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI	M2	375.44	43,000	$16,143,920.00
6.3	PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI	ML	12,261.00	$ 5,800.00	$71,113,800.00
6.4	TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS	UND	1,531.00	$ 12,400.00	$18,984,400.00
7	CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS				$0
7.1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGI. Inc retiro 5km	M3	1,078.74	$ 28,000.00	$30,204,720.00
7.2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	$ 4,900.00	$0
7.3	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	22.70	$ 460,000.00	$10,442,000.00
7.4	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	432.75	$ 970,000.00	$419,767,500.00
	ITEMS NO PREVISTOS				$0
INP 1	CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, poste concre. c/2 m	ML	4,659.66	$ 28,350.00	$132,101,361.00
INP 2	DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO	ML	1,353.96	$ 10,610.00	$14,365,515.60
INP 3	CORTE Y RETIRO DE SINGLE	ML	1,266.19	$ 39,175.00	$49,602,993.25
INP 4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada)(7 arboles por metro lineal)	ML	860.32	$ 23,361.00	$20,097,935.52

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 16/05/24					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
INP 5	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y	DIA	182.00	$ 321,591.00	$58,529,562.00
INP 6	CUNETA (20.7MPa,3000psi) SIN REFUERZO INC. FORMALE	M3	67.22	$ 771,751.00	$51,877,102.22
INP 7	TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des	UN	9.00	$ 424,796.00	$3,823,164.00
INP 8	TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30m inc. transp5km, dese	UN	-	$ 692,315.00	$0
INP 9	BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMOH=2,5CM INC. INSTA	M2	252.00	$ 336,018.00	$84,676,536.00
INP 10	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 30"	ML	23.70	$ 428,209.00	$10,148,553.30
INP 11	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 36"	ML	55.84	$ 459,198.00	$25,641,616.32
INP 12	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	796.18	$ 67,710.00	$53,909,347.80
INP 13	PROTECCION DE TALUDES CON MATERIAL DE DESCAPOTE	M2	2,125.19	$ 12,800.00	$27,202,432.00
INP 14	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20X50X80cm EXC-TRAN	ML	101.13	$ 70,152.00	$7,094,471.76
INP 15	GAVION 2x1x1/10x12/2,4mm,C13,Recubre Zn (260gr/m2)	M3	124.00	$ 220,360.00	$27,324,640.00
INP 16	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	1,890.81	$ 9,973.00	$18,857,048.13
INP 17	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM	M3	1,895.21	$ 1,118,094.00	$2,119,022,929.74
INP 18	SUMINISTRO, E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CORTADO Y FIGURADO FY=4200 Mpa	KG	30,000.00	$ 7,929.00	$237,870,000.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA DEL 16/05/24					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	
INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	7,825.70	$24,848.00	$194,452,993.60
INP 20	TALA ARBOL CLASE I 1m<H<5m inc. transp5km, desen	UN	26.00	$138,547.00	$3,602,222.00
INP 21	TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen	UN	59.00	$268,564.00	$15,845,276.00
INP 22	CORTE DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML	355.03	$5,798.00	$2,058,463.94
INP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACION DE PRECISION)	ML	18.50	$222,566.00	$4,117,471.00
INP 24	TUBERIA PVC U, MECANICA NTC 37223 ALCANT. 0=400 mm (16") (Inc. nivel precision)	ML	30.00	$286,367.00	$8,591,010.00
INP 25	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2" (H=0.92m)	ML	22.00	$508,019.00	$11,176,418.00
VALOR TOTAL SUBTOTAL OBRAS					$ 7,677,256,269.03
PLAN MANEJO DE TRANSITO					$ 20,278,500.00
PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)					$ 276,100,000.00
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO					**$ 7,973,634,769.03**
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO REDONDEADO AL PESO					**7,973,634,769.00**

3.2 Condiciones finales del proyecto según acta de recibo.

Las cantidades finales ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual del proyecto corresponde a las mostradas a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans	MES	17.00	$ 14,000,000.00	$ 238,000,000.00
2	**DESCAPOTE**				
2.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	25,218.55	$ 4,830.00	$ 121,805,596.50
3	**EXCAVACIONES**				
3.1	EXCAVACION MECANICA Incluye retiro de sobrantes, para cajas vias	M3	13,090.37	$ 24,400.00	$ 319,405,028.00
4	**RELLENOS**				
4.1	AFIRMADO TAM MAX 3",Incl explot,cargue,transp 5 km	M3	22,593.29	$ 50,000.00	$ 1,129,664,500.00
4.2	SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km	M3	13,013.15	$ 80,000.00	$ 1,041,052,000.00
4.3	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	5,702.21	$ 94,000.00	$ 536,007,740.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
4.4	SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.	M3-KM	319,068.27	$ 1,400.00	$ 446,695,578.00
5	**PAVIMENTOS RIGIDOS**				
5.1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	27,611.19	$ 2,200.00	$ 60,744,618.00
5.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	-	$ 710,000.00	$ -
6	**SEÑALIZACION**				
6.1	Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA	UND	68.00	$ 386,000.00	$ 26,248,000.00
6.2	PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI	M2	314.25	$ 43,000.00	$ 13,512,750.00
6.3	PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI	ML	12,221.72	$ 5,800.00	$ 70,885,976.00
6.4	TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS	UND	1,519.00	$ 12,400.00	$ 18,835,600.00
7	**CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS**				
7.1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGI. Inc retiro 5km	M3	1,078.59	$ 28,000.00	$ 30,200,520.00
7.2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	$ 4,900.00	$ -
7.3	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	22.70	$ 460,000.00	$ 10,442,000.00
7.4	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	430.83	$ 970,000.00	$ 417,905,100.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
INP 1	CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, poste concre. c/2 m	ML	4,659.66	$ 28,350.00	$ 132,101,361.00
INP 2	DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO	ML	1,353.96	$ 10,610.00	$ 14,365,515.60
INP 3	CORTE Y RETIRO DE SINGLE	ML	1,266.19	$ 39,175.00	$ 49,602,993.25
INP 4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada)(7 arboles por metro lineal)	ML	860.32	$ 23,361.00	$ 20,097,935.52
INP 5	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y	DIA	182.00	$ 321,591.00	$ 58,529,562.00
INP 6	CUNETA (20.7MPa,3000psi) SIN REFUERZO INC. FORMALE	M3	58.85	$ 771,751.00	$ 45,417,546.35
INP 7	TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des	UN	9.00	$ 424,796.00	$ 3,823,164.00
INP 8	TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30m inc. transp5km, dese	UN	-	$ 692,315.00	$ -
INP 9	BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMOH=2,5CM INC. INSTA	M2	248.24	$ 336,018.00	$ 83,413,108.32
INP 10	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 30"	ML	23.61	$ 428,209.00	$ 10,110,014.49
INP 11	SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 36"	ML	55.83	$ 459,198.00	$ 25,637,024.34
INP 12	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	738.34	$ 67,710.00	$ 49,993,001.40

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
INP 13	PROTECCION DE TALUDES CON MATERIAL DE DESCAPOTE	M2	2,125.10	$ 12,800.00	$ 27,201,280.00
INP 14	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20X50X80cm EXC-TRAN	ML	101.13	$ 70,152.00	$ 7,094,471.76
INP 15	GAVION 2x1x1/10x12/2,4mm,C13,Recubre Zn (260gr/m2)	M3	123.46	$ 220,360.00	$ 27,205,645.60
INP 16	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	1,724.86	$ 9,973.00	$ 17,202,028.78
INP 17	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM	M3	1,893.89	$ 1,118,094.00	$ 2,117,547,045.66
INP 18	SUMINISTRO, E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CORTADO Y FIGURADO FY=4200 Mpa	KG	29,999.89	$ 7,929.00	$ 237,869,127.81
INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	7,825.60	$ 24,848.00	$ 194,450,508.80
INP 20	TALA ARBOL CLASE I 1m<H<5m inc. transp5km, desen	UN	26.00	$ 138,547.00	$ 3,602,222.00
INP 21	TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen	UN	59.00	$ 268,564.00	$ 15,845,276.00
INP 22	CORTE DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML	355.03	$ 5,798.00	$ 2,058,463.94
INP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACION DE PRECISION)	ML	18.50	$ 222,566.00	$ 4,117,471.00
INP 24	TUBERIA PVC U, MECANICA NTC 37223 ALCANT. 0=400 mm (16") (Inc. nivel precision)	ML	30.00	$ 286,367.00	$ 8,591,010.00
INP 25	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2" (H=0.92m)	ML	21.50	$ 508,019.00	$ 10,922,408.50
				VALOR TOTAL SUBTOTAL OBRAS	**$ 7,648,203,192.62**
				PLAN MANEJO DE TRANSITO	**$ 20,232,058.00**
				PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)	**$ 276,100,000.00**
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 7,944,535,250.62**
				VALOR TOTAL REDONDEADO AL PESO	**$ 7,944,535,251.00**

4 ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1 Actas generadas

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista, Interventoría y entidad contratante las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	06/12/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	07/07/2022
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1	06/09/2022
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1	05/11/2022
AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 1	04/01/2023
AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN 1	04/03/2023
AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN 1	04/04/2023
ACTA DE REINICIO 1	15/06/2023
ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1	26/06/2023
ACTA MODIFICATORIA No. 1	26/06/2023
ACTA DE PRÓRROGA No. 2	13/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	13/03/2024
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2	02/04/2024
ACTA DE REINICIO 2	17/04/2024
ACTA DE PRÓRROGA No. 3	17/04/2024
MODIFICATORÍA No. 2	16/05/2024
ACTA DE PRÓRROGA No. 4	16/05/2024
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	16/06/2024
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA	31/10/2024

4.2 Avance financiero y Control Presupuestal

Tal como quedó establecido contractualmente en la cláusula cuarta del contrato de obra 1507 de 2021, se determinó que el municipio de Villavicencio pagará a EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. actas de pago parcial de ejecución de obra, de la siguiente manera:

> *"Un primer pago parcial correspondiente mínimo al 20% de ejecución del valor del contrato y posteriormente mediante actas parciales hasta máximo el 80% del valor total del contrato, el saldo restante, es decir como mínimo del 20% del valor del contrato se pagará con la suscripción del acta de liquidación y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad entre los que están el recibo de la obra y la liquidación del contrato."*

A la fecha se han facturado las siguientes actas de cobro parcial de obra, quedando pendiente por cobrar en la liquidación y a favor de la entidad los siguientes valores:

CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	06/12/2021-05/08/2022	$4.866.749.104,00	$0.00	$0.00	0.00%
ADICIÓN 1 Y MODIFICACIÓN 1 CONTRATO	26/06/2023	$3.106.885.665,00	$0.00	$7.973.634.769,00	0.00%
ANTICIPO	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
ANTICIPO ADICIÓN	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO SEGÚN MODIFICACIÓN 1	26/06/2023	$7.973.634.769,00	$0.00	$7.973.634.769,00	0.00%
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO SEGÚN MODIFICACIÓN 2	16/05/2024	$7.973.634.769,00	$0.00	$7.973.634.769,00	0.00%
PARCIAL 01	06/12/2021-20/09/2023	$2.311.451.473,00	$0.00	$2.311.451.473,00	28.99%
PARCIAL 02	21/09/2023-28/02/2024	$3.961.812.785,00	$0.00	$3.961.812.785,00	49.69%
VALOR PARA FACTURAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	29/02/2024 – 16/06/2024	**$1,671,270,993.00**	$0.00	**$1,671,270,993.00**	20.96%
SALDO A FAVOR DE ENTIDAD	N/A	**$ 29,099,518.00**	$0.00	**$ 29,099,518.00**	0.36%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	**$7.973.634.769,00**	$0.00	**$7.973.634.769,00**	100.00%

4.3 Control de Pólizas

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra:

SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	27-08-2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27-08-2021	27-08-2022	$ 973.349.820,80
Salarios y Prestaciones Sociales	27-08-2021	27-04-2025	$ 243.337.455,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	27-08-2021	27-04-2022	$ 454.263.000,00
Estabilidad obra	28-04-2022	28-04-2027	$ 2.433.374.552,00

SEGÚN ACTA DE INICIO			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	16-12-2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	06-12-2022	$ 973.349.820,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	06-08-2025	$ 243.337.455,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	06-08-2022	$ 454.263.000,00
Estabilidad obra	06-08-2022	06-08-2027	$ 2.433.374.552,00

SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 1			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	24-08-2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	06-02-2023	$ 973.349.820,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	06-10-2025	$ 243.337.455,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	06-10-2022	$ 454.263.000,00
Estabilidad obra	06-08-2022	06-08-2027	$ 2.433.374.552,00

SEGÚN ACTA AMPLIACIÓN 1, 2, 3, 4 Y 5 A LA SUSPENSION No. 1 Y ACTA DE REINICIO 1			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	12-07-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	13-11-2023	$ 973.349.820,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	13-07-2026	$ 243.337.455,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	13-07-2023	$ 580.000.000,00
Estabilidad obra	13-07-2023	13-07-2028	$ 2.433.374.552,00

SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1, ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No 1			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	13-07-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	13-04-2024	$ 1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	13-12-2026	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	13-12-2023	$ 580.000.000,00
Estabilidad obra	13-12-2023	13-12-2028	$ 3.986.817.384,50
SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA No 2			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	21-12-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	13-07-2024	$ 1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	13-03-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	13-03-2024	$ 580.000.000,00
Estabilidad obra	13-03-2024	13-03-2029	$ 3.986.817.384,50

SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 2			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	27-03-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	02-08-2024	$ 1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	02-04-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	02-04-2024	$ 650.000.000,00
Estabilidad obra	02-04-2024	02-04-2029	$ 3.986.817.384,50
SEGÚN ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2 Y REINICIO No 2			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	10-05-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	17-08-2024	$ 1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	17-04-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	17-04-2024	$ 650.000.000,00
Estabilidad obra	17-04-2024	17-04-2029	$ 3.986.817.384,50

SEGÚN PRÓRRROGA No 3			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	17-05-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	17-09-2024	$ 1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	17-05-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	17-05-2024	$ 650.000.000,00
Estabilidad obra	17-04-2024	17-05-2029	$ 3.986.817.384,50

SEGÚN PRÓRRROGA No 4 Y MODIFICATORÍA No. 2			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	21-05-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	16-10-2024	$ 1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	16-06-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	16-06-2024	$ 650.000.000,00
Estabilidad obra	16-06-2024	16-06-2029	$ 3.986.817.384,50

SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	20-06-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	16-10-2024	$1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	16-06-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	16-06-2024	$650.000.000,00
Estabilidad obra	16-06-2024	16-06-2029	$3.986.817.384,50

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA			
Póliza de Cumplimiento	PÓLIZA No. 133030		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	PÓLIZA No. 9055		
Expedida por:	SEGURO EXPO BANCOLDEX-CESCE.		
Fecha de expedición.	07-11-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	06-12-2021	16-10-2024	$1.594.726.953,80
Salarios y Prestaciones Sociales	06-12-2021	16-06-2027	$ 398.681.738,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-12-2021	16-06-2024	$650.000.000,00
Estabilidad obra	31-10-2024	31-10-2029	$3.986.817.384,50

5 AVANCE TECNICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO.

5.1 Actividades ejecutadas.

- COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans.
  Se realizó localización, trazado, replanteo, control y levantamiento topográfico durante el desarrollo de las actividades de obra y posterior a ellas para la elaboración de los planos récord en una longitud de 4.088 Km, la comisión topográfica conformada permanentemente por un topógrafo y dos cadeneros y en labores de oficina un dibujante, trabajaron de manera constante durante 17 meses, dotados con equipos topográficos tales como estación total y nivel de presión cada uno debidamente avalado para su uso mediante certificado de calibración vigente.




Para esta actividad en particular la cantidad contractual fijada según la modificatoria número 1 aprobada el 26 de junio de 2023 correspondía a 13 meses, lo que correspondía ejecutarla hasta el 13 de diciembre de 2023; sin embargo, teniendo en cuenta que en primera medida esta actividad es fundamentalmente predecesora de todas las actividades constructivas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que si no se hubiera seguido ejecutando no se hubiera podido seguir desarrollando las demás actividades que se tenían previstas en el cronograma de trabajo, que además de ellos es un ítem existente y contractualmente vigente y que teniendo en cuenta el balance presupuestal del contracto se contaba con recursos financieros para seguir ejecutándola, esta actividad se siguió ejecutando durante 4 meses más y la formalización contractual de estos cuatro meses adicionales de ejecución de topografía se dio mediante la aprobación de la modificatoria No. 2 aprobada el 16 de mayo de 2024.

- DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms.
  Se ejecutó descapote mecánico removiendo 0.15m de capa vegetal o turba en los puntos requeridos a través del ancho total de la pata de terraplén de afirmado o ancho de excavación según aplicara, en los puntos de vía existente y transitada debido al tener una superficie de trabajo expuesta y lista para trabajos de excavación o relleno no fue necesario ejecutar la actividad.



- EXCAVACION MECANICA Incluye retiro de sobrantes, para cajas vías.
  Se realizó excavación mecánica para caja de vías a través de los 4.088 Km de vía según el anchos y cotas estipuladas en el diseño geométrico, de igual forma se ejecutó esta actividad en los puntos de mejoramiento de subrasante y en los sitios específicos donde se encontraron fallos y fue necesario el reemplazo del material in sitú con material tipo afirmado para mejorar la capacidad de soporte de la subrasante. De igual forma se efectúo excavación mecánica para la conformación de los accesos vehiculares de los predios colindantes con la vía en intervención y para la instalación de sardinel prefabricado en el K0+000 punto de intersección de la vía intervenida con la vía existente del barrio Charrascal.

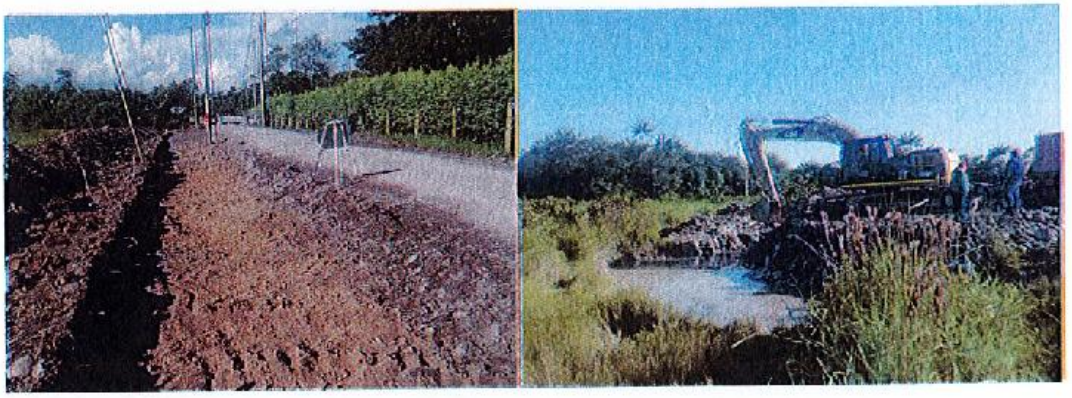

- AFIRMADO TAM MAX 3"Incl explot,cargue,transp 5 km
  Se instaló afirmado tamaño máximo 3 pulgadas con espesor variable hasta la cota especificada en el diseño geométrico a través de los 4.088 Km de longitud de vía, en los puntos en los que se requirió mejoramiento de subrasante según recomendaciones geotécnicas para garantizar un adecuado comportamiento de la estructura de pavimento y en los sitios puntuales donde se encontraron fallos y fue necesario el reemplazo del material in sitú con material tipo afirmado para mejorar la capacidad de soporte de la subrasante. En los puntos de construcción de las obras transversales de drenaje se realizó mejoramiento con material de relleno de estas especificaciones y en los puntos de construcción de gaviones, esto con el fin de mejorar las condiciones mecánicas de soporte de la subrasante.



El aumento de la cantidad de este ítem con respecto a la cantidad que se estipulada en la modificación No. 1 del 26 de junio de 2023 se debe a que a medida que se fue avanzado en la construcción de la estructura de vía se encontraron fallos en la subrasante que no se tenían previstos, donde fue necesario reemplazar el material in situ por material tipo afirmado para aumentar la capacidad portante, para que de este modo se pudiera garantizar la estabilidad y la calidad de la estructura instalada y continuar con la construcción de la misma. La formalización del aumento de la cantidad en esta actividad se dio mediante la modificatoria No. 2 del 16 de mayo de 2024.

- SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km

  Se realiza la instalación de subbase granular seleccionada de río tamaño máximo 2 pulgadas a través de los 4.088 Km de vía que comprendió el proyecto, con un espesor uniforme de 0.40m, ancho típico pata de terraplén de 8.46m y ancho de corona de terraplén de 7.22m, se instaló subbase durante la conformación y construcción de los accesos vehiculares en los predios colindantes con la vía en intervención y en la zona de construcción de cunetas para el mejoramiento de la capacidad portante de la subrasante.



Referente al aumento de la cantidad de este ítem con respecto a la cantidad que se estipulada en la modificación No. 1 del 26 de junio de 2023 se dio debido a que se requirió la construcción de acceso vehiculares a los predios aledaños a la vía para

garantizarle iguales o mejores condiciones a las iniciales y de igual forma para proteger el hombro de la estructura de pavimento ante los efectos erosivos del tránsito de los vehículos que ingresan a estos predios a través de los accesos vehiculares, de este modo se realizó la construcción de rampas en material tipo subbase granular seleccionada, para el caso de la construcción de cunetas se realizó un mejoramiento de la subrasante en subbase granular seleccionada y de este modo se garantizó una adecuada capacidad portante del terreno que asegure un buen comportamiento de las cunetas antes las cargas que van a recibir. La formalización del aumento de la cantidad en esta actividad se dio mediante la modificatoria No. 2 del 16 de mayo de 2024 y la cantidad adicional se comenzó a ejecutar a partir de esta fecha.

- BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km

Se realiza instalación de base triturada tamaño máximo 1 ½" a través de los 4.088 Km de vía intervenidos, con espesor uniforme de 0.20m, ancho tipico de pata de terraplén de 7.22 m y con un ancho típico de corona de terraplén de 6.60m, teniendo en cuenta que la carpeta asfáltica tiene un ancho típico de 6m, la estructura de pavimento construida en el proyecto se entrega con una berma hombro de 0.30m en cada extremo del eje de la vía debidamente imprimada para que de este modo la corona de base instalada corresponda a 6.60m.



- SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.

Teniendo en cuenta que las canteras (las más cercanas que cumple con las condiciones técnicas, ambientales y legales mínimas para suministrar el material) de las cuales procede el material granular tipo afirmado tamaño máximo 3", subbase granular seleccionada de rio tamaño máximo 2" y base triturada tamaño máximo 1 ½" se encuentran a una distancia mayor a 5km que corresponde al sobre acarreo máximo que incluye cada uno de los anteriores ítems de material granular mencionados, fue necesario hacer uso del ítem de sobre acarreo para garantizar el transporte y el posterior suministro del material en una distancia mayor establecida intrínsecamente dentro de la actividad, de igual forma para el caso de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19 cuyo ítem incluye 5 Km de transporte y para la cual la distancia supera esta longitud máxima, fue igualmente necesario ejecutar la actividad de sobre acarreo para garantizar el transporte y suministro del pavimento.

Las distancias de sobre acarreo se dividen en dos entradas, La entrada 1 corresponde al ingreso a la obra por el K0+000 en el barrio Charrascal y se extienda hacia mayores hasta el caño Corcovado en el K1+100 y la entrada 2 corresponde al ingreso por el K4+088 sector Corredor Ecológico-Caracolí y se desarrolla hacia menores hasta el caño Corcovado en el K1+100. La división del sobre acarreo a través de estos tramos se debe a la presencia del caño Corcovado con flujo constante de agua, el cual impidió el paso de las volquetas en este punto hasta que no se tuvo la estructura hidráulica tipo box culvert de sección doble de 3mx2.5m habilitada para el tránsito, limitándolas a que no pudieran hacer el recorrido contante a través de los 4.088 Km ingresando por un solo punto.



El aumento de la cantidad de este ítem con respecto a la cantidad que se estipulada en la modificación No. 1 del 26 de junio de 2023 se debe a la necesidad de transportar la cantidad adicional de afirmado tamaño max 3" y de subbase granular de rio seleccionada tamaño max 2" requerido. La formalización del aumento de la cantidad en esta actividad se dio mediante la modificatoria No. 2 del 16 de mayo de 2024.


- IMPRIMACION ASFALTICA

Se realiza imprimación asfáltica sobre la corona de la base para la posterior instalación de la mezcla densa en caliente tipo MDC 19, adicionalmente se imprima el hombro berma de 0.30m dispuesto a cada costado del eje de la vía, esto con el fin de estabilizarlo y evitar los daños causado por la erosión del agua y otros factores externos, de este modo se efectúa la imprimación asfáltica a través de los 4.088 Km de la vía con un ancho típico de 6.60 metros. De igual forma, teniendo cuenta que los sobreanchos en las zonas de construcción de obras transversales se pavimentaron y aquellos accesos vehiculares con mayor flujo vehicular igualmente se les hizo instalación de pavimento para proteger el hombro de la estructura de vía, fue necesario imprimar su superficie granular para la correcta instalación de la carpeta asfáltica.



- Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA

  Se realizó la instalación de 68 señales verticales a través de los 4.088 Km que comprende la vía en intervención, acorde a las especificaciones establecidas en el diseño de señalización vial de proyecto que cumple con Manual de Señalización Vial 2015 del Invias y cuenta con concepto de viabilidad por parte del director de planeación y prospectiva de la alcaldía de Villavicencio doctor Omar Yesid de la Peña Muñoz mediante nota interna 1703-19. 18/ 0434. En general dentro de estas señales verticales se incluyen señales preventivas y reglamentarias con el fin de garantizar control sobre la velocidad máxima permitida en el corredor, la señalización de las zonas escolares ubicadas en Tramo 3, informar y advertir a los usuarios de la presencia de curvas prolongadas, intersecciones, zonas donde está prohibido las maniobras de adelantamiento y la presencia de bandas alertadoras (bandas sonoras).

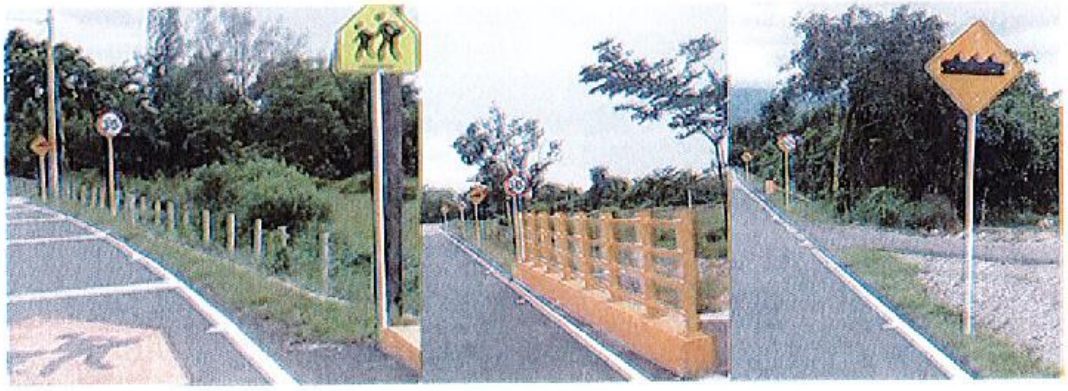

- PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI

  Se realizó la instalación de marcas viales de zona escolar en Tramo 3 desde el K3+000 al K4+088 donde se cuenta con la presencia de tres instituciones educativas, estas incluyeron líneas de aproximación, marcas y texto de zona escolar, cebras peatonales y demarcación de resaltos (reductores de velocidad), en el K4+088 punto donde finaliza la intervención de la vía y esta empalma con la vía denominada Corredor Ecológico se instalaron marcar viales direccionales con el fin de indicar la dirección que debe seguir el conductor que transita por cada carril. De igual forma se instaló

marca vial tipo reductor virtual antes y después de la curva ubicada entre el K1+300 y el k1+400 y la curva ubicada entre el K2+100 al K2+200 esto con el fin de advertir al usuario de la vía la presencia de estás curvas pronunciadas que deben ser transitadas acorde a la velocidad máxima permitida estipulada mediante la señalización vertical. Finalmente se instalaron marcas viales en los bordillos de las obras transversales con el fin de que sean fácilmente identificables a los conductores y así prevenir incidentes durante las maniobras de acercamiento al hombro de la vía. Las marcas viales instaladas cuentan con concepto de viabilidad del director de planeación y prospectiva de la alcaldía de Villavicencio.



- PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI

Se hizo la instalación de dos líneas laterales continuas de color blanco, una en cada borde de vía, así mismo una línea amarilla continúa central que divide a los carriles derecho e izquierdo indicando de igual forma que durante los 4.088 Km de trayecto está prohibida la maniobra de adelantamiento. Actividad ejecutada acorde a concepto de viabilidad del director de planeación y prospectiva de la alcaldía de Villavicencio.



- TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS

Se instala tachas viales reflectivas bidireccionales sobre el borde izquierdo, borde derecho y eje de la vía a través de los 4.088 Km a una distancia de 8 metros acorde a las especificaciones del Manual de Señalización Vial del Invias y según concepto de viabilidad del director de planeación y prospectiva de la alcaldía de Villavicencio. Estos

elementos tienen como fin indicar al usuario los límites de vía y la división de carril especialmente en horarios nocturnos, siendo un elemento muy útil para garantizar la seguridad vial.




- EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGl. Inc retiro 5km

  Se ejecutó la actividad de excavación mecánica húmeda en conglomerado, incluye 5 Km de retiro para la construcción del box culvert de 3.x2.5m doble en el K1+173 sector Caño Corcovado en el cual para su construcción se hizo un mejoramiento del suelo de subrasante con afirmado en un espesor de 40 cm, de igual forma, se requirió la excavación provisional de un canal para el desvío del agua del caño el cual presenta flujo constante y que era necesario para mantener la zona de trabajo seca durante las labores de construcción; teniendo en cuenta las dimensiones de esta obra transversales también fue necesario ejecutar una excavación de explanación lo suficientemente ancho que garantizara el espacio de construcción de la obra y el espacio necesario para la instalación de formaletas, puntales y en el cual los trabajadores se pudieran mover con facilidad para ejecutar las actividades que requirió la materialización de esta obra hidráulica. Para la construcción de las demás obras hidráulicas se realizó la explanación necesaria para la construcción de estas con su respetivo espacio de trabajo. En el caso de la construcción de los gaviones se hizo necesario el mejoramiento con afirmado de la subrasante en la cual fueron apoyados, este mejoramiento se ejecutó con espesor de 50 cm, para el cual fue necesario la ejecución de excavación, de la misma manera se ejecutó excavación para el desplante del terreno en el cual se implantaron.



- CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie


  Para la construcción de las diferentes estructuras de concreto que se materializaron a través de los 4.088 Km de intervención de vía fue necesario la instalación de concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) tipo solado o también denominado concreto de limpieza, el cual tiene como fin preparar la superficie de soporte de la estructura a materializar, permitiendo aislarla del terreno natural y generando un área rígida en la cual se pueda apoyar el acero, la formaleta y demás materiales o elementos de fabricación requeridos sin riesgos de asentamientos diferenciales durante la construcción. Las obras en las cuales se instaló este tipo de concreto corresponden a un sumidero de doble cajón en el K0+000, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K0+755, un box culvert de sección 2mx2m en el K0+908, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+055, un box culvert de sección 2mx2m en el K1+102, un box culvert de sección doble de 3mx2.5m en el K1+173, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+245, un box culvert de sección 3mx2m en el K1+441, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+673, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" K2+818, una reconstrucción de pozos sépticos del colegio Licafo en el K3+100, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" en el K3+351, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+745, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+885 y finalmente una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K4+086.

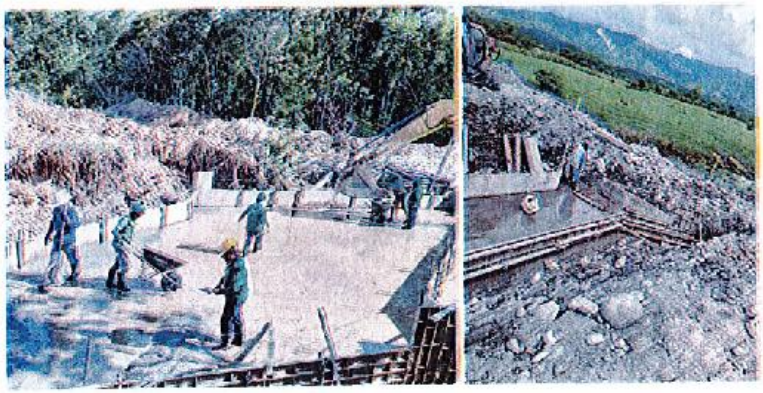

- CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS

Se ejecutó la actividad de concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) para la construcción de estructuras de concreto a través de los 4.088 Km de intervención de vía con el fin de materializar cada uno de sus elementos como lo son cajón, aletas, muros, bordillos y el realce de algunas cajas de inspección existente, las obras en concreto construidas corresponde a una cinta de protección que independiza la estructura existente de vía del barrio Charrascal con la estructura de vía nueva construida, un sumidero de doble cajón en el K0+000, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K0+755, un box culvert de sección 2mx2m en el K0+908, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+055, un box culvert de sección 2mx2m en el K1+102, un box culvert de sección doble de 3mx2.5m en el K1+173, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+245, un box culvert de sección 3mx2m en el K1+441, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+673, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" K2+818, una reconstrucción de pozos sépticos del colegio Licafo en el K3+100, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" en el K3+351, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+745, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+886, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K4+086, la construcción de un cárcamo de protección para la tubería de 14" instalada en el K0+000, un cárcamo de protección con bordillo para la tubería de 16" instalada en el K3+700, la construcción de un bordillo de proyección para la caja de inspección existente en el K2+916, el realce de la tapa de un pozo de inspección ubicado en el K3+320 y finalmente para el recubrimiento de los gaviones construidos en el K1+173 y en el K1+340.



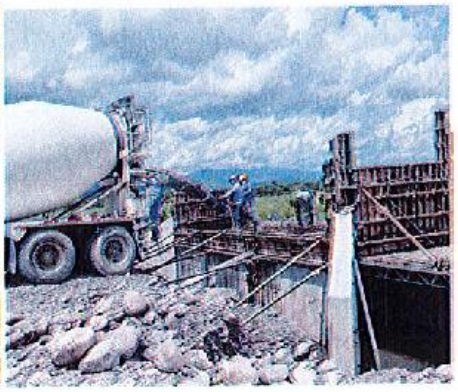

- CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, poste concre. c/2 m

Se realizó instalación de cerca de alambre de púas conformada por 4 hiladas y postes en concreto instalados cada 2 metros en las zonas donde la entidad contratante realizó adquisición predial para la construcción de la faja de vía, siendo necesario esta actividad para de delimitar los nuevos linderos del derecho de vía esta actividad se ejecutó desde el K0+006.70 al K1+166.09 por el costado derecho de la vía, desde el K0+006.01 al K1+177.80 por el costado izquierdo, desde el K1+200 al K1+337 por el

costado izquierdo, desde el K1+180 al K2+147 por el costado derecho, desde el K2+147 al K2+910 por el costado derecho, desde el K2+830 al K2+905 por el costado izquierdo, desde el K2+920 al K3+140 por el costado izquierdo, desde el K3+168 al K3+227, desde el K3+230 al K3+270, desde el K3+275 al K3+350 todos ellos de igual forma por el costado izquierdo de la vía.



- DESMONTE DE CERCA H=2,5 MTS 4 HILOS INC RETIRO

Se realizó desmonte de cerca 4 hilos en las zonas donde la entidad contratante realizó adquisición predial para la construcción de la faja de vía, siendo necesario removerlas para la construcción de la estructura de vía y para la definición de los nuevos linderos del derecho de vía, se realizó desmonte de cerca en el K0+010, K0+420, K0+793, K1+070 y en el K1+930 y en el K2+140 las cuales se ubicaban de extremo a extremo del ancho de la vía en su respectiva abscisa, de igual forma se hizo desmonte de cerca desde el K2+147 al K2+895 por el costado derecho, desde el K2+830 al K2+905, del K2+921 al K3+050, del K3+052 al K3+080, del K3+083 al K3+140, K3+170 al K3+225, del K3+231 al K3+268 y del K3+275 al K3+350 todas ellas por el costado izquierdo de la vía.



- CORTE Y RETIRO DE SINGLE

Durante el proceso de desmonte de cerca 4 hilos se encontró que alguna de ellas se encontraba junto con cerca viva (cerca o cerramiento conformado por plantas) tipo

single, por tal razón también fue necesario el corte y retiro de esta, la cual se ejecutó desde el K2+147 al K2+904 por el costado derecho de la vía, desde el K2+830 al K2+905, desde el K2+920 al K3+050, desde el K3+059 al K3+080, desde el K3+083 al K3+083 al K3+140, desde el K3+170 al K3+225, desde el K3+231 al K3+268 y desde el K3+275 al K3+550 todo ello por el costado izquierdo de la vía.




- SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SINGLE (para reponer la retirada)(7 arboles por metro lineal).

  Teniendo en cuenta que se realizó el corte y el retiro de single de los paramentos de algunos predios en las abscisas nombradas anteriormente fue necesario el suministro y siembra de single sembrando 7 individuos por metro lineal en los puntos donde los propietarios de los predios solicitaron que se repusiera la cerca viva los cuales corresponden desde el K2+147 al K2+904 por el costado derecho y desde el K3+275 al K3+350 por el costado izquierdo de la vía.




- MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y

  Durante el proceso constructivo de la estructuras hidráulicas fue necesario el manejo de agua con motobomba diesel de 6" en el K1+173 sector caño Corcovado en la construcción del box culvert de sección doble de 3mx2.5m debido al flujo constante de agua que se presenció en este punto, esto con el fin de mantener el área de trabajo seca y poder desarrollar los trabajos constructivos, para el caso de las otras obras

hidráulicas tales como el box culvert de sección 2mx2m en el K0+908, alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" en el K1+055, box culvert de sección 2mx2m en el K1+102, muro de contención en el K1+173, alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+245, box culvert de sección 3mx2m en el K1+441, de igual forma en la construcción de gaviones en el K1+173 y en el secado de la subrasante en el entre el K2+180 al K2+830 para la construcción de la estructura de vía, se hizo necesario el manejo de agua con motobomba debido a las fuertes lluvias que se registraron durante la intervención en estos puntos que dejaron láminas de agua de altura considerable que fue necesario evacuar para continuar con las labores constructivas.



Para esta actividad en particular la cantidad contractual fijada según la modificatoria número 1 aprobada el 26 de junio de 2023 correspondía a 120 días y se debían ejecutar hasta el 13 de diciembre de 2023; sin embargo, a fecha del 12 de diciembre de 2023 se tenía una ejecución de 182 días, la decisión de ejecutar una mayor cantidad se da debido a que es necesario seguir ejecutándola para continuar con las labores de construcción de estructuras hidráulicas que corresponde a una tarea crítica que si no se hubiera garantizado su ejecución hubiera implicado la suspensión de las actividades constructivas de la estructura de vía y por consiguiente un retraso en el cronograma de obra, además de ellos es un ítem contractualmente existente y vigente y revisando el balance financiero del contrato se contaba con el recurso necesario para ejecutar una mayor cantidad. La formalización de las 62 días adicionales de esta actividad se dio mediante la aprobación de la modificatoria No. 2 el 16 de mayo de 2024.

- CUNETA (20.7MPa,3000psi) SIN REFUERZO INC. FORMALE

  En los puntos donde la estructura de vía consistió en una sección en corte en la cual la cota rasante del terreno colindante especialmente al costado izquierdo de la vía es superior a la de la superficie de rodadura, lo cual limita la evacuación del agua de escorrentía que fluye sobre la carpeta asfáltica durante la temporada de lluvias fue necesario la construcción de cunetas que garanticen la recolección de esta agua y la conduzcan a la obra hidráulica más cercana para su posterior evacuación, esta cunetas se construyeron desde el K3+033.39 hasta el K3+311.00 en una sección triangular y desde el K3+311 al K3+350 en una sección trapezoidal y desde el

K3+580.42 al K3+742.46 en una sección trapezoidal, todas ellas contiguas al borde izquierdo del pavimento.



- TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des

  Durante el proceso constructivo de la vía fue necesario la tala de 9 especies arbóreas clase III con altura comprendida entre los 10 metros y los 20 metros los cuales intervenían con la faja vial, la actividad se realizó previamente verificando que tales individuos se encontraran dentro del permiso de aprovechamiento forestal otorgador por la corporación ambiental Cormacarena.



- BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMOH=2,5CM INC. INSTA


  La instalación de bandas sonoras o también conocidas como bandas alertadores tienen como fin advertir al usuario de la vía de la existencia de alguna condición especial en el corredor que amerita estar alerta, cumplir estrictamente con el límite de velocidad permitido en la zona y seguir las recomendaciones suministradas por la señalización vial, en este caso se realizó la instalación de tres grupos de 10 bandas cada uno entre el K0+000 al K0+070 punto donde la vía construida empalma con la vía existente del barrio charrascal, con el fin de advertir el cambio de sección de la vía, la existencia de una intersección vial y ayudar a controlar la velocidad de circulación de los vehículos debido al flujo constante de peatones, se instalaron 6 grupos cada uno de 10 bandas entre el K1+250 y el K1+420 con el objetivo de advertir al usuario

de la existencia de un cambio de dirección del trazado de vía que viene acompañado por una curva bastante prolongada la cual debe ser tomada cumpliendo con la velocidad máxima permitida y siguiendo las recomendaciones dadas por la señalización vial en este punto, con este mismo objetivo se instalaron otros 6 grupos de 10 bandas cada uno desde el K2+060 al K2+230 y finalmente a petición de la comunidad del conjunto residencia Caracolí se instalaron 6 grupos de 10 bandas cada uno entre el K3+620 al K3+770 con el fin de realizar control de la velocidad máxima permitida en el punto debido al alto flujo de vehículos y peatones que ingresan y salen del conjunto residencial.




- SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 30"

  Se realizó el transporte, suministro e instalación de tubería en concreto reforzado de 30" para la construcción de las obras hidráulicas transversales tipo alcantarilla en el K3+745, K3+885 y K4+086.

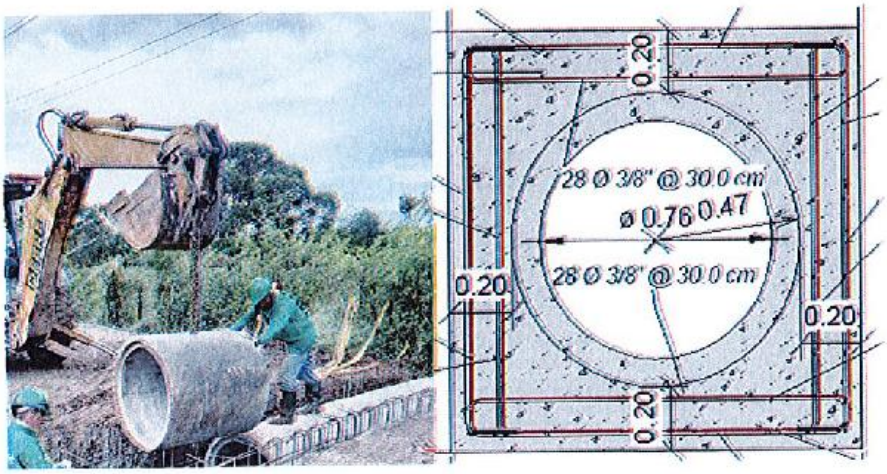

- SUMINISTRO, INSTALA, TRANSP TUBERIA 36"

  Se realizó el transporte, suministro e instalación de tubería en concreto reforzado de 36" para la construcción de las obras hidráulicas transversales tipo alcantarilla en el K0+755, K1+055, K1+245, K1+673, K2+818 y K3+351.

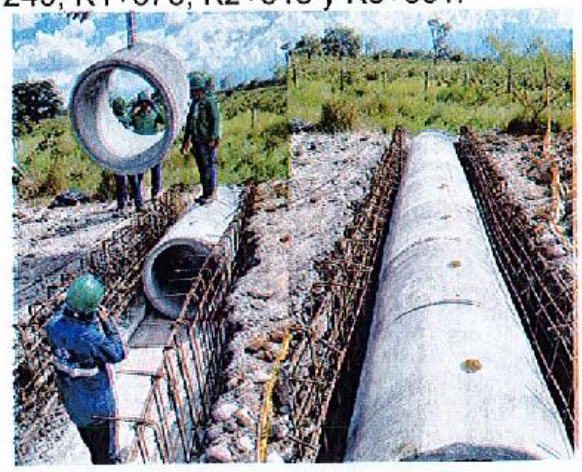

- EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms

  Se realizó excavaciones secas en conglomerado para la preparación y nivelación de la subrasante en los puntos de construcción de obras de concreto correspondientes a una cinta de protección que independiza la estructura existente de vía del barrio Charrascal con la estructura de vía nueva construida, un sumidero de doble cajón en el K0+000, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K0+755, un box culvert de sección 2mx2m en el K0+908, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+055, un box culvert de sección 2mx2m en el K1+102, un box culvert de sección doble de 3mx2.5m en el K1+173, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+245, un box culvert de sección 3mx2m en el K1+441, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+673, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" K2+818, una reconstrucción de pozos sépticos del colegio Licafo en el K3+100, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" en el K3+351, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+745, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+886, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K4+086, la construcción de un cárcamo de protección para la tubería de 14" instalada en el K0+000 y un cárcamo de protección para la tubería de 16" instalada en el K3+700, de la misma manera se ejecutó esta actividad para la construcción de cunetas desde el K3+033.39 hasta el K3+350 y desde el K3+580.42 al K3+742.46. Finalmente se realiza excavaciones secas en conglomerado manual para la construcción de un canal contiguo al costado derecho de la pata del terraplén de la vía desde el K0+013.50 al K0+753.33 con el fin de conducir las aguas de escorrentía a la obra transversal hidráulica más cercana y para la conformación de los descoles de las obras transversales ubicadas en el K0+908, K1+102, K1+245, K1+670, K2+818, K3+351, K3+745, K3+880 y K4+086.



- PROTECCION DE TALUDES CON MATERIAL DE DESCAPOTE

  Con el fin de proteger los taludes de tarraplén de los efectos erosivos de las aguas lluvias que circulan por la estructura de la vía y pensando en optimizar los materiales de construcción se seleccionó material de descapote tipo capa vegetal disponible en buenas condiciones para cubrir los taludes y proveerlos de una capa vegetable de protección, esta actividad se ejecutó desde el K0+300 al K0+410 por el costado derecho, desde el K0+410 al K0+760 por el costado izquierdo y desde el K0+870 al K0+910 y desde el K1+500 al K1+910 tanto por el costado derecho como por el izquierdo.




- SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20X50X80cm EXC-TRAN

  Teniendo como finalidad realizar un empalme armónico geométrica y arquitectónicamente con la vía existen del barrio Charrascal en el K0+000 la cual se encuentra conformado por sardinales tanto en el costado izquierdo como en el derecho, se suministró e instaló 80 metros de sardinel por el costado derecho de la vía y 21.13 metros de sardinel por el costado izquierdo de la vía en la zona de empalme con la vía existente del barrio Charrascal.



- GAVION 2x1x1/10x12/2,4mm,C13,Recubre Zn (260gr/m2)
  Teniendo en cuenta los efectos erosivos del caudal del caño Corcovado se construyen gaviones para la protección de laderas en el K1+173, de igual forma considerando la pendiente del terraplén de vía en el K1+340 se construyen gaviones para garantizar la contención del material que compone la estructura de vía.

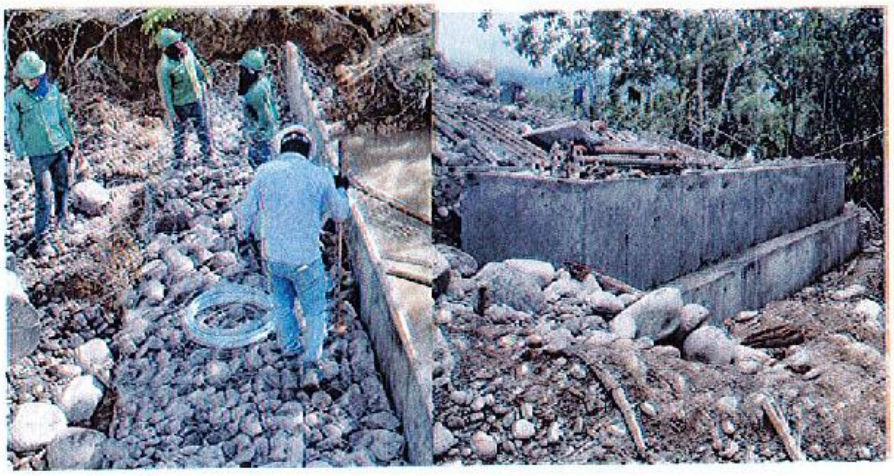

- MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa
  La malla electrosoldada se empleó con el fin de reforzar las cunetas construidas en concreto, esto, teniendo en cuenta que se puede presentar flujo vehicular sobre las mismas debido a su cercanía al borde de pavimento y de igual modo con el fin de prevenir el agrietamiento por retracción del concreto durante el fraguado en su proceso de construcción. Este suministro e instalación de malla electrosoldada se efectuó en las cunetas que se construyeron desde el K3+033.39 hasta el K3+311.00 en una sección triangular y desde el K3+311 al K3+350 en una sección trapezoidal y desde el K3+580.42 al K3+742.46 en una sección trapezoidal, todas ellas contiguas al borde izquierdo del pavimento.




- SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM

  Se realiza suministro, extendido y compactación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para capa de rodadura de la estructura de pavimento a través de los 4.088 Km que incluye la intervención de vía y en la zona de empalme con la vía existente del barrio Charrascal en el K0+000, de igual forma se realiza la construcción de dos reductores de velocidad en mezcla tipo MDC-19 en el K3+030 y en el K3+330, de igual forma con el fin de garantizar mejores o iguales condiciones en las que se encontraban los acceso vehiculares a los predios colindantes con la vía y con el fin de proteger el hombro de la estructura de vía ante la circulación de los vehículos por estas zonas para el ingreso a los predios se realizó la instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 en los acceso vehiculares en los que se requirió y previamente aprobó la interventoría.



- SUMINISTRO, E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CORTADO Y FIGURADO FY=4200 Mpa

  Se ejecutó la actividad de suministro e instalación de acero de refuerzo cortado y figurado Fy= 4200 MPa para la construcción de estructuras de concreto a través de los 4.088 Km de intervención de vía con el fin de materializar cada uno de sus elementos como lo son cajón, aletas, muros, bordillos y el realce de algunas cajas de inspección existente, las obras construidas corresponde a un sumidero de doble cajón en el K0+000, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K0+755, un box culvert de sección 2mx2m en el K0+908, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+055, un box culvert de sección 2mx2m en el K1+102, un box culvert de sección doble de 3mx2.5m en el K1+173, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+245, un box culvert de sección 3mx2m en el K1+441, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" en el K1+673, una alcantarilla en tubería de concreto de 36" K2+818, una reconstrucción de pozos sépticos del colegio Licafo en el K3+100, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" en el K3+351, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+745, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K3+886, una alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 30" en el K4+086, la construcción de un cárcamo de protección para la tubería de 14" instalada en el K0+000, un cárcamo de protección con bordillo para la tubería de 16" instalada en el K3+700, la construcción de un bordillo de proyección para la caja de inspección existente en el K2+916 y el realce de la tapa de un pozo de inspección ubicado en el K3+320.

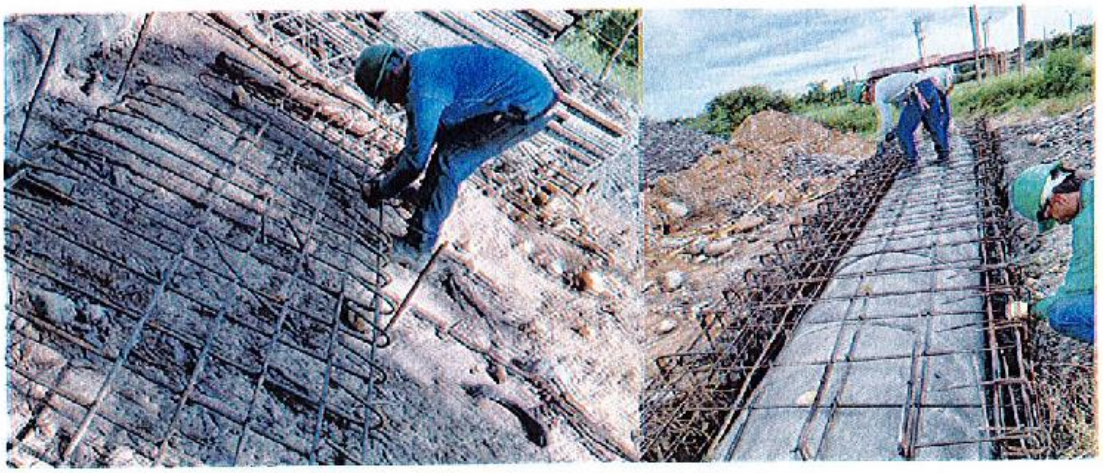

- SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA

  Con el fin de proteger los taludes de terraplén de los efectos erosivos de las aguas lluvias que circulan por la estructura de la vía se realizó el suministro y la instalación de grama trenza proveyendo los taludes de una capa vegetal de protección, esta actividad se ejecutó desde K0+000 al K0+340 por el costado derecho, desde el K0+000 al K0+410 costado izquierdo, desde el K0+410 al K0+750 por el costado derecho, desde el K0+760 al K0+880, desde el K0+910 al K1+320, desde el K1+370 al K1+510, desde el K2+150 al K3+030, todos estos puntos tanto al costado izquierdo como el

derecho, desde el K3+100 al K3+310 por el costado derecho, desde el K3+310 al K3+580 por el costado derecho e izquierdo, desde el K3+590 al K3+720 por el costado derecho y finalmente desde el K3+730 al K4+060 por el costado derecho e izquierdo.




- TALA ARBOL CLASE I 1m<H<5m inc. transp5km, desen

  Durante el proceso constructivo de la vía fue necesario la tala de 26 especies arbóreas clase I con altura comprendida entre los 1 metros y los 5 metros los cuales intervenían con la faja vial, la actividad se realizó previamente verificando que tales individuos se encontraran dentro del permiso de aprovechamiento forestal otorgador por la corporación ambiental Cormacarena.




- TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen

  Durante el proceso constructivo de la vía fue necesario la tala de 59 especies arbóreas clase II con altura comprendida entre los 5 metros y los 10 metros los cuales intervenían con la faja vial, la actividad se realizó previamente verificando que tales individuos se encontraran dentro del permiso de aprovechamiento forestal otorgador por la corporación ambiental Cormacarena.

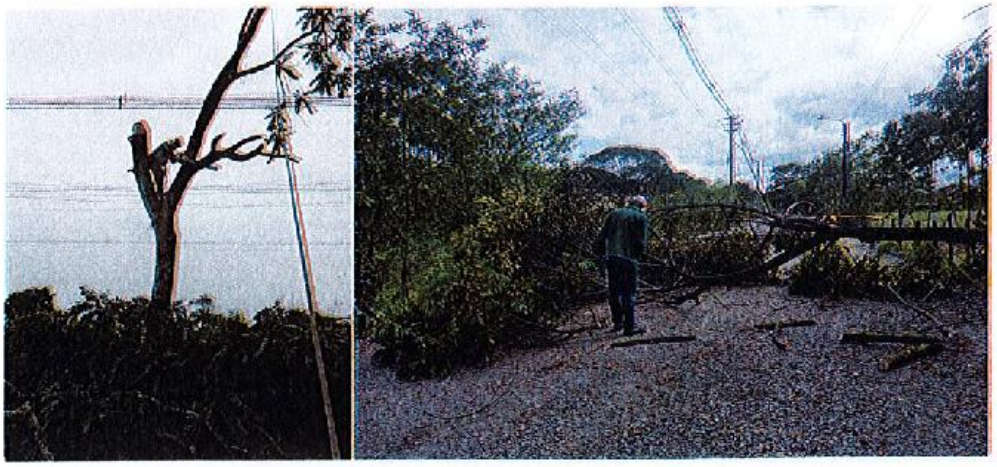

- CORTE DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)

  El corte de pavimento se ejecuta en el borde del pavimento contiguo a la cuneta previamente a la construcción de esta, este tiene como fin generar una junta constructiva por medio de una superficie regular que permita fundir la cuneta con espesor uniforme evitando que se generen superficies irregulares que puedan generar esfuerzos diferenciales perjudiciales para el elemento en concreto. Esta actividad se ejecutó previo a la construcción de cunetas desde el K3+033.40 al K3+279.85 y desde el K3+580.42 al K3+689.00 costado izquierdo de la vía.

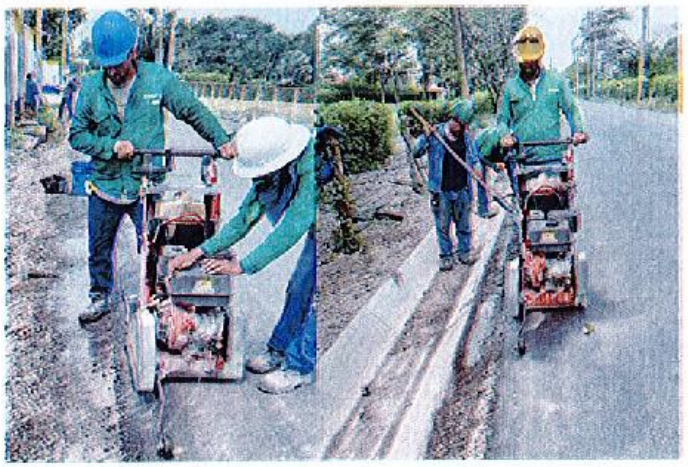

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACION DE PRECISION)

  Se vio la necesidad de la construcción de un sumidero de cajón doble sección 1x1 para manejo de aguas lluvias en el K0+015 el cual requirió la instalación de 18.50m de tubería PVC de 14" para la conducción del agua recolectada por el sumidero a su punto de descarga correspondiente a un pozo existente ubicado sobre la vía del barrio charrascal.



- TUBERIA PVC U, MECANICA NTC 37223 ALCANT. 0=400 mm (16") (Inc. nivel precision)

  Durante la construcción de las cuneta tipo canal abierto para el manejo de aguas desde el K3+580.42 al K3+742.46, se observó que debido a la existencia del acceso vehicular y zona de estacionamiento del conjunto residencial Caracolí contiguo a la vía entre el K3+687 al K3+720, se requirió realizar una transición del canal a tubería para seguir garantizando el acceso vehicular a esta zona, haciendo la instalación de 30.00m de tubería PVC de 16" para que se garantizara la continuidad en la conducción del agua lluvia transportada por medio de este canal.



- BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2" (H=0.92m)

  Una vez construida la estructura hidráulica tipo box culvert doble 3x2.5m en el K1+173 se observó la necesidad de la construcción de barandas metálicas sobre sus bordillos para garantizar la seguridad vial de los usuarios en el momento que transiten por este sector, teniendo en cuenta la considerable longitud de vía (11 m) la cual salva a una altura importante respecto a la placa de fondo, la instalación de esta baranda metálica se hizo tanto en el bordillo izquierdo como el derecho.



- PLAN MANEJO DE TRANSITO

Durante el desarrollo de las actividades de obra, teniendo en cuenta que parte de la vía intervenida correspondía a un carreteable habilitado y ampliamente transitado fue necesario contar con un plan de manejo de tránsito que garantizara seguridad vial a los usuarios de la vía y al personal vinculado a la obra durante el proceso de desarrollo de las actividades constructivas, tal plan de manejo de transitó contó con señalización vial de obra y con auxiliares viales que hicieron una regulación efectiva y segura del tráfico en la zona.



- PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)

Dentro del desarrollo del presupuesto ambiental PAGA se incluyeron los siguientes aspectos:

Residente SISO:
A fin de prevenir accidentes durante el desarrollo de las actividades enmarcadas dentro del presupuesto ambiental (PAGA), se contó con una profesional SISO encargado de

supervisar y hacer control del uso de los elementos de protección personal por parte del personal asignado para la ejecución de las labores del presupuesto ambiental y de la ejecución de estas actividades acorde a las buenas prácticas y procedimientos establecidos para prevenir incidentes o accidentes laborales, de igual forma estuvo a cargo de supervisar el adecuado funcionamiento de la maquinaria, vehículos y herramientas, verificando que estuvieran en óptimas condiciones y no representaran riesgo ambiental por derramamiento de fluidos contaminantes o liberación de emisiones que representaran un impacto ambiental desfavorable no contemplado dentro del desarrollo de las actividades de obra, así mismo veló por el uso de señalización adecuada de las zonas de trabajo evitando que se generara algún daño ya sea las personas o a los diferentes componentes ambientales presentes. Se tiene en cuenta el costo según la disponibilidad del profesional en campo.

Control de material particulado:
Durante el tiempo de intervención en la cual la vía con tránsito vehicular constante estuvo a nivel de capas granulares y en aquellos días donde era común las altas temperaturas se producia bastante polución debido al material particulado que se dispersaba por el aire con el paso de los vehículos afectando a la comunidad aledaña, por lo cual fue necesario contar con un carro tanque irrigador que humedeciera el material de material constante en diferentes horas del día así logrando hacer control del material particulado.

Suministro de agua para el consumo:
Con el fin de brindar a los trabajadores las condiciones básicas para el desarrollo de las labores, en donde se debe contar con agua potable apta para el consumo humano empleada para la hidratación del personal durante las jornadas de trabajo, conociendo que el proveedor se adapta a los parámetros idóneos para cumplir con la normativa ambiental vigente. Se calcula la cantidad dependiendo del número de trabajadores activos en las diferentes jornadas de trabajo.

Alquiler de baños portátiles:
Fue necesario brindar a los trabajadores las condiciones básicas para el desarrollo de las labores, en donde se contó con unidades sanitarias portátiles, evitando contaminación al medio ambiente, el proveedor cumplió con los parámetros idóneos para cumplir con la normativa ambiental vigente. Se realizó mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles (USP), durante todo el desarrollo del proyecto.

Adecuación de Zodme:
Se contó con punto de disposición de material de excavación y descapote, el cual se adecuó evitando alteraciones en los diferentes componentes ambientales que aplicasen.

Desenraice de especies taladas:
Cuando se realiza el aprovechamiento forestal con la motosierra, quedan partes de las raíces arraigadas al suelo, por lo que es necesario realizar un desenraice de las especies taladas, evitando nuevos requerimientos por parte de la autoridad ambiental, por hallar tocones o residuos del aprovechamiento.

Evaluación ecológica rápida:
Cormacarena solicitó una evaluación ecológica rápida para poder evaluar qué especies de flora y fauna son las que se encuentran dentro del área de influencia directa y así poder contar con un plan de manejo aplicado en caso de que fueran avistadas o encontradas en algún punto del proyecto, evitando impactos negativos en los mismos.

Levantamiento y manejo de epifitas – protocolo de ahuyentamiento de fauna:
Cormacarena una vez realizó la visita de campo para otorgar el permiso de aprovechamiento forestal, dejó unos requerimientos establecidos, como el tema de levantamiento y manejo de epífitas, en donde se buscó realizar un manejo adecuado con estas especies buscándoles un árbol hospedero, ya que en el que se encontraba iba a ser aprovechado, este nuevo árbol cumplía con las condiciones necesarias para que se adaptaran y sobrevivieran dentro del mismo ecosistema. De igual manera solicitaron un ahuyentamiento de fauna para evitar que algunas de las especies que permanecen en el área de influencia, puedan tener algún riesgo o alteración al momento de la intervención constructiva de la vía.

Publicación y difusión en periódico:
En el artículo 22° de la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0105 que permite el uso de cauce, se requiere publicar en un periódico de alta circulación nacional o regional, el encabezado y parte resolutiva del acto administrativo mencionado anteriormente. En el artículo 27° de la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0704 que permite el Aprovechamiento forestal, se requiere publicar en un periódico de alta circulación nacional o regional, el encabezado y parte resolutiva del acto administrativo mencionado anteriormente, lo cual se realizó cumpliendo los requerimientos de las dos resoluciones.

Inventario forestal:
Uno de los requerimientos para el trámite de permiso de aprovechamiento forestal, es el inventario forestal con las coordenadas de cada uno de los individuos y el plan de aprovechamiento forestal, firmado y presentado por un profesional forestal idóneo, el cual se desarrolló dentro del marco del presupuesto ambiental paga del contrato 1507 de 2021.

Laboratorio de epífitas:
Para poder dar cumplimiento a Cormacarena con el levantamiento de epífitas, fue necesario certificar las especies que se encontraron y se reubicaron en el área de influencia, viéndose necesario realizar un laboratorio de epífitas.







5.2 Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Los trabajadores que estuvieron vinculados en el desarrollo de los trabajos destinados al cumplimiento del objeto del contrato estuvieron afiliados a seguridad social como lo estipula la cláusula decimo primera del contrato No. 1507 de 2021, en su numeral 8, donde requiere "***Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales***".

A continuación, se relaciona corte a corte el personal vinculado al desarrollo de los trabajos enmarcados en el contrato y en la sección anexos se adjunta la planilla de pago de seguridad social:

LISTADO PERSONAL DICIEMBRE 2021		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
MARIA FERNANDA VÉLEZ RIOS	ING AUXILIAR	1,121,896,539
FREDY ALEXANDER PUENTES ROZO	CADENERO	17,421,937
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL ENERO 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRAN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL FEBRERO 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL MARZO 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL ABRIL 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
DIEGO ARTURO DIAZ PORRAS	OPERARIO	1,032,387,035
JORGE IVAN PARRADO ROMERO	AYUDANTE	1,074,129,857
LEISDER ASDRUBAL GIRALDO	AYUDANTE	1,121,827,310
EDISSON JAVIER LEAL ESPINOSA	AYUDANTE	1,121,857,319
JULIAN DAVID HINCAPIE BARRETO	AYUDANTE	1,121,868,851
JESUS IVAN DIAZ URREGO	AYUDANTE	1,121,911,000
JOHAN MANUEL DUQUE ACEVEDO	AYUDANTE	1,121,921,647
JOSE ALEJANDRO GARCIA OCHOA	AYUDANTE	1,121,932,244
KAROL DAYAN ROJAS ORTIZ	PALETERA	1,193,091,717
IVAN PULIDO VARGAS	OPERARIO	17,344,901
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFO	1,121,858,465
VICTOR MANUEL ARDILA HERNANDEZ	CADENERO	1,121,878,409
DANIEL FELIPE HINCAPIE BARRETO	CADENERO	1,121,940,179
GERMAN SANABRIA RODIRGUEZ	CADENERO	17,357,122
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL MAYO 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
DIEGO ARTURO DIAZ PORRAS	OPERARIO	1,032,387,035
JORGE IVAN PARRADO ROMERO	AYUDANTE	1,074,129,857
LEISDER ASDRUBAL GIRALDO	AYUDANTE	1,121,827,310
EDISSON JAVIER LEAL ESPINOSA	AYUDANTE	1,121,857,319
JESUS IVAN DIAZ URREGO	AYUDANTE	1,121,911,000
JOHAN MANUEL DUQUE ACEVEDO	AYUDANTE	1,121,921,647
JOSE ALEJANDRO GARCIA OCHOA	AYUDANTE	1,121,932,244
KAROL DAYAN ROJAS ORTIZ	PALETERA	1,193,091,717
IVAN PULIDO VARGAS	OPERARIO	17,344,901
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFO	1,121,858,465
VICTOR MANUEL ARDILA HERNANDEZ	CADENERO	1,121,878,409
DANIEL FELIPE HINCAPIE BARRETO	CADENERO	1,121,940,179
GERMAN SANABRIA RODIRGUEZ	CADENERO	17,357,122
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL JUNIO 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
DIEGO ARTURO DIAZ PORRAS	OPERARIO	1,032,387,035
JORGE IVAN PARRADO ROMERO	AYUDANTE	1,074,129,857
LEISDER ASDRUBAL GIRALDO	AYUDANTE	1,121,827,310
EDISSON JAVIER LEAL ESPINOSA	AYUDANTE	1,121,857,319
JESUS IVAN DIAZ URREGO	AYUDANTE	1,121,911,000
JOHAN MANUEL DUQUE ACEVEDO	AYUDANTE	1,121,921,647
JOSE ALEJANDRO GARCIA OCHOA	AYUDANTE	1,121,932,244
KAROL DAYAN ROJAS ORTIZ	PALETERA	1,193,091,717
IVAN PULIDO VARGAS	OPERARIO	17,344,901
ADDY TINJACA COLON	TOPOGRAFO	1,006,415,133
JUAN PABLO MERCHAN TORRES	CADENERO	1,057,606,408
EDGAR STIVEN CARDENAS PATIÑO	CADENERO	1,057,607,971
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL JULIO 2022		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
DIEGO ARTURO DIAZ PORRAS	OPERARIO	1,032,387,035
JORGE IVAN PARRADO ROMERO	AYUDANTE	1,074,129,857
LEISDER ASDRUBAL GIRALDO	AYUDANTE	1,121,827,310
EDISSON JAVIER LEAL ESPINOSA	AYUDANTE	1,121,857,319
JESUS IVAN DIAZ URREGO	AYUDANTE	1,121,911,000
JOHAN MANUEL DUQUE ACEVEDO	AYUDANTE	1,121,921,647
JOSE ALEJANDRO GARCIA OCHOA	AYUDANTE	1,121,932,244
KAROL DAYAN ROJAS ORTIZ	PALETERA	1,193,091,717
IVAN PULIDO VARGAS	OPERARIO	17,344,901
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFO	1,121,858,465
VICTOR MANUEL ARDILA HERNANDEZ	CADENERO	1,121,878,409
CESAR AUGUSTO URUETA BARRAZA	CADENERO	1,043,002,124
GERMAN SANABRIA RODIRGUEZ	CADENERO	17,357,122
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

LISTADO PERSONAL JUNIO 2023		
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
IGNACIO ROJAS SÁNCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	10,168,138
HENRY GONZÁLEZ MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	17,390,558
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFÍA	1,121,858,465
DANIEL FELIPE BARRERA CALDERÓN	TOPOGRAFÍA	1,002,727,117
GERMAN ANDRÉS CALDERÓN PERILLA	TOPOGRAFÍA	1,123,084,038

LISTADO PERSONAL JULIO 2023		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
HAROLD ESTEBAN MORENO MARTÍNEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,918,566
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,924,964
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
JEFERSSON TORRES MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	1,030,586,565
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
ANGEL LEONARDO SABOGAL GÓMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,087,076,269
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFÍA	1,121,856,465
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFÍA	1,006,423,866
LUIS HERNESTO BETANCOURTH GONZÁLEZ	TOPOGRAFÍA	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL AGOSTO 2023		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
HAROLD ESTEBAN MORENO MARTÍNEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,918,566
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,924,964
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
JEFERSSON TORRES MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	1,030,586,565
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
ANGEL LEONARDO SABOGAL GÓMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,087,076,269
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
ANDRÉS MAURICIO QUIÑONEZ ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	1,234,791,168
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFÍA	1,121,856,465
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFÍA	1,006,423,866
LUIS HERNESTO BETANCOURTH GONZÁLEZ	TOPOGRAFÍA	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL SEPTIEMBRE 2023		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,887,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVAN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SANCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,924,964
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
JEFERSSON TORRES MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	1,030,586,585
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
ANGEL LEONARDO SABOGAL GÓMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,087,076,268
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
JHON FREDY APOLINAR SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1,006,795,395
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,796,551
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
ANDRÉS MAURICIO QUIÑONEZ ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	1,234,791,168
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
JAIVER FABIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL OCTUBRE 2023		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,887,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SANCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,924,964
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
JEFERSSON TORRES MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	1,030,586,585
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
JHON FREDY APOLINAR SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1,006,795,395
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,796,551
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
JAIVER FABIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL NOVIEMBRE 2023		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86.075.526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121.842.823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40.332.046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121.882.054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86.041.016
IVAN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17.344.901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRAN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122.133.490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17.346.751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11.280.202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1.121.915.725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17.346.751
JOSE FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86.054.872
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97.611.356
JAIRO DE JESUS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86.068.425
YOBANY FIRIGUA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1.121.885.427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1.121.927.006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3.276.434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.924.984
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.868.255
JEFERSSON TORRES MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	1.030.586.565
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17.339.737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125.471.422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17.386.756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121.872.429
JHON FREDY APOLINAR SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1,006.795.395
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006.796.551
WILLIAM ANDRES OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121.927.112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121.842.258
JAIVER FABIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006.423.856
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006.820.934

LISTADO DE PERSONAL DICIEMBRE 2023		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121.867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86.075.526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121.842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40.332.046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121.882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVAN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17.344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRAN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122.133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17.346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11.280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121.915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17.346,751
JOSE FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86.054,872
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97.611,356
JAIRO DE JESUS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86.068,425
YOBANY FIRIGUA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121.885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121.927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121.924,984
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121.868,255
JEFERSSON TORRES MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	1,030.586,565
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125.471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121.872,429
JHON FREDY APOLINAR SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1,006.795,395
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006.796,551
WILLIAM ANDRES OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121.927,112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121.842,258
JAIVER FABIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006.423,856
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006.820,934

LISTADO DE PERSONAL ENERO 2024		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,924,964
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
JHON FREDY APOLINAR SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1,006,795,395
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,795,551
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL FEBRERO 2024		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
YHON MAURICIO QUIMBAYA MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,924,964
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
JHON FREDY APOLINAR SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1,006,795,395
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,795,551
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL MARZO 2024		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,796,551
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866
LUIS ERNESTO BETANCOURTH	CADENERO	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL ABRIL 2024		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
YOBANY FIRIGUA RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA	1,121,885,427
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
MANUAL ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,868,255
WILIAM DURAN HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	17,339,737
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSE WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
LUIS ANGEL TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,796,551
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
YENIFER PEÑARETE QUEVEDO	AUXILIAR VIAL	1,121,842,258
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866
LUIS ERNESTO BETANCOURTH GONZALEZ	CADENERO	1,006,820,934

LISTADO DE PERSONAL MAYO 2024		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ALONSO BOBADILLA CLAVIJO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	1,121,867,898
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
IVÁN PULIDO VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	17,344,901
ELKIN ESTEBAN MOLINA BELTRÁN	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,122,133,490
JOSÉ BERNARDO CONTRERAS CARRILLO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
EDILBERTO AMAYA	OPERADOR DE MAQUINARÍA	11,280,202
ARQUIMEDES JUEZ SABOGAL	OPERADOR DE MAQUINARÍA	1,121,915,725
JOSE FLORIBERTO MATIAS PARRADO	OPERADOR DE MAQUINARÍA	17,346,751
JOSÉ FERNEY ORTIZ SÁNCHEZ	OPERADOR DE MAQUINARÍA	86,054,672
JAIRO GUTIERREZ CEBALLOS	OFICIAL DE OBRA	97,611,355
JAIRO DE JESÚS VILLADA ROJAS	OFICIAL DE OBRA	86,068,425
ANDRÉS FELIPE BASTIDAS BELTRÁN	OFICIAL DE OBRA	1,121,927,006
JOSÉ MANUEL CARDENAS ESPITIA	OFICIAL DE OBRA	3,276,434
CLAUDIO PASCUAL RESTREPO COMERCIANTE	AYUDANTE DE OBRA	1,125,471,422
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429
WILLIAM ANDRÉS OSPINA TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	1,121,927,112
JAIVER FAVIAN ABRIL ESCOBAR	TOPOGRAFO	1,006,423,866

LISTADO DE PERSONAL JUNIO 2024		
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula
EDUARDO MARTÍNEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	86,057,208
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
DIEGO ALEXANDER DUQUE VARGAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	86,075,526
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTE DE CALIDAD	1,121,882,054
EVA LILIANA MARTÍNEZ TARACHE	INGENIERA AMBIENTAL	1,121,842,823
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046
ARMANDO MORENO GONZÁLEZ	TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	86,041,016
BELLO SANABRIA JUAN SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	1,123,809,664
HENRY MURILLO GONZÁLEZ	AYUDANTE DE OBRA	17,390,558
JOSÉ WILSON NIETO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	17,386,756
DIEGO FERLEY BERMUDEZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1,121,872,429

5.3 Aspectos logísticos

El personal profesional y técnico garantizado durante el desarrollo del contrato de obra correspondió al relacionado a continuación:

CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
INGENIERO AMBIENTAL	1
GERENTE DE PROYECTOS	1
PROFESIONAL EN SST - HSEQ	1
TECNICO EN AREA DE LA INGENIERIA Y/O INSPECTOR	1

La maquinaria y equipo mínimo garantizado en obra durante la de ejecución del proyecto correspondió a:

MAQUINA/EQUIPO	CANTIDAD
MINICARGADOR BOBCAT	1
VIBROCOMPACTADOR RODILLO MIN 7 TON	1
MOTONIVELADORA	1
RETROEXCAVADORA	1
EXCAVADORA DE ORUGAS	1
VOLQUETAS	2

5.5 Instalaciones administrativas

El contratista cuenta con una oficina ubicada en la carrera 32 # 38-70, oficina 1302 y cuenta con el teléfono fijo número 608 671 54 23 y celular 315 866 00 74, donde se coordinaron todos los aspectos administrativos del proyecto y actualmente se coordinan los aspectos relacionados con la liquidación del contrato.

5.6 Seguridad Industrial y señalización de obra

Antes del inicio de las labores, al personal que se contrataba se le realizaba una inducción donde se daban a conocer los temas principales de la empresa y la matriz de riesgo. Adicionalmente se manejó un profesiograma el cual se implementó para los requerimientos de contratación según legislación vigente colombiana.

Así mismo se creó un programa de capacitación según matriz de peligros para la mitigación de los riesgos a los cuales estaban expuestos los trabajadores y se realizaba entrega de dotación al personal contratado.

Con referencia a la señalización de obra y al manejo de tráfico, continuamente se dispuso de un auxiliar vial debidamente capacitado para el control de tráfico durante las actividades de obra, de igual manera se dispuso e hizo uso de la señalización vial propuesta en el Plan de Manejo de Tráfico.

5.5 Control de calidad.

Como parte del proceso de control de calidad en el desarrollo de las actividades de obra se han solicitado certificados de calidad a los proveedores de materiales y se han desarrollados laboratorios conjuntamente con los que desarrolla la interventoría en el proceso de control y supervisión de las actividades de obra, a continuación, se relacionan los ensayos de laboratorio ejecutados por el contratista de obra:

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							
Fecha	Material	Ensayo	Localización	Norma	Resultados		CUMPLE
					REFERENTE	OBTENIDO	
16/09/2022	SUBBASE	DENSIDAD	K03+570.00	INV-E-161-2013	95%	97.40%	S
9/06/2022	SUBBASE	DENSIDAD	K03+510.00	INV-E-161-2013	95%	96.80%	S
9/06/2022	SUBBASE	DENSIDAD	K04+040.00	INV-E-161-2013	95%	97.10%	S
9/06/2022	SUBBASE	DENSIDAD	K03+885.00	INV-E-161-2013	95%	96.70%	S
9/06/2022	SUBBASE	DENSIDAD	K03+815.00	INV-E-161-2013	95%	96.40%	S
9/06/2022	SUBBASE	DENSIDAD	K03+725.00	INV-E-161-2013	95%	98.30%	S
16/06/2020	SUBBASE	DENSIDAD	K03+455.00	INV-E-161-2013	95%	98.30%	S
15/08/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K00+310.00	INV-E-164-166	95%	95.40%	S
15/08/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K00+410.00	INV-E-164-166	95%	95.50%	S
15/08/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K00+505.00	INV-E-164-166	95%	95.20%	S
15/08/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K00+608.00	INV-E-164-166	95%	100.30%	S
15/08/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K00+720.00	INV-E-164-166	95%	97.90%	S
22/08/2023	BASE	DENSIDAD	K00+020.00	INV-E-164-166	98%	98.70%	S
22/08/2023	BASE	DENSIDAD	K00+050.00	INV-E-164-166	98%	99.00%	S
22/08/2023	BASE	DENSIDAD	K00+120.00	INV-E-164-166	98%	98.70%	S
22/08/2023	BASE	DENSIDAD	K00+280.00	INV-E-164-166	98%	101.50%	S
22/08/2023	BASE	DENSIDAD	K00+340.00	INV-E-164-166	98%	99.30%	S
22/08/2023	BASE	DENSIDAD	K01+400.00	INV-E-164-166	98%	101.20%	S
4/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+720.00	INV-E-161-2013	95%	96.30%	S
4/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+780.00	INV-E-161-2013	95%	95.40%	S
4/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+850.00	INV-E-161-2013	95%	96.20%	S
4/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+950.00	INV-E-161-2013	95%	95.50%	S
4/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K04+070.00	INV-E-161-2013	95%	95.90%	S
7/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+720.00	INV-E-161-2013	98%	99.50%	S
7/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+780.00	INV-E-161-2013	98%	99.30%	S
7/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+850.00	INV-E-161-2013	98%	99.70%	S
7/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+950.00	INV-E-161-2013	98%	99.90%	S
7/09/2023	BASE	DENSIDAD	K04+070.00	INV-E-161-2013	98%	99.70%	S
11/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+510.00	INV-E-161-2013	95%	95.70%	S
11/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+590.00	INV-E-161-2013	95%	95.50%	S
11/09/2023	SUBBASE	DENSIDAD	K03+680.00	INV-E-161-2013	95%	96.50%	S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							
Fecha	Material	Ensayo	Localización	Norma	Resultados		CUMPLE
					REFERENTE	OBTENIDO	
13/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+510.00	INV-E-161-2013	98%	99.60%	S
13/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+590.00	INV-E-161-2013	98%	99.80%	S
13/09/2023	BASE	DENSIDAD	K03+680.00	INV-E-161-2013	98%	99.70%	S
5/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	5028.2 PSI	S
5/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4991.1 PSI	S
5/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	5154.3 PSI	S
12/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	2000 PSI	2235.0 PSI	S
12/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	2000 PSI	2214.6 PSI	S
12/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	2000 PSI	2231.3 PSI	S
29/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3483.2 PSI	S
29/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3134.5 PSI	S
29/09/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3386.8 PSI	S
10/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3403.5 PSI	S
10/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3438.7 PSI	S
10/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3462.8 PSI	S
18/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3132.7 PSI	S
18/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3340.4 PSI	S
18/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3260.6 PSI	S
21/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3047.3 PSI	S
21/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3358.9 PSI	S
21/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3642.7 PSI	S
25/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3713.2 PSI	S
25/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3904.2 PSI	S
25/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3904.2 PSI	S
28/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3568.5 PSI	S
28/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3800.4 PSI	S
28/10/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3820.8 PSI	S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Material	Ensayo	Localización	Norma	Resultados		CUMPLE
					REFERENTE	OBTENIDO	
3/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4149.1 PSI	S
3/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4792.7 PSI	S
3/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4967.0 PSI	S
16/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3496.2 PSI	S
16/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3550.0 PSI	S
16/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3807.8 PSI	S
18/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3268.1 PSI	S
18/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3323.7 PSI	S
18/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3403.5 PSI	S
23/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3892.7 PSI	S
23/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4097.1 PSI	S
23/11/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4113.8 PSI	S
14/12/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4551.5 PSI	S
14/12/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4698.1 PSI	S
14/12/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4725.9 PSI	S
19/12/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4368.8 PSI	S
19/12/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4549.7 PSI	S
19/12/2023	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4662.8 PSI	S
4/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4550.0 PSI	S
4/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4564.5 PSI	S
4/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4839.0 PSI	S
9/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4254.8 PSI	S
9/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4536.7 PSI	S
9/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4605.3 PSI	S
10/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	3807.8 PSI	S
10/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4048.9 PSI	S
10/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4204.7 PSI	S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Material	Ensayo	Localización	Norma	Resultados		CUMPLE
					REFERENTE	OBTENIDO	
10/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4787.1 PSI	S
10/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	4924.4 PSI	S
10/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	5161.8 PSI	S
24/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	5004.1 PSI	S
24/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	5302.7 PSI	S
24/01/2024	CONCRETO	COMPRESIÓN	OBRAS DREN.	INV-E-410	3000 PSI	5447.4 PSI	S
28/08/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.1%	S
28/08/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.61	S
28/08/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
28/08/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.30	S
1/09/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
1/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.45	S
1/09/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
1/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.25	S
8/09/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
8/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.42	S
8/09/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.20	S
8/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.49	S
9/09/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
9/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.58	S
9/09/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
9/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.28	S
23/09/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
23/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.28	S
23/09/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.30	S
23/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.36	S
26/09/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
26/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.62	S
26/09/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
26/09/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.26	S
22/12/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
22/12/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	13.63	S
22/12/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
22/12/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	3.99	S
26/12/2023	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	4.9%	S
26/12/2023	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.07	S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							
Fecha	Material	Ensayo	Localización	Norma	Resultados		CUMPLE
					REFERENTE	OBTENIDO	
26/12/2023	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
26/12/2023	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.10	S
10/02/2024	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.1%	S
10/02/2024	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.13	S
10/02/2024	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.50	S
10/02/2024	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.08	S
21/02/2024	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.0%	S
21/02/2024	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.02	S
21/02/2024	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
21/02/2024	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.09	S
22/02/2024	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.2%	S
22/02/2024	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.09	S
22/02/2024	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.50	S
22/02/2024	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.04	S
12/03/2024	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.2%	S
12/03/2024	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.63	S
12/03/2024	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.50	S
12/03/2024	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.21	S
12/03/2024	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.1%	S
12/03/2024	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.00	S
12/03/2024	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.40	S
12/03/2024	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.08	S
12/03/2024	MDC-19	%ASFALTO	VÍA	INV-E-732	4.9% - 5.5%	5.1%	S
12/03/2024	MDC-19	ESTABILIDAD	VÍA	INV-E-748	12.99 - 18.04	14.22	S
12/03/2024	MDC-19	FLUJO	VÍA	INV-E-748	2.0 - 3.50	3.50	S
12/03/2024	MDC-19	ESTABILIDAD/FUJO	VÍA	INV-E-748	3.0 - 6.0	4.07	S

6 CONCLUSIONES

- Las actividades de obra necesarias para la ejecución del objeto contractual se ejecutaron conforme a los diseños establecidos, siguiendo las especificaciones técnicas y atendiendo a los criterios técnicos de especialistas e interventoría, de igual forma se veló por el cumplimiento del personal y maquinaría mínimo requerido en el contrato.

- Se ha logrado el cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra 1507 de 2021 correspondiente a "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" con una utilización de $ 7,944,535,251.00 quedando un saldo a favor de la entidad contratante por $ 29,099,518.00.

- Se logró el mejoramiento de la vía Charrascal-Caracolí, entregándose una vía totalmente pavimentada con un ancho de pavimento de 6 metros y una longitud de 4.088 Km cuyo punto de inicio se encuentra ubicado en el barrio Charrascal en el K0+000 con coordenadas 4°5'6.39"N, 73°39'21.34"O y el punto final de la intervención se encuentra en sector de Caracolí en la intersección con la vía denominada Corredor ecológico en el K4+088 y coordenadas 4° 5'24.72"N, 73°37'41.52"O.

- Es de vital importante seguir las recomendaciones del manual de mantenimiento de obra y ejecutar los trabajos de mantenimiento que son de vital importancia para prolongar la vida útil de la carretera y mejorar la serviciabilidad de la vía.

ING. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 25202-26082 CND

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

SEGURIDAD SOCIAL – FINANCIERA

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A
Ingenieros Contratista
NIT. 800.079.482-9

CERTIFICADO DE PAGO DE NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CARLOS YESID MARTINEZ CASTILLO identificado con cedula de ciudadanía número 17.342.070 de Villavicencio y con tarjeta profesional No. 48.107-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.** identificada con NIT **800.079.482-9,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA.**

Luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente **aceptadas** en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante los últimos 6 meses, la empresa realizo el pago de nómina y el pago de los aportes de salud (aportes empleados), riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, **manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud (aportes empleador), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.**

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 19 días del mes de noviembre de 2024.

CARLOS YESID MARTINEZ CASTILLO
Revisor Fiscal **EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.**
C.C. 17.342.070 DE VILLAVICENCIO
T.P. 48.107-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 0 2 6 8 9 0 5 5 8 8 0 8 A 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS YESID MARTINEZ CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342070 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 48107-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.342.070

MARTINEZ CASTILLO

APELLIDOS

CARLOS YESID

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1969

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-DIC-1987 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00147467-M-0017342070-20090123 0009597118A 1 6760009422

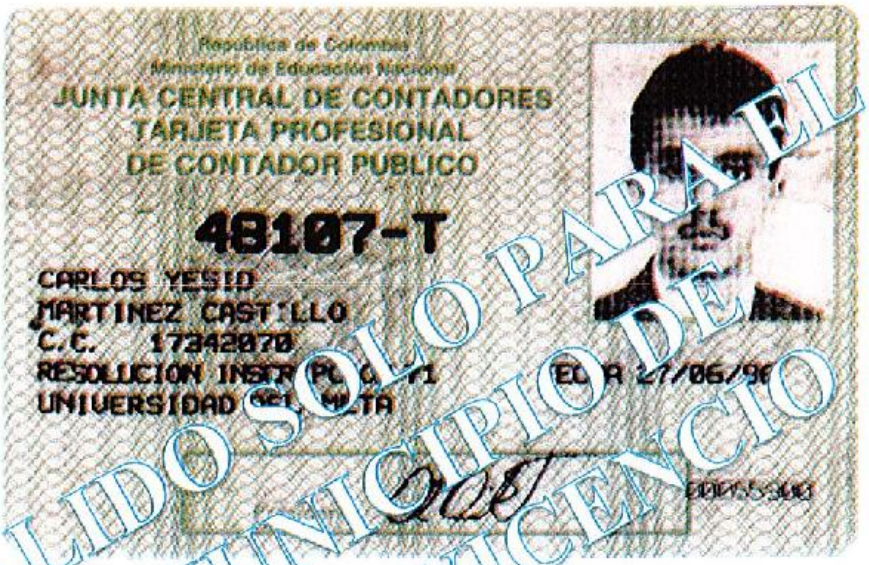


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48107-T

CARLOS YESID
MARTINEZ CASTILLO
C.C. 17342070
RESOLUCION INSCR PCC 171 EXPR 27/06/9
UNIVERSIDAD SAN MARTA

VALIDO SOLO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

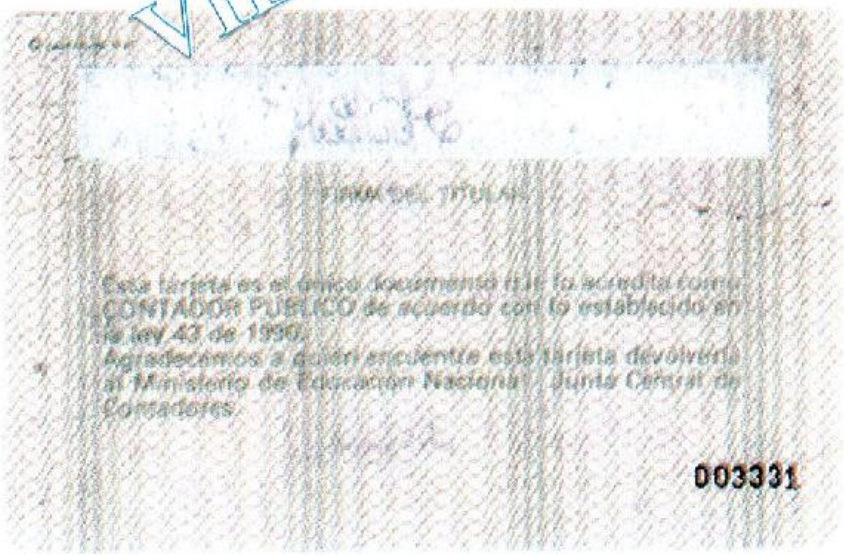

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003331

LISTADO PERSONAL DICIEMBRE 2021

ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
MARIA FERNANDA VÉLEZ RIOS	ING AUXILIAR	1,121,896,539
FREDY ALEXANDER PUENTES ROZO	CADENERO	17,421,937
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO: META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 1502	TELÉFONO: 6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7822793888	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1272352873

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	13	$ 4.075.300	$ 0	$ 0	$ 40.800	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 4.156.900	$ 0	$ 4.156.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 7.090.200	$ 0	$ 0	$ 104.300	$ 104.300	$ 0	$ 0	$ 7.298.800	$ 0	$ 7.298.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 404.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.200	$ 0	$ 404.200
230301	230301-PORVENIR	20	$ 4.384.200	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 4.454.200	$ 0	$ 4.454.200
SUBTOTALES:										$ 16.314.100	$ 0	$ 16.314.100

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 429.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200	$ 0	$ 0	$ 429.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 38.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 25.900
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 123.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.200	$ 0	$ 0	$ 123.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 47.400
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
EPS041	EPS041-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 67.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	21		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.051.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.051.400	$ 0	$ 0	$ 2.051.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 50.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 403.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800	$ 0	$ 0	$ 403.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 652.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.700	$ 0	$ 0	$ 652.700
SUBTOTALES:													$ 4.207.800	$ 0	$ 0	$ 4.207.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7 SEGUROS BOLIVAR S.A.	55		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.814.700	$ 8.814.700	$ 0	$ 0	$ 8.814.700
SUBTOTALES:									$ 8.814.700	$ 0	$ 0	$ 8.814.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	30	$ 4.207.800	$ 0	$ 4.207.800
SUBTOTALES:			$ 4.207.800	$ 0	$ 4.207.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	HOYOS ANGARITA ALEXIS MANUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	04	16						X	X								
2	CC [illegible]	HIDALGO AVILA JOHN ALEXER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		15							X								
3	CC [illegible]	FLOREZ LANDAZURI YESICA ANDREA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	
4	CC 80150135	ROJAS SANCHEZ IGNACIO	DEPEND		$ 999.526	FIJO			SI									X								
5	CC 80174899	QUINTERO VILLARRAGA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.071.000	FIJO			SI									X								
6	CC [illegible]	VASQUEZ ARIAS ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	
7	CC [illegible]	RINCON GARCIA DANIEL FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	20							X									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	15	$ 648.355	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 103.500
2	230301-PORVENIR	15	$ 562.500	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.000
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.199.536	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.329.427	$ 212.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.800
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
7	230301-PORVENIR	11	$ 733.334	$ 117.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117.400

SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 646.355	$ 25.900	$ 0	$ 25.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 648.355	1	$ 45.000
2	EPS044-MEDIMÁS	15	$ 562.500	$ 22.500	$ 0	$ 22.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 562.500	1	$ 39.200
3	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 5.300
4	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.199.538	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.199.536	1	$ 83.500
5	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.329.427	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.329.427	1	$ 97.800
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200
7	EPS017-FAMISANAR	11	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 29.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	11	$ 733.334	1	$ 51.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	15	$ 648.355	CCF34-COFREM META	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	15	$ 562.500	CCF34-COFREM META	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.199.536	CCF34-COFREM META	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.329.427	CCF34-COFREM META	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	11	$ 733.334	CCF34-COFREM META	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 1502	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7922793888	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1272332673

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
8	CC 1067388538	TORO MARQUEZ JEISON CAMILO	DEPEND		$ 1.271.000	FIJO		SI									X									231001-COLFONDOS	30	$ 1.270.932	$ 203.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 203.400
9	CC 1119587871	VILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 2.188.125	$ 350.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350.100
10	CC 1120873026	BUENO MOLANO RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	04							X	X									230301-PORVENIR	27	$ 958.333	$ 153.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.400
11	CC 1121847829	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO		SI		30																230201-PROTECCION	30	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000
12	CC 1121893369	MUÑOZ SALINAS JESSICA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
13	CC 1121866539	VELEZ [illegible]	DEPEND		$ 4.150.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.150.000	$ 664.000	$ 20.800	$ 20.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 705.600
14	CC 1121911060	DIAZ LARREGO JESUS IVAN	DEPEND		$ 1.258.000	FIJO		SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 1.267.961	$ 202.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.900
15	CC 1121914172	RAYO RAMIREZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.568.000	FIJO		SI									X									230201-PROTECCION	30	$ 1.692.134	$ 270.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.800
16	CC 1121905223	SALAZAR VALENZUELA NICLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400
17	CC 1121863940	MORENO ORTEGA JOEL DAVID	DEPEND		$ 1.207.000	FIJO		SI	01							X	X									230301-PORVENIR	30	$ 1.458.458	$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.400
18	CC 1123143385	CHISABA LAMOR LEYDER EDWIN	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 998.432	$ 159.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.800
19	CC 1125114071	ZAPATA LONGA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	03	14						X	X									230301-PORVENIR	12	$ 605.211	$ 96.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.900
20	CC 1124825001	GUTIERREZ PALENCIA WILDER ARLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	04							X	X									230301-PORVENIR	27	$ 958.333	$ 153.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.400
21	CC 1124997120	GALVIS BENJUMEA WILLIAM	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
22	CC 11250202	RAMYA EDILBERTO	DEPEND		$ 1.242.000	FIJO		SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.607.484	$ 257.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257.200
23	CC 1120818894	MALAGON BOBADILLA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI	01							X	X									230301-PORVENIR	30	$ 1.086.919	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.000
24	CC 1234789119	OÑATE SUAREZ FABIAN STIVEN	DEPEND		$ 955.000	FIJO		SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 1.233.660	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400
25	CC 17310869	RODRIGUEZ ORJUELA JAIME	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.178.000	FIJO		SI									X											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
26	CC 17311567	CRUZ ARIZA JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.130.000	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.800
27	CC 17325108	[illegible]	DEPEND		$ 8.700.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.700.000	$ 1.392.000	$ 43.500	$ 43.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.479.000
28	CC 17344639	MATAS PARRADO JOSE FLORBERTO	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO		SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.456.641	$ 233.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.100

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP; PARAFISCALES

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR UPC ADICIONAL	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.270.932	$ 50.900	$ 0	$ 50.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.270.932	1	$ 88.500	30	$ 1.270.932	CCF34-COFREM META	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.188.125	$ 87.600	$ 0	$ 87.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.188.125	1	$ 152.200	30	$ 2.188.125	CCF34-COFREM META	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 958.333	$ 38.400	$ 0	$ 38.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 958.333	1	$ 66.700	27	$ 958.333	CCF34-COFREM META	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.450.000	1	$ 101.000	30	$ 1.450.000	CCF34-COFREM META	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000	1	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.150.000	$ 166.000	$ 0	$ 166.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.150.000	1	$ 288.900	30	$ 4.150.000	CCF34-COFREM META	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.267.961	$ 50.800	$ 0	$ 50.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.267.961	1	$ 88.300	30	$ 1.267.961	CCF34-COFREM META	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.692.134	$ 67.700	$ 0	$ 67.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.692.134	1	$ 117.800	30	$ 1.692.134	CCF34-COFREM META	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526	1	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF34-COFREM META	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.458.458	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.458.458	1	$ 101.600	30	$ 1.458.458	CCF34-COFREM META	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 998.432	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 998.432	1	$ 69.500	30	$ 998.432	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	EPS044-MEDIMÁS	12	$ 605.211	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 605.211	1	$ 42.200	12	$ 605.211	CCF34-COFREM META	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 958.333	$ 38.400	$ 0	$ 38.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 958.333	1	$ 66.700	27	$ 958.333	CCF34-COFREM META	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.607.484	$ 64.300	$ 0	$ 64.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.607.484	1	$ 111.900	30	$ 1.607.484	CCF34-COFREM META	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.086.919	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.086.919	1	$ 75.700	30	$ 1.086.919	CCF34-COFREM META	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.233.660	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.233.660	1	$ 85.900	30	$ 1.233.660	CCF34-COFREM META	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.435.667	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.435.667	1	$ 100.000	30	$ 1.435.667	CCF34-COFREM META	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.130.000	$ 45.200	$ 0	$ 45.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.130.000	1	$ 78.700	30	$ 1.130.000	CCF34-COFREM META	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 8.700.000	$ 348.000	$ 0	$ 348.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 8.700.000	1	$ 605.600	30	$ 8.700.000	CCF34-COFREM META	$ 348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.456.641	$ 58.300	$ 0	$ 58.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.456.641	1	$ 101.400	30	$ 1.456.641	CCF34-COFREM META	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079492
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ECOPETROL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 1102	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	75227793888		TIPO DE PLANILLA:		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1272332873

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																												PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	CENTRO OCIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PSP SUBSISTENCIA	PSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
29	CC 37346751	CONTRERAS CARRILLO JOSE BERNARDO	DEPEND	PENSIONADO ACT	$ 1.972.000	FIJO			SI									X									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	01-PS037-NUEVA EPS	30	$ 1.972.000	$ 95.600	$ 0	$ 95.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.394.318	1	168.700	30	$ 2.394.318	$CCF34-COFREM META	$ 95.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 37987759	CARDOZA JORGE	DEPEND		$ 1.973.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.973.000	$ 315.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.973.000	$ 79.000	$ 0	$ 79.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.973.000	1	137.400	30	$ 1.973.000	$CCF34-COFREM META	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 37992058	GONZALEZ MURILLO HENRY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI									X								230201-PROTECCION	30	$ 1.171.147	$ 187.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.171.147	$ 46.900	$ 0	$ 46.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.171.147	1	81.900	30	$ 1.171.147	$CCF34-COFREM META	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 17421837	[illegible]	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	252201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 840.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000	1	278.400	30	$ 4.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 2[illegible]	MOLINA BARRIOS DORA MERCEDES	DEPEND		$ 1.147.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.147.000	$ 183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 183.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.147.000	$ 45.900	$ 0	$ 45.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.147.000	1	$ 80.000	30	$ 1.147.000	$CCF34-COFHLM META	$ 45.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 2[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000	1	$ 7.400	30	$ 1.400.000	$CCF34-COFREM META	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 40[illegible]	SARA CARDONA HAZLLY BRIGITTE	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000	1	222.800	30	$ 3.200.000	$CCF34-COFHLM META	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 80054492	DIAZ GOMEZ MYRAM	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.250.000	1	$ 8.500	30	$ 1.250.000	$CCF34-COFREM META	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 80875283	MENDEZ ORTIZ BEATRIZ	DEPEND	PENSIONADO ACT	$ 1.020.000	VARIABLE			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	05-PS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.020.000	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.020.000	1	$ 8.500	30	$ 1.020.000	$CCF34-COFHLM META	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 80870109	BAQUERO MEDINA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 528.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 132.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.300.000	1	$ 17.500	30	$ 3.300.000	$CCF34-COFREM META	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 41729917	[illegible]	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS044-MEDIMAS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526	1	$ 62.300	30	$ 908.526	$CCF34-COFHLM META	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 52988181	CASTILLO ESTUPIÑAN MARLEN	DEPEND		$ 1.255.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.255.000	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.800	EPS010-COOMEVA S.A.	30	$ 1.255.000	$ 50.200	$ 0	$ 50.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.255.000	1	$ 8.600	30	$ 1.255.000	$CCF34-COFREM META	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 25284523	[illegible]	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																	250501-PORVENIR	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS S.DC	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.000.000	1	497.200	30	$ 7.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 23177715	[illegible]	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI	01								X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.000.000	1	948.000	30	$ 5.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 80240498	PATIÑO SILVA CARLOS EDWARDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.100	$ 0	$ 40.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 109.700	30	$ 1.000.000	$CCF34-COFHLM META	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2.415.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.415.000	$ 386.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.415.000	$ 96.600	$ 0	$ 96.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.415.000	1	168.100	30	$ 2.415.000	$CCF34-COFREM META	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 80054672	ORTIZ SANCHEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 1.801.693	FIJO			SI									X								230201-PROTECCION	30	$ 1.801.693	$ 288.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.801.693	$ 72.100	$ 0	$ 72.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.801.693	1	125.400	30	$ 1.801.693	$CCF34-COFREM META	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 80057051	MARTINEZ SANCHEZ EDUARDO	DEPEND		$ 7.150.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.150.000	$ 1.144.000	$ 35.800	$ 35.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.215.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.150.000	$ 286.000	$ 0	$ 286.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.150.000	1	497.700	30	$ 7.150.000	$CCF34-COFREM META	$ 286.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 80070827	DIAZ REYES JEHANY ARMILES	DEPEND		$ 1.251.800	FIJO			SI									X								230301-PROTECCION	30	$ 1.852.102	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.852.102	$ 66.100	$ 0	$ 66.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.852.102	1	115.000	30	$ 1.852.102	$CCF34-COFREM META	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 80073094	AGUAS MONTES CARLOS ANTONIO	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO			SI									X								230201-PROTECCION	30	$ 1.801.042	$ 256.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.801.042	$ 64.100	$ 0	$ 64.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.801.042	1	111.000	30	$ 1.801.042	$CCF34-COFREM META	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 52 38 70 OFICINA 10 02	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7622793869	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1272382873

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
49	CC [illegible]	[illegible] JULIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.144.000	FIJO		SI									X								
50	CC [illegible]	[illegible] PULIDO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.207.000	FIJO		SI									X								
51	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ [illegible]	FIJO		SI									X								
52	CC [illegible]	[illegible] TORO JORMAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	
53	CC [illegible]	FERNANDEZ [illegible] OSCAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	28	30															
54	CC [illegible]	CANGAMIL [illegible]	DEPEND		$ 1.021.000	FIJO		SI									X								
55	CC [illegible]	GÓMEZ AGUIRRE [illegible]	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI	01							X	X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
49	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.514.608	$ 242.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.400
50	230201-PROTECCION	30	$ 1.425.014	$ 228.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.100
51	230201-PROTECCION	30	$ 1.182.977	$ 189.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.300
52	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
53	230301-PORVENIR	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
54	230201-PROTECCION	30	$ 1.369.310	$ 219.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.100
55	230301-PORVENIR	30	$ 1.693.333	$ 271.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
49	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.514.608	$ 60.600	$ 0	$ 60.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.514.608	1	$ 105.500
50	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.425.014	$ 57.100	$ 0	$ 57.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.425.014	1	$ 99.200
51	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.182.977	$ 47.400	$ 0	$ 47.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.182.977	1	$ 82.400
52	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200
53	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 100.000		$ 7.000
54	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.369.310	$ 54.800	$ 0	$ 54.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.369.310	1	$ 95.400
55	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.693.333	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.693.333	1	$ 117.900

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
49	30	$ 1.514.608	CCF34-COFREM META	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	30	$ 1.425.014	CCF34-COFREM META	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	30	$ 1.182.977	CCF34-COFREM META	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	3	$ 100.000	CCF34-COFREM META	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	30	$ 1.369.310	CCF34-COFREM META	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	30	$ 1.693.333	CCF34-COFREM META	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 31.344.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1002 ED ROMARGO	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2329042829	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		69843714

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 232.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.761.500	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 2.881.500	$ 0	$ 2.881.500
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.418.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.418.300	$ 0	$ 3.418.300
SUBTOTALES:										$ 6.883.800	$ 0	$ 6.883.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 61.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 43.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 50.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 101.800
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 57.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.100	$ 0	$ 0	$ 124.100
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 118.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.300	$ 0	$ 0	$ 118.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 818.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 818.700	$ 0	$ 0	$ 818.700
SUBTOTALES:													$ 1.691.300	$ 0	$ 0	$ 1.691.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.943.100	$ 2.943.100	$ 0	$ 0	$ 2.943.100
SUBTOTALES:									$ 2.943.100	$ 0	$ 0	$ 2.943.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	24	$ 1.691.300	$ 0	$ 1.691.300
SUBTOTALES:			$ 1.691.300	$ 0	$ 1.691.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1026252911	[illegible] JOHATHAN ANDRES	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI									01-30							
2	CC 1032471865	LASSO CONDE LAURA KATHERINE	DEPEND		$ 950.000	FIJO			SI																
3	CC 1121831124	ROJAS AGUILAR FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI									01-30							
4	CC 1121859782	SALAZAR CONTRERAS SHIRLEY XIOMARA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																
5	CC 1121867189	SAOUGRO REY WILLIAM GIOVANNY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI		X							01-15							
6	CC 1121868057	JIMENEZ MUÑOZ JHON FREDY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI									01-30							
7	CC 1121877442	CESPEDES GADUINO NATALIA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																
8	CC 1121552054	[illegible]	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.100.641	$ 176.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.200
2	230301-PORVENIR	30	$ 950.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.000
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.329.865	$ 212.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.800
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000
5	230301-PORVENIR	15	$ 646.377	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 103.500
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.172.692	$ 187.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.600
7	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.100.641	$ 44.100	$ 0	$ 44.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.641		$ 76.700
2	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 950.000		$ 66.200
3	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.329.865	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.329.865		$ 92.600
4	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.200.000		$ 83.600
5	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	15	$ 646.377	$ 25.900	$ 0	$ 25.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 646.377		$ 45.000
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.172.692	$ 46.900	$ 0	$ 46.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.172.692		$ 81.600
7	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200
8	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.100.641	CCF34-COFREM META	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 950.000	CCF34-COFREM META	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.329.865	CCF34-COFREM META	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.200.000	CCF34-COFREM META	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	15	$ 646.377	CCF34-COFREM META	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.172.692	CCF34-COFREM META	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 2.200.000	CCF34-COFREM META	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 4.000.000	CCF34-COFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901298805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 ED ROMARCO
TELÉFONO:	6715120
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2329042829
TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/06
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	69643714

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1121934858	HINCAPIE ARDILA SARA MARIA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																	
10	CC 1121944733	ALZATE ROMERO JOSE LUIS	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																	
11	CC 1121569051	VIAFARA ZAMORA HUVER ALEXI	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI									01-30								
12	CC 1122123824	SOTO ALVARADO JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO		SI																	
13	CC 1122133480	MOLINA BELTRAN ELKIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.272.000	FIJO		SI									01-30								
14	CC 1122142886	PEREZ REY JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																	
15	CC 1122827574	PERILLA CEPEDA FRANKIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI		15							01-15								
16	CC 87411790	HORTUA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	
17	CC 35264652	OLIVEROS MORA FLOR NEYSMEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI									01-30								
18	CC 40185625	CRUZ ARCINIEGAS ALBA YINETH	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	
19	CC 40330077	MENDOZA MENDEZ LENNY MARCELA	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI	01								01-30								
20	CC 41327946	BAZA CAPOTE OMAR ERNESTO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI									01-30								
21	CC 75080958	CORREA GARCIA VICTOR JULIAN	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO		SI																	
22	CC 76360072	BONILLA ALDANA FABIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI									01-30								
23	CC 86068170	MORALES HERNANDEZ NAUMAN	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI									01-30								
24	CC 86068859	MATIAS BOBADILLA WILFREDO	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
10	230201-PROTECCION	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
11	230301-PORVENIR	30	$ 953.478	$ 152.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.600
12	231001-COLFONDOS	30	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000
13	230301-PORVENIR	30	$ 1.456.838	$ 233.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.100
14	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
15	230301-PORVENIR	15	$ 567.187	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.800
16	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
17	230301-PORVENIR	30	$ 965.309	$ 154.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154.500
18	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
19	230301-PORVENIR	30	$ 941.649	$ 150.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 150.700
20	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.259.375	$ 201.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.500
21	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000
22	230301-PORVENIR	30	$ 962.942	$ 154.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154.100
23	230301-PORVENIR	30	$ 1.437.500	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.000
24	230301-PORVENIR	30	$ 1.076.981	$ 172.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.400

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200
10	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200
11	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 953.478	$ 38.200	$ 0	$ 38.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 953.478		$ 66.400
12	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.450.000		$ 101.000
13	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.456.838	$ 58.300	$ 0	$ 58.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.456.838		$ 101.400
14	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200
15	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 567.187	$ 22.700	$ 0	$ 22.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 567.187		$ 39.500
16	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200
17	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 965.309	$ 38.700	$ 0	$ 38.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 965.309		$ 67.200
18	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200
19	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 941.649	$ 37.700	$ 0	$ 37.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 941.649		$ 65.600
20	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.259.375	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.259.375		$ 87.700
21	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 8.000.000		$ 556.800
22	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 962.942	$ 38.600	$ 0	$ 38.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 962.942		$ 67.100
23	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.437.500	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.437.500		$ 100.100
24	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.076.981	$ 43.100	$ 0	$ 43.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.076.981		$ 75.000

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	30	$ 2.200.000	CCF34-COFREM META	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 2.200.000	CCF34-COFREM META	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 953.478	CCF34-COFREM META	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.450.000	CCF34-COFREM META	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.456.838	CCF34-COFREM META	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 2.200.000	CCF34-COFREM META	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	15	$ 567.187	CCF34-COFREM META	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 965.309	CCF34-COFREM META	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 941.649	CCF34-COFREM META	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 1.259.375	CCF34-COFREM META	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 8.000.000	CCF34-COFREM META	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 962.942	CCF34-COFREM META	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	30	$ 1.437.500	CCF34-COFREM META	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	30	$ 1.076.981	CCF34-COFREM META	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 13.209.500

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 11:20:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057656455

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** diciembre de 2021

PAGADO 19/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA		
Documento	CC1049608025	**Dirección**	CL 10 #26 A - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6603242
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	Total
CC 1049608025	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	57	00																	0	30	30	30	0	(230001) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 113.600	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300	$ 145.900	$ 468.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

LISTADO PERSONAL ENERO 2022

ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8000754/2
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 1302	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	E-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78255771 40	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO		2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				131129030

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	20	$ 4.778.100	$ 0	$ 0	$ 95.000	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 4.845.100	$ 0	$ 4.845.100
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 431.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.200	$ 0	$ 431.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 7.207.400	$ 0	$ 0	$ 107.700	$ 132.700	$ 0	$ 0	$ 7.447.800	$ 0	$ 7.447.800
230201	230201- PROTECCION	12	$ 3.865.300	$ 0	$ 0	$ 40.800	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 3.946.900	$ 0	$ 3.946.900
SUBTOTALES:										$ 16.674.000	$ 0	$ 16.674.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 336.300
EPS041	SALUD NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 32.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 440.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300	$ 0	$ 0	$ 440.300
CCF050	CCF050- COMFACOR ATLANTICO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
EPS005	EPS005-SANITAS E.A.	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.163.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.163.800	$ 0	$ 0	$ 2.163.800
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 48.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 483.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100	$ 0	$ 0	$ 483.100
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 642.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.200	$ 0	$ 0	$ 642.200
EPS044	EPS044-MEDIMAS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 88.800
SUBTOTALES:													$ 4.396.800	$ 0	$ 0	$ 4.396.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	55		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.738.000	$ 5.738.000	$ 0	$ 0	$ 5.738.000
SUBTOTALES:									$ 5.738.000	$ 0	$ 0	$ 5.738.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	55	$ 4.417.000	$ 0	$ 4.417.000
SUBTOTALES:			$ 4.417.000	$ 0	$ 4.417.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	TIPO IDENTIFICACIÓN	NUMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES COLOMBIANO EN EXTERIOR	RETORNO PERMANENTE	IRS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IGP
1	CC	1005999604	FLOREZ LANDAZURI ISSACK RAMIREZ	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO										A									
2	CC	80191535	NOVAS SANCHEZ IGNACIO	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI														30-11			
3	CC	10165128	NOVAS SANCHEZ IGNACIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								X	X								
4	CC	10174899	QUINTERO VILLAVIAGA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.221.000	FIJO		SI									X								
5	CC	10174899	QUINTERO VILLAVIAGA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.221.000	FIJO		SI														03-11			
6	CC	1020015052	MENDEZ MARIAS ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	
7	CC	1032357035	DIAZ PEDRAZA DIEGO ARTURO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI	11							X	X								
8	CC	1023750066	OTALORA JIMENEZ ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	25							X									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INCAPACIDAD TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000
25-14 COLPENSIONES	9	$ 259.862	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 67.600
25-14 COLPENSIONES	21	$ 863.794	$ 138.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.300
25-14 COLPENSIONES	21	$ 647.844	$ 135.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135.700
25-14 COLPENSIONES	9	$ 398.829	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.900
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
230301-PORVENIR	20	$ 1.385.417	$ 221.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.700
230301-PORVENIR	6	$ 220.000	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 35.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000
EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 259.862	$ 14.400	$ 0	$ 14.400
EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 863.794	$ 34.600	$ 0	$ 34.600
EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 647.844	$ 34.000	$ 0	$ 34.000
EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 398.829	$ 16.000	$ 0	$ 16.000
EPS005-SANITAS E.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
EPS017-FAMISANAR	20	$ 1.385.417	$ 55.500	$ 0	$ 55.500
EPS017-FAMISANAR	6	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.000	1	$ 5.800
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 259.862		$ 0
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 863.794	1	$ 90.200
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 647.844	1	$ 68.000
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 398.829		$ 0
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 1.385.417	1	$ 96.500
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 220.000	1	$ 15.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — PARAFISCALES — CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 1.100.000	CCF34-COFREM META	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 370.928	CCF34-COFREM META	$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 999.497	CCF34-COFREM META	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 851.000	CCF34-COFREM META	$ 34.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 389.917	CCF34-COFREM META	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.385.417	CCF34-COFREM META	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 220.000	CCF34-COFREM META	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830078482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 DI 80 MA 10 CC	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades regulatorias y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7825577140	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO		2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				13112992539

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARL							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1075684275	RINCON GARCIA DANIEL FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.000.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200	$30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1067986538	TORO MARQUEZ JESSY LORELEIN	DEPEND		$ 1.021.000	FIJO			SI								X								231601-COLFONDOS	31	$ 837.008	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.000	EPS017-FAMISANAR	21	$ 837.008	$ 53.500	$ 0	$ 53.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 837.008	1	$ 58.000	21	$ 837.008	CCF34-COFREM META	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1067986538	TORO MARQUEZ JESSY LORELEIN	DEPEND		$ 1.021.000	FIJO			SI												03-11				231601-COLFONDOS	9	$ 381.250	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61.100	EPS017-FAMISANAR	9	$ 381.250	$ 15.300	$ 0	$ 15.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 381.250		$ 0	9	$ 348.462	CCF34-COFREM META	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1139837871	VILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI												03-11				230301-PORVENIR	9	$ 656.438	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.100	EPS017-FAMISANAR	9	$ 656.438	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 656.438		$ 0	9	$ 602.059	CCF34-COFREM META	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1139837871	VILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI								X								230301-PORVENIR	21	$ 1.395.938	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.400	EPS017-FAMISANAR	21	$ 1.395.938	$ 55.900	$ 0	$ 55.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.395.938	1	$ 167.213	21	$ 1.395.938	CCF34-1.474.800 COFREM META	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1128521363	TIERNO MOLANO RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI		17						X	X							230301-PORVENIR	17	$ 715.001	$ 114.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 114.500	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 715.001	$ 28.700	$ 0	$ 28.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	17	$ 715.001	1	$ 49.801	17	$ 715.001	CCF34-COFREM META	$ 28.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1121851772	ACOSTA CONTRERAS CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI	28							X								230301-PORVENIR	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.200	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 48.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.213.334	1	$ 84.500	28	$ 1.213.334	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1121550315	MUÑOZ SALINAS JESSICA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000	1	$ 111.400	$30	$ 1.600.000	CCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1121990529	MEJIA RIOS MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 4.150.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 4.150.000	$ 664.000	$ 20.800	$ 20.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 705.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.150.000	$ 166.000	$ 0	$ 166.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.150.000	1	$ 288.900	$30	$ 4.150.000	CCF34-COFREM META	166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1121911003	DIAZ URREGO JESUS IVAN	DEPEND		$ 1.098.000	FIJO			SI								X								230301-PORVENIR	21	$ 811.491	$ 129.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.900	EPS017-FAMISANAR	21	$ 811.491	$ 32.500	$ 0	$ 32.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 811.491	1	$ 55.802	21	$ 871.155	CCF34-COFREM META	$ 34.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1121911003	DIAZ URREGO JESUS IVAN	DEPEND		$ 1.098.000	FIJO			SI												03-11				230301-PORVENIR	9	$ 380.389	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.900	EPS017-FAMISANAR	9	$ 380.389	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 380.389		$ 0	9	$ 373.810	CCF34-COFREM META	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1121914475	RAMIREZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.520.000	FIJO			SI								X								230201-PROTECCION	30	$ 1.608.833	$ 257.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.608.833	$ 64.400	$ 0	$ 64.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.608.833	1	$ 112.000	$30	$ 1.608.833	CCF34-COFREM META	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1121915725	DIAZ RAMIREZ JUAN MANUEL	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI	25							X								231601-COLFONDOS	6	$ 220.000	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 35.200	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 8.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 220.000	1	$ 15.400	6	$ 220.000	CCF34-COFREM META	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1121995259	BALDIZAR VALENZUELA ASHLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								X								230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 49.800	30	$ 1.000.000	CCF34-1.000.000 COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1121995486	MORENO ORTEGA JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.207.600	FIJO			SI								X								230301-PORVENIR	30	$ 1.396.737	$ 223.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.396.737	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.396.737	1	$ 97.400	30	$ 1.396.737	CCF34-COFREM META	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1122143285	GRANADA GAMBOA LENIN LISTHIN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												03-11				230301-PORVENIR	9	$ 300.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.000	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 12.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 300.000		$ 0	9	$ 366.160	CCF34-COFREM META	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1122143285	GRANADA GAMBOA LENIN LISTHIN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								X	X							230301-PORVENIR	21	$ 822.462	$ 131.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.600	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 822.462	$ 32.900	$ 0	$ 32.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 822.462	1	$ 57.330	21	$ 854.379	CCF34-COFREM META	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1124218401	GUTIERREZ PALENCIA WILMER ANLEY	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI								X	X							230301-PORVENIR	30	$ 1.237.500	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.237.500	$ 49.500	$ 0	$ 49.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.237.500	1	$ 86.200	30	$ 1.237.500	CCF34-COFREM META	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1124857020	SANTOS BELMONCA WILLIAM	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI								X	X							230301-PORVENIR	30	$ 1.168.750	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.000	EPS046-MEDIMAS	30	$ 1.168.750	$ 46.800	$ 0	$ 46.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.168.750	1	$ 81.400	30	$ 1.168.750	CCF34-COFREM META	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1128	AMAYA ROBERTO	DEPEND		$ 1.242.000	FIJO			SI								X								25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.021.416	$ 163.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.500	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.021.416	$ 40.900	$ 0	$ 40.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.021.416	1	$ 71.102	21	$ 1.039.212	CCF34-COFREM META	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1128	AMAYA ROBERTO	DEPEND		$ 1.242.000	FIJO			SI												03-11				25-14 COLPENSIONES	9	$ 482.248	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.200	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 482.248	$ 19.300	$ 0	$ 19.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 482.248		$ 0	9	$ 444.948	CCF34-COFREM META	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6715150
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7825577140	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1311280230

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
30	CC 1152811894	MAHECHA BONILLA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														03-11			
31	CC 1152811894	MAHECHA BONILLA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								X	X								
32	CC 1234789119	OÑATE SUAREZ FABIAN STIVEN	DEPEND		$ 986.000	FIJO			SI								X	X								
33	CC 1234789119	OÑATE SUAREZ FABIAN STIVEN	DEPEND		$ 986.000	FIJO			SI														03-11			
34	CC 17310829	RODRIGUEZ ORJUELA JAIME	DEPEND	PENSVEJ ACT	$ 1.178.000	FIJO			SI									X								
35	CC 17310829	RODRIGUEZ ORJUELA JAIME	DEPEND	PENSVEJ ACT	$ 1.178.000	FIJO			SI														03-11			
36	CC 17311257	CRUZ AVILA JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.636.500	FIJO			SI									X								
37	CC 17311257	CRUZ AVILA JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI														09-11			
38	CC 17311257	CRUZ AVILA JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI												24-28					
39	CC 17329166	SALCEDO MEDINA RAFAEL FERNANDO	DEPEND		$ 8.700.000	FIJO			SI														16-17			
40	CC 17329166	SALCEDO MEDINA RAFAEL FERNANDO	DEPEND		$ 8.700.000	FIJO			SI														11-15			
41	CC 17329166	SALCEDO MEDINA RAFAEL FERNANDO	DEPEND		$ 8.700.000	FIJO			SI									X								
42	CC 17344530	MATIAS PARRADO JOSE FLORBERTO	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI									X								
43	CC 17344530	MATIAS PARRADO JOSE FLORBERTO	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI														03-11			
44	CC 17348761	CONTRERAS CASTILLO JOSE BERNARDO	DEPEND	PENSVEJ ACT	$ 1.873.000	FIJO			SI									X								
45	CC 17581771	QUIROGA JORGE	DEPEND		$ 1.973.000	FIJO			SI																	
46	CC 17390558	GONZALEZ MURILLO HENRY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								X	X								
47	CC 17390558	GONZALEZ MURILLO HENRY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														03-11			
48	CC 17421537	PUENTES ROJO FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	
49	CC 28558642	MOLINA BARRIOS DORA MERCEDES	DEPEND		$ 1.147.000	FIJO			SI														03-15			
50	CC 28558642	MOLINA BARRIOS DORA MERCEDES	DEPEND		$ 1.147.000	FIJO			SI														16-20			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
30	230301-PORVENIR	9	$ 326.078	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 52.200
31	230301-PORVENIR	21	$ 863.149	$ 138.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.200
32	230301-PORVENIR	21	$ 822.162	$ 131.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.600
33	230301-PORVENIR	9	$ 370.099	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.300
34			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
35			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
36	25-14 COLPENSIONES	18	$ 752.746	$ 120.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 120.500
37	25-14 COLPENSIONES	9	$ 339.000	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 54.300
38	25-14 COLPENSIONES	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700
39	25-14 COLPENSIONES	2	$ 580.000	$ 92.800	$ 2.900	$ 2.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.600
40	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 7.300	$ 7.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.600
41	25-14 COLPENSIONES	23	$ 7.314.241	$ 1.170.300	$ 36.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.243.500
42	25-14 COLPENSIONES	21	$ 941.079	$ 150.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 150.600
43	25-14 COLPENSIONES	9	$ 436.993	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 70.000
44			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
45	230201-PROTECCION	30	$ 1.973.000	$ 315.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.700
46	230201-PROTECCION	21	$ 866.199	$ 138.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.600
47	230201-PROTECCION	9	$ 351.345	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.300
48	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000
49	230301-PORVENIR	15	$ 497.035	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 79.600
50	230301-PORVENIR	5	$ 191.167	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
30	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 326.078	$ 13.100	$ 0	$ 13.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 326.078		$ 0
31	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 863.149	$ 34.600	$ 0	$ 34.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 863.149	1	$ 60.100
32	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 822.162	$ 32.900	$ 0	$ 32.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 822.162	1	$ 57.300
33	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 370.099	$ 14.900	$ 0	$ 14.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 370.099		$ 0
34	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 913.505	$ 36.600	$ 0	$ 36.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 913.505	1	$ 63.500
35	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 430.707	$ 17.300	$ 0	$ 17.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 430.707		$ 0
36	EPS002-SALUD TOTAL	18	$ 752.746	$ 30.200	$ 0	$ 30.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 752.746	1	$ 52.400
37	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 339.000	$ 13.600	$ 0	$ 13.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 339.000		$ 0
38	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 0
39	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 580.000		$ 0
40	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 1.450.000		$ 0
41	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 7.314.241	$ 292.600	$ 0	$ 292.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 7.314.241	1	$ 509.100
42	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 941.079	$ 37.700	$ 0	$ 37.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 941.079	1	$ 65.500
43	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 436.993	$ 17.500	$ 0	$ 17.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 436.993		$ 0
44	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.050.070	$ 82.100	$ 0	$ 82.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.050.070	1	$ 142.700
45	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.973.000	$ 79.000	$ 0	$ 79.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.973.000	1	$ 137.400
46	EPS017-FAMISANAR	21	$ 866.199	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 866.199	1	$ 60.300
47	EPS017-FAMISANAR	9	$ 351.345	$ 14.100	$ 0	$ 14.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 351.345		$ 0
48	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000	1	$ 278.400
49	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 497.035	$ 19.900	$ 0	$ 19.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 497.035		$ 0
50	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 191.167	$ 7.700	$ 0	$ 7.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 191.167		$ 0

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	9	$ 364.702	CCF34-COFREM META	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	21	$ 850.972	CCF34-COFREM META	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	21	$ 838.673	CCF34-COFREM META	$ 33.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	9	$ 359.174	CCF34-COFREM META	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	21	$ 944.912	CCF34-COFREM META	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	9	$ 404.963	CCF34-COFREM META	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	18	$ 850.987	CCF34-COFREM META	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	9	$ 479.625	CCF34-COFREM META	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	5	$ 166.667	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	2	$ 630.873	CCF34-COFREM META	$ 25.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	5	$ 1.577.160	CCF34-COFREM META	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	23	$ 7.255.023	CCF34-COFREM META	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	21	$ 955.742	CCF34-COFREM META	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	9	$ 409.934	CCF34-COFREM META	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	30	$ 2.050.070	CCF34-COFREM META	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	30	$ 1.975.000	CCF34-COFREM META	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	21	$ 866.211	CCF34-COFREM META	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	9	$ 370.806	CCF34-COFREM META	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	30	$ 4.000.000	CCF34-COFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	15	$ 497.658	CCF34-COFREM META	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	5	$ 191.464	CCF34-COFREM META	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELEFONO:	871 5100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO LMITE SAI:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulatorias y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		78255771 40	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		131 1260230

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
51	CC 28156942	MOLINA BARRIOS SILVIA MERCEDES	DEPEND		$ 1,147,600	FIJO		SI
52	CC 86261180	QUINTANA GONZALEZ YUHANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,400,000	FIJO		SI
53	CC 40033046	YAYA CARDONA HAILY BRIGITTE	DEPEND		$ 3,200,000	FIJO		SI
54	CC 40334492	ORTIZ GOMEZ MYRIAM	DEPEND		$ 1,250,000	FIJO		SI
55	CC 41267333	MUÑOZ URIBE BEATRIZ	DEPEND	PENSIONADO ACT	$ 1,820,000	VARIABLE		SI
56	CC 40436729	BADILLO MEDINA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3,300,000	FIJO		SI
57	CC 40436729	BADILLO MEDINA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3,700,000	FIJO		SI
58	CC 40436729	BADILLO MEDINA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3,300,000	FIJO		SI
59	CC 41.721.217	RAMOS LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI
60	CC 53908141	CASTILLO EMILIANO MARLEN	DEPEND		$ 1,225,000	FIJO		SI
61	CC 52908141	CASTILLO EMILIANO MARLEN	DEPEND		$ 1,225,000	FIJO		SI
62	CC 52908141	CASTILLO EMILIANO MARLEN	DEPEND		$ 1,225,000	FIJO		SI
63	CC 75034823	[illegible]	DEPEND		$ 7,000,000	FIJO		SI
64	CC 79577715	[illegible]	DEPEND		$ 5,000,000	FIJO		SI
65	CC 74843491	PINZON [illegible]	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI
66	CC 80042498	PINZON [illegible]	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI
67	CC 80041016	[illegible]	DEPEND		$ 2,435,500	FIJO		SI
68	CC 80041016	[illegible]	DEPEND		$ 2,435,500	FIJO		SI
69	CC 86054672	ORTIZ SANCHEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI
70	CC 86054672	ORTIZ SANCHEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI

NOVEDADES

Nº	IRP	VAC	AUS	LMA	LRE	CON	SLN	VST	SUS	INCAPACIDAD GENERAL	LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD	VACACIONES	LICENCIA REMUNERADA	LICENCIA NO REMUNERADA	HUELGA LEGAL	AVP	VCT	IGE	RET
51								X											
52																			
53																			
54																			
55																			
56												15-16							
57												16-17							
58																			
59								X											
60												16-16							
61												03-15							
62																			
63																			
64																			
65								X	X										
66												03-11							
67																			
68												03-11							
69												03-12							
70								X											

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN
51	890201-PORVENIR	16	$ 458,801	$ 73,500
52	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1,400,000	$ 224,300
53	25-14-COLPENSIONES	30	$ 3,200,000	$ 512,900
54	230301-PORVENIR	30	$ 1,250,000	$ 200,000
55			$ 0	$ 0
56	25-14-COLPENSIONES	5	$ 550,000	$ 88,000
57	25-14-COLPENSIONES	7	$ 220,000	$ 35,200
58	25-14-COLPENSIONES	23	$ 2,530,000	$ 404,800
59	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1,000,000	$ 160,000
60	251001-COLPENSIONES	1	$ 41,034	$ 6,700
61	251001-COLPENSIONES	15	$ 543,835	$ 87,100
62	231001-COLPENSIONES	16	$ 669,334	$ 107,100
63	230301-PORVENIR	30	$ 7,000,000	$ 1,120,000
64	25-14-COLPENSIONES	30	$ 5,000,000	$ 800,000
65	25-14-COLPENSIONES	21	$ 847,843	$ 135,700
66	25-14-COLPENSIONES	9	$ 300,070	$ 48,100
67	25-14-COLPENSIONES	21	$ 1,690,500	$ 270,500
68	25-14-COLPENSIONES	9	$ 726,500	$ 116,000
69	230201-PROTECCION	10	$ 600,585	$ 96,100
70	230201-PROTECCION	28	$ 1,120,291	$ 179,300

PENSIÓN

Nº	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
51	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 73,500
52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,300
53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512,900
54	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200,000
55	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
56	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 88,000
57	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 35,200
58	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404,800
59	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000
60	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,700
61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 87,100
62	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107,100
63	$ 35,000	$ 35,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,120,000
64	$ 25,000	$ 25,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 800,000
65	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135,700
66	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48,100
67	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270,500
68	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 116,000
69	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96,100
70	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179,300

SALUD

Nº	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
51	EPS002-SALUD TOTAL	$ 458,801	$ 18,400	$ 0	$ 18,400
52	EPS002-SALUD TOTAL	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 0	$ 56,000
53	EPS037-NUEVA EPS	$ 3,200,000	$ 128,000	$ 0	$ 128,000
54	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1,250,000	$ 50,000	$ 0	$ 50,000
55	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1,820,000	$ 64,800	$ 0	$ 64,800
56	EPS005-SANITAS S.A.	$ 550,000	$ 22,000	$ 0	$ 22,000
57	EPS005-SANITAS S.A.	$ 220,000	$ 8,800	$ 0	$ 8,800
58	EPS005-SANITAS S.A.	$ 2,530,000	$ 101,200	$ 0	$ 101,200
59	EPS044-MEDIMAS	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000
60	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS S DE	$ 41,834	$ 1,700	$ 0	$ 1,700
61	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS S DE	$ 543,835	$ 21,800	$ 0	$ 21,800
62	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS S DE	$ 669,334	$ 26,800	$ 0	$ 26,800
63	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS S DE	$ 7,000,000	$ 280,000	$ 0	$ 280,000
64	EPS005-SANITAS S.A.	$ 5,000,000	$ 200,000	$ 0	$ 200,000
65	EPS005-SANITAS S.A.	$ 847,843	$ 34,000	$ 0	$ 34,000
66	EPS005-SANITAS S.A.	$ 300,070	$ 12,100	$ 0	$ 12,100
67	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1,690,500	$ 67,700	$ 0	$ 67,700
68	EPS005-SANITAS S.A.	$ 724,500	$ 29,000	$ 0	$ 29,000
69	EPS005-SANITAS S.A.	$ 600,585	$ 24,100	$ 0	$ 24,100
70	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1,120,291	$ 44,900	$ 0	$ 44,900

ARP

Nº	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
51	16	$ 458,801	1	$ 2,400
52	30	$ 1,400,000	1	$ 7,400
53	30	$ 3,200,000	1	$ 222,800
54	30	$ 1,250,000	1	$ 6,800
55	30	$ 1,820,000	1	$ 8,500
56	5	$ 550,000	1	$ 2,900
57	7	$ 220,000	1	$ 0
58	23	$ 2,530,000	1	$ 13,300
59	30	$ 1,000,000	1	$ 69,600
60	1	$ 41,834	1	$ 0
61	15	$ 543,835	1	$ 0
62	16	$ 669,334	1	$ 3,500
63	30	7,000,000	1	$ 487,200
64	30	$ 5,000,000	1	$ 348,000
65	21	$ 847,843	1	$ 58,900
66	9	$ 300,070	1	$ 0
67	21	$ 1,690,500	1	$ 117,700
68	9	$ 724,500	1	$ 0
69	10	$ 600,585	1	$ 0
70	28	$ 1,120,291	1	$ 78,000

PARAFISCALES

Nº	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
51	$ 458,801	CCF34-COMFREM META	$ 18,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	$ 1,400,000	CCF34-COMFREM META	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	$ 3,200,000	CCF34-COMFREM META	$ 128,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	$ 1,250,000	CCF34-COMFREM META	$ 50,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	$ 1,820,000	CCF34-COMFREM META	$ 64,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	$ 550,000	CCF34-COMFREM META	$ 22,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	$ 220,000	CCF34-COMFREM META	$ 8,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	$ 2,530,000	CCF34-COMFREM META	$ 101,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	$ 1,000,000	CCF34-COMFREM META	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	$ 41,834	CCF34-COMFREM META	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	$ 543,835	CCF34-COMFREM META	$ 25,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	$ 669,334	CCF34-COMFREM META	$ 30,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	7,000,000	CCF34-COMFREM META	$ 280,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	$ 5,000,000	CCF34-COMFREM META	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	$ 847,843	CCF34-COMFREM META	$ 33,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	$ 300,070	CCF34-COMFREM META	$ 12,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	$ 1,690,500	CCF34-COMFREM META	$ 70,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	$ 724,500	CCF34-COMFREM META	$ 30,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	$ 600,585	CCF34-COMFREM META	$ 22,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	$ 1,120,291	CCF34-COMFREM META	$ 45,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900079452
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 1102		6719120
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades seguridadmas y fortificadoras de la ac
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7625577140	TIPO DE PLANILLA:		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1311260230

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP									CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IRC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
71	CC 86057238	MARTINEZ TARACHE EDUARDO	DEPEND		$ 7.150.000	FIJO			SI												03-30				25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.908.867	$ 305.100	$ 9.600	$ 9.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.300	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1.908.867	$ 79.900	$ 0	$ 79.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 1.908.867		$ 0	8	$ 2.862.867	CCF34-COMFREM META	$ 100.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
72	CC 86057238	MARTINEZ TARACHE EDUARDO	DEPEND		$ 7.150.000	FIJO			SI								X								25-14 COLPENSIONES	22	$ 5.243.334	$ 839.300	$ 26.300	$ 26.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 891.600	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 5.243.334	$ 209.800	$ 0	$ 209.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 5.243.334	1	$ 393.000	22	$ 9.862.934	CCF34-COMFREM META	$ 276.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 74072927	DIAZ TORRES JOHANY ARNALDO	DEPEND		$ 1.251.000	FIJO			SI												16-16				230201 - PROTECCION	1	$ 86.071	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.900	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 55.071	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 55.071		$ 0	1	$ 72.157	CCF34-COMFREM META	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 74072927	DIAZ TORRES JOHANY ARNALDO	DEPEND		$ 1.251.000	FIJO			SI												03-15				230201 - PROTECCION	12	$ 715.912	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 114.600	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 715.912	$ 28.700	$ 0	$ 28.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 715.912		$ 0	12	$ 936.561	CCF34-COMFREM META	$ 37.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 74072927	DIAZ TORRES JOHANY ARNALDO	DEPEND		$ 1.251.000	FIJO			SI								X								230201 - PROTECCION	16	$ 1.191.503	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.700	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 1.191.503	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 1.191.503	1	$ 83.000	16	$ 1.185.182	CCF34-COMFREM META	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
76	CC 80073084	AGUJA MONTES CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI								X								230201 - PROTECCION	20	$ 1.589.714	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.400	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.589.714	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 1.589.714	1	$ 110.700	20	$ 1.589.714	CCF34-COMFREM META	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
77	CC 80073084	AGUJA MONTES CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.744.800	FIJO			SI								X								25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.528.313	$ 244.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.600	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.528.313	$ 61.200	$ 0	$ 61.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 1.528.313	1	$ 106.400	20	$ 1.528.313	CCF34-COMFREM META	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
78	CC 86071670	AGUDELO PULIDO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.251.000	FIJO			SI								X								230201 - PROTECCION	21	$ 1.022.431	$ 163.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.022.431	$ 40.900	$ 0	$ 40.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.022.431	1	$ 71.200	21	$ 1.281.921	CCF34-COMFREM META	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
79	CC 86075570	AVENDAÑO PINZON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.287.000	FIJO			SI												03-11				230201 - PROTECCION	9	$ 427.505	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.500	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 427.505	$ 17.200	$ 0	$ 17.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 427.505		$ 0	9	$ 540.823	CCF34-COMFREM META	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
80	CC 79775581	ZAPATA SAENZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							X	X								230201 - PROTECCION	21	$ 855.638	$ 136.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.900	EPS008-COMPENSAR	21	$ 855.638	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 855.638	1	$ 59.800	21	$ 826.738	CCF34-COMFREM META	$ 33.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
81	CC 79775581	ZAPATA SAENZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												03-11				230201 - PROTECCION	9	$ 354.894	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.800	EPS008-COMPENSAR	9	$ 354.894	$ 14.200	$ 0	$ 14.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 354.894		$ 0	9	$ 354.894	CCF34-COMFREM META	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
82	CC 79986746	HENAO TONO JORMAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								X								230201 - PROTECCION	12	$ 800.001	$ 128.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.100	EPS017-FAMISANAR	12	$ 800.001	$ 32.100	$ 0	$ 32.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 800.001	1	$ 55.700	12	$ 825.467	CCF34-COMFREM META	$ 33.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
83	CC 80088248	HENAO TONO JORMAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI												16-05				230201 - PROTECCION	5	$ 333.333	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.400	EPS017-FAMISANAR	5	$ 333.333	$ 13.400	$ 0	$ 13.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 333.333		$ 0	5	$ 343.964	CCF34-COMFREM META	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
84	CC 80088248	HENAO TONO JORMAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI												03-13				230201 - PROTECCION	13	$ 866.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.700	EPS017-FAMISANAR	13	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	$ 866.667		$ 0	13	$ 894.258	CCF34-COMFREM META	$ 35.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
85	CC 80089150	HERNANDEZ CURVELO EDGAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	12						X	X								230201 - PORVENIR	19	$ 970.400	$ 155.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 155.500	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 973.438	$ 39.000	$ 0	$ 39.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 973.438	1	$ 67.800	19	$ 973.438	CCF34-COMFREM META	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
86	CC 88294228	CARDAMA BERMUY JHON ELDER	DEPEND		$ 1.321.000	FIJO			SI												03-11				230201 - PROTECCION	9	$ 410.793	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.800	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 410.793	$ 16.500	$ 0	$ 16.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 410.793		$ 0	9	$ 358.077	CCF34-COMFREM META	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
87	CC 88294228	CARDAMA GIRALDO JHON ELDER	DEPEND		$ 1.321.000	FIJO			SI								X								230201 - PROTECCION	21	$ 858.279	$ 137.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 137.400	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 858.279	$ 34.400	$ 0	$ 34.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 858.279	1	$ 59.800	21	$ 835.513	CCF34-COMFREM META	$ 33.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
88	CC 88031563	GOMEZ AGUIRRE FERNANDO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI		16														230201 - PORVENIR	15	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 800.000	1	$ 55.700	15	$ 800.000	CCF34-COMFREM META	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 31.109.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: [illegible]	NÚMERO PLANILLA:	2329134893
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO EGG	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2022	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO: META	DÍAS DE MORA: 0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2022
DIRECCIÓN: CHA 32 N 39 - 70 OF 1002 ED ROMARCO	TELÉFONO: 6715100	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 50395874
TIPO APORTANTE: 01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA: PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 3.189.600	$ 0	$ 0	$ 61.400	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 3.312.400	$ 0	$ 3.312.400
230201	230201- PROTECCION	5	$ 783.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.800	$ 0	$ 783.800
230301	230301-PORVENIR	23	$ 4.013.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.013.200	$ 0	$ 4.013.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 296.000
SUBTOTALES:										$ 8.405.400	$ 0	$ 8.405.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 101.600
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 82.600
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 91.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.300	$ 0	$ 0	$ 127.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 90.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 974.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 974.600	$ 0	$ 0	$ 974.600
EPS044	EPS044-MEDIMAS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 87.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.500	$ 0	$ 0	$ 188.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:													$ 2.071.600	$ 0	$ 0	$ 2.071.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	37		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.534.500	$ 3.534.500	$ 0	$ 0	$ 3.534.500
SUBTOTALES:									$ 3.534.500	$ 0	$ 0	$ 3.534.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	37	$ 2.071.600	$ 0	$ 2.071.600
SUBTOTALES:			$ 2.071.600	$ 0	$ 2.071.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL
1	CC 1010131434	GOMEZ OTERO BAYRON CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	17								17-30								
2	CC 1025282018	NAGUA MURILLO JONATHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
3	CC 1032431855	LASSO CONDE LAURA KATHERINE	DEPEND		$ 250.000	FIJO		SI													01-30				
4	CC 1112459856	CAMARGO MEJARANO ROYNER	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	17								17-30								
5	CC 1112402212	BECERRA CAMARGO KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	26																
6	CC 1121831129	ROJAS AGUILAR FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI									01-30								
7	CC 1121859782	SALAZAR CONTRERAS SHIRLEY ROXANA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO		SI								01-30									
8	CC 1121888077	JIMENEZ MUÑOZ JHON FREDY	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	14	$ 484.896	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.600
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.041.668	$ 166.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.700
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
4	230201-PROTECCION	14	$ 484.896	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.600
5	230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.525.000	$ 244.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 484.896	$ 19.400	$ 0	$ 19.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 484.896		$ 33.800
2	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.041.668	$ 41.700	$ 0	$ 41.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.041.668		$ 72.500
3	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 0
4	EPS044-MEDIMAS	14	$ 484.896	$ 19.400	$ 0	$ 19.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 484.896		$ 33.800
5	ESSC24-COOSALUD ESS	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 11.700
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400
7	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400
8	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.525.000	$ 61.000	$ 0	$ 61.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.525.000		$ 106.200

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14	$ 484.896	CCF34-COFREM META	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.041.668	CCF34-COFREM META	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	14	$ 484.896	CCF34-COFREM META	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	5	$ 166.667	CCF34-COFREM META	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.525.000	CCF34-COFREM META	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901218805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ECC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 ED ROMARCO	TELÉFONO:	6715106
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2329134893	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	50995674

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1121871171	GARCIA VARGAS LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	26																
10	CC 1121878429	BERMUDEZ VELASQUEZ DIEGO FERNEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	26																
11	CC 1121877402	CESPEDES RACHERO NATALIA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI								01-30									
12	CC 1121892154	CHAMORRO GALLERA NICOLAS	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI								01-30									
13	CC 1121888306	TERREÑO PARRA ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	17								17-30								
14	CC 1121889536	SANCHEZ MARULANDA DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	18																
15	CC 1121902920	MENDEZ GONZALEZ DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	17								17-30								
16	CC 1121934856	HINCAPIE ARDILA SARA MARIA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI								01-30									
17	CC 1121944733	ALZATE ROMERO JOSE LUIS	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI								01-30									
18	CC 1121950251	VIVAPA ZAMORA HUNER ALEX	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								
19	CC 1122125624	SOTO ALVARADO JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO			SI								01-30									
20	CC 1122133693	MOLINA BELTRAN ELKIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.272.000	FIJO			SI								01-30	01-30								
21	CC 1122142855	PEREZ REY JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI								01-30									
22	CC 1122159131	MENDEZ MENDEZ ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	19								19-30								
23	CC 1122527624	PERILLA CEPEDA FRANKIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	11								11-30								
24	CC 11320614	MARTINEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	11								11-30								
25	CC 17380759	NIETO TRANA JOSE WILSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	11								11-30								
26	CC 17411738	HORTUA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								01-30									
27	CC 35264052	OLIVEROS MURA FLOR NAYIBEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
28	CC 40186022	CRUZ ARCINIEGAS ALBA YIBETH	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								01-30									
29	CC 40[illegible]77	MENDOZA MENDEZ LENY MARCELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700
10	230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700
11	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.280.000	$ 684.800	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 727.600
13	230301-PORVENIR	14	$ 490.104	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 78.500
14	230201-PROTECCION	13	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400
15	230201-PROTECCION	14	$ 490.134	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 78.500
16	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700
17	230201-PROTECCION	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700
18	230301-PORVENIR	30	$ 1.044.271	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100
19	231001-COLFONDOS	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000
20	230301-PORVENIR	30	$ 1.549.479	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000
21	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700
22	230301-PORVENIR	12	$ 418.229	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 67.000
23	230301-PORVENIR	20	$ 818.750	$ 131.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.000
24	25-14 COLPENSIONES	20	$ 818.229	$ 131.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.000
25	25-14 COLPENSIONES	20	$ 878.125	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
26	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
27	230301-PORVENIR	30	$ 1.052.083	$ 168.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.400
28	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
29	230301-PORVENIR	30	$ 1.018.229	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADIC	TOTAL APORTE
9	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700
10	EPS044-MEDIMAS	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700
11	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
12	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.280.000	$ 171.200	$ 0	$ 171.200
13	EPS017-FAMISANAR	14	$ 490.104	$ 19.700	$ 0	$ 19.700
14	EPS005-SANITAS S.A.	13	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400
15	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 490.134	$ 19.700	$ 0	$ 19.700
16	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
17	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
18	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.044.271	$ 41.800	$ 0	$ 41.800
19	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000
20	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.549.479	$ 62.000	$ 0	$ 62.000
21	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
22	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	12	$ 418.229	$ 16.800	$ 0	$ 16.800
23	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	20	$ 818.750	$ 32.800	$ 0	$ 32.800
24	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 818.229	$ 32.800	$ 0	$ 32.800
25	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 878.125	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
26	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600
27	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.052.083	$ 42.100	$ 0	$ 42.100
28	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600
29	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.018.229	$ 40.800	$ 0	$ 40.800

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 11.700	5	$ 166.667	CCF34-COFREM META	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 11.700	5	$ 166.667	CCF34-COFREM META	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.280.000		$ 297.900	30	$ 4.280.000	CCF34-COFREM META	$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 490.104		$ 34.200	14	$ 490.134	CCF34-COFREM META	$ 19.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	$ 1.083.334		$ 75.500	13	$ 1.083.334	CCF34-COFREM META	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 490.134		$ 34.200	14	$ 490.134	CCF34-COFREM META	$ 19.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.044.271		$ 72.700	30	$ 1.044.271	CCF34-COFREM META	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.850.000		$ 128.800	30	$ 1.850.000	CCF34-COFREM META	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.549.479		$ 107.900	30	$ 1.549.479	CCF34-COFREM META	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 418.229		$ 29.200	12	$ 418.229	CCF34-COFREM META	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 818.750		$ 57.000	20	$ 818.750	CCF34-COFREM META	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 818.229		$ 57.000	20	$ 818.229	CCF34-COFREM META	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 878.125		$ 61.200	20	$ 878.125	CCF34-COFREM META	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000	30	$ 2.140.000	CCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.052.083		$ 73.300	30	$ 1.052.083	CCF34-COFREM META	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000	30	$ 2.140.000	CCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.018.229		$ 70.900	30	$ 1.018.229	CCF34-COFREM META	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901288805
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO ECC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1202 ED ROMANICO	TELÉFONO:	5715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2329134693	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2022
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			50393574

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
30	CC 4 [illegible]	BAZO [illegible] EMPOTE OMAR ERNESTO	DEPEND		$ 1.220.000	FIJO		SI								01-3001-30								25-14 - DOLIENTES	30	$ 1.491.145	$ 238.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.600	EPS010 - SALUD TOTAL	30	$ 1.491.145	$ 89.700	$ 0	$ 89.700	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.491.145		$ 103.800	$30	$ 1.491.145	SCCF34 - CCFREM META	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 75093068	CORTES GARCIA HECTOR JULIAN	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO		SI																25-14 - DOLIENTES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SAS	30	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 8.000.000		$ 488.800	$30	$ 8.000.000	SCCF34 - CCFREM META	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC [illegible]	DONILLA ALDANA LAINO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								230901 - PORVENIR	30	$ 1.054.687	$ 168.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.054.687	$ 42.200	$ 0	$ 42.200	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.054.687		$ 73.500	$30	$ 1.054.687	SCCF34 - CCFREM META	$ 42.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 79322206	AGUIRRE PEÑA OMAR SANTIAGO	DEPEND		$ 1.665.600	FIJO		SI	11							13-30								230901 - PORVENIR	29	$ 708.333	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.400	EPS017 - FAMISANAR	29	$ 708.333	$ 28.400	$ 0	$ 28.400	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 708.333		$ 49.300	$29	$ 708.333	SCCF34 - CCFREM META	$ 28.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 86064170	MORALES HERNANDEZ EDGAR	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI								01-3001-30								230901 - PORVENIR	30	$ 1.541.469	$ 240.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.700	EPS044 - MEDIMAS	30	$ 1.541.469	$ 61.700	$ 0	$ 61.700	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.541.469		$ 107.300	$30	$ 1.541.469	SCCF34 - CCFREM META	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 86085425	VILLADA PRADO JAIRO DE JESUS	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI	27															230901 - PORVENIR	4	$ 186.667	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 29.900	EPS005 - SANITAS S.A.	4	$ 186.667	$ 7.500	$ 0	$ 7.500	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 186.667		$ 13.000	4	$ 186.667	SCCF34 - CCFREM META	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 86088939	MATIAS BOBADILLA FRANCO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								230901 - PORVENIR	30	$ 1.065.134	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.500	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 1.065.134	$ 42.700	$ 0	$ 42.700	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.065.134		$ 74.200	$30	$ 1.065.134	SCCF34 - CCFREM META	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 87611355	GUTIERREZ CEBALLOS JAIRO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI	27															25-14 - DOLIENTES	4	$ 186.667	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 29.900	EPS005 - SANITAS S.A.	4	$ 186.667	$ 7.500	$ 0	$ 7.500	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 186.667		$ 13.000	4	$ 186.667	SCCF34 - CCFREM META	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 16.083.100

Planilla Pagada

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054068825		ALVAREZ FONSECA JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 43 # 6 06	TUNJA-BOYACA	7401387	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	131134748	94005586 12	1	2022/02/07	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$482,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	900,224,808	3	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$94,700	$0	$0	$94,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$94,700	$0	$0	$94,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$482,300	$0	$0	$482,300

2022/02/03 11:11:11

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049669835		ALVAREZ FONSECA JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 43 5 A 06	TUNJA-BOYACA	7404387	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1311247961	94055361 2	I	2022/02/07	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$482,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	TA	TDA	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049669835	ALVAREZ JOSE	X																		230301	30	$1,360,000	$215,600	230301	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,360,000	$102,700	0	$0	$0	No	$482,300
Total Afiliados(1)																								$1,360,000	$215,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000	$102,700		$0	$0		$482,300

2022/02/03 11:14:11

LISTADO PERSONAL FEBRERO 2022

ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO PLANILLA:	7828189028
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079482	TIPO DE PLANILLA:	E EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ECOBRAS S.A.	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES	febrero AÑO 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES	marzo AÑO 2022
DEPARTAMENTO:	META	DÍAS DE MORA:	0
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/02
TELÉFONO:	6715100	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1349699164
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR		
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 7.997.600	$ 0	$ 0	$ 115.800	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 8.229.200	$ 0	$ 8.229.200
230201	230201-PROTECCION	12	$ 4.209.100	$ 0	$ 0	$ 43.700	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 4.296.500	$ 0	$ 4.296.500
230301	230301-PORVENIR	26	$ 8.588.500	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 8.658.500	$ 0	$ 8.658.500
231001	231001 COLFONDOS	4	$ 823.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.800	$ 0	$ 823.800
SUBTOTALES:										$ 22.008.000	$ 0	$ 22.008.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 575.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.000	$ 0	$ 0	$ 575.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 830.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.800	$ 0	$ 0	$ 830.800
EPS044	EPS044-MEDIMAS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 41.500
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 41.100
EPS041	EPS41 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 81.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.449.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.449.700	$ 0	$ 0	$ 2.449.700
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR E.S.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 602.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.800	$ 0	$ 0	$ 602.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 49.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 338.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.900	$ 0	$ 0	$ 338.900
CCFC55	CCFC55 CAJACOPI ATLANTICO	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 119.500
SUBTOTALES:													$ 5.183.200	$ 0	$ 0	$ 5.183.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IHP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	54		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.086.200	$ 5.086.200	$ 0	$ 0	$ 5.086.200
SUBTOTALES:									$ 5.086.200	$ 0	$ 0	$ 5.086.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	54	$ 5.153.100	$ 0	$ 5.153.100
SUBTOTALES:			$ 5.153.100	$ 0	$ 5.153.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	GARCIA BAYONA SERGIO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	18							X	X								
2	CC 1006891250	MURILLO TORRES JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	07							X	X								
3	CC 1006715062	CARDENAS GAITAN JUAN GABRIEL	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	11							X	X								
4	CC 1006604606	OSORIO MAYORGA JHON STIVEN	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	15							X	X								
5	CC 1006996484	FLOREZ LANDAZURI YESICA ANDREA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI																	
6	CC 1007596051	DIAZ VACUBA RAWER	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	11							X	X								
7	CC [illegible]	ROJAS SANCHEZ IGNACIO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI									X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	15	$ 668.022	$ 106.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.900	EPS037 NUEVA EPS	15	$ 668.022	$ 26.800	$ 0	$ 26.800
2	230301-PORVENIR	24	$ 1.026.521	$ 164.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	24	$ 1.026.521	$ 41.100	$ 0	$ 41.100
3	230301-PORVENIR	22	$ 878.855	$ 140.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.700	EPS037 NUEVA EPS	22	$ 878.855	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
4	230301-PORVENIR	16	$ 650.834	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.200	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	16	$ 650.834	$ 26.100	$ 0	$ 26.100
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	ESSC18 - EMSSANAR E.S.A.S.	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000
6	230301-PORVENIR	22	$ 878.855	$ 140.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.700	EPS002 SALUD TOTAL	22	$ 878.855	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.224.480	$ 196.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.000	EPS002 SALUD TOTAL	30	$ 1.224.480	$ 49.000	$ 0	$ 49.000

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 668.022	1	$ 46.800	15	$ 668.022	CCF34-COFREM META	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.026.521	1	$ 71.400	24	$ 1.026.521	CCF34-COFREM META	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 878.855	1	$ 61.200	22	$ 878.855	CCF34-COFREM META	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 650.834	1	$ 45.300	16	$ 650.834	CCF34-COFREM META	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.000	1	$ 5.800	30	$ 1.100.000	CCF34-COFREM META	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 878.855	1	$ 61.200	22	$ 878.855	CCF34-COFREM META	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.224.480	1	$ 85.300	30	$ 1.224.480	CCF34-COFREM META	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800078482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOPETROL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELEFONO	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			76228189028	TIPO DE PLANILLA:			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			3349999184

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
8	CC 1017174899	QUINTERO VILLARAGA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.124.000	FIJO			SI									X							25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.488.096	$ 238.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.100	EPS008-SALUD TOTAL	30	$ 1.488.096	$ 59.600	$ 0	$ 59.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.488.096	1	$ 103.900	30	$ 1.488.096	$CCF34-1.488.096	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1026015802	MENDEZ ARIAS ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI								X	X							25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000	1	$ 174.000	30	$ 2.500.000	$CCF34-2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1035512727	DIAZ ROMAS DIEGO ARTURO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 2.318.906	$ 371.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.100	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.318.906	$ 92.800	$ 0	$ 92.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.318.906	1	$ 161.400	30	$ 2.318.906	$CCF34-2.318.906	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1032579369	OTALORA GONZALEZ ANDERSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.298.229	$ 207.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 207.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.298.229	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.298.229	1	$ 90.400	30	$ 1.298.229	$CCF34-1.298.229	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1014994792	RINCON ORTIZ DANIEL FERNANDO	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.400.000	1	$ 167.100	30	$ 2.400.000	$CCF34-2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1057088538	RIVAS MARQUEZ JEFER CAMILO	DEPEND		$ 1.124.000	FIJO			SI									X							231001-COLFONDOS	30	$ 1.467.806	$ 234.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.467.806	$ 58.800	$ 0	$ 58.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.467.806	1	$ 102.200	30	$ 1.467.806	$CCF34-1.467.806	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1116847671	VILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 2.602.129	$ 416.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.602.129	$ 104.100	$ 0	$ 104.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.602.129	1	$ 181.200	30	$ 2.602.129	$CCF34-2.602.129	$ 104.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1121551772	BOGANEGRA CONTRERAS CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	22	$ 1.144.792	$ 183.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 183.200	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1.144.792	$ 45.800	$ 0	$ 45.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 1.144.792	1	$ 79.700	22	$ 1.144.792	$CCF34-1.144.792	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1121551772	BOGANEGRA CONTRERAS CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																06-19	230301-PORVENIR	8	$ 373.334	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.800	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 373.334	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 373.334		$ 0	8	$ 373.334	$CCF34-373.334	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1121893359	MUÑOZ SALINAS ELISSA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000	1	$ 111.400	30	$ 1.600.000	$CCF34-1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1121896039	MELEZ ROS MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 4.441.000	FIJO			SI									X							230201-PROTECCION	30	$ 4.732.000	$ 757.200	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 804.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.732.000	$ 189.300	$ 0	$ 189.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.732.000	1	$ 329.400	30	$ 4.732.000	$CCF34-4.732.000	$ 189.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1123911066	DIAZ LINARES JESUS IVAN	DEPEND		$ 1.124.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.458.824	$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.458.824	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.458.824	1	$ 101.600	30	$ 1.458.824	$CCF34-1.458.824	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1123914173	RUYO RAMIREZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.868.000	FIJO			SI									X							230201-PROTECCION	30	$ 1.808.000	$ 289.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 289.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.808.000	$ 72.400	$ 0	$ 72.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.808.000	1	$ 125.900	30	$ 1.808.000	$CCF34-1.808.000	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1123915726	JUEZ SANDOVAL ANGUMEDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI									X							231001-COLFONDOS	30	$ 1.329.739	$ 212.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.329.739	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.329.739	1	$ 92.600	30	$ 1.329.739	$CCF34-1.329.739	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1123935235	SALAZAR VALENZUELA SHILEY	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 900.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.000	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	27	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 36.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 900.000	1	$ 62.700	27	$ 900.000	$CCF34-1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1123935235	SALAZAR VALENZUELA SHILEY	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																06-19	230301-PORVENIR	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 100.000		$ 0	3	$ 100.000	$CCF34-100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1121939548	MORENO ORTEGA JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.311.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.775.525	$ 284.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 284.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.775.525	$ 71.100	$ 0	$ 71.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.775.525	1	$ 123.600	30	$ 1.775.525	$CCF34-1.775.525	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1122349581	CHISABA GAMBOA LETICIA ESTHER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.095.834	$ 175.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.095.834	$ 43.900	$ 0	$ 43.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.095.834	1	$ 76.300	30	$ 1.095.834	$CCF34-1.095.834	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1064979014	SUPERBIEZ PALENCIA WILDER ANJEY	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.245.521	$ 199.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 199.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.245.521	$ 49.900	$ 0	$ 49.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.245.521	1	$ 86.700	30	$ 1.245.521	$CCF34-1.245.521	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1124529890	PEREZ CRUZ YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI	11							X	X							231001-COLFONDOS	22	$ 878.956	$ 140.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.700	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 878.956	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 878.956	1	$ 61.200	22	$ 878.956	$CCF34-878.956	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1124653286	OJUAR PALACIOS JUAN ANDRES	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI	07							X	X							230301-PORVENIR	24	$ 1.025.525	$ 164.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.100	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.025.521	$ 41.100	$ 0	$ 41.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.025.521	1	$ 71.600	24	$ 1.025.521	$CCF34-1.025.521	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7828189028	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1049699154		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
29	CC 1124997026	GALVIZ BENAVIDES WILLIAM	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI		01							X								
30	CC 1127352916	QUIVAY ALVARADO NELSON ALONSO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	07							X	X								
31	CC 11385202	AMAYA EDILBERTO	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO		SI									X								
32	CC 1151119816	DAZA ZAMBRANO RALMIR	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	11							X	X								
33	CC 1152744628	MARQUEZ SANCHEZ DANIEL SANTIAGO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	22							X	X								
34	CC 1192918558	MURCIA BOBADILLA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI									X								
35	CC 92347891	OÑATE SUAREZ FABIAN STIVEN	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO		SI									X								
36	CC 17912889	RODRIGUEZ ORJUELA JAIME	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.311.000	FIJO		SI									X								
37	CC 17311287	CRUZ AVILA JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.230.000	FIJO		SI									X								
38	CC 17329108	[illegible] RAFAEL BERNARDO	DEPEND		$ 9.300.000	FIJO		SI									X								
39	CC 17346539	MATIZ PARRADO JOSE FLORIBERTO	DEPEND		$ 1.230.000	FIJO		SI									X								
40	CC 17346751	CONTRERAS CARRILLO JOSE BERNARDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.110.000	FIJO		SI									X								
41	CC 17388725	QUIROGA [illegible]	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO		SI									X								
42	CC 17596558	GONZALEZ MURILLO HENRY	DEPEND		$ 1.050.000	FIJO		SI									X								
43	CC 17631607	PUENTES RIAÑO FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO		SI																	
44	CC 18261996	QUIVAY SALCEDO LUIS ALFONSO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI	11							X	X								
45	CC 21850042	MEDINA [illegible] DORA MERCEDES	DEPEND		$ 1.345.000	FIJO		SI									X								
46	CC 35260100	BEJARANO GONZALEZ YOHANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.597.000	FIJO		SI									X								
47	CC 40332546	YARA CARDONA HAZLLY BRIGITTE	DEPEND		$ 3.392.000	FIJO		SI									X								
48	CC 40332546	YARA CARDONA HAZLLY BRIGITTE	DEPEND		$ 3.392.000	FIJO		SI												10-17					
49	CC 40334452	ORTIZ GOMEZ MYRIAM	DEPEND		$ 1.567.000	FIJO		SI									X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
29	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.900	EPS044-MEDIMAS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600
30	230301-PORVENIR	24	$ 1.008.333	$ 161.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.400	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	24	$ 1.008.333	$ 40.400	$ 0	$ 40.400
31	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.714.641	$ 274.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.714.641	$ 68.600	$ 0	$ 68.600
32	230301-PORVENIR	20	$ 881.667	$ 137.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 137.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 881.667	$ 34.500	$ 0	$ 34.500
33	230301-PORVENIR	9	$ 323.436	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.800	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	9	$ 323.436	$ 13.000	$ 0	$ 13.000
34	230301-PORVENIR	30	$ 1.164.063	$ 186.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.164.063	$ 46.600	$ 0	$ 46.600
35	230301-PORVENIR	30	$ 1.759.516	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.759.516	$ 70.400	$ 0	$ 70.400
36			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.676.156	$ 67.100	$ 0	$ 67.100
37	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.566.776	$ 250.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.566.776	$ 62.700	$ 0	$ 62.700
38	25-14-COLPENSIONES	30	$ 9.990.000	$ 1.598.400	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.698.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.990.000	$ 399.600	$ 0	$ 399.600
39	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.615.719	$ 258.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.615.719	$ 64.700	$ 0	$ 64.700
40			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.817.349	$ 104.700	$ 0	$ 104.700
41	230201-PROTECCION	30	$ 2.293.242	$ 367.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 367.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.293.242	$ 91.800	$ 0	$ 91.800
42	230201-PROTECCION	30	$ 1.231.250	$ 197.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.231.250	$ 49.300	$ 0	$ 49.300
43	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
44	230301-PORVENIR	20	$ 881.667	$ 137.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 137.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 881.667	$ 34.500	$ 0	$ 34.500
45	230301-PORVENIR	30	$ 1.345.000	$ 215.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 215.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.345.000	$ 53.800	$ 0	$ 53.800
46	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.614.000	$ 258.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.614.000	$ 64.600	$ 0	$ 64.600
47	25-14-COLPENSIONES	28	$ 3.357.867	$ 537.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 537.300	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 3.357.867	$ 134.400	$ 0	$ 134.400
48	25-14-COLPENSIONES	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700
49	230301-PORVENIR	30	$ 1.764.000	$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.764.000	$ 70.600	$ 0	$ 70.600

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
29	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 38.667	1	$ 2.600	1	$ 38.667	CCF34-COFREM META	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.008.333	1	$ 70.200	24	$ 1.008.333	CCF34-COFREM META	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.714.641	1	$ 119.400	30	$ 1.714.641	CCF34-COFREM META	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 881.667	1	$ 60.000	20	$ 881.667	CCF34-COFREM META	$ 34.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 323.436	1	$ 22.600	9	$ 323.436	CCF34-COFREM META	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.164.063	1	$ 81.100	30	$ 1.164.063	CCF34-COFREM META	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.759.516	1	$ 122.500	30	$ 1.759.516	CCF34-COFREM META	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.676.156	1	$ 116.700	30	$ 1.676.156	CCF34-COFREM META	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.566.776	1	$ 109.100	30	$ 1.566.776	CCF34-COFREM META	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 9.990.000	1	$ 695.400	30	$ 9.990.000	CCF34-COFREM META	$ 399.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.615.719	1	$ 112.500	30	$ 1.615.719	CCF34-COFREM META	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.817.349	1	$ 182.200	30	$ 2.817.349	CCF34-COFREM META	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.293.242	1	$ 159.700	30	$ 2.293.242	CCF34-COFREM META	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.231.250	1	$ 85.700	30	$ 1.231.250	CCF34-COFREM META	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000	1	$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF34-COFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 881.667	1	$ 60.000	20	$ 881.667	CCF34-COFREM META	$ 34.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.345.000	1	$ 7.100	30	$ 1.345.000	CCF34-COFREM META	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.614.000	1	$ 5.500	30	$ 1.614.000	CCF34-COFREM META	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 3.357.867	1	$ 230.500	28	$ 3.424.534	CCF34-COFREM META	$ 137.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 66.667		$ 0	2	$ 66.667	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.764.000	1	$ 9.300	30	$ 1.764.000	CCF34-COFREM META	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDUBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7828189028	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1040688154

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
50	CC 40307533	MURCIA ORTIZ BEATRIZ	DEPEND	PENSVG ACT	$ 1.744.000	VARIABLE		SI									X							
51	CC 40436721	BAQUERO MEDINA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3.900.000	FIJO		SI									X							
52	CC 4172017	DAZA LUIS HERNANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																
53	CC 17661141	CASTILLO CHILLAMAN MARLEN	DEPEND		$ 1.360.000	FIJO		SI									X							
54	CC 79084423	CUERVO BELTRAN CRISTIAN [illegible]	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI																
55	CC 79577715	[illegible]	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI																
56	CC 86049458	PARDO ULLOA CARLOS OSWALDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									X							
57	CC 86041018	MORENO [illegible]	DEPEND		$ 2.565.000	FIJO		SI									X							
58	CC 86054072	ORTIZ SANCHEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 1.471.000	FIJO		SI									X							
59	CC 86057200	MARTINEZ TAPASCO EDUARDO	DEPEND		$ 7.651.000	FIJO		SI									X							
60	CC 86070527	DIAZ TORRES JOHNNY ARNULFO	DEPEND		$ 1.360.000	FIJO		SI								X	X							
61	CC 86072094	AGUAS MONTES CARLOS ANTONIO	DEPEND		$ 1.360.000	FIJO		SI									X							
62	CC 86079106	VELEZ RIOS JULIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.340.000	FIJO		SI									X							
63	CC 86079279	AVENDAÑO PULIDO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.311.000	FIJO		SI									X							
64	CC 86079098	ZAPE SAENZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI									X							
65	CC 86086248	HENAO TORO JUAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO		SI									X							
66	CC 86089818	HERNANDEZ CLAUDIO EDGAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI									X							
67	CC 86274021	SANDOVAL GIRALDO JHON EDIER	DEPEND		$ 1.180.000	FIJO		SI									X							

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

N°	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR UPC ADIC.	TOTAL APORTE
50			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.866.000	$ 74.800	$ 0	$ 74.800
51	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.900.000	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 624.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
52	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
53	231001-COLFONDOS	30	$ 1.471.000	$ 235.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.471.000	$ 58.900	$ 0	$ 58.900
54	230301-PORVENIR	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000
55	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
56	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.093.333	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.093.333	$ 43.800	$ 0	$ 43.800
57	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.755.000	$ 440.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.755.000	$ 110.200	$ 0	$ 110.200
58	230201-PROTECCION	30	$ 1.941.836	$ 310.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.941.836	$ 77.700	$ 0	$ 77.700
59	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.152.000	$ 1.304.400	$ 40.800	$ 40.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.386.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 8.152.000	$ 326.100	$ 0	$ 326.100
60	230201-PROTECCION	30	$ 1.878.980	$ 300.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.878.980	$ 75.200	$ 0	$ 75.200
61	230201-PROTECCION	30	$ 1.824.863	$ 292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.824.863	$ 73.000	$ 0	$ 73.000
62	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.843.085	$ 294.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.843.085	$ 73.800	$ 0	$ 73.800
63	230201-PROTECCION	30	$ 1.631.998	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.631.998	$ 65.300	$ 0	$ 65.300
64	230201-PROTECCION	30	$ 1.223.438	$ 195.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.223.438	$ 49.000	$ 0	$ 49.000
65	230201-PROTECCION	30	$ 2.280.000	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 91.200
66	230301-PORVENIR	30	$ 1.605.938	$ 257.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.605.938	$ 64.300	$ 0	$ 64.300
67	230201-PROTECCION	30	$ 1.458.578	$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.458.578	$ 58.400	$ 0	$ 58.400

ARP / PARAFISCALES

N°	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
50	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.866.000	1	$ 9.800	30	1.866.000	CCF34-COFREM META	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.900.000	1	$ 20.400	30	3.900.000	CCF34-COFREM META	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.471.000	1	$ 7.700	30	1.471.000	CCF34-COFREM META	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.000.000	1	$ 487.200	30	7.000.000	CCF34-COFREM META	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.000.000	1	$ 348.000	30	5.000.000	CCF34-COFREM META	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.093.333	1	$ 76.100	30	1.093.333	CCF34-COFREM META	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.755.000	1	$ 191.800	30	2.755.000	CCF34-COFREM META	$ 110.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.941.836	1	$ 135.200	30	1.941.836	CCF34-COFREM META	$ 77.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 8.152.000	1	$ 567.400	30	8.152.000	CCF34-COFREM META	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.878.980	1	$ 130.800	30	1.878.980	CCF34-COFREM META	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.824.863	1	$ 127.100	30	1.824.863	CCF34-COFREM META	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.843.085	1	$ 128.300	30	1.843.085	CCF34-COFREM META	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.631.998	1	$ 113.600	30	1.631.998	CCF34-COFREM META	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.223.438	1	$ 85.200	30	1.223.438	CCF34-COFREM META	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.280.000	1	$ 158.700	30	2.280.000	CCF34-COFREM META	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.605.938	1	$ 111.800	30	1.605.938	CCF34-COFREM META	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.458.578	1	$ 101.600	30	1.458.578	CCF34-COFREM META	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 38.400.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ECC META
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 LO HOMARGO	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	(ÚNICO)		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
NÚMERO PLANILLA:		2329233497	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			61133662

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 3.684.700	$ 0	$ 0	$ 61.400	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 3.807.500	$ 0	$ 3.807.500
230201	230201 - PROTECCION	6	$ 1.497.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.497.700	$ 0	$ 1.497.700
230301	230301-PORVENIR	30	$ 5.972.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.972.800	$ 0	$ 5.972.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 484.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.400	$ 0	$ 484.400
SUBTOTALES:										$ 11.762.400	$ 0	$ 11.762.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
EPS044	EPS044-MEDIMAS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.400	$ 0	$ 0	$ 157.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 138.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.800	$ 0	$ 0	$ 275.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 316.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.200	$ 0	$ 0	$ 316.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300	$ 0	$ 0	$ 143.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.235.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.235.400	$ 0	$ 0	$ 1.235.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 90.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES:													$ 2.911.100	$ 0	$ 0	$ 2.911.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7 SEGUROS BOLIVAR S.A.	47		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.995.300	$ 4.995.300	$ 0	$ 0	$ 4.995.300
SUBTOTALES:									$ 4.995.300	$ 0	$ 0	$ 4.995.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	46	$ 2.871.100	$ 0	$ 2.871.100
SUBTOTALES:			$ 2.871.100	$ 0	$ 2.871.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SIN	COR	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006772537	GONZALEZ CUBIDES DIEGO OSWALDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
2	CC 1006794919	ENCISO MORALES PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	21																
3	CC 1006791560	PENILLA OCAMPO RONALD KEVIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
4	CC 1010131494	GOMEZ DIEGO MATEON CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
5	CC 1026263911	RAGUA MURILLO JOHATHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
6	CC 1053421165	LASSO CONDE LAURA KATHERINE	DEPEND		$ 950.000	FIJO			SI													01-30				
7	CC 1112468556	CARABALI BEJARANO ROYMER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
8	CC 1112469217	SALAZAR CARABALI KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.237.499	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.000
2	230301-PORVENIR	10	$ 333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.400
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.164.062	$ 186.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.300
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.096.354	$ 175.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.500
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.440.100	$ 230.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.500
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
7	230201-PROTECCION	30	$ 1.059.896	$ 169.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 169.600
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.065.104	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.237.499	$ 49.500	$ 0	$ 49.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.237.499		$ 88.200
2	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 13.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 333.334		$ 23.300
3	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.164.062	$ 46.600	$ 0	$ 46.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.164.062		$ 81.100
4	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.096.354	$ 43.900	$ 0	$ 43.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.096.354		$ 76.400
5	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.440.100	$ 57.700	$ 0	$ 57.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.440.100		$ 100.300
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 0
7	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.059.896	$ 42.400	$ 0	$ 42.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.059.896		$ 73.800
8	ESSC24-COOSALUD EPSS	30	$ 1.065.104	$ 42.700	$ 0	$ 42.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.065.104		$ 74.200

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.237.499	CCF34-COFREM META	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	10	$ 333.334	CCF34-COFREM META	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.164.062	CCF34-COFREM META	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.096.354	CCF34-COFREM META	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.440.100	CCF34-COFREM META	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.059.896	CCF34-COFREM META	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.065.104	CCF34-COFREM META	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 ED ROMARCO
TELÉFONO:	6716100
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2329233497
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/02
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2022
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	61193552

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1126921750	BUSTOS VILLALOBOS YUDI YOLANDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	36															
10	CC 1121831124	ROJAS AGUILAR FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
11	CC 1121850782	SALGADO CONTRERAS SHIRLEY XIOMARA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																
12	CC 1121866267	JIMENEZ MUÑOZ JHON FREDY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																
13	CC 1121871176	GARCIA VARGAS LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
14	CC 1121872420	HERNANDEZ VELASQUEZ DIEGO FERLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
15	CC 1121877420	CESPEDES BAQUERO NATALIA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI		30														
16	CC 1121882954	PRADO [illegible] NICOLAS	DEPEND		$ 4.280.000	FIJO			SI																
17	CC 1121887240	DIAZ AMAYA WILDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
18	CC 1121885308	HERREÑO PARRA ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
19	CC 1121889390	SANCHEZ MANJUANDA DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		30														
20	CC 1121890558	GUTIERREZ MARTINEZ LAURA FERNANDA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI	15															
21	CC 1121897546	RAMOS REYES JOSE ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
22	CC 1121902200	MENDEZ GONZALEZ DANIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
23	CC 1121934856	HINCAPIE AVILA SARA MARIA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																
24	CC 1121944733	ALZATE ROMERO JUAN LUIS	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																
25	CC 1121923061	VARGAS ZAMORA HUVER ALEXI	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							
26	CC 1122129624	SOTO ALVARADO JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO			SI																
27	CC 1122133490	MOLINA BELTRAN ELKIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									01-30							
28	CC 1122142895	PEREZ REY JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																
29	CC 1122513381	MENDEZ MENDEZ ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30							

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
9	230301-PORVENIR	8	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	8	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.460.937	$ 233.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.460.937	$ 58.500	$ 0	$ 58.500
11	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
12	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
13	230301-PORVENIR	30	$ 1.125.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.125.000	$ 45.000	$ 0	$ 45.000
14	230301-PORVENIR	30	$ 1.242.706	$ 198.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.900	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.242.706	$ 49.800	$ 0	$ 49.800
15	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
16	25-14-COLPENSIONES	30	$ 4.280.000	$ 684.800	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 727.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.280.000	$ 171.200	$ 0	$ 171.200
17	230301-PORVENIR	30	$ 1.070.833	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.070.833	$ 42.900	$ 0	$ 42.900
18	230301-PORVENIR	30	$ 1.138.541	$ 182.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.138.541	$ 45.600	$ 0	$ 45.600
19	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
20	231001-COLFONDOS	15	$ 1.177.000	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.400	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 1.177.000	$ 47.100	$ 0	$ 47.100
21	230301-PORVENIR	30	$ 1.070.833	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.070.833	$ 42.900	$ 0	$ 42.900
22	230201-PROTECCION	30	$ 1.184.896	$ 189.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.184.896	$ 47.400	$ 0	$ 47.400
23	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
24	230201-PROTECCION	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
25	230301-PORVENIR	30	$ 1.059.896	$ 169.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 169.600	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.059.896	$ 42.400	$ 0	$ 42.400
26	231001-COLFONDOS	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000
27	230301-PORVENIR	30	$ 1.558.229	$ 249.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.558.229	$ 62.400	$ 0	$ 62.400
28	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
29	230301-PORVENIR	30	$ 1.046.875	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.500	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.046.875	$ 41.900	$ 0	$ 41.900

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 200.000		$ 14.000	8	$ 200.000	CCF34-COFREM META	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.460.937		$ 101.700	30	$ 1.460.937	CCF34-COFREM META	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.125.000		$ 78.300	30	$ 1.125.000	CCF34-COFREM META	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.242.706		$ 86.500	30	$ 1.242.706	CCF34-COFREM META	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.280.000		$ 297.900	30	$ 4.280.000	CCF34-COFREM META	$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.070.833		$ 74.600	30	$ 1.070.833	CCF34-COFREM META	$ 42.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.138.541		$ 79.300	30	$ 1.138.541	CCF34-COFREM META	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 1.177.000		$ 82.000	15	$ 1.177.000	CCF34-COFREM META	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.070.833		$ 74.500	30	$ 1.070.833	CCF34-COFREM META	$ 42.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.184.896		$ 82.500	30	$ 1.184.896	CCF34-COFREM META	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.059.896		$ 73.800	30	$ 1.059.896	CCF34-COFREM META	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.850.000		$ 128.800	30	$ 1.850.000	CCF34-COFREM META	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.558.229		$ 108.500	30	$ 1.558.229	CCF34-COFREM META	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.046.875		$ 72.900	30	$ 1.046.875	CCF34-COFREM META	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 ED ROMARCO	TELÉFONO:	6716100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2329233497	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	81133552

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
30	CC 1122627674	PERILLA CEPEDA FRANKLIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI																
31	CC 1120?0114	MARTINEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.208.850	FIJO		SI								01-30								
32	CC 1124759039	BERMUDEZ MENDEZ LADY CAROLINA	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO		SI	08							08-30								
33	CC 1124788202	LEON REYES JUAN MANUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
34	CC 17356755	NIETO ... JOSE WILSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
35	CC 17411736	HORTUA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO		SI																
36	CC 26264092	OLIVEROS ...	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
37	CC 40186623	CRUZ ... ALBA YANETH	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO		SI																
38	CC 40330077	MENDOZA MENDEZ LEIDY MARCELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
39	CC 4152798	DAZA CAPOTE OMAR ERNESTO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI								01-30								
40	CC 75?9?868	CORREA GARCIA VICTOR JULIAN	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO		SI																
41	CC 76?6072	BONILLA ALDANA FARID	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
42	CC [illegible]	AGUIRRE PEÑA OMAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
43	CC [illegible]	MORALES HERNANDEZ OSCAR	DEPEND		$ 1.254.000	FIJO		SI								01-30								
44	CC [illegible]	VILLADA ROJAS ...	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI								01-30								
45	CC 86078105	SILVESTRE ... FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	08							08-30								
46	CC [illegible]	MATIAS ... WILFREDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI								01-30								
47	CC 97611355	GUTIERREZ CEBALLOS JAIRO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI								01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
30	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000
31	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.208.664	$ 193.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 193.500
32	230301-PORVENIR	23	$ 779.687	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 124.800
33	230301-PORVENIR	30	$ 1.026.041	$ 164.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.200
34	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.065.104	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.500
35	25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
36	230301-PORVENIR	30	$ 1.185.416	$ 189.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.700
37	25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
38	230501-PORVENIR	30	$ 1.193.229	$ 191.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191.000
39	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.469.271	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.100
40	25-14-COLPENSIONES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000
41	230301-PORVENIR	30	$ 1.093.750	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.000
42	230301-PORVENIR	30	$ 1.237.500	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.000
43	230301-PORVENIR	30	$ 1.628.406	$ 260.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.600
44	230301-PORVENIR	30	$ 1.487.500	$ 238.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.000
45	230301-PORVENIR	23	$ 1.044.062	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100
46	230301-PORVENIR	30	$ 1.072.916	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.700
47	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.487.500	$ 238.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
30	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.200.000		$ 63.600
31	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.208.664	$ 48.400	$ 0	$ 48.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.208.664		$ 84.200
32	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 779.687	$ 31.200	$ 0	$ 31.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 779.687		$ 54.300
33	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.026.041	$ 41.100	$ 0	$ 41.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.026.041		$ 71.500
34	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.065.104	$ 42.700	$ 0	$ 42.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.065.104		$ 74.200
35	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000
36	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.185.416	$ 47.500	$ 0	$ 47.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.185.416		$ 82.600
37	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000
38	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.193.229	$ 47.800	$ 0	$ 47.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.193.229		$ 83.100
39	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.469.271	$ 58.600	$ 0	$ 58.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.469.271		$ 102.300
40	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 8.000.000		$ 556.800
41	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.093.750	$ 43.800	$ 0	$ 43.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.093.750		$ 76.200
42	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.237.500	$ 49.500	$ 0	$ 49.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.237.500		$ 86.200
43	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.628.406	$ 65.200	$ 0	$ 65.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.628.406		$ 113.400
44	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.487.500	$ 59.500	$ 0	$ 59.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.487.500		$ 103.600
45	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 1.044.062	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 1.044.062		$ 72.700
46	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.072.916	$ 43.000	$ 0	$ 43.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.072.916		$ 74.700
47	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.487.500	$ 59.500	$ 0	$ 59.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.487.500		$ 103.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	30	$ 1.200.000	CCF34-COFREM META	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	30	$ 1.208.664	CCF34-COFREM META	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	23	$ 779.687	CCF34-COFREM META	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	30	$ 1.026.041	CCF34-COFREM META	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	30	$ 1.065.104	CCF34-COFREM META	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	30	$ 2.140.000	CCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	30	$ 1.185.416	CCF34-COFREM META	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	30	$ 2.140.000	CCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	30	$ 1.193.229	CCF34-COFREM META	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	30	$ 1.469.271	CCF34-COFREM META	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	30	$ 8.000.000	CCF34-COFREM META	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	30	$ 1.093.750	CCF34-COFREM META	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	30	$ 1.237.500	CCF34-COFREM META	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	30	$ 1.628.406	CCF34-COFREM META	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	30	$ 1.487.500	CCF34-COFREM META	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	23	$ 1.044.062	CCF34-COFREM META	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	30	$ 1.072.916	CCF34-COFREM META	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	30	$ 1.487.500	CCF34-COFREM META	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 22.539.900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 # 1-08	TUNJA-BOYACA	[illegible]	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$482,300

RESUMEN DE PAGO

Nombre	Codigo	NIT	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP ADMINISTRADORAS: 1				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL ADMINISTRADORAS: 1				1	$94,700	$0	$0	$94,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$94,700	$0	$0	$94,700
EPS ADMINISTRADORAS: 1				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS033	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL					$482,300	$0	$0	$482,300

2022/03/22 02:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		ALVAREZ FONSECA JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 44 B # 99	TUNJA-BOYACA	[illegible]	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2022-02	2022-02	[illegible]	[illegible]	E	2022/03/07	2022/03/22	BANCOLOMBIA	15	$444,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vsc	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
1	CC	[illegible]	X																2	30	$1,160,000	$139,200	2	30	$1,160,000	$139,200		0	$0	$0	4-11	30	$1,160,000	$174,000	0	$0	$0	NO	$313,200
Total	Afiliados: 1																				$1,160,000	$139,200			$1,160,000	$139,200			$0	$0			$1,160,000	$174,000		$0	$0		$313,200

2022/03/22 02:48 PM

LISTADO PERSONAL MARZO 2022		
ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
CRISTIAN FELIPE CUERVO BELTRÁN	CADENERO	75,084,823
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800078482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 33 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades rejuvenecimiento y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	76332065 61	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN (OTROS):	MES marzo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1396354889

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	21	$ 9.770.400	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 9.770.400	$ 0	$ 9.770.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 430.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.900	$ 0	$ 430.900
232201	232201- PROTECCION	14	$ 4.821.400	$ 0	$ 0	$ 42.300	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 4.906.000	$ 0	$ 4.906.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 7.769.900	$ 0	$ 0	$ 113.300	$ 113.300	$ 0	$ 0	$ 8.009.500	$ 0	$ 8.009.500
SUBTOTALES:										$ 20.133.300	$ 0	$ 20.133.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 334.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.600	$ 0	$ 0	$ 334.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 867.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.100	$ 0	$ 0	$ 867.100
EPSC34	EPSC34- CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 49.300
EPS041	SOS0 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 76.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	24		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.437.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.437.700	$ 0	$ 0	$ 2.437.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 576.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.800	$ 0	$ 0	$ 576.800
CCF059	CCF059- CAJACOPI ATLANTICO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.600	$ 0	$ 0	$ 116.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 815.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.100	$ 0	$ 0	$ 815.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 50.700
ESS018	ESS018 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES:													$ 5.168.500	$ 0	$ 0	$ 5.168.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	68		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.184.800	$ 8.184.800	$ 0	$ 0	$ 8.184.800
SUBTOTALES:									$ 8.184.800	$ 0	$ 0	$ 8.184.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	68	$ 5.168.800	$ 0	$ 5.168.800
SUBTOTALES:			$ 5.168.800	$ 0	$ 5.168.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	DÍAS	INT	LMA	VAC	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	VAT	SLN	DOM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	UPC ADICIONAL	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	FRAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1026419197	BARRERA SARMIENTO SERGIO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI										X									230301-PORVENIR	15	$ 880.594	$ 107.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107.000	ESS018 - EMSSANAR S.A.S.	15	$ 880.594	$ 29.600	$ 0	$ 29.600	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 880.594	1	$ 46.600	15	$ 880.594	CCF34-COFREM META	$ 29.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026602250	MURILLO TORRES JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI										X									230301-PORVENIR	30	$ 1.230.052	$ 196.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.900	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.230.052	$ 49.300	$ 0	$ 49.300	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.230.052	1	$ 85.700	30	$ 1.230.052	CCF34-COFREM META	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1026713362	CARDENAS SANTAN JUAN GABRIEL	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI		01																	230301-PORVENIR	1	$ 36.667	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 36.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 36.667	1	$ 2.900	1	$ 36.667	CCF34-COFREM META	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1026804626	ESPERZA MARULANDA JHON STIVEN	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI										X									230301-PORVENIR	30	$ 1.230.052	$ 196.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.230.052	$ 49.300	$ 0	$ 49.300	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.230.052	1	$ 85.700	30	$ 1.230.052	CCF34-COFREM META	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1026884684	FLOREZ SATURNO MONICA ANDREA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	ESS018 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.000	1	$ 5.800	30	$ 1.100.000	CCF34-COFREM META	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1027594081	DIAZ VALDIRA LAURA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI		15																	230301-PORVENIR	15	$ 550.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 88.000	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 22.000	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 550.000	1	$ 38.300	15	$ 550.000	CCF34-COFREM META	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1918158	ROJAS SANCHEZ ALVARO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI										X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.275.531	$ 204.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.275.531	$ 51.100	$ 0	$ 51.100	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.275.531	1	$ 88.830	30	$ 1.275.531	CCF34-COFREM META	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1917489	QUINTERO VILLARRAGA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.764.800	FIJO			SI										X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.392.706	$ 222.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.392.706	$ 55.800	$ 0	$ 55.800	014-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.392.706	1	$ 97.000	30	$ 1.392.706	CCF34-COFREM META	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079482
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7633208561	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		8790354509

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1026615622	VASQUEZ ARIAS ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI																	
10	CC 1032507005	DIAZ PORRAS DIEGO ARTURO	DEPEND		$ 2.110.000	FIJO			SI																	
11	CC 1075751088	OTALORA GONZALEZ ANDERSON	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI		08							X								
12	CC 1075884272	RINCON GARCIA DANIEL FERNANDO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	
13	CC 1087500550	ROSO MARQUEZ JESER GAGUER	DEPEND		$ 1.124.000	FIJO			SI									X								
14	CC 1110687571	VILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									X								
15	CC 1121881772	BOCANEGRA CONTRERAS CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									X								
16	CC 1121857919	LEAL ESPINOSA EDISSON JAVIER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	15							X									
17	CC 1121890359	MUÑOZ SALINAS JESSICA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		21															
18	CC 1121895530	VELEZ RIOS MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 4.441.000	FIJO			SI																	
19	CC 1121911000	DIAZ URREGO JESUS IVAN	DEPEND		$ 1.193.000	FIJO			SI									X								
20	CC 1121914173	RAYO RAMIREZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.868.000	FIJO			SI									X								
21	CC 1121915725	JUEZ SANDOVAL [illegible]	DEPEND		$ 1.420.000	FIJO			SI								X	X								
22	CC 1121921647	DUQUE ACEVEDO JOHAN MANUEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	15							X	X								
23	CC 1121932244	GARCIA SALINAS JOSE ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	15							X									
24	CC 1121935223	SALAZAR VALENZUELA SIRLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	
25	CC 1121935223	SALAZAR VALENZUELA SIRLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												03-08					
26	CC 1121936748	VELEZ RIOS JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	19							X									
27	CC 1121952148	MORENO ORTEGA JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.511.000	FIJO			SI									X								
28	CC 1122143385	CHISAMA GAMBOA [illegible] ESTIVEN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X								
29	CC 1124826001	GUTIERREZ PALENCIA WILDER NILEY	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI		29							X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000
10	230301-PORVENIR	30	$ 2.110.000	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.600
11	230301-PORVENIR	8	$ 254.375	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.700
12	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
13	230201-PROTECCION	30	$ 1.413.195	$ 226.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 226.200
14	230301-PORVENIR	30	$ 2.877.577	$ 460.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 460.400
15	230301-PORVENIR	30	$ 1.547.292	$ 247.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.600
16	230301-PORVENIR	16	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400
17	230301-PORVENIR	21	$ 1.120.000	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.200
18	230201-PROTECCION	30	$ 4.441.000	$ 710.600	$ 22.300	$ 22.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 755.200
19	230301-PORVENIR	30	$ 1.626.836	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200
20	230201-PROTECCION	30	$ 2.383.421	$ 381.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 381.400
21	231001-COLFONDOS	30	$ 1.767.500	$ 282.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.800
22	230301-PORVENIR	16	$ 541.147	$ 86.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 86.600
23	230301-PORVENIR	16	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000
24	230301-PORVENIR	24	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000
25	230301-PORVENIR	6	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000
26	230301-PORVENIR	12	$ 640.000	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.400
27	230301-PORVENIR	30	$ 1.512.430	$ 242.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.000
28	230301-PORVENIR	30	$ 1.352.500	$ 216.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.400
29	230301-PORVENIR	29	$ 1.193.386	$ 191.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
9	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
10	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 84.400
11	EPS017-FAMISANAR	8	$ 254.375	$ 10.200	$ 0	$ 10.200
12	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000
13	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.413.195	$ 56.600	$ 0	$ 56.600
14	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.877.577	$ 115.100	$ 0	$ 115.100
15	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.547.292	$ 61.900	$ 0	$ 61.900
16	EPS017-FAMISANAR	16	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400
17	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 44.800
18	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.441.000	$ 177.700	$ 0	$ 177.700
19	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.626.836	$ 65.100	$ 0	$ 65.100
20	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.383.421	$ 95.400	$ 0	$ 95.400
21	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.767.500	$ 70.700	$ 0	$ 70.700
22	EPS005-SANITAS S.A.	16	$ 541.147	$ 21.700	$ 0	$ 21.700
23	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000
24	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	24	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000
25	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	6	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000
26	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 640.000	$ 25.600	$ 0	$ 25.600
27	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.512.430	$ 60.500	$ 0	$ 60.500
28	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.352.500	$ 54.100	$ 0	$ 54.100
29	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.193.386	$ 47.800	$ 0	$ 47.800

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.400.000	1	$ 167.100
10	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.110.000	1	$ 146.900
11	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 254.375	1	$ 17.800
12	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000	1	$ 153.200
13	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.413.195	1	$ 98.400
14	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.877.577	1	$ 200.300
15	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.547.292	1	$ 107.700
16	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 533.334	1	$ 37.200
17	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.120.000	1	$ 78.000
18	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.441.000	1	$ 309.100
19	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.626.836	1	$ 113.200
20	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.383.421	1	$ 165.900
21	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.767.500	1	$ 123.100
22	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 541.147	1	$ 37.700
23	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 800.000	1	$ 55.700
24	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 800.000	1	$ 55.700
25	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 200.000		$ 0
26	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 640.000	1	$ 44.600
27	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.512.430	1	$ 105.300
28	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.352.500	1	$ 94.200
29	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 1.193.386	1	$ 83.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	30	$ 2.400.000	CCF34-COFREM META	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 2.110.000	CCF34-COFREM META	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	8	$ 254.375	CCF34-COFREM META	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 2.200.000	CCF34-COFREM META	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.413.195	CCF34-COFREM META	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 2.877.577	CCF34-COFREM META	$ 115.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 1.547.292	CCF34-COFREM META	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	16	$ 533.334	CCF34-COFREM META	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	21	$ 1.120.000	CCF34-COFREM META	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 4.441.000	CCF34-COFREM META	$ 177.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 1.626.836	CCF34-COFREM META	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 2.383.421	CCF34-COFREM META	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 1.767.500	CCF34-COFREM META	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	16	$ 541.147	CCF34-COFREM META	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	16	$ 800.000	CCF34-COFREM META	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	24	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	6	$ 200.000	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	12	$ 640.000	CCF34-COFREM META	$ 25.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	30	$ 1.512.430	CCF34-COFREM META	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	30	$ 1.352.500	CCF34-COFREM META	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	29	$ 1.193.386	CCF34-COFREM META	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800078182
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD-MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 35 70 OFICINA 1302	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7833208581		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1396364559

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	PARAFISCALES: CCF: ADMIN	TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
30	CC 1.24825890	FLOREZ CRUZ NELSON ANDRES	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO	SI	23-001-COLFONDOS	23	$ 925.281	$ 148.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148.100	EPS032-SALUD TOTAL	23	$ 925.281	$ 37.100	$ 0	$ 37.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 925.281	1	$ 64.400	23	$ 925.281	CCF34-COMFREM META	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 9.124.8330	CUJAR PALACIOS JUAN ANDRES	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO	SI	23-201-PORVENIR	15	$ 666.594	$ 107.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 666.594	$ 26.800	$ 0	$ 26.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 666.594	1	$ 46.600	15	$ 666.594	CCF34-COMFREM META	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1.121.124.941	QUIVAY ALVARADO NELSON ALONSO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO	SI	23-201-PORVENIR	15	$ 666.594	$ 107.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107.000	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	15	$ 666.594	$ 26.800	$ 0	$ 26.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 666.594	1	$ 46.600	15	$ 666.594	CCF34-COMFREM META	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 1126.5102	AMAYA EDILBERTO	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO	SI	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.721.953	$ 275.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.721.953	$ 68.900	$ 0	$ 68.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.721.953	1	$ 119.900	30	$ 1.721.953	SCCF34-COMFREM META	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 1151.1189.08	DAZA CAMARGO CAMARGO RAZMER	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO	SI	23-201-PORVENIR	15	$ 550.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 88.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 22.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 550.000	1	$ 38.300	15	$ 550.000	CCF34-COMFREM META	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 1.122.463.505	MARQUEZ SANCHEZ DANIEL SANTIAGO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO	SI	23-301-PORVENIR	30	$ 1.249.479	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.249.479	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.249.479	1	$ 87.000	30	$ 1.249.479	SCCF34-COMFREM META	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 1.154.515.894	MANTILLA ROMERO LA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO	SI	23-001-PORVENIR	30	$ 1.285.938	$ 205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.285.938	$ 51.500	$ 0	$ 51.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.285.938	1	$ 89.800	30	$ 1.285.938	SCCF34-COMFREM META	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 1.234.269.619	ORTIZ SUAREZ FABIAN STIVEN	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO	SI	23-301-PORVENIR	30	$ 1.566.891	$ 251.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.566.891	$ 62.800	$ 0	$ 62.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.566.891	1	$ 109.200	30	$ 1.566.891	SCCF34-COMFREM META	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 1.121.880.7	HUERTAS CHUELA JAIME	DEPEND	PENSIONADO	$ 1.211.800	FIJO	SI			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.653.772	$ 66.200	$ 0	$ 66.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.653.772	1	$ 115.200	30	$ 1.653.772	SCCF34-COMFREM META	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 17.311.287	CRUZ AVILA JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO	SI	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.638.157	$ 261.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.157	$ 65.500	$ 0	$ 65.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.638.157	1	$ 113.900	30	$ 1.638.157	SCCF34-COMFREM META	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 1.124.9185	SALAZAR MORENO HAMILTON EDUARDO	DEPEND		$ 9.000.000	FIJO	SI	25-14-COLPENSIONES	30	$ 9.990.000	$ 1.598.400	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.698.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.990.000	$ 399.600	$ 0	$ 399.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 9.990.000	1	$ 695.400	30	$ 9.990.000	SCCF34-COMFREM META	$ 399.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 1.234.4539	MATAS PARRADO JOSE FLORIBERTO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO	SI	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.591.313	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS017-NUEVA EPS	30	$ 1.591.313	$ 63.700	$ 0	$ 63.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.591.313	1	$ 110.800	30	$ 1.591.313	SCCF34-COMFREM META	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 1.234.6751	CONTRERAS SANTILLO JOSE FERNANDO	DEPEND	PENSIONADO	$ 2.110.000	FIJO	SI			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.192.429	$ 87.700	$ 0	$ 87.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.192.429	1	$ 152.600	30	$ 2.192.429	SCCF34-COMFREM META	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 1.233.6.725	QUIROGA JORGE	DEPEND		$ 2.103.000	FIJO	SI	23-201-PROTECCION	30	$ 2.135.859	$ 341.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.135.859	$ 85.500	$ 0	$ 85.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.135.859	1	$ 148.700	30	$ 2.135.859	SCCF34-COMFREM META	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 1.130.0.898	GONZALEZ MURILLO HENRY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO	SI	23-201-PROTECCION	30	$ 1.259.899	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.259.899	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.259.899	1	$ 87.700	30	$ 1.259.899	SCCF34-COMFREM META	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 1.142.1.257	PUENTES ROZO FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO	SI	23-201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000	1	$ 278.400	30	$ 4.000.000	SCCF34-COMFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 1.122.3.285	RIOS BERNARDINA Y HELIBERTO	DEPEND	PENSIONADO	$ 500.000	FIJO	SI		25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	0	$ 250.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	0	$ 250.000	1	$ 1.100	0	$ 250.000	CCF34-COMFREM META	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 1.120.1.998	QUIVAY SALGUERO LUIS ALFONSO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO	SI	23-301-PORVENIR	30	$ 1.247.240	$ 199.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 199.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.247.240	$ 49.900	$ 0	$ 49.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.247.240	1	$ 86.900	30	$ 1.247.240	SCCF34-COMFREM META	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 1.065.6.402	MOLINA BARROS DORA MERCEDES	DEPEND		$ 1.246.000	FIJO	SI	23-301-PORVENIR	30	$ 1.246.000	$ 199.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 199.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.246.000	$ 49.900	$ 0	$ 49.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.246.000	1	$ 86.800	30	$ 1.246.000	SCCF34-COMFREM META	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 1.065.6.120	BEJARANO GONZALEZ MONANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.507.000	FIJO	SI	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.507.000	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.507.000	$ 60.300	$ 0	$ 60.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.507.000	1	$ 7.900	30	$ 1.507.000	SCCF34-COMFREM META	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 40.332.046	VARA CARDONA ANGUY BRIGITTE	DEPEND		$ 3.092.000	FIJO	SI									84-20		25-14-COLPENSIONES	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 66.667		$ 0	2	$ 66.667	CCF34-COMFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800029482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOPRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 79 OFICINA 19 02	TELEFONO:	8715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO LIMPIEZA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7633206561			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1398354559

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
51	CC 1033703445	VALLE CARDONA HAZLLY BRIGITTE	DEPEND		$ 3.392.000	FIJO		SI
52	CC 1123544492	ORTIZ GOMEZ MIRIAM	DEPEND		$ 1.507.000	FIJO		SI
53	CC 1026577203	MEDINA ORTIZ BEATRIZ	DEPEND	PENSIONADO POR VEJEZ ACT	$ 1.744.000	FIJO		SI
54	CC 1014287259	MADRID MEDINA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3.800.000	FIJO		SI
55	CC 1075751778	VAZQUEZ BARRAGAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI
56	CC 52698143	CASTILLO CHILAMBO MAILEN	DEPEND		$ 1.383.000	FIJO		SI
57	CC 75054823	[illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI
58	CC 79527715	[illegible]	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI
59	CC 80048498	PERDO ULCUE CARLOS LEONARDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI
60	CC 80041018	[illegible]	DEPEND		$ 2.585.000	FIJO		SI
61	CC 80054072	ORTIZ SANCHEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 1.470.000	FIJO		SI
62	CC 80057208	MARTINEZ PARADA EDUARDO	DEPEND		$ 7.551.000	FIJO		SI
63	CC 80070527	DIAZ TORRES JEREMY ARNALDO	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO		SI
64	CC 80073094	ARIAS MUNERA CARLOS ANTONIO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI
65	CC 80078828	VELEZCROS DAJAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.243.000	FIJO		SI
66	CC 80078926	AMEDIANO PULIDO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.381.000	FIJO		SI
67	CC 80078958	LOPEZ SAENZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.026.000	FIJO		SI
68	CC 80080266	HENAO TORO JORMAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO		SI
69	CC 80085910	HERNANDEZ CLAVIJO OSCAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI
70	CC 80074701	CANCAMO C. GIRALDO JHON ERICK	DEPEND		$ 1.110.000	FIJO		SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ETP
51									X							
57																
59									X							
61									X							
63									X							
64									X							
65									X							
66									X							
67									X							
68									X							
69									X							
70									X							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
51	25-14 COLPENSIONES	28	$ 3.185.667	$ 509.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 509.600
52	230301-PORVENIR	30	$ 1.507.000	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200
53			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
54	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.800.000	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 570.000
55	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
56	250201-PROTECCION	30	$ 1.383.000	$ 218.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 218.100
57	230301-PORVENIR	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000
58	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000
59	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.287.188	$ 206.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 206.000
60	25-14 COLPENSIONES	29	$ 2.585.000	$ 413.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 413.600
61	230201-PROTECCION	29	$ 1.885.234	$ 301.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.700
62	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.551.000	$ 1.224.200	$ 38.300	$ 38.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.300.800
63	230201-PROTECCION	30	$ 2.554.271	$ 408.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.700
64	230201-PROTECCION	30	$ 2.167.101	$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 346.800
65	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.671.576	$ 267.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 267.500
66	230201-PROTECCION	30	$ 1.694.804	$ 271.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.200
67	230201-PROTECCION	30	$ 1.265.104	$ 202.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.500
68	230201-PROTECCION	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
69	230301-PORVENIR	30	$ 1.894.063	$ 303.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.100
70	230201-PROTECCION	30	$ 1.427.391	$ 228.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.400

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AUSILIO	TOTAL APORTE
51	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 3.185.667	$ 126.700	$ 0	$ 126.700
52	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.507.000	$ 60.300	$ 0	$ 60.300
53	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.744.000	$ 69.800	$ 0	$ 69.800
54	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.800.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000
55	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
56	EPS034-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.383.000	$ 54.600	$ 0	$ 54.600
57	EPS034-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000
58	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 365.000	$ 0	$ 365.000
59	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.287.188	$ 51.500	$ 0	$ 51.500
60	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.585.000	$ 103.400	$ 0	$ 103.400
61	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.885.234	$ 75.500	$ 0	$ 75.500
62	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.551.000	$ 302.100	$ 0	$ 302.100
63	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.554.271	$ 102.200	$ 0	$ 102.200
64	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.167.101	$ 86.700	$ 0	$ 86.700
65	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.671.576	$ 66.900	$ 0	$ 66.900
66	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.694.804	$ 67.800	$ 0	$ 67.800
67	EPS006-COMPENSAR	30	$ 1.265.104	$ 50.700	$ 0	$ 50.700
68	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600
69	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.894.063	$ 75.800	$ 0	$ 75.800
70	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.427.391	$ 57.100	$ 0	$ 57.100

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
51	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 3.185.667	1	$ 220.400
52	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.507.000	1	$ 7.600
53	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.744.000	1	$ 9.200
54	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.800.000	1	$ 18.800
55	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 99.800
56	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.383.000	1	$ 7.200
57	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.000.000	1	$ 487.200
58	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.000.000	1	$ 348.000
59	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.287.188	1	$ 89.600
60	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.585.000	1	$ 180.000
61	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.885.234	1	$ 131.300
62	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.551.000	1	$ 532.500
63	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.554.271	1	$ 177.400
64	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.167.101	1	$ 150.500
65	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.671.576	1	$ 116.400
66	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.694.804	1	$ 118.000
67	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.265.104	1	$ 88.100
68	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000	1	$ 149.000
69	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.894.063	1	$ 131.900
70	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.427.391	1	$ 99.400

PARAFISCALES

Nº	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
51	$ 3.232.534	34-COFREM META	$ 129.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	$ 1.507.000	34-COFREM META	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	$ 1.744.000	34-COFREM META	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	$ 3.800.000	34-COFREM META	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	$ 1.000.000	34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	$ 1.383.000	34-COFREM META	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	$ 7.000.000	34-COFREM META	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	$ 5.000.000	34-COFREM META	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	$ 1.287.188	34-COFREM META	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	$ 2.585.000	34-COFREM META	$ 103.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	$ 1.885.234	34-COFREM META	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	$ 7.551.000	34-COFREM META	$ 302.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	$ 2.554.271	34-COFREM META	$ 102.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	$ 2.167.101	34-COFREM META	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	$ 1.671.576	34-COFREM META	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	$ 1.694.804	34-COFREM META	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	$ 1.265.104	34-COFREM META	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	$ 2.140.000	34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	$ 1.894.063	34-COFREM META	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	$ 1.427.391	34-COFREM META	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 38.645.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901286805
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 LD HUMADEA	TELEFONO:	6715100
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO SUPERSA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7533065736	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mes/a AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	MM AÑO	2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaammdd):			20220404	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1257427084

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLPENSIONES	2	$ 672,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672,700	$ 0	$ 672,700
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1,125,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,125,000	$ 0	$ 1,125,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 3,427,900	$ 0	$ 0	$ 55,300	$ 55,300	$ 0	$ 0	$ 3,588,500	$ 0	$ 3,588,500
230301	230301-PORVENIR	29	$ 5,574,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,574,200	$ 0	$ 5,574,200
SUBTOTALES:										$ 10,960,400	$ 0	$ 10,960,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,109,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,109,700	$ 0	$ 0	$ 1,109,700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 270,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270,300	$ 0	$ 0	$ 270,300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 340,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340,100	$ 0	$ 0	$ 340,100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 311,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311,500	$ 0	$ 0	$ 311,500
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 238,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238,900	$ 0	$ 0	$ 238,900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 141,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141,900	$ 0	$ 0	$ 141,900
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,800	$ 0	$ 0	$ 166,800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136,900	$ 0	$ 0	$ 136,900
SUBTOTALES:													$ 2,714,100	$ 0	$ 0	$ 2,714,100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	45		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4,393,400	$ 4,393,400	$ 0	$ 0	$ 4,393,400
SUBTOTALES:									$ 4,393,400	$ 0	$ 0	$ 4,393,400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	44	$ 2,565,500	$ 0	$ 2,565,500
SUBTOTALES:			$ 2,565,500	$ 0	$ 2,565,500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
																											PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE1	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	PET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065725347	GONZALEZ CLAVIJO DIEGO OSWALDO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,500	30	$ 1,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065794319	ENCISO MORALES PAULA XIMENA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,500	30	$ 1,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065799560	PEREA OCAMPO RONALD KEVIN ARMANDO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI													07-21					230201-PROTECCION	5	$ 166,667	$ 26,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26,700	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5	$ 166,667	$ 6,700	$ 0	$ 6,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166,667		$ 0	5	$ 111,112	CCF34-COFREM META	$ 4,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065799560	PAVILA OCAMPO RONALD KEVIN ARMANDO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI												01-29						230201-PROTECCION	25	$ 1,125,001	$ 180,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180,100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	25	$ 1,125,001	$ 45,100	$ 0	$ 45,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 1,125,001		$ 78,400	25	$ 1,125,001	SCCF34-COFREM META	$ 45,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010131494	GOMEZ PISCO BARON CAMILO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI												01-08						230201-PROTECCION	26	$ 1,044,271	$ 167,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167,100	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 1,044,271	$ 41,800	$ 0	$ 41,800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1,044,271		$ 72,700	26	$ 1,044,271	SCCF34-COFREM META	$ 41,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020253011	NAGUA MUNEVAR JONATHAN ANDRES	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO		SI												01-30						230301-PORVENIR	30	$ 1,405,728	$ 225,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,405,728	$ 56,300	$ 0	$ 56,300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,405,728		$ 97,900	30	$ 1,405,728	SCCF34-COFREM META	$ 56,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1032421835	LASSO CONDE LAURA KATHERINE	DEPEND		$ 250,000	FIJO		SI													01-30					230201-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,000,000		$ 0	30	$ 1,000,000	SCCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1112454660	CARVAJAL BEJARANO REYNER	DEPEND		$ 1,200,000	FIJO		SI													01-30					230201-PROTECCION	30	$ 1,020,833	$ 163,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163,400	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1,020,833	$ 40,900	$ 0	$ 40,900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,020,833		$ 71,300	30	$ 1,020,833	SCCF34-COFREM META	$ 40,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288505
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 36 - 70 OF 1302 ED ROMARCO	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7633065736	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1397427064

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	DOM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1112493217	GALARZA CARABALI KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
10	CC 1120025735	[illegible] VILLALOBOS YUDI YOLANDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
11	CC 1121528124	ROJAS AGUILAR FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI									01-30								
12	CC 1121869782	SALAZAR CONTRERAS SHIRLEY ZOOMARA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI												06-12					
13	CC 1121869782	SALAZAR CONTRERAS SHIRLEY ZOOMARA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	
14	CC 1121868057	JIMENEZ MUÑOZ JHON FREDY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	
15	CC 1121871171	GARCIA VARGAS LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
16	CC 1121872429	BERMUDEZ VELASQUEZ DIEGO FERLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
17	CC 1121882064	FRANCO [illegible] NICOLAS	DEPEND		$ 4.280.000	FIJO		SI																	
18	CC 1121887243	DIAZ ARANGO WILDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
19	CC 1121888039	HERREÑO PARRA ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
20	CC 1121890556	GUTIERREZ MARTINEZ LAURA FERNANDA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO		SI																	
21	CC 1121897540	RAMOS REYES JOSE ALBERTO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI									01-30								
22	CC 1121908200	MENDEZ GONZALEZ DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								
23	CC 1121934856	HINCAPIE ARDILA SARA MARIA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO		SI												10-19					
24	CC 1121934856	HINCAPIE ARDILA SARA MARIA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO		SI																	
25	CC 1121944730	ALZATE ROMERO JOSE LUIS	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO		SI																	
26	CC 1121953051	[illegible] ZAMORA [illegible] ALEXI	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	
27	CC 1122121924	SOTO ALVARADO JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO		SI																	
28	CC 1122132488	MOLINA BELTRAN EDWIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI																	
29	CC 1122142835	PEREZ REY [illegible] ANDRES	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO		SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.020.833	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.400
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.067.708	$ 170.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.900
11	230301-PORVENIR	30	$ 1.197.916	$ 191.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191.700
12	230301-PORVENIR	7	$ 233.334	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400
13	230301-PORVENIR	23	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.000
14	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
15	230301-PORVENIR	30	$ 1.128.124	$ 180.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.500
16	230301-PORVENIR	30	$ 1.020.833	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.400
17	25-14-COLPENSIONES	30	$ 4.280.000	$ 684.800	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 727.600
18	230301-PORVENIR	30	$ 1.031.250	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.000
19	230301-PORVENIR	30	$ 1.242.708	$ 198.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.900
20	231001-COLFONDOS	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700
21	230301-PORVENIR	30	$ 1.033.854	$ 165.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.500
22	230201-PROTECCION	30	$ 1.318.229	$ 211.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.000
23	230301-PORVENIR	10	$ 523.112	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.700
24	230301-PORVENIR	20	$ 1.569.334	$ 251.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.100
25	230201-PROTECCION	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700
26	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
27	231001-COLFONDOS	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000
28	230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000
29	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
9	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.020.833	$ 40.900	$ 0	$ 40.900
10	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.067.708	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
11	EPS008-SANITAS S.A.	30	$ 1.197.916	$ 48.000	$ 0	$ 48.000
12	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 9.400
13	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 46.000
14	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
15	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.128.124	$ 45.200	$ 0	$ 45.200
16	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.020.833	$ 40.900	$ 0	$ 40.900
17	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.280.000	$ 171.200	$ 0	$ 171.200
18	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.031.250	$ 41.300	$ 0	$ 41.300
19	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.242.708	$ 49.800	$ 0	$ 49.800
20	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
21	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.033.854	$ 41.400	$ 0	$ 41.400
22	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.318.229	$ 52.800	$ 0	$ 52.800
23	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 523.112	$ 21.000	$ 0	$ 21.000
24	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.569.334	$ 62.800	$ 0	$ 62.800
25	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200
26	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
27	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000
28	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000
29	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200

SEGURIDAD SOCIAL — ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.020.833		$ 71.100	30	$ 1.020.833	CCF34-COFREM META	$ 40.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.067.708		$ 74.400	30	$ 1.067.708	CCF34-COFREM META	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.197.916		$ 83.400	30	$ 1.197.916	CCF34-COFREM META	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 233.334		$ 0	7	$ 233.334	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 1.150.000		$ 80.100	23	$ 1.150.000	CCF34-COFREM META	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.128.124		$ 78.600	30	$ 1.128.124	CCF34-COFREM META	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.020.833		$ 71.100	30	$ 1.020.833	CCF34-COFREM META	$ 40.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.280.000		$ 297.900	30	$ 4.280.000	CCF34-COFREM META	$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.031.250		$ 71.800	30	$ 1.031.250	CCF34-COFREM META	$ 41.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.242.708		$ 86.500	30	$ 1.242.708	CCF34-COFREM META	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.033.854		$ 72.000	30	$ 1.033.854	CCF34-COFREM META	$ 41.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.318.229		$ 91.800	30	$ 1.318.229	CCF34-COFREM META	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 523.112		$ 0	10	$ 523.112	CCF34-COFREM META	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 1.569.334		$ 109.300	20	$ 1.569.334	CCF34-COFREM META	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.850.000		$ 128.800	30	$ 1.850.000	CCF34-COFREM META	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF34-COFREM META	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901286805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 ED ROMARCO	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7833065736	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1397427064

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IOM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
30	CC 1122613891	MENDEZ MENDEZ ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								
31	CC 1123827574	PERILLA CESPEDA FRANKLIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								
32	CC 1132081 4	MARTINEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
33	CC 1234788039	BERMUDEZ MENDEZ LADY CAROLINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
34	CC 1234788232	LEON REYES JUAN MANUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
35	CC 17365758	NIETO TRIANA JOSE WILSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
36	CC 17411738	HORTUA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI																	
37	CC 30984032	OLIVEROS MORA FLOR NEYSNEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
38	CC 40186623	CRUZ ARCINIEGAS ALBA YINETH	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI																	
39	CC 40320077	MENDOZA MENDEZ JENY MARCELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
40	CC 41327...	DAZA CAPOTE OMAR ERNESTO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									01-30								
41	CC 79...	CORREA GARCIA VICTOR JULIAN	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO			SI												17-30					
42	CC 79...	CORREA GARCIA VICTOR JULIAN	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO			SI																	
43	CC [illegible]	BONILLA ALDANA PABLO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
44	CC 79322258	AGUIRRE PEÑA OMAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								
45	CC 86068170	MORALES FERNANDEZ OSMAR	DEPEND		$ 1.254.000	FIJO			SI									01-30								
46	CC 86068425	MILLAN ROJAS JAIRO DE JESUS	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI												14-18					
47	CC 86068425	MILLAN ROJAS JAIRO DE JESUS	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									01-20								
48	CC 86078109	SILVESTRE PIRAVAN FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-24								
49	CC 86078109	SILVESTRE PIRAVAN FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI												25-27					

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
30	230301-PORVENIR	30	$ 1.215.625	$ 194.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.500
31	230301-PORVENIR	30	$ 1.215.625	$ 194.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.500
32	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.152.083	$ 184.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.400
33	230301-PORVENIR	30	$ 1.070.313	$ 171.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.300
34	230301-PORVENIR	30	$ 1.031.250	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.000
35	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.357.812	$ 217.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.300
36	25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
37	230301-PORVENIR	30	$ 1.122.396	$ 179.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.600
38	25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400
39	230301-PORVENIR	30	$ 1.125.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.000
40	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.480.208	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 236.900
41	25-14-COLPENSIONES	14	$ 2.488.891	$ 398.300	$ 12.500	$ 12.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.300
42	25-14-COLPENSIONES	16	$ 4.266.667	$ 682.700	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 725.500
43	230301-PORVENIR	30	$ 1.062.500	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.000
44	230301-PORVENIR	30	$ 1.041.667	$ 166.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.700
45	230301-PORVENIR	30	$ 1.688.594	$ 270.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.200
46	230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700
47	230301-PORVENIR	25	$ 1.161.251	$ 185.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.800
48	230301-PORVENIR	27	$ 1.291.875	$ 206.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 206.700
49	230301-PORVENIR	3	$ 130.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
30	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.215.625	$ 48.700	$ 0	$ 48.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.215.625		$ 84.700
31	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.215.625	$ 48.700	$ 0	$ 48.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.215.625		$ 84.700
32	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.152.083	$ 46.100	$ 0	$ 46.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.152.083		$ 80.200
33	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.070.313	$ 42.900	$ 0	$ 42.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.070.313		$ 74.500
34	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.031.250	$ 41.300	$ 0	$ 41.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.031.250		$ 71.800
35	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.357.812	$ 54.400	$ 0	$ 54.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.357.812		$ 94.500
36	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000
37	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.122.396	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.122.396		$ 78.200
38	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000
39	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.125.000	$ 45.000	$ 0	$ 45.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.125.000		$ 78.300
40	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.480.208	$ 59.300	$ 0	$ 59.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.480.208		$ 103.100
41	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	14	$ 2.488.891	$ 99.600	$ 0	$ 99.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 2.488.891		$ 0
42	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	16	$ 4.266.667	$ 170.700	$ 0	$ 170.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 4.266.667		$ 297.000
43	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.062.500	$ 42.500	$ 0	$ 42.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.062.500		$ 74.000
44	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.041.667	$ 41.700	$ 0	$ 41.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.041.667		$ 72.500
45	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.688.594	$ 67.600	$ 0	$ 67.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.688.594		$ 117.500
46	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 0
47	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.161.251	$ 47.300	$ 0	$ 47.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 1.161.251		$ [illegible]
48	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.291.875	$ 51.700	$ 0	$ 51.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 1.291.875		$ 90.000
49	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 5.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 130.000		$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	30	$ 1.215.625	CCF34-COFREM META	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	30	$ 1.215.625	CCF34-COFREM META	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	30	$ 1.152.083	CCF34-COFREM META	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	30	$ 1.070.313	CCF34-COFREM META	$ 42.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	30	$ 1.031.250	CCF34-COFREM META	$ 41.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	30	$ 1.357.812	CCF34-COFREM META	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	30	$ 2.140.000	CCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	30	$ 1.122.396	CCF34-COFREM META	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	30	$ 2.140.000	CCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	30	$ 1.125.000	CCF34-COFREM META	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	30	$ 1.480.208	CCF34-COFREM META	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	14	$ 2.488.891	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	16	$ 4.266.667	CCF34-COFREM META	$ 170.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	30	$ 1.062.500	CCF34-COFREM META	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	30	$ 1.041.667	CCF34-COFREM META	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	30	$ 1.688.594	CCF34-COFREM META	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	5	$ 166.666	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	25	$ 1.161.251	CCF34-COFREM META	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	27	$ 1.291.875	CCF34-COFREM META	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	3	$ 130.000	CCF34-COFREM META	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901288805
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO CSD
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 38 - 70 OF 1302 ED ROMARCO	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	E MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			76330657 36	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1397427084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
50	CC 20086839	MATAS BURAVILLA WILFREDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-09								23030 PORVENIR	3	$ 111.717	$ 17.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.900	EPS017 FAMISANAR	3	$ 111.717	$ 4.500	$ 0	$ 4.500	3447 SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 111.717		$ 7.600	3	$ 111.717	00134 COFREM ETA	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 97611395	GUTIERREZ CEBALLOS JAIRO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									01-30								25 14 COLPENSIONES	30	$ 1.429.188	$ 228.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.700	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.429.188	$ 57.200	$ 0	$ 57.200	3447 SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.429.188		$ 99.500	30	$ 1.429.188	00F34 COFREM ETA	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 20.633.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal/ Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049603829		ALVAREZ PONSON JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 43 B A 95	TANJA-BOYACA	7404084	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-03	1400097849	94033631 16	I	2022/04/07	2022/04/07	BANCOLOMBIA	0	$ 183,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irp	cue	vip			Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Diferencia SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049603829	ALVAREZ JOSE																	230301	30	$1,300,000	$247,000	230301	30	$1,300,000	$130,000		0	$0	$0	116221	30	$1,300,000	$104,000	0	$0	$0	NO	$481,300
Total		afiliados(1)																				$1,300,000	$247,000			$1,300,000	$130,000			$0	$0			$1,300,000	$104,000		$0	$0		$481,300

2022/04/07 08:46 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Excepción Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1[illegible]28		ALVAREZ FONSECA JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 43 # 6 A 08	TUNJA/BOYACA	7404367	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-03	M0268[illegible]19	1[illegible]2119	1	2022/04/07	2022/04/07	BANCOLOMBIA	0	$433,300

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	200,224,308	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$94,700	$0	$0	$94,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$94,700	$0	$0	$94,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000

LISTADO PERSONAL ABRIL 2022

ISIDORO ZORRO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA	79,577,715
RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	17,329,108
ARMANDO MORENO GONZALES	INSPECTOR DE OBRA	860,441,016
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	1,049,608,025
NICOLAS FRANCO BAQUERO	GERENTA DE CALIDAD	1,121,882,054
LUIS FERNANDO DAZA	CADENERO	4,172,317
SARA MARIA HINCAPIE ARDILA	ING AMBIENTAL	1,121,934,856
DIEGO ARTURO DIAZ PORRAS	OPERARIO	1,032,387,035
JORGE IVAN PARRADO ROMERO	AYUDANTE	1,074,129,857
LEISDER ASDRUBAL GIRALDO	AYUDANTE	1,121,827,310
EDISSON JAVIER LEAL ESPINOSA	AYUDANTE	1,121,857,319
JULIAN DAVID HINCAPIE BARRETO	AYUDANTE	1,121,868,851
JESUS IVAN DIAZ URREGO	AYUDANTE	1,121,911,000
JOHAN MANUEL DUQUE ACEVEDO	AYUDANTE	1,121,921,647
JOSE ALEJANDRO GARCIA OCHOA	AYUDANTE	1,121,932,244
KAROL DAYAN ROJAS ORTIZ	PALETERA	1,193,091,717
IVAN PULIDO VARGAS	OPERARIO	17,344,901
GHELMUR ZARATE LEON	TOPOGRAFO	1,121,858,465
VICTOR MANUEL ARDILA HERNANDEZ	CADENERO	1,121,878,409
DANIEL FELIPE HINCAPIE BARRETO	CADENERO	1,121,940,179
GERMAN SANABRIA RODIRGUEZ	CADENERO	17,357,122
HAZLLY BRIGITTE YARA CARDONA	PROFESIONAL EN SST - HSEQ	40,332,046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079492
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6719100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B.MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78371249	90	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1444033855

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	25	$ 8.425.800	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 8.425.800	$ 0	$ 8.425.800
230301	230301-COLFONDOS	1	$ 281.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.300	$ 0	$ 281.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 7.969.400	$ 0	$ 0	$ 113.300	$ 113.300	$ 0	$ 0	$ 8.167.000	$ 0	$ 8.167.000
230201	230201- PROTECCION	17	$ 4.983.400	$ 0	$ 0	$ 42.300	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 5.048.000	$ 0	$ 5.048.000
SUBTOTALES:										$ 19.992.100	$ 0	$ 19.992.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	24		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.381.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.381.600	$ 0	$ 0	$ 2.381.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 848.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.900	$ 0	$ 0	$ 848.900
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 177.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.800	$ 0	$ 0	$ 177.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 527.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.900	$ 0	$ 0	$ 527.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 0	$ 587.800
EPS010	CRK SUPRAVER CAJA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 334.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.800	$ 0	$ 0	$ 334.800
EPS018	ES0018 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
EPS041	SURA NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.200	$ 0	$ 0	$ 42.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.500	$ 0	$ 0	$ 106.500
EPS034	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 79.600
SUBTOTALES:													$ 5.130.900	$ 0	$ 0	$ 5.130.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	68		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.961.400	$ 7.961.400	$ 0	$ 0	$ 7.961.400
SUBTOTALES:									$ 7.961.400	$ 0	$ 0	$ 7.961.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COMFREM META	66	$ 5.132.100	$ 0	$ 5.132.100
SUBTOTALES:			$ 5.132.100	$ 0	$ 5.132.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
AP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRADA TRASLADA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1026031259	MURILLO TORRES JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.130.600	FIJO		SI								X								230301 - PORVENIR	30	$ 1.164.167	$ 166.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.300	EPS034 - CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.164.167	$ 58.800	$ 0	$ 58.800	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.164.167	1	$ 81.100	30	$ 1.164.167	SCCF34 - COFREM META	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1024904539	DURAN MAYLANDA JHON STIVEN	DEPEND		$ 1.130.600	FIJO		SI								X								230301 - PORVENIR	30	$ 1.164.167	$ 166.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.300	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.164.167	$ 58.800	$ 0	$ 58.800	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.164.167	1	$ 81.100	30	$ 1.164.167	SCCF34 - COFREM META	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1024999884	FLOREZ LANDAZURI YULIKA ANDREA	DEPEND		$ 1.130.600	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.000	EPS018 - EMSSANA S.A.S.	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.000	1	$ 55.000	30	$ 1.100.000	SCCF34 - COFREM META	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010123305	ZAPATA LUNA BRAYAN SMITH	DEPEND		$ 1.030.600	FIJO		SI	19						X	X								230301 - PORVENIR	12	$ 410.417	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.700	EPS034 - CAPITAL SALUD EPSS	12	$ 410.417	$ 16.500	$ 0	$ 16.500	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 410.417	1	$ 28.500	12	$ 410.417	SCCF34 - COFREM META	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1018981138	ROJAS SANCHEZ IGNACIO	DEPEND		$ 1.030.600	FIJO		SI												18 17				25-14 COLPENSIONES	2	$ 68.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS002 - SALUD TOTAL	2	$ 68.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 68.667		$ 0	2	$ 68.667	SCCF34 - COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1018981138	ROJAS SANCHEZ IGNACIO	DEPEND		$ 1.030.600	FIJO		SI								X								25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.068.230	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.000	EPS002 - SALUD TOTAL	25	$ 1.068.230	$ 42.800	$ 0	$ 42.800	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 1.068.230	1	$ 74.400	25	$ 1.068.230	SCCF34 - COFREM META	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1017489...	QUINTERO VILLAMIZAR JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.124.600	FIJO		SI								X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.287.331	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 1.287.331	$ 51.500	$ 0	$ 51.500	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.287.331	1	$ 89.800	30	$ 1.287.331	SCCF34 - COFREM META	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1020815032	MARQUEZ MEJIAS ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-7 - SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.400.000	1	$ 167.100	30	$ 2.400.000	SCCF34 - COFREM META	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800079482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO: META
DIRECCIÓN: CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELÉFONO: 6719100
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7637124990	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES mayo AÑO 2022
DÍAS DE MORA: 0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1444333855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE y NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1032397095	DIAZ PORRAS DIEGO ARTURO	DEPEND		$ 2.110.000	FIJO			SI									X								
10	CC 1071332017	GUTIERREZ CRUZ MILLYDI YANINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	07							X	X								
11	CC 1074125857	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	05							X	X								
12	CC 1075664279	RINCON GARCIA DANIEL FERNANDO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	
13	CC 1087986558	TORO MARQUEZ JEISER JOAQUIN	DEPEND		$ 1.124.000	FIJO			SI									X								
14	CC 1119887171	VILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.801.000	FIJO			SI									X								
15	CC 1121527382	[illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	19							X	X								
16	CC 1121851772	ROSANEGRA CONTRERAS CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.480.000	FIJO			SI									X								
17	CC 1121857819	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									X								
18	CC 1121869801	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	19	30						X	X								
19	CC 1121896509	VELEZ RIOS MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 4.441.000	FIJO			SI																	
20	CC 1121911000	[illegible]	DEPEND		$ 1.193.000	FIJO			SI									X								
21	CC 1121914472	RAYO RAMIREZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.656.800	FIJO			SI									X								
22	CC 1121915725	RUIZ SANDOVAL ARQUIMEDES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									X								
23	CC 1121921847	DUQUE ACEVEDO JOHAN MANUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X								
24	CC 1121932244	GARCIA OCHOA JOSE ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	
25	CC 1121932225	SALAZAR VALENZUELA SIRLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	
26	CC 1121936748	VELEZ RIOS JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	
27	CC 1121950848	MORENO ORTEGA JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.311.000	FIJO			SI		30							X								
28	CC 1122145385	CHISABA GAMBOA LEYDER ESTIVEN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X								
29	CC 11290202	AMAYA EDILBERTO	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO			SI									X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.176.938	$ 348.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 348.200
10	230201-PROTECCION	24	$ 841.667	$ 134.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.700
11	230301-PORVENIR	25	$ 1.167.292	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800
12	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
13	230201-PROTECCION	30	$ 1.299.040	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 207.900
14	230301-PORVENIR	30	$ 2.528.828	$ 404.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.600
15	230201-PROTECCION	17	$ 410.417	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.700
16	230301-PORVENIR	30	$ 1.480.208	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 236.900
17	230301-PORVENIR	30	$ 1.080.729	$ 173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.000
18	230301-PORVENIR	17	$ 405.208	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.900
19	230201-PROTECCION	30	$ 4.441.600	$ 710.600	$ 22.300	$ 22.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 755.200
20	230301-PORVENIR	30	$ 1.442.104	$ 230.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.800
21	230201-PROTECCION	30	$ 1.856.800	$ 297.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.100
22	231001-COLFONDOS	30	$ 1.632.604	$ 261.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.300
23	230301-PORVENIR	30	$ 1.185.937	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800
24	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
25	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
26	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
27	230301-PORVENIR	30	$ 1.509.015	$ 241.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.500
28	230301-PORVENIR	30	$ 1.227.188	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.400
29	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.493.438	$ 239.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
9	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.176.938	$ 87.100	$ 0	$ 87.100
10	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 841.667	$ 33.700	$ 0	$ 33.700
11	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.167.292	$ 46.700	$ 0	$ 46.700
12	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000
13	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.299.040	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
14	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.528.828	$ 101.200	$ 0	$ 101.200
15	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	17	$ 410.417	$ 16.500	$ 0	$ 16.500
16	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.480.208	$ 59.300	$ 0	$ 59.300
17	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.080.729	$ 43.300	$ 0	$ 43.300
18	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 405.208	$ 16.300	$ 0	$ 16.300
19	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.441.600	$ 177.700	$ 0	$ 177.700
20	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.442.104	$ 57.700	$ 0	$ 57.700
21	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.856.800	$ 74.300	$ 0	$ 74.300
22	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.632.604	$ 65.400	$ 0	$ 65.400
23	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.185.937	$ 47.500	$ 0	$ 47.500
24	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
25	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
26	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
27	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.509.015	$ 60.400	$ 0	$ 60.400
28	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.227.188	$ 49.100	$ 0	$ 49.100
29	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.493.438	$ 59.800	$ 0	$ 59.800

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.176.938	1	$ 151.500
10	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 841.667	1	$ 58.500
11	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 1.167.292	1	$ 81.300
12	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000	1	$ 153.200
13	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.299.040	1	$ 90.500
14	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.528.828	1	$ 176.000
15	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 410.417	1	$ 28.500
16	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.480.208	1	$ 103.100
17	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.080.729	1	$ 75.300
18	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	17	$ 405.208	1	$ 28.300
19	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.441.600	1	$ 309.100
20	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.442.104	1	$ 100.400
21	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.856.800	1	$ 129.300
22	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.632.604	1	$ 113.700
23	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.185.937	1	$ 82.600
24	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 104.400
25	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 69.500
26	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000	1	$ 111.400
27	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.509.015	1	$ 105.100
28	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.227.188	1	$ 85.500
29	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.493.438	1	$ 104.000

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	30	$ 2.176.938	CCF34-COFREM META	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	24	$ 841.667	CCF34-COFREM META	$ 33.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25	$ 1.167.292	CCF34-COFREM META	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 2.200.000	CCF34-COFREM META	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.299.040	CCF34-COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 2.528.828	CCF34-COFREM META	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	12	$ 410.417	CCF34-COFREM META	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.480.208	CCF34-COFREM META	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 1.080.729	CCF34-COFREM META	$ 43.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	17	$ 405.208	CCF34-COFREM META	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 4.441.600	CCF34-COFREM META	$ 177.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 1.442.104	CCF34-COFREM META	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 1.856.800	CCF34-COFREM META	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 1.632.604	CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	30	$ 1.185.937	CCF34-COFREM META	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	30	$ 1.600.000	CCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	30	$ 1.509.015	CCF34-COFREM META	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	30	$ 1.227.188	CCF34-COFREM META	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	30	$ 1.493.438	CCF34-COFREM META	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800079182
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELEFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulatorias y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			76371249990	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	mayo AÑO	2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1444393855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	CUERPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXONERADO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN	SAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
30	CC 1152745825	BARAJAS SANCHEZ DANIEL SANTIAGO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 1.142.709	$ 182.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.900
31	CC 1122815694	MANOSCHA ROMANILLA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									X									230301-PORVENIR	29	$ 957.813	$ 153.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.300
32	CC 1122815694	MANOSCHA ROMANILLA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI													09-19					230301-PORVENIR	4	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400
33	CC 1140751787	NOVAS ORTIZ ANA DAYANA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	M							X	X									25-14 COLPENSIONES	19	$ 884.584	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.400
34	CC 1234759139	CRATY SUAREZ KAIAN SIMON	EMPLEAD		$ 1.250.000	FIJO			SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 1.429.295	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500
35	CC 17310839	RODRIGUEZ DRUEDA JAIME	PENSIO	PENSIONADO ACT	$ 1.211.000	FIJO			SI									X											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
36	CC 17211257	CHAPARRO JOSE BERNARDO	PENSIO		$ 1.238.300	FIJO			SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.434.380	$ 229.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.500
37	CC 17529100	MADARIAGA MEDINA RAFAEL FERNANDO	DEPEND		$ 9.000.000	FIJO			SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.990.000	$ 1.598.400	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.698.400
38	CC 17344522	MATIAS FARRADO JOSE FLORBERTO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.431.157	$ 229.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.000
39	CC [illegible]	TAUTO [illegible]	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI	01							X										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000
40	CC 17345751	CONTRERAS CARRILLO JOSE BERNARDO	PENSIO	PENSIONADO ACT	$ 2.810.000	FIJO			SI									X											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
41	CC 17388708	DURODA JORGE	DEPEND		$ 2.150.000	FIJO			SI									X									230201-PROTECCION	30	$ 2.242.105	$ 358.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 358.800
42	CC 17398538	GONZALEZ MURILLO HENRY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									X									230201-PROTECCION	30	$ 1.155.730	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.000
43	CC 17421617	FUENTES RICO FREYD ALEXANDER	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000
44	CC 17555035	RICO BETANCOURT NELBERTO	DEPEND	PENSIONADO ACT	$ 1.000.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
45	CC 17619198	QUIVAY SALCEDO LUIS ALFONSO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI		27							X									230301-PORVENIR	27	$ 1.054.169	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.700
46	CC 233632	GALLO RAMIREZ OLGA MARGARITA	DEPEND		$ 1.507.000	FIJO			SI	01							X										230201-PROTECCION	30	$ 1.507.000	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200
47	CC 28830842	MOLINA HARRIS DORA MERCEDES	DEPEND		$ 1.248.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.248.000	$ 199.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 199.400
48	CC 28830100	BEJARANO GONZALEZ NOHARA PATRICIA	DEPEND		$ 1.507.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	15	$ 753.500	$ 120.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 120.600
49	CC 28830100	BEJARANO GONZALEZ NOHARA PATRICIA	DEPEND		$ 1.507.000	FIJO			SI													16-30					25-14 COLPENSIONES	15	$ 753.500	$ 120.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 120.600
50	CC 1122815694	VIVAS TANDINA HAZLLY BASILTE	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI														16-20				25-14 COLPENSIONES	3	$ 383.254	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.900

N°	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD: ADMIN	SAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	SAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	PARAFISCALES: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
30	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.142.709	$ 45.800	$ 0	$ 45.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.142.709	1	$ 79.900	30	$ 1.142.709	CCFC54-COFREM META	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 957.813	$ 38.400	$ 0	$ 38.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 957.813	1	$ 66.700	29	$ 957.813	CCFC54-COFREM META	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 133.334		$ 0	4	$ 133.334	CCFC54-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	EPS012-FAMILIAR	19	$ 884.584	$ 26.600	$ 0	$ 26.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 884.584	1	$ 46.300	19	$ 884.584	CCFC54-COFREM META	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	EPS032-SALUD TOTAL	30	$ 1.429.295	$ 56.900	$ 0	$ 56.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.429.295	1	$ 98.800	30	$ 1.429.295	CCFC54-COFREM META	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.433.906	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.433.906	1	$ 99.800	30	$ 1.433.906	CCFC54-COFREM META	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.434.380	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.434.380	1	$ 99.900	30	$ 1.434.380	CCFC54-COFREM META	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.990.000	$ 399.600	$ 0	$ 399.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 9.990.000	1	$ 693.400	30	$ 9.990.000	CCFC54-COFREM META	$ 399.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.431.157	$ 57.300	$ 0	$ 57.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.431.157	1	$ 99.700	30	$ 1.431.157	CCFC54-COFREM META	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000	1	$ 160.100	30	$ 2.300.000	CCFC54-COFREM META	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.225.391	$ 89.100	$ 0	$ 89.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.225.391	1	$ 154.900	30	$ 2.225.391	CCFC54-COFREM META	$ 89.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.242.105	$ 89.700	$ 0	$ 89.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.242.105	1	$ 156.100	30	$ 2.242.105	CCFC54-COFREM META	$ 89.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	EPS017-FAMILIAR	30	$ 1.155.730	$ 46.300	$ 0	$ 46.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.155.730	1	$ 80.500	30	$ 1.155.730	CCFC54-COFREM META	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000	1	$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCFC54-COFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCFC54-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.054.169	$ 42.200	$ 0	$ 42.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 1.054.169	1	$ 73.400	27	$ 1.054.169	CCFC54-COFREM META	$ 42.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	EPS034-COMPENSAR	30	$ 1.507.000	$ 60.300	$ 0	$ 60.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.507.000	1	$ 7.500	30	$ 1.507.000	CCFC54-COFREM META	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.248.000	$ 49.900	$ 0	$ 49.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.248.000	1	$ 6.500	30	$ 1.248.000	CCFC54-COFREM META	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 753.500	$ 30.200	$ 0	$ 30.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 753.500	1	$ 4.000	15	$ 753.500	CCFC54-COFREM META	$ 30.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 753.500	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 753.500		$ 615	15	$ 753.500	CCFC54-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 383.254	$ 13.000	$ 0	$ 13.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 383.254		$ 0	3	$ 341.142	CCFC54-COFREM META	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800078482
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EDGRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 1302	TELEFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			76371249 90	TIPO DE PLANILLA:	E-MPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2022
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACION:	1444033855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																															PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO EN COLOMBIA	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
51	CC 40232045	RUBIA CARDONA HAZLLY BRISETH	DEPEND		$ 3.992.880	FIJO			SI								X								28-14 COLPENSIONES	27	$ 3.852.801	$ 488.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 488.500	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 3.852.801	$ 133.300	$ 0	$ 133.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 3.852.801	1	$ 212.500	30	$ 3.870.292	SCCF34-1.934.000	COFREM META	$ 122.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 40304492	ORTIZ GOMEZ MYRIAM	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.507.000	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.507.000	$ 60.300	$ 0	$ 60.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.507.000	1	$ 7.500	30	$ 1.507.000	SCCF34-1.507.000	COFREM META	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 40367330	MURCIA ORTIZ BEATRIZ	DEPEND	PENSIONADO	$ 1.744.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.744.000	$ 69.800	$ 0	$ 69.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.744.000	1	$ 9.200	30	$ 1.744.000	SCCF34-1.744.000	COFREM META	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 40405729	BAQUERO HERRERA CLAUDIA LUCIA	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI																28-14 COLPENSIONES	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.600.000	1	$ 15.600	30	$ 3.600.000	SCCF34-3.600.000	COFREM META	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 41728172	ACA LUIS HERNANDO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																28-14 COLPENSIONES	22	$ 733.334	$ 117.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117.400	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 29.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 733.334	1	$ 51.100	22	$ 733.334	SCCF34-1.600.000	COFREM META	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 41729170	ACA LUIS HERNANDO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI											25-30					25-14 COLPENSIONES	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	SCCF34-0	COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 52568143	CASTILLO CHILARIO MAILEN	DEPEND		$ 1.263.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.363.000	$ 218.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 218.100	EPS034-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.363.000	$ 54.600	$ 0	$ 54.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.363.000	1	$ 7.200	30	$ 1.363.000	SCCF34-1.363.000	COFREM META	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 75064823	CUERVO BELTRAN CRISTIAN FELIPE	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS034-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.000.000	1	$ 497.200	30	$ 7.000.000	SCCF34-7.000.000	COFREM META	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 7[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.000.000	1	$ 348.000	30	$ 5.000.000	SCCF34-5.000.000	COFREM META	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 86041496	VARGAS LEON CARLOS OSWALDO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI								X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.142.904	$ 182.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.142.904	$ 45.800	$ 0	$ 45.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.142.904	1	$ 79.600	30	$ 1.142.904	SCCF34-1.142.904	COFREM META	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 86041018	[illegible] GONZALEZ ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.585.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.585.000	$ 413.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 413.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.585.000	$ 100.400	$ 0	$ 100.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.585.000	1	$ 180.500	30	$ 2.585.000	SCCF34-2.585.000	COFREM META	$ 100.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 52654672	ORTIZ SANCHEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 1.475.000	FIJO			SI								X								230201-PROTECCION	30	$ 1.754.835	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.754.835	$ 70.200	$ 0	$ 70.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.754.835	1	$ 152.200	30	$ 1.754.835	SCCF34-1.754.835	COFREM META	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 86057208	MARTINEZ TAMAYO EDUARDO	DEPEND		$ 7.851.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.851.000	$ 1.256.200	$ 58.900	$ 58.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.300.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.851.000	$ 588.100	$ 0	$ 588.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.851.000	1	$ 532.500	30	$ 7.851.000	SCCF34-7.851.000	COFREM META	$ 500.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 86870827	DIAZ RONDON JOHNNY RANULFO	DEPEND		$ 2.650.000	FIJO			SI								X								230201-PROTECCION	30	$ 2.011.933	$ 322.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.011.933	$ 80.800	$ 0	$ 80.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.011.933	1	$ 140.100	30	$ 2.011.933	SCCF34-2.011.933	COFREM META	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 86870394	AGUAS MONTES DANIEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI								X								230201-PROTECCION	30	$ 1.894.751	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.894.751	$ 75.800	$ 0	$ 75.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.894.751	1	$ 131.900	30	$ 1.894.751	SCCF34-1.894.751	COFREM META	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 86879388	VELEZ RIOS JULIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.345.500	FIJO			SI								X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.315.508	$ 210.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.315.508	$ 52.700	$ 0	$ 52.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.315.508	1	$ 91.600	30	$ 1.315.508	SCCF34-1.315.508	COFREM META	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 86879470	AVENDAÑO PALACIOS FERNANDO	DEPEND		$ 1.911.500	FIJO			SI								X								230301-PROTECCION	30	$ 1.859.844	$ 295.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.859.844	$ 68.400	$ 0	$ 68.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.859.844	1	$ 115.800	30	$ 1.859.844	SCCF34-1.859.844	COFREM META	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 86879598	ZAPATA BAENA JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI								X								230201-PROTECCION	30	$ 1.163.125	$ 184.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.163.125	$ 46.200	$ 0	$ 46.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.163.125	1	$ 80.300	30	$ 1.163.125	SCCF34	COFREM META	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 86886246	HENAO TORO JOHNNY ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000	1	$ 149.000	30	$ 2.140.000	SCCF34-2.140.000	COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 86886918	HERNANDEZ CLAVIJO OSCAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI								X								230301-PORVENIR	30	$ 1.787.031	$ 286.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 286.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.787.031	$ 71.500	$ 0	$ 71.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.787.031	1	$ 124.400	30	$ 1.787.031	SCCF34-1.787.031	COFREM META	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800379482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 70 OFICINA 13 02	TELEFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7837124990	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1444333855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 86254266	SANDAMIL GIRALDO JHON EDIER	DEPEND		$ 1.110.000	FIJO		SI									X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PSP SUBSISTENCIA	PSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.285.750	$ 205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR UPC ADIC	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.285.750	$ 51.500	$ 0	$ 51.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.285.750	1	$ 69.500

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.285.750	CCF34-COFREM META	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 38.236.500

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288905
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 N. 38 - 79 DF 1902 ED ROMARCO	TELÉFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B.MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7636029072	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	mayo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1438085801

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
252201	252201- PROTECCION	5	$ 1.000.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.500	$ 0	$ 1.068.500
252301	252301-PORVENIR	28	$ 5.040.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.041.900	$ 0	$ 5.041.900
251001	251001-COLFONDOS	2	$ 672.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.760	$ 0	$ 672.760
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 3.455.600	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 3.455.600	$ 0	$ 3.455.600
SUBTOTALES:										**$ 10.238.760**	**$ 0**	**$ 10.238.760**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.900	$ 0	$ 0	$ 205.900
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.800	$ 0	$ 0	$ 291.800
EPS010	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 281.000
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.104.400	$ 0	$ 0	$ 1.104.400
EPS008	EPS008 COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400	$ 0	$ 0	$ 132.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 153.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.900	$ 0	$ 0	$ 153.900
EPS034	EPS034 CAPITAL SALUD EPSS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 225.800
EPS017	EPS017 FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.800	$ 0	$ 0	$ 137.800
SUBTOTALES:													**$ 2.532.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.532.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	44		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.202.600	$ 4.202.600	$ 0	$ 0	$ 4.202.600
SUBTOTALES:									**$ 4.202.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.202.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	44	$ 2.494.000	$ 0	$ 2.494.000
SUBTOTALES:			**$ 2.494.000**	**$ 0**	**$ 2.494.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
NR	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	TERCERA TRIBUTARIA	IVS	RET	TDE	TAE	TSP	TDP	ESP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	SALUD TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	ARP TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1036725357	GONZALEZ CUBIDES DIEGO DAMIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.125.521	$ 180.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.125.521	$ 45.100	$ 0	$ 45.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.125.521		$ 78.400	30	$ 1.125.521	CCF34-COFREM META	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036748310	ENGISO MORALES PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230501-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1036795560	PERILLA OCAMPO RONALD KEVIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.062.500	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.000	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.062.500	$ 42.500	$ 0	$ 42.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.062.500		$ 74.000	30	$ 1.062.500	CCF34-COFREM META	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1018151494	DOMEZ OYUSO RATTON CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.023.437	$ 163.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.023.437	$ 41.000	$ 0	$ 41.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.023.437		$ 71.300	30	$ 1.023.437	CCF34-COFREM META	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1036283911	RADA MURILLO JONATHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.169.271	$ 187.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.169.271	$ 46.800	$ 0	$ 46.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.169.271		$ 81.400	30	$ 1.169.271	CCF34-COFREM META	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1032421805	LASSO CONDE LAURA KATHERINE	DEPEND		$ 950.000	FIJO		SI	30																230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 33.334		$ 2.400	1	$ 31.867	CCF34-COFREM META	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1032421805	LASSO CONDE LAURA KATHERINE	DEPEND		$ 950.000	FIJO		SI													01-29				230301-PORVENIR	29	$ 988.867	$ 151.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.700	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 988.867	$ 38.700	$ 0	$ 38.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 988.867		$ 829	29	$ 988.867	CCF34-COFREM META	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1129519599	CARABALLO BEJARANO WITNER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.019.229	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.000	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.019.229	$ 40.800	$ 0	$ 40.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.019.229		$ 70.900	30	$ 1.019.229	CCF34-COFREM META	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901289805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO EGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA. 32 N. 36 - 70 OF 1302 ED ROMARCO	TELÉFONO:	9715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7636029072	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1438085601

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / PENSIÓN

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN
9	CC 1112490217	BALANTA CARABALI KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.023.441	$ 163.800
10	CC 1120925798	BUSTOS VILLALOBOS YUDI YOLANDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.157.612	$ 185.300
11	CC 1121836124	ROJAS AGUILAR FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.307.291	$ 209.200
12	CC 1121858782	SALAZAR CONTRERAS SHIRLEY XIOMARA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000
13	CC 1121868257	JIMENEZ MUÑOZ JHON FREDY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		07							01-07								230301-PORVENIR	7	$ 254.167	$ 40.700
14	CC 1121871111	GARCIA VARGAS LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		03							01-03								230301-PORVENIR	3	$ 110.416	$ 17.700
15	CC 1121872429	BERMUDEZ VELASQUEZ DIEGO FERLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.588.541	$ 254.200
16	CC 1121882054	FRANCO ORDUÑA NICOLAS	DEPEND		$ 4.280.000	FIJO			SI																	25-14-COLPENSIONES	30	$ 4.280.000	$ 684.800
17	CC 1121887241	DIAZ ARANGO WILDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		04															230301-PORVENIR	4	$ 133.334	$ 21.400
18	CC 1121888335	HERREÑO PARRA ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.388.458	$ 221.900
19	CC 1121890550	GUTIERREZ MARTINEZ LAURA FERNANDA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.354.000	$ 376.700
20	CC 1121897546	RAMOS REYES JOSE ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.085.937	$ 173.800
21	CC 1121908290	MENDEZ GONZALEZ DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.218.750	$ 195.000
22	CC 1121934855	HINCAPIE ARDILA SARA MARIA	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700
23	CC 1121944733	ALZATE ROMERO JOSE LUIS	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.354.000	$ 376.700
24	CC 1121953051	VIVARA ZAMORA HUVER ALEXI	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		05							01-05								230301-PORVENIR	5	$ 195.313	$ 31.300
25	CC 1122129824	SOTO ALVARADO JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.850.000	$ 296.000
26	CC 1122133400	MOLINA BELTRAN ELKIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.606.353	$ 257.100
27	CC 1122142895	PEREZ REY JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.354.000	$ 376.700
28	CC 1122513391	MENDEZ MENDEZ ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000
29	CC 1125287874	PERILLA CEPEDA FRANKLIN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.364.375	$ 218.300

SEGURIDAD SOCIAL (PENSIÓN, continuación / SALUD / ARP) – PARAFISCALES

Nº	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.023.441	$ 41.000	$ 0	$ 41.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.023.441		$ 71.300	30	$ 1.023.441	CCF34-COFREM META	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.300	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.157.612	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.157.612		$ 80.800	30	$ 1.157.612	CCF34-COFREM META	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.307.291	$ 52.300	$ 0	$ 52.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.307.291		$ 91.000	30	$ 1.307.291	CCF34-COFREM META	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.700	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 254.167	$ 10.200	$ 0	$ 10.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 254.167		$ 17.700	7	$ 254.167	CCF34-COFREM META	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.700	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 110.416	$ 4.500	$ 0	$ 4.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 110.416		$ 7.700	3	$ 110.416	CCF34-COFREM META	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.200	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.588.541	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.588.541		$ 110.600	30	$ 1.588.541	CCF34-COFREM META	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 727.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.280.000	$ 171.200	$ 0	$ 171.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.280.000		$ 297.900	30	$ 4.280.000	CCF34-COFREM META	$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 133.334		$ 9.300	4	$ 133.334	CCF34-COFREM META	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.388.458	$ 55.500	$ 0	$ 55.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.388.458		$ 96.500	30	$ 1.388.458	CCF34-COFREM META	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.085.937	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.085.937		$ 75.600	30	$ 1.085.937	CCF34-COFREM META	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.218.750	$ 48.800	$ 0	$ 48.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.218.750		$ 84.900	30	$ 1.218.750	CCF34-COFREM META	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31.300	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	5	$ 195.313	$ 7.900	$ 0	$ 7.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 195.313		$ 13.600	5	$ 195.313	CCF34-COFREM META	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.850.000		$ 128.800	30	$ 1.850.000	CCF34-COFREM META	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.606.353	$ 64.300	$ 0	$ 64.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.606.353		$ 111.900	30	$ 1.606.353	CCF34-COFREM META	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.354.000	$ 94.200	$ 0	$ 94.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.354.000		$ 163.900	30	$ 2.354.000	CCF34-COFREM META	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 218.300	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.364.375	$ 54.600	$ 0	$ 54.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.364.375		$ 95.000	30	$ 1.364.375	CCF34-COFREM META	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO RGC
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 N. 38 - 70 OF 1002 ED ROMARIO	TELEFONO:	6715100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7836029072	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	mayo AÑO	2022
DIAS DE MORA:		a					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1438858601

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														PILA																																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
30	CC 91323514	MARTINEZ CAMPO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	05															25-14 COLPENSIONES	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 11.700	5	$ 166.667	SCCF34-COFREM META	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1234719033	BETANCOURT MENDEZ LADY CAROLINA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.126.562	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.126.562	$ 45.100	$ 0	$ 45.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.126.562		$ 26.500	30	$ 1.126.562	SCCF34-COFREM META	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1234756250	LEON REYES JUAN MANUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	05															230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 166.667		$ 11.700	5	$ 166.667	SCCF34-COFREM META	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1438857581	NIETO TRIANA JOSE WILSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.167.187	$ 166.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.167.187	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.167.187		$ 81.300	30	$ 1.167.187	SCCF34-COFREM META	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 12411738	HORTUA RODRIGUEZ FERNAN AUGUSTO	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000	30	$ 2.140.000	SCCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 26246052	CUESTAS MANRIQUE MYRIAM	DEPEND		$ 1.038.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.057.291	$ 169.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 169.200	EPS034-CAPITAL SALUD EPS S	30	$ 1.057.291	$ 42.300	$ 0	$ 42.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.057.291		$ 73.600	30	$ 1.057.291	SCCF34-COFREM META	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 40189623	CRUZ ARCINIEGAS ALBA YANETH	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.400	EPS010-COMPENSAR	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.140.000		$ 149.000	30	$ 2.140.000	SCCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 46033677	MENDOZA MUÑOZ JENY MARCELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.039.062	$ 166.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.300	CCF055-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.039.062	$ 41.600	$ 0	$ 41.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.039.062		$ 72.400	30	$ 1.039.062	SCCF34-COFREM META	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 41057700	PLAZA LAPORTE OMAR ERNESTO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI								01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.425.521	$ 228.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.100	EPS002 SALUD TOTAL	30	$ 1.425.521	$ 57.100	$ 0	$ 57.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.425.521		$ 99.300	30	$ 1.425.521	SCCF34-COFREM META	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 75093693	CORREA LARGO VICTOR JULIAN	DEPEND		$ 4.800.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	19	$ 5.088.667	$ 810.700	$ 25.400	$ 25.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 861.500	03A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	19	$ 5.088.667	$ 202.700	$ 0	$ 202.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 5.088.667		$ 352.700	19	$ 5.088.667	SCCF34-COFREM META	$ 202.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 75093693	CORREA LARGO VICTOR JULIAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI												01-11				25-14 COLPENSIONES	11	$ 1.955.557	$ 312.900	$ 9.800	$ 9.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.500	03A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	11	$ 1.955.557	$ 78.300	$ 0	$ 78.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	11	$ 1.955.557		$ 135.900	11	$ 1.955.557	SCCF34-COFREM META	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 75090722	ROMERO ALDANA IVAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.041.666	$ 166.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.041.666	$ 41.700	$ 0	$ 41.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.041.666		$ 72.500	30	$ 1.041.666	SCCF34-COFREM META	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 26252004	AGUIRRE PINA OMAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.026.042	$ 164.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.026.042	$ 41.100	$ 0	$ 41.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.026.042		$ 71.500	30	$ 1.026.042	SCCF34-COFREM META	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 86058770	MORALES HERNANDEZ DIEGO	DEPEND		$ 1.254.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.838.437	$ 282.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.838.437	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.838.437		$ 114.100	30	$ 1.838.437	SCCF34-COFREM META	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 86036425	VILLADA RAMIREZ JAVIER ALEJO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.447.396	$ 231.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 231.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.447.396	$ 57.900	$ 0	$ 57.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.447.396		$ 100.800	30	$ 1.447.396	SCCF34-COFREM META	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 86078109	SILVESTRE HIRAVAN YESID ALEXANDER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.371.094	$ 219.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.371.094	$ 54.900	$ 0	$ 54.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.371.094		$ 95.500	30	$ 1.371.094	SCCF34-COFREM META	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 87111355	GUTIERREZ CABALLOS JAIRO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI								01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.421.875	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.421.875	$ 56.900	$ 0	$ 56.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.421.875		$ 99.000	30	$ 1.421.875	SCCF34-COFREM META	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 19.468.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9801072-5	CUBILLOS GONZALEZ RAFAEL MAURICIO	MANZ 14 CASA 21 REMANSOS DE ROSA [illegible]	3134991561	groupcapitalempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CHARRASCAL	CHARRASCAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2022-05	2022-04	E	04/05/2022	59683257	TOTAL A PAGAR	
					$1.238.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	278.400				278.400	0	0	278.400			2.784	278.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	160.000	0	0	160.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	160.000	160.000
Pensión	3	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	278.400	278.400
CCF	1	160.000	160.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.238.400	1.238.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9001072-0	CUBILLOS GONZALEZ RAFAEL MAURICIO		MANZ 14 CASA 21 REMANSOS DE ROSA BLANCA	3134991591	groupcapitalempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CHARRASCAL	CHARRASCAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	04/05/2022	58683257	$1.236.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de mora	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121858465	ZARATE LEON GHELMUR	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	60.900	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1121878409	ARDILA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	1	0			S																23020I	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	60.900	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1121940179	HINCAPIE BARRETO DANIEL FELIPE	1	0			S																23030I	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	60.900	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	17357122	SANABRIA RODRIGUEZ GERMAN	1	0			S																23053I	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	60.900	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 11:20:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057656466

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

PAGADO 19/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA		
Documento	CC1049608025	**Dirección**	CL 10 #26 A - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6603242
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte MINA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1049608025	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 125.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600	$ 160.500	$ 515.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
