ACTA PARCIAL DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO CARVI

OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

CONTRATO No.	12-OBR009 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	27 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 1,889,339,990.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CARVI	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR ADICIONAL**	$ -
REPRESENTANTE LEGAL	ALBA VIVIANA TORRES USECHE	**PLAZO INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	**VALOR TOTAL**	$ 1,889,339,990.00
INTERVENTOR	CONSORCIO JR	**PLAZO ADICIONAL**	4 MESES	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 815,404,340.87
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA RUIZ PEREZ	**PLAZO FINAL**	30 DE ABRIL DE 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 1**	
SUPERVISOR	HERMES TOVAR CUELLAR	**FECHA DEL ACTA**	21 DE FEBRERO DE 2025		

I. OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE- ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 1		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**										
	PRELIMINARES										
1.1	Ajustes de diseño , memorias de cantidades y balance	M2	1012.4	$ 10,972.00	$ 11,107,504.20	1514.68	$ 16,619,119.43	1514.68	$ 16,619,119.43	1,514.68	**$ 16,619,119.43**
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	20	$ 17,875.00	$ 357,500.00	20.00	$ 357,500.00	20.00	$ 357,500.00	20.00	**$ 357,500.00**
	DESMONTES Y DEMOLICIONES										
1.3	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	15	$ 42,402.00	$ 636,030.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.4	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	15	$ 23,750.00	$ 356,250.00	14.36	$ 341,145.00	14.36	$ 341,145.00	14.36	**$ 341,145.00**
1.5	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	300	$ 23,725.00	$ 7,117,500.00	430.98	$ 10,225,104.89	430.98	$ 10,225,104.89	430.98	**$ 10,225,104.89**
1.6	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	6	$ 48,140.00	$ 288,840.00	11.00	$ 529,540.00	11.00	$ 529,540.00	11.00	**$ 529,540.00**
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	66	$ 38,716.00	$ 2,555,256.00	24.00	$ 929,184.00	24.00	$ 929,184.00	24.00	**$ 929,184.00**
1.8	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1	$ 61,453.00	$ 61,453.00	57.00	$ 3,502,821.00	57.00	$ 3,502,821.00	57.00	**$ 3,502,821.00**
1.9	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	140	$ 40,227.00	$ 5,631,780.00	280.26	$ 11,273,858.11	280.26	$ 11,273,858.11	280.26	**$ 11,273,858.11**
1.10	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	195	$ 39,432.00	$ 7,689,240.00	269.00	$ 10,607,208.00	269.00	$ 10,607,208.00	269.00	**$ 10,607,208.00**
1.11	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	120	$ 24,874.00	$ 2,984,880.00	89.96	$ 2,237,665.04	89.96	$ 2,237,665.04	89.96	**$ 2,237,665.04**
1.12	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	500	$ 7,634.00	$ 3,817,000.00	385.93	$ 2,946,189.62	385.93	$ 2,946,189.62	385.93	**$ 2,946,189.62**
1.13	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	120	$ 16,200.00	$ 1,944,000.00	401.00	$ 6,496,200.00	401.00	$ 6,496,200.00	401.00	**$ 6,496,200.00**
1.14	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	2500	$ 1,908.00	$ 4,770,000.00	3931.00	$ 7,500,348.00	3931.00	$ 7,500,348.00	3,931	**$ 7,500,348.00**
1.15	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN	2	$ 159,764.00	$ 319,528.00	6.00	$ 958,584.00	6.00	$ 958,584.00	6.00	**$ 958,584.00**
1.16	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	8	$ 14,090.00	$ 112,720.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.17	Desmonte de Cielo Raso.	M2	1,012	$ 26,222.00	$ 26,545,841.70	1047.03	$ 27,455,126.26	1047.03	$ 27,455,126.26	1,047.03	**$ 27,455,126.26**
1.18	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1	$ 314,766.00	$ 314,766.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.19	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	350	$ 32,753.00	$ 11,463,550.00	649.53	$ 21,274,056.09	649.53	$ 21,274,056.09	649.53	**$ 21,274,056.09**
1.20	Demolición de pañetes.	M2	50	$ 8,810.00	$ 440,500.00	47.64	$ 419,739.24	47.64	$ 419,739.24	47.64	**$ 419,739.24**
1.21	Demolición mortero de pisos e=+-5cm.	M2	55	$ 9,757.00	$ 540,928.08		$ -	0.00	$ -		$ -
1.22	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposición final)	UN	1	$ 51,962.00	$ 51,962.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.23	Demolición de enchapes Piso/Muro.	M2	66	$ 26,676.00	$ 1,772,353.44	1380.79	$ 36,834,079.42	1380.79	$ 36,834,079.42	1,380.79	**$ 36,834,079.42**
1.24	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla.	M2	50	$ 12,587.00	$ 629,350.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.25	Demolición de guarda escoba.	ML	850	$ 5,488.00	$ 4,664,800.00	148.08	$ 812,663.04	148.08	$ 812,663.04	148.08	**$ 812,663.04**
1.26	Demolición Mesón en concreto.	M2	50	$ 29,884.00	$ 1,494,200.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.27	Demolición de mesón en mármol.	ML	1	$ 24,659.00	$ 24,659.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.28	Demolición de Dinteles en concreto.	ML	70	$ 20,430.00	$ 1,430,100.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.29	Demolición muros en mampostería e=15cm.	M2	307.68	$ 42,619.00	$ 13,113,013.92	56.77	$ 2,419,651.11	56.77	$ 2,419,651.11	56.77	**$ 2,419,651.11**
1.30	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm.	M2	1	$ 54,250.00	$ 54,250.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.31	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm.	M2	1	$ 76,751.00	$ 76,751.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.32	Demolición de muro en fibrocemento.	M2	1	$ 36,342.00	$ 36,342.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.33	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)	M2	250	$ 32,897.00	$ 8,224,250.00	294.73	$ 9,695,880.85	294.73	$ 9,695,880.85	294.73	**$ 9,695,880.85**
1.34	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado.	ML	1	$ 22,666.00	$ 22,666.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.35	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, equipos, trasiego y disposición final)	UN	1	$ 284,890.00	$ 284,890.00		$ -	0.00	$ -		$ -
1.36	Trasiego, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.	M3	136.06	$ 157,410.00	$ 21,416,942.04	139.98	$ 22,034,454.58	139.98	$ 22,034,454.58	139.98	**$ 22,034,454.58**
2	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**										
2.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	653.18	$ 137,904.00	$ 90,076,686.34	652.06	$ 89,921,130.62	602.00	$ 83,018,208.00	602.00	**$ 83,018,208.00**
2.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	1	$ 70,997.00	$ 70,997.00		$ -		$ -		$ -
2.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	1	$ 78,711.00	$ 78,711.00		$ -		$ -		$ -
2.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	1	$ 153,398.00	$ 153,398.00		$ -		$ -		$ -
2.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	1	$ 72,684.00	$ 72,684.00		$ -		$ -		$ -
2.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, con acabado pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	1	$ 86,902.00	$ 86,902.00		$ -		$ -		$ -
2.7	Aislamiento acústico interior tipo frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1	$ 25,600.00	$ 25,600.00		$ -		$ -		$ -
3	**ALISTADO DE PISOS**										
3.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	11	$ 48,307.00	$ 531,860.07	314.61	$ 15,197,961.88	314.61	$ 15,197,961.88	314.61	**$ 15,197,961.88**
4	**PAÑETES**										
4.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	55	$ 38,635.00	$ 2,124,925.00	47.64	$ 1,840,706.62	47.64	$ 1,840,706.62	47.64	**$ 1,840,706.62**
4.2	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	250	$ 42,398.00	$ 10,599,500.00		$ -		$ -		$ -
4.3	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	250	$ 32,244.00	$ 8,061,000.00		$ -		$ -		$ -
5	**CIELO RASOS**										
5.1	Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería)	M2	1,012	$ 94,417.00	$ 95,583,049.95		$ -		$ -		$ -
5.2	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	20	$ 58,313.00	$ 1,166,260.00		$ -		$ -		$ -
5.3	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	6	$ 252,134.00	$ 1,512,804.00		$ -		$ -		$ -
6	**ESTUCO Y PINTURA**										
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	50	$ 25,379.00	$ 1,268,950.00	1404.17	$ 35,636,328.91	1145.50	$ 29,071,644.50	1,145.50	**$ 29,071,644.50**
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	50	$ 28,893.00	$ 1,444,650.00	2008.53	$ 58,032,457.29	1456.00	$ 42,068,208.00	1,456.00	**$ 42,068,208.00**
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**										
7.1	Suministro e instalación de piso SPC de click	M2	1,012	$ 161,585.00	$ 163,580,574.75		$ -		$ -		$ -
7.2	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida,cristalizada y brillada necesarios)	M2	102	$ 213,064.00	$ 21,636,649.20		$ -		$ -		$ -
7.3	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1	$ 36,127.00	$ 36,127.00		$ -		$ -		$ -
7.4	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML	26	$ 35,503.00	$ 923,078.00		$ -		$ -		$ -
7.5	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML	1	$ 50,002.00	$ 50,002.00		$ -		$ -		$ -
7.6	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	1	$ 24,332.00	$ 24,332.00		$ -		$ -		$ -
7.7	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	1	$ 106,312.00	$ 106,312.00		$ -		$ -		$ -
7.8	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1	$ 30,760.00	$ 30,760.00		$ -		$ -		$ -
7.9	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	50	$ 87,112.00	$ 4,355,600.00		$ -		$ -		$ -
7.10	Piso en cerámica Pizarra madera tangerine blanco 30.5x60 o similar	M2	1	$ 88,273.00	$ 88,273.00		$ -		$ -		$ -
7.11	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	1	$ 20,816.00	$ 20,816.00		$ -		$ -		$ -
7.12	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	1	$ 113,671.00	$ 113,671.00		$ -		$ -		$ -
7.13	Piso en porcelanato sellado 56x56 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	1	$ 95,628.00	$ 95,628.00		$ -		$ -		$ -
7.14	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	1	$ 37,822.00	$ 37,822.00		$ -		$ -		$ -
7.15	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1	$ 39,040.00	$ 39,040.00		$ -		$ -		$ -
7.16	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	55	$ 122,310.00	$ 6,780,866.40	47.64	$ 5,827,276.49		$ -		$ -
7.17	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	ML	10	$ 94,914.00	$ 949,140.00		$ -		$ -		$ -
7.18	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	4	$ 772,397.00	$ 3,089,588.00	2.20	$ 1,699,273.40		$ -		$ -
7.19	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	4	$ 487,126.00	$ 1,948,504.00		$ -		$ -		$ -
7.20	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 193,103.00	$ 1,158,618.00		$ -		$ -		$ -
7.21	Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)	UN	46	$ 17,768.00	$ 817,328.00	48.00	$ 852,864.00		$ -		$ -
8	**CARPINTERIA MADERA**										
8.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	1	$ 382,468.00	$ 382,468.00	14.00	$ 5,354,552.00		$ -		$ -

8.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	1	$ 759,627.00	$ 759,627.00		$ -		$ -		$ -
8.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	1	$ 857,861.00	$ 857,861.00		$ -		$ -		$ -
8.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	4	$ 1,093,084.00	$ 4,372,336.00		$ -		$ -		$ -
8.5	Mueble en madera tipo cocina. (bajo y alto). h=0,80 - 0,60m ancho=0,60 - 0,30 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	13.62	$ 1,722,849.00	$ 23,465,203.38		$ -		$ -		$ -
8.6	Suministro e instalación Puerta en madera entamborada. Incluye marco y montante en vidrio crudo.	M2	1	$ 412,577.00	$ 412,577.00		$ -		$ -		$ -
9	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**										
	CERRADURAS										
9.1	Cerradura de manija para oficinas Ref. Fixser o equivalente (Suministro e instalación)	UN	46	$ 150,965.00	$ 6,944,390.00		$ -		$ -		$ -
9.2	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	8	$ 124,922.00	$ 999,376.00	12.00	$ 1,499,064.00		$ -		$ -
9.3	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e instalación)	UN	18	$ 430,076.00	$ 7,741,368.00		$ -		$ -		$ -
	VIDRIOS Y ESPEJOS										
9.4	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UN	18	$ 1,507,129.00	$ 27,128,322.00	47.00	$ 70,835,063.00		$ -		$ -
9.5	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro e instalación. Incluye bisagra de piso, cerradura y manija de acero inoxidable)	UN	18	$ 2,888,827.00	$ 51,998,886.00		$ -		$ -		$ -
9.6	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	155	$ 796,975.00	$ 123,531,125.00	98.84	$ 78,774,602.95		$ -		$ -
9.7	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	78	$ 64,515.00	$ 5,032,170.00	307.31	$ 19,825,911.11		$ -		$ -
9.8	Suministro e instalación de espejo flotante espesor 4 mm Biselado	M2	25.2	$ 403,287.00	$ 10,162,832.40		$ -		$ -		$ -
10	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
10.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1	$ 64,781.00	$ 64,781.00		$ -		$ -		$ -
10.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1	$ 41,904.00	$ 41,904.00		$ -		$ -		$ -
10.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1	$ 51,447.00	$ 51,447.00		$ -		$ -		$ -
10.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1	$ 12,513.00	$ 12,513.00		$ -		$ -		$ -
10.5	Sanitario institucional antivandalico blanco de fluxómetro. Incluye válvula de descarga y asiento abierto (Suministro e instalación)	UN	6	$ 1,967,742.00	$ 11,806,452.00		$ -		$ -		$ -
10.6	Lavamanos institucional de colgar blanco (Suministro e instalación)	UN	6	$ 686,181.00	$ 4,117,086.00		$ -		$ -		$ -
10.7	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 27,401.00	$ 164,406.00	2.00	$ 54,802.00		$ -		$ -
10.8	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 39,489.00	$ 236,934.00		$ -		$ -		$ -
10.9	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	6	$ 32,187.00	$ 193,122.00	1.00	$ 32,187.00		$ -		$ -
10.10	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	1	$ 39,454.00	$ 39,454.00		$ -		$ -		$ -
10.11	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1	$ 47,175.00	$ 47,175.00		$ -		$ -		$ -
10.12	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 668,245.00	$ 4,009,470.00	4.00	$ 2,672,980.00		$ -		$ -
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
11.1	Punto hidráulico PVCP 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	6	$ 38,169.00	$ 229,014.00		$ -		$ -		$ -
11.2	Punto hidráulico para Lavamanos con válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	6	$ 77,816.00	$ 466,896.00		$ -		$ -		$ -
11.3	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	2	$ 43,617.00	$ 87,234.00		$ -		$ -		$ -
11.4	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	2	$ 39,852.00	$ 79,704.00		$ -		$ -		$ -
11.5	Punto hidráulico A.F. PVCP 3/4". Desde el codo en piso hasta la salida del muro. Incluye tuberia, accesorios y recamara en HG.	UN	6	$ 109,724.00	$ 658,344.00		$ -		$ -		$ -
11.6	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1	$ 73,997.00	$ 73,997.00		$ -		$ -		$ -
12	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
12.1	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 28,135.00	$ 703,375.00		$ -		$ -		$ -
12.2	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 48,046.00	$ 1,201,150.00		$ -		$ -		$ -
12.3	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 65,217.00	$ 1,630,425.00		$ -		$ -		$ -
12.4	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 147,308.00	$ 3,682,700.00		$ -		$ -		$ -
12.5	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ml	25	$ 96,391.00	$ 2,409,775.00		$ -		$ -		$ -
12.6	Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación)	ML	25	$ 23,226.00	$ 580,650.00		$ -		$ -		$ -
12.7	Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación)	ML	25	$ 33,804.00	$ 845,100.00		$ -		$ -		$ -
12.8	Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación)	ML	25	$ 48,494.00	$ 1,212,350.00		$ -		$ -		$ -
12.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	25	$ 10,491.00	$ 262,275.00		$ -		$ -		$ -
12.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	25	$ 20,634.00	$ 515,850.00		$ -		$ -		$ -
12.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	25	$ 37,064.00	$ 926,600.00		$ -		$ -		$ -
12.12	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	6	$ 52,943.00	$ 317,658.00		$ -		$ -		$ -
12.13	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	2	$ 74,931.00	$ 149,862.00		$ -		$ -		$ -
12.14	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	6	$ 102,616.00	$ 615,696.00		$ -		$ -		$ -
12.15	Salida sanitaria para lavamanos	UN	6	$ 110,358.00	$ 662,148.00		$ -		$ -		$ -
12.16	Salida sanitaria para sanitario	UN	6	$ 155,377.00	$ 932,262.00		$ -		$ -		$ -
12.17	Salida sanitaria para orinal	UN	2	$ 113,317.00	$ 226,634.00		$ -		$ -		$ -
12.18	Salida sanitaria para poceta aseo	UN	2	$ 110,358.00	$ 220,716.00		$ -		$ -		$ -
12.19	Salida sanitaria para lavaplatos	UN	2	$ 110,358.00	$ 220,716.00		$ -		$ -		$ -
12.20	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	6	$ 79,981.00	$ 479,886.00		$ -		$ -		$ -
12.21	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	6	$ 90,045.00	$ 540,270.00		$ -		$ -		$ -
12.22	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	6	$ 93,695.00	$ 562,170.00		$ -		$ -		$ -
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
	SALIDAS INTERRUPTORES										
13,1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería , cable, aparato, accesorios 3m)	UN	55	$ 100,214.00	$ 5,511,770.00	59.00	$ 5,912,626.00		$ -		$ -
13,2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	5	$ 104,490.00	$ 522,450.00	3.00	$ 313,470.00		$ -		$ -
13,3	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1	$ 174,260.00	$ 174,260.00		$ -		$ -		$ -
	SALIDAS TOMAS										
13,4	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	37	$ 166,397.00	$ 6,156,689.00		$ -		$ -		$ -
13,5	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	2	$ 138,959.00	$ 277,918.00	50.00	$ 6,947,950.00		$ -		$ -
13,6	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, canaleta, cable, toma, accesorios 3m)	UN	146	$ 149,469.00	$ 21,822,474.00	132.00	$ 19,729,908.00		$ -		$ -
13,7	Salida toma doble PT GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	6	$ 213,929.00	$ 1,283,574.00	7.00	$ 1,497,503.00		$ -		$ -
13,8	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	146	$ 166,246.00	$ 24,271,916.00	121.00	$ 20,115,766.00		$ -		$ -
13,9	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	155	$ 154,496.00	$ 23,946,880.00	351.00	$ 54,228,096.00		$ -		$ -
13,10	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	8	$ 92,121.00	$ 736,968.00	30.00	$ 2,763,630.00		$ -		$ -
13,11	Suministro e Instalacion de UPS On Line Trifasica de 20 KVA con autonomia a plena carga de 5 Minutos	UN	2	$ 20,988,000.00	$ 41,976,000.00	2.00	$ 41,976,000.00		$ -		$ -
13,12	Suministro e Instalacion de Transferencia Manual para UPS de 20KVA. Incluye cofre y automaticos	UN	2	$ 841,500.00	$ 1,683,000.00	2.00	$ 1,683,000.00		$ -		$ -
13,13	Suministro e Instalacion de Acometida Electrica en cable de Cu 3x2+1x2+1x2, Incluye tuberia, automatico totalizador y accesorios	ML	50	$ 138,600.00	$ 6,930,000.00	132.00	$ 18,295,200.00		$ -		$ -
13,14	Suministro e Instalacion de Tableros Electricos de 24 Circuitos Trifasicos C/P y Espacio para Totalizador. Incluye Tablero, Automaticos, Totalizador y Accesorios.	UN	4	$ 1,148,400.00	$ 4,593,600.00	4.00	$ 4,593,600.00		$ -		$ -
	LUMINARIAS										
13,15	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	195	$ 320,865.00	$ 62,568,675.00	219.00	$ 70,269,435.00		$ -		$ -
13,16	Ajuste a los diseños red electrica, para la adecuacion redes electricas existentes incluyendo iluminacion, tomas normales y reguladas (por espacio de trabajo)	UN	1	$ 8,322,443.00	$ 8,322,443.00	2.00	$ 16,644,886.00	2.00	$ 16,644,886.00	2.00	**$ 16,644,886.00**
14	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**										
	VOZ Y DATOS										
14,1	Ajuste a los diseños red de datos, (por espacio de trabajo)	UN	1	$ 8,322,443.00	$ 8,322,443.00	2.00	$ 16,644,886.00	2.00	$ 16,644,886.00	2.00	**$ 16,644,886.00**
14,2	Salida de punto de datos doble voz y datos incluye faceplate, RJ45, caja de octogonal, caja de montaje y accesorios, suministro y mano de obra CAT 6A	UN	151	$ 196,702.00	$ 29,702,002.00	140.00	$ 27,538,280.00		$ -		$ -
14,3	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido, accesorios de montaje	ML	10080	$ 5,640.00	$ 56,851,200.00	10080.00	$ 56,851,200.00		$ -		$ -
14,4	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)	UN	151	$ 33,344.00	$ 5,034,944.00	140.00	$ 4,668,160.00		$ -		$ -
14,5	Suministro e Instalacion de Rack de 40 RU de 210x80x80 Ranurado con Puertas Abatibles. Multitoma, Organizadores.	UN	1	$ 3,246,593.00	$ 3,246,593.00	1.00	$ 3,246,593.00		$ -		$ -
14,6	Suministro e Instalacion de SW de 24 puertos10/100/1000 capa 2 con 4 Puertos SFP ARUBA	UN	7	$ 1,435,500.00	$ 10,048,500.00	7.00	$ 10,048,500.00		$ -		$ -
14,7	Suministro e Instalacion de Bandeja Portacbles Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeccion)	ML	110	$ 44,550.00	$ 4,900,500.00	145.00	$ 6,459,750.00		$ -		$ -
14,8	Suministro e Instalacion de Canaleta Metalica 12x5 Blanca con Division y Pintura Electrostatica (Incluye Accesorios de Sujeccion)	ML	200	$ 54,450.00	$ 10,890,000.00	325.00	$ 17,696,250.00		$ -		$ -
14,9	Suministro e Instalacion de Herraje de 24 Puertos. Incluye Jack	UN	17	$ 1,237,500.00	$ 21,037,500.00	7.00	$ 8,662,500.00		$ -		$ -
14,10	Suministro e Instalacion de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)	UN	151	$ 2,970.00	$ 448,470.00	280.00	$ 831,600.00		$ -		$ -
14,11	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN	302	$ 14,850.00	$ 4,484,700.00	140.00	$ 2,079,000.00		$ -		$ -
15	**ASEO Y VARIOS**										
15.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,012	$ 3,123.00	$ 3,161,569.05	1514.68	$ 4,730,360.01		$ -		$ -
15.2	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	50	$ 71,424.00	$ 3,571,200.00		$ -		$ -		$ -
15.3	Reubicación detector de movimiento. (Incluye instalación, accesorios)	UN	15	$ 46,145.00	$ 692,175.00		$ -		$ -		$ -
15.4	Señalización institucional espacios, acrílico + soportes acero inox. (Suministro e instalación)	UN	50	$ 68,564.00	$ 3,428,200.00	67.00	$ 4,593,788.00		$ -		$ -
NP	**NO PREVISTOS**										
NP 1	Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral, incluye estructura de soporte	M2		$ 120,594.00	$ -	964.83	$ 116,352,202.53	698.00	$ 84,174,612.00	698.00	**$ 84,174,612.00**
NP 2	Suministro e instalacion de ceramica formato 60 cm X 60 cm (incluye pegante y boquilla)	M2		$ 110,378.00	$ -	1383.09	$ 152,662,708.02	1264.00	$ 139,517,792.00	1,264.00	**$ 139,517,792.00**
NP 3	Suministro e instalacion ventaneria en aluminio, incluye vidrio de seguridad 5mm	M2		$ 735,473.00	$ -	138.90	$ 102,157,199.70		$ -		$ -
NP 4	Suministro e instalacion de orinal tipo push	UN		$ 1,727,027.00	$ -	3.00	$ 5,181,081.00		$ -		$ -
NP 5	Suministro e instalacion de sanitario	UN		$ 1,967,742.00	$ -	4.00	$ 7,870,968.00		$ -		$ -
NP 6	Suministro e instalacion de divisiones de baño en acero inoxidable	M2		$ 1,332,250.00	$ -	14.36	$ 19,136,439.00		$ -		$ -
NP 7	Suministro e instalacion de madera hasta 60 cm de ancho, para entrepaños o para atencion al publico tipo recepcion de documentos o para puertas abatibles, inlcuye lo necesario para su instalacion	ML		$ 153,670.00	$ -	99.90	$ 15,351,633.00		$ -		$ -
NP 8	Mamposteria en ladrillo hueco No. 5	M2		$ 68,951.00	$ -	9.80	$ 675,719.80	9.80	$ 675,719.80	9.80	**$ 675,719.80**
NP 9	Guardaescoba en tableta ceramica altura hasta 10cm	ML		$ 24,597.00	$ -	986.20	$ 24,257,561.40	698.00	$ 17,168,706.00	698.00	**$ 17,168,706.00**
NP 10	Desmonte de aires acondicionados existentes	UN		$ 98,496.00	$ -	60.00	$ 5,909,760.00	60.00	$ 5,909,760.00	60.00	**$ 5,909,760.00**
NP 11	Suministro e instalación de panel led 18W	UN		$ 100,637.00	$ -	45.00	$ 4,528,665.00		$ -		$ -
NP 12	Suministro e instalación lampara de emergencia tipo tortuga	UN		$ 181,210.00	$ -	87.00	$ 15,765,270.00		$ -		$ -
NP 13	Acometida electrica para sistema regulado 1 (3F # 6+1N # 6+1T #8)CU	ML		$ 100,860.00	$ -	80.00	$ 8,068,800.00		$ -		$ -
NP 14	Suministro e instalación de tablero de 36 ctos con espacio para totalizador	UN		$ 1,845,085.13	$ -	4.00	$ 7,380,340.53		$ -		$ -
NP 15	Alimentación electrica para condensadora 2F#10CU+1T#12CU prom salida= 35m	ML		$ 39,900.00	$ -	49.00	$ 1,955,100.00		$ -		$ -

NP 16	Alimentación de fibra optica entre rack ppal y rack piso 6	ML		$ 4,887.00	$ -	55.00	$ 268,785.00		$ -		$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA				**$ 1,242,757,658.92**		**$ 1,500,071,448.92**		**$ 647,403,208.47**		**$ 647,403,208.47**
	Administratración		19%		$ 236,123,955.00		$ 285,013,575.00		$ 123,006,610.00		$ 123,006,610.00
	Imprevistos		1%		$ 12,427,577.00		$ 15,000,715.00		$ 6,474,032.00		$ 6,474,032.00
	Utilidad		5%		$ 62,137,883.00		$ 75,003,572.00		$ 32,370,160.00		$ 32,370,160.00
	IVA sobre Utilidad		19%		$ 11,806,198.00		$ 14,250,679.00		$ 6,150,330.40		$ 6,150,330.40
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				**$ 322,495,613.00**		**$ 389,268,541.00**		**$ 168,001,132.40**		**$ 168,001,132.40**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 1,565,253,271.92**		**$ 1,889,339,990**		**$ 815,404,340.87**		**$ 815,404,340.87**

II. MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE- ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 1		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES FINALES	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
16.1	**SILLA TIPO EJECUTIVA.** Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño..	UN	18	$ 690,564.00	$ 12,430,152.00	-18.00	-$ 12,430,152.00				$ -
16.2	**SILLA TIPO OPERATIVA.** Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	45	$ 527,570.00	$ 23,740,650.00	-45.00	-$ 23,740,650.00				$ -
16.3	**PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m.** Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. El modulo adicional descrito en el esquema se cotizara por aparte.	UN	18	$ 2,099,104.00	$ 37,783,872.00	-18.00	-$ 37,783,872.00				$ -
16.4	**PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.** Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	45	$ 1,875,311.00	$ 84,388,995.00	-45.00	-$ 84,388,995.00				$ -
16.5	**PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m.** Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	15	$ 1,577,727.00	$ 23,665,905.00	-15.00	-$ 23,665,905.00				$ -
16.6	**SILLA TIPO INTERLOCUTORA.** Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	40	$ 244,592.00	$ 9,783,680.00	-40.00	-$ 9,783,680.00				$ -
16.7	**MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA.** de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UN	14	$ 1,114,117.00	$ 15,597,638.00	-14.00	-$ 15,597,638.00				$ -

16.8	**PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m.** Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	1	$ 1,158,054.00	$ 1,158,054.00	-1.00	-$ 1,158,054.00				$ -
16.9	**MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m.** Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. la superficie sera redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevara 2 costados, metalicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendra una viga metalica inspeccionable pasa cables.llevara instalado 2 gromnet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendra una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluira rodachinas de carga pesada con freno.	UN	1	$ 2,839,134.00	$ 2,839,134.00	-1.00	-$ 2,839,134.00				$ -
17.0	**UNIDAD DE ARCHIVO** compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada modulo tendra 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 modulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada modulo rodante tendra 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, : La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los los costados de cada unidad de consulta, llevara una lamina metalica para evitar la caida de los expedientes.	UN	5	$ 11,481,313.00	$ 57,406,565.00	-5.00	-$ 57,406,565.00				$ -
17.1	**CORTINA**. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.	M2	1	$ 246,292.00	$ 246,292.00	-1.00	-$ 246,292.00				$ -
17.2	**ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLICO.** tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco, superficie madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. De 0.90m de largo x 0,50m de fondo x 0,75 m de alto. Se estructurara en lámina cold rolled calibre 14 con dos gaveteros para carpetas.	UN	1	$ 1,650,943.00	$ 1,650,943.00	-1.00	-$ 1,650,943.00				$ -
17.3	**MESA REDONDA** r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.	UN	1	$ 967,898.00	$ 967,898.00	-1.00	-$ 967,898.00				$ -
17.4	**TÁNDEM TRES (3) PUESTOS**. asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 ".	UN	1	$ 682,002.00	$ 682,002.00	-1.00	-$ 682,002.00				$ -
	SUBTOTAL COSTO MOBILIARIO				**$ 272,341,780.00**		**-$ 272,341,780.00**		$ -		$ -
	IVA 19%				$ 51,744,938.20		-$ 51,744,938.20		$ -		$ -
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				**$ 324,086,718.20**		**-$ 324,086,718.20**		**$ -**		**$ -**
	I. TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 1,565,253,271.92**				**$ 815,404,340.87**		**$ 815,404,340.87**
	II. TOTAL COSTO MOBILIARIO				**$ 324,086,718.20**				**$ -**		**$ -**
	T O T A L C O S T O O B R A Y M O B I L I A R I O				**$ 1,889,339,990.00**				**$ 815,404,340.87**		**$ 815,404,340.87**

ALBA VIVIANA TORRES USECHE
RL CONSORCIO CARVI
CONTRATISTA DE OBRA

JESUS MARIA RUIZ PEREZ
RL CONSORCIO JR
INTERVENTOR

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONES
COORDINADOR DESAJ **(A)**
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

5	**CIELO RASOS**	**5.1**	**Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería)**	**UBICACIÓN**	
				UNIDAD	**M2**

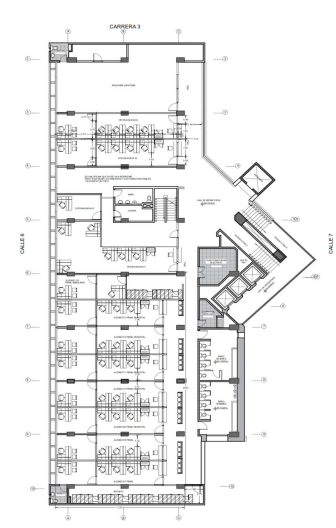

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

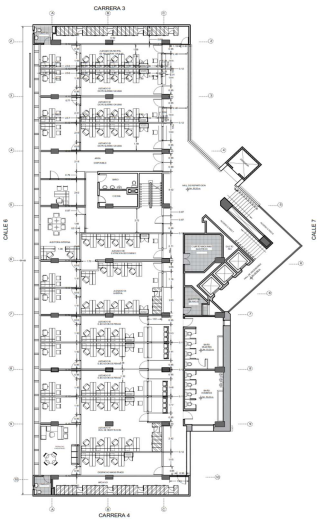

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
ARCHIVO AL LADO DE OFICINA MAGISTRADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 OF 01	5.73	13.10	-	75.06	-	1.00	75.06
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 OF 02	5.93	13.10		77.68		1.00	77.68
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-3.00	-0.48
P6 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		2.00	28.68
	2.10	7.93		16.65		1.00	
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
O6 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	
	0.40	0.94		0.38		-2.00	
P5 OF 01	5.65	13.10	-	74.02	-	1.00	78.00
	0.17	0.94		0.16		-4.00	
P5 OF 02	5.85	13.10		76.64		1.00	
	0.17	0.94		0.16		-4.00	
P5 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	
	0.17	0.94		0.16		-4.00	
P5 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	
	0.17	0.94		0.16		-4.00	
				-			-
						Subtotal	698.00
						Subtotal	
						TOTAL	**698.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

NP	NO PREVISTOS	NP 2	Suministro e instalacion de ceramica formato 60 cm X 60 cm (incluye pegante y boquilla)	UBICACIÓN	
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO DE OFICINA MAGISTRADO	2.00	14.60		29.20		1.00	29.20
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 OF 01	5.73	13.10	-	75.06	-	1.00	75.06
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 OF 02	5.93	13.10		77.68		1.00	77.68
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-3.00	-0.48
P6 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	
	5.05	2.84		14.34		2.00	28.68
	2.10	7.93		16.65		1.00	16.65
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
O6 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.60		29.20		1.00	29.20
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
							-
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.60		29.20		1.00	29.20
	0.40	0.94		0.38		-2.00	-0.75
P5 OF 01	5.65	13.10	-	74.02	-	1.00	74.02
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 02	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	
	2.10	5.05		10.61		1.00	
	8.00	1.75		14.00		1.00	
	1.50	4.10		6.15		1.00	
	5.05	2.84		14.34		1.00	
	2.10	13.10		27.51		-1.00	
	0.17	0.94		0.16		-6.00	



P5 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	
	0.17	0.94		0.16		-4.00	
P5 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	
	0.17	0.94		0.16		-2.00	
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.60		29.20		1.00	29.20
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
				-			-
PISO BAÑO HOMBES PISO 5	5.74	4.02		23.07		1.00	
	0.82	0.34		0.28		-1.00	-0.28
	0.18	1.30		0.23		-1.00	-0.23
				-			-
				-			-
						Subtotal	1,264.00
						Subtotal	
						TOTAL	**1,264.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 8**	**Mamposteria en ladrillo hueco No. 5**	**UBICACIÓN**	
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
VANOS DE PUERTAS	1.00		2.00	2.00		4.00	8.00
VANOS DUCTOS	0.60		0.43	0.26		7.00	1.80
				-			-
						Subtotal	9.80
						Subtotal	
						TOTAL	**9.80**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

NP	NO PREVISTOS	NP 9	Guardaescoba en tableta ceramica altura hasta 10cm	UBICACIÓN	
				UNIDAD	ML





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO DE OFICINA MAGISTRADO		14.60		-		2.00	29.20
		2.00		-		2.00	4.00
P6 OF 01		13.10	-	-	-	2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P6 OF 02		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P6 OF 03		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P6 OF 04		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P6 OF 05		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		2.00	11.70
		5.85		-		1.00	5.85
		5.85		-		1.00	5.85
		2.93		-		2.00	5.85
		1.12				1.00	1.12
O6 OF 06		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P6 OF 07		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
ARCHIVO AL LADO JUZGADO		14.60		-		2.00	29.20
		2.00		-		2.00	4.00
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO		14.60		-		2.00	29.20
		2.00		-		2.00	4.00
P5 OF 01		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P5 OF 02		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P5 OF 03		13.10		-		2.00	26.20
		5.85		-		3.00	17.55
P5 OF 04		13.10		-		2.00	
		5.85		-		2.00	
P5 OF 05		13.10		-		1.00	
		5.05		-		1.00	
		1.75		-		1.00	
		4.10		-		1.00	
		2.84		-		1.00	
		13.10		-		-1.00	
		0.94		-		-6.00	

	P5 OF 06		13.10		-		2.00	
			4.20		-		1.00	
	P5 OF 07		13.10		-		2.00	
			5.85		-			-
	ARCHIVO AL LADO JUZGADO		14.60		-		1.00	
			0.94		-		3.00	
	CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6		74.04		-		1.00	74.04
	CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6		74.04	-	-	-	1.00	74.04
					-			-
					-			-
					-			-
							Subtotal	698.00
OBSERVACIONES:							**Subtotal**	
							TOTAL	**698.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

	MEMORIAS DE CÁLCULO **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

NP	**NO PREVISTOS**	**NP10**	**Desmonte de aires aconcionados existentes**	**UBICACIÓN**	
				UNIDAD	**UN**





Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6				-		32.00	32.00
PISO 5			-	-	-	28.00	28.00
				-			-
				-			-
						Subtotal	60.00
						Subtotal	
						TOTAL	**60.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.1**	**Ajustes de diseño , memorias de cantidades y balance**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**

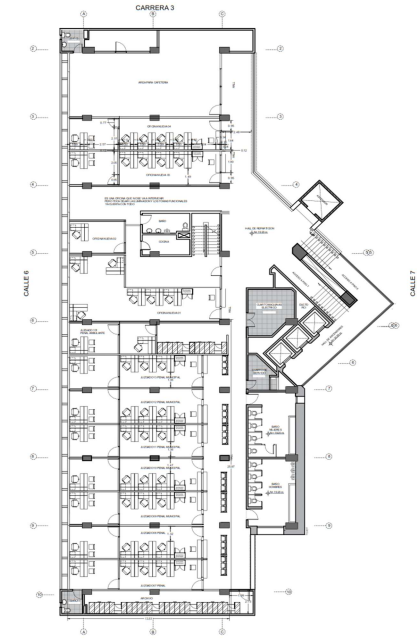

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO DE OFICINA MAGISTRADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 OF 01	5.73	13.10	-	75.06	-	1.00	75.06
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 OF 02	5.93	13.10		77.68		1.00	77.68
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-3.00	-0.48
P6 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		2.00	28.68
	2.10	7.93		16.65		1.00	16.65
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
O6 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
							-
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-2.00	-0.75
P5 OF 01	5.65	13.10	-	74.02	-	1.00	74.02
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64

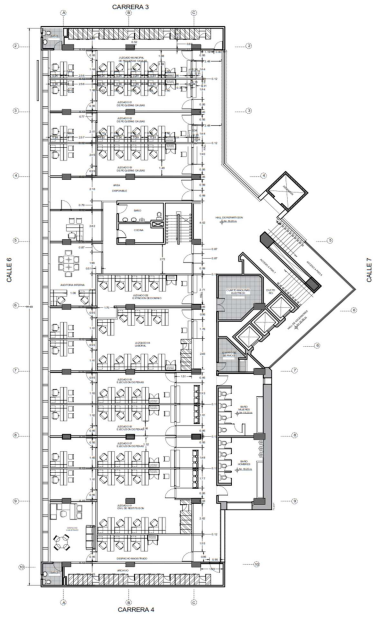

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

P5 OF 02	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		1.00	14.34
	2.10	13.10		27.51		-1.00	-27.51
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
P5 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
				-			-
BAÑO HOMBRE PISO 5	5.74	4.02		11.54		1.00	11.54
							-
						Subtotal	1,514.68
						Subtotal	
						TOTAL	**1,514.68**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	ML

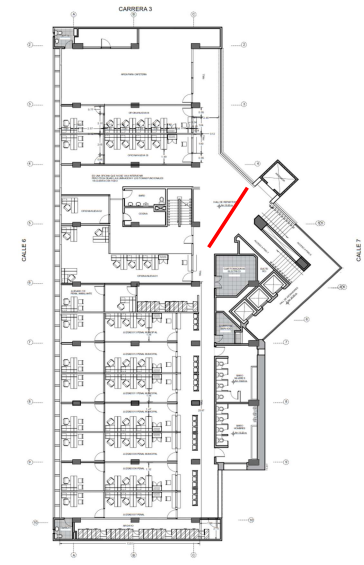

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

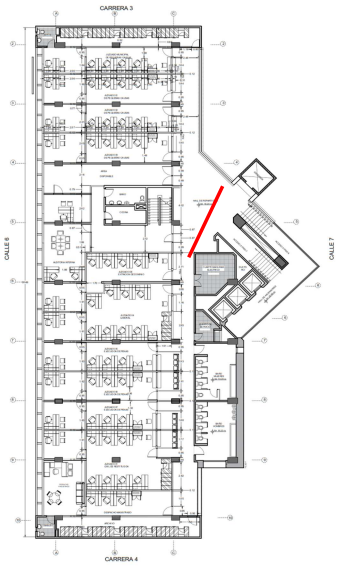

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CERRAMIENTO CORREDORS				20.00	-	1.00	20.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	20.00
Subtotal	
TOTAL	20.00

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.4**	**Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES PISO 5	4.20		1.80	7.56		1.00	7.56
	1.26		1.80	2.27		3.00	6.80
					Subtotal		14.36
					Subtotal		
					TOTAL		**14.36**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.5	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2

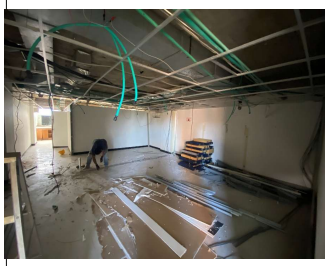



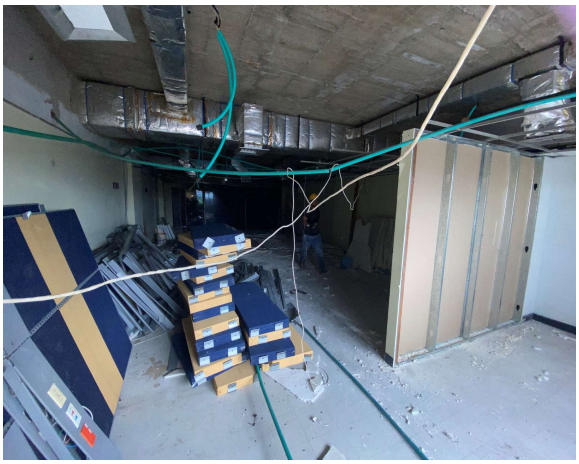

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		2.60	2.25	5.85	-	1.00	5.85
		1.00	2.25	2.25		1.00	2.25
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
		1.00	2.25	2.25		1.00	2.25
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
P6 OF 02		1.40	1.60	2.24		1.00	2.24
		2.40	2.25	5.40		1.00	5.40
		4.80	1.60	7.68		2.00	15.36
		0.60	1.60	0.96		1.00	0.96
P6 OF 03		3.00	2.25	6.75		1.00	6.75
		3.20	2.25	7.20		1.00	7.20
		3.37	2.25	7.58		1.00	7.58
		3.20	2.25	7.20		1.00	7.20
		1.60	1.60	2.56		4.00	10.24
		3.10	2.25	6.98		1.00	6.98
P6 OF 04		5.90	2.25	13.28		1.00	13.28
		4.50	2.25	10.13		1.00	10.13
P6 OF 05		13.60	2.25	30.60		1.00	30.60
P6 OF 06		3.70	2.25	8.33		1.00	8.33
		2.70	2.25	6.08		1.00	6.08
		5.50	2.25	12.38		1.00	12.38
		2.40	1.80	4.32		1.00	4.32
		4.77	2.25	10.73		1.00	10.73
P5 OF 01		3.40	2.20	7.48		1.00	7.48
		5.60	2.20	12.32		1.00	12.32
		3.10	1.65	5.12		1.00	5.12
		2.62	1.65	4.32		1.00	4.32
		0.32	1.65	0.53		1.00	0.53
		3.13	2.20	6.89		2.00	13.77
		2.52	2.20	5.54		1.00	5.54
P5 OF 02		3.10	2.20	6.82		2.00	13.64
		2.75	2.20	6.05		2.00	12.10
		1.50	1.50	2.25		2.00	4.50
		1.40	1.10	1.54		1.00	1.54
		0.35	1.50	0.53		1.00	0.53
		0.60	1.20	0.72		1.00	0.72



P5 OF 03		2.65	2.20	5.83		4.00	23.32
		3.00	2.20	6.60		4.00	26.40
		2.00	2.20	4.40		1.00	4.40
		1.50	1.50	2.25		1.00	2.25
P5 OF 04		2.45	2.20	5.39		1.00	5.39
		5.50	2.20	12.10		1.00	12.10
		3.03	2.20	6.67		3.00	20.00
		4.25	2.20	9.35		1.00	9.35
		1.54	1.63	2.51		2.00	5.02
		0.65	0.97	0.63		7.00	4.41
		1.85	1.63	3.02		1.00	3.02
		2.00	2.20	4.40		1.00	4.40
		2.50	1.93	4.83		1.00	4.83
P5 OF 05		2.95	2.20	6.49		1.00	6.49
		4.40	2.20	9.68		1.00	9.68
		1.00	2.20	2.20		1.00	2.20
		1.50	2.20	3.30		1.00	3.30
P5 OF 07		3.95	2.20	8.69		1.00	8.69
							-
							-
						Subtotal	430.98
						Subtotal	
						TOTAL	**430.98**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.6**	**Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

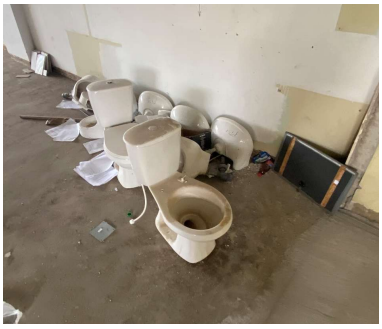

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ORINALES						3.00	3.00
LAVAMANOS	-		-	-		4.00	4.00
SANITARIOS						4.00	4.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
					Subtotal		11.00
					Subtotal		
					TOTAL		**11.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.7**	**Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

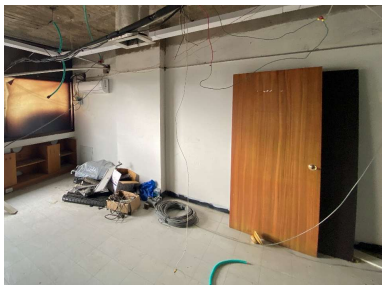

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
OFICINAS PISO 6						15.00	15.00
PISO 5	-		-	-		9.00	9.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	24.00
						Subtotal	
						TOTAL	**24.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.8**	**Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
OFICINAS PISO 6						34.00	34.00
OFICINAS PISO 5	-		-	-		23.00	23.00
							-
							-
						Subtotal	57.00
						Subtotal	
						TOTAL	**57.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.9	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 FRONTAL OF 1		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 2		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 3		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 4		5.50	2.90	15.95	-	1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 5		3.60	2.90	10.44		1.00	10.44
P6 CORREDOR ESCALERAS EMERGENCIA		1.74	2.90	5.05		1.00	5.05
P6 FRONTAL OF 5		2.10	2.90	6.09		1.00	6.09
P6 FRONTAL OF 6		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 7		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
TRASERAS PISO 6		5.80	1.95	11.31		9.00	101.79
				-			
P5 FRONTAL OF 1		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 2		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 3		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 4		5.50	2.90	15.95	-	1.00	15.95
TRASERAS PISO 5		5.80	1.95	11.31		4.00	45.24
				-			
P5FRONTAL OF 5		3.60	2.90	10.44		1.00	
P5 CORREDOR ESCALERAS EMERGENCIA		1.74	2.90	5.05		1.00	
P5 FRONTAL OF 6		5.50	2.90	15.95		1.00	
P5 FRONTAL OF 7		5.50	2.90	15.95		1.00	
				-			-
				-			-
						Subtotal	280.26
						Subtotal	
						TOTAL	280.26

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.10**	**Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6				-	-	124.00	124.00
							-
PISO 5						145.00	145.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	269.00
Subtotal	
TOTAL	**269.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.11	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	ML





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		5.65		-	-	1.00	5.65
P6 OF 02		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 03		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 04		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 05		11.49		-		1.00	11.49
P6 OF 06		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 07		5.85		-		1.00	5.85
				-			-
P6 OF 01		5.65		-	-	1.00	5.65
P6 OF 02		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 03		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 04		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 05		8.67		-		1.00	8.67
P6 OF 06		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 07		5.85		-		1.00	5.85
				-			-
						Subtotal	89.96
						Subtotal	
						TOTAL	**89.96**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.12**	**Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
OFICINAS PISO 6		223.22				1.00	223.22
P5 OF 01		27.19		-		1.00	27.19
P5 OF 02		15.00		-		1.00	15.00
P5 0F 03		32.72		-		1.00	32.72
P5 OF 04		30.50		-		1.00	30.50
P5 OF 5		15.00		-		1.00	15.00
P5 OF 6		32.79		-			-
P5 OF 7		42.30		-		1.00	42.30

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.13**	**Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**





Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
P6 OF 01				-	-	23.00	23.00
P6 OF 02				-		22.00	22.00
P6 OF 03				-		25.00	25.00
P6 OF 04				-		24.00	24.00
P6 OF 05				-		35.00	35.00
P6 OF 06				-		22.00	22.00
P6 OF 07				-		16.00	16.00
				-			-
P5 OF 01				-	-	22.00	22.00
P5 OF 02				-		32.00	32.00
P5 OF 03				-		27.00	27.00
P5 OF 04				-		57.00	57.00
P5 OF 05				-		28.00	28.00
P5 OF 06				-		30.00	30.00
P5 OF 07				-		38.00	38.00
				-			-
						Subtotal	401.00
						Subtotal	
						TOTAL	**401.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.14**	**Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**



Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6		1,850.00				1.00	1,850.00
PISO 5		1,321.00				1.00	1,321.00
PISO 5 2		760.00				1.00	760.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	3,931.00
						Subtotal	
						TOTAL	**3,931.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.15**	**Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6				-	-	2.00	2.00
PISO 5				-		4.00	4.00
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	6.00
						Subtotal	
						TOTAL	**6.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.17	Desmonte de Cielo Raso.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10
P6 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
O6 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P6 OF 05	7.92	3.77		29.86		1.00	29.86
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	7.90	1.75		13.83		1.00	13.83
	8.19	1.50		12.29		1.00	12.29
	5.17	2.85		14.73		2.00	29.47
	2.45	2.10		5.15		1.00	5.15
	4.00	2.10		8.40		1.00	8.40
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
CORREDOR P6	5.10	2.30		11.73		1.00	11.73
	2.30	0.67		1.54		2.00	3.08
	0.98	0.58		0.57		-1.00	-0.57
P5 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10



P5 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P5 OF 05	8.00	3.77		30.16		1.00	30.16
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	8.00	1.70		13.60		1.00	13.60
	3.00	1.50		4.50		1.00	4.50
	5.00	2.85		14.25		1.00	14.25
	0.17	0.95		0.16		-6.00	-0.97
CORREDOR P5	5.10	2.30		11.73		1.00	11.73
	2.30	0.67		1.54		2.00	3.08
	0.98	0.58		0.57		-1.00	-0.57
				-			-
				-			-
						Subtotal	1,047.03
						Subtotal	
						TOTAL	**1,047.03**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

	MEMORIAS DE CÁLCULO **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.19**	**Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6		336.01	-	-	-	1.00	336.01
PISO 5		215.61				1.00	215.61
PISO 5 SEGUNDA MITAD		97.91				1.00	97.91
						Subtotal	649.53
						Subtotal	
						TOTAL	**649.53**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.20**	**Demolición de pañetes.**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES	5.40		2.40	12.96	-	1.00	12.96
	5.74		2.40	13.78		1.00	13.78
	0.34		2.40	0.82		1.00	0.82
	0.82		2.40	1.97		1.00	1.97
	4.02		2.40	9.65		1.00	9.65
	3.20		2.40	7.68		1.00	7.68
	1.30		2.40	3.12		1.30	4.06
	0.18		2.40	0.43		1.00	0.43
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	47.64
						Subtotal	
						TOTAL	**47.64**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.23	Demolición de enchapes Piso/Muro.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10
P6 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
O6 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P6 OF 05	7.92	3.77		29.86		1.00	29.86
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	7.90	1.75		13.83		1.00	13.83
	8.19	1.50		12.29		1.00	12.29
	5.17	2.85		14.73		2.00	29.47
	2.45	2.10		5.15		1.00	5.15
	4.00	2.10		8.40		1.00	8.40
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
P5 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10





P5 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P5 OF 05	8.00	3.77		30.16		1.00	30.16
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	8.00	1.70		13.60		1.00	13.60
	3.00	1.50		4.50		1.00	4.50
	5.00	2.85		14.25		1.00	14.25
	0.17	0.95		0.16		-6.00	-0.97
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
PAREDES BAÑO HOMBRES PISO 5	5.40		2.40	12.96	-	1.00	12.96
	5.74		2.40	13.78		1.00	13.78
	0.34		2.40	0.82		1.00	0.82
	0.82		2.40	1.97		1.00	1.97
	4.02		2.40	9.65		1.00	9.65
	3.20		2.40	7.68		1.00	7.68
	1.30		2.40	3.12		1.30	4.06
	0.18		2.40	0.43		1.00	0.43
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05

	PISO BAÑO HOMBES PISO 5	5.74	4.02		23.07		1.00	23.07
		0.82	0.34		0.28		-1.00	-0.28
		0.18	1.30		0.23		-1.00	-0.23
					-			-
							Subtotal	1,380.79
OBSERVACIONES:							**Subtotal**	
							TOTAL	**1,380.79**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES**	**1.25**	**Demolición de guarda escoba.**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CORREDORES PISO 6		74.04			-	1.00	74.04
CORREDORES PISO 5		74.04				1.00	74.04
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					Subtotal		148.08
OBSERVACIONES:					**Subtotal**		
					TOTAL		**148.08**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.		CONTRATO	

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.29	Demolición muros en mampostería e=15cm.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01	4.85		2.90	14.07	-	1.00	14.07
	3.06		2.90	8.87		1.00	8.87
	1.50		1.10	1.65		1.00	1.65
	1.50		0.85	1.28		2.00	2.55
	1.00		2.00	2.00		1.00	2.00
P6 OF 03	1.35		2.90	3.92		1.00	3.92
P6 OF 05	1.50		2.90	4.35		1.00	4.35
P6 OF 06	1.50		2.90	4.35		1.00	4.35
	1.50		0.85	1.28		1.00	1.28
	1.00		2.00	2.00		1.00	2.00
				-			-
PISO 5 OF 01, 02 Y 03	1.35		2.90	3.92		3.00	11.75
					Subtotal		56.77
					Subtotal		
					TOTAL		56.77

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.33**	**Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		2.60	2.25	5.85	-	1.00	5.85
		3.10	2.25	6.98		6.00	41.85
P4 OF 02		4.20	2.25	9.45		3.00	28.35
		2.80	2.25	6.30		3.00	18.90
P6 OF 04		4.20	2.25	9.45		1.00	9.45
		2.50	2.25	5.63		2.00	11.25
		2.10	2.25	4.73		2.00	9.45
		3.80	2.25	8.55		1.00	8.55
P6 OF 05		3.80	2.25	8.55		1.00	8.55
		2.80	2.25	6.30		1.00	6.30
		1.90	2.25	4.28		2.00	8.55
		1.50	2.25	3.38		1.00	3.38
P6 OF 06		2.25	2.25	5.06		3.00	15.19
		2.50	2.25	5.63		1.00	5.63
		2.30	2.25	5.18		1.00	5.18
		4.95	2.25	11.14		1.00	11.14
P6 OF 07		5.45	2.25	12.26		1.00	12.26
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
		3.60	2.25	8.10		1.00	8.10
P5 OF 06		2.87	2.20	6.31		3.00	18.94
		13.10	2.20	28.82		1.00	28.82
P5 OF 07		5.65	2.20	12.43		1.00	12.43
		3.20	2.20	7.04		1.00	7.04
		1.70	2.20	3.74		1.00	3.74
						Subtotal	294.73
						Subtotal	
						TOTAL	**294.73**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1 | **Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.36**	**Trasiego, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M3**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CIELO RASO			0.02	1,047.03	20.94	1.30	27.22
PAÑETES			0.03	47.64	1.43	1.30	1.86
ENCHAPES			0.03	1,380.79	41.42	1.30	53.85
MAMPOSTERIA			0.15	56.77	8.52	1.30	11.07
DRYWALL			0.12	294.73	35.37	1.30	45.98
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-			-
						Subtotal	139.98
						Subtotal	
						TOTAL	**139.98**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

2	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**	**2.1**	**Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	ióp
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		4.87	2.90	14.12	-	1.00	14.12
		3.10	2.01	6.23		1.00	6.23
		0.95	2.00	1.90		1.00	1.90
		5.65	2.90	16.39		1.00	16.39
		9.10	2.90	26.39		1.00	26.39
P6 OF 02		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
		11.95	2.90	34.66		1.00	34.66
		1.50	2.90	4.35		1.00	4.35
P6 OF 03		11.95	2.90	34.66		1.00	34.66
		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
P6 OF 04		4.20	2.90	12.18		1.00	12.18
		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
		1.70	2.90	4.93		1.00	4.93
		1.00	2.90	2.90		1.00	2.90
P6 OF 05		3.77	2.90	10.93		1.00	10.93
		0.62	2.90	1.80		1.00	1.80
		2.82	2.90	8.18		1.00	8.18
		1.58	2.90	4.58		1.00	4.58
		0.73	2.90	2.12		1.00	2.12
		1.96	2.90	5.68		1.00	5.68
P6 OF 06		13.50	2.90	39.15		1.00	39.15
		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
		1.05	2.05	2.15		3.00	6.46
P6 OF 07		13.50	2.90	39.15		1.00	39.15
		5.65	2.90	16.39		1.00	16.39
		1.00	2.05	2.05		1.00	2.05
		4.86	2.90	14.09		1.00	14.09
P5 OF 01		11.95	2.90	34.66		1.00	34.66
		5.65	2.90	16.39		1.00	16.39
		4.65	2.90	13.49		1.00	13.49
		1.05	2.05	2.15		1.00	2.15
P5 OF 02		11.95	2.90	34.66		1.00	34.66
		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
P5 OF 03		11.95	2.90	34.66		1.00	34.66
		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
P5 OF 04		14.15	2.90	41.04		1.00	41.04
		5.85	2.90	16.97		1.00	16.97
		2.93	2.90	8.50		1.00	-3.05
						Subtotal	602.00
						Subtotal	
						TOTAL	**602.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

3	**ALISTADO DE PISOS**	**3.10**	**Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
PISO BAÑO HOMBES PISO 5	5.74	4.02		23.07		1.00	23.07
	0.82	0.34		0.28		-1.00	-0.28
	0.18	1.30		0.23		-1.00	-0.23
				-			-
				-			-
						Subtotal	314.61
						Subtotal	
						TOTAL	**314.61**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**4.10**	**Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**



P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES	5.40		2.40	12.96	-	1.00	12.96
	5.74		2.40	13.78		1.00	13.78
	0.34		2.40	0.82		1.00	0.82
	0.82		2.40	1.97		1.00	1.97
	4.02		2.40	9.65		1.00	9.65
	3.20		2.40	7.68		1.00	7.68
	1.30		2.40	3.12		1.30	4.06
	0.18		2.40	0.43		1.00	0.43
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	47.64
						Subtotal	
						TOTAL	**47.64**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**
VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

6	**ESTUCO Y PINTURA**	**6.1**	**Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**

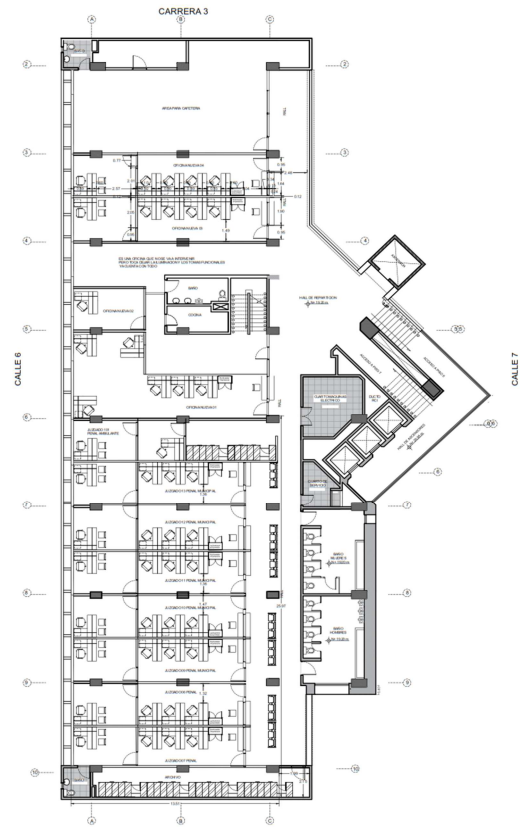

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado	16.30		2.60	42.38	-	2.00	84.76
	2.03		2.60	5.28		2.00	10.56
	2.03		0.60	1.22		2.00	2.44
	0.17		2.60	0.44		5.00	2.21
	1.98		2.60	5.15		1.00	5.15
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
DESPACHO MASGISTRADO	5.65		1.10	6.22	-	1.00	6.22
	4.20		2.60	10.92		2.00	21.84
	7.00		2.60	18.20	-	1.00	18.20
	0.17		2.60	0.44		2.00	0.88
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	4.20		2.60	10.92		1.00	10.92
	0.17		2.60	0.44		2.00	0.88
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	11.75		2.60	30.55		1.00	30.55
	0.17		2.60	0.44		4.00	1.77
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	11.75		2.60	30.55		1.00	30.55
	0.17		2.60	0.44		4.00	1.77
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 04 LABORAL	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	13.30		2.50	33.25		1.00	33.25
	7.28		2.50	18.20		1.00	18.20
	0.17		2.50	0.43		8.00	3.40
OF JUZ DE EXTINCIION	2.95		2.50	7.38		1.00	7.38
	0.17		2.50	0.43		3.00	1.28
	8.15		2.50	20.38		1.00	20.38
	8.65		2.50	21.63		1.00	21.63
AUDITORIA INTERNA	5.85		1.10	6.44		1.00	6.44
	2.10		2.50	5.25		1.00	5.25
	4.20		2.50	10.50		1.00	10.50
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
	5.05		2.50	12.63		1.00	12.63
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
ESPACIO LIBRE	5.05		2.50	12.63		3.00	37.88
	5.85		1.10	6.44		1.00	6.44
	8.15		2.50	20.38		1.00	20.38
	1.65		2.50	4.13		1.00	4.13
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13

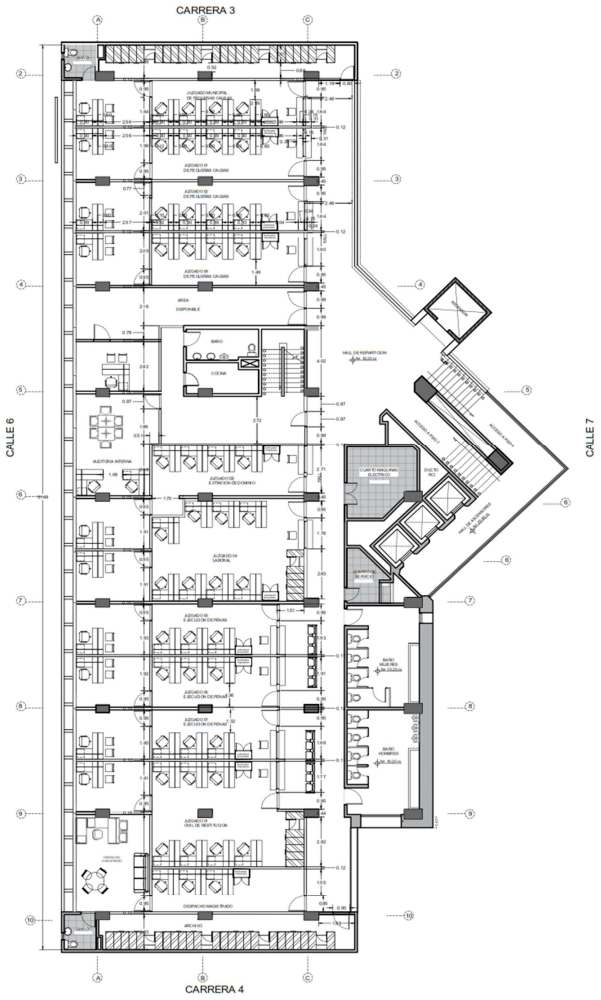

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

CUARTO TECNICO	4.85		2.50	12.13	-	2.00	24.25
	0.17		2.50	0.43		2.00	0.85
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas	16.30		2.50	40.75	-	2.00	81.50
	2.03		2.50	5.08		2.00	10.15
	2.03		0.60	1.22		2.00	2.44
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
	1.98		2.50	4.95		1.00	4.95
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
archivo lado juz 07 PENAL	16.30		2.50	40.75	-	2.00	81.50
	2.03		2.50	5.08		2.00	10.15
	2.03		0.60	1.22		2.00	2.44
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
	1.98		2.50	4.95		1.00	4.95
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
OF JUZ 07 PENAL	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
OF JUZ 06 PENAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 01 AMBULANTE	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
COLUMNAS	0.45		2.90	1.31		5.00	6.53
						Subtotal	1,145.50
						Subtotal	
						TOTAL	**1,145.50**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA
NEIVA - HUILA

VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

6	ESTUCO Y PINTURA	6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2



P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado	16.30		2.50	40.75	-	2.00	81.50
	2.03		2.50	5.08		2.00	10.15
	2.03		0.60	1.22		2.00	2.44
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
	1.98		2.50	4.95		1.00	4.95
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
DESPACHO MASGISTRADO	5.65		1.10	6.22	-	1.00	6.22
	4.20		2.50	10.50		2.00	21.00
	7.00		2.50	17.50	-	1.00	17.50
	0.17		2.50	0.43		2.00	0.85
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	4.20		2.50	10.50		1.00	10.50
	0.17		2.50	0.43		2.00	0.85
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 04 LABORAL	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	13.30		2.50	33.25		1.00	33.25
	7.28		2.50	18.20		1.00	18.20
	0.17		2.50	0.43		8.00	3.40
OF JUZ DE EXTINCIION	2.95		2.50	7.38		1.00	7.38
	0.17		2.50	0.43		3.00	1.28
	8.15		2.50	20.38		1.00	20.38
	8.65		2.50	21.63		1.00	21.63
AUDITORIA INTERNA	5.85		1.10	6.44		1.00	6.44
	2.10		2.50	5.25		1.00	5.25
	4.20		2.50	10.50		1.00	10.50
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
	5.05		2.50	12.63		1.00	12.63
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
ESPACIO LIBRE	5.05		2.50	12.63		3.00	37.88
	5.85		1.10	6.44		1.00	6.44
	8.15		2.50	20.38		1.00	20.38
	1.65		2.50	4.13		1.00	4.13
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13

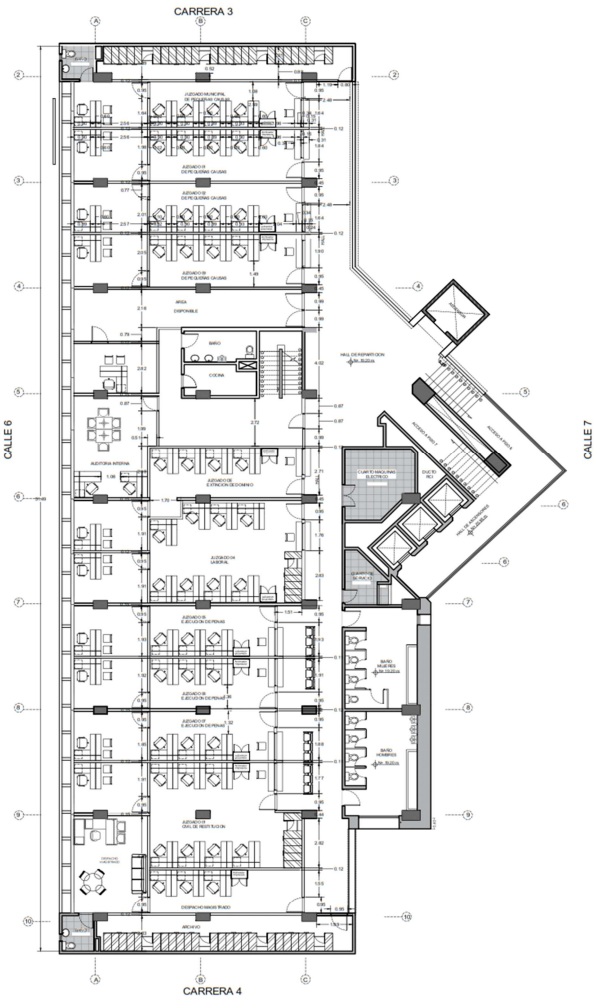

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

CUARTO TECNICO	4.85		2.50	12.13	-	2.00	24.25
	0.17		2.50	0.43		2.00	0.85
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas	16.30		2.50	40.75	-	2.00	81.50
	2.03		2.50	5.08		2.00	10.15
	2.03		0.60	1.22		2.00	2.44
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
	1.98		2.50	4.95		1.00	4.95
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
archivo lado juz 07 PENAL	16.30		2.50	40.75	-	2.00	81.50
	2.03		2.50	5.08		2.00	10.15
	2.03		0.60	1.22		2.00	2.44
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
	1.98		2.50	4.95		1.00	4.95
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
OF JUZ 07 PENAL	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
OF JUZ 06 PENAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	11.75		2.50	29.38		1.00	29.38
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
OF JUZ 01 AMBULANTE	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
COLUMNAS	0.45		2.90	1.31		5.00	6.53
P5 OF 06	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
P5 OF 06	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13
P5 OF 07	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	0.17		2.50	0.43		5.00	2.13

	P5 OF 07	13.10		2.50	32.75		1.00	32.75
		2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
		1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
	P5 OF 05	2.95		2.50	7.38		1.00	7.38
		0.17		2.50	0.43		3.00	1.28
		8.15		2.50	20.38		1.00	20.38
		8.65		2.50	21.63		1.00	21.63
	P5 OF 05	5.85		1.10	6.44		1.00	6.44
		2.10		2.50	5.25		1.00	
		4.20		2.50	10.50		1.00	
		0.17		2.50	0.43		4.00	1.70
		5.05		2.50	12.63		1.00	
		1.00		2.00	2.00		-1.00	-2.00
	SUPERIOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
		4.40	1.80		7.92		1.00	
		0.95	0.45		0.43		-8.00	
					-			-
OBSERVACIONES:							**Subtotal**	1,456.00
							Subtotal	
							TOTAL	**1,456.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**13.16**	**Ajuste a los diseños red electrica, para la adecuacion redes electricas existentes incluyendo iluminacion, tomas normales y reguladas (por espacio de trabajo)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

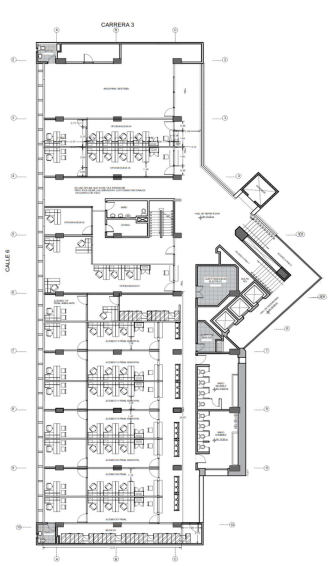

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

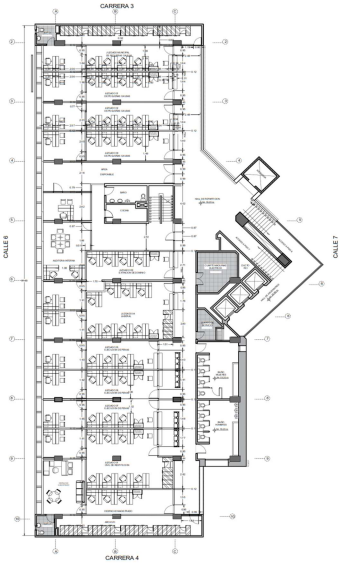

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 5				-		1.00	1.00
PISO 6				-		1.00	1.00
							-

OBSERVACIONES:

Subtotal	2.00
Subtotal	
TOTAL	**2.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**
	VERSIÓN: 1 — **Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**		**CONTRATO**	

14	**INSTALACION VOZ Y DATOS**	**14.1**	**Ajuste a los diseños red de datos, (por espacio de trabajo)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

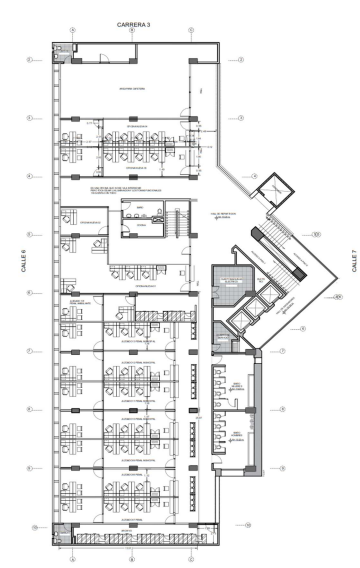

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

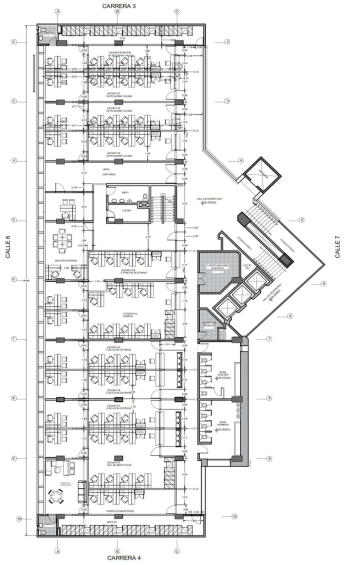

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 5				-		1.00	1.00
PISO 6				-		1.00	1.00
							-

OBSERVACIONES:

Subtotal	2.00
Subtotal	
TOTAL	**2.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
