	MUNICIPIO DE PAIPA	**19/12/24** **30/1/25**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	**FECHA:**
	INFORME SEMANAL 07	**31/1/25**

DATOS DEL COMITÉ DE OBRA SEMANAL:

Nombre del Contratista:	**LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA**
Nombre del Interventor:	**N/A**
nombre del Supervisor	**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**
Tiempo Transcurrido desde la iniciación del Contrato:	**43** Días
Tiempo Restante para la Terminación del Contrato:	**0** Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	75,38%	100,00%	**Obra Fisica Ejecutada (%)**	55,87%	100,00%
Valor obra programada	$ 113.494.757,00	$ 150.560.539,00	**Valor obra Ejecutada**	$ 84.112.027,00	$ 150.560.539,00

CONTRATO DE OBRA

ORDEN N°:	**6**		Plazo Actualizado:	**43**	**DIAS**
Valor Inicial:		$ $ 121.742.088,00	Fecha de Iniciación:	**19/12/2024**	
Valor Actualizado:		$ **$ 150.560.539,00**	Fecha de Terminación inicial:	**31/12/2024**	
Plazo Inicial:	**13 DIAS**		Fecha de Terminación prorroga 1:	**30/01/2025**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO










FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRESENTE SEMANA:





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRESENTE SEMANA:

SE CONTINUA CON LA APLICACCION DE LA CAPA FINAL DE ACRILICO SEGÚN EL DISEÑO

DEMARCACION E INSTALACION DE LOS 4 SOSCOS PARA LA CANCHA DE VOLEIBOL

DEMARCACION DE E INSTALACION DE LAS CANCHAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS DOS JUEGOS DE CANCHAS MULTIPLES

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO:

EL CONTRATO TERMINA EL 30 DE ENERO DE 2025


OBSERVACIONES, METAS FÍSICAS, ÍTEMS NO PREVISTOS O DATOS IMPORTANTES	Vo Bo INTERVENTOR:

PERSONAL ADMINISTRATIVO						
NOMBRE	CEDULA	CARGO	AFILIACIÓN			
			SALUD	RIESGO	PENSIÓN	CCF

PERSONAL OPERATIVO						
NOMBRE	CEDULA	CARGO	AFILIACIÓN			
			SALUD	RIESGO	PENSIÓN	CCF
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6.765.918	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	COMFABOY
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR	1.049.631.574	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	COLPATRIA ARP	PORVENIR	COMFABOY
TIMOTEO MARTINEZ LOPEZ	79.280.813	MAESTRO DE OBRA	SANITAS	COLPATRIA ARP	PORVENIR	COMFABOY
DUVAN FELIPE BOSSA RAMIREZ	1.072.717.437	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	COLPATRIA ARP	PORVENIR	COMFABOY

ANEXOS

CURVA AVANCE DE OBRA

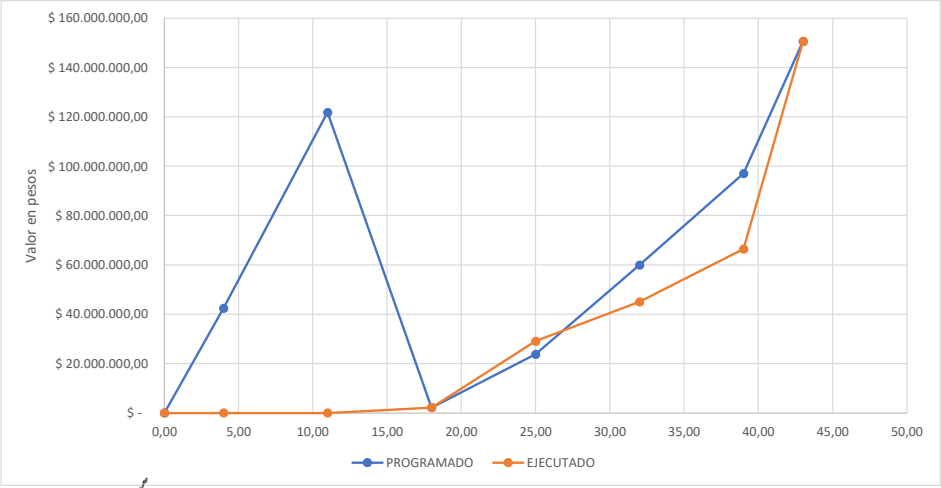

LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA
Contratista
