INFORME DE SUPERVISION No. 01 y FINAL

MINIMA CUANTIA 041 DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 090045 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 110051 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITANORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ NIT: 88229077
SUPERVISOR	MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA – secretario de Planeación e Infraestructura
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($36.149.820) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTI SIETE (27) DIAS
FECHA DE INICIO	04 DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DICIEMBRE DE 2024
LOCALIZACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL
RÉGIMEN	COMUN
ACTA DE SUSPENSIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTAS DE REINICIO	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA
NORTE DE SANTANDER
NIT: 890506116-8
RADICACIÓN
RADICADO Nº: 341
RECIBIDO POR: Yulver Parada
FECHA: 07/03/2025 HORA: 07:59 Am

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A			
VALOR DEL ADICIONAL	N/A			
TIEMPO DEL ADICIONAL	N/A			
GARANTÍAS	N/A			
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 al 23 de diciembre de 2024 y del 28 de febrero al 06 de marzo de 2025			
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		**NO**	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	
	100%		100%	

RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

- Aporte de Seguridad social según la siguiente relación

ADMINISTRADORA DE SALUD

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
DICIEMBRE - 2024	2025/01/17	81019041	$ 3,086,000	$385.800
DICIEMBRE - 2024	2025/01/23	31972217	$ 5.600.000	$ 700.000
DICIEMBRE - 2024	2024/27/12	82940050	$ 1.755.800	$219.500

ADMINISTRADORA DE PENSION

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
DICIEMBRE - 2024	2025/01/17	81019041	$ 3,086,000	$493.800
DICIEMBRE - 2024	2025/01/23	31972217	$ 5.600.000	$ 952.000
DICIEMBRE - 2024	2024/27/12	82940050	$ 1.755.800	$ 281.000

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
DICIEMBRE - 2024	2025/01/23	31972217	$ 5.600.000	$ 136.500
DICIEMBRE - 2024	2024/27/12	82940050	$ 1.755.800	$ 9.200

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR	MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ NIT: 88229077
OTROS ASISTENTES	NO
LUGAR DE LA REUNIÓN	ALCALDÍA DE PAMPLONITA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo de 04 al 23 de diciembre de 2024 y del 28 de febrero al 06 de marzo de 2025 y su posterior aprobación para el pago de sus honorarios, lo cual se relaciona a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

I. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se adjunta el informe de cumplimiento suscrito por el contratista consta de cinco (05) folios.

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


N° DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS DE LA CONSULTORIA				
1	ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.	X		FINALIZADO
2	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO.	X		FINALIZADO
3	GEOLOGÍA Y GEOTECNIA PARA INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS.	X		FINALIZADO
4	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	X		FINALIZADO
5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	X		FINALIZADO
6	ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL	X		FINALIZADO
7	GESTIÓN PREDIAL	X		FINALIZADO
8	CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	X		FINALIZADO

Dentro de las actividades contractuales objeto del contrato en ejecución según las condiciones contractuales y la oferta económica presentada para la adjudicación del proceso de **ISMC-PNITAL-041-2024** se realizaron las siguientes acciones:


0. CONSULTORIA TULANTA - VOLCAN-20250306T135211Z-001.zip\0. CONSULTORIA TULANTA - VOLCAN - ar

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modifi
..			Carpeta de archivos	
0. PLANO UBICACION GENERAL	17.542.490	13.960.536	Carpeta de archivos	
1. E. TTO, CAPAC Y NIVEL DE SERVICIO	4.337.193	4.077.330	Carpeta de archivos	
2. E. TOPOG, TRAZADO Y D. GEOM	543.426.278	492.067.264	Carpeta de archivos	
3. E. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	246.379.989	218.214.365	Carpeta de archivos	
4. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACI...	55.087.912	50.349.950	Carpeta de archivos	
5. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	150.297.310	129.742.131	Carpeta de archivos	
6. ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PR...	3.803.340	2.742.464	Carpeta de archivos	
7. GESTIÓN PREDIAL	43.138.802	37.164.030	Carpeta de archivos	
8. CANT. DE OBRA, APU Y PTO	38.473.307	29.335.023	Carpeta de archivos	
9. PROCESO CONSTRUCTIVO	12.556.067	12.199.724	Carpeta de archivos	
10. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	8.829.462	8.344.332	Carpeta de archivos	
11. DIAGNOSTICO TECNICO ESTADO ACTUAL	42.537.011	42.278.101	Carpeta de archivos	
12. ESPECIFICACIONES TECNICAS	18.126.481	17.104.712	Carpeta de archivos	

0 PLANO UBICACIÓN GENERAL Se anexa topografía en formato dwg y pdf georeferenciado

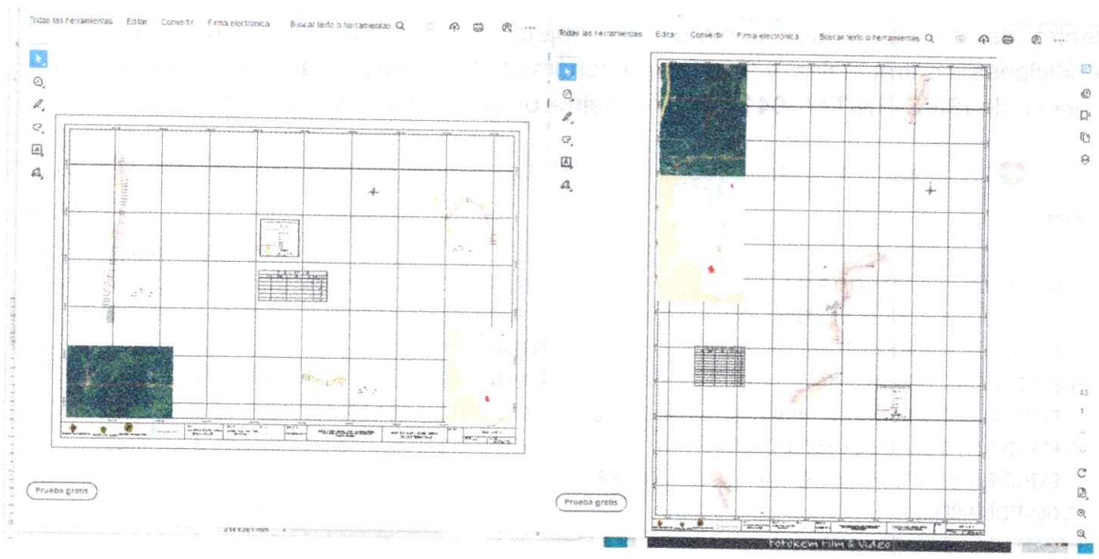

1. E. TTO, CAPAC Y NIVEL DE SERVICIO se realiza los respectivos conteos de transito en cada uno de los corredores viales para determinar el numero de ejes que transitan y con ellos realizar el diseño estructural del corredor vial

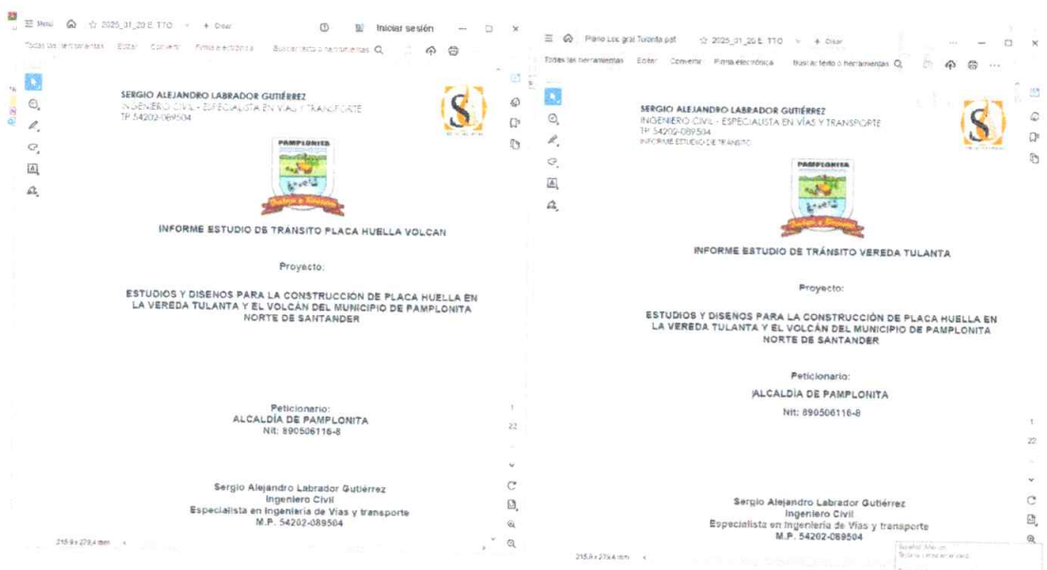

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIÉRREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
TP 54202-089504

INFORME ESTUDIO DE TRANSITO PLACA HUELLA VOLCAN

Proyecto:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Peticionario:
ALCALDÍA DE PAMPLONITA
Nit: 890506116-8

Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Vías y transporte
M.P. 54202-089504

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIÉRREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
TP 54202-089504

INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO VEREDA TULANTA


Proyecto:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Peticionario:
ALCALDÍA DE PAMPLONITA
Nit: 890506116-8

Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Vías y transporte
M.P. 54202-089504

2. E. TOPOG, TRAZADO Y D. GEOM se realiza levantamiento topográfico en el cual se anexa informes de diseño geométrico e informe del levantamiento adicionalmente se cuenta con los datos rines, datos en crudo e planos en AutoCAD y pdf

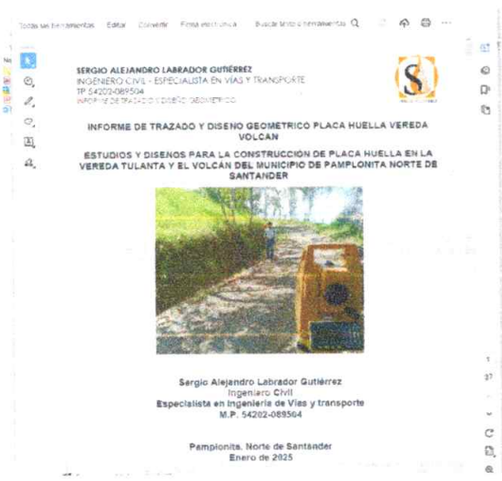

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIÉRREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
TP 54202-069504
INFORME DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO

INFORME DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO PLACA HUELLA VEREDA VOLCAN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Vías y transporte
M.P. 54202-069564

Pamplonita, Norte de Santander
Enero de 2025



GERALDINE GARCIA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER.

INFORME TOPOGRAFICO
ELABORADO: GERALDINE GARCIA VALLE

DIRECTOR DE CONSULTORIA
SERGIO A LABRADOR GUTIERREZ

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PAMPLONITA
2025

3. E. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA se realiza estudio para cada uno de los tramos viales , se anexa ubicación en planos en AutoCAD y pdf de la ubicación de cada una de las exploraciones




ESTUDIOS GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

PROYECTO: CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER.


LOCALIZACIÓN: CORREDOR DE TERCER VEREDA EL VOLCAN


SOLICITÓ: ALCALDIA DE PAMPLONITA

CONSULTOR: SERGIO A. LABRADOR G.

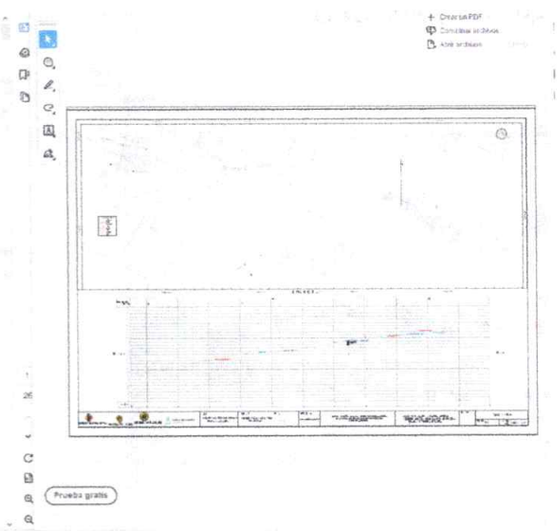

4. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION, se realiza el diseño de las respectivas obras de drenaje para cada uno de los tramos seleccionados en el alcance del proyecto se realiza el respectivo informe por el profesional al igual se adjunta planos en AutoCAD y pdf

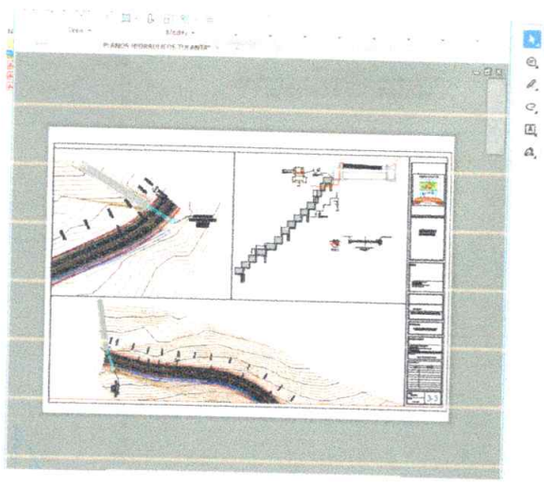

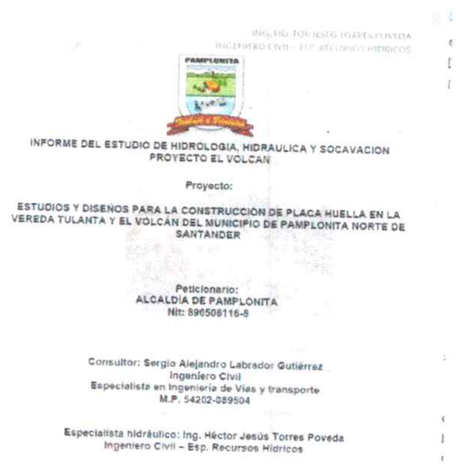

INFORME DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION
PROYECTO EL VOLCAN

Proyecto:


ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER


Peticionario:
ALCALDÍA DE PAMPLONITA
Nit: 890506116-8

Consultor: Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Vías y transporte
M.P. 54202-089504

Especialista hidráulico: Ing. Héctor Jesús Torres Poveda
Ingeniero Civil – Esp. Recursos Hídricos

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS, se realiza el respectivo diseño estructural del pavimento así como de las obras hidráulicas y/o complementarias determinadas para cada uno de los tramos viales se anexa informe estructural para cada tramo así como planos en pdf y AutoCAD.

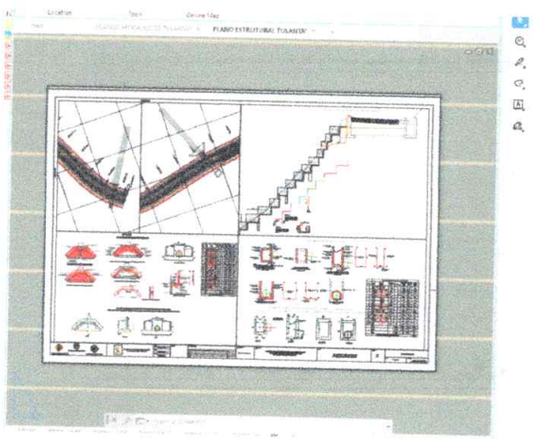

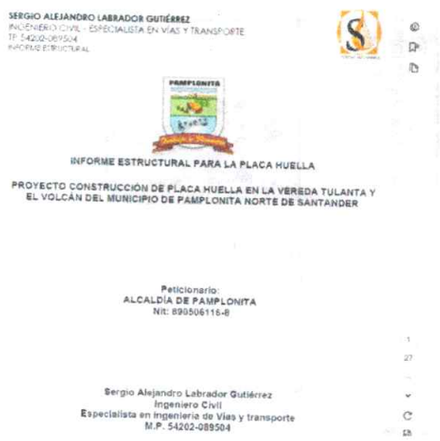

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIÉRREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
TP. 54202-089504
INFORME ESTRUCTURAL


INFORME ESTRUCTURAL PARA LA PLACA HUELLA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Peticionario:
ALCALDÍA DE PAMPLONITA
Nit: 890506116-8

Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Vías y transporte
M.P. 54202-089504

6. ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO, se realiza el respectivo informe con el personal idóneo para cada una de las vías seleccionadas

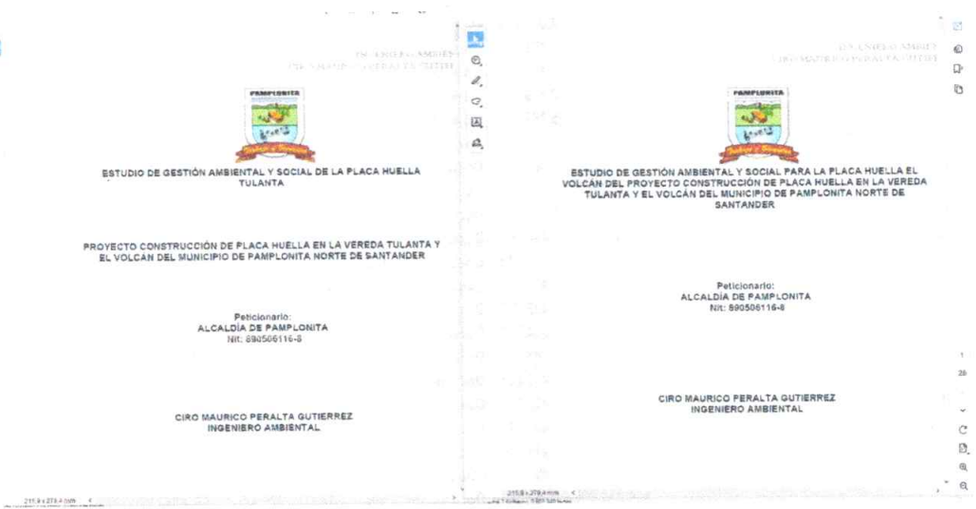

ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PLACA HUELLA TULANTA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Peticionario:
ALCALDÍA DE PAMPLONITA
Nit: 890506116-8


CIRO MAURICO PERALTA GUTIERREZ
INGENIERO AMBIENTAL

ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA PLACA HUELLA EL VOLCÁN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Peticionario:
ALCALDÍA DE PAMPLONITA
Nit: 890506116-8

CIRO MAURICO PERALTA GUTIERREZ
INGENIERO AMBIENTAL

7. GESTIÓN PREDIAL, se realiza un informe predial para cada una de las vías seleccionada sobre el trazado actual que la red vial terciaria posee así como sus planos en AutoCAD y pdf

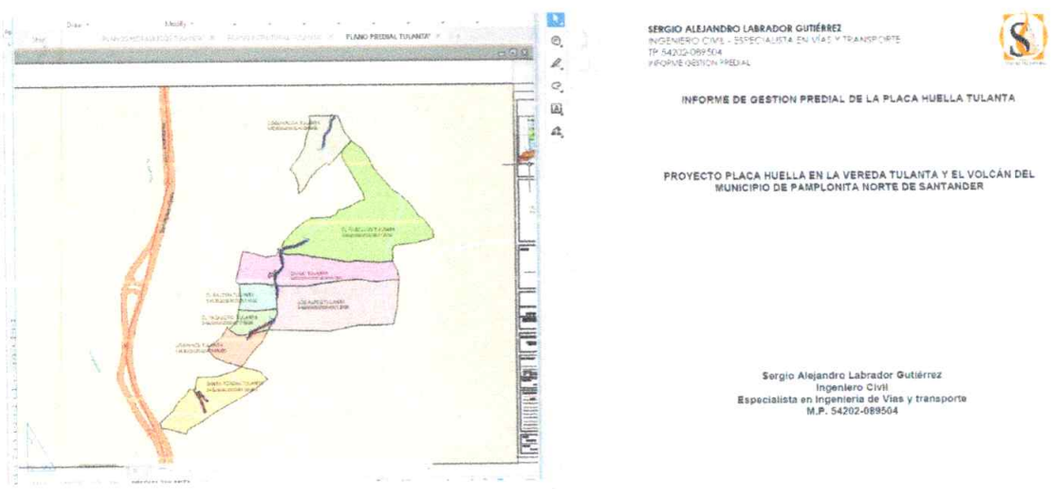

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIÉRREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
TP 54202-089504
INFORME GESTION PREDIAL

INFORME DE GESTION PREDIAL DE LA PLACA HUELLA TULANTA

PROYECTO PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Sergio Alejandro Labrador Gutiérrez
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Vías y transporte
M.P. 54202-089504

8. CANT. DE OBRA, APU Y PTO, Se realiza el respectivo estudio de mercado para la vigencia actual de diferentes fuentes de abastecimiento como lo son agregados pétreos asi como a su vez los respectivo materiales de ferretería

..			Carpeta de archivos		
EQUIPOS	5.126.375	4.019.078	Carpeta de archivos		
MATERIALES	15.614.344	8.375.987	Carpeta de archivos		
TRANSPORTE	126.796	120.673	Carpeta de archivos		
2025_02_24 MEMORIAS FINALES.xlsx	2.719.450	2.579.760	Hoja de cálculo de...	24/02/2025 3:3...	EAE1DE0C
2025_02_24 PTO GENERAL.xlsx	5.354.797	5.335.049	Hoja de cálculo de...	24/02/2025 3:2...	971ED0AB
COSTOS ENSAYOS DE LABORATORIO.pdf	527.053	500.684	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	2996AC4E
CRONOGRAMA.pdf	526.759	497.055	Documento Adob...	25/02/2025 10:...	A0D05804
DETALLE AIU.pdf	404.977	388.254	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	DEF38245
DISTANCIAS CANTERAS.pdf	1.085.186	1.048.880	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	FC21F408
LISTA DE EQUIPO.pdf	521.141	494.060	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	576F3166
LISTA DE MATERIALES.pdf	459.860	433.716	Documento Adob...	14/02/2025 1:5...	443C1E46
LISTA DE TRANSPORTE.pdf	436.867	411.938	Documento Adob...	14/02/2025 1:5...	534EC0DB
MANO DE OBRA.pdf	447.493	422.042	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	16050FC8
MEMORIAS TULANTA.pdf	1.110.628	964.797	Documento Adob...	25/02/2025 10:...	4C9AEE48
MEMORIAS VOLCAN.pdf	874.572	785.916	Documento Adob...	25/02/2025 10:...	67189433
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA.pdf	447.714	422.805	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	F0AC23C5
PRESUPUESTO GENERAL .pdf	498.776	470.720	Documento Adob...	25/02/2025 10:...	FD7A5C1D
PRESUPUESTO PAGA.pdf	465.916	440.349	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	414A1A65
PRESUPUESTO PMT.pdf	436.022	411.046	Documento Adob...	14/02/2025 2:3...	1A1202AC
UNITARIOS BASICOS.pdf	479.107	452.169	Documento Adob...	14/02/2025 1:5...	2D742606
UNITARIOS.pdf	809.484	760.045	Documento Adob...	14/02/2025 1:5...	9E0F3623

9. PROCESO CONSTRUCTIVO, se realiza el respectivo proceso acorde a cada una de las actividades de las vías terciarias seleccionadas en el proyecto


PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITANORTE DE SANTANDER

CONSULTOR:
SERGIO A LABRADOR GUTIERREZ

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA


PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TULANTA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITANORTE DE SANTANDER

CONSULTOR:
SERGIO A LABRADOR GUTIERREZ

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA

Cada uno de los componentes del proyecto se realizo como independiente para cada una de las veredas en este caso tulanta y volcán esto con el fin de que el proyecto pueda ser financiados con recursos bien sea de origen nacional o departamentales en la vía de tulanta se realiza la proyección para la construcción de 595.5 ml y en la vía el volcán se realiza la proyección de la construcción de 441.40 ml .

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
ACTIVIDAD /COMPROMISO	ninguna
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD / COMPROMISO	Se ha ejecutado el 100 % del contrato de obra.
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	ninguna

BALANCE FINANCIERO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**Porcentaje de ejecución**
Valor inicial del contrato	$36.149.820	100%
Valor Adicionales	$0.0	0%
Valor Total del Contrato	$36.149.820	100%
Valor Pagado	$0.0	0%
Valor causado que no se ha pagado	$36.149.820	100%
Valor total ejecutado	$36.149.820	100%
Valor saldo por pagar	$ 0.0	0.0%
Valor a favor del Municipio	$0	0%
Estado actual	Ejecutado	**100%**
OBSERVACIONES		

Ninguna.

RELACIÓN DE PAGOS		
PERIODO DE COBRO CON LA PRESENTE ACTA	**DESDE**	04 de diciembre de 2024
	HASTA	06 de marzo de 2025

N° DE COBROS	FECHA	VALOR

Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de marzo de 2025

Ing. MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
Supervisor del Contrato

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
NIT: 88229077
