OFICIO 001-2025

Cartagena de Indias, 14 de febrero de 2025.

Señor
Atn, ING. EDILBERTO MANUEL VERGARA VÁSQUEZ.
Interventor.
Ciudad.

***Asunto: Solicitud Prorroga 2, Contrato No.* 3376 de 2024.**

Cordial saludo,

Yo, **HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO**, identificada con cédula de ciudadanía **1.047.413.737** de Cartagena de Indias, representante legal de **PANAMERA S.A.S**. identificada con **NIT: 901.493.547-1**, contratista del contrato 3376 de 2024 celebrado con el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** le comunico formalmente que la obra a desarrollarse en la vía SAN LUCAS – LA ESMERALDA, municipio **SANTA ROSA DEL SUR – BOLÍVAR**, solicitamos prorrogar el contrato de obra teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES

- Que el día 28 de agosto de 2024 el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" y el contratista PANAMERA S.A.S. suscribimos el contrato No. 3376 de 2024.

- Que el Instituto Nacional de Vías el día 17 de septiembre mediante oficio 2024S-VBOL-065743 impartió orden de inicio al Contrato de obra del asunto.

- Que el día 19 de noviembre mediante oficio STS-007-2024 la interventoría Ingeniero Edilberto Guevara Vásquez aprobó de manera definitiva los estudios y diseños entregados.

- Que el Instituto Nacional de Vías el día 4 de diciembre mediante contrato adicional No. 3376-1-2024 aprobaron Adicionar el valor del Contrato principal No. 3376 de 2024, en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($54.482.959,00), incluido IVA.

- Que el Instituto Nacional de Vías el día 30 de diciembre a través de la plataforma Secop II aprueba PRORROGA UNO (01) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 3376 DE 2024- Prorrogar el plazo del contrato 3376-2024 desde el día 31 de diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025.

2. JUSTIFICACION

En relación a las condiciones contractuales, características y topografía del terreno se hace necesario el rediseño de la Placa Huella a construir razones que se exponen a continuación:

- Que una vez iniciado la ejecución del contrato realizada la Topografía y las características del sitio a construir fue necesario reevaluar y realizar los rediseños de la Placa Huella y obras de arte generando mayor complejidad de las actividades a ejecutar para dar alcance objeto de este contrato.

Barrio Castillogrande calle 6 # 7 – 50
316-6200869
panameraconstrucciones@gmail.com
Cartagena – Colombia
Sur América

- Que, debido a las características del terreno, como pendientes y curvas cerradas se hace necesario la construcción de mayores vigas riostras, mayores placas en concreto rígido, y menores cantidades en concreto ciclópea piedra pegada, siendo más complejo el proyecto al momento de ejecutar.

- Finalmente, en caso de ser aceptadas las recomendaciones y sugerencias planteadas en el presente oficio, se solicita a la interventoría y la supervisión evaluar una ampliación del contrato por el termino de 60 días más a partir del 28 de febrero del presente año.

3. SOLICITUD

Prorrogar por 60 días las ejecución del contrato, ya que debido a los rediseños y estudios aprobados se hace más complejo la construcción de estos obligándonos a consumir más tiempo de lo previsto, adicional debido a las constantes lluvias recibidas durante el año 2024 por el fenómeno de la niña y el ciclón tropical AL99 presentado a inicios de mes de noviembre sobre el centro del mar caribe han provocado fuertes escorrentías obligándonos a suspender actividades de movimientos de tierras y aplicación de súbase, retrasando estas actividades considerablemente.

Si bien es cierto dependemos de terceros en términos de Suministro de Materiales, Cemento, Acero, etc. El ritmo de la obra se vio afectado en gran medida en el mes de enero de 2025 dado el cierre de algunas de estas empresas por temas contables y de fin de año. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicitamos este tiempo adicional para llevar a cabo sin contratiempos el objeto final del contrato.

Agradezco su atención, en espera de respuesta,

Atentamente,



HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
C.C: 1.047.413.737 de Cartagena
Representante Legal
PANAMERA S.A.S.
NIT: 901.493.547-1
CONTRATISTA

Barrio Castillogrande calle 6 # 7 – 50
316-6200869
panameraconstrucciones@gmail.com
Cartagena – Colombia
Sur América



EDILBERTO M. GUEVARA VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
T.P 13202-12411 BLV

Santa Rosa del Sur, 18 de febrero de 2025

OFICIO STS - 015-2024

Sres.

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Centro - Calle del Candilejo. No. 33-41 piso 2 Edificio Rafael del Castillo
Cartagena Bolívar
COLOMBIA

REF. CONTRATO 3376 DE 2024 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS

Asunto: Aprobación de Solicitud Prorroga 2, Contrato No. 3376 de 2024.

Cordial Saludo

Yo, **EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ**, identificado con cc **92.495.144** de Sincelejo, en calidad de interventor del contrato de obra **3376 DE 2024,** por medio de este documento me permito **AVALAR**, la prorroga #2 requerido en tiempo por 60 días por parte del contratista **PANAMERA SAS**, esto basado en qué estamos de acuerdo con la solicitud del contratista en especial por los atrasos presentados al inicio del contrato y demás acontecimientos, modificaciones contractuales plasmadas en el balance de obra y demás justificaciones, pero como interventoría reiteramos la recomendación de ampliar los frentes de trabajo en la zona y/o agilizar los trabajos que se vienen realizando en cada uno de los tramos, esto para evitar futuros inconvenientes y procesos sancionatorios.

No siendo más, muchas gracias

EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ

INTERVENTOR DE OBRAS

Carrera 14 # 16 – 63 La Pajuela Síncelejo- Sucre Cel. 3004825126
Email:edilmaku@hotmail.Com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/02/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3376 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: PANAMERA S.A.S.
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3493 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 3 MESES Y 14 DIAS (HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024)
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/09/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A.	N.A.	

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	26/12/2024	1/01/2025	28/02/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.			

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.145.517.039,42 **50% EN SMMLV:** 440,58
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
3376 DE 2024	29/11/2024	$ 54.482.959,60	41,91

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.200.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. OFICIO 001-2025 de fecha 14/02/2025 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Prorroga N°2 de tiempo por 60 días.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/02/2025
(Día / Mes / Año)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CONSTRUCCIÓN DE 707 M DE PLACA HUELLA, 1 ALCANTARILLA L=6m TUBERÍA 36", 1 BATEA Y MEJORAMIENTO DE 480 M EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 3376 Fecha: nov/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$ 539.813	$ 539.813	**$ -**	**$ 539.813**
Excavaciones varias en material común en seco.	$ 6.491.069	$ 6.491.069	**$ -**	**$ 6.491.069**
Excavación en material común de la explanación y canales	$ 4.462.631	$ 25.240.640	**$ -**	**$ 25.240.640**
Terraplenes	$ 782.683	$ 13.206.005	**$ -**	**$ 13.206.005**
Demolición de Estructuras	$ 3.980.125	$ 3.980.125	**$ -**	**$ 3.980.125**
Excavaciones varias en material común en seco.	$ 282.191	$ 282.191	**$ -**	**$ 282.191**
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	$ 4.706.660	$ 5.647.993	**$ -**	**$ 5.647.994**
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$ 630.751	$ 630.751	**$ -**	**$ 630.751**
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	$ 6.974.997	$ 6.974.997	**$ -**	**$ 6.974.997**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	$ 4.471.295	$ 4.471.295	**$ -**	**$ 4.471.295**
Relleno para Estructuras con suelo	$ 180.800	$ 180.800	**$ -**	**$ 180.800**
Excavaciones varias en material común en seco.	$ 1.241.639	$ 467.872	**$ -**	**$ 467.872**
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$ 56.065	$ -	**$ -**	**$ -**
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	$ 8.048.074	$ 8.316.343	**$ -**	**$ 8.316.343**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	$ 4.901.435	$ 4.901.435	**$ -**	**$ 4.901.435**
Relleno para Estructuras con suelo	$ 180.800	$ 98.435	**$ -**	**$ 98.435**
Subbase Granular Clase C.	$ 143.563.029	$ 124.361.560	**$ -**	**$ 124.361.560**
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA	$ 218.883.739	$ 329.824.900	**$ -**	**$ 329.824.900**
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS	$ 67.307.470	$ 67.703.651	**$ -**	**$ 67.703.651**
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	$ 218.883.739	$ 166.517.701	**$ -**	**$ 166.517.701**
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	$ 144.877.349	$ 28.246.871	**$ -**	**$ 28.246.871**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	$ 187.933.397	$ 209.464.545	**$ -**	**$ 209.464.545**
Caracterización del corredor	$ 6.671.000	$ 6.671.000	**$ -**	**$ 6.671.000**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 9.117.148	$ 9.117.148	**$ -**	**$ 9.117.148**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 37.550.000	$ 37.550.000	**$ -**	**$ 37.550.000**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.134.500	$ 7.134.500	**$ -**	**$ 7.134.500**
Conformación de la calzada existente	$ 2.553.534	$ 5.485.369	**$ -**	**$ 5.485.369**
Excavación en material común de la explanación y canales	$ 8.463.610	$ 17.850.523	**$ -**	**$ 17.850.523**
Afirmado	$ 34.246.001	$ 97.845.716	**$ -**	**$ 97.845.716**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 2.499.586	$ 2.499.586	**$ -**	**$ 2.499.586**
IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%	$ 7.901.909	$ 8.297.165	**$ -**	**$ 8.297.165**
Valor Total	**$ 1.145.517.039**	**$ 1.200.000.000**	**$ -**	**$ 1.200.000.000**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Enero (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 55% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 80%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 896.356.111,80
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 561.561.691,91
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 610.349.911,96
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a $ 234.715.779,24 (mes anterior a la presente solicitud) de 2024. (año) N/A

Último mes facturado: ENERO DE 2025 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 589.650.088,04
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17/02/2025
	(Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Debido a las características del terreno encontradas al momento de la ejecucion, como pendientes y curvas cerradas se hace necesario la construcción de mayores vigas riostras, mayores placas en concreto rígido, y menores cantidades en concreto ciclópea piedra pegada, tal como se evidencia en los balances de obra, siendo esto un atraso significativo en los tiempos de trabajo.

JURÍDICA:

No se encuentra ningun impedimento juridico para proceder con la prorroga en tiempo de 2 meses.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

No se encuentra ningun impedimento financiero para proceder con la prorroga en tiempo de 2 meses.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No se encuentra ningun impedimento presupuestal para proceder con la prorroga en tiempo de 2 meses.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

No se encuentra ningun impedimento ambiental y/o social y/o predial y/o sostenibilidad para proceder con la prorroga en tiempo de 2 meses.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

Al iniciar el proyecto se vieron presentados ciertos atrasos, que se basaron principalmente en la adecuacion d ela via alterna para la comunidad y su area de influencia, este proceso retraso los inicios contractuales de 40 a 45 dias.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma

Nombre: EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320212411 BLV

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

Nombre: NO APLICA
Gestor Técnico de Proyecto
NO APLICA

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3376 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648

CONTRATISTA: PANAMERA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3493 DE 2024 **INTERVENTOR:** EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ

PLAZO INICIAL: 3 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/9/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.145.517.040,40** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (iincluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.200.000.000,00**

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES Y 14 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 54.482.959,60**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 SEPTIEMBRE DE 2024	2 OCTUBRE DE 2024	3 NOVIEMBRE DE 2024	4 DICIEMBRE DE 2024	5 ENERO DE 2025	6 FEBRERO DE 2025	7 MARZO DE 2025	8 ABIRL DE 2025	9 N/A	10 N/A
EXPLANACIONES	$16.256.321	90,00%	91,95%	%P	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
	$49.457.652	91,95%	$45.477.527	$P	$0	$ 14,837,295.60	$ 9,891,530.40	$ 9,891,530.40	$ 9,891,530.40					
				$E	$0	$ 6,826,952.95	$ 3,217,928.15		$ 36,215,329.00					
				%E	0,00%	13,80%	6,50%	0,00%	73,22%					
ESTRUCTURA DE DRENAJE ALCANTARILLA	$17.246.694	40,00%	0,00%	%P	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	10,00%	30,00%	20,00%		
	$18.188.027	0,00%	$0	$P	$0	$0	$0	$ 1,818,802.70	$ 5,456,408.10					
				$E	$0	$0	$0							
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVERT	$14.428.013	40,00%	100,00%	%P	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	0,00%		
	$13.784.085	100,00%	$13.784.085	$P	$0	$0	$0	$ 1,378,408.50	$ 4,135,225.50					
				$E	$0	$0	$0		$ 13,784,085.00					
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
PLLACA HUELLA	$981.448.723	80,00%	46,13%	%P	0,00%	10,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
	$926.119.228	46,13%	$427.212.226	$P	$0	$ 92,611,922.80	$ 185,223,846.00	$ 231,529,807.00	$ 231,529,807.00					
				$E	$0	$ 86,774,696.07	$ 204,200,054.84		$ 136,237,476.00					
				%E	0,00%	9,36%	22,04%	0,00%	14,71%					
CARACTERIZACIÓN VIAL	$6.671.000	100,00%	100,00%	%P	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$6.671.000	100,00%	$6.671.000	$P	$0	$ 4,669,700.00	$ 2,001,300.00							
				$E	$0	$ 4,765,000.00	$ 1,906,000.00							
				%E	0,00%	71,00%	29,00%	0,00%	0,00%					
EXPLANACIONES (MANTENIMIENTO)	$45.263.145	80,00%	56,53%	%P	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
	$121.181.608	56,53%	$68.502.411	$P	$0	$0	$ 36,354,482.40	$ 36,354,482.40	$ 24,236,321.60					
				$E	$0	$0	$ 21,726,310.00		$ 46,776,101.00					
				%E	0,00%	0,00%	17,93%	0,00%	38,60%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.081.313.896,00**							Reprogramación No.1		Reprogramación No.2				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.135.401.600,00**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**9,87%**	**20,56%**	**24,75%**	**23,76%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$112.118.918**	**$233.471.219**	**$280.973.091**	**$269.792.884**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**9,87%**	**30,44%**	**55,18%**	**78,95%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$112.118.918**	**$345.590.137**	**$626.563.228**	**$896.356.112**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**8,66%**	**22,90%**	**0,00%**	**20,52%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$98.366.649**	**$260.011.493**	**$0**	**$233.012.992**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**8,66%**	**31,56%**	**31,56%**	**52,09%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$98.366.649**	**$358.378.142**	**$358.378.142**	**$591.391.134**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 9.117.148,18 $ 9.117.148,18	$ -	0%
*REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.684.500,00 $ 44.684.500,00	$ 44.684.500,00	100%
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) (MANTENIMIENTO)	$ 2.499.586,00 $ 2.499.586,00	$ -	0%
*IVA SOBRE UTILIDAD (U) 19%	$ 7.901.909,24 $ 8.297.165,54	$ 4.103.720,06	49%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.145.517.040,40**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.200.000.000,00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1320212411 BLV

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3376 DE 2024 **CONTRATISTA:** PANAMERA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3493 DE 2024 **INTERVENTOR:** EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	18	18	24	24	24	24	24	24	24	21	24	20	18	24	18	23	24	23	24	10	24	23	24	24	24	23	24	24	24		669
Lluvias moderadas	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	0	4	1	0	1	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0		37
Lluvias intensas	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Fabio Alzate
Nombre: FABIO ALZATE ALZATE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520246367 ANT

Firma
Nombre: LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-2730005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3376 DE 2024 **CONTRATISTA:** PANAMERA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3493 DE 2024 **INTERVENTOR:** EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																	24	24	24	24	18	24	24	22	18	24	24	12	24	24		310
Lluvias moderadas																	0	0	0	0	6	0	0	2	4	0	0	8	0	0		20
Lluvias intensas																	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0		6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FABIO AUGUSTO ALZATE ALZATE
Residente de Obra
Matricula No.: 0520246367 ANT

Firma
Nombre: LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 22202-2730005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3376 DE 2024 **CONTRATISTA:** PANAMERA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3493 DE 2024 **INTERVENTOR:** EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	22	24	24	18	12	23	24	22	22	20	19	24	24	24	19	18	24	18	24	16	22	18	24	15	12	24	18	24	626
Lluvias moderadas	0	0	0	2	0	0	4	8	1	0	2	1	4	4	0	0	0	4	4	0	6	0	4	2	4	0	5	8	0	3	0	66
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4	0	2	0	4	4	0	3	0	28
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.


OBSERVACIONES:

Firma Fabio Alzate
Nombre: FABIO ALZATE ALZATE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520246367 ANT

Firma
Nombre: LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-2730005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

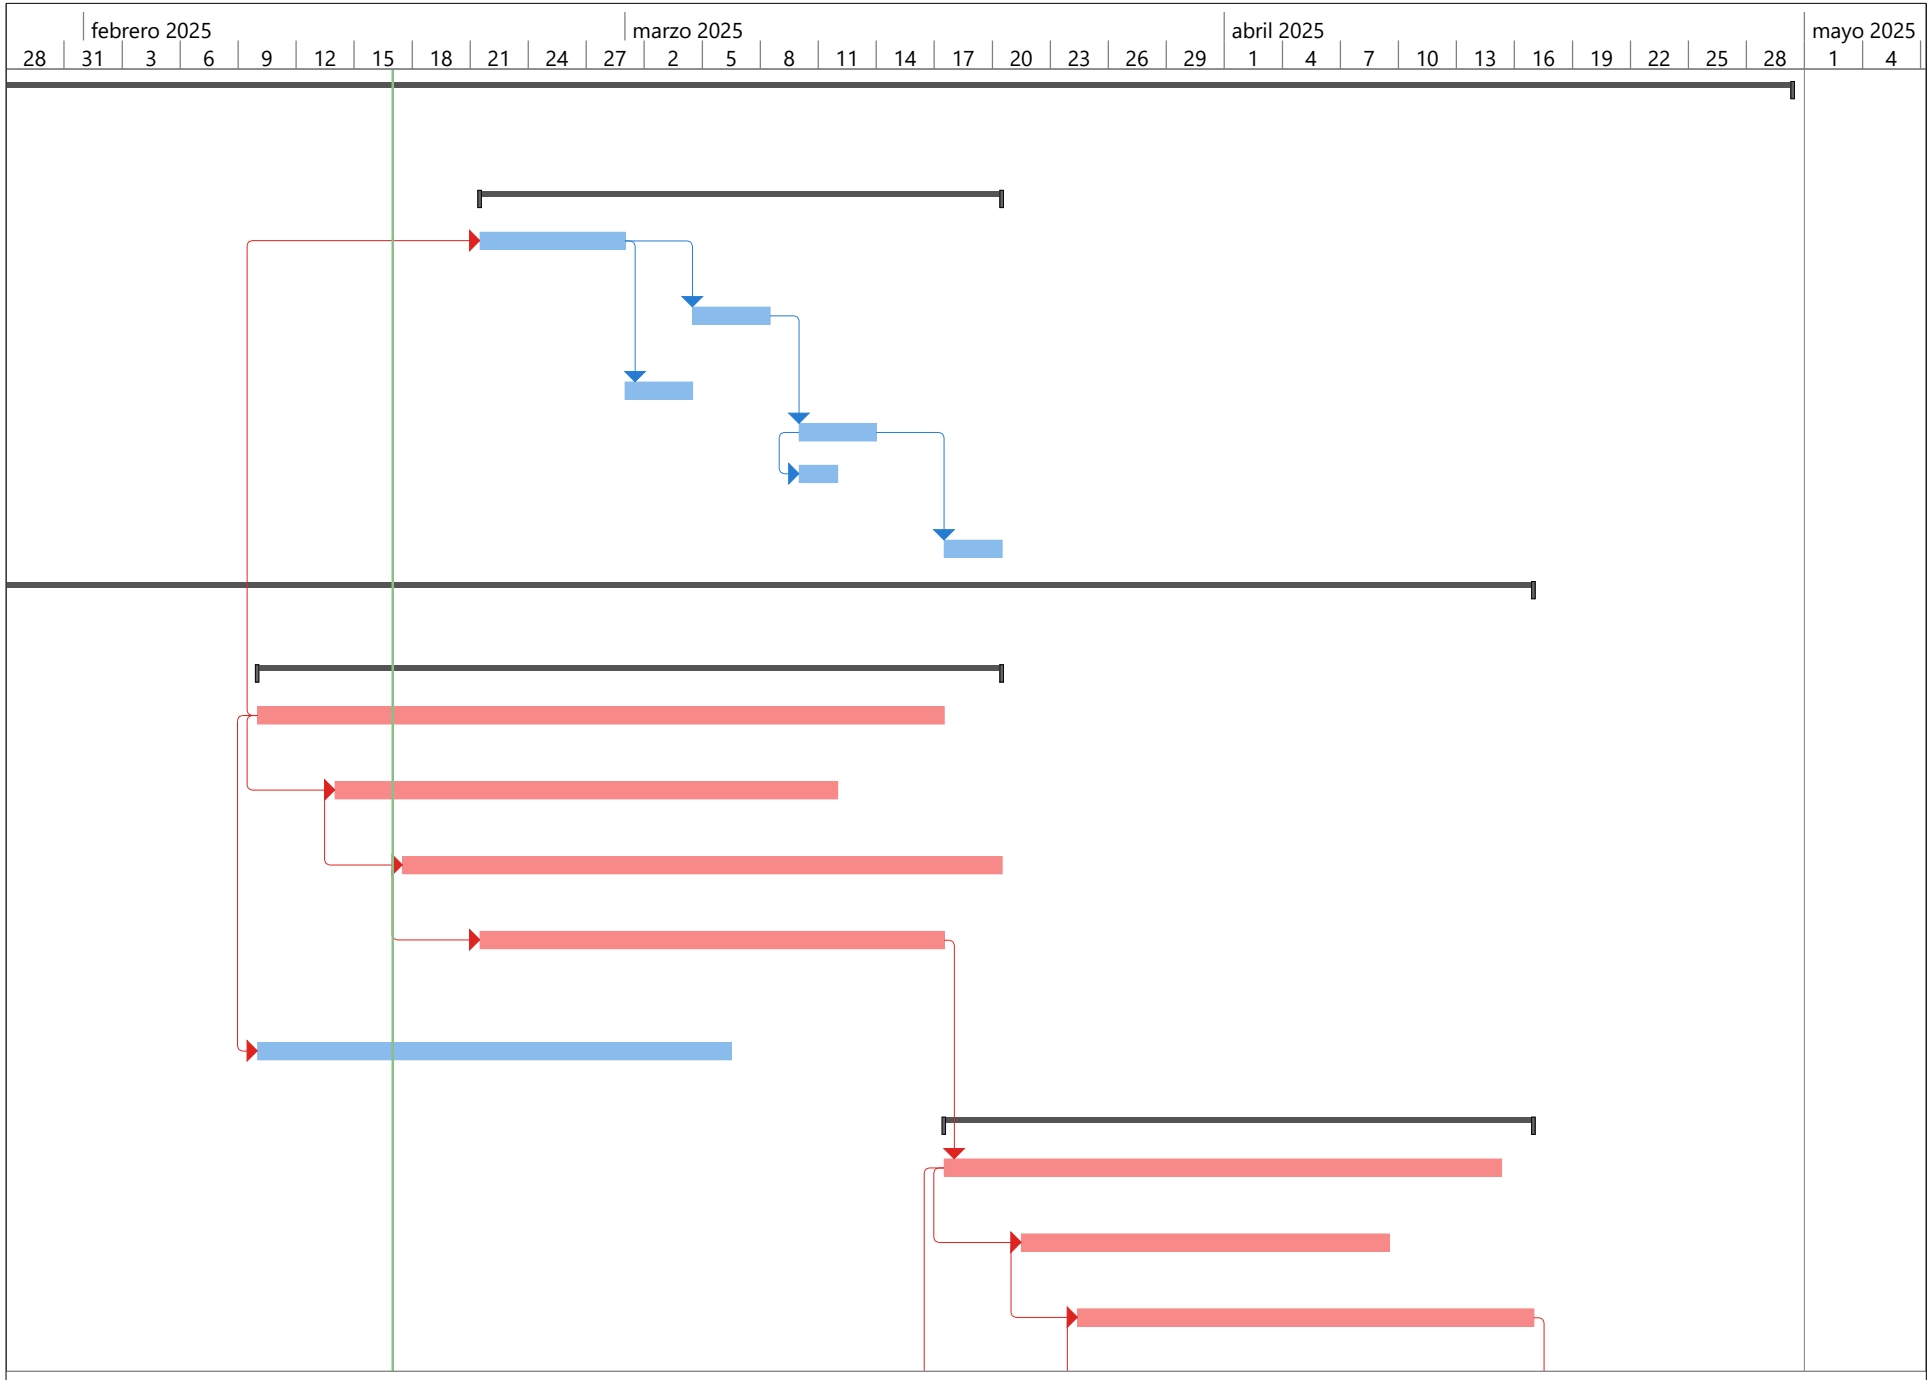
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**PROYECTO VÍA SAN LUCAS - LA ESMERALDA SANTA ROSA DEL SUR**	**192.7 días**	**mar 9/17/24**	**mié 4/30/25**	
2	**INICIO OBRAS**	0 días	mar 9/17/24	mar 9/17/24	
3	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m**	**21 días**	**vie 2/21/25**	**jue 3/20/25**	
4	Excavaciones varias en material común en seco.	6 días	vie 2/21/25	vie 2/28/25	13CC+10 días
5	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	4 días	mar 3/4/25	sáb 3/8/25	4FC+2 días
6	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	2 días	sáb 3/1/25	mar 3/4/25	4
7	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	4 días	lun 3/10/25	jue 3/13/25	5
8	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	2 días	lun 3/10/25	mar 3/11/25	7CC
9	Relleno para Estructuras con suelo	3 días	lun 3/17/25	jue 3/20/25	7FC+2 días
10	**PLACA HUELLA**	**179.7 días**	**mar 9/17/24**	**jue 4/17/25**	
11	Subbase Granular Clase C.	20 días	mar 9/17/24	vie 10/11/24	
12	**TRAMO 2**	**31 días**	**lun 2/10/25**	**jue 3/20/25**	
13	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	28 días	lun 2/10/25	lun 3/17/25	
14	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	20 días	vie 2/14/25	mar 3/11/25	13CC+4 días
15	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	25 días	lun 2/17/25	jue 3/20/25	14CC+2 días
16	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	18 días	vie 2/21/25	lun 3/17/25	15CC+4 días
17	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	20 días	lun 2/10/25	jue 3/6/25	13CC
18	**TRAMO 1**	**26 días**	**lun 3/17/25**	**jue 4/17/25**	
19	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	24 días	lun 3/17/25	mar 4/15/25	16
20	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	16 días	vie 3/21/25	mié 4/9/25	19CC+4 días
21	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	20 días	lun 3/24/25	jue 4/17/25	20CC+2 días

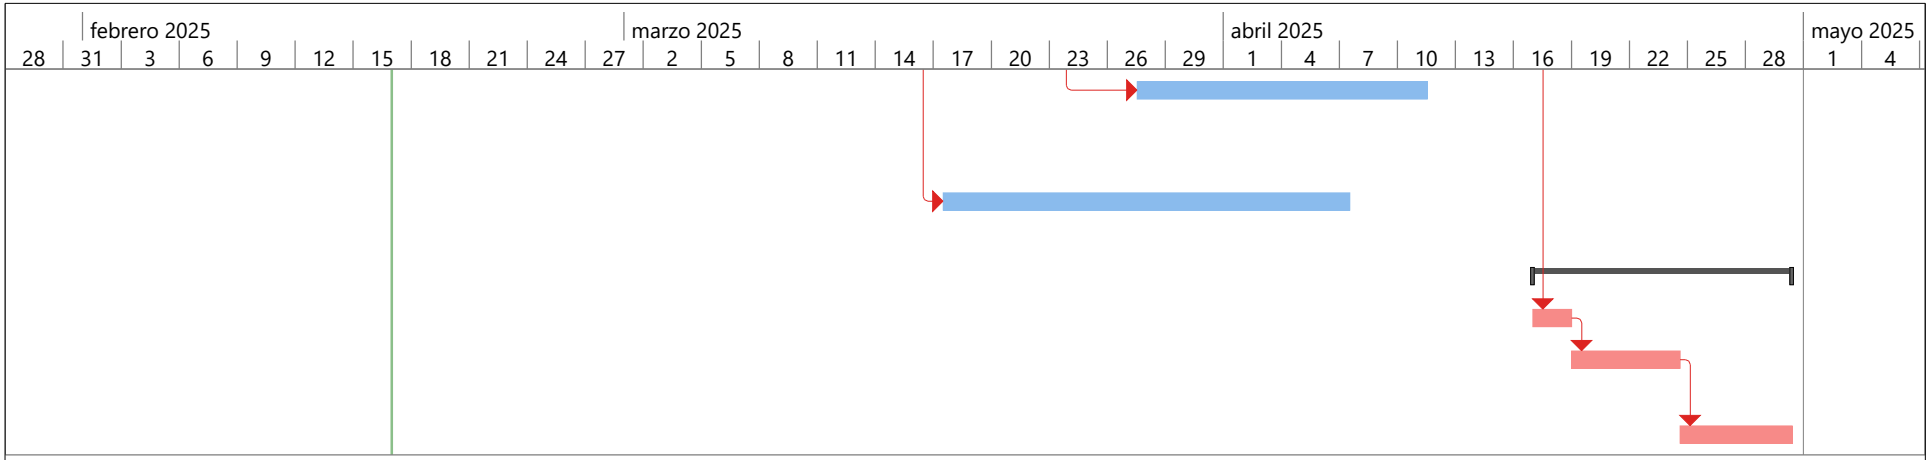


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
22	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	12 días	jue 3/27/25	vie 4/11/25	21CC+4 días
23	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	18 días	lun 3/17/25	lun 4/7/25	19CC
24	**MANTENIMIENTO**	**13 días**	**jue 4/17/25**	**mié 4/30/25**	
25	Conformación de la calzada existente	4 días	jue 4/17/25	vie 4/18/25	21
26	Excavación en material común de la explanación y canales	5 días	vie 4/18/25	jue 4/24/25	25
27	Afirmado	4 días	jue 4/24/25	mié 4/30/25	26

julio 2021

18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18


febrero 2025
marzo 2025
abril 2025
mayo 2025
28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4


febrero 2025
marzo 2025
abril 2025
mayo 2025
28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	26 (Día)	2 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3376 DE 2024 **CONTRATISTA:** PANAMERA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648

FECHA DE INICIO: 17/09/2024

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.145.517.040,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.200.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3493 DE 2024 **INTERVENTOR:** EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.551.704,00	28	8	2024	28	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 229.103.408,00	28	8	2024	1	11	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 229.103.408,00	28	8	2024	28	6	2025
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 310.815.226,00	28	8	2024	28	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101234407

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	28	8	2024	28	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067606 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	26 (Día)	2 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.000.000,00	28	8	2024	28	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 229.103.408,00	28	8	2024	28	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.000.000,00	28	8	2024	28	2	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 340.585.244,00	28	8	2024	28	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101234407

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	28	8	2024	28	2	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067606 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
