CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2210723 DE 2021
INFORME No. 14 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$9.600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2023		
ADICIÓN EN TIEMPO	OCHO (8) MESES		
TIEMPO TOTAL	VEINTICUATRO (24) MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YURIS CAMPO BELTRAN		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$8.999.904.640	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$600.095.360

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	$960.000.000	12/11/ 2021	17/11/20 23

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	19/12/2021	15/03/2022	$ 960.000000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio		22/07/2022	$960.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio		8/08/2023	$2.880.000.000,00
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$4.800.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
02/2022 A 03/2022	$577.846,83	$577.846,83
03/2022 A 04/2022	$1.020.578,30	$1.020.578,30
04/2022 A 05/2022	$1.055.763,72	$1.055.763,72
05/2022 A 06/2022	$1.020.535,86	$1.020.535,86
07/2022	$1.394.494,66	$1.394.494,66
08/2022	$1.052.878,70	$1.052.878,70
09/2022	$576.457,95	$576.457,95
10/2022	$527.245,15	$527.245,15
11/2022	$510.622,76	$510.622,76
12/2022	$527.810,24	$527.810,24
01/2023	$528.076,82	$528.076,82
02//2023	$476.706,74	$476.706,74
03/2023	$527.371,21	$527.371,21
04/2023	$510.243,37	$510.243,37

05/2023	$527.213,42	$527.213,42
06/2023	$510.224,34	$510.224,34
07/2023	$527.267,49	$527.267,49
08/2023	$2.237.665,56	$2.237.665,56

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 001-2022		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$600.095.360
Nombre contratista		CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS	
Fecha Firma del contrato		23/03/2022	
Plazo contrato		8 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato		19 DE MAYO DE 2022	
Suspensión N°1		29/09/2022	
Ampliación a la suspensión N° 1		12/11/2022	
Reinicio N°1		12/12/2022	
Suspensión N° 2		15/12/2022	
Ampliación a la suspensión N° 2		6/01/2023	
Reinicio N°2		6/02/2023	
Suspensión N° 3		23/05/2023	
Fecha de Terminación del contrato según acta de reinicio N°2		23 DE MAYO DE 2023	
REINICIO N° 3		1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
PRORROGA 1		4 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		31 DE DICIEMBRRE DE 2023	

	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%15	%15	$90.014.304	#1391	09/08/2022
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					

	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$90.014.304**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**7.003%**	
	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO				
PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101379053 RESOLUCION DE APROBACION Nº 032 DE 18 DE MAYO DE 2022	11/07/2022	CUMPLIMIENTO	$60.009.536	19/05/2022	19/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536	19/05/2022	19/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536	19/01/2023	19/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$90.014.304	19/05/2022	19/05/2023

	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2				
POLIZA N°	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
21-44-101379053	21/02/2023	CUMPLIMIENTO	$60.009.536,00	**19/05/2022**	**23/09/2023**
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536,00	**19/05/2022**	**23/05/2026**
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536,00	**19/01/2023**	**19/01/2028**
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 90.014.304,00	**19/05/2022**	**23/09/2023**

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA Nº 007 DE 2022		CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$8.999.322.870
Nombre contratista	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22		
Fecha Firma del contrato	02 DE MAYO DE 2022		

Plazo contrato	OCHO (8) MESES
Fecha del acta de inicio del contrato	19 DE MAYO DE 2022
Suspensión N°1	29/09/2022
Ampliación a la suspensión N° 1	12/11/2022
Reinicio N° 1	12/12/2022
Suspensión N°2	18/12/2022
Ampliación a la suspensión N° 2	06/01/2023
Reinicio N° 2	06/02/2023
Suspensión N°3	23/05/2023
Fecha de Terminación del contrato de acuerdo a acta de reinicio N° 2	23 DE MAYO DE 2023
REINICIO N° 3	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° 1	4 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	ANTICIPO	15%	15%	$1.349.898.430,50	1392	09/08/2022
	PRIMER PAGO	16.02%	16.02 %	$1.441.370.340,00	1774-2019	27/07/2023 - 18/08/2023
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$2.575.063.219,50**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**28.61%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
96-44-101173847	25/07/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	02/05/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	02/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022	02/01/2026

		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS

POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101173847	20/02/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	23/09/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	23/09/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022	23/05/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: EL CONTRATO SE NCUENTRA SUSPENDIDO.
El contrato de obra N° 007 y contrato de interventoría N° 001 se encontraban suspendidos desde el 23 de mayo de 2023, las causas de dicha suspensión se encuentran en el acta de suspensión N° 3 que fue entregada a ustedes. El día 1 de septiembre de 2023 se firmó acta de reinicio y prorroga N° 1 a los contratos específicos por un tiempo adicional de cuatro (4) meses, quedando como fecha de terminación de los contratos específicos el día 31 de diciembre de 2023. Durante el periodo transcurrido del 1 al 30 de septiembre de 2023 el contratista ejecutó las siguientes actividades.

AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023								PORCENTAGE DE AVANCE POR ACTIVIDAD
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL-MODIF 1	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO PRESENTE MES CON AIU	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO TOTAL CON AIU	
1. PATINODROMO Y GRADERIAS								
1. PRELIMINARES								
1.1. OBRAS PRELIMINARES								
1.1.1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos y referencias.	M2	39.270,22	$ 2.414,00	**$ -**	**39.270,22**	**$ 123.237.804,40**	100,00%
2. PISTA DE PATINAJE - PISTA DE VELOCIDAD, PISTA DE RUTA Y ZONA TECNICA								
2.1 PISTA DE VELOCIDAD 200m								
2.1.1	Conformación en planta de la zona a intervenir. Incluye mano de obra, equipos y herramientas necesarios.	M2	3.147,78	$ 963,00	**$ -**	**3.147,78**	**$ 3.940.705,78**	100,00%
2.1.2	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m.	M3	944,33	$ 15.244,00	**$ -**	**944,33**	**$ 18.713.976,48**	100,00%
2.1.3	CONFORMACIÓN EN AFIRMADO	M3	936,43	$ 101.762,00	**$ -**	**936,43**	**$ 123.880.886,56**	100,00%
2.1.4	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	786,94	$ 101.394,00	**$ 103.728.931,96**	**786,94**	**$ 103.728.931,96**	100,00%
2.1.5	BASE GRANULAR, CBR >80% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	314,78	$ 128.194,00	**$ 52.458.436,21**	**314,78**	**$ 52.458.436,21**	100,00%
2.1.6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.	M2	3.147,78	$ 6.963,00	**$ 28.493.384,35**	**3.147,78**	**$ 28.493.384,35**	100,00%
2.1.7	CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	M2	3.147,78	$ 43.709,00	**$ 178.862.176,73**	**3.147,78**	**$ 178.862.176,73**	100,00%
2.1.8	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	ML	213,58	$ 72.356,00	**$ 9.353.454,51**	**99,44**	**$ 9.353.454,51**	46,56%
2.2 PISTAS DE PATINAJE - PISTA DE RUTA 400m								
2.2.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	2.532,20	$ 963,00	**$ -**	**2.532,00**	**$ 3.169.810,80**	99,99%

2.2.2	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m.	M3	759,66	$ 15.224,00	$ -	**759,66**	$ **15.034.582,99**	100,00%
2.2.3	CONFORMACIÓN EN AFIRMADO	M3	455,80	$ 101.762,00	$ -	**455,80**	$ **60.298.055,48**	100,00%
2.2.4	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	633,05	$ 101.394,00	$ -	**633,05**	$ **83.443.713,21**	100,00%
2.2.5	BASE GRANULAR, CBR >80% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	253,22	$ 128.194,00	$ -	**253,22**	$ **42.199.595,09**	100,00%
2.2.6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.	M2	2.532,20	$ 6.963,00	$ **22.921.180,45**	**2.532,20**	$ **22.921.180,45**	100,00%
2.2.7	CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	M2	2.532,20	$ 43.709,00	$ **143.883.653,04**	**2.532,20**	$ **143.883.653,04**	100,00%
2.2.8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.75m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	383,74	$ 72.356,00	$ -	**383,74**	$ **36.095.658,87**	100,00%
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	102,32	$ 988.377,00	$ -	**102,32**	$ **131.469.955,03**	100,00%
2.2.12	ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	6.918,76	$ 7.723,00	$ -	**6.918,76**	$ **69.463.658,52**	100,00%
2.2.14	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS.	ML	667,96	$ 238.544,00	$ -	**667,96**	$ **207.138.523,08**	100,00%
3. GRADERÍAS PISTAS DE PATINAJE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	3.217,39	$ 33.653,00	$ -	**3.116,19**	$ **136.329.884,69**	96,85%
3.1.3	RELLENOS COMPACTADOS CONBMATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES,SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACION HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO	M3	4.914,02	$ 17.345,00	$ **48.655.378,79**	**3.116,19**	$ **70.265.410,22**	63,41%
3.1.4	NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE CORTE MANUAL.	M3	151,47	$ 33.653,00	$ **6.430.458,32**	**146,99**	$ **6.430.458,32**	97,04%
3.2. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO								
3.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.	M3	33,81	$ 544.708,00	$ -	**20,37**	$ **14.423.075,69**	60,24%


3.2.2	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	48,71	$ 806.301,00	**$ 241.084,00**	**48,71**	**$ 51.057.398,22**	100,00%
3.2.3	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	100,45	$ 722.301,00	**$ -**	**100,45**	**$ 94.325.432,05**	100,00%
3.2.4	PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	13,84	$ 808.361,63	**$ -**	**13,84**	**$ 14.548.245,93**	100,03%
3.2.5	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	2,80	$ 988.377,00	**$ 1.824.543,94**	**2,26**	**$ 2.903.851,63**	80,71%
3.2.6	GRADERIAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI - DE ESPESOR - E=0.12m. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. FUNDIR EN UNA SOLA ETAPA.	M3	45,63	$ 979.945,00	**$ 27.508.600,54**	**42,83**	**$ 54.566.841,88**	93,87%
3.2.7	ESCALERAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M3	5,85	$ 1.041.154,00	**$ -**	**2,08**	**$ 2.815.280,42**	35,53%
3.2.8	COLUMNAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M3	21,70	$ 1.043.900,00	**$ -**	**21,70**	**$ 29.448.419,00**	100,00%
3.2.9	VIGAS AEREAS EN CONCRETO fc 3500 Psi, SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO, INCLUYE FORMALETA	M3	89,44	$ 1.003.683,00	**$ -**	**37,79**	**$ 49.307.934,74**	42,25%
3.2.10	PLACAS AEREAS EN CONCRETO fc:3500psi SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO, INCLUYE FORMALETA	M2	228,80	$ 171.372,00	**$ -**	**118,04**	**$ 26.297.376,14**	51,59%
3.2.14	ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	55.468,83	$ 7.723,00	**$ -**	**31.350,37**	**$ 314.754.552,25**	56,52%
3.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS, RECUBRIMIENTOS LATERALES Y CUBIERTAS								
3.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50cm, CONECTORES Y ACABADO FINA	KG	18.471,96	$ 18.527,00	**$ 181.314.245,54**	**8.303,51**	**$ 199.990.835,95**	44,95%
3.6.12	TUBERÍA P.V.C.-S 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	140,50	$ 158.193,00	**$ -**	**9,40**	**$ 1.933.118,46**	6,69%

3.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS								
3.8.5	TUBERÍA P.V.C.-S 10", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	134,46	$ 132.327,00	**$ 2.064.301,20**	**23,90**	**$ 4.111.399,89**	17,77%
4. - 4.1 PRELIMINARES - CANCHA MÚLTIPLE								
4.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	925,00	$ 963,00	**$ -**	**925,00**	**$ 1.158.007,50**	100,00%
5 CANCHA MÚLTIPLE Y DRENAJE CANCHA								
5.1 CANCHA MÚLTIPLE EN CONCRETO								
5.1.1	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE.	M3	185,00	$ 15.224,00	**$ 3.661.372,00**	**185,00**	**$ 3.661.372,00**	100,00%
5.1.2	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	185,00	$ 101.394,00	**$ 24.385.257,00**	**185,00**	**$ 24.385.257,00**	100,00%
5.1.6	CANCHA EN CONCRETO f'c=3.000PSI - E=15cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	925,00	$ 120.595,00	**$ 145.015.487,50**	**925,00**	**$ 145.015.487,50**	100,00%
6. GRADERÍAS CANCHA MÚLTIPLE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
6.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	30,08	$ 33.653,00	**$ 1.315.966,91**	**30,08**	**$ 1.315.966,91**	100,00%
6.1.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	30,08	$ 17.345,00	**$ 678.258,88**	**30,08**	**$ 678.258,88**	100,00%
8. ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VÍAS								
8.1 TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES								
8.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	5.191,52	$ 963,00	**$ -**	**5.191,52**	**$ 6.499.260,26**	100,00%

8.1.2	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	1.038,30	$ 101.394,00	**$ 30.079.869,62**	**335,22**	**$ 44.185.699,47**	32,29%
8.1.5	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	ML	1.906,89	$ 72.356,00	**$ 35.010.174,16**	**372,20**	**$ 35.010.174,16**	19,52%
8.3 ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES								
8.3.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	1.068,24	$ 963,00	**$ -**	**1.068,24**	**$ 1.337.325,90**	100,00%
9. PARQUEADERO VEHICULAR								
9.1 PARQUEADERO								
9.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	4.254,46	$ 963,00	**$ -**	**4.254,46**	**$ 5.326.155,97**	100,00%
13. ZONAS EXTERIORES - ANDENES, ZONAS DE JUEGOS, ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO EXTERIOR								
13.1 TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES								
13.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	1.696,63	$ 33.653,00	**$ -**	**0,00**	**$ -**	0,00%
13.1.2	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO Y/O ESTAMPADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm.	M2	6.201,29	$ 93.356,06	**$ 112.830.460,86**	**1.406,91**	**$ 170.746.039,87**	22,69%
TOTAL DE AVANCE DE OBRA MAYO DE 2023					**$ 1.172.380.464,00**		**$ 2.982.280.451,65**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							**$ 8.999.322.870,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE					**13,03%**	**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO**	**33,14%**	

A continuación, se presenta el cuadro de los porcentajes programados Vs ejecutado

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES Y PORCENTAJE ACUMULADO		
MES	**% EJECUTADO**	**%PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN PRORROGA 1**
MAYO 2022	0,22%	0,00%
JUNIO 2022	1,18%	0,46%
JULIO2022	0,22%	0.89%
AGOSTO 2022	2,34%	4,00%
SEPTIEMBRE 2022	3,01%	6,36%
FEBRERO 2023	5,04%	2,73%
MARZO 2023	4,00%	6,85%
ABRIL2023	1,46%	10,54%
MAYO 2023	2,63%	10,55%
SEPTIEMBRE 2023	13.03%	21.16
ACUMULADO	**33.14%**	**42,31%**

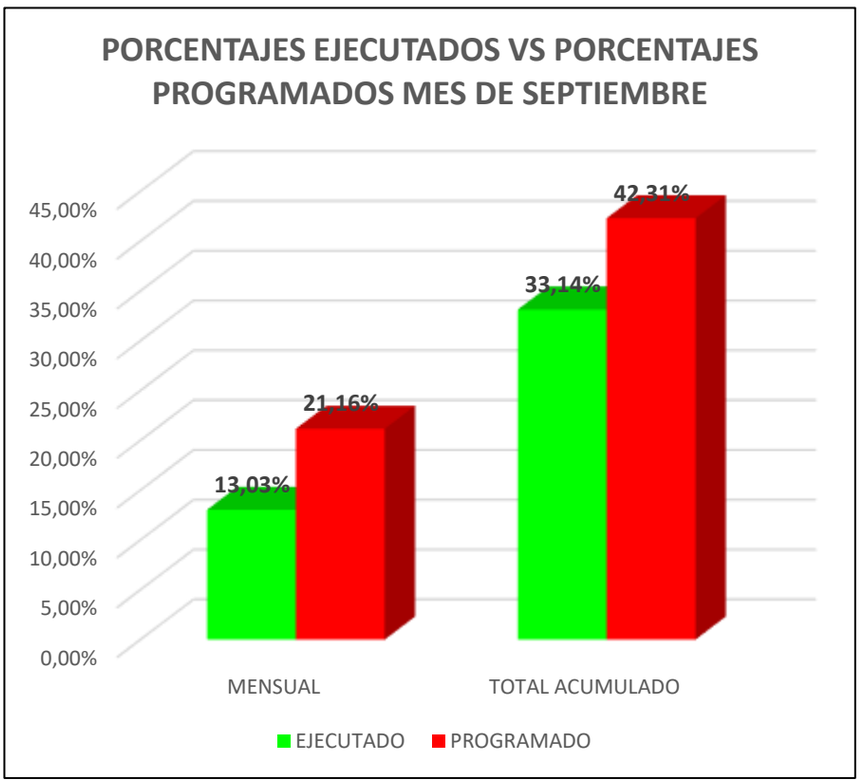

YURYS CAMPO BELTRAN
SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRAFICO





SUB BASE GRANULAR, CBR >30%





BASE GRANULAR, CBR>80%



TOMA DE DENSIDADES DE COMPACTACIÓN





IMPRIMACIÓN BASE GRANULAR





CONCRETO ASFALTICO





BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.



GRADERIA

