ALCALDÍA DE FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CONTRATO ESPECÍFICO Nº 086-2210731 DE 2021
INFORME No. 29 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30, DE NOVIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "**CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA**" QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$ 34.000.000.000
	MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		$ 4.692.432.704
	ADICIÓN MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		$4.558.952.179
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$43.251 384.883
PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL: 23 MESES PRORROGA No1: 3 MESES PRORROGA No2: 5 MESES FINAL: 31 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/11/2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	GLADYS GONZALEZ GONZALEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	28/06/2022	31/12/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/06/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 12/08/2022 (MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO) MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 24/03/23 (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 28/08/24 (PRORROGA)		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/02/2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO	$41.070.430.107	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA LA INTERVENTORIA**	$2.180 954 776

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
POLIZA 8001004713 AXA COLPATRIA, FECHA APROBACION 28/06/2022	28/06/2022	CUMPLIMIENTO	$ 3.400.000.000	28/06/2022	28/01/2025
		CUMPLIMIENTO	$ 3.400.000.000	30/08/2023	28/04/2025
		CUMPLIMIENTO	$ 3.400.000.000	04/09/2024	28/10/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	**FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	17/07/2022	19/08/2022	**$6.800.000.000**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	31/09/2023	21/11/2023	**$6.800.000.000**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	17-04-2024	22/04/2024	**$6.800.000.000**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	19-07-2024	23/07/2024	**$6.800.000.000**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$27.200.000.000**

Una vez suscrito el Contrato Específico, desde el punto de vista presupuestal, el municipio de FUNZA, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 020 del día 25, del mes enero del año 2022, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 2022000962 y 2022000964, adicionalmente mediante ACUERDO No. 05 DE 2022 (06 DE MAYO DE 2022) permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No. 2023000085 y No. 2023000086 todos ellos soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LP-002-2022 Y CM-005-2022, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	2022000964	20/04/2022	$36.735.638.505		$0
RP	20220011615	13/09/2022		$36.735.638.505	
CDP	2023000085	02/01/2023	$4.334.791.602		$0
RP	2023000007	02/01/2023		$4.334.791.602	
Interventoría					
CDP	2022000962	19/04/2022	$1.956.794.199		$0
RP	2022001706	04/10/2022		$1.956.794.199	
CDP	2023000086	02/01/2023	$224.160.577		$0
RP	2023000008	02/01/2023		$224.160.577	
Total			**$43.251.384.883**	**$43.251.384.883**	**$0**

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No 01 a 04)

Se detalla el valor de adición presupuestal al contrato especifico, cuya motivación nace de la actualización de precios referencia ICCU 2021 con el cual se presupuestó inicialmente el proyecto y la necesidad de actualizarlos a vigencia 2022 dado que es este año cuando se adelantan los contratos derivados se anexan los soportes presupuestales del mismo.

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	2023000085	02/01/2023	$4.334.791.602		$0
RP	2023000007	02/01/2023		$4.334.791.602	
Interventoría					
CDP	2023000086	02/01/2023	$224.160.577		$0

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

RP	2023000008	02/01/2023		$224.160.577	
Total			**4.558.952.179**	**4.558.952.179**	**$0**

Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se aperturó una Cuenta de Ahorros No. 462100110420, en el banco DAVIVIENDA denominada: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO - ENTERRITORIO de fecha 05 del mes enero del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	6.800.000.000	6.800.000.000	19/08/2022	0
	Transferencia 2	6.800.000.000	6.800.000.000	21/11/2023	0
	Transferencia 3	6.800.000.000	6.800.000.000	22/04/2024	0
	Transferencia 4	6.800.000.000	6.800.000.000	23/07/2024	0
	Transferencia 5	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
	Transferencia 6	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		**34.000.000.000**	**27.200.000.000**		**6.800.000.000**
ALCALDIA DE FUNZA					
	Transferencia 1	1.956.794.199	0	N/A	1.956.794.199
	Transferencia 2	2.735.638.505	0	N/A	2.735.638.505
	Transferencia 3	4.334.791.602	0	N/A	4.334.791.602
	Transferencia 4	224.160.577	0	N/A	224.160.577
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDIA DE FUNZA		**9.251.384.883**	**0**		**9.251.384.883**

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros No 462100110420, del mes 11 del año 2024, además, se adiciona el soporte del traslado de los mismos a la cuenta del tesoro nacional, Folios del 05 al 07

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes 01 del año 2022 hasta el mes 11 del año 2024 de los recursos aportados por ENTerritorio, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco DAVIVIENDA, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de FUNZA a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Febrero 2022	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	$ 8.343.819,35	8,343,819.35
Septiembre	$ 19.263.901,25	19.263.901.25
Octubre	$ 51.304.346,88	51.304.346.88
Noviembre	$ 49.663.841,91	49.663.841 ,91
Diciembre	$ 68.560.485,26	68.560.485.26
Enero de 2023	$ 68.411.671,42	68.411.671.42
Febrero de 2023	$ 61.872.026,08	61.872.026.08
Marzo de 2023	$ 68.507.665,46	68.507.665,46
Abril de 2023	$ 24.649.866,12	24.649.866,12
Mayo de 2023	$ 70.175,04	1.444.645,04
Junio 2023	$ 4.095,71	1.061.576,71
Julio 2023	$ 3.487,43	756,392.43
Agosto 2023	$ 679,87	679.87
Septiembre 2023	$ 3.991,06	447,835.08
Octubre 2023	$ 2.332,66	97.457.99
Noviembre 2023	$ 21.631.079,06	21.631.100,06
Diciembre 2023	$ 53.929.746,10	53.929.746,10
Enero 2024	$ 32.250.787,14	32.250.787,14
Febrero 2024	$ 30.064.191,24	30.064.191,24
Marzo 2024	$ 31.484.330,69	31.484.330,69
Abril 2024	$ 46.183.769,43	46.183.769,43
Mayo 2024	$ 71.448.821,81	71.448.821,81
Junio 2024	$ 62.032.156,10	62.032.156,10
Julio 2024	$ 80.021.833,52	80.021.833,52
Agosto 2024	$ 116.394.685,37	116.394.685,37
Septiembre 2024	$ 104.783.998,08	$ 104.783.998,08
Octubre 2024	$ 79.290.527,23	$ 79.290.527,23
Noviembre 2024	$ 68.560.454,58	
Total	$ 1.218.738.765,85	$ 1.150.178.311,27

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o en general que señale todos los meses, además, se adiciona el soporte del Traslado de los mismos a la cuenta del tesoro Folios No 05 a 07

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso de que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	CO1.PCCNTR.3952242 DE 2022		
Objeto	CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
Valor	$ 41.070.430.107,00	Cuenta o encargo Fiduciario	04000006639 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Valor Anticipo	$ 8.214.086.021,00	Valor Girado	$8.214.086.021,00
Porcentaje	20%	Fecha de Giro	13 abril 2023
Detalle Orden	**Valor Orden**	**Fecha**	**Saldo Anticipo**
			$ 0
Total			0

Rendimientos Financieros del Anticipo		
Periodo	**Valor Rendimientos**	**Valores Transferidos**
GENERADOS ABRIL-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 1,374,470.00	$ 1,374,470.00 (TRANSFERIDO EN MES DE MAYO CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
GENERADOS MAYO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 1,057,481.00	TRANSFERIDO EN MES DE JUNIO DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
GENERADOS JUNIO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 752,905.00	TRANSFERIDO EN MES DE JULIO DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
GENERADOS JULIO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 443,844.02	TRANSFERIDO EN MES DE SEPTIEMBRE DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
GENERADOS AGOSTO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 95,101.33	TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
GENERADOS SEPTIEMBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 24,00	TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
GENERADOS OCTUBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA)	$ 21,00	TRANSFERIDO EN MES DE NOV DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)
ENTRA EN LIQUIDACION FIDUCIA NOVIEMBRE (NO GENERA MAS RENDIMIENTOS)		
Total	**$ 3.723.846,35**	

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Se adjuntó el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional hasta cuando fue invertido el anticipo por parte del contratista.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del contrato específico, con corte al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**noviembre-24**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$10.562.333.072,22
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS (RENDIMIENTOS FIDUCIA)	$ 68.560.454,58
	RENDIMIENTOS TOTALES	$ 68.560.454,58
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	TOTAL INGRESOS	$ 68.560.454,58
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	TASAS PRODEPORTE	$ 120.472.700,00
	CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD	$ 726.297.000,00
	ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 145.259.400,00
	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$ 290.518.800,00
	TRASLADO RENDIMIENTOS (octubre)	$ 79.290.527,23
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	DESCUENTOS	
	RTE FUENTE	$ 290.519.689,00
	ICA	$ 87.156.000,00
	OTROS ()	
	TOTAL, EGRESOS	$ 1.774.997.316,23
	SALDO FINAL MES	$ 8.855.896.210,57

Se adjunta el extracto correspondiente.

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar la fecha de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

NOTA: La secretaría de hacienda del municipio de Funza determinó que los recursos aportados por el municipio en el marco del presente contrato específico serán

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

desembolsados a los contratos derivados de obra e interventoría directamente de las cuentas propias de la administración, a fin de generar eficiencia en el manejo de los recursos, por lo anterior el cuadro "**Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos"** reflejará solo los recursos aportados por ENTerritorio, a continuación se relaciona el manejo de recursos aportados por el municipio.

Manejo recursos aportados por el municipio:

CONCEPTO	DETALLE	agosto-24
INGRESOS	RENDIMIENTOS TOTALES	
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	0
	TOTAL INGRESOS	
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	DESCUENTOS	
	RTE FUENTE	
	OTROS	0
	TOTAL EGRESOS	

Balance General de la Contratación Derivada

Se relacionan los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de obra

Objeto del Contrato Derivado:	**CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**					
Número Contrato	CO1.PCCNTR.3952 242	**Valor:**	$ 41.070.430.10		**Plazo:**	23 Meses
Nombre del Contratista	CONSORCIO COLISEO 2022					
Fecha de firma del contrato	*9/09/2022*	**Fecha de acta de inicio**		23 DICIEMBRE 2022	**Fecha de Terminación del contrato**	28 DE ENERO 2025
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**Amortización Anticipo**	**No. Comprobante de egreso**	**Fecha de pago**
Anticipo	$8.214.086.021,00	0	8.214.086.021,00	0	2023001743	13/05/2023
Acta Parcial No 1	1.493.965.591,00	192.721.612,00	1.002.450.860,80	298,793,118.20	2023002531	14/06/2023
Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	357.827.128,07	1.861.255.836,73	554.770.741,20	2023004506	31/08/2023
Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	340.652.425,79	1.771.920.757,41	528.143.295,80	2023006008	25/10/2023
Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	313.544.926,68	1.630.919.734,92	486.116.165,40	2023007458	12/12/2023
Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	375.142.896,11	1.951.324.676,69	581.616.893,20	2023008182	27/12/2023
Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	428.994.703,34	2.231.437.565,46	665.108.067,20	2024000685	03/05/2024
Acta Parcial No 7	6.023.636.882,00	777.049.600,00	4.818.909.505,60	$1.204.727.376,4	2024004826	26/09/2024
TOTAL						
Saldo Contrato	$ 15.579.241.456,40					

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	1.493.965.591,0	1.493.965.591,00		192.721.612,0	12.9%			192.721.612,0
Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	2,773,853,706.00		357.827.128,07	12.9%			357.827.128,07
Acta Parcial No 3	2.640.716.479,0	2.640.716.479,00		340.652.425,79	12.9%			340.652.425,79
Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	2.430.580.827,00		313.544.926,68	12.9%			313.544.926,68
Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	2.908.084.466,00		375.142.896,11	12.9%			375.142.896,11
Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	3.325.540.336,00		375.142.896,11	12.9%			428.994.703,34
Acta Parcial No 7	6.023.636.882,00	6.023.636.882,00		777.049.600,00	12.9%			777.049.600,00
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato de Interventoría

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA					
Número Contrato	CO1.PCCNTR.4047655	**Valor:**	$ 2.180.954.776		**Plazo:**	23 meses
Nombre del Contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2022					
Fecha de firma del contrato	*3/10/2022*	**Fecha de acta de inicio**		23/12/2022	**Fecha de Terminación del contrato**	28/01/2025
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**Amortización Anticipo**	**No. Comprobante de egreso**	**Fecha de pago**

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Balance Financiero Contrato Específico

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Contrato específico señalando el valor adeudado por el Fondo Regional de Contratos Plan, el manejo del recursos frente a los valores adeudaos a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	6.800.000.000	6.800.000.000	19/08/2022	0
	Transferencia 2	6.800.000.000	6.800.000.000	21/11/2023	0
	Transferencia 3	6.800.000.000	6.800.000.000	22/04/2024	0
	Transferencia 4	6.800.000.000	6.800.000.000	23/07/2024	0
	Transferencia 5	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
	Transferencia 6	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

ALCALDÍA DE FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		**34.000.000.000**	**27.200.000.000**	**VALOR ADEUDADO POR ENTERRITORIO**	**6.800.000.000**
ALCALDÍA DE FUNZA					
	Transferencia (Inter)	1.956.794.199			1.956.794.199
	Transferencia (obra)	2.735.638.505			
	Transferencia (obra)	4.334.791.602			0
	Transferencia (inter)	224.160.577			224.160.577
	Transferencia 0 (anticipo obra)		1.414.086.021	13/04/2023	
	Transferencia 1 (corte 1 obra)		1.195.172.472,8	14/06/2023	0
	Transferencia 2 (corte 2 obra)		2.219.082.964,8	31/08/2023	0
	Transferencia 3 (corte 3 obra)		2.112.573.183,2	25/10/2023	0
	Transferencia 4 (corte 4 obra)		129.515.465,20	12/12/2023	0
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDÍA DE FUNZA		**9.251.384.883**	**$7.070.430.107**	**VALOR ADEUDADO POR LA ALCALDÍA DE FUNZA**	$ 2.180.954.776
CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO ESPECIFICO					
CONTRATO DE OBRA					
	Anticipo	8.214.086.021	8.214.086.021	13/04/2023	0
	Acta Parcial No 1	1.493.965.591	1.195.172.472,8	14/06/2023	0
	Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	2.219.082.964,8	31/08/2023	0
	Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	2.112.573.183,2	25/10/2023	0
	Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	1.944.464.661,6	12/12/2023	0
	Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	2.326.467.572,8	27/12/2023	0
	Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	2.660.432.268,8	03/05/2024	0
	Acta Parcial No 7	6.023.636.882,00	4.818.909.505,6	26/09/2024	0
VALOR PAGADO		20.672.279.145,0		**VALOR ADEUDADO**	20.398.150.962,00
CONTRATO INTERVENTORÍA					
	Anticipo	0	0	N/A	
	Acta Parcial No 1				
	Acta Parcial No 2				
VALOR PAGADO		**0**	**0**	**VALOR ADEUDADO**	**2.180.954.776**

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

ALCALDÍA DE FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	$ 2.180.954.776
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2022	
Fecha Firma del contrato	*3/10/2022*	
Plazo contrato	23 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	23/12/2022	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.	Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 Reinicio No 1 20/08/2024 Prorroga No 1 tres (3) días Prorroga No 2 cinco (5) meses	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	28/01/2025	

	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
	ANTICIPO			0		
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**0**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**0%**	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	11/10/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436.190.955,20	23/12/2022	28/07/2025
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	218.095.477,60	23/12/2022	28/01/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	436.190.955,20	23/12/2022	28/01/2030

	ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

ALCALDÍA DE FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA	**CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**	$ 41.070.430.10

Nombre contratista	CONSORCIO COLISEO 2022
Fecha Firma del contrato	9/09/2022
Plazo contrato	23 MESES
Fecha del acta de inicio del contrato	23/12/2022
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.	Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 Reinicio No 1 20/08/2024 Prorroga No 1 tres (3) días Prorroga No 2 cinco (5) meses
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	28/01/2025

	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
	ANTICIPO	20	20	8.214.086.021,00	2023001 743	13/04/2023
	PRIMER PAGO	2.91	2.91	1.195.172.472,8	2023002 531	14/06/2023
	SEGUNDO PAGO	5.40	5.40	2.219.082.964,8	2023004 506	31/08/2023
	TERCER PAGO	5.14	5.14	2.112.573.183,2	2023006 008	25/10/2023
	CUARTO PAGO	4.73	4.73	1.944.464.661,6	2023 007458	12/12/2023
	QUINTO PAGO	5.66	5.66	2.326.467.572,8	2023 008182	27/12/2023
	SEXTO PAGO	6.48	6.48	2.660.432.268,8	2024000 685	03/05/2024
	SEPTIMO PAGO	6.48	11.73	4.818.909.505,60	2024004 826	26/09/2024
	PAGO CONTRA LIQUIDACION	10	10			
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (LUEGO DE AMORTIZACION)				$25.491.188.651,0	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**62,07%**	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
400043455 400043828	14 / 3 / 2023	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	2.054.365.242,30	23 / 12 / 2022	28 / 01 / 2025

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	28/01/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4.108.730.484.60	23 / 12 / 2022	28/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	28/07/2025
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	12.326.191.453.80	23 / 12 / 2022	28/01/2030
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	4.108.730.484.60	28/01/2025	28/01/2027
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO	75.24%			
	% AVANCE PROGRAMADO	79.61%			
	ESTADO DEL CONTRATO		**EJECUCION**		

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto para la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento. **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** El seguimiento, control y vigilancia del Proyecto se realizan a través de la Interventoría Integral y de la Supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024, así mismo, se adjunta el Informe de Interventoría, que incluye un análisis más detallado de las actividades realizadas en el Proyecto.

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

- Firma contrato: 03/10/2022.
- Pólizas expedidas el: 30/09/2022.
- Pólizas aprobadas el: 14/10/2022.
- Firma de acta de inicio: 23/12/2022.
- Suspensión No1 Un (1) mes desde: 17/06/2024 a 17/07/2024.
- Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde: 17/07/2024 a 17/08/2024.
- Reinicio No1: 20/08/2024
- Prorroga No 1. Tres (3) días, hasta: 28/08/2024
- Prorroga No 2. Cinco (5) meses hasta: 28/01/2025
- Fecha terminación actualizada: 28/01/2025

El CONSORCIO CONTRUIR 2022 garantiza la participación de las partes interesadas del proyecto mediante la realización de reuniones y comités de obra semanales.

NUMERO DE COMITÉ	FECHA DE REALIZACIÓN
ACTA DE COMITÉ NO. 87	1/11/2024
ACTA DE COMITÉ NO. 88	7/11/2024
ACTA DE COMITÉ NO. 89	14/11/2024
ACTA DE COMITÉ NO. 90	21/11/2024
ACTA DE COMITÉ NO. 91	28/11/2024

La interventoría realiza inventario de proveedores con los que se realizaron las diferentes adquisiciones anteriormente mencionadas:

- GRUPO ARGOS
- TREMIX DE COLOMBIA SA
- GASEOSAS LUX
- AGROCONSTRUCCIONES
- FERREELECTRICOS SA
- AGREGADOS MONTANEL SAS
- RYR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA
- AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS- ESP

En el periodo del Del 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, se realizan las
siguientes actividades de obra:

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

• Cerca en tela verde h= 2.10 m
• Red telefónica provisional
• Unidades Sanitarias campamento
• Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión
• Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular)
• Excavación a máquina sin clasificar cimentación
• Excavación manual en material común para zapatas graderías (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
• Excavación manual en material común para vigas de amarre (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
• Excavación a máquina sin clasificar para tanque
• Excavación a máquina sin clasificar pisos cancha 0.69 cm (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)
• Base granular (NORMA INVIAS 330)
• Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
• Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque
• Concreto de limpieza pobre 1500 psi
• Pilote preexcavado D=60 CM (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
• Pedestales en concreto 4000 PSI Columnas en concreto de 4000 psi, graderías
• Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatación
• Entrepiso casetón con vigas 3500 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)
• Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderías
• Escalera maciza en concreto 3500 psi
• Acero figurado de 60000 psi - pilotes
• Acero figurado de 60000 psi - zapatas
• Acero figurado de 60000 psi - pedestales
• Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre
• Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188
• Acero figurado de 60000 psi - placa de entrepiso malla M-188
• Acero figurado de 60000 psi - columnas
• Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas
• Acero figurado de 60000 psi - escalera
• Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y platinas. Contemplo fabricación suministro y montaje
• Demolición cabeza de pilotes
• Relleno tipo 6 "rajón-piedra"
• Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
• Relleno en recebo común compactado mecánicamente
• Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)
• Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios)

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

- Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios)
- Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios)
- Red ventilación 2"
- Salida sanitaria pvc-s/paral 2"
- Salida sanitaria pvc-s/sifon 2"
- Salida sanitaria pvc-s/sifon 3"
- Salida sanitaria pvc-s/sifon 4"
- Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios)
- Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios)
- Yee ø=2"
- Yee ø=3"
- Yee ø=4"
- Reducción 4"-3"
- Caja de inspección de 70 x 70
- Zapatas en concreto 4000 PSI
- Dados en concreto 4000 psi
- Viga de cimentación en concreto de 4000 psi

La interventoría hace entrega de memorias de cantidades que soportan el balance de obra actual y memorias del presupuesto de posible adición.

La supervisión solicita a la interventoría realizar el seguimiento y control a la programación vigente aprobada para la prórroga con nueva fecha de terminación 28 de enero de 2025.

Se solicita a interventoría realizar las gestiones necesarias para adelantar la ejecución presupuestal de su contrato.

La interventoría superviso los procesos de izaje y montaje de los elementos estructurales para las zonas VIP en la gradería occidental.

El especialista estructural de la interventoría realiza seguimiento y formula recomendaciones a los procesos de ajuste y acabado de la estructura de cubierta.

La interventoría solicita al contratista concepto estructural aclaratorio sobre cumplimiento de norma del recubrimiento intumescente para la estructura de cubierta.

Se solicita a la interventoría revisar el acabado de concretos en estructura de graderías, asi como el procedimiento propuesto por el contratista de obra para el detallado.

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

La interventoría consolida listado de actividades con observaciones para ser subsanadas por parte del contratista de obra.

CONTRATO DE OBRA:

Firma de contrato el 09 septiembre 2022.
Pólizas aprobadas el 15 noviembre 2022.
Firma de acta de inicio 23/12/2022.
Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024
Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024
Reinicio No1 20/08/2024
Prorroga No 1. Tres (3) días, hasta 28/08/2024
Prorroga No 2. Cinco (5) meses
Fecha terminación actualizada: 28/01/2025

Se reporta avance del 75.24% con corte 30 de noviembre de 2024 dentro de las actividades realizadas se destacan:

- ✔ Montaje de estructura: Ajuste de estructura metálica
- ✔ Escaleras graderías.
- ✔ Cimentación, columnas portería y administración
- ✔ Continuación mampostería.
- ✔ Continuacion pañetes.
- ✔ Red de suministro y desagües.
- ✔ Instalación tubería eléctrica.

Se evidencia que el CONSORCIO COLISEO 2022 mediante programación de obra inicial, presenta atraso con los tiempos estipulados contractualmente presentando un desequilibrio del 4,37% en ejecución y proyección. se recomienda continuar con seguimiento a contingencia o acciones relevantes del cronograma.

Se evidencia que, durante el periodo en mención, se realizaron las actividades de control y

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

aseguramiento de calidad prevista en el plan de inspección y ensayos y se aplicaron los procedimientos del plan de calidad del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el informe de calidad del periodo:

- Avance Financiero
- Seguimiento a la Programación de Obra
- (Avance físico)
- Mejora Continua
- Atención de Quejas y Reclamos
- Inspección en recibo de materiales e insumos
- Inspección en actividades de obra
- Ensayo de materiales
- Procedimiento de acciones correctivas
- Procedimiento para la ejecución de la obra
- Procedimiento gestión de personal
- Procedimiento de compras
- Responsabilidades gerenciales y provisión de recursos
- Indicadores de procesos
- Plan de mejoramiento de procesos

Para el presente periodo y durante el desarrollo del proyecto el CONSORCIO COLISEO 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- Montaje de estructura: se realizó el ajuste de uniones soldadas.
- Se realizó la fundición de cimentación del edificio de portería.
- Se realizado relleno de área placa contrapiso de edificio administración.
- Se realizo fundida de columnas del edificio de administración.
- Se realizó adelanto la mampostería del coliseo 80%,
- Pañete mampostería coliseo 35%
- Mampostería del edificio de cuartos técnicos 90%.

Se relaciona cuadro de seguimiento de actividades

PRESUPUESTO CONTRACTUAL	TOTAL INVERSION NOVIEMBRE	CANTIDADES ACUMULADAS A NOVIEMBRE	% ACUMULADO NOVIEMBRE

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

1.1.1	Descapote mecánico e. 20 incluye cargue y retiro	$ 1.678,00	0,127%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 52.116.569,72	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 52.116.569,08	100,00%
1.1.2	Cerca en tela verde h= 2.10 m	$ 25.028,00	0,032%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 13.239.061,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 13.377.015,50	101,04%
1.1.3	Campamento 18 M2	$ 2.334.821,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 3.035.267,29	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.035.267,30	100,00%
1.1.4	Red hidráulica provisional	$ 3.105.900,00	0,010%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 4.037.670,00	100,00%
1.1.5	Red telefónica provisional	$ 281.677,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 366.180,10	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 366.180,10	100,00%
1.1.6	Unidades Sanitarias campamento	$ 1.260.780,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 6.556.056,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 9.834.084,00	150,00%
1.2.1	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	$ 11.419,00	0,321%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 131.979.329,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 2.649.630,50	$ 152.333.490,91	115,42%
2.1.1	Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular)	$ 19.375,00	0,045%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 18.629.179,40	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 69.004.179,40	370,41%
2.1.2	Excavación a máquina sin clasificar cimentacion	$ 19.375,00	0,039%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 16.069.372,80	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 70.543.354,18	438,99%
2.1.5	Prehuecos para pilotes H=30 cms	$ 23.419,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 6.576.055,20	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 6.576.055,20	100,00%
2.1.6	Excavación a máquina sin clasificar para tanque	$ 19.375,00	0,299%	*PROGRAMADO*	$ 116.856.155,37	$ 122.603.179,40	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 124.499.293,75	101,55%
2.1.10	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque	$ 70.398,00	3,756%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.542.749.994,51	100,00%
				EJECUTADO	$ 111.254.042,48	$ 2.411.609.784,01	156,32%
2.1.11	Entibado TIPO 2 (1/7 utilizaciones)	$ 30.280,00	0,010%	*PROGRAMADO*	$ 886.017,98	$ 4.252.886,30	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ 1.417.104,00	$ 1.417.104,00	33,32%
2.1.12	Filtro material granular filtrante perimetro tanque	$ 92.127,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 85.145,37	$ 209.588,60	100,00%
2,1,13	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno	$ 23.100,00	0,033%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 13.594.581,00	100,00%
2.2.1	Concreto de limpieza pobre 1500 psi	$ 391.822,00	0,166%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 68.321.610,50	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 78.217.878,16	114,48%
2.2.2	Pilote preexcavado D=60 CM (ncluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	$ 399.916,00	7,410%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 3.043.232.787,37	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.058.954.284,10	100,52%
2.2.4	Pedestales en concreto 4000 PSI	$ 781.186,00	0,176%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 72.123.778,99	100,00%
				EJECUTADO	$ 568.703,41	$ 76.135.168,75	105,56%
2.2.7	Columnas en concreto de 4000 psi, graderias	$ 1.004.327,00	0,851%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 349.581.120,19	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 321.732.137,14	92,03%
2.2.8	Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatacion	$ 93.025,00	1,725%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 708.321.001,70	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 386.717.948,50	54,60%
2.2.10	Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderias	$ 1.363.833,00	1,794%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 736.674.395,58	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 623.345.327,98	84,62%
2.2.11	Escalera maciza en concreto 3500 psi	$ 1.139.613,00	0,216%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 88.697.219,01	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 28.622.520,11	32,27%
2.2.12	Concreto para gradas coliseo 4000 psi	$ 1.576.332,00	2,192%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 900.145.472,17	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 925.166.590,45	102,78%
2.2.13	Concreto foso ascensor concreto 4000 psi	$ 1.207.668,00	0,126%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 51.777.558,31	100,00%
2.2.14	Acero figurado de 60000 psi - pilotes	$ 8.260,00	2,579%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.059.343.216,10	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 1.059.343.216,10	100,00%
2.2.15	Acero figurado de 60000 psi - zapatas	$ 8.260,00	0,659%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 270.816.332,80	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ -	$ 286.004.804,54	105,61%
2.2.16	Acero figurado de 60000 psi - dados	$ 8.260,00	1,378%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 565.818.507,80	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 566.118.098,00	100,05%
2.2.17	Acero figurado de 60000 psi - pedestales	$ 8.260,00	0,523%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 215.002.678,80	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 215.002.678,80	100,00%
2.2.18	Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre	$ 8.260,00	0,639%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 262.243.543,90	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 288.247.435,84	109,92%
2.2.19	Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188	$ 10.412,00	0,696%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 285.693.473,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 21.551.382,32	$ 177.936.967,26	62,28%
2.2.20	Acero figurado de 60000 psi - placa de entrepiso malla M-188	$ 10.412,00	0,276%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 113.170.610,80	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 123.141.474,56	108,81%
2.2.21	Acero figurado de 60000 psi - columnas	$ 8.260,00	1,662%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 682.432.328,50	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 1.187.955.570,62	174,08%
2.2.22	Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas	$ 8.260,00	1,632%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 670.208.082,70	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 884.340.338,70	131,95%
2.2.23	Acero figurado de 60000 psi - escalera	$ 8.260,00	0,142%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 58.145.947,60	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 88.846.856,28	152,80%
2.2.24	Acero figurado de 60000 psi - graderías coliseo	$ 8.260,00	0,729%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 299.593.313,50	100,00%
2.2.25	Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje	$ 17.669,00	35,369%	*PROGRAMADO*	$ 1.513.150.449,84	$ 14.064.733.431,25	96,82%
				EJECUTADO	$ 930.665.402,17	$ 13.024.524.840,09	89,66%
2.2.26	Acero figurado de 60000 psi - tanque	$ 8.260,00	0,096%	*PROGRAMADO*	$ 39.559.114,40	$ 39.559.114,40	100,00%
2.2.27	Refuerzo malla electrosoldada M-159	$ 10.412,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 2.111.283,20	$ 2.111.283,20	100,00%
2.2.28	Concreto 4000 psi para tanque subterráneo.	$ 954.682,00	0,199%	*PROGRAMADO*	$ 81.886.893,41	$ 81.886.893,41	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

2.2.29	Demolición cabeza de pilotes	$ 361.684,00	0,072%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 29.584.304,10	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 29.584.304,10	100,00%
2.2.30	Viga aérea en concreto de 3000 psi	$ 957.593,00	0,102%	*PROGRAMADO*	$ 41.877.457,70	$ 41.877.457,70	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 27.312.467,55	65,22%
3.1.1	Alfajía en concreto 2500 PSI E=0,25	$ 65.262,00	0,035%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 14.545.921,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 6.089.858,27	$ 6.089.858,27	41,87%
3.1.2	Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20	$ 63.024,00	0,059%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 24.091.869,10	100,00%
				EJECUTADO	$ 24.091.869,36	$ 24.091.869,36	100,00%
3.1.3	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	$ 48.427,00	0,804%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 330.217.442,11	100,00%
				EJECUTADO	$ 65.796.578,44	$ 194.722.327,73	58,97%
3.1.4	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	$ 29.732,00	0,018%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 7.560.252,70	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 6.485.351,96	85,78%
3.1.5	Anclaje 3/8" x 8" incluye acero	$ 18.622,00	0,051%	*PROGRAMADO*	$ 20.916.230,40	$ 20.916.230,40	100,00%
				EJECUTADO	$ 22.683.458,20	$ 33.262.616,40	159,03%
3.1.6	Anclaje 1/2" x 8" incluye acero	$ 25.682,00	0,101%	*PROGRAMADO*	$ 41.532.930,40	$ 41.532.930,40	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 35.990.754,80	86,66%
3.1.7	Columnetas de confinamiento 20 x 10 cms concreto 3000 psi	$ 43.836,00	0,263%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 107.950.095,49	100,00%
				EJECUTADO	$ 13.088.158,36	$ 97.376.194,50	90,20%
3.1.8	Suministro e instalación cinta PVC 0-22 para tanque	$ 25.175,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ 1.441.319,10	$ 1.441.319,10	100,00%
3.1.9	Muro en bloque No 5 e=0,23 mts	$ 87.093,00	0,571%	*PROGRAMADO*	$ 234.637.860,61	$ 234.637.860,61	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 12.516.570,50	5,33%
3.2.1	Filos y dilataciones muro - columnas y vigas	$ 8.894,00	0,180%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 56.317.425,02	76,19%
				EJECUTADO	$ 3.468.660,00	$ 6.996.055,98	9,46%
3.2.2	Pañete bajo placa 1.4	$ 27.584,00	0,095%	*PROGRAMADO*	$ 3.588.585,48	$ 3.588.585,48	9,17%
3.2.3	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms	$ 22.128,00	0,558%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 229.275.975,52	100,00%
				EJECUTADO	$ 23.037.859,10	$ 48.946.029,60	21,35%
3.2.4	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms	$ 13.618,00	0,086%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 35.216.489,11	100,00%
				EJECUTADO	$ 2.225.140,35	$ 5.964.983,60	16,94%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ -	$ 12.028.643,25	17,87%
3.2.7	Pañete impermeabilizado fachadas 1:3	$ 26.350,00	0,097%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 39.697.434,40	100,00%
3,2,10	Pañete impermeabilizado fachadas 1:3	$ 16.091,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 2.879.403,81	100,00%
				EJECUTADO	$ 24.154.913,25	$ 24.154.913,25	838,89%
4.2.3	Relleno tipo 6 "rajón-piedra"	$ 82.105,00	2,399%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 985.367.886,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 1.334.206,25	$ 1.022.037.210,55	103,72%
5.1.1	Impermeabilización fachada en sika transparente o similar	$ 10.086,00	0,037%	*PROGRAMADO*	$ 8.167.304,44	$ 8.167.304,44	53,75%
5.1.3	Pintura fachada tipo koraza	$ 18.131,00	0,067%	*PROGRAMADO*	$ 27.315.116,01	$ 27.315.116,01	100,00%
5.1.5	Líneas de demarcación canchas	$ 3.288,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 904.207,00	100,00%
5.1.6	Pintura acrílica texturizada para pisos	$ 29.604,00	0,164%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 67.310.615,00	100,00%
5.1.7	Estuco y vinilo 3 manos	$ 18.946,00	0,266%	*PROGRAMADO*	$ 33.642.061,80	$ 33.642.061,80	30,75%
5.1.13	Pintura fachada tipo koraza	$ 18.131,00	0,030%	*PROGRAMADO*	$ 4.002.790,78	$ 12.476.231,00	100,00%
5.1.14	Vinilo sobre pañete 2 manos	$ 8.634,00	0,109%	*PROGRAMADO*	$ 21.632.512,83	$ 44.950.676,01	100,00%
5.1.15	Vinilo sobre pañete 2 manos (lineal)	$ 5.495,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ 1.721.584,00	$ 1.721.584,00	100,00%
6.1.1	Teja tipo sándwich 525-cal 26 poliuretano inyectad0 30mm	$ 168.613,00	4,208%	*PROGRAMADO*	$ 594.862.221,24	$ 594.862.221,24	34,42%
6.2.1	Suministro e instalacion de fachada doble altura entre vanos SISTEMA STICK, con verticales estructurales ocultos de 220 mm x 50 mm (FRX-220) y horizontales estructurales a la vsita de 80 mm x 50 mm (FRX-080), rejilla de ventilacion de 1 mt de altura, perf	$ 850.194,00	5,042%	*PROGRAMADO*	$ 582.000.310,82	$ 873.189.537,32	42,17%
7.1.1	Puertas doble hoja entradas antipático TIPO 1. Marco en lamina cold rolled calibre 18, hojas en vidrio templado de 8 mm. - 2,30 x 3,00 m-. Salida(P-1), salida (P-24), salida (P-26A), salida (P-38), salida (P-40A), salida (P-69), salida (P-71A) y salida (P-	$ 4.047.984,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

7.1.2	Puertas doble hoja entradas antipático TIPO 2. Marco en lamina cold rolled calibre 18, hojas en vidrio templado de 8 mm. - 2,20 x 3,00 m-. Acceso taquilla (P-1A), salida (P-11), salida (P-14), acceso taquilla (P-24A), acceso taquilla (P-26), salida (P-30),	$ 3.965.850,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.3	Puertas hoja sencilla TIPO 3. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,80 x 2,40m- Taquilla (P-2), administración (P-15), s.j. administración (P-16), taquilla (P-25), taquilla (P-39), cuarto aseo (P-43), s. juntas mantenimiento (P-46), oficina logistica (P	$ 930.904,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.4	Puertas hoja sencilla TIPO 3.1. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,90 x 1,30m- dep. aseo z. jueces (P-20). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 709.596,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.5	Puertas hoja sencilla TIPO 3.2. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,80 x 0,95m- deposito (P-57) y deposito (P-58). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 586.542,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.6	Puertas hoja sencilla TIPO 3.3. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,80 x 1,80m- baño s. juntas (P-47) y consultorio c. dopaje (P-55). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 787.369,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.7	Puertas hoja sencilla TIPO 4. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,00 x 2,40m- punto fijo escalera (P-3), baño PMR (P-6), b. implementación deportiva	$ 1.078.148,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	2 (P-10), deposito residuos (P-12), deposito residuos (P-13), baño PMR (P-21), baño PMR (P-28), baño P						
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.8	Puertas hoja sencilla TIPO 4.1. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,00 x 1,80m- almacen manteminiento (P-41), almacen mantenimiento (P-48A) y sala de espera d. (P-54). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 895.686,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.9	Puertas hoja sencilla TIPO 4.2. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,00 x 0,95m- deposito (P-67) y deposito (P-68). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 539.982,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.10	Puertas hoja sencilla TIPO 4.3. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,00 x 1,30m- b. implementacion deportiva (P-4), b. implementacion deportiva (P-8), almacen de rec. y m. (P-9), b. implementacion deportiva (P-17), área jueces (P-18) y b. implementacio	$ 648.994,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.11	Puertas hoja sencilla TIPO 4.4. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,00 x 1,70m- almacen deportistas (P-76). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 765.652,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.12	Puertas hoja sencilla TIPO 4.5. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,00 x 2,10m- almacen deportistas (P-81). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 857.243,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.13	Puertas hoja sencilla TIPO 5. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,20 x 2,40m- sala de prensa (P-72), sala de prensa - tunel (P-74), sala recuperación y masajes (P-79) y s. recup. y mas. p. fijo (P-85). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 1.114.944,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.14	Puertas doble hoja TIPO 6. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -2,00 x 2,40m- s. recuperación masajes (P-5). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 1.270.861,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.15	Puertas hoja sencilla TIPO 7. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,90 x 2,40m- baños hombres 3 (P-7), baños damas 3 (P-22), baños hombres 2 (P-27), baños damas 3 (P-36), baños hombres 1 (P-42), area de mantenimiento (P-45), hall (P-60), baños damas 1 (	$ 896.562,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.16	Puertas hoja sencilla TIPO 7.1. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,90 x 1,70m- baño vest. y baños (P-77), baños vest. y baños (P-82) y duchas (P-83). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 724.657,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.17	Puertas hoja sencilla TIPO 7.2. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,90 x 1,30m- área duchas jueces (P-19). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 619.389,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

7.1.18	Puertas doble hoja TIPO 8. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,60 x 1,70m- mantenimiento equipos dep. (P-29), zona cal. vestieres y b (P-75) y zona cal. vestieres y b (P-80). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 813.965,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.19	Puertas doble hoja TIPO 8.1. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,60 x 2,40m- bodega equipos (P-31) y cuarto eléctrico (P-32). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 1.033.980,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.20	Puertas doble hoja TIPO 8.2. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -1,60 x 2,00m- almacen logística (P-34). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 909.043,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.21	Puertas hoja sencilla TIPO 9. Hoja en lamina cold rolled caibre 18 -0,70 x 2,40m- baño consultorio P.A. (P-52), baño control dopaje (P-56) y baños V.I.P. (P-89). Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DETALLE	$ 744.575,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.22	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 1 Taquilla (V-1), taquilla (V-5), taquilla (V-6), taquilla (V-9), taquilla (V-10), taquilla (V-17), taquilla (V-18) y taquilla (V-28). 1.60 x 1.90 m. SEGUN DETALLE	$ 376.042,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.23	Ventana rejilla de ventilación TIPO 2 Baños hombres 3 (V-2), cuarto de residuos (V-3), baños damas 3 (V-4), baños hombres 2 (V-7), baños damas 3 (V-8), baños	$ 238.689,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	caballeros 1 (V-11) y baños damas 1 (V-16). 3.35 x 0.90 m. SEGUN DETALLE						
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.24	Ventana abatible con marco en aluminio TIPO 3 Administración (V-3A) y sala administración (V-3B). 1.50 x 1.50 m. SEGUN DETALLE	$ 702.078,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.25	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 3.1 Vestier y lockers (V-19), Sala de calentamiento (V-20), Sala de calentamiento (V-21) y Vestier y lockers (V-22). 1.50 x 0.90 m. SEGUN DETALLE	$ 268.795,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.26	Ventana abatible con marco en aluminio TIPO 4 S. juntas mantenimiento (V-12). 2.30 x 1.50 m. SEGUN DETALLE	$ 689.460,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.27	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 5 Salón de la fama (V-13) y Salón de la fama (V-13A). 6.00 x 1.50 m. SEGUN DETALLE	$ 761.320,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.28	Ventana abatible con marco en aluminio TIPO 6 Oficina D. técnico (V-14) y Oficina logística (V-15). 2.10 x 1.50 m. SEGUN DETALLE	$ 645.605,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.29	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 6.1 Sala de reuniones (V-14A). 2.50 x 1.50 m. SEGUN DETALLE	$ 408.368,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.30	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 7 Sala V.I.P. (V-24). 7.97 x 1.45 m. SEGUN DETALLE	$ 984.832,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.31	Ventana rejilla de ventilación TIPO 8 Baño transmisión (V-27) -1.05 m x 1.60 m-. SEGUN DETALLE	$ 238.689,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.32	Ventana rejilla de ventilación TIPO 8.1 Baño V.I.P. (V-28) -0.90 m x 1.60 m-. SEGUN DETALLE	$ 234.565,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.33	Ventana con 10 vidrios fijos con marco en PVC REHAU, vidrio termoacústicos 27 mm: laminado incoloro 4.3 con PVB de 0.76 + espaciador de aluminio 12 mm + laminado incoloro 3.3 con PVB de 0.38 mm - 7,52 m x 1,45 m - PMU (V-25). SEGÚN DETALLE Y COTIZACIÓN	$ 852.085,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.34	Ventana con 10 vidrios fijos con marco en PVC REHAU, vidrio termoacústicos 27 mm: laminado incoloro 4.3 con PVB de 0.76 + espaciador de aluminio 12 mm + laminado incoloro 3.3 con PVB de 0.38 mm - 9,41 m x 1,45 m - zona de transmisión (V-26). SEGÚN DETALLE	$ 852.085,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.35	Marco para puerta en lamina cal. 18 incluye pintura y anticorrosivo	$ 170.577,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.36	División baños acero inoxidable (	$ 900.021,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.37	Baranda metalica	$ 486.884,00	1,153%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.38	Pasamanos en acero inoxidable	$ 244.228,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.39	Mesón acero inoxidable cafetería	$ 517.032,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.40	Escalera de gato en tubo estructural galvanizado de 1" incluye anticorrosivo	$ 93.249,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.41	Fabricacion, pintura e instalacion de cortina metalica enrollable, elaborada en fleje de seguridad cold rolled micro perforado calibre 22, eje compensadocon resortes ocultos en tubo aguas negras 4", rieles en lamina calibre 14. parte inferior en angulo y	$ 29.170.050,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.42	Puertas TIPO 1 administración (102), contaduría (103), sala de juntas (104), gerencia (105), acceso portería (109),y archivo (110) en lamina cold rolled calibre 18 hoja en lámina 0.80 x 2.40 m. Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DISEÑO.	$ 753.660,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.43	Puertas TIPO 2 acceso administración (101), baño PMR 2 (106), baño PMR 1 (107) y baño portería (108) en lamina cold rolled calibre 18 hoja en lamina 1.00 x 2.40 m. Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DISEÑO.	$ 749.501,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.44	Ventana fija con marco en aluminio y vidrio TIPO 1 administración (V1-02, V1-03), contaduría (V1-04, V1-05), Sala de juntas (V1-06,V1-07), gerencia (V1-08), monitoreo (V1-11) -1.00 x 1.50 m-. SEGUN DETALLE	$ 486.935,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.45	Ventana fija con marco en aluminio y vidrio TIPO 2 portería (V1-14) -1.80 m x 1.50 m-. SEGUN DETALLE	$ 763.461,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.46	Ventana fija con marco en aluminio y vidrio TIPO 3 recepción (V1-01) -2.00 m x 1.50 m-. SEGUN DETALLE	$ 881.281,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.47	Ventana corrediza con marco en aluminio y vidrio TIPO 4 portería (V1-13) y recepción (V1-15) -3.30 m x 1.50 m-. SEGUN DETALLE	$ 705.646,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.48	Ventana rejillas de ventilación en aluminio - 1.80 x 0.25 m-. SEGÚN DETALLE	$ 120.107,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.49	Puertas TIPO 1 shut de basuras (100), zona de trabajo (104), zona de carpintería metálica (105, 106), taller de electricidad (107), planta eléctrica (110), cuarto de equipos (111), mantenimiento de bombas (113) y cuarto de bombas (115). Hoja en lámina 2.0	$ 990.406,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.50	Puertas TIPO 2 baño de hombres (101) y baño de mujeres (102). Marco y hoja sencilla en madera de cedro y tintilla 0.80 x 2.40 m. SEGÚN DISEÑO.	$ 1.109.926,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.51	Puertas TIPO 3 zona de estar (103) y depósito (108). Marco y hoja sencilla en madera de cedro y tintilla 1.00 x 2.40 m. SEGÚN DISEÑO.	$ 1.262.095,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.52	Puertas TIPO 4 cuarto de transformador (109). Hoja en lámina 4.45 x 2.40 m. Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DISEÑO.	$ 1.801.745,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

7.1.53	Puertas TIPO 5 taller de carpinteria metálica (112) y cuarto de bombas (114). Hoja en lámina 1.20 x 2.40 m. Incluye pintura y anticorrosivo SEGÚN DISEÑO.	$ 770.456,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.54	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 1 Depósito (V-05) y Planta eléctrica (V-07). 3.00 x 1.00 m. SEGUN DETALLE	$ 1.021.760,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.55	Ventana fija con marco en aluminio TIPO 2 Zona de trabajo (V-01), zona de carpintería metálica (V-02, V-03) y taller de electricidad (V-04) -2.00 m x 1.00 m-. SEGUN DETALLE	$ 759.076,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.56	Ventana rejilla de ventilación TIPO 3 Shut de basuras (V-06) -3.00 m x 0.50 m-. SEGUN DETALLE	$ 409.615,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
7.1.57	Ventana abatible con marco en aluminio TIPO 4 taller de carpintería metálica (V-08) -1.20 m x 1.00 m-. SEGUN DETALLE	$ 645.748,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ -	100,00%
8.1.7	Pintura para tubería red de incendios con diámetro de hasta 2"	$ 4.648,00	0,008%	*PROGRAMADO*	$ 2.248.405,25	$ 2.248.405,25	71,09%
8.1.8	Pintura para tubería red de incendios con diámetro mayor a 2"	$ 7.307,00	0,013%	*PROGRAMADO*	$ 3.895.284,15	$ 3.895.284,15	71,09%
8.1.19	Reducción 21/2 -1"	$ 19.395,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 1.361.529,00	$ 1.361.529,00	100,00%
8.1.20	Derivación strap 2-1/2"	$ 20.180,00	0,011%	*PROGRAMADO*	$ 793.578,50	$ 793.578,50	17,19%
8.2.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	$ 54.118,00	0,025%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 10.243.455,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 1.474.607,26	$ 2.251.308,80	21,98%
8.2.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	$ 23.100,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ 2.936.934,00	$ 2.936.934,00	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

8.2.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	$ 70.398,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ 6.434.588,00	$ 6.434.588,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 823.656,60	$ 1.647.313,20	25,60%
8.2.4	Red suministro PVC 3/4" RDE 13.5 (Incluye accesorios)	$ 12.225,00	0,008%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 3.232.535,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 942.425,25	$ 1.339.737,75	41,45%
8.2.5	Red suministro PVC 1/2" RDE 9 (Incluye accesorios)	$ 9.870,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.583.345,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 751.896,60	$ 944.361,60	59,64%
8.2.6	Red suministro PVC 1" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 16.201,00	0,008%	*PROGRAMADO*	$ 1.848.129,19	$ 3.285.563,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 1.990.292,85	$ 2.243.028,45	68,27%
8.2.7	Red suministro PVC 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 19.809,00	0,009%	*PROGRAMADO*	$ 3.749.447,01	$ 3.749.447,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 3.054.151,62	$ 3.440.427,12	91,76%
8.2.8	Red suministro PVC 1 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 25.372,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 808.098,00	$ 808.098,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 1.537.035,76	$ 2.196.707,76	271,84%
8.2.9	Red suministro PVC 2" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 36.363,00	0,014%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 5.833.352,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 2.408.030,59	$ 6.015.349,28	103,12%
8.2.10	Red suministro PVC 2 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 56.254,00	0,006%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 2.522.992,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 4.117.230,26	$ 9.236.344,26	366,09%
8.2.11	Red suministro PVC 3" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 73.275,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.143.090,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 3.553.104,75	$ 6.410.829,75	560,83%
8.2.12	Red suministro PVC 4" RDE 21 (Incluye accesorios)	$ 130.851,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.616.010,17	79,17%
8.2.14	Punto hidráulico pvc- 1/2" paral	$ 76.046,00	0,015%	*PROGRAMADO*	$ 4.481.644,13	$ 6.327.027,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 2.833.321,87	$ 6.194.555,07	97,91%
8.2.15	Punto agua caliente cpvc	$ 99.992,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 2.079.834,00	$ 2.079.834,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 1.299.896,00	$ 1.949.844,00	93,75%
8.2.16	Ducha electrónica 110v-127v	$ 188.604,00	0,010%	*PROGRAMADO*	$ 3.922.963,01	$ 3.922.963,01	100,00%
8.2.17	Desinfección	$ 517.545,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ 2.691.234,00	$ 2.691.234,00	100,00%
8.2.18	Llave de corte especial 4"	$ 1.372.729,00	0,009%	*PROGRAMADO*	$ 3.569.095,01	$ 3.569.095,01	100,00%
8.2.19	Válvula cheque 4"	$ 1.680.129,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 2.184.168,00	$ 2.184.168,00	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

8.2.20	Tee 1"	$ 15.319,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 318.635,00	$ 318.635,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 378.379,30	$ 677.099,80	212,50%
8.2.21	Tee 1 1/4"	$ 21.151,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 659.911,01	$ 659.911,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 494.933,40	$ 1.429.807,60	216,67%
8.2.22	Tee 1 1/2"	$ 25.809,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 805.241,00	$ 805.241,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 671.034,00	$ 1.677.585,00	208,33%
8.2.23	Tee 2"	$ 35.299,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 550.664,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 275.332,20	50,00%
8.2.24	Tee 2 1/2"	$ 51.838,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 673.894,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 673.894,00	100,00%
8.2.25	Tee 3"	$ 74.341,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 386.573,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 483.216,50	125,00%
8.2.26	Tee 4"	$ 143.494,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ 38.862,92	$ 186.542,00	100,00%
8.2.28	Reducción 4"-3"	$ 57.115,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ 15.468,75	$ 74.250,00	100,00%
8.2.29	Reducción 3"-1"	$ 40.927,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 106.410,00	100,00%
8.2.30	Reducción 3"-11/4"	$ 42.491,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 110.477,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 165.714,90	$ 165.714,90	150,00%
8.2.31	Reducción 3"-11/2"	$ 42.491,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 55.238,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 386.668,10	700,00%
8.2.32	Reducción 11/2"-1/2"	$ 18.464,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ 144.019,00	$ 144.019,00	100,00%
8.2.33	Reducción 1"-1/2"	$ 15.467,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 482.570,00	$ 482.570,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 40.214,20	$ 140.749,70	29,17%
8.2.34	Reducción 1 1/4"-3/4"	$ 16.630,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 345.904,00	$ 345.904,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 108.095,00	31,25%
8.2.35	Reducción 2 1/2"- 1 1/4"	$ 34.404,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 134.176,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 223.626,00	166,67%
8.2.36	Reducción 1 1/4"-1/2"	$ 16.552,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 344.282,00	$ 344.282,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 215.176,00	62,50%
8.2.37	Reducción 1 1/4"-1"	$ 19.159,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 298.880,00	$ 298.880,00	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ 74.720,10	$ 74.720,10	25,00%
8.2.38	Reducción 1 1/2"-11/4"	$ 21.779,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 2.208.391,00	$ 2.208.391,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 537.941,30	$ 1.415.635,00	64,10%
8.2.39	Reducción 2 1/2" - 1 1/2"	$ 34.398,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 89.435,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 223.587,00	250,00%
8.2.40	Reducción 21/2" -2"	$ 36.111,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 93.889,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 187.777,20	200,00%
8.2.41	Reducción 2" - 1 1/4"	$ 22.139,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 287.807,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 86.342,10	$ 86.342,10	30,00%
8.2.42	Reducción 2" - 1 1/2"	$ 23.571,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 122.569,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 122.569,20	100,00%
8.2.43	Reducción 2 1/2"-1"	$ 34.539,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 44.901,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 134.702,10	300,00%
8.2.45	Punto hidráulico pvc- 1" paral	$ 90.833,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 708.497,00	$ 2.054.114,01	289,93%
8.2.46	Desinfección	$ 517.545,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 14.309.235,00	1063,40%
8.2.47	Registro 1 1/4" red white toyo	$ 171.986,00	0,035%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 705.589,46	4,93%
8.2.48	Tapa registro 20x20	$ 22.405,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ 2.265.313,54	$ 2.265.313,54	76,25%
8.2.54	Llave manguera	$ 41.848,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 79.336,88	$ 380.817,01	100,00%
8.2.55	Escotilla en concreto reforzado	$ 124.043,00	0,000%	*PROGRAMADO*	$ 161.256,00	$ 161.256,00	100,00%
8.3.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	$ 54.118,00	0,167%	*PROGRAMADO*	$ 21.960.022,38	$ 68.446.823,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 13.406.543,90	$ 30.298.395,24	44,27%
8.3.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	$ 23.100,00	0,048%	*PROGRAMADO*	$ 17.812.269,83	$ 17.812.269,83	89,58%
8.3.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	$ 70.398,00	0,066%	*PROGRAMADO*	$ 27.169.685,00	$ 27.169.685,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 5.051.760,48	$ 26.750.536,02	98,46%
8.3.4	Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)	$ 29.888,00	0,010%	*PROGRAMADO*	$ 1.449.948,84	$ 1.449.948,84	34,37%
				EJECUTADO	$ 1.031.195,78	$ 3.819.387,52	90,55%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

8.3.5	Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios)	$ 41.149,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ 1.437.910,66	$ 5.898.215,36	89,35%
8.3.6	Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios)	$ 55.781,00	0,128%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ 14.748.161,71	$ 27.779.161,12	52,95%
8.3.7	Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios)	$ 101.782,00	0,040%	*PROGRAMADO*	$ 16.327.869,00	$ 16.327.869,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 26.331.003,40	161,26%
8.3.9	Red ventilación 2"	$ 21.072,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ 6.423.799,00	$ 6.423.799,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 802.906,42	$ 8.452.843,15	131,59%
8.3.10	Bajante aguas residuales pvc 4"	$ 49.848,00	0,009%	*PROGRAMADO*	$ 2.480.150,48	$ 2.480.150,48	67,50%
				EJECUTADO	$ 212.628,00	$ 9.993.516,00	118,99%
8.3.12	Salida sanitaria pvc-s/sifon 2"	$ 63.860,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 1.992.432,00	$ 1.992.432,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 2.407.522,00	120,83%
8.3.13	Salida sanitaria pvc-s/sifon 3"	$ 86.836,00	0,011%	*PROGRAMADO*	$ 3.852.261,88	$ 3.852.261,88	87,50%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.386.604,00	76,92%
8.3.14	Salida sanitaria pvc-s/sifon 4"	$ 111.826,00	0,026%	*PROGRAMADO*	$ 9.949.019,07	$ 9.949.019,07	93,75%
				EJECUTADO	$ -	$ 9.303.923,20	87,67%
8.3.15	Caja de inspección de 60 x 60	$ 308.264,00	0,017%	*PROGRAMADO*	$ 6.812.634,01	$ 6.812.634,01	100,00%
8.3.16	Trampa de grasas 60 x 60	$ 315.716,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 51.303,88	$ 51.303,88	12,50%
8.3.18	Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios)	$ 41.317,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 212.610,79	$ 212.610,79	79,17%
				EJECUTADO	$ -	$ 537.121,00	200,00%
8.3.19	Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios)	$ 56.565,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 815.007,38	$ 815.007,38	79,17%
				EJECUTADO	$ -	$ 735.345,00	71,43%
8.3.20	Yee ø=2"	$ 21.465,00	0,008%	*PROGRAMADO*	$ 1.930.642,88	$ 1.930.642,88	56,25%
				EJECUTADO	$ 502.281,00	$ 2.818.354,50	82,11%
8.3.21	Yee ø=3"	$ 31.480,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.887.780,00	220,93%
8.3.22	Yee ø=4"	$ 46.267,00	0,034%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ 3.849.414,40	$ 13.112.067,80	93,16%
8.3.24	Reducción 4"-2"	$ 46.711,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	$ 364.345,80	$ 667.967,30	37,93%
8.3.25	Reducción 4"-3"	$ 48.150,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 625.950,00	111,11%
8.3.26	Reducción 3"-2"	$ 26.468,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ 275.267,20	$ 619.351,20	48,65%
8.3.28	Marco tapa caja de inspección	$ 212.016,00	0,011%	*PROGRAMADO*	$ 4.685.554,00	$ 4.685.554,00	100,00%
8.3.29	Caja de inspección tapón de limpieza	$ 157.977,00	0,015%	*PROGRAMADO*	$ 3.796.779,79	$ 3.796.779,79	63,75%
8.3.30	Caja de inspeccion de 70 x 70	$ 398.563,00	0,021%	*PROGRAMADO*	$ 8.808.242,00	$ 8.808.242,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 6.217.582,80	70,59%
8.3.31	Suministroe instalación canaleta sección 0.2x0.2 incluye rejilla	$ 151.343,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 393.492,00	$ 393.492,00	100,00%
8.4.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	$ 54.118,00	0,063%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 25.875.980,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 11.122.169,01	$ 25.875.980,52	100,00%
8.4.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	$ 23.100,00	0,020%	*PROGRAMADO*	$ 5.147.360,97	$ 5.147.360,97	61,46%
				EJECUTADO	$ -	$ 18.917.561,75	167,51%
8.4.4	Bajante pvc aguas lluvias d=6"	$ 88.689,00	0,035%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ 784.010,76	$ 2.651.801,10	18,64%
8.4.5	Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye uniones)	$ 145.198,00	0,144%	*PROGRAMADO*	$ 57.417.642,00	$ 59.269.824,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 2.950.278,16	$ 30.305.000,57	51,13%
8.4.6	Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye uniones)	$ 147.935,00	0,045%	*PROGRAMADO*	$ 18.385.362,01	$ 18.385.362,01	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.461.679,00	18,83%
8.4.7	Caja de inspección 70 x 70	$ 398.563,00	0,019%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 7.771.979,00	100,00%
8.4.8	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, e=0.25m (inc. Pañete interno e =1.5cm y cañuela)	$ 765.536,00	0,015%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 5.971.181,00	100,00%
8.4.9	Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi con refuerzo).	$ 1.000.198,00	0,019%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 7.801.544,01	100,00%
8.4.10	Cubierta pozo d=1.7m, e=0.20m concreto 3000psi	$ 924.457,00	0,018%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 7.210.765,00	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	con refuerzo (incluye aro y tapa hf)						
8.4.13	Marco tapa caja de inspección	$ 212.016,00	0,011%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 4.409.933,00	100,00%
8.4.14	Wash-primer sobre aluminio	$ 25.723,00	0,033%	*PROGRAMADO*	$ 13.497.012,00	$ 13.497.012,00	100,00%
8.4.15	Bajante aguas lluvias PVC 4"	$ 40.545,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 2.988.573,00	100,00%
8.4.16	Tubería PVC alcantarillado 4"	$ 126.799,00	0,025%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 10.269.451,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 19.024.034,37	185,25%
8.4.17	Caja de inspección 60 x 60	$ 308.264,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 801.486,00	100,00%
8.4.18	Canal en lamina galvanizada cal 22, ds =90	$ 38.422,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.148.818,01	100,00%
8.4.19	Rejilla c6 x 4 aluminio cúpula	$ 40.755,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 529.815,00	100,00%
8.4.20	Yee 6"	$ 136.060,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 707.512,00	$ 707.512,00	100,00%
8.4.21	Reduccion 6-4"	$ 52.549,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 341.569,00	$ 341.569,00	100,00%
8.4.22	Wash primer sobre aluminio	$ 25.723,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 1.478.712,13	$ 1.478.712,13	68,75%
9.1.1	Estructura de derivación en poste existente.	$ 1.999.236,00	0,006%	*PROGRAMADO*	$ 812.189,69	$ 2.599.007,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 2.599.006,80	100,00%
9.1.2	Transformador de 112,5 KVA para provisional	$ 9.720.833,00	0,031%	*PROGRAMADO*	$ 12.637.083,00	$ 12.637.083,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 12.637.082,90	100,00%
9.1.3	Estructura de protecciones para transformador en poste	$ 3.034.677,00	0,010%	*PROGRAMADO*	$ 3.945.080,00	$ 3.945.080,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.945.080,10	100,00%
9.1.4	Puesta a tierra para transformador en poste.	$ 1.007.799,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 1.310.139,00	$ 1.310.139,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 1.310.138,70	100,00%
9.1.5	Malla de puesta a tierra para transformador. Incluye 4 varillas de Cu y cable de Cu desnudo.	$ 1.012.381,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 1.316.095,00	$ 1.316.095,00	100,00%
9.1.6	Suministro, plomada e Incada de poste de concreto de 12m, 750 kg.	$ 1.190.743,00	0,008%	*PROGRAMADO*	$ 3.095.932,00	$ 3.095.932,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 1.547.965,90	50,00%
9.1.7	Armario con grupo de medida para baja tensión	$ 7.843.918,00	0,025%	*PROGRAMADO*	$ 10.197.093,00	$ 10.197.093,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 10.197.093,40	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

9.1.8	Suministro y montaje de red para alumbrado en cable #4 de aluminio ASCR.	$ 13.697,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 534.183,00	$ 534.183,00	100,00%
9.1.9	Estructura de paso en poste	$ 1.203.275,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ 1.564.258,00	$ 1.564.258,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 1.564.257,50	100,00%
9.1.10	Tableros móviles certificados, con extensiones.	$ 2.555.687,00	0,073%	*PROGRAMADO*	$ 29.901.538,00	$ 29.901.538,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 26.579.144,80	88,89%
9.1.11	Tablero general de distribución, para red provisional.	$ 1.606.380,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 2.088.294,00	$ 2.088.294,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 2.088.294,00	100,00%
9.1.12	Empalmes pre moldeados para exterior, juego x 3	$ 929.660,00	0,006%	*PROGRAMADO*	$ 2.417.116,00	$ 2.417.116,00	100,00%
9.1.13	Red Eléctrica provisional L:50m	$ 3.022.642,00	0,019%	*PROGRAMADO*	$ 7.858.869,00	$ 7.858.869,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.929.434,60	50,00%
9.1.14	Suministro e Instalación de reflectores Provisionales. IP 65 de 100W	$ 220.170,00	0,006%	*PROGRAMADO*	$ 2.289.768,00	$ 2.289.768,00	100,00%
9.1.15	Suministro y montaje de red para alumbrado en cable #4 de aluminio ACSR.	$ 13.697,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 890.305,00	$ 890.305,00	100,00%
9.1.16	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos con chapa, puerta y espacio para totalizador.	$ 1.271.851,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ 1.653.406,00	$ 1.653.406,00	100,00%
9.1.17	Suministro e instalación de tablero monofásico de 6 circuitos con chapa, puerta y espacio para totalizador.	$ 341.487,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 887.866,00	$ 887.866,00	100,00%
9.1.18	UPS de 3 KVA	$ 3.152.206,00	0,010%	*PROGRAMADO*	$ 4.097.868,00	$ 4.097.868,00	100,00%
9.1.19	Alimentador en 3#8 + 1#8N AWG de Cu libre de halógenos + 1#10T de Cu desnudo de tablero	$ 42.099,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 547.287,00	$ 547.287,00	100,00%
9.2.1	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos.	$ 1.358.544,00	0,013%	*PROGRAMADO*	$ 5.298.322,00	$ 5.298.322,00	100,00%
9.2.2	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos.	$ 1.083.787,00	0,007%	*PROGRAMADO*	$ 2.817.846,00	$ 2.817.846,00	100,00%
9.2.3	Suministro e Instalación de tablero bifásico de 12 circuitos.	$ 821.621,00	0,018%	*PROGRAMADO*	$ 7.476.751,00	$ 7.476.751,00	100,00%
9.2.4	Suministro e instalación de tablero bifásico de 8 circuitos.	$ 487.332,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 1.003.091,54	$ 1.003.091,54	79,17%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

9.2.13	Alimentador en 2#2+1#2N(libre de halógeno)+1#8T desnudo, para pantalla gigante, no incluye tubería.	$ 87.710,00	0,109%	*PROGRAMADO*	$ 36.421.939,12	$ 36.421.939,12	81,25%
9.2.14	Alimentador en 3#6+1#6N(libre de halógeno)+1#10T desnudo	$ 54.958,00	0,030%	*PROGRAMADO*	$ 8.294.331,14	$ 8.294.331,14	67,19%
9.2.21	Tubería PVC de 1.1/2"	$ 14.911,00	0,038%	*PROGRAMADO*	$ 15.507.440,00	$ 15.507.440,00	100,00%
9.2.22	Tubería PVC de 2"	$ 17.789,00	0,005%	*PROGRAMADO*	$ 1.942.559,00	$ 1.942.559,00	100,00%
9.2.23	Tubería PVC de 1"	$ 8.336,00	0,017%	*PROGRAMADO*	$ 7.163.233,00	$ 7.163.233,00	100,00%
9.2.24	Tubería EMT de 1 1/2"	$ 21.973,00	0,011%	*PROGRAMADO*	$ 2.211.773,38	$ 2.211.773,38	47,50%
				EJECUTADO	$ 179.715.778,59	$ 179.715.778,59	62,15%
9.2.44	Canalización en 4Ø4" PVC por andén.	$ 160.696,00	0,013%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 3.133.572,00	60,41%
9.2.50	Canalización en 2Ø1" PVC por zona verde.	$ 55.199,00	0,044%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 5.048.224,55	27,70%
9.2.52	Canalización en 2Ø2" PVC por andén.	$ 88.968,00	0,056%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 5.911.300,82	25,81%
9.2.53	Canalización en 2Ø1.1/2" PVC por andén.	$ 82.430,00	0,157%	*PROGRAMADO*	$ -	$ -	0,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 14.457.892,28	22,49%
9.3.6	Suministro e instalación de tubería IMC de ø 1"	$ 27.281,00	0,047%	*PROGRAMADO*	$ 8.831.460,37	$ 8.831.460,37	45,50%
9.4.6	Suministro e instalación de tubería EMT de ø 1/2"	$ 22.887,00	0,092%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 37.917.946,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 65.456.820,00	$ 65.456.820,00	172,63%
9.4.7	Suministro e instalación de tubería EMT de ø 3/4"	$ 29.761,00	0,130%	*PROGRAMADO*	$ 580.239,70	$ 53.999.717,71	101,09%
9.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4"	$ 5.385,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 6.241.326,00	$ 6.938.678,30	543,11%
9.4.9	Salida para interruptor sencillo en 2#12 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. Incluye aparato y 4m de cableado. incluye 4m de tubería y cableado.	$ 68.586,00	0,015%	*PROGRAMADO*	$ 606.767,01	$ 606.767,01	9,72%
9.4.10	Salida para interruptor doble en 3#12 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. Incluye aparato y 4m de tubería y cableado.	$ 116.686,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 5.546.876,00	$ 5.546.876,00	914,17%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

9.5.1	Salida para Tomacorriente monofásico con polo a tierra de 15 Amp en 2#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo, incluye aparato y contempla 4m de cableado, no incluye tubería.	$ 82.053,00	0,025%	*PROGRAMADO*	$ 10.133.546,00	$ 10.133.546,00	100,00%
9.5.2	Salida para tomacorriente bifásico en 3#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. incluye aparato y contempla 4m de cableado, no incluye tubería.	$ 118.371,00	0,001%	*PROGRAMADO*	$ 615.529,00	$ 615.529,00	100,00%
9.5.3	Salida para tomacorriente tipo GFCI monofásico en 2#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. Incluye aparato y contempla 4m de cableado, no incluye tubería.	$ 144.134,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ 6.370.723,00	$ 6.370.723,00	100,00%
9.5.4	Salida para Tomacorriente monofásico con polo a tierra de 15 Amp para secador de manos en 2#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo, incluye aparato y contempla 4m de cableado, no incluye tubería.	$ 82.053,00	0,002%	*PROGRAMADO*	$ 960.020,00	$ 960.020,00	100,00%
9.5.5	Salida para tomacorriente monofásico regulado en 2#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. incluye aparato y contempla 4m de cableado, no incluye tubería.	$ 89.786,00	0,006%	*PROGRAMADO*	$ 2.451.158,00	$ 2.451.158,00	100,00%
9.5.6	Salida para tomacorriente bifásico regulado en 3#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo. incluye aparato y contempla 4m de cableado, no incluye tubería.	$ 117.248,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 1.219.379,00	$ 1.219.379,00	100,00%
9.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4"	$ 5.385,00	0,018%	*PROGRAMADO*	$ 7.331.344,01	$ 7.331.344,01	100,00%
				EJECUTADO	$ 7.329.523,50	$ 7.329.523,50	99,98%
9.5.8	Alimentador en 2#10 awg libre de halógenos + 1#12 de Cu desnudo, para tomacorrientes monofásicos	$ 15.054,00	0,119%	*PROGRAMADO*	$ 11.619.806,25	$ 11.619.806,25	23,75%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

9.6.1	Suministro e instalación de salida para voz y datos, caja 4x4 Doble Fondo con tapa flush, face plate doble y dos (2) Jack CAT 6A UTP, no incluye tubería.	$ 55.888,00	0,004%	*PROGRAMADO*	$ 1.207.879,08	$ 1.207.879,08	79,17%
9.6.3	Suministro e instalación de cable 4 pares UTP cat 6A	$ 5.847,00	0,046%	*PROGRAMADO*	$ 2.820.720,70	$ 2.820.720,70	14,84%
9.6.5	Suministro e instalación de tubería EMT de ø 3/4"	$ 29.761,00	0,040%	*PROGRAMADO*	$ 13.206.877,13	$ 13.206.877,13	79,69%
				EJECUTADO	$ -	$ 7.441.531,50	23,62%
9.9.1	Suministro, transporte e instalación de puntas de captación de aluminio de 1m. Incluye base.	$ 144.988,00	0,040%	*PROGRAMADO*	$ 2.073.328,38	$ 16.586.627,01	100,00%
9.9.2	Suministro, transporte e instalación de conectores bimetálicos	$ 12.454,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ 1.036.173,00	$ 1.036.173,00	100,00%
9.9.3	Suministro, transporte e instalación de caja de 40x40 inspecciónale para varilla puesta a tierra de 5/8"x2.44m no incluye varilla.	$ 272.988,00	0,024%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 9.936.763,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 4.258.612,80	$ 4.258.612,80	42,86%
9.9.4	Ducto para bajante en IMC de 3/4", incluye uniones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. No incluye el cable de Al.	$ 25.684,00	0,039%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 15.827.816,00	100,00%
9.9.5	Cable 1/0 AWG de aluminio desnudo	$ 10.104,00	0,052%	*PROGRAMADO*	$ 5.641.877,06	$ 21.492.865,00	100,00%
9.9.6	Suministro, transporte e instalación de aisladores para cable de aluminio (H=3.5)	$ 4.644,00	0,017%	*PROGRAMADO*	$ 1.141.936,41	$ 7.027.301,00	100,00%
9.9.7	Cable 1/0 de cobre desnudo	$ 45.638,00	0,050%	*PROGRAMADO*	$ 20.363.036,00	$ 20.363.036,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 19.887.214,88	$ 19.887.214,88	97,66%
9.9.8	Varillas puesta a tierra de Cu de 2,48m	$ 193.095,00	0,017%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 7.028.658,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 1.506.141,00	$ 1.506.141,00	21,43%
9.9.9	Soldadura exotérmica, para empalmes de Cu	$ 37.920,00	0,003%	*PROGRAMADO*	$ -	$ 1.380.288,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 591.552,00	$ 591.552,00	42,86%
9.9.10	Suministro, transporte e instalación de puntas de captación de aluminio de 60 cm. Incluye base.	$ 114.646,00	0,011%	*PROGRAMADO*	$ 4.620.234,00	$ 4.620.234,00	100,00%
				EJECUTADO	$ 6.708.501,80	$ 6.708.501,80	100,00%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

2.2NP-01	Zapatas en concreto 4000 PSI	$ 813.294,00		*PROGRAMADO*	$ -	$ 681.228.067,01	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 715.991.505,84	105,10%
2.2NP-02	Dados en concreto 4000 psi	$ 769.570,00		*PROGRAMADO*	$ -	$ 699.428.311,41	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 709.800.884,21	101,48%
2.2NP-03	Viga de cimentación en concreto de 4000 psi	$ 838.270,00		*PROGRAMADO*	$ -	$ 643.508.863,40	100,00%
				EJECUTADO	$ 108.975,10	$ 546.226.791,24	84,88%
2.2NP-04	Polietileno negro CAL.6	$ 3.683,00		*PROGRAMADO*	$ -	$ 21.677.744,40	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 17.030.225,15	78,56%
2.2NP-06	Excavación de material común y conformación de terraplen con reutilización del material	$ 11.374,00		*PROGRAMADO*	$ 119.693.905,77	$ 163.683.973,70	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 145.704.249,83	89,02%
2.2NP-07	Entrepiso casetón con vigas 4000 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)	$ 203.723,00		*PROGRAMADO*	$ 66.080.203,80	$ 66.080.203,80	100,00%
				EJECUTADO	$ 30.561.131,15	$ 96.641.334,60	146,25%
				EJECUTADO	$ -	$ 62.215.727,42	100,00%
8.4NP-01	Suministro, transporte e instalacion de filtro frances	$ 220.998,00		*PROGRAMADO*	$ 16.852.279,23	$ 16.852.279,23	34,58%
				EJECUTADO	$ 615.774,25	$ 86.701.014,40	113,87%
7.	Proyecto Eléctrico para sub estación tipo serie 3.	$ 13.096.000,00	0,032%	*PROGRAMADO*	$ 3.774.194,44	$ 3.774.194,44	28,82%
				EJECUTADO	$ 15.584.240,00	$ 15.584.240,00	119,00%
8.	Proyecto y aprobación para la red provisional serie 5.	$ 6.548.000,00	0,016%	*PROGRAMADO*	$ 6.548.000,00	$ 6.548.000,00	100,00%
				EJECUTADO	$ -	$ 347.165.860,00	100,00%
		PROGRAMADO	**% PROGR. ACUMULADO**				79,61%
		EJECUTADO	**% EJECUTADO ACUMULADO**				75,24%

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Vigas aéreas administración



Relleno área central administración

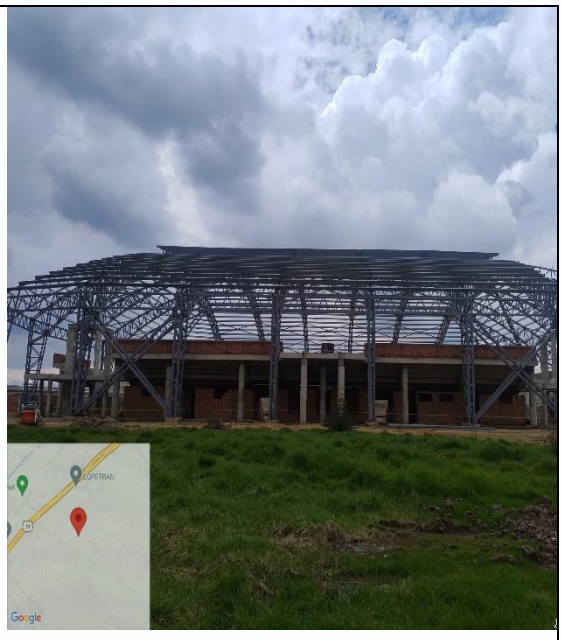
icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	
Aceros de refuerzo cimentación portería	Pañetes cuartos técnicos
	
Pruebas de tintas estructura cubierta	Ajuste de estructura para cubierta

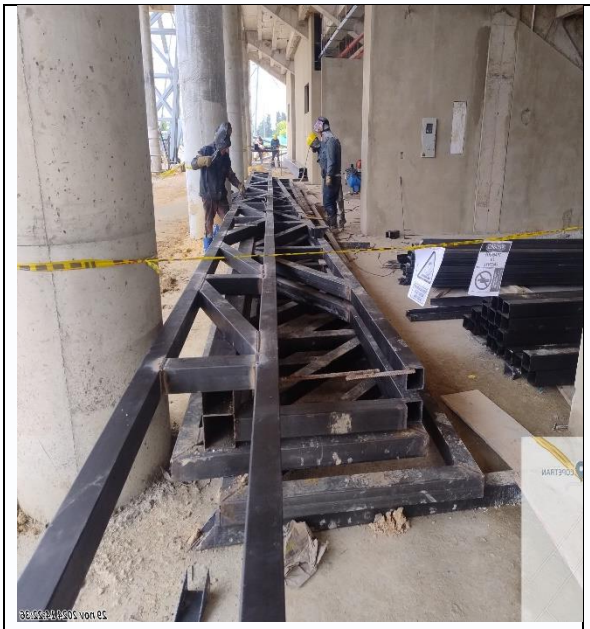
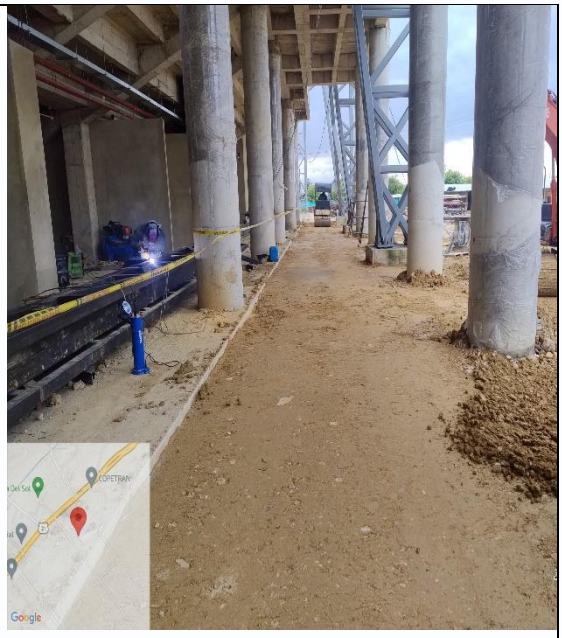
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	
Auditoria	Mampostería gradería oriental
	
Supervisión de redes internas	Fachada gradería oriental

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	
Estructura para acceso y portería	Relleno compactado para placa de concreto

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Se solicita al contratista actividades que permitan mejorar el avance ejecutado de obra, con el fin de recuperar el promedio comparativo con la programación de obra.

Se reitera solicitud al contratista presentar a la interventoría para su verificación el APU de la pintura intumescente, con el fin de definir el tipo y cantidad de esta actividad ya que debe ser previa a instalación de cubierta.

Se anexan los modificatorios de la contratación derivada, así como las pólizas actualizadas de los contratos derivados.

Se realiza el reembolso de rendimientos financieros a la cuenta del tesoro nacional.

Se realiza reintegro tasas, contribuciones, estampillas e impuestos de la cuenta a exclusiva a las cuantas respectivas.
Finalmente, se reporta un avance físico del 75,24% respecto a los recursos contractuales disponibles.

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS

- **ANEXOS**
  1. **RP contratos derivados.**
  2. **Extractos cuenta exclusiva manejo recursos Enterritorio**
  3. **Modificatorios contratos derivados.**
  4. **Pólizas actualizadas contratos derivados**
- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

GLADYS GONZALEZ GONZALEZ
SUPERVISOR

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	EDWIN DAZA SANABRIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – APOYO A SUP		nov 2024

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750
