CONTRATO ESPECÍFICO Nº 096-2210744
DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR CONTRATO DE MANDATO No. 221009 – SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO

INFORME No. 27 PERIODO DE EJECUCIÓN 1 DE SEPTIEMBRE A 31 SEPTIEMBRE 2024.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALFÉREZ DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR		
PARTICIPANTES	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Municipio de El Carmen de Bolívar.		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Municipio de El Carmen de Bolívar		
Meta	Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio El Carmen de Bolívar en el Departamento de Bolívar.		
Alcance se logrará con las siguientes actividades	Intervención de **2.023,34** metros lineales del arroyo Alférez con la construcción para el revestimiento total de canales y construcción de tramos nuevos y/o adicionales de canales revestidos, para recuperar el Funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$15.237.104.309,00	
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$15.237.104.309,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	26 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	NOVIEMBRE 12 DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO - Secretario de infraestructura.		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JESUS PONCE HERRERA	22 DE JUNIO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	4 DE MARZO 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	FECHA DE PRORROGA No. 1 del 02 DE MAYO DEL 2024.		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	NO APLICA		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	INICIAL: 04 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN PRORROGA No. 1: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$14.240.284.401	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$996.819.908

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101046974	07/03/2022	CUMPLIMIENTO	$1.523.710.430,90	04/03/2022	04/01/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	23/03/2022	23/03/2022	**$ 3.208.000.000**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio			**$ 2.500.000.000**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			**$ 1.991.200.000**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 7.699.200.000**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL (0589-0007-2842)
MARZO 2022	$ 79.165,16	
ABRIL 2022	$ 263.062,03	$ 79.165,00
MAYO 2022	$ 272.693,11	$ 263.062,00
JUNIO 2022	$ 245.952,63	$ 272.693,00
JULIO 2022	$ 6.604,62	$ 245.952,00
AGOSTO 2022	$ 6.586,97	$ 6.605,00
SEPTIEMBRE 2022	$ 5.718,84	$ 6.587,00
OCTUBRE 2022	$ 0,61	$ 7.439,00
NOVIEMBRE 2022	$ 0,67	$ -
DICIEMBRE 2022	$ 25.535,22	$ -
ENERO 2023	$ 219.172,03	$ 25.535,00
FEBRERO 2023	$ 121.166,67	$ 219.172,00
MARZO 2023	$ 80.767,63	$ 121.167,00
ABRIL 2023	$ 48.947,78	$ 80.767,00
MAYO 2023	$ 43.460,37	$ 48.948,00
JUNIO 2023	$ 41.900,48	$ 43.460,00
JULIO 2023	$ 38.076,55	$ 41.900,00
AGOSTO 2023	$ 38.076,55	$ 41.900,00
SEPTIEMBRE 2023		
OCTUBRE 2023		
NOVIEMBRE 2023	$ 15.453	$ 15.453
DICIEMBRE 2023	$ 668.22	$ 668.22
ENERO 2024	$ 688.21	$ 688.21
FEBRERO 2024	$ 688.21	$ 688.21
MARZO 2024	$ 688.21	$ 688.21
ABRIL 2024	$ 664.83	$ 664.83
MAYO 2024	$ 668.00	$ 668.00
JUNIO 2024	$ 106,954	$ 106,954
TOTAL	**$ 1.498.811,37**	**$ 1.559.237,43**

3.

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CMA-001-2022	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DEL ARROYO ALFEREZ DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR"	$996.818.714
Nombre contratista	CONSORCIO INTERCANAL CDB	
Fecha Firma del contrato	16 DE MAYO DE 2022	
Plazo contrato	20 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2022	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.	Suspensión No.1 : OCTUBRE 02 DEL 2023 Reinicio No.1: FEBRERO 27 DEL 2024 Prorroga No. 1: Tres (03) Meses	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	INICIAL: 22 DE FEBRERO 2024 SEGÚN SUSPENSION No. 1: 16 DE JULIO 2024	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	16.13%		$ 355.353.260,15		08-03-2023
SEGUNDO PAGO	37.34%		$ 318,959,627.00		09-07-2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$ 674.312.887,15	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**67%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
3002604	3/06/2022	1: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 99,681,871	16/05/2022	16/07/2024
		2: PAGO DE SALARIOS PRESTACI	$ 49,840,936	16/05/2022	16/01/2027
		3: CALIDAD DEL SERVICIO	$ 49,840,936	16/01/2024	16/01/2029
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
LP-003-2022	"MEJORAMIENTO Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALFÉREZ DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR"	$14.229.603.512
Nombre contratista	CONSORCIO CANALES DE BOLIVAR	
Fecha Firma del contrato	9 DE MAYO DE 2022	
Plazo contrato	19 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2022	
Fecha Adición, Otrosí,	Suspensión No.1 : OCTUBRE 02 DEL 2023	

Suspensión, Reinicio No	Reinicio No.1: FEBRERO 27 DEL 2024 Prorroga No. 1: Cuatro (04) Meses
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	FECHA INICIAL: 22 DE ENERO 2024 FECHA SEGÚN SUSPESION: 16 DE JUNIO 2024

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	22%		$ 3.130.512.772.00	0	29/06/2022
PRIMER PAGO	15%		$ 2.215.764.946,15	1	28/02/2023
SEGUNDO PAGO	20%		$ 736.405.345,66	2	28/07/2023
TERCER PAGO	30%		$ 2.189.379.312,79	3	19/09/2023
CUARTO PAGO	50%		$ 2.160.688.501	4	12/06/2024
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$ 7.302.238.105,45	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**51%**	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002604	03/06/2022	1: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 99,681,871	16/05/2022	16/07/2024
		2: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 49,840,936	16/05/2022	16/01/2027
		3: CALIDAD DEL SERVICIO	$ 49,840,936	16/01/2024	16/01/2029

% AVANCE FISICO EJECUTADO	70,07%
% AVANCE EN EL PRESENTE CORTE	2,24%
% AVANCE POR EJECUTAR	29,93%
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO

- **DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS**

✓ Se inicia proceso de perfeccionamiento de contrato con la firma del mismo el día nueve (09) de mayo de 2022

✓ Se expide registro presupuestal No 08-31001 de fecha 09 de mayo de 2022, por valor de 14.229.603.512

✓ Se reciben las garantías de cumplimiento de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista y se procede a la aprobación de las mismas con Acta de aprobación de garantía de fecha 20 de mayo de 2022

✓ Se firma acta de inicio con fecha de 22 de Junio del 2022.

- ✓ Levantamiento de acta de vecindad: Para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 21 de agosto del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar ha realizado las actividades pertinentes para este periodo la acta de vecindad que es un documento en el que se describe técnicamente el estado de una construcción antes, durante y después de una intervención constructiva en el lindero o zona cercana si es necesario según la magnitud o el proceso de la obra proyectada.



- ✓ Levantamiento de acta de vecindad: Para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 21 de agosto del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar ha realizado las actividades pertinentes para este periodo la acta de vecindad que es un documento en el que se describe técnicamente el estado de una construcción antes, durante y después de una intervención constructiva en el lindero o zona cercana si es necesario según la magnitud o el proceso de la obra proyectada.







- ✓ Revisión de diseños y recorrido técnico: Para el periodo comprendido entre el 26 de agosto de del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar ha realizado las actividades pertinentes en la revisión del diseño es una evaluación exhaustiva del diseño de un producto con la fiabilidad como factor determinante. La revisión del diseño en las primeras fases del desarrollo del producto es esencial para garantizar que un producto sea totalmente operable antes de las fases finales de desarrollo, en punto estratégico en campo.



- ✓ Trabajos de excavación y descapote con maquinaria: Para el periodo comprendido 26 a 31 de agosto año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar ha realizado las actividades de excavación que es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras en este caso se utilizaron de forma mecánica para suplir las necesidades a trabajar y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones por consecuente la actividad de descapote y desenraice consiste en el retiro de raíces y de suelos que contengan materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material inapropiado para la construcción de la obra.



- ✓ Para el periodo comprendido entre el 1 y 30 de septiembre del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar ha realizado las actividades y trabajos de fundición de concreto armado para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.



- ✓ Para el periodo comprendido entre el 1 y 30 de septiembre del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar ha realizado los Trabajos de afirmado de suelo y colocación de canaleta para fundición de concreto en nuevos tramos en la canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.



- ✓ Para el periodo comprendido entre septiembre 22 de octubre al 21 del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos excavación en nuevos tramos para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre septiembre 22 de octubre al 21 del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de hierro para la fundición en nuevos tramos para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido septiembre 22 de octubre al 21 del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.









- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado en fundición de Box Culvert para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.











- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de Box Culvert para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de canal cerrado para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE del año en curso 2022, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de Box Culvert para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE DICIEMBRE A 21 DE ENERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de para canalización del canal abierto de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE DICIEMBRE A 21 DE ENERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de canal cerrado para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE DICIEMBRE A 21 DE ENERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de para canalización del canal abierto de antiguo lecho del arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE DICIEMBRE A 21 DE ENERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de acero para nuevos tramos de canalización del canal abierto de antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de colocación de formaletas para la continuación de nuevos tramos de canalización del canal abierto de antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con algunos trabajos en el humedal en a K1+710 y K1+845 del cauce del arroyo Alférez, con un área aproximada de 3.200 m2 y conocido en el municipio como la "Laguna de los carburadores", en los estudios de diseño se contempló una zona de amortización de la energía de las corrientes que se puedan generar con la canalización del arroyo, las cuales seguirán su curso hasta desembocar al Alférez Real; esta zona de amortización consiste en la instalación de gaviones, los cuales no alteran el ecosistema y que, además protegen los taludes, evitando la erosión producto de las corrientes.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de colocación de formaletas para la continuación de nuevos tramos de canalización del canal abierto de antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.




9.710459° N, 75.118462° W ±18.73m


9.710617° N, 75.119444° W ±9.71m

- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de acero para nuevos tramos de canal cerrado para canalización de antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado de para canalización del canal abierto de antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 21 DE FEBRERO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE FEBRERO A 21 DE MARZO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE FEBRERO A 21 DE MARZO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado en nuevos tramos de canal cerrado de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.






- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE FEBRERO A 21 DE MARZO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación y armado de hierro en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE FEBRERO A 21 DE MARZO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.

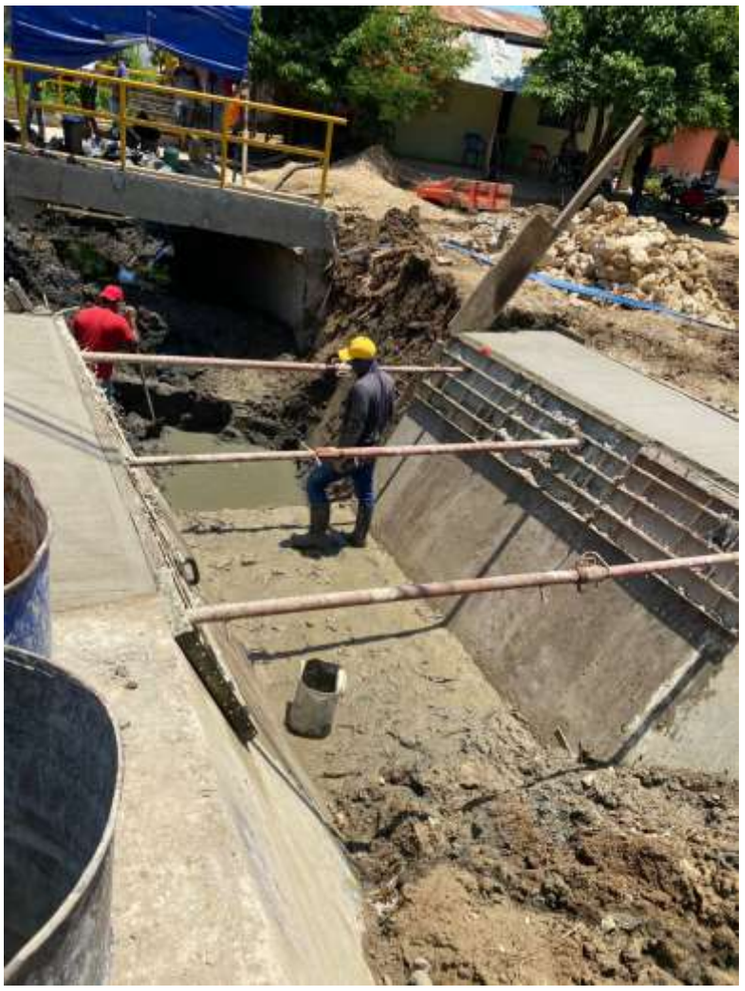

- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE FEBRERO A 21 DE MARZO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MARZO A 21 DE ABRIL del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado y formaletas en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MARZO A 21 DE ABRIL del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MARZO A 21 DE ABRIL del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado en canal cerrado de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MARZO A 21 DE ABRIL del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado y formaletas en nuevos tramos de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MARZO A 21 DE ABRIL del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto armado en canal abierto de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de acero en canal de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado en canal de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado Box Culvert en canal de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado Box Culvert en canal de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado en canal abierto de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado en canal abierto de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de construcción de Box Culvert de la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto armado en canal abierto y andenes en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en canal abierto en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado y formaleta en canal cerrado en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto canal cerrado en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición en concreto en andenes en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado y formaleta en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado y formaleta en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de formaleta y acero en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de demolición de Box Culvert ABS : 0+935,55 antiguo para la nueva construcción de Box Culvert en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de colocación de formaletas para nuevos tramos en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de hierro para nuevos tramos en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto para nuevos tramos en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de Excavación Mecánica para nuevos tramos en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de nuevos tramos en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con la construcción de Box Culvert ABS : 0+935,55 en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con la construcción de canal cerrado en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con la construcción de Box Culvert ABS: 0+336.76 en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con la construcción de fundición en concreto rígido en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE del año en curso 2023, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con la construcción de andenes fundición en concreto rígido en la canalización del antiguo lecho del arroyo alférez en la ABS: 0+ 270.70 en el municipio de El Carmen de Bolívar.



- ✓ Para la vigencia 2024 del gobierno entrante del alcalde PEDRO VASQUEZ DIAZ, En la fecha y hora mencionadas, el 09 de enero de 2024 a las 07:30 am, se llevó a cabo una importante reunión de comité en la que participaron contratista e interventoría y alcaldía municipal. Este encuentro tuvo como propósito principal iniciar el análisis detallado del proyecto LP-003-2022, cuyo objeto es "Mejoramiento y Canalización del Arroyo Alférez del Municipio El Carmen de Bolívar".

  La razón fundamental de esta reunión fue la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el desarrollo del proyecto durante la vigencia de 2024. Los participantes se dedicaron a evaluar el progreso de la ejecución de la obra hasta la fecha, considerando tanto los logros alcanzados como los desafíos encontrados. La reunión también sirvió como plataforma para abordar las problemáticas que han surgido a lo largo del proyecto y para encontrar soluciones eficientes y compromisos mutuos entre el contratista y la interventoría.

  Es importante destacar que la discusión se centró en la búsqueda de estrategias para superar los obstáculos presentes y garantizar el éxito continuo del proyecto. Se hizo hincapié en la necesidad de tomar decisiones informadas y proactivas que permitan optimizar el avance de la obra y asegurar su alineación con los objetivos establecidos.

  En resumen, la reunión del comité fue un espacio clave para la reflexión y la toma de decisiones orientadas a mejorar y canalizar eficazmente el Arroyo Alférez, contribuyendo así al desarrollo y bienestar del Municipio El Carmen de Bolívar.

  Se le informa a la comunidad del barrio el porvenir, la reubicación de tubería de alcantarillado con un metraje de 64 metros lineales, la reubicación y construcción de 2 manholes, para la coexistencia de los proyectos de alcantarillado y mejoramiento y canalización del arroyo alférez del municipio el Carmen de Bolívar.











- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE DICIEMBRE A 21 DE ENERO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar pone en marcha los compromisos acordados con la comunidad del barrio el porvenir, en mitigación de limpieza y bombeos de evacuación de aguas estancadas canal cerrado.









- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 29 DE FEBRERO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar pone en marcha el reinicio de las obras avanzando en apertura de nuevos tramos.







- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 29 DE FEBRERO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar en apertura de nuevos tramos en actividades de armado de hierro.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 29 DE FEBRERO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de canal cerrado.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 22 DE ENERO A 29 DE FEBRERO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación del canal.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de colocación de formaletas para fundición de canal abierto.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los excavación con maquinaria para aperturas más tramos de canalización.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto en fondo de canal.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de concreto en andenes del canal.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de la canalización.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación para empalmar canal.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de canal abierto para empalmar con la laguna de amortización sector barrio El Porvenir.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MARZO A 31 DE MARZO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de fundición de canal abierto para empalmar con la laguna de amortización en el sector barrio tendal, fundición de andenes.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos demolición de Box culvert existente para posteriormente construirlo con las medidas de diseño del nuevo canal.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación para la continuidad a la canalización del antiguo arroyo alférez.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de armado de acero y formaletería para la continuidad a la canalización del antiguo arroyo alférez.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación con maquinaria para la continuidad a la canalización del antiguo arroyo alférez.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MAYO A 31 DE MAYO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de colocación de acero para la fundición del box culvert.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MAYO A 31 DE MAYO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación manual para fundición de andenes.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE MAYO A 31 DE MAYO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación a máquina y manual en nuevos tramos de canal abierto.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JUNIO A 31 DE JUNIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de colocación de acero en nuevos tramos en la canalización.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JUNIO A 31 DE JUNIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación con maquinaria nuevos tramos en la canalización.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JUNIO A 31 DE JUNIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar sigue con los trabajos de excavación con maquinaria nuevos tramos en la canalización.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JUNIO A 31 DE JUNIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar termina el Box Cuvert número 6 en sector barrio el tendal.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JULIO A 31 DE JULIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza fundición y acabados en andenes.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JULIO A 31 DE JULIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de colocación de rieles en nuevos tramos.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JULIO A 31 DE JULIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de excavación en nuevos tramos.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE JULIO A 31 DE JULIO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de colocación de entibado en nuevos tramos.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de excavación con maquinaria en nuevos tramos.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de fundición de andenes.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de colocación de rejillas en canal cerrado.



- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de excavación maquinaria en nuevos tramos.





- ✓ Para el periodo comprendido entre 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE SEPTIEMBRE del año en curso 2024, el Consorcio Canales de Bolívar realiza actividades de excavación manual en nuevos tramos.





- **DE LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA**

✓ El día doce (12) de Mayo de 2022 se realizó la diligencia de adjudicación del proceso de concurso de méritos abiertos CMA-001-2022, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DEL ARROYO ALFEREZ DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR", el cual se adjudicó mediante resolución 2033 del trece (13) de Mayo del año en curso, con un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIESCIOCHO MIL SETESCIENTOS CATORCE PESOS ($996.818.714)

✓ Se inicia proceso de perfeccionamiento de contrato con la firma de este el día dieciséis (16) de mayo de 2022

✓ Se expide registro presupuestal No 08-51002 de fecha 16 de Mayo de 2022, por valor de $996.818.714

✓ Se reciben las garantías de cumplimiento por parte del contratista de interventoría y se procede a la aprobación de las mismas con Acta de aprobación de garantía de fecha 8 de Junio de 2022

✓ Se firma acta de inicio 22 de Junio.

- **DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL**

✓ Se realizó el pago del permiso de ocupación de cauce debidamente tramitado ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE para la respectiva intervención del cuerpo de agua.

✓ Se recibe una solicitud documental por parte de la CAR el 31 de mayo del año en curso, a la cual se dio contestación el día 3 de junio, y se encuentra en seguimiento constante a fin de continuar con

El trámite de expedición del respectivo permiso.

✓ Se realiza la primera jornada de socialización con la población directamente beneficiada con la ejecución de las obras de canalización.

✓ Se emitió Pronunciamiento de la Corporación Ambiental regional atraves del Auto N°0233 del 7 de Julio del 2022

✓ Se cumplió técnicamente con los requisitos para solicitar por la corporación autónoma CARDIQUE la emisión del permiso del antiguo lecho del arroyo alférez

- **DE LA GESTION FINANICERA**

✓ Los Rendimientos generados en la cuenta bancaria correspondientes al mes de abril se enviarán con la documentación del mes de Julio.

✓ Se realizó desembolso del anticipo a fiducia ALIANZA FIDUCIARIA S.A por un valor de 3.130.512.772,64 correspondiente al 22%

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

✓ El avance del proyecto, según el reporte presentado por el contratista e interventoría Esto indica que, hasta la fecha especificada en el mes de Septiembre, se ha completado un total acumulado del 70,07% de ejecución.

✓ En el presente informe, se destaca un progreso significativo en el proyecto de canalización, con la presencia de 2 frentes de trabajo activos. Este hecho indica una planificación y coordinación efectivas por parte del equipo de trabajo, lo cual ha permitido avanzar de manera eficiente en múltiples áreas simultáneamente. La existencia de varios frentes de trabajo también sugiere una asignación efectiva de recursos y una gestión adecuada del tiempo, lo que contribuye a la aceleración del proyecto. Es fundamental mantener este ritmo de trabajo para garantizar que se cumplan los plazos establecidos y se logren los objetivos propuestos en el proyecto de canalización.

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:



ALEXANDER
DEULOUFEUT CANTILLO
SUPERVISOR
