CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2221186 DE 2023
INFORME No. 1 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".		
PARTICIPANTES	ENTerritorio MUNICIPIO DE ALGARROBO – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE ALGARROBO		
VALOR APORTES	ENTerritorio		$1.470.889.286,35
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$1.470.889.286,35
ADICIÓN:	NINGUNA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico.		
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/12/2022		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA Secretario de Planeación e Infraestructura		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A		
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/02/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA SUSPENSIONES	N/A	**FECHA REINICIOS**	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/11/2023	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO**	28/11/2023
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$1.470.889.286,35	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$ 99.120.563,00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	10%	**Avance Financiero del periodo (%)**	10%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	20%	**Avance Financiero Acumulado (%)**	10%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4 No. 320 47 994000025132	22/02/2023	CUMPLIMIENTO	$147,088,928.64	(22/02/2023)	(22/06/2024)

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	02/08/2023	13/03/2023	$ 221.013.286,08
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$ 221.013.286,08

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero/2023	**$ 24.224,00**	**$ 24.224,00**
Marzo/2023	**$ 45.420,00**	**$ 45.420,00**
Mayo/2023	**$ 46.934,00**	**$ 46.934,00**
Junio/2023	**$ 45.420,00**	**$ 46.934,00**

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de Interventoría No. 020523-001 de 2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA	**($ 99.120.563,00)**
Nombre contratista	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 expedida en Barranquilla	
Fecha Firma del contrato	02/05/2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha del acta de inicio del contrato	17/05/2023	

NOVEDADES	N/A				
Fecha Inicial Terminación Contrato	17/10/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		17/10/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	N/A				
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**0**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**10%**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 320 47 994000025782	03/05/2023	Cumplimiento del contrato	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(03/02/2024)
	03/05/2023	Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(05/10/2026)
	03/05/2023	Calidad del Servicio	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(03/10/2023)
ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*Se presenta informe de interventoría del periodo 01 de junio al 30 de junio. El cual presenta el desarrollo de las siguientes actividades:* ***ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:*** • *Se verificaron las hojas de vida de los trabajadores, se verificó el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato de interventoría y de obra, se verifico el cumplimiento del siso y de las medidas de bioseguridad, se le solicitaron los informes al contratista.* ***ACTIVIDADES TÉCNICAS*** • *Se estudio las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y en general de toda la información referente al proyecto, se presentaron las observaciones y recomendaciones que consideraron pertinentes.* ***ACTIVIDADES FINANCIERAS*** • *Se revisó y estableció el presupuesto de obra del diseño aprobado con cierre financiero, ya que el presupuesto que arrojó el diseño tiene un mayor valor que el presupuesto oficial destinado para las obras, diferencia que fue aportada por el municipio.*	(01/06/2023)	(30/06/2023)

	ACTIVIDADES AMBIENTALES • *Se revisó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, indicando que se deben realizar unos ajustes al documento para que cumpla con los requerimientos del proyecto*		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
Contrato de Obra N°150523-001 de 2023	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".			**($1.344.325.137)**	
Nombre contratista	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO, identificado con NIT. 901.712.744-5 representado legalmente por Cristian Cuentas Manotas identificado con cedula de ciudadanía 8.649.306 expedida en Sabanalarga				
Fecha Firma del contrato	15/05/2023				
Plazo contrato	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha del acta de inicio del contrato	17 /05/2023				
NOVEDADES	NO APLICA				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17/10/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		17/10/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	N/A				
PRIMER PAGO	N/A				
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**0**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**20%**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 85-44-101121673	17/05/2023	Cumplimiento del contrato	$134.432.513,70	(15/05/2023)	(15/02/2024)
	17/05/2023	Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$268.865.027,40	(15/05/2023)	(15/10/2026)
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101055849	17/05/2023	Estabilidad y calidad de la Obra	$403.297.541,10	(15/10/2023)	(15/10/2028)
	17/05/2023	Responsabilidad civil extracontractual (Amparos básicos predios laborales y operacionales)	$232.000.000,00	(15/05/2023)	(15/10/2023)
% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO			**10%**		

% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	**20%**
% AVANCE PROGRAMADO	**12,53%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

➢ **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR**

En el proceso de ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA en el periodo del 01 de junio al 30 de Junio desde la supervisión designa se ha realizado seguimiento y control a la ejecución de la obra con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos establecidos, los plazos y se mantenga la calidad de la construcción.

El supervisor de obra verificó que los trabajos se realicen acorde con los estudios, diseños, especificaciones y normas técnicas aprobados para la ejecución del proyecto, además de garantizar que se sigan las medidas de seguridad y se cumpla el presupuesto establecido.

➢ **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

El contrato de Obra No 150523-001 del 15 de mayo de 2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA” inició el día 17 de Mayo de 2023 una vez reunido los requisitos de perfeccionamiento y el cumplimiento de las garantías exigidas en el contrato de Obra.

Durante el periodo de tiempo del 01 de junio al 30 de junio de 2023, el contratista alcanzó un avance de obra equivalente al 20%, a juicio de esta interventoría es un avance significativo, dado el incremento porcentual del avance ejecutado con respecto al programado.

➢ **CONTRATO DE OBRA.**

• Avance de la meta establecida en el contrato especifico.

Durante el periodo del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, el avance de ejecución en el periodo de la obra es del 10,00%; presentando un avance ejecutado del 20,00% más con respecto a lo programado que es el del 12,34%

• Actividades desarrolladas en el periodo del informe:
Donde se ejecutaron las siguientes actividades:

• Excavación mecánica por medio de retroexcavadora desde la abscisa K00+00 hasta la abscisa K00+460,42, así mismo se conformó el terreno intervenido por medio de motoniveladora y vibro compactador. También se realizaron pruebas de densidad en la subrasante, lo cual se exigió por parte de interventoría. Se inició el corte de terreno con respecto a lo establecido en planos topográficos, teniendo en cuenta las pendientes naturales del terreno y lo propuesto en plano.

• Actividades de conformación de la calzada existente con motoniveladora y vibro compactador, se realizaron pruebas de densidad en la subrasante, lo cual se exigió por parte de interventoría y se inició el suministro e instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante.

• Colocación, extendido y compactación de la subbase granular clase C en los tramos de la estructura de pavimento ya mejorados y se procederá a pavimentar en concreto hidráulico MR=38 el primer tramo ya sellado con subbase.

Pavimento en concreto hidráulico, MR = 38 se realiza la pavimentación desde la abscisa K00+20 hasta la abscisa K00+140, una vez realizado la conformación y compactación de la Subbase granular clase C cumpliendo con los

porcentajes de compactación según lo establecido en las especificaciones generales de construcción de carrerteras INVIAS 2022, resolución 06 de mayo de 2022.

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.

Resumen de las cantidades de obras realizadas en el mes de junio comprendido desde el día 01 de junio de 2023 con corte al 30 de Junio de 2023

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
PRELIMINARES		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	362,82
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	323,36
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	285,07
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	67,00
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	521

Resumen de las cantidades de obras realizadas acumuladas desde el día 17 de mayo de 2023 con corte al 30 de Junio de 2023

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
PRELIMINARES		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.392,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.649,97
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	285,07
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	67,00
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	521

• REGISTROS FOTOGRÁFICOS




















• Actualización del programa de ejecución del proyecto.

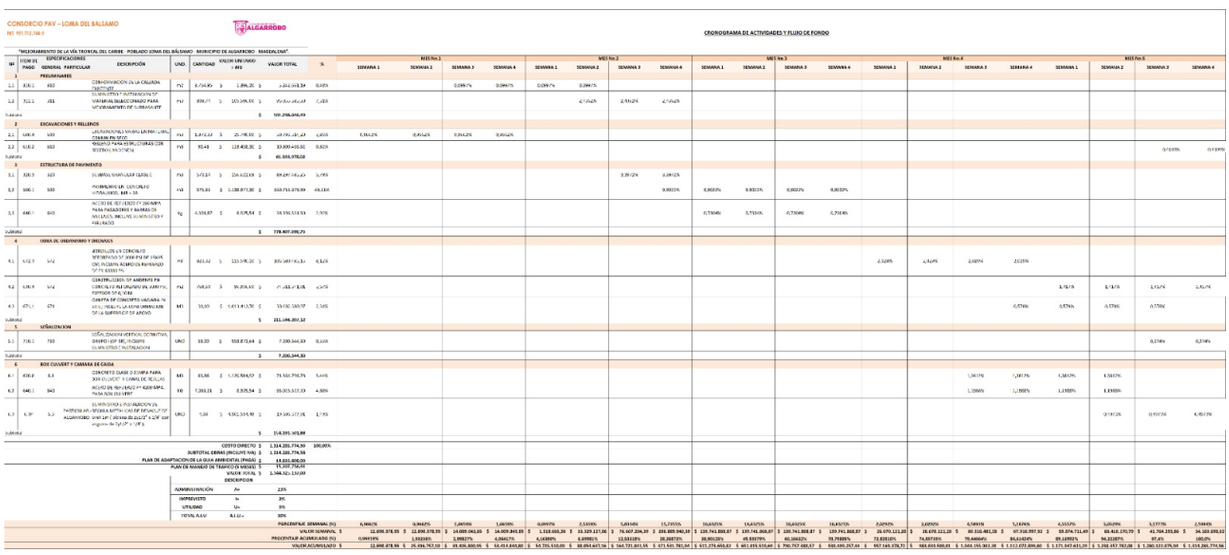

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.312.764-3

ALGARROBO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDO

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE PORLADO LOMA DEL BÁLSAMO MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO APU	VALOR TOTAL	%	MES No.1 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES No.2 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES No.3 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES No.4 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES No.5 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1		PRELIMINARES																											
1.1	101.1	101		DEMOLICIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	8,750.00	$ 1,896.20	$ 16,592,935.24	0.01%			0.09%	0.09%	0.09%	0.09%																
1.2	701.1	701		EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES COMPACTADOS PARA SUBRASANTES DE SUBBASE EXP	M3	958.71	$ 165,109.35	$ 158,306,468.69	7.28%					4.73%	2.55%	2.73%	4.73%														
Subtotal								$ 500,298,696.69																					
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS																											
2.1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	3,812.22	$ 20,798.00	$ 79,301,187.42	3.65%	0.36%	0.45%	0.36%	0.45%																		
2.2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	90.48	$ 228,408.00	$ 20,669,450.01	0.95%																					0.19%	0.19%
Subtotal								$ 99,970,637.43																					
3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																											
3.1	320.3	320		IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	M2	5,720.01	$ 226,122.69	$ 69,297,746.49	3.19%							3.19%	3.19%														
3.2	306.1	306		MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE MDC-19	M3	975.81	$ 1,388,871.00	$ 355,715,376.99	49.16%								9.83%	9.83%	9.83%	9.83%												
3.3	400.1	401		SUMINISTRO, ESTIRIDO Y EXTENDIDO PARA PEGADO ENTRE Y BARRERA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE O MEZCLAS	Kg	4,554.87	$ 8,978.54	$ 59,556,533.53	7.97%									0.75%	0.75%	0.75%	0.75%										
Subtotal								$ 778,407,096.29																					
4		OBRA DE UNDERDRENO Y OBLICUAS																											
4.1	612.1	612		EXCAVACIÓN Y CONCRETO ESTRUCTURAS DE ENTRADA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUYENDO ACARREO REFERIDO	M3	822.62	$ 225,548.20	$ 185,547,462.82	6.82%															4.56%	4.69%	2.00%	2.03%				
4.2	606.4	606		CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 3,000 PSI, ESPESOR DE 0.10M	M2	458.00	$ 39,856.60	$ 18,254,442.80	2.67%																			1.78%	1.78%	1.56%	1.56%
4.3	675.1	675		CUNETA DE CONCRETO INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, PERFILADO, LA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE DE APOYO	M3	70.00	$ 1,013,813.50	$ 70,967,945.07	2.58%																	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%		
Subtotal								$ 255,194,850.68																					
5		SEÑALIZACION																											
5.1	704.1	704		SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TIPO PREVENTIVO, SEGÚN LOS DISEÑOS Y LA NORMATIVA VIGENTE	UND	10.00	$ 703,872.64	$ 7,038,644.00	0.26%																					0.24%	0.24%
Subtotal								$ 7,038,644.00																					
6		BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA																											
6.1	400.4	8.4		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA	M3	83.86	$ 1,190,844.50	$ 99,861,990.75	3.44%																	1.34%	1.34%	1.36%	0.56%		
6.2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA, PARA BOX CULVERT	KG	7,260.18	$ 8,575.54	$ 62,253,327.39	2.30%																	1.08%	1.08%	1.08%	1.14%		
6.3	6.3P	9.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ANTIVEGETACIÓN DE ESPUMA, TIPO ALGARROBO SHAFT EN CONCRETO CLASE 3 4,000 PSI	UND	1.00	$ 9,561,504.90	$ 9,561,504.90	0.35%																					0.35%	0.35%
Subtotal								$ 171,677,467.54																					
								COSTO DIRECTO	$ 1,314,231,774.50	100.00%																				
								SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 1,314,231,774.50																						
								PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 10,031,000.00																						
								PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 VERAS)	$ 11,337,750.00																						
								VALOR TOTAL	$ 1,348,321,134.00																						
								DESCRIPCION																						
								ADMINISTRACIÓN	Ao	23%																				
								IMPREVISTO	Io	3%																				
								UTILIDAD	Uo	5%																				
								TOTAL A.I.U	A.I.U=	30%																				
								PORCENTAJE SEMANAL (%)		0.96%	0.96%	1.84%	1.84%	0.89%	2.53%	5.45%	15.73%	10.41%	10.41%	10.41%	7.97%	2.69%	6.59%	5.14%	6.55%	5.29%	3.77%	2.59%
								VALOR SEMANAL	$	12,698,378.55	$ 12,698,378.55	$ 24,009,043.05	$ 24,009,043.05	$ 1,318,165.30	$ 33,329,127.86	$ 76,467,204.20	$ 206,889,940.39	$ 135,741,868.87	$ 135,741,868.87	$ 135,741,868.87	$ 26,670,121.20	$ 35,670,121.20	$ 90,316,481.28	$ 67,710,397.52	$ 89,974,711.45	$ 68,810,170.79	$ 49,704,203.86	$ 34,103,699.62
								PROCENTAJE ACUMULADO (%)		0.96%	1.92%	3.76%	5.60%	6.49%	9.02%	14.47%	30.20%	40.61%	50.02%	60.43%	68.40%	71.09%	77.68%	82.82%	89.37%	94.66%	98.43%	101.02%
								VALOR ACUMULADO	$	12,698,378.55	$ 25,396,757.10	$ 49,405,800.15	$ 73,414,843.20	$ 74,733,008.50	$ 108,062,136.36	$ 184,529,340.56	$ 391,419,280.95	$ 527,161,149.82	$ 662,902,018.69	$ 798,643,887.56	$ 825,313,987.76	$ 860,984,108.96	$ 951,300,590.24	$ 1,019,010,987.76	$ 1,108,985,459.21	$ 1,177,795,630.00	$ 1,227,499,833.86	$ 1,261,603,533.48

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Durante el periodo comprendido del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, el informe muestra la ejecución al periodo de un 10% con un acumulado del 20% de las actividades del contrato No.150523-001. Por su parte la interventoría continúa trabajando en simultaneo garantizando el óptimo cumplimiento del debido proceso, dando cumplimientos a las especificaciones técnicas y de calidad de la obra.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A
		N/A

- **RELACIÓN DE ANEXOS**

1. Extracto Bancario de la cuenta del contrato específico (al corte mensual más reciente), certificación bancaria que señale los rendimientos generados durante el mes del reporte.
2. Soporte de traslado de los rendimientos financieros a la Dirección General de Crédito Público
3. Informe de interventoría firmado que soporta el reporte del periodo con todos sus anexos.
6. Programación actualizada
8. Demás documentos que soporten la información reportada.

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
SUPERVISOR

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

- Anexo 1: Informe Interventoría del periodo del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023
- Anexo 2: Informe Semanal
- Anexo 3: Bitácora
- Anexo 4: Informe financiero
- Anexo 5: evidencia fotográfica
- Anexo 5: Cronograma

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE ALGARROBO
ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATISTA: TORIBIO ANDRADE YEJAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA

INFORME DE INTERVENTORIA No 2

5 DE JUNIO DE 2023 - 2 DE JULIO DE 2023

INTRODUCCIÓN

La alcaldía Municipal de Algarrobo, en usos de sus facultades desarrolla la Interventoría Administrativa y Técnica del proyecto, **MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA**, para que cumpla con los estándares actuales de calidad de obra en los procesos de construcción de vías urbanas, para optimizar las vías y permita disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito, bien sea peatonal o vehicular que a diario circulan por las calles y carreras del casco urbano del municipio de Algarrobo.

OBJETIVO

El objeto del proyecto es: **EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA,** el cual se le adjudico a la firma CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO, mediante contrato de obra pública número 150523-001 de fecha Trece (17) de mayo de 2023.

El presente informe contiene generalidades del desarrollo del contrato de obra y de interventoría.

1.1 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
REPRESENTANTE LEGAL	Cristian Cuentas Manotas identificado con cedula de ciudadanía 8.649.306 expedida en Sabanalarga
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**
VALOR DEL CONTRATO	($1.344.325.137) INCLUIDO AIU
CONTRATO NUMERO:	150523-001
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	16 DE OCTUBRE DE 2023

1.1.1 ASPECTOS JURIDICOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES

POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, No 400048210 SEGUROS DEL ESTADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA "No. 150523-001 de fecha VEINTINUEVE (29) de mayo de 2023"

TOMADOR/ GARANTIZADO	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
ASEGURADO Y BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ALGARROBO – ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 819.003.219-0
GARANTIAS OTORGADAS	

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	115,890	$43.700.000,00	15	05	2023	15	02	2024
Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	231,780	$	15	05	2023	15	10	2026
Estabilidad y calidad de la Obra	347,670	$403.297.541,10	15	10	2023	15	10	2028

POLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, No 400048211 SEGUROS DEL ESTADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA "No. 150523-001 de fecha VEINTINUEVE (29) de mayo de 2023"

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad civil extracontractual (Amparos básicos predios laborales y operacionales)	200,000	$232,000,000.00	15	05	2023	15	10	2023

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 220623-001

CONTRATISTA	TORIBIO ANDRADE YEJAS
REPRESENTANTE LEGAL	TORIBIO ANDRADE YEJAS con CC 72.135.609 B/quilla
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.120.563,00
VALOR ADICION AL CONTRATO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (5) MESES.
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO de 2023
ADICION EN PLAZO	N/A
FECHA DE FINALIZACION	16 DE OCTUBRE DE 2023

1.2.1 ASPECTOS JURIDICOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTOIA "No. 320 47 994000025782 de fecha Tres (03) de Mayo de 2023. **Póliza Numero 320 47 994000025782, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

TOMADOR/ GARANTIZADO	TORIBIO ANDRADE YEJAS, CC 72.135.609
ASEGURADO Y BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ALGARROBO – ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 819.003.219-0

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

Cumplimiento del contrato	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	03	02	2024
Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	05	10	2026
Calidad del Servicio	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	03	10	2023

1.3 REVISIÓN TECNICA

SITUACIÓN:

Se realizará el mejoramiento de la vía terciaria localizado en el tramo K0+000 a K0+460,42 entre la Troncal del Caribe – Poblado Loma del Bálsamo en el Municipio de Algarrobo con la intervención de 0,46042 Kilómetros con pavimento en concreto rígido con espesor de 20 cm y MR 38 soportado sobre una Sub-Base Granular de 20 cm. Con una calzada de 6.0 m y esta a su vez compuestas por dos carriles cada uno de 3.0 m de ancho, Con un Bordillo de altura de servicios de 45 cm y 15 cm de ancho y anden de 0,85 m de ancho, además de obras de drenaje como Cunetas en concreto reforzado de 0,8m de ancho localizadas desde las abscisas K0+380 hasta la abscisa K0+460,42, con su señalización vial vertical.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista inicio labores el 17 de Mayo del 2023, sin Anticipo puesto que el contrato no contempla el pago de Anticipo, el contratista continuó la cuarta semana realizando actividades de conformación de la calzada existente y suministro e instalación de subbase granular clase C, en la quinta semana se realizaron actividades de conformación de la calzada existente, suministro e instalación de subbase granular clase C y excavaciones en material común en seco, en la sexta y séptima semana no se ejecutaron actividades debido a que se presentaron fuertes precipitaciones en el sitio de la obra, se realizó manejo de aguas con motobomba, luego se realizaron actividades de armado de acero y pavimento en concreto hidráulico, MR=38 MPa.

La interventoría solicitó al contratista toda la documentación técnica y legal para iniciar las obras, éste entrego parte de esta documentación, quedando pendiente los siguientes documentos:

- ✓ Plan de calidad e Implementación del programa de gerencia del proyecto
- ✓ Señalización preventiva en toda la obra.
- ✓ Exámenes de ingreso del personal en obra y Afiliaciones a los sistemas de SALUD, PENSION, RIESGOS LABORALES, ICBF, SENA.

2. ACTAS DE OBRAS.

- El contratista presentó avance de obra, por valor de **$262.865.027,40** con un porcentaje de avance del **10%** completando un porcentaje ejecutado acumulado del **20%.**

3. INCONVENIENTES.

Durante la ejecución de las obras de excavación, se presentaron dificultad con las lluvias persistentes en la zona, afectando así dos semanas de ejecución de la obra.

La interventoría, quien además de exigir al Contratista el cumplimiento de lo pactado en el contrato, participo de manera proactiva en los cambios y decisiones, en busca del equilibrio de inversión, economía y buenas obras.

4. AVANCE DEL CONTRATO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA

CATEGORIA INVERSIÓN: OBRA FISICA

EL AVANCE DEL PROYECTO ES DE $262.865.027,40 con un porcentaje de avance de ejecución del 20%

A continuación, se relacionan las tablas resumen de los procesos financieros objeto de

este contrato y sus adicionales de obra:

1	VALOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de Mayo de 2023	$ 1.344.325.137,00
3	VALOR ANTICIPO (%) DEL CONTRATO INICIAL		$ 0
4	ACTA PARCIAL Nº 001	4 de Junio de 2023	$ 134.432.513,70
6	VR. TOTAL, EJECUTADO	2 de Julio de 2023	$ 262.865.027,40
7	VR. POR EJECUTAR		$ 1.081.460.109,60

4.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Dentro de las actividades, para el continuo desarrollo de la topografía se encuentran debidamente calibrados los siguientes equipos:

- GPS topcon hider Vred Gnss.
- Estacion total topcon CTS-255 con precision angular.
- Nivel.
- Equipo Densidad de campo (Cono de arena).


Dentro de la maquinaria de trabajo utilizados en esta etapa del proyecto tenemos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retro Excavadora – Oruga.	2
Cortadoras de acero (tronzadoras).	1
Compactador tipo rana	1
Motoniveladora	1
Vibro-Compactador	1
Retro Excavadora – tipo pajarita	1

4.2. INFORMES SEMANALES

Se describen a continuación los avances semanales a corte del 05 de Junio de 2023 al 02 de julio de 2023 obtenidos en la ejecución del contrato de Obra No. 150523-001

Columna1	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S3		3,00%		10,23%	
S4	1,07%	4,06%	6,24%	16,46%	-5,17%
S5	0,10%	4,16%	3,99%	20,46%	-3,89%
S6	2,54%	6,70%	0,00%	20,46%	2,54%
S7	5,83%	12,53%	0,00%	20,46%	5,83%

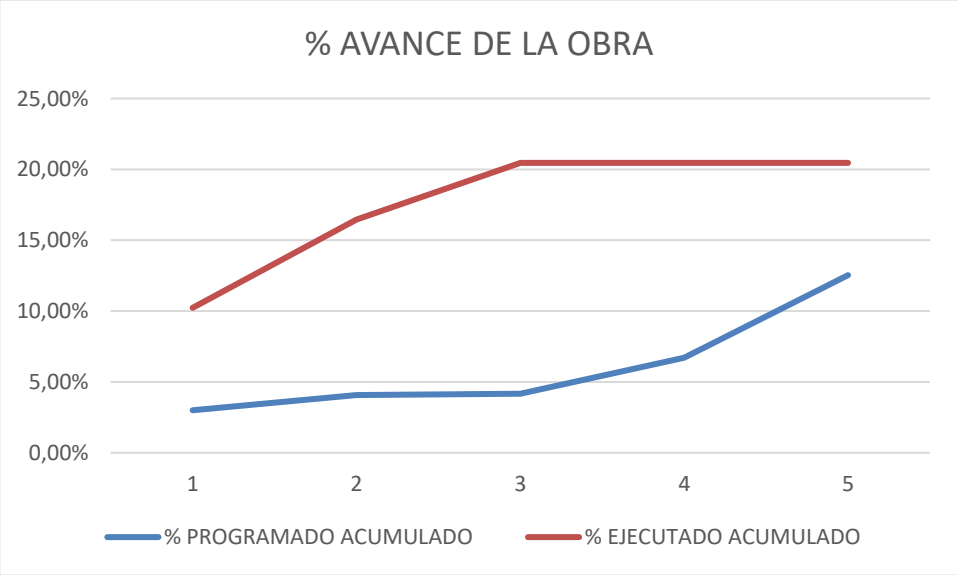

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los aspectos o condiciones a resaltar, presentadas del periodo del 05 de Junio hasta el 2 de julio del 2023 de ejecución, donde el contratista ha realizado las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
PRELIMINARES		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	362,82
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	323,36
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	285,07
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	67,00
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	521

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
PRELIMINARES		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.392,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.649,97
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	285,07
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	67,00
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	521

5. CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo que se informa, el contratista alcanzó un avance de obra equivalente al 10% del valor total del contrato, a juicio de esta interventoría es un avance significativo, dado el incremento porcentual del avance ejecutado con respecto al programado. El índice de cumplimiento aumentó al 14,6%, lo cual significa que se encuentran adelantados.

Manteniendo los rendimientos de los equipos y la Mano de Obra para la elaboración de la conformación y las excavaciones que son actividades que se encuentran programadas para las siguientes semanas se puede conseguir una secuencia en el avance de la obra.



TORIBIO ANDRADE YEJAS
INTERVENTOR

- **ANEXOS FOTOGRAFICOS**































RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO

I.N.V. E-414
ASTM C 78, AASHTO T 97 I.N.V. E-415, ASTM C 293, AASHTO T 177

JP INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S
DIAGONAL 19A # 21-36 BARRIO LOS CACIQUES, VALLEDUPAR
TELEFONO 5872155 - CELULAR 300 810 17 92

Ingeniería civil

SOLICITANTE: CONSORCIO PAV-LOMA DEL BALSAMO

DIRECCIÓN SOLICITANTE:

OBRA Y LOCALIZACION: MEJORAMIENTO LA VIA TRONCAL DEL CARIBE-POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

PROCEDENCIA GRUESO:

PROCEDENCIA FINO:

CEMENTO UTILIZADO:

OBSERVACIONES: NORMA UTILIZADA INV - E 414

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (días)	ASENTAMIENTO	LECTURA MAQUINA (kN)	DISTANCIA ENTRE APOYOS (mm)	EJE MENOR DE LA VIGA (mm)	ALTURA DE LA VIGA (mm)	MÓDULO DE ROTURA (MPa)	MÓDULO DE ROTURA (kg/cm²)
1			26/07/2023		I.N.V. E-414	**20,18**	465,0	150,0	151,0	**2,74**	**28,0**
2			26/07/2023		I.N.V. E-414	**19,67**	465,0	150,0	150,0	**2,71**	**27,6**

1. Los informes de laboratorio sin firmas originales del GERENTE o LABORATORISTA y sello del Laboratorios ("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen validez.
2. Los resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
4. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados.

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
NIT. 900891467-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JOSÉ E. PALENCIA MORALES
GERENTE

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

DENSIDAD EN EL TERRENO

OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P A V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: CALLE 4 TRONCAL – VIA BELLA VISTA LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA
FECHA: JUNIO 23 DE 2023 **DESCRIPCIÓN:** SUBBASE GRANULAR

ENSAYO No.	1	2	3	4	5	
ABSCISAS	K0+190	K0+220	K0+250	K0+285	K0+310	
PROFUNDIDAD METROS	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6420	6390	6382	6371	6362	
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	3103	3083	3075	3062	3048	
PESO ARENA TOTAL USADA	3299	3301	3307	3309	3314	
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458	1458	
PESO ARENA EN EL HUECO	1841	1843	1849	1851	1856	
DENSIDAD DE LA ARENA	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	
VOLUMEN DEL HUECO	1363	1365	1369	1371	1374	
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	2862	2857	2850	2846	2838	
% HUMEDAD	8.5	8.6	8.4	8.7	8.6	
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	2637	2630	2629	2618	2613	
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	1.93	1.92	1.92	1.90	1.90	
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	120.4	119.8	119.8	118.5	118.5	
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	98.2	97.8	97.4	96.9	96.5	
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	

OBSERVACIONES: _____

LABORATORIO **LABORATORISTA** **INGENIERO**

MP 08202-

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla - Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

DENSIDAD EN EL TERRENO

OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P A V/ LA LOMA
LOCALIZACIÓN: CALLE 4 TRONCAL – VIA BELLA VISTA LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA
FECHA: JUNIO 23 DE 2023 **DESCRIPCIÓN:** SUBBASE GRANULAR

ENSAYO No.	1	2	3	4	5	6	7
ABSCISAS	K0+08	K0+028	K0+055	K0+080	K0+115	K0+138	K0+167
PROFUNDIDAD METROS	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6462	6456	6442	6433	6426	6418	6409
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	3172	3160	3152	3145	3135	3123	3115
PESO ARENA TOTAL USADA	3290	3296	3290	3288	3291	3295	3294
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458
PESO ARENA EN EL HUECO	1832	1838	1832	1830	1833	1837	1836
DENSIDAD DE LA ARENA	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
VOLUMEN DEL HUECO	1357	1361	1357	1355	1357	1360	1360
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	2830	2844	2846	2857	2838	2862	2826
% HUMEDAD	8.4	8.6	8.5	8.7	8.5	8.4	8.6
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	2610	2618	2623	2628	2615	2623	2602
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	1.92	1.92	1.93	1.93	1.92	1.92	1.91
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	119.8	119.8	120.4	120.4	119.8	119.8	119.1
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	97.6	97.4	98.1	98.4	97.8	97.5	96.9
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

OBSERVACIONES: _____

LABORATORIO **LABORATORISTA** **INGENIERO**

MP 08202-128175 del Atlo

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla - Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad


OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P A V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA **FECHA:** JUNIO 20 DE 2023
DESCRIPCIÓN: MATERIAL GRANILAR COLOR GRIS SUBBASE GRANULAR CLASE B

LIMITE LÍQUIDO

No. de golpes	----	----	----
% de humedad	----	----	----

LIMITE PLÁSTICO

No. de Recipiente	----	----	----
% de humedad	----	----	----

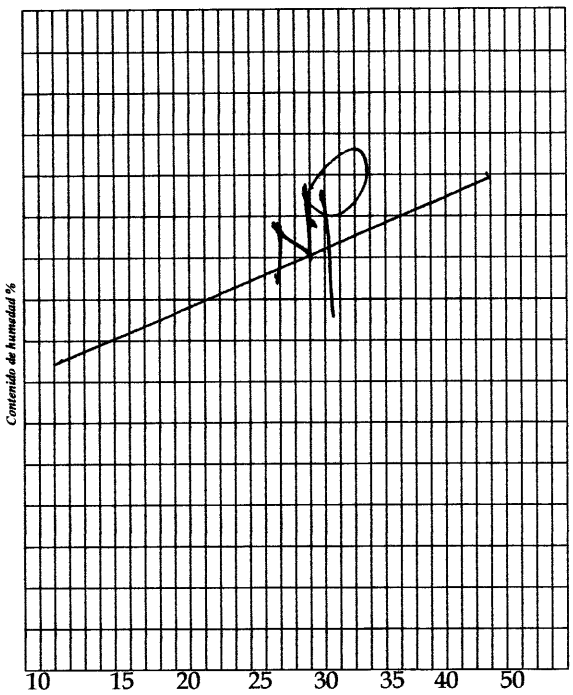


Número de golpes
RESULTADOS

PI	1922	P2			
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa		
2	---	---	100	100	---
11/2	**175.4**	**9.12**	**90.80**	**70-95**	100
1	**289.8**	**15.08**	**84.92**	**60-90**	75-95
1/2	**963.0**	**50.10**	**49.90**	**45-75**	55-85
3/8	**1121**	**58.32**	**41.68**	**40-70**	45-75
No. 4	**1340.8**	**69.76**	**30.24**	**25-55**	30-60
10	**1473.3**	**76.65**	**23.35**	**15-40**	20-50
40	**1623.3**	**84.46**	**15.54**	**6-25**	8-30
200	**1797**	**93.49**	**6.51**	**2-15**	2-15
F	**125.1**	**6.51**			

LL≤25
IP≤6

Humedad 9.22
Límite líquido: NL
Límite plástico NP
Índice de plasticidad NP
Índice de grupo 0
U.S.C. SM-SC
A.A.S/H.T.O. A-1-b

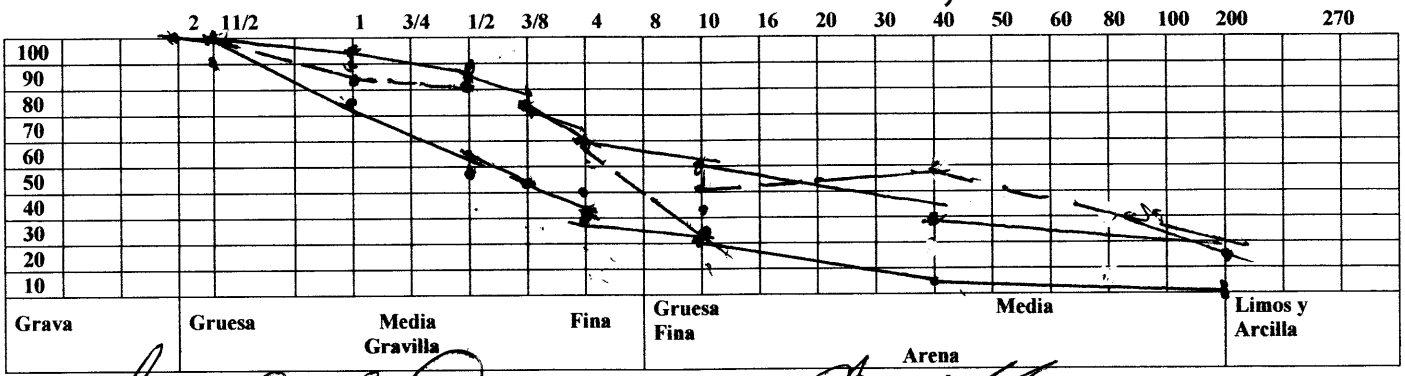

LABORATORISTA


JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla – Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P A V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA **FECHA:** JUNIO 20 DE 2023
DESCRIPCIÓN: SUBBASE GRANULAR

PRUEBA	1	2	3	4	5
No. DE GOLPES	**125**	**125**	**125**		
HUMEDAD DESEADA %	**6.6**	**9.6**	**12.6**		
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA %	**6.6**	**6.6**	**.6.6**		
HUMEDAD ADICIONAL %	**--**	**3.0**	**6.0**		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA GRS	**2500**	**2500**	**2500**		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	**2345**	**2345**	**2345**		
AGUA ADICIONAL C.C.	**---**	**75**	**150**		
MOLDE No.	**1**	**1**	**1**		
PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA Y MOLDE GRS	**3810**	**3990**	**3890**		
PESO DEL MOLDE GRS	**1952**	**1952**	**1952**		
PESO DE LA MUESTRA HUMEDAD GRS	**1858**	**2038**	**1938**		
PORCENTAJE DE HUMEDAD (HORNO)	**6.6**	**9.6**	**12.6**		
PESO DE LA MUESTRA SECA GRS	**1742**	**1859**	**1721**		
PESO DE LA MUESTRA SECA EN LBS	**3.83**	**4.09**	**3.79**		
VOLUMEN DEL MOLDE CM^3	**940**	**940**	**940**		
DENSIDAD DE LA MUESTRA SECA GRS/CM^3	**1.85**	**1.97**	**1.83**		

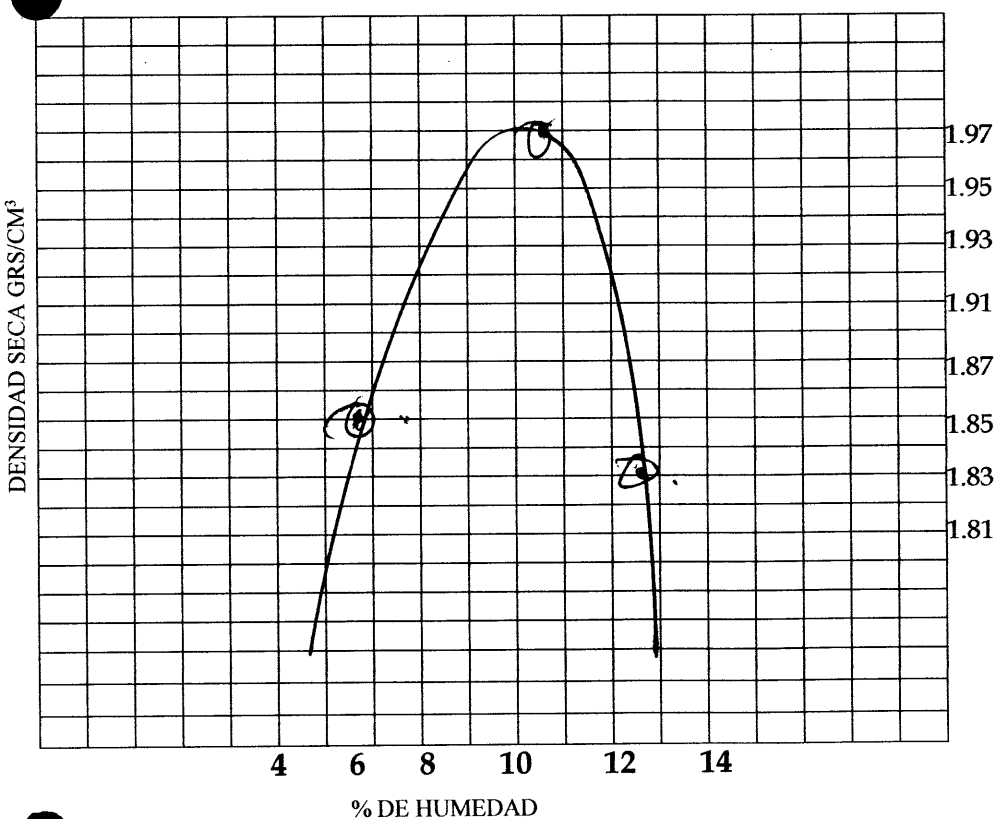

CLASIFICACIÓN

A.S.S.T.H.O
U.S.C.
Índice de grupo

Densidad max. 1.97 grs/cm^3

Humd. Óptima 9.6%

OBSERVACIONES

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla - Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad


OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P.A.V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA **FECHA:** JUNIO 10 DE 2023
DESCRIPCIÓN: MATERIAL GRANILAR COLOR GRIS AFIRMADO A-38

LIMITE LÍQUIDO

No. de golpes	14	25	35
% de humedad	26.5	21.8	17.9

LIMITE PLÁSTICO


No. de Recipiente	1	2	
% de humedad	15.5	16.0	

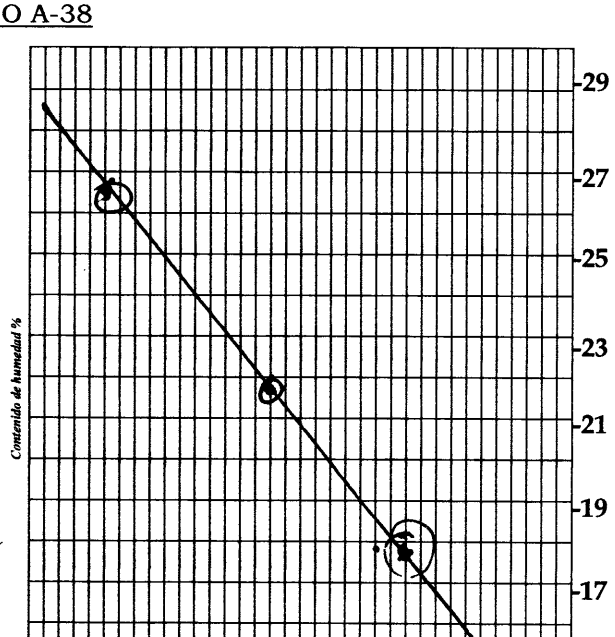

PI	1853	P2		A-38	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa		
11/2	---	---	100	100	
1	91.50	4.93	95.07	---	
3/4	273.5	14.76	85.24	80-100	
3/8	706.3	38.11	61.89	60-85	
No. 4	1061	57.26	42.74	40-65	
10	1300	70.15	30.0	30-50	
40	1530.6	82.60	17.40	13-30	
200	1610.2	286.89	13.11	9.18	
F	**242.92**	**13.11**			

RESULTADOS

Humedad 7.93
Límite líquido: 21.8
Límite plástico 15.5
Índice de plasticidad 6.3
Índice de grupo 0
U.S.C. SC
A.A.S.H.T.O. A-1-b

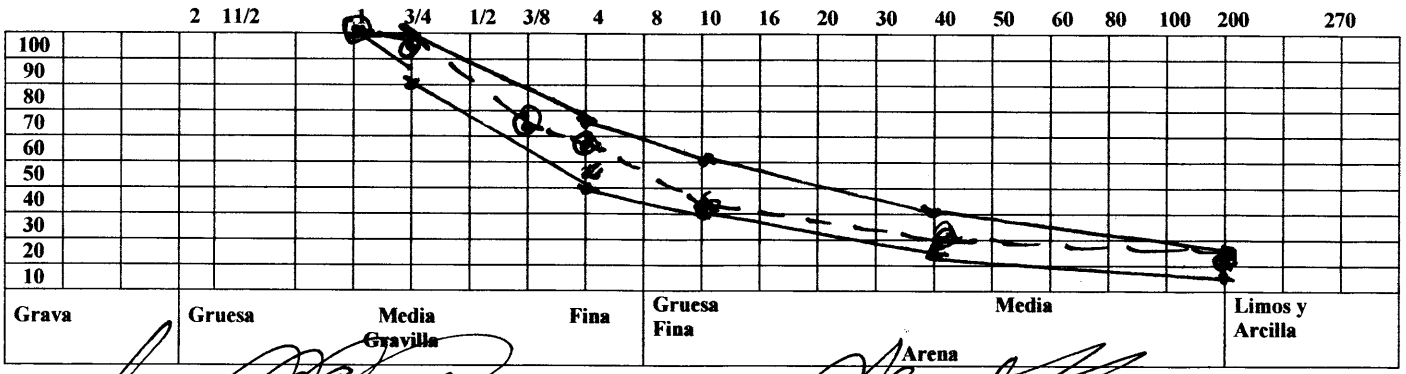

LABORATORISTA

JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314 5049381
Barranquilla - Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

DENSIDAD EN EL TERRENO

OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P.A V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: CALLE 4 TRONCAL – VIA BELLA VISTA LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA
FECHA: JUNIO 09 DE 2023 **DESCRIPCIÓN:** SUBRASANTE

ENSAYO No.	1	2	3	4		
ABSCISAS	K0+05	K0+110	K0+150	K0+170		
PROFUNDIDAD METROS	0.11	0.11	0.11	0.11		
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6152	6144	6137	6131		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	2821	2869	2856	2846		
PESO ARENA TOTAL USADA	3271	3275	3281	3285		
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458		
PESO ARENA EN EL HUECO	1813	1817	1823	1827		
DENSIDAD DE LA ARENA	1.35	1.35	1.35	1.35		
VOLUMEN DEL HUECO	1342	1345	1350	1353		
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	2642	2652	2635	2624		
% HUMEDAD	7.5	7.7	7.3	7.2		
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	2457	2462	2455	2447		
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	1.83	1.83	1.81	1.80		
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	114.1	114.1	112.9	112.3		
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	1.87	1.87	1.87	1.87		
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9.6	9.6	9.6	9.6		
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	97.9	97.8	97.2	96.7		
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0		

OBSERVACIONES: _____

LABORATORIO **LABORATORISTA** **INGENIERO**

MP 0826 2-12477 del Atlántico

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla - Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

DENSIDAD EN EL TERRENO

OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: CALLE 4 TRONCAL – VIA BELLA VISTA LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA
FECHA: JUNIO 16 DE 2023 **DESCRIPCIÓN:** AFIRMADO GRANULAR

ENSAYO No.	1	2	3	4	5	6
ABSCISAS	K0+050	K0+090	K0+130	K0+170	K0+210	K0+250
PROFUNDIDAD METROS	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6525	6520	6510	6495	6485	6477
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	3310	3260	3455	3480	3535	3195
PESO ARENA TOTAL USADA	3215	3260	3055	3025	2950	3282
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458	1458	1458
PESO ARENA EN EL HUECO	1757	1802	1597	1567	1492	1824
DENSIDAD DE LA ARENA	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
VOLUMEN DEL HUECO	1304	1334	1182	1160	1105	1351
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	2735	2835	2725	2505	2340	2797
% HUMEDAD	8.4	8.0	8.5	8.7	8.6	8.4
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	2523	2625	2511	2304	2154	2580
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	1.93	1.96	1.99	1.98	1.94	1.90
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	120.4	122.3	124.1	123.5	121.0	118.5
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	97.7	99.3	100	100	98.4	96.4
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

OBSERVACIONES: _____

LABORATORIO **LABORATORISTA** **INGENIERO**

MP 08202-12575 del Atl.

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla - Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla
Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

DENSIDAD EN EL TERRENO

OBRA: PAVIMENTO **REFERENCIA:** CONSORCIO P.A.V LA LOMA
LOCALIZACIÓN: CALLE 4 TRONCAL – VIA BELLA VISTA LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA
FECHA: JUNIO 19 DE 2023 **DESCRIPCIÓN:** AFIRMADO GRANULAR

ENSAYO No.	1	2	3	4	5	6
ABSCISAS	K0+07	K0+060	K0+086	K0+110	K0+265	K0+287
PROFUNDIDAD METROS	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6468	6462	6454	6446	6439	6432
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	3183	3175	3164	3152	3142	3133
PESO ARENA TOTAL USADA	3285	3267	3290	3294	3297	3299
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458	1458	1458
PESO ARENA EN EL HUECO	1827	1809	1832	1836	1839	1841
DENSIDAD DE LA ARENA	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
VOLUMEN DEL HUECO	1353	1340	1357	1360	1362	1363
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	2812	2838	2827	2853	2862	2874
% HUMEDAD	8.4	8.6	8.5	8.7	8.5	8.4
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	2594	2613	2605	2624	2637	2651
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	1.91	1.92	1.92	1.92	1.93	1.94
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	119.1	121.6	119.8	119.8	120.4	121.0
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	96.8	98.4	96.9	97.4	97.8	98.2
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

OBSERVACIONES: _____

LABORATORIO **LABORATORISTA** **INGENIERO**

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla - Colombia

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato **INFORME SEMANAL 4**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	19 dias		

Semana Número: 4 Del: 5/06/2023 Al: 11/06/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 26 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,0659%	4,0642%	Obra Física Ejecutada (%)	6,2351%	16,4637%
Valor de la Obra programada:	$ 14.009.043,85	$ 53.414.844,80	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 81.947.084,90	$ 216.379.598,60

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,9983%	10,2286%	5,1692%
Durante el periodo	1,0659%	6,2351%	
Acumulado actual	4,0642%	16,4637%	

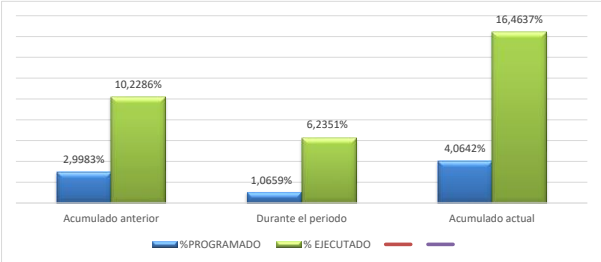

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la cuarta semana se relizaron actividades de: Conformación de la calzada existente y suministro e instalación de subbase granular clase C.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Suministro e instalación de la subbase granulas clase C en los tramos de la estructura de pavimento ya mejorados. Asi mismo se realizaran pruebas de densidades en la capa de mejoramiento y subbase.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 16,4637% con respecto a lo programado de 1,0659% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 16,4637% presentandose un avance de 5,1692% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALLESSA TURIZO CENTENO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5			$ 1.310.665,30								
6			$ 33.329.127,06								
7			$ 76.667.204,39								
8			$ 206.809.940,39								
9			$ 139.741.868,87								
10			$ 139.741.868,87								
11			$ 139.741.868,87								
12			$ 139.741.868,87								
13			$ 26.670.121,28								
14			$ 26.670.121,28								
15			$ 60.316.402,28								
16			$ 67.916.997,52								
17			$ 59.874.711,49								
18			$ 66.410.170,79								
19			$ 41.764.293,86								
20			$ 34.163.698,62								
			$ 1.314.285.774,56					**4,0642%**	**$ 53.414.844,80**	**16,4637%**	**$ 216.379.598,60**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato **INFORME SEMANAL 5**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	26 dias		

Semana Número: 5 Del: 12/06/2023 Al: 18/06/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 33 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,0997%	4,1639%	Obra Física Ejecutada (%)	3,9935%	20,4571%
Valor de la Obra programada:	$ 1.310.665,30	$ 54.725.510,09	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 52.485.428,80	$ 268.865.027,40

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,0642%	16,4637%	3,8937%
Durante el periodo	0,0997%	3,9935%	
Acumulado actual	4,1639%	20,4571%	

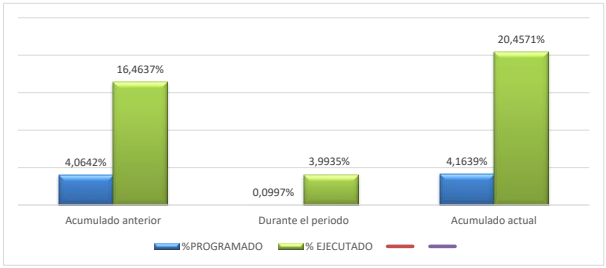

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la quinta semana se relizaron actividades de: Conformación de la calzada existente, suministro e instalación de subbase granular clase C y excavaciones en material común en seco.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Colocación de la subbase granulas clase C en los tramos de la estructura de pavimento ya mejorados. Asi mismo se realizaran pruebas de densidades en la capa de mejoramiento y subbase.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 3,9935% con respecto a lo programado de 0,0997% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 20,4571%, presentandose un avance de 3,8937% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALLESSA TURIZO CENTENO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6			$ 33.329.127,06								
7			$ 76.667.204,39								
8			$ 206.809.940,39								
9			$ 139.741.868,87								
10			$ 139.741.868,87								
11			$ 139.741.868,87								
12			$ 139.741.868,87								
13			$ 26.670.121,28								
14			$ 26.670.121,28								
15			$ 60.316.402,28								
16			$ 67.916.997,52								
17			$ 59.874.711,49								
18			$ 66.410.170,79								
19			$ 41.764.293,86								
20			$ 34.163.698,62								
			$ 1.314.285.774,56					**4,1639%**	**$ 54.725.510,09**	**20,4571%**	**$ 268.865.027,40**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato **INFORME SEMANAL 6**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	33 dias		

Semana Número: 6 Del: 19/06/2023 Al: 25/06/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 40 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,5359%	6,6998%	Obra Física Ejecutada (%)	0,0000%	20,4571%
Valor de la Obra programada:	$ 33.329.127,06	$ 88.054.637,16	Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 268.865.027,40

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,1639%	20,4571%	-2,5359%
Durante el periodo	2,5359%	0,0000%	
Acumulado actual	6,6998%	20,4571%	

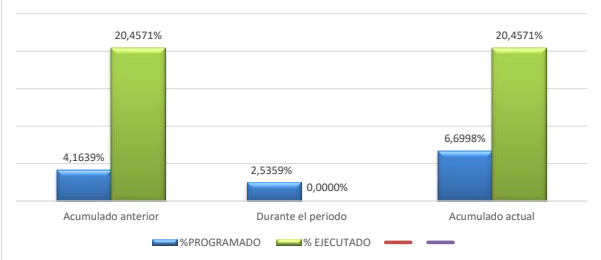

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la sexta semana no se ejecutaron actividades debido a que se presentaron fuertes precipitaciones en el sitio de la obra. Se realizó manejo de aguas con motobomba.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero y pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 0,00% con respecto a lo programado de 2,5359% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 20,4571%, presentandose un atraso de de-2,5359% menos respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALLESSA TURIZO CENTENO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7			$ 76.667.204,39								
8			$ 206.809.940,39								
9			$ 139.741.868,87								
10			$ 139.741.868,87								
11			$ 139.741.868,87								
12			$ 139.741.868,87								
13			$ 26.670.121,28								
14			$ 26.670.121,28								
15			$ 60.316.402,28								
16			$ 67.916.997,52								
17			$ 59.874.711,49								
18			$ 66.410.170,79								
19			$ 41.764.293,86								
20			$ 34.163.698,62								
			$ 1.314.285.774,56					**6,6998%**	**$ 88.054.637,16**	**20,4571%**	**$ 268.865.027,40**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato **INFORME SEMANAL 7**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	40 dias		

Semana Número: 7 Del: 26/06/2023 Al: 2/07/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 47 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,8334%	12,5332%	Obra Física Ejecutada (%)	0,0000%	20,4571%
Valor de la Obra programada:	$ 76.667.204,39	$ 164.721.722,72	Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 268.865.027,40

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6,6998%	20,4571%	-5,8334%
Durante el periodo	5,8334%	0,0000%	
Acumulado actual	12,5332%	20,4571%	

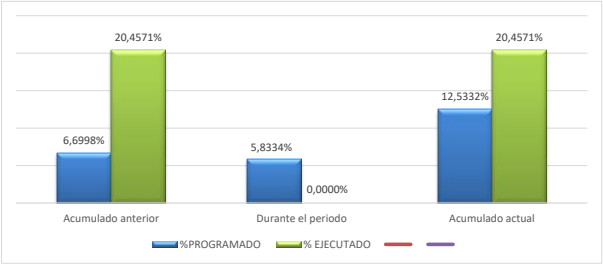

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la septima semana no se ejecutaron actividades debido a que se presentaron fuertes precipitaciones en el sitio de la obra. Se realizó manejo de aguas con motobomba.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero y pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 0,00% con respecto a lo programado de 5,8334% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 20,4571%, presentandose un atraso de de-5,8334% menos respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: IRIS PACHECO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8			$ 206.809.940,39								
9			$ 139.741.868,87								
10			$ 139.741.868,87								
11			$ 139.741.868,87								
12			$ 139.741.868,87								
13			$ 26.670.121,28								
14			$ 26.670.121,28								
15			$ 60.316.402,28								
16			$ 67.916.997,52								
17			$ 59.874.711,49								
18			$ 66.410.170,79								
19			$ 41.764.293,86								
20			$ 34.163.698,62								
			$ 1.314.285.774,56					**12,5332%**	**$ 164.721.841,55**	**20,4571%**	**$ 268.865.027,40**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 5/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 11 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Mercado

Actividades Ejecutadas

Conformación de la Calzada Existente Instalación de material Selecc... capa para mejoramiento de Subrasante

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Carrotanque	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 6/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 12 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

Instalación de material seleccionado para mejoramiento de subrasante
Conformación de la calzada existente

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Equ. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 7/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 22 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

Instalación de material OK Subbase granular - Tipo C
Conformación de la Calzada Existente.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	Si		Nublado	
Esp. Topografica	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 8/06/2023	Consecutivo:	Página: 23 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150SZ3-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Orozco	Ing Residente	Aldemar Molina Mendoza

Actividades Ejecutadas

Conformación de la calzada existente, Instalación de material de Subbase granular tipo C

Observaciones

Se suspenden las actividades en horas de la tarde por lluvias

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo		No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado	X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado		
Equ. Topográficos	Bien	SI		Lluvias Moderadas		
				Lluvias Intensas	X	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los trenes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M

Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 9/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 24 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Daniel Yance Orozco	Ing. Residente	Alcemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

No se laboró en obra. Se extrae las aguas estancadas por mantenimiento

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Eq. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALCEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Daniel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 10/06/2023	Consecutivo:	Página: 25 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MNLG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.699 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

No se labora en obra. Se espera que el material de sega.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Est. Topografica	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitacora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitacora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M — Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco — Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 11/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 26 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Paulino Miranda

Actividades Ejecutadas

No se laboró en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Esp. Pluviometro	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Version: 01	Fecha: 12/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 27 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO AMORADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – PUBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - PUBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ovalle	Ing. Residente	Alderme Molina Mercado

Actividades Ejecutadas

Excavaciones Varias en Material Común Seco. Suministro e Instalación de Material Piedra Graduar Clase B

Observaciones

Se Suspende actividades en horas de la tarde por lluvias

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	Si		Nublado	
Esp. Diligencia	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas X	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitacora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitacora diariamente

*Marcar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Ovalle
Ing. Residente - Obra

PROCESO INTERVENTORIA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 13/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 28 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yamil Onzco	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

100 Se laboró en obra. Se sacan aguas estancadas por medio de motobomba

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo		No. Horas
Motobomba	Bien	Si		Seco - Soleado	X	
Vibrocompactador	Bien	Si		Nublado		
Est. Topografico	Bien	Si		Lluvias Moderadas		
				Lluvias Intensas		

Nota:
*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora. diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yamil Onzco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 14/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 20 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Ortiz	Ing. Residente	Aldemar Molina Maestre

Actividades Ejecutadas

No se laboro en Obra. Se extrae agua estancadas por las lluvias.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Cam. Volquetas	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

"Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

"Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

"Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Ortiz
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 15/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 30 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.699 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yamir Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Maranto

Actividades Ejecutadas

Instalación de material para subbase granular clase C.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Compactador	Bien	SI		Nublado	
Carrotanque	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitacora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitacora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yamir Orozco
Ing. Residente - Obra

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 16/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 31 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Orozco	Ing Residente	Aldemar Molina Mercado

Actividades Ejecutadas

Instalación de material para subbase granular Clase C.

Observaciones

Se Suspenden actividades en horas de la tarde por lluvias

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Esp. Topografia	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas X	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitacora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Orozco
Ing Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 17/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 32 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con NIT. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

No se laboró en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Retroexcavadora	Bien	SI		Nublado	
Equ. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitacora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M

Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Version: 01	Fecha: 18/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 33 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MAL-C-003-2023	TORRES AMORADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.899 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
135525-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yunio Orozco	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

No se laboro en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Retroexcavadora	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias intensas	

Nota:

"Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

"Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora diariamente.

"Anotar todos y cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo.

ALDEMAR MOLINA M

Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yunio Orozco

Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 19/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 34 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ortiz	Ing. Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

No se laboró en Obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Carrotanque	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Ortiz
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 20/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 35 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Mariel Yanes Orozco	Ing Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

Instalación de Subbase Granular Clase C.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Equi. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácore hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoria

Mariel Yanes O.
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 21/06/2022	Consecutivo:	Pagina: 36 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yonce Ovalle	Ing Residente	Aldemar Molina Miranda

Actividades Ejecutadas

Instalación de material Para Subbase granular Clase C Por retiro. Sitio de intervención se realizan apiques cada 50 m.

Observaciones

ABSCISA 20 ESTA BIEN CON ALTERNADO Y SUB BASE I 30 MEJORAMIENTO 20 DE SUBBASE EN CA SO Y ABSCISA 100 30 DE MEJORAMIENTO DE SUB BASE I 150 FALTAN 25CM DE SUB BASE Y 200 HAY 30CM DE MEJORAMIENTO

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Motoniveladora	Bien	SI		Nublado	
Equipo Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

ALDEMAR MOLINA M
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yonce Ovalle
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Informes y Protocolos

Bitacora Nº:	Fecha: 21/06/2023	Consecutivo:	Paginas: 37 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MIN-0-003-2022	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – PUEBLO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
1550[illegible]-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con NIT. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – PUEBLO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Orozco	Ing. Residente	Aldemar Mateo Miranda

Actividades Ejecutadas

Instalación de Muro en Bolsacreto para Bloque granular Clase B

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Equ. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitacora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno.
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 23/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 38 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ortega	Inge. Residente	Aldimar Molina Hernandez

Actividades Ejecutadas

No se trabajó en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Equ. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Ortega
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 24/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 39 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

NO Se Labora en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo		No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado	X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado		
Equi. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas		
				Lluvias Intensas		

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno.
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Version: 01	Fecha: 25/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 40 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MAG-0-033-2023	TORRES ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con NIT. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yunes Orozco		

Actividades Ejecutadas

No se labora en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones
Motoniveladora	Bien	Si	
Retroexcavadora	Bien	Si	
Equ. Topografico	Bien	Si	

Estado del Tiempo	No. Horas
Seco - Soleado X	
Nublado	
Lluvias Moderadas	
Lluvias Intensas	

Nota:
*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yunes Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORÍA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 26/06/2023	Consecutivo:	Página: 41 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.808 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
1S0523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con NIT. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Ovigo		

Actividades Ejecutadas

Se realiza la Preparación del terreno para Fundir Figuración de Vigas

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Esq. Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Ovigo
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORÍA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 27/06/2023	Consecutivo:	Página: 42 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yamir Ospino		

Actividades Ejecutadas

Se inspeccionó el terreno para fundir. Fotografía de acero de refuerzo

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Equipo Topografico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turito Centeno
Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yamir Ospino
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO

NIT 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diaria de Inspección, Ambiental y Predial

Versión: 01	Fecha: 29/06/2023	Consecutivo:	Página: 43 de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MAL-[illegible]-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.899 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
1555CD-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con NIT. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Constralista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yanes Orozco		

Actividades Ejecutadas

Inspección Ambiental en el area de influencia directa del proyecto UF 34 desde el Caserio Almendro K0+000

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Equi. Fitogenetico	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turito Centeno
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yanes Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 29/06/2023	Consecutivo:	Página: 4 de 4

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MAG-C-033-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.809 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
1502525-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con NIT. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Mg Residente	Manuel Jesus Ordaz		

Actividades Ejecutadas

Fundicion de Alcantarillas para pavimento hidraulico
Trabajos con Moto de la fresadora

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motoniveladora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Fresadora	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:
*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble y cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Jesus Ordaz
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 30/06/2023	Consecutivo:	Pagina: 45 de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.899 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yanes Orozco		

Actividades Ejecutadas

Se Riego Agua estancadas por medio de motobomba 2p
horas de la tarde llueve nuevamente

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Motobomba	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Vibrocompactador	Bien	Si		Nublado	
Equipo Topografico	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas X	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Jallessa Turizo Centeno
Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yanes Orozco
Ing. Residente - Obra

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDO

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	%	MES No.1 SEMANA 1	MES No.1 SEMANA 2	MES No.1 SEMANA 3	MES No.1 SEMANA 4	MES No.2 SEMANA 1	MES No.2 SEMANA 2	MES No.2 SEMANA 3	MES No.2 SEMANA 4	MES No.3 SEMANA 1	MES No.3 SEMANA 2	MES No.3 SEMANA 3	MES No.3 SEMANA 4	MES No.4 SEMANA 1	MES No.4 SEMANA 2	MES No.4 SEMANA 3	MES No.4 SEMANA 4	MES No.5 SEMANA 1	MES No.5 SEMANA 2	MES No.5 SEMANA 3	MES No.5 SEMANA 4
1		PRELIMINARES																											
1,1	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19	0,40%			0,0997%	0,0997%	0,0997%	0,0997%																
1,2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	$ 105.586,00	$ 96.055.385,30	7,31%						2,4362%	2,4362%	2,4362%													
Subtotal								**$ 101.298.046,49**																					
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS																											
2,1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20	3,86%	0,9662%	0,9662%	0,9662%	0,9662%																	
2,2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	90,41	$ 119.458,30	$ 10.800.463,82	0,82%																			0,4109%	0,4109%
Subtotal								**$ 61.593.978,02**																					
3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																											
3,1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,69	$ 89.297.485,26	6,79%							3,3972%	3,3972%													
3,2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99	49,51%								9,9022%	9,9022%	9,9022%	9,9022%										
3,3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50	2,92%									0,7304%	0,7304%	0,7304%	0,7304%								
Subtotal								**$ 778.407.696,75**																					
4		OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES																											
4.1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,32	$ 115.540,10	$ 106.680.485,13	8,12%													2,029%	2,029%	2,029%	2,029%				
4.2	630.4	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	768,50	$ 96.956,60	$ 74.511.341,01	5,67%																	1,417%	1,417%	1,417%	1,417%
4.3	671,1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	30,00	$ 1.013.412,70	$ 30.402.380,97	2,31%																0,578%	0,578%	0,578%	0,578%	
Subtotal								**$ 211.594.207,12**																					
5		SEÑALIZACION																											
5.1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30	0,55%																			0,274%	0,274%
Subtotal								**$ 7.200.344,30**																					
6		BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA																											
6.1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX CULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78	5,44%																						
6.2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX CULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20	4,80%																						
6.3	6.3P	6.3	PARTICULAR ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	4,00	$ 4.901.594,48	$ 19.606.377,91	1,49%																			0,4973%	0,4973%	0,4973%
Subtotal								**$ 154.191.501,88**																					
							COSTO DIRECTO	**$ 1.314.285.774,56**	**100,00%**																				
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 1.314.285.774,56**																				
							PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	**$ 14.831.606,00**																				
							PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES)	**$ 15.207.756,44**																				
							VALOR TOTAL	**$ 1.344.325.137,00**																				
							DESCRIPCION																				
							ADMINISTRACIÓN **A=**	**23%**																				
							IMPREVISTO **I=**	**2%**																				
							UTILIDAD **U=**	**5%**																				
							TOTAL A.I.U **A.I.U.=**	**30%**																				
								PORCENTAJE SEMANAL (%)		**0,9662%**	**0,9662%**	**1,0659%**	**1,0659%**	**0,0997%**	**2,5359%**	**5,8334%**	**15,7355%**	**10,6325%**	**10,6325%**	**10,6325%**	**10,6325%**	**2,0292%**	**2,0292%**	**4,5893%**	**5,1676%**	**4,5557%**	**5,0529%**	**3,1777%**	**2,5994%**
								VALOR SEMANAL		**$ 12.698.378,55**	**$ 12.698.378,55**	**$ 14.009.043,85**	**$ 14.009.043,85**	**$ 1.310.665,30**	**$ 33.329.127,06**	**$ 76.667.204,39**	**$ 206.809.940,39**	**$ 139.741.868,87**	**$ 139.741.868,87**	**$ 139.741.868,87**	**$ 139.741.868,87**	**$ 26.670.121,28**	**$ 26.670.121,28**	**$ 60.316.402,28**	**$ 67.916.997,52**	**$ 59.874.711,49**	**$ 66.410.170,79**	**$ 41.764.293,86**	**$ 34.163.698,62**
								PROCENTAJE ACUMULADO (%)		**0,9662%**	**1,9323%**	**2,9827%**	**4,0417%**	**4,1639%**	**6,6981%**	**12,5318%**	**28,2687%**	**38,9025%**	**49,5379%**	**60,1663%**	**70,7985%**	**72,8281%**	**74,8573%**	**79,4664%**	**84,6142%**	**89,1692%**	**94,2287%**	**97,4%**	**100,0%**
								VALOR ACUMULADO		**$ 12.698.378,55**	**$ 25.396.757,10**	**$ 39.405.800,95**	**$ 53.414.844,80**	**$ 54.725.510,09**	**$ 88.054.637,16**	**$ 164.721.841,55**	**$ 371.531.781,94**	**$ 511.273.650,82**	**$ 651.015.519,69**	**$ 790.757.388,57**	**$ 930.499.257,44**	**$ 957.169.378,72**	**$ 983.839.500,01**	**$ 1.044.155.902,28**	**$ 1.112.072.899,80**	**$ 1.171.947.611,29**	**$ 1.238.357.782,08**	**$ 1.280.122.075,94**	**$ 1.314.285.774,56**

BALANCE FINANCIERO A JUNIO DE 2023.

CONTRATO ESPECIFICO No 2221186

En cumplimiento del contrato especifico 2221186 celebrado entre el Municipio de Algarrobo Magdalena y ENTerritorio que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA", dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos del Fondo Regional de Contratos Plan, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del proyecto; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del Contrato Específico, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Contrato Específico citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

1. **Generalidades del Contrato Especifico:** Relacionar los datos básicos o aspectos principales del Contrato Específico:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA				
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor efectivo**	**Valor total Aporte**	**%Aporte**
ENTERRITORIO			$ 1.470.889.286,35	100%
TOTAL			$ 1.470.889.286,35	

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de Algarrobo Magdalena, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 160123-04 del día 16, del mes Enero del año 2023, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 2023.CEN.01.000039 y 2023.CEN.01.000040, que soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LP-MALG-001-2023 Y CMA-MALG-002-2023, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detallle	**Número**	**Fecha de expedición**	**Valor CDP**	**Valor RP**	**Saldo**
Obra					
CDP	2023.CEN.01.000039	16/01/2023	$ 1.371.768.236,35		$ 0,00
RP	2023.CEN.01.000386	05/05/2023		$ 1.344.325.137,00	$ 27.443.099,35
Interventoría					
CDP	2023.CEN.01.000040	16/01/2023	$ 99.121.050,00		$ 0,00
RP	2023.CEN.01.000308	02/05/2023		$ 99.121.050,00	$ 0,00
Total			**1.470.889.286,35**	**$ 1.443.446.187,0**	**1.470.889.286,35**

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No XX - XX)

En caso de haber adiciones en valor al contrato específico, se hace necesario que se detalle el valor adicional, objeto o motivación del adicional y los soportes presupuestales de mismo. Realizar un cuadro adicional con la información del Otrosí.

2. Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se aperturó una cuenta No 326386711 Corriente en el banco de Bogotá denominada: "CONTRATO ESPECÍFICO N° 2221186 MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA", de fecha 22 del mes Junio del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	$221.013.286,08	$221.013.286,08	16/03/2023	$0
	Transferencia 2				
	Transferencia 3				
	Transferencia 4				
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		**$221.013.286,08**	$221.013.286,08		**$0**

Se anexan extracto de la de Cuenta corriente No.326386711, del mes de junio de 2023, donde se resaltan los aportes de las entidades.

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes marzo del año 2023 hasta el mes mayo del año 2023, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco de Bogotá, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de Algarrobo a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Marzo 2023	$ 24.224,00	$ 24.224,00
Abril 2023	$ 45.420,00	$ 45.420,00
Mayo 2023	$ 46.934,00	$ 46.934,00
Junio 2023	$ 45.420,00	$ 46.934,00
Julio 2023	$ 0,0	$ 0,00
Agosto 2023	$ 0,0	$ 0,00
Total	$ 161.998,00	$ 163.512,00

(Anexar la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o una general que señale todos los meses, y soporte del Traslado de los mismos a la cuenta del tesoro.(Folios No 02)

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	N° 150523-001		
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.		
Valor	$ 1.344.325.137	Cuenta o encargo Fiduciario	XXXXX
Valor Anticipo	$	Valor Girado	$
Porcentaje	%	Fecha de Giro	XX/XX/XXXXX
Detalle Orden	**Valor Orden**	**Fecha**	**Saldo Anticipo**
Total			
Rendimientos Financieros del Anticipo			
Periodo	**Valor Rendimientos**	**Valores Transferidos**	
feb-23	N/A		
Marzo-23	N/A		
Abril-23	N/A		
Total			

Adjuntar el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**Mar-2023**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$ 0,0
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	$221.013.286,08
	OTROS	$ 5.000
	RENDIMIENTOS TOTALES	**$ 161.998,00**
	RENDIMIENTOS ACUMULADO S	
	TOTAL INGRESOS	**$ 221.134.864,08**
22EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS	**$ 161.998,00**
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 0,00
	DESCUENTOS	$ 0,00
	RTE FUENTE	
	OTROS	$ 1.514,00
	TOTAL EGRESOS	**$ 163.512,00**
	SALDO FINAL MES JUNIO 2023	**220.971.352,08**

Se adjunta el extracto correspondiente al mes de mayo de 2023.

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar las fechas de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

3. **Balance General de la Contratación Derivada**

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de Obra

Objeto del Contrato Derivado:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.				
Número Contrato	N° 150523-001	**Valor:**	$ 1.344.325.137	**Plazo:**	CINCO (05) Meses
Nombre del Contratista	**CONSORCIO PAV ALGARROBO – LOMA DEL BALSAMO**				
Fecha de firma del contrato	15/05/2023	**Fecha de acta de inicio**	17/05/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	16/10/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato de Interventoria

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".				
Número Contrato	020523-001	**Valor:**	$ 99.120.563	**Plazo:**	CINCO (05) MESES
Nombre del Contratista	**ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO**				
Fecha de firma del contrato	02/05/2023	**Fecha de acta de inicio**	17/05/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	16/10/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

4. Balance Financiero Contrato Específico

La entidad ENTerritorio, solo ha realizado un (01) desembolso y el contrato se encuentra en proceso de licitación, por ende, no se ha hecho uso o egresos de los recursos recibidos por parte del Municipio de Algarrobo. Se han generado tres meses en rendimientos financieros correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2023, los cuales se han enviado al Tesoro Nacional en su totalidad por valor acumulado de $ 161.998,00 más $ 1.514 consignados por error.

Se firma el presente informe financiero, a los 13 días del mes de julio de 2023.

KELLY PÉREZ AMARIS
SECRETARÍA DE HACIENDA
secretariafinanciera@algarrobo-magdalena.gov.co
perezkelly237@gmail.com

LILIBETH DE LA ROSA MENDOZA
CONTADORA PÚBLICA
Lilibeth.delarosa@hotmail.com

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos Días Anteriores

Empresa: **MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8190032190**

Generado por: **KELLY YOHANA PEREZ AMARIS**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC6711	*****6711

Fecha
Jun 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/06/30	Interes remuneracion especial	0000000000	$0,00	$45.420,00
2023/06/05	Pago por Internet Corporativo	0000001006	$46.934,00	$0,00
