CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2221186 DE 2023
INFORME No. 1 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".		
PARTICIPANTES	ENTerritorio MUNICIPIO DE ALGARROBO – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE ALGARROBO		
VALOR APORTES	ENTerritorio		$1.470.889.286,35
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$1.470.889.286,35
ADICIÓN:	NINGUNA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico.		
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/12/2022		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA Secretario de Planeación e Infraestructura		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A		
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/02/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA SUSPENSIONES	N/A	**FECHA REINICIOS**	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/11/2023	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO**	28/11/2023
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$1.470.889.286,35	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$ 99.120.563,00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	31,23%	**Avance Financiero del periodo (%)**	10%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	61,23%	**Avance Financiero Acumulado (%)**	10%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4 No. 320 47 994000025132	22/02/2023	CUMPLIMIENTO	$147,088,928.64	(22/02/2023)	(22/06/2024)

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	02/08/2023	13/03/2023	$ 221.013.286,08
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$ 221.013.286,08

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero/2023	**$ 24.224,00**	**$ 24.224,00**
Marzo/2023	**$ 45.420,00**	**$ 45.420,00**
Mayo/2023	**$ 46.934,00**	**$ 46.934,00**
Junio/2023	**$ 45.420,00**	**$ 46.934,00**
Julio/2023	**$41.523,00**	**$40.009,00**
Agosto/2023	**$11.892,00**	**$11.892,00**

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de Interventoría No. 020523-001 de 2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA	**($ 99.120.563,00)**
Nombre contratista	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 expedida en Barranquilla	
Fecha Firma del contrato	02/05/2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	

Fecha del acta de inicio del contrato	17/05/2023				
NOVEDADES	N/A				
Fecha Inicial Terminación Contrato	17/10/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		17/10/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	N/A				
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**0**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**10%**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 320 47 994000025782	03/05/2023	Cumplimiento del contrato	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(03/02/2024)
	03/05/2023	Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(05/10/2026)
	03/05/2023	Calidad del Servicio	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(03/10/2023)
ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*Se presenta informe de interventoría del periodo 01 de agosto al 31 de agosto. El cual presenta el desarrollo de las siguientes actividades:* ***ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:*** • *Se verificaron las hojas de vida de los trabajadores, se verificó el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato de interventoría y de obra, se verifico el cumplimiento del siso y de las medidas de bioseguridad, se le solicitaron los informes al contratista.* ***ACTIVIDADES TÉCNICAS*** • *Se estudio las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y en general de toda la información referente al proyecto, se presentaron las observaciones y recomendaciones que consideraron pertinentes.* ***ACTIVIDADES FINANCIERAS*** • *Se revisó y estableció el presupuesto de obra del diseño aprobado con cierre financiero, ya que el presupuesto que arrojó el diseño tiene un mayor valor*	(01/08/2023)	(31/08/2023)

	que el presupuesto oficial destinado para las obras, diferencia que fue aportada por el municipio. ***ACTIVIDADES AMBIENTALES*** • *Se revisó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, indicando que se deben realizar unos ajustes al documento para que cumpla con los requerimientos del proyecto*		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de Obra N°150523-001 de 2023	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".	**($1.344.325.137)**
Nombre contratista	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO, identificado con NIT. 901.712.744-5 representado legalmente por Cristian Cuentas Manotas identificado con cedula de ciudadanía 8.649.306 expedida en Sabanalarga	
Fecha Firma del contrato	15/05/2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 /05/2023	
NOVEDADES	NO APLICA	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17/10/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** 17/10/2023

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	N/A				
PRIMER PAGO	10%	10%	$ 134.432.513,70	2023.CEN.01.000701	25/07/2023
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 134.432.513,70**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**61,23%**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 85-44-101121673	17/05/2023	Cumplimiento del contrato	$134.432.513,70	(15/05/2023)	(15/02/2024)
	17/05/2023	Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$268.865.027,40	(15/05/2023)	(15/10/2026)
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101055849	17/05/2023	Estabilidad y calidad de la Obra	$403.297.541,10	(15/10/2023)	(15/10/2028)
	17/05/2023	Responsabilidad civil extracontractual (Amparos básicos predios	$232.000.000,00	(15/05/2023)	(15/10/2023)

		laborales y operacionales)			
% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO			**31,23%**		
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO			**61,23%**		
% AVANCE PROGRAMADO			**89,38%**		
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

➢ **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR**

En el proceso de ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA en el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto desde la supervisión designa se ha realizado seguimiento y control a la ejecución de la obra con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos establecidos, los plazos y se mantenga la calidad de la construcción.

A los diez (10) días del mes de agosto de 2023 se suscribe Acta de modificación No. 002 que contiene cambios en referencia a menores y mayores cantidades de obra, con el propósito de cumplir con el objeto contractual. y brindar las garantías de estabilidad a lo largo del todo el tramo de construcción del pavimento tal como se evidencia en l acta adjunta en los anexos.

El supervisor de obra verificó que los trabajos se realicen acorde con los estudios, diseños, especificaciones y normas técnicas aprobados para la ejecución del proyecto, además de garantizar que se sigan las medidas de seguridad y se cumpla el presupuesto establecido.

En virtud de los compromisos adquiridos en la reunión de visita y el comité operativo de seguimiento se realiza el cumplimiento de cada uno de ellos.

➢ **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

El contrato de Obra No 150523-001 del 15 de mayo de 2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA” inició el día 17 de Mayo de 2023 una vez reunido los requisitos de perfeccionamiento y el cumplimiento de las garantías exigidas en el contrato de Obra.

Durante el periodo de tiempo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2023, el contratista alcanzó un avance de obra equivalente al 31,2% del valor total del contrato, para un porcentaje ejecutado acumulado de 66,92% por debajo del porcentaje acumulado programado de 89,38%, luego de los ajustes según el nuevo cronograma obtenido de la modificatoria No. 002 realizada al contrato de obra, a juicio de esta interventoría es un avance poco significativo, dado al desfase porcentual del avance ejecutado con respecto al programado que se dio en este mes. El índice de cumplimiento disminuyó al 22,46%, lo cual significa que se encuentran retrasados. Por parte de la interventoría se realizaron todas acciones pertinentes para lograr conseguir en el próximo periodo un mayor porcentaje de ejecución de la obra.

➢ **CONTRATO DE OBRA.**

• Avance de la meta establecida en el contrato especifico.

Durante el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, el avance de ejecución en el periodo de la obra es del 31,23%; presentando un avance acumulado ejecutado del 61,23%.

• Actividades desarrolladas en el periodo del informe:

Donde se ejecutaron las siguientes actividades:

• Armado de acero de refuerzo para pasadores y bordillos. Fundida de pavimento en concreto hidráulico, MR=38 MPa para el carril derecho desde el PT0+180 hasta el PT0+200, se repararon placas dos placas agrietadas

• Fundida de pavimento para el carril derecho desde el PT0+160al PT0+180 y desde el PT0+200 hasta el PT0+280. Así mismo se fundieron 50ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PT0+010 hasta el PT0+060.

• Fundida de pavimento para el carril derecho desde el PT0+180al PT0+370 y el carril izquierdo desde el PT0+180 hasta el PT0+230 y desde el PT0+370 hasta el PT0+330, así mismo se fundieron 187ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PT0+060 hasta el PT0+150 lado derecho y el lado izquierdo desde el PT0+010 hasta el PT0+150

• Fundida de concreto en el carril izquierdo desde el PT0+220 hasta el PT0+300 y el carril derecho desde el PT0+370 hasta el PT0+400. Así mismo se fundieron 488,5ml de bordillos de margen derecho y margen izquierdo hasta el PT0+220, y los andenes desde el PT0+020 hasta el PT0+230

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.
Resumen de las cantidades de obras realizadas en el mes de agosto comprendido desde el día 01 de agosto de 2023 con corte al 31 de Agosto de 2023

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	25
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	280,35
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	1655,14
OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES		
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	460,00
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	212,50

Resumen de las cantidades de obras realizadas acumuladas desde el día 17 de mayo de 2023 con corte al 31 de Agosto de 2023

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
PRELIMINARES		
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	25

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	414,34
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	2696,14
OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES		
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	460,00
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	212,50

• **REGISTROS FOTOGRÁFICOS**


CAT





















• Actualización del programa de ejecución del proyecto.

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-1

ALCALDÍA DE ALGARROBO

"MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".

CRONOGRAMA DE

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	%	ADICIONES CANT +/-	ADICIONES CANT +/-	Vr. PARCIAL	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2
1,1	310.1	310		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19	0,40%	339,42	4094,37	$ 5.716.559,39	0,43%			0,1087%	0,1087%	0,1087%	0,1087%						
1,2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	$ 105.586,00	$ 96.055.385,30	7,31%	81,47	991,21	$ 104.657.793,47	7,96%						2,6544%	2,6544%	2,6544%				
Subtotal								$ 101.298.046,49				$ 110.374.352,87											
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS																					
2,1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20	3,86%	197,51	2170,84	$ 55.877.498,82	4,25%	1,0629%	1,0629%	1,0629%	1,0629%						
2,2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL ANDARIEL	m3	90,41	$ 119.458,30	$ 10.800.463,82	0,82%	-10,14	80,27	$ 9.589.395,57	0,73%										
Subtotal								$ 61.593.978,02				$ 65.466.894,39											
3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																					
3,1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,69	$ 89.297.485,26	6,79%	93,63	663,77	$ 103.962.014,21	7,91%								3,9551%	3,9551%	
3,2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99	49,51%	63,03	634,34	$ 722.501.141,57	54,97%									10,9946%	10,9946%
3,3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50	2,92%	2141,70	6443,57	$ 57.512.363,73	4,38%										1,0942%	1,0942%
Subtotal								$ 778.407.696,75				$ 883.975.519,51											
4		OBRA DE URBANISMO Y ORENAJES																					
4,1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,12	$ 115.540,30	$ 106.680.485,13	8,12%	27,08	950,40	$ 109.809.311,04	8,36%											
4,2	630.4	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	768,50	$ 96.956,60	$ 74.511.341,01	5,67%	39,34	807,84	$ 78.325.419,74	5,96%											
4,3	671,1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	30,00	$ 1.013.412,70	$ 30.402.380,97	2,31%	18,96	48,96	$ 49.616.685,74	3,78%											
Subtotal								$ 211.594.207,12				$ 237.751.416,51											
5		SEÑALIZACION																					
5,1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30	0,55%		13,00	$ 7.200.344,30	0,55%											
Subtotal								$ 7.200.344,30				$ 7.200.344,30											
6		BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA																					
6,1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX CULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78	5,44%	-60,73	3,13	$ 3.507.368,18	0,27%											
6,2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA, PARA BOX CULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20	4,80%	-6936,84	124,17	$ 1.108.284,30	0,08%											
6,3	6,3P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICA DE DESAGUE DE 5mX 1m (platina de 2½'/2" x 1/4" con angulos de 2½/2" x 1/4").	UND	4,00	$ 4.901.594,48	$ 19.606.377,91	1,49%	-3,00	1,00	$ 4.901.594,48	0,37%											
Subtotal								$ 154.191.902,89				$ 9.517.246,96											
							COSTO DIRECTO	$ 1.314.285.774,56	100,00%			$ 1.314.285.774,56	100,00%										
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 1.314.285.774,56				$ 1.314.285.774,56											
							PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 14.811.606,00				$ 14.811.606,00											
							PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (1 MES)	$ 15.027.745,99				$ 15.027.745,99											
							VALOR TOTAL	$ 1.344.325.127,00				$ 1.344.325.127,00											

	DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN	Ar
IMPREVISTO	P
UTILIDAD	U=
TOTAL A.I.U	A.I.U.=

PORCENTAJE SEMANAL (%)		1,0629%	1,0629%	1,1716%	1,1716%	0,1087%	2,7631%	6,6094%	17,6040%	12,0888%	12,0888%
VALOR SEMANAL	$	13.969.374,71	$ 13.969.374,71	$ 15.398.514,55	$ 15.398.514,55	$ 1.429.139,85	$ 36.315.077,01	$ 86.866.938,26	$ 231.367.146,58	$ 158.878.319,25	$ 158.878.319,25
PROCENTAJE ACUMULADO (%)		1,0629%	2,1257%	3,2974%	4,4690%	4,5777%	7,3408%	13,9503%	31,5543%	43,6429%	55,7314%
VALOR ACUMULADO	$	13.969.374,71	$ 27.938.749,41	$ 43.337.263,96	$ 58.735.778,52	$ 60.164.918,37	$ 96.479.989,37	$ 183.346.927,63	$ 414.714.094,21	$ 573.592.413,46	$ 732.470.732,71

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Durante el periodo comprendido del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023, el informe muestra la ejecución al periodo de un 31,23% con un acumulado del 61,23% de las actividades del contrato No.150523-001. Por su parte la interventoría continúa trabajando en simultaneo garantizando el óptimo cumplimiento del debido proceso, dando cumplimientos a las especificaciones técnicas y de calidad de la obra.

Se cumplen con cada uno de los compromisos por parte del municipio y el contratista de acuerdo con lo establecido en el acta de visita No. 001 por parte de ENTERRITORIO.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
VISITA DE CAMPO	08 DE AGOSTO DE 2023	COMPACTACION DE AREA CONTIGUA ANDENES COMPACTACION TRAMO FINAL DE OBRA REPARACIÓN LOSAS EN 3 PUNTOS CON PATOLOGIAS
		ACTA DE MODIFICACION No. 002 REGISTRO FOTOGRAFICO VALLA DEL PROYECTO ENTREGA DE INFORMES DE SUPERVISION
COMITÉ OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO	28 DE AGOSTO DE 2023	ENTREGA DE INFORME DE SUPERVISION Y FINANCIERO ENTREGA DE ACTA DE MODIFICACION No. 002 SUBSANACIÓN INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO

- **RELACIÓN DE ANEXOS**

1. Extracto Bancario de la cuenta del contrato específico (al corte mensual más reciente), certificación bancaria que señale los rendimientos generados durante el mes del reporte.
2. Soporte de traslado de los rendimientos financieros a la Dirección General de Crédito Público
3. Informe de interventoría firmado que soporta el reporte del periodo con todos sus anexos.
6. Programación actualizada
8. Demás documentos que soporten la información reportada.

- **SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
SUPERVISOR

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

- Anexo 1: Informe Interventoría del periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023
- Anexo 2: Informe Semanal
- Anexo 3: Bitácora
- Anexo 4: Acta parcial No. 3
- Anexo 5: Memoria de cantidades
- Anexo 6: Informe Contratista de Obra
- Anexo 7: Informe financiero
- Anexo 8: Acta de modificación No. 002
- Anexo 9: Cronograma Actualizado

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE ALGARROBO
ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATISTA: TORIBIO ANDRADE YEJAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA

INFORME DE INTERVENTORIA No 3

01 DE AGOSTO DE 2023 - 31 DE AGOSTO DE 2023

INTRODUCCIÓN

La alcaldía Municipal de Algarrobo, en usos de sus facultades desarrolla la Interventoría Administrativa y Técnica del proyecto, **MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA**, para que cumpla con los estándares actuales de calidad de obra en los procesos de construcción de vías urbanas, para optimizar las vías y permita disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito, bien sea peatonal o vehicular que a diario circulan por las calles y carreras del casco urbano del municipio de Algarrobo.

OBJETIVO

El objeto del proyecto es: **EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA,** el cual se le adjudico a la firma CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO, mediante contrato de obra pública número 150523-001 de fecha Trece (17) de mayo de 2023.

El presente informe contiene generalidades del desarrollo del contrato de obra y de interventoría.

1.1 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
REPRESENTANTE LEGAL	Cristian Cuentas Manotas identificado con cedula de ciudadanía 8.649.306 expedida en Sabanalarga
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**
VALOR DEL CONTRATO	($1.344.325.137) INCLUIDO AIU
CONTRATO NUMERO:	150523-001
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	16 DE OCTUBRE DE 2023

1.1.1 ASPECTOS JURIDICOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES

POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, No 400048210 SEGUROS DEL ESTADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA "No. 150523-001 de fecha VEINTINUEVE (29) de mayo de 2023"

TOMADOR/ GARANTIZADO	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
ASEGURADO Y BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ALGARROBO – ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 819.003.219-0
GARANTIAS OTORGADAS	

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	115,890	$43.700.000,00	15	05	2023	15	02	2024
Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	231,780	$	15	05	2023	15	10	2026
Estabilidad y calidad de la Obra	347,670	$403.297.541,10	15	10	2023	15	10	2028

POLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, No 400048211 SEGUROS DEL ESTADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA "No. 150523-001 de fecha VEINTINUEVE (29) de mayo de 2023"

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad civil extracontractual (Amparos básicos predios laborales y operacionales)	200,000	$232,000,000.00	15	05	2023	15	10	2023

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 220623-001

CONTRATISTA	TORIBIO ANDRADE YEJAS
REPRESENTANTE LEGAL	TORIBIO ANDRADE YEJAS con CC 72.135.609 B/quilla
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.120.563,00
VALOR ADICION AL CONTRATO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (5) MESES.
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO de 2023
ADICION EN PLAZO	N/A
FECHA DE FINALIZACION	16 DE OCTUBRE DE 2023

1.2.1 ASPECTOS JURIDICOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTOIA "No. 320 47 994000025782 de fecha Tres (03) de Mayo de 2023. **Póliza Numero 320 47 994000025782, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

TOMADOR/ GARANTIZADO	TORIBIO ANDRADE YEJAS, CC 72.135.609
ASEGURADO Y BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ALGARROBO – ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 819.003.219-0

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

Cumplimiento del contrato	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	03	02	2024
Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	05	10	2026
Calidad del Servicio	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	03	10	2023

1.3 REVISIÓN TECNICA

SITUACIÓN:

Se realizará el mejoramiento de la vía terciaria localizado en el tramo K0+000 a K0+460,42 entre la Troncal del Caribe – Poblado Loma del Bálsamo en el Municipio de Algarrobo con la intervención de 0,46042 Kilómetros con pavimento en concreto rígido con espesor de 20 cm y MR 38 soportado sobre una Sub-Base Granular de 20 cm. Con una calzada de 6.0 m y esta a su vez compuestas por dos carriles cada uno de 3.0 m de ancho, Con un Bordillo de altura de servicios de 45 cm y 15 cm de ancho y anden de 0,85 m de ancho, además de obras de drenaje como Cunetas en concreto reforzado de 0,8m de ancho localizadas desde las abscisas K0+380 hasta la abscisa K0+460,42, con su señalización vial vertical.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista inicio labores el 17 de Mayo del 2023, sin Anticipo puesto que el contrato no contempla el pago de Anticipo, el contratista continuó en la semana doce se realizaron actividades de: Armado de acero de refuerzo para pasadores y bordillos. Fundida de pavimento en concreto hidráulico, MR=38 MPa para el carril derecho desde el PT0+180 hasta el PT0+200, se repararon placas dos placas agrietadas, En la semana trece se realizaron actividades de: Fundida de pavimento para el carril derecho desde el PT0+160al PT0+180 y desde el PT0+200 hasta el PT0+280. Así mismo se fundieron 50ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PT0+010 hasta el PT0+060, la semana catorce y quince se realizaron actividades de: Fundida de pavimento para el carril derecho desde el PT0+180al PT0+370 y el carril izquierdo desde el PT0+180 hasta el PT0+230 y desde el PT0+370 hasta el PT0+330, así mismo se fundieron 187ml de bordillo

en concreto reforzado de 3000 psi desde el PT0+060 hasta el PT0+150 lado derecho y el lado izquierdo desde el PT0+010 hasta el PT0+150, En la semana 16 se realizó la fundida de concreto en el carril izquierdo desde el PT0+220 hasta el PT0+300 y el carril derecho desde el PT0+370 hasta el PT0+400. Así mismo se fundieron 488,5ml de bordillos de margen derecho y margen izquierdo hasta el PT0+220, y los andenes desde el PT0+020 hasta el PT0+230.

2. ACTAS DE OBRAS.

- El contratista presentó avance de obra, por valor de **$419.835.310,32** con un porcentaje de avance del **31,23%** completando un porcentaje ejecutado acumulado del **61,23%.**

3. INCONVENIENTES.

Durante la ejecución de las obras de excavación y conformación, se presentaron dificultad con las lluvias persistentes en la zona.

La interventoría, quien además de exigir al Contratista el cumplimiento de lo pactado en el contrato, participo de manera proactiva en los cambios y decisiones, en busca del equilibrio de inversión, economía y buenas obras.

4. AVANCE DEL CONTRATO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA

CATEGORIA INVERSIÓN: OBRA FISICA

EL AVANCE DEL PROYECTO ES DE $419.835.310,32 con un porcentaje de avance de ejecución del 31,23%

A continuación, se relacionan las tablas resumen de los procesos financieros objeto de este contrato y sus adicionales de obra:

1	VALOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de Mayo de 2023	$ 1.344.325.137,00
3	VALOR ANTICIPO (%) DEL CONTRATO INICIAL		$ 0
4	ACTA PARCIAL Nº 001	4 de Junio de 2023	$ 134.432.513,70

5	ACTA PARCIAL Nº 002	30 de Julio de 2023	$ 262.865.027,40
6	ACTA PARCIAL Nº 003	04 de Septiembre de 2023	$ 419.835.310,32
7	VR. TOTAL, EJECUTADO	04 de Septiembre de 2023	$ 823.132.851,42
8	VR. POR EJECUTAR	04 de Septiembre de 2023	$ 521.192.285,58

4.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Dentro de las actividades, para el continuo desarrollo de la topografía se encuentran debidamente calibrados los siguientes equipos:

- GPS topcon hider Vred Gnss.
- Estacion total topcon CTS-255 con precision angular.
- Nivel.
- Equipo Densidad de campo (Cono de arena).


Dentro de la maquinaria de trabajo utilizados en esta etapa del proyecto tenemos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retro Excavadora – Oruga.	2
Cortadoras de acero (tronzadoras).	1
Compactador tipo rana	1
Motoniveladora	1
Vibro-Compactador	1
Retro Excavadora – tipo pajarita	1

4.2. INFORMES SEMANALES

Se describen a continuación los avances semanales a corte del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023 obtenidos en la ejecución del contrato de Obra No. 150523-001 (Porcentajes calculados con el costo directo de la obra).

Columna1	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1-S11		60,16%		30,69%	
S12	10,63%	70,79%	0,92%	31,61%	9,72%
Porcentaje Luego de la Modificatoria No.002		79,91%			
S13	2,09%	82,00%	4,82%	36,43%	-2,73%
S14	2,09%	84,09%	12,71%	49,14%	-10,62%
S15	2,18%	86,26%	2,40%	51,54%	-0,22%
S16	3,12%	89,38%	15,39%	66,92%	-12,26%

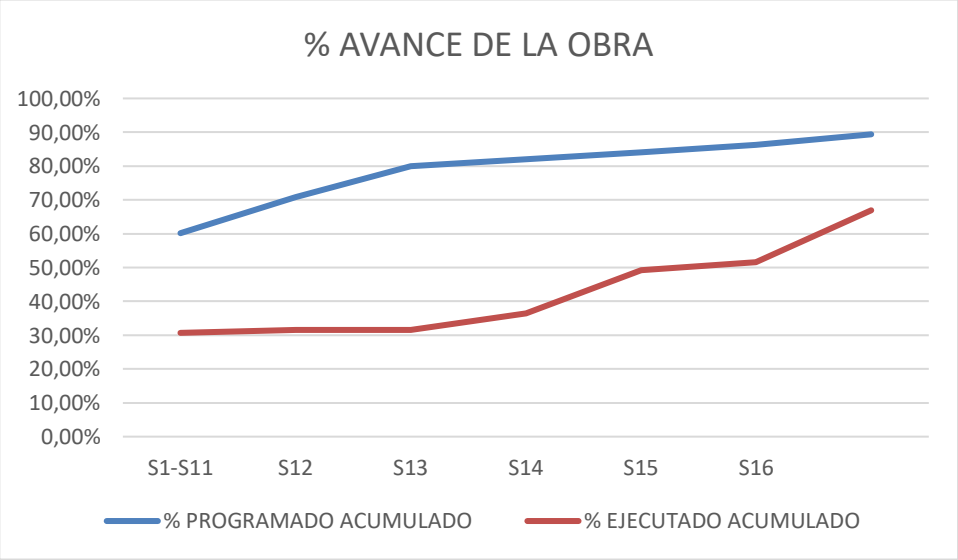

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los aspectos o condiciones a resaltar, presentadas del periodo del 01 de

Agosto hasta el 31 de Agosto del 2023 de ejecución, donde el contratista ha realizado las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT + /-	Vr. PARCIAL
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	25,00	$ 2.986.457,50
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	280,35	$ 319.312.287,44
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	1655,14	$ 14.773.033,15
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	460,00	$ 53.148.446,00
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	212,50	$ 20.603.277,50

Cantidades ejecutadas es el mes de Agosto

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	25,00
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	414,34
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	3796,84
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	487,08
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	251,84

Cantidades ejecutadas acumuladas

5. CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo que se informa, el contratista alcanzó un avance de obra equivalente al 31,2% del valor total del contrato, para un porcentaje ejecutado acumulado de 66,92% por debajo del porcentaje acumulado programado de 89,38%, luego de los ajustes según el nuevo cronograma obtenido de la modificatoria No. 002 realizada al contrato de obra, a juicio de esta interventoría es un avance poco significativo, dado al desfase porcentual del avance ejecutado con respecto al programado que se dio en este mes. El índice de cumplimiento disminuyó al 22,46%, lo cual significa que se encuentran retrasados. Por parte de la interventoría se realizaron todas acciones pertinentes para lograr conseguir en el próximo periodo un mayor porcentaje de ejecución de la obra.



TORIBIO ANDRADE YEJAS
INTERVENTOR

- **ANEXOS FOTOGRAFICOS**






















CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO
	INFORME SEMANAL 12	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	72 dias		

Semana Número: 12 Del: 31/07/2023 Al: 6/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 79 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,6325%	70,7989%	Obra Física Ejecutada (%)	0,9173%	31,6030%
Valor de la Obra programada:	$ 139.741.868,87	$ 930.499.257,44	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 12.056.499,31	$ 415.354.040,41

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	60,1663%	30,6857%	-9,7152%
Durante el periodo	10,6325%	0,9173%	
Acumulado actual	70,7989%	31,6030%	

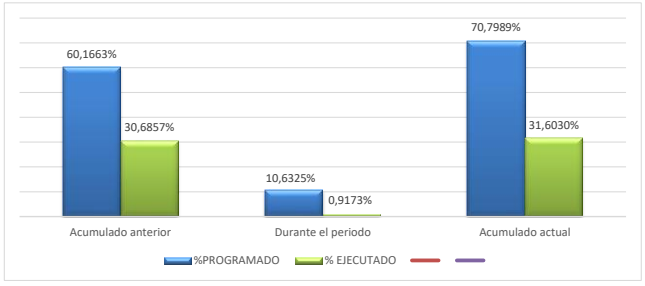

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la decima semana se realizaron actividades de: Armado de acero de refuerzo para pasadores y bordillos. Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa para el carril derecho desde el PT0+180 hasta el PT0+200

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero de refuerzo para pasadores y bordillos. Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 0,9173% con respecto a lo programado de 10,6325% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 37,6999%, presentandose un defase de de -9,7152% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALLESSA TURIZO CENTENO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
13	Sem 13		$ 26.670.121,28								
14	Sem 14		$ 26.670.121,28								
15	Sem 15		$ 60.316.402,28								
16	Sem 16		$ 67.916.997,52								
17	Sem 17		$ 59.874.711,49								
18	Sem 18		$ 66.410.170,79								
19	Sem 19		$ 41.764.293,86								
20	Sem 20		$ 34.163.698,62								
			$ 1.314.285.774,56					**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$ 415.354.040,41**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO
	INFORME SEMANAL 13	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	79 dias		

Semana Número: 13 Del: 7/08/2023 Al: 13/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 86 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,0888%	81,9974%	Obra Física Ejecutada (%)	4,8214%	36,4244%
Valor de la Obra programada:	$ 27.452.327,76	$ 1.077.679.698,95	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 63.366.388,71	$ 478.720.429,11

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	79,9086%	31,6030%	2,7326%
Durante el periodo	2,0888%	4,8214%	
Acumulado actual	81,9974%	36,4244%	

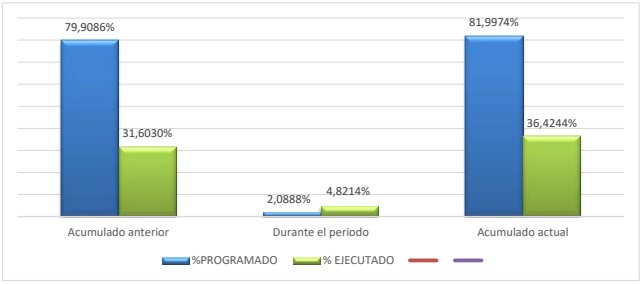

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana 13 se realizaron actividades de: Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa para el carril derecho desde el PT0+160al PT0+180 y desde el PT0+200 hasta el PT0+280. Asi mismo se fundieron 50ml de bordillo en concreyo reforzado de 3000 psi desde el PT0+010 hasta el PT0+060

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero de refuerzo para pasadores. Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa y fundida de bordillos en concreyo reforzado de 3000psi

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 4,8214% con respecto a lo programado de 2,0888% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 36,4244%, presentandose un porcentaje de 2,7326% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALESSA TURIZO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14		$ 27.452.327,76								
15	Sem 15		$ 28.606.240,88								
16	Sem 16		$ 41.010.412,32								
17	Sem 17		$ 33.139.439,49								
18	Sem 18		$ 34.773.304,32								
19	Sem 19		$ 42.014.261,14								
20	Sem 20		$ 29.610.089,70								
			$ 1.314.285.774,56					**81,9974%**	**$ 1.077.679.698,95**	**36,4244%**	**$ 478.720.429,11**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO
	INFORME SEMANAL 14	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	86 dias		

Semana Número: 14 Del: 14/08/2023 Al: 20/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 93 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,0888%	84,0861%	Obra Física Ejecutada (%)	4,8214%	49,1369%
Valor de la Obra programada:	$ 27.452.327,76	$ 1.105.132.026,71	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 63.366.388,71	$ 645.799.714,05

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	81,9974%	36,4244%	10,6238%
Durante el periodo	2,0888%	12,7126%	
Acumulado actual	84,0861%	49,1369%	

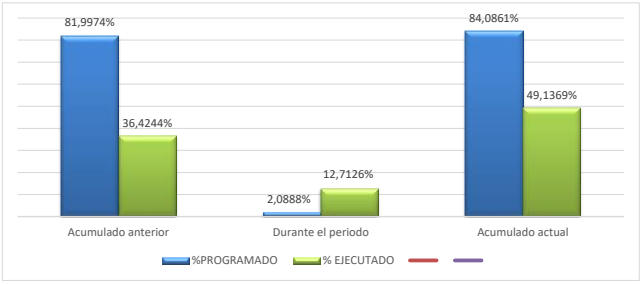

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

la semana 14 se realizaron actividades de: Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa para el carril derecho desde el PT0+180al PT0+370 y el carril izquierdo desde el PT0+180 hasta el PT0+230 y desde el PT0+370 hasta el PT0+330. Asi mismo se fundieron 187ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PT0+060 hasta el PT0+150 lado derecho y el lado izquierdo desde el PT0+010 hasta el PT0+150

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero de refuerzo para pasadores. Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa y fundida de bordillos en concreto reforzado de 3000psi

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 12,7126% con respecto a lo programado de 2,0888% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 49,1369%, presentandose un porcentaje de 10,6238% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALESSA TURIZO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14	20-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	12,7126%	$ 167.079.284,93	$ 139.626.957,17	84,0861%	$ 1.105.132.026,71	49,1369%	$645.799.714,05
15	Sem 15		$ 28.606.240,88								
16	Sem 16		$ 41.010.412,32								
17	Sem 17		$ 33.139.439,49								
18	Sem 18		$ 34.773.304,32								
19	Sem 19		$ 42.014.261,14								
20	Sem 20		$ 29.610.089,70								
			$ 1.314.285.774,56					**84,0861%**	**$ 1.105.132.026,71**	**49,1369%**	**$ 645.799.714,05**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO
	INFORME SEMANAL 15	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	93 dias		

Semana Número: 15 Del: 21/08/2023 Al: 27/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,1766%	86,2627%	Obra Física Ejecutada (%)	2,3950%	51,5319%
Valor de la Obra programada:	$ 28.606.240,88	$ 1.133.738.267,60	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 31.477.144,30	$ 677.276.858,35

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84,0861%	49,1369%	0,2184%
Durante el periodo	2,1766%	2,3950%	
Acumulado actual	86,2627%	51,5319%	

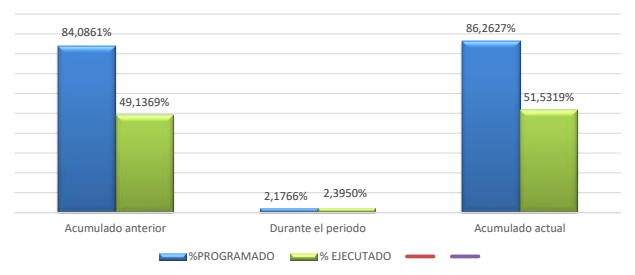

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana 15 se realizaron actividades de: Fundida de andenes para el carril derecho desde el PT0+160al PT0+180 y desde el PT0+200 hasta el PT0+280. Asi mismo se fundieron 111,52ml de bordillo en concreyo reforzado de 3000 psi desde el PT0+010 hasta el PT0+060

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero de refuerzo para pasadores. Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa y fundida de bordillos en concreyo reforzado de 3000psi

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 2,1766% con respecto a lo programado de 2,3950% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 51,5319%, presentandose un porcentaje de 0,2184% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALESSA TURIZO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14	20-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	12,7126%	$ 167.079.284,93	$ 139.626.957,17	84,0861%	$ 1.105.132.026,71	49,1369%	$645.799.714,05
15	Sem 15	27-ago-23	$ 28.606.240,88	2,1766%	2,3950%	$ 31.477.144,30	$ 2.870.903,42	86,2627%	$ 1.133.738.267,60	51,5319%	$677.276.858,35
16	Sem 16		$ 41.010.412,32								
17	Sem 17		$ 33.139.439,49								
18	Sem 18		$ 34.773.304,32								
19	Sem 19		$ 42.014.261,14								
20	Sem 20		$ 29.610.089,70								
			$ 1.314.285.774,56					**86,2627%**	**$ 1.133.738.267,60**	**51,5319%**	**$ 677.276.858,35**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO
	INFORME SEMANAL 16	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	89 dias		

Semana Número: 15 Del: 27/08/2023 Al: 3/09/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 97 días


Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,1204%	89,3830%	Obra Física Ejecutada (%)	15,3850%	66,9170%
Valor de la Obra programada:	$ 41.010.412,32	$ 1.174.748.679,91	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 202.203.383,71	$ 879.480.242,06

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	86,2627%	51,5319%	12,2647%
Durante el periodo	3,1204%	15,3850%	
Acumulado actual	89,3830%	66,9170%	

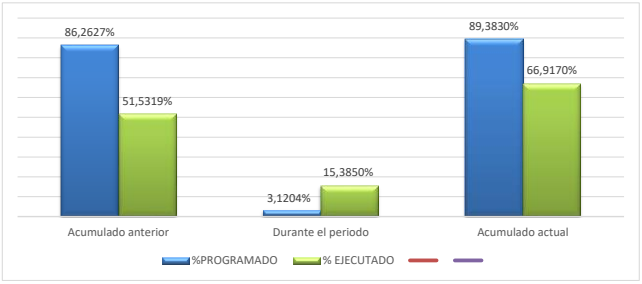

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana 16 se realizó la fundida de concreto en el carril izquierdo desde el PT0+220 hasta el PT0+300 y el carril derecho desde el PT0+370 hasta el PT0+400. Así mismo se fundieron 488,5ml de bordillos de margen derecho y margen izquierdo hasta el PT0+220, y los andenes desde el PT0+020 hasta el PT0+230

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para las actividades de la semana siguiente se programa: Armado de acero de refuerzo para pasadores. Fundida de pavimento en concreto hidraulico, MR=38 mpa y fundida de bordillos en concreyo reforzado de 3000psi

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 15,3850% con respecto a lo programado de 3,1204% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 51,5319%, presentandose un porcentaje de 12,2647% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALESSA TURIZO
Residente de interventoría

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 1/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Uriel Jance Onzo		

Actividades Ejecutadas

Colocación de mesa para fundida de Pavimento hidraulico MR38

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroconcreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Regla Compactadora	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Uriel Jance Onzo

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 2/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MÁLG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Mari Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida de Concreto hidraulico M25 para Cerramiento derecho.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroconcreto	Bien			Seco - Soleado x	
Para compactador	Bien			Nublado	
Trompo	Bien			Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Mari C. Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 3/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Se retiran todos los dias del turno y Fundido. Instalación de Acero de refuerzo para pasadores y bordillos

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vehiculo Concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Planta compactador	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 4/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing Residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Arreglo de Terreno para Fundida de Pavimento hidraulico MR3

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroconcreto	Bien	SI		Seco - Soleado	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Dumpb	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	**Fecha:** 3/08/2023	**Consecutivo:**	**Pagina:** de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	**Contratista**	**Contratante**	**Objeto del Contrato**
CMA-MALG-003-2023	**TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"**

Información Contrato de Obra

Contrato No.	**Contratista**	**Contratante**	**Objeto del Contrato**
150523-001	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**

Personal Profesional y Técnico

Contratista		**Interventor**	
Cargo	**Nombre**	**Cargo**	**Nombre**
Ing. residente	Manuel Jance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Se retiran restos de la fundida de placas. Se realiza corte en las juntas de dilatación

Observaciones

Maquinaria y Equipo	**Estado B/M**	**Operativo SI/NO**	**Observaciones**	**Estado del Tiempo**	**No. Horas**
Vibroconcreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Retroacompactador	Bien	SI		Nublado	
Tumpo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel. Jance Orozco

Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	**Fecha:** 6/08/2023	**Consecutivo:**	**Pagina:** de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	**TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"**

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

NO se laboró en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroconcreto	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Rana compactado	Bien	Si		Nublado	
Tromplo	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel P. Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 7/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Onzeo		

Actividades Ejecutadas

Se arman Cajones para fundida de Bordillos. Se engola terreno para fundida de Pavimento hidraulico MR38

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibro concreto	Bien	Si		Seco - Soleado	
Rana compactadora	Bien	Si		Nublado	
Trompo	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Onzeo

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	**Fecha:** 8/08/2023	**Consecutivo:**	**Pagina:** de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	**TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"**

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida de 30ml de Bordillo Fundida de Pavimento hidraulico K0238 Cam1 derecho hasta el PK0+220.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vi En Concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Bomba compactada	Bien	SI		Nublado	
trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 9/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundición de cajones para fundida de Bordillos. Amagos del terreno para fundida de Pavimento hidraulico

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroconcreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 10/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de 30ml de Bordillo hasta el PT 0+060. Fundida del Pavimento Hidraulico MR38 hasta el PT 0+250.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibrocompactador	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Ranacompactador	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 11/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Retiro de Bolos de bordillos. Se arreglo terreno para Fundida de pavimento hidraulico MR38.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibro concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactada	Bien	SI		Nublado	
Tromps	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 12/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Daniel Jance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida de Pavimento hidraulico M3 35 del carril derecho hasta el PK0+280

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
1 Mixer concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoría

Daniel J. Jance Ortiz
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	**Fecha:** 13/08/2023	**Consecutivo:**	**Pagina:** de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	**Contratista**	**Contratante**	**Objeto del Contrato**
CMA-MALG-003-2023	**TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"**

Información Contrato de Obra

Contrato No.	**Contratista**	**Contratante**	**Objeto del Contrato**
150523-001	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**

Personal Profesional y Técnico

Contratista		**Interventor**	
Cargo	**Nombre**	**Cargo**	**Nombre**
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

No se laboró en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	**Estado B/M**	**Operativo SI/NO**	**Observaciones**	**Estado del Tiempo**	**No. Horas**
Vibroconcreto	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Rana compuesta	Bien	Si		Nublado	
Bomba	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 14/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Mariel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Relleno de terreno para Fundida de Pavimento hidraulico MR38
Colocacion de bolas para Fundida de Bordillos.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibrocreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

**Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre*

**Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente*

**Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo*

Mariel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 15/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Adanel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de 50mt de Bordillos. Fundida de Pavimento Hidraulico MR3B

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Mixer Concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Equipo compactación	Bien	SI		Nublado	
Formaleta	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Adanel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	**Fecha:** 16/08/2023	**Consecutivo:**	**Pagina:** **de**

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	**TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"**

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	**Nombre**	**Cargo**	**Nombre**
Ing. Residente	Abmd. Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Arreglo de terreno para Fundida de Pavimento hidraulico M23R. para carril derecho. Colocación de cajones para Bordillos

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones
Vibroconcreto	Bien	SI	
Rana compacta	Bien	SI	
Trompo	Bien	SI	

Estado del Tiempo	No. Horas
Seco - Soleado X	
Nublado	
Lluvias Moderadas	
Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Abmd. Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 18/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Arreglo de terreno para fundida de fraguamiento y Armado de Aceros para fundida de Bordillos.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibro Concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Planta Compacta	Bien	SI		Nublado	
Pompeo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 11/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Mariel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de Pavimento hidraulico MR38. para canal izquierdo. Fundida de 30ml de Bordillos.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vi Dr concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactu	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoría

Mariel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 20/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Abdel Jance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Colocación de cajuelas para Fundida de Bordillos

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibro Concreto	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	Si		Nublado	
Trompo	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Abdel Jance Orozco

Ing. Residente - Interventoría | **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 22/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

No se laboró en obra por lluvias todo el día.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibrocompactador	Bien	SI		Seco - Soleado	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Tanque	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas X	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría **Ing. Residente - Obra**

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 23/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Pedraplen de terreno para Fundida de Pavimento hidraulico y plan Fundida de Andenes

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones
Vibro concreto	Bien	SI	
Lona compacta	Bien	SI	
Rompe	Bien	SI	

Estado del Tiempo	No. Horas
Seco - Soleado X	
Nublado	
Lluvias Moderadas	
Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	**Fecha:** 30/08/2023	**Consecutivo:**	**Pagina:** de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	**TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"**

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.**	MUNICIPIO DE ALGARROBO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Daniel Jance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Relleno de recebo para andenes, Arreglo de tramo para fundida de pavimento hidraulico, y cajones para Bordillos

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones
Vibroconcreto	Bien	SI	
Retroexcavadora	Bien	SI	
Trompo	Bien	SI	

Estado del Tiempo	No. Horas
Seco - Soleado X	
Nublado	
Lluvias Moderadas	
Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Daniel Jance Orozco

Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 17/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Ramel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de Bordillos Cam1 derecho. Fundida de Pavimento Hidráulico Cam1 derecho

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroapisonador	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	Si		Nublado	
Trompo	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ramel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 24/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Jance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de 30m³ de pavimento rígido MR38 de anden de 30m³ de Bordillo cerrado y fundido y Fundida de

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibrocompactador	Bien	SI		Seco - Soleado x	
Vibrocompactador	Bien	SI		Nublado	
Herramienta menor	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Jance Orozco

Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 25/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ingeniero	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Retiro de cojines de Bordillo y de Tiras del Pavimento.
Amago de ferrene para fundida de Pavimento, Bordillo y andenes

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibro concreto	Bien	Si		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	Si		Nublado	
Pompo	Bien	Si		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 26/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de pavimento hidraulico MR38 Fundida de 20m1 de bordillos y fundido de andenes margen derecho.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibroconcreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compacta	Bien	SI		Nublado	
Equipo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoría

Manuel Yance Orozco
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 27/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

No se laboro en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibro concreto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Equipo compacto	Bien	SI		Nublado	
Formaleta	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 29/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de Pavimento hidraulico MR38, Fundida de Bordillos y anclajes

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones
Vibrocompactador	Bien	SI	
Retrocargador	Bien	SI	
Dumper	Bien	SI	

Estado del Tiempo	No. Horas
Seco - Soleado X	
Nublado	
Lluvias Moderadas	
Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
Nit. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 28/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Arreglo de terreno para fundida de Pavimento hidraulico MR38
Colocacion de Relleno para recibo para andenes

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retroexcavadora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Trompo	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe dillgenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 31/08/2023	Consecutivo:	Pagina:	de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Adanl Jance Ovies		

Actividades Ejecutadas

Fundido de 30ml de anclajes hidraulicos 2ml RASE. Bordillos y Fundido de 60 ml Permanente

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Vibrocompactador	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rana compactadora	Bien	SI		Nublado	
Formaleta	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:
*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Adanl Jance Ovies

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 150523-001. MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ALGARROBO– MAGDALENA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO** **Nit. 901.712.744-5** **Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS** **C.C. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico.**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.**
VALOR INICIAL:	**$ 1.344.325.137,00**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1:	**$ 134.432.513,70**
VALOR ACTA PARCIAL No. 2:	**$ 262.865.027,40**
VALOR ACTA PARCIAL No. 3:	**$ 419.835.310,32**
PLAZO DE EJECUCION:	**CINCO (5) MESES**
FECHA DE INICIO:	**MAYO 17 DE 2023**
FECHA DE TERMINACION:	**OCTUBRE 17 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**TORIBIO ANDRADE YEJAS** **CC. No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA** **SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**SEPTIEMBRE 4 DE 2023**

En el Municipio de Algarrobo, Magdalena, a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2023, se reunieron el ingeniero **DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA**, Secretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato en referencia, el señor **TORIBIO ANDRADE YEJAS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico, interventoría del contrato y el señor **CRISTIAN CUENTAS MANOTAS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico, representante legal del **CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO,** identificado con **Nit. 901.712.744-5,** en su calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir respectivamente cada uno de los nombrados las obras parciales objeto del contrato en referencia, dejando constancia de los siguientes hechos:

1. Que el **CONTRATO DE OBRA No.150523-001**, cuyo objeto es el **MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA,** se ejecutó de acuerdo con el cuadro de cantidades, especificaciones técnicas del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjunto a la presente acta y que hace parte integral de la misma y al siguiente resumen:

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 419.835.310,32**
MENOS AMORITIZACIÓN DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 419.835.310,32**

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 419.835.310,32) ML.

2. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	**$ 1.344.325.137,00**
Valor Acta de recibo parcial No. 1	**$ 134.432.513,70**
Valor Acta de recibo parcial No. 2	**$ 262.865.027,40**
Valor Acta de recibo parcial No. 3	**$ 419.835.310,32**
	$ 521.192.285,58
Valor por ejecutar	

3. Que el estado de cuentas del anticipo a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor del anticipo (0%)	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 1	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 2	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 3	$ 0,00
Valor por amortizar	**$ 0,00**

4. Que a la fecha el contrato presenta un avance físico del: **61,23%**

5. Que mediante la presente acta se hace entrega parcial de las obras objeto del contrato en referencia.

6. Que las obras parciales objeto del contrato fueron recibidas a entera satisfacción por el supervisor del contrato y la interventoria en representación del Municipio de ALGARROBO, MAGDALENA.

7. Que el valor por pagar al contratista en la presente acta de recibo parcial de obra No. 3 es la suma de **$ 419.835.310,32.**

8. Que el contratista **CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO,** declara estar a paz y salvo con los trabajadores, proveedores y subcontratista que participaron en el desarrollo del contrato.

9. Que el contratista **CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO,** manifiesta estar a paz y salvo con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de todos los trabajadores de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

Ing.DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
Secretario de Planeación e Infraestructura
C.C. No. 19.518.350
SUPERVISOR

TORIBIO ANDRADE YEJAS
CC. No. 72.135.609 de Barranquilla
INTERVENTOR

CRISTIAN CUENTAS MANOTAS
CC No. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico
Rep. Legal. CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5
CONTRATISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

ACTA PARCIAL No. 3

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5

CONTRATISTA	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO Nit. 901.712.744-5 Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS C.C. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico.	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL**	$ 1.344.325.137,00
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALGARROBO– MAGDALENA	**VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL N° 1**	$ 0,00
INTERVENTOR	TORIBIO ANDRADE YEJAS CC. No. 72.135.609 de Barranquilla	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 1.344.325.137,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**VALOR ACTA PARCIAL N° 1**	$ 134.432.513,70
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.	**VALOR ACTA PARCIAL N° 2**	$ 268.865.027,40
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.344.325.137,00	**VALOR ACTA PARCIAL N° 3**	$ 419.835.310,32
VALOR ANTICIPO (0%)	$ 0,00	**PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA**	61,23%
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 521.192.285,58
FECHA DE INICIO	MAYO 17 DE 2023	**VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N°3**	$ 419.835.310,32
FECHA TERMINACIÓN	OCTUBRE 17 DE 2023	**Menos Amortización de Anticipo (0%)**	$ 0,00
FECHA PRESENTE ACTA	SEPTIEMBRE 4 DE 2023	**VALOR TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL N° 3**	$ 419.835.310,32

								CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		VARIACIÓN		ACTA MODIFICATIVA No. 1		ACTA PARCIAL N° 3	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT +/-	Vr. PARCIAL	CANT +/-	Vr. PARCIAL	CANT +/-	Vr. PARCIAL
1		**PRELIMINARES**																	
1,1	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19		3029,318	$ 4.229.533,79	725,63	$ 1.013.127,40	339,42	$ 473.898,20	4094,37	$ 5.716.559,39		$ -
1,2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	$ 105.586,00	$ 96.055.385,30		909,74	$ 96.055.807,64		$ -	81,47	$ 8.601.985,83	991,21	$ 104.657.793,47		$ -
							Subtotal	**$ 101.298.046,49**			**$ 100.285.341,43**		**$ 1.013.127,40**		**$ 9.075.884,04**		**$ 110.374.352,87**		**$ -**
2		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																	
2,1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20		1.326,62	$ 34.147.172,27	646,71	$ 16.646.341,93	197,51	$ 5.083.984,62	2170,84	$ 55.877.498,82		$ -
2,2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	90,41	$ 119.458,30	$ 10.800.463,82			$ -		$ -	-10,14	-$ 1.211.068,25	80,27	$ 9.589.395,57	25,00	$ 2.986.457,50
							Subtotal	**$ 61.593.978,02**			**$ 34.147.172,27**		**$ 16.646.341,93**		**$ 3.872.916,37**		**$ 65.466.894,39**		**$ 2.986.457,50**
3		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**																	
3,1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,687000	$ 89.297.485,26			$ -	570,14	$ 89.297.485,26	93,63	$ 14.664.528,95	663,77	$ 103.962.014,21		$ -
3,2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99			$ -	133,99	$ 152.616.125,00	63,03	$ 71.787.461,58	634,34	$ 722.501.141,57	280,35	$ 319.312.287,44
3,3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50			$ -	1041	$ 9.291.947,81	2141,70	$ 19.115.832,22	6443,57	$ 57.512.363,73	1655,14	$ 14.773.033,15
							Subtotal	**$ 778.407.696,75**			**$ -**		**$ 251.205.558,07**		**$ 105.567.822,75**		**$ 883.975.519,51**		**$ 334.085.320,59**
4		**OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES**																	
4.1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,32	$ 115.540,10	$ 106.680.485,13			$ -		$ -	27,08	$ 3.128.825,91	950,40	$ 109.809.311,04	460,00	$ 53.148.446,00
4.2	630.4	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	768,50	$ 96.956,60	$ 74.511.341,01			$ -		$ -	39,34	$ 3.814.078,73	807,84	$ 78.325.419,74	212,50	$ 20.603.277,50
4.3	671,1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	30,00	$ 1.013.412,70	$ 30.402.380,97			$ -		$ -	18,96	$ 19.214.304,77	48,96	$ 49.616.685,74		$ -
							Subtotal	**$ 211.594.207,12**			**$ -**		**$ -**		**$ 26.157.209,41**		**$ 237.751.416,53**		**$ 73.751.723,50**
5		**SEÑALIZACION**																	
5.1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30			$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 7.200.344,30		$ -
							Subtotal	**$ 7.200.344,30**			**$ -**		**$ -**		$ -		**$ 7.200.344,30**		**$ -**
6		**BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA**																	
6.1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX COULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78			$ -		$ -	-63,86	-$ 71.561.796,78	3,13	$ 3.507.368,18564		$ -
6.2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX COULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20			$ -		$ -	-7061,01	-$ 63.023.327,20	124,17	$ 1.108.284,30180		$ -
6.3	6.3P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	4,00	$ 4.901.594,48	$ 19.606.377,91			$ -		$ -	-4,00	-$ 19.606.377,91	1,00	$ 4.901.594,47701		$ -
							Subtotal	**$ 154.191.501,88**			**$ -**		**$ -**		**-$ 154.191.501,88**		**$ 9.517.246,96**		**$ -**
							Subtotal												

COSTO DIRECTO			$ 1.314.285.774,56		$ 134.432.513,70		$ 268.865.027,40				$ 1.314.285.774,56		$ 410.823.501,59
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 1.314.285.774,56		$ 134.432.513,70		$ 268.865.027,40				$ 1.314.285.774,56		$ 410.823.501,59
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)			$ 14.831.606,00								$ 14.831.606,00	30%	$ 4.449.481,80
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES)			$ 15.207.756,44								$ 15.207.756,44	30%	$ 4.562.326,93
VALOR TOTAL			$ 1.344.325.137,00		$ 134.432.513,70		$ 268.865.027,40				$ 1.344.325.137,00		$ 419.835.310,32
	DESCRIPCION												
	ADMINISTRACIÓN	A=	23%										
	IMPREVISTO	I=	2%										
	UTILIDAD	U=	5%										
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%										
					$ 134.432.513,70		$ 268.865.027,40				$ 1.344.325.137,00		$ 419.835.310,32

Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
Secretario de Planeación e Infraestructura
C.C. No. 19.518.350
SUPERVISOR

TORIBIO ANDRADE YEJAS
CC. No. 72.135.609 de Barranquilla
INTERVENTOR

CC No. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico
Rep. Legal. CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5
CONTRATISTA

Formato de Memorias de Cantidad de Obras

CONTRATO DE OBRA No.150523-001 de 2023	Versión: 3	Fecha: 4/09/2023

OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA	FECHA DE CORTE		4/09/2023
ITEM 3.2	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38			UND / M2



DESCRIPCION	Localización y/o Abscisa	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38						
CARRIL DERECHO	PT0+150-PT400	3,15	240,00	0,20		151
CARRIL IZQUIERDO	PT0+150-PT400	3,15	205,00	0,20		129
TOTAL						**280,35**

Consorcio Pav-La Loma
Contratista de obra

Delpi Gómez de la Rosa
Supervisor

ITEM 3.3	ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO					UND	M3



DESCRIPCION	Localización y/o Abscisa	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ø	KGR	LARGO		
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO						
BARRAS LISAS	PT0+150- PT0+400	1"	23,84	0,35	65	1.549,60
BARRAS CORRUGADAS	PT0+150- PT0+401	1/2"	5,96	0,85	17,71	105,54
TOTAL						**1.655,14**

Consorcio Pav-La Loma
Contratista de obra

Deibi Gomez de la Rosa
Supervisor

ITEM 4.1	BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	DIST.	M3KM



DESCRIPCION	Localización y/o Abscisa	DIMENSIONES			KM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	PT0+020-PT0+230		460			460,00

ITEM 2.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	UND	M3



DESCRIPCION	Localización y/o Abscisa	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)						
CARRIL DERECHO	PT0+020-PT0+230	0,10	200,00			20,00
CARRIL IZQUIERDO	PT0+020-PT0+130	0,10	50,0			5,00

ITEM 4,2	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	UND	M3



DESCRIPCION	Localización y/o Abscisa	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M						
CARRIL DERECHO	PT0+020-PT0+230	0,85	200,00			170,00
CARRIL IZQUIERDO	PT0+020-PT0+130	0,85	50,00			42,50
						212,50

Consorcio Pav-La Loma
Contratista de obra

Deibi Gomez de la Rosa
Supervisor

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023



Antes



Durante



Después

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 3

PERIODO:
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ALGARROBO - MAGDALENA, SEPTIEMBRE 4 DE 2023

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 3
01 AL 31 AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VIA A INTERVENIR
MAGDALENA	ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA	VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 3
01 AL 31 AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

ELABORO:	Residente de Obra Ing. MARIEL YANCE OROZCO Mat. Prof. 021037-0614443 ATL
REVISO Y APROBO:	Director de obra Ing. EDUARDO E. CABALLERO AVILA Mat. Prof. 08202-64430 ATL
VERSION:	1.0

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 6
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO. 7
4. INFORMACION DE CAMBIOS PROPUESTOS 7
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023 9
5.1. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el presente periodo 10
5.2. Estado de avance y acciones a seguir 11
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA MUNICIPIO DE ALGARROBO **¡Error! Marcador no definido.**
6.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA MUNICIPIO DE ALGARROBO **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.1. Resumen mensual estado general del proyecto **¡Error! Marcador no definido.**
Maquinaria y equipo de contrato de obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.2. Personal contrato de obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.3. Informe financiero y presupuestal al contrato de obra . **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.4. Estado general de tiempo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.5. Resumen ensayos de laboratorio ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.6. Control aporte legales y seguridad social contrato de obra **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.7. Informe avance físico-financiero ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.8. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.9. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.10. Seguimiento a la inversión del anticipo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.11. Programa de Inversiones ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.12. Seguimiento programa de inversiones ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.13. Actas de comité de obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.14. Informe semanal ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 12
7.2. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 12
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
9. ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.1. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.2. COPIA DE BITÁCORA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.3. INFORMES SEMANALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.4. FORMATOS FOC ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.5. ACTA PARCIAL DE OBRA No.2 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

1. INTRODUCCION

El presente informe contiene una descripción técnica de unos cambios y obras adicionales propuestos por El CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, en su calidad de contratista de obra, quien socializó y sometió a aprobación de la supervisión del contrato e interventoría, las siguientes modificaciones, basadas en los estudios hidráulicos y el nuevo diseño geométrico, los cuales harían funcional el proyecto vial a construir.

La modificación contempla la construcción de una transición para el empalme con la vía troncal del caribe, así mismo, un cambio de dos Boxcoulvert, Construcción de 4 bocacalles y de dos registros para la recolección de aguas de las cuentas y las calles adyacentes.

Las mayores y menores cantidades propuestas se realizan para la construcción de:

- Transición en la abscisa PR0+000

- Cambios de pendiente en el pavimento que sustituyen el Box coulvert 1 ubicado en la abscisa PR0+070

- Cambios de pendiente en el pavimento con el fin de que funcione como batea la cual sustituye el Boxcoulvert 2 ubicado en la abscisa PR0+170.

-Cámara caída o Canal de rejillas PR0+446.

-Bocacalles CL 4 CRA 3ª; CL4 CRA 1; CL4 CRA 3.

Mayores y menores cantidades de obra que no varían el presupuesto incial-contractual, ni el plazo de ejecución. Cambios que fueron aprobados mediante acta modificativa No. 2 de fecha 10 de agosto de 2023 al **CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023.**

2. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Municipio de ALGARROBO, MAGDALENA



Localización del Proyecto en el Municipio de Algarrobo – Magdalena.


3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las obras de intervención que ejecutará el constructor a través del CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023, que tiene como objeto el **MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA**, estarán sujetas a las especificaciones generales y particulares del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES), SUBBASE GRANULAR CLASE C, PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38, ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO, BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI, CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M, CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACIONM, CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS, ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 1mX 1m (Platina de 2y1/2" x 1/4" con ángulos de 2y1/2" x 1/4"), PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) Y PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES).

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
LONGITUD	460,42 mts
ANCHO	6 mts
MR CONCRETO	38
BOMBEO	-2%

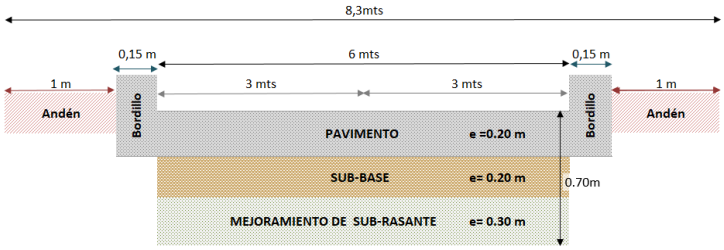

La zona a intervenir del proyecto representa una longitud de 460,42 metros lineales.

4. INFORMACION DE CAMBIOS PROPUESTOS

basados en los estudios hidráulicos y al nuevo diseño geométrico de la vía, se propuso las siguientes modificaciones:

- **Transición PR0+000:** Se hace necesario la construcción de la transición desde PR0+000 hasta el PR0+030 que empalma el pavimento con la vía nacional troncal del caribe, debido a que esta no se encuentra contemplada en el presupuesto inicial del proyecto, logrando con esto, el correcto funcionamiento de la vía.

Evidencia del estado de la vía en el PR0+000



- **Box Coulvert ubicado en el PR0+070**: Recomendamos realizar un cambio de pendiente desde la abscisa PR0+010 hasta la PR0+170, debido a que el flujo de agua producto de escorrentías por lluvia en ese tramo es mínima. El objetivo de este cambio es permitir que las aguas se recojan en la abscisa PR0+170. Al mantener una sola pendiente dentro de estos puntos, se asegura que las aguas fluyan hacia un único

lugar de recolección. Esto contribuirá a evitar posibles problemas de drenaje y asegurará un correcto funcionamiento del sistema.

- **Box-Coulvert propuesto en la abscisa PR0+170:** Sugerimos sustituir el Box Coulvert propuesto en la abscisa PR0+170 por una batea. Esto se basa en el hecho de que el terreno adyacente quedará por encima del box-coulvert, lo cual resultaría en su cimentación y falta de funcionalidad. Al utilizar una batea en su lugar, se evitarán futuros problemas relacionados con el drenaje y el flujo adecuado de agua en esa ubicación.

Dentro de nuestro objeto contractual, inicialmente se realizaron las actividades de excavación de la subrasante existente en todo el tramo, al evidenciar que la demanda de agua en ese punto no era alta, planteamos un cambio de pendiente hasta el PR0+170 para observar el comportamiento en ese punto, donde se obtuvieron los resultados esperados y todas las aguas se recogían en el punto más crítico existente de la salida de agua inicial.

Así mismo en el PR0+170 se plantea una batea manejándola por un cambio de pendiente en este punto para observar el comportamiento de aguas producto de la escorrentía.

Evidencia de la demanda de agua en el PR0+070



Evidencia de extensión del material para el cambio de pendiente PR0+070



Evidencia del estado de la vía en PR0+170



Una vez identificado el flujo de agua por escorrentías en estos puntos y mediante un estudio hidráulico realizado para determinar la demanda de agua se propone mantener una sola pendiente dentro de estos puntos, se asegura que las aguas fluyan hacia un único lugar de recolección. Esto contribuirá a evitar posibles problemas de drenaje y asegurará un correcto funcionamiento del sistema.

- **En el PR0+446:** Proponemos realizar unos registros o cámaras de caída (rejillas de 1mx1m) que recolecten las aguas que vienen de las cunetas y dirigir la salida de las aguas hacia el descole del box-coulvert existente en el PR0+460,2. Debido a que las aguas que se recogen en las cunetas ubicadas en el margen derecho no tienen salida, ya que se ubican saliendo por el encole del box-coulvert existente lo cual implicaría realizar un corte en la aleta del mismo, causando una debilitación en la estructura y causando que el agua recolectada por la estructura se dirija a la vía cuando este es rebosado.

Evidencia de la estructura con respecto al nivel de terminación de las cunetas



Por lo tanto, se sugieren realizar unos registros o cámara de caída (1mx1m) donde se recojan las aguas de las cunetas y se encaminen al descole del Boxcoulvert existente.

- **Construcción de bocacalles:** Se plantea la construcción de las bocacalles de las carreras que interceptan con la vía a intervenir, con sus respectivos andenes y bordillos, con el fin de proteger la estructura de pavimento en construcción.

Mayores y menores cantidades de obra que se cuantifican en el acta modificativa No. 2, la cual hace parte integral del presente informe y no varían el valor del presupuesto inicial-contractual, ni el plazo contractual inicial.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO

	Nit. 901.712.744-5 Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS C.C. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.
VALOR INICIAL:	$ 1.344.325.137,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1:	$ 134.432.513,70
VALOR ACTA PARCIAL No. 2:	$ 262.865.027,40
VALOR ACTA PARCIAL No. 3:	$ 419.835.310,32
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	MAYO 17 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	OCTUBRE 17 DE 2023
INTERVENTORIA:	TORIBIO ANDRADE YEJAS CC. No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlán.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA ACTA PARCIAL No.3:	SEPTIEMBRE 4 DE 2023

POLIZA UNICA No. 85-44-101121673 (Anexo 0) Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 85-40-101055849 (Anexo 0) Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	15/05/2023	15/02/2024	$ 134.432.513,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2023	15/10/2026	$ 268.865.027,40
Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$ 403.297.541,10
Responsabilidad civil	15/05/2023	15/10/2023	$ 232.000.000,00

5.1. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el presente periodo

Durante en el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2023 y 04 de septiembre de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades (ver acta de recibo parcial No. 3):

En la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Armado de acero de refuerzo para pasadores y bordillos. Fundida de pavimento en concreto hidráulico, MR=38 mpa para el carril derecho desde el PR0+180 hasta el PR0+200.



En la semana del 7 al 13 de agosto de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Fundida de pavimento en concreto hidráulico, MR=38 mpa para el carril derecho desde el PR0+160 al PR0+180 y desde el PR0+200 hasta el PR0+280. Así mismo se fundieron 50ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PR0+010 hasta el PR0+060.



En la semana del 14 al 20 de agosto de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Fundida de pavimento en concreto hidráulico, MR=38 mpa para el carril derecho desde el PR0+180 al PR0+370 y el carril izquierdo desde el PR0+180 hasta el PR0+230. Así mismo se fundieron 187ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PR0+060 hasta el PR0+150 lado derecho y el lado izquierdo desde el PR0+010 hasta el PR0+150.





En la semana del 21 al 27 de agosto de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Fundida de andenes para el carril derecho desde el PR0+160al PR0+180 y desde el PR0+200 hasta el PR0+280. Así mismo se fundieron 111,52ml de bordillo en concreto reforzado de 3000 psi desde el PR0+010 hasta el PR0+060.





En la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Fundida de concreto en el carril izquierdo desde el PR0+220 hasta el PR0+300 y el carril derecho desde el PR0+370 hasta el PR0+400. Así mismo se fundieron 488,5ml de bordillos de margen derecho y margen izquierdo hasta el PR0+220, y los andenes desde el PR0+020 hasta el PR0+230.





5.2. Estado de avance y acciones a seguir

Durante este periodo las obras se encuentran en un porcentaje de avance de un **61,23%** las cuales fueron realizadas de acuerdo de las especificaciones técnicas del INVIAS, los materiales pétreos y de cantera fueron adquiridos en la cantera CONSORCIO ÁRIDOS DE GUATAPURÍ, identificada con Nit. 890.922.447-4, ubicada en el municipio de EL Copey, Cesar, que cuenta con todos los permisos y requisitos legales los cuales se adjuntaron en el informe parcial de obra No. 1, la evidencia de las licencias ambientales, titulo minero, requisitos legales del proveedor de materiales pétreos, indicado en el documento PGIO y plan de calidad de la obra.

De acuerdo con las especificaciones técnicas y previa solicitud de la interventoría se realizaron la toma de muestra para proctor y CBR y densidades de la subrasante, afirmado y subbase y ensayo de la máquina de los ángeles las cuales se adjuntan al presente informe.

INVERSIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14	20-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	12,7126%	$ 167.079.284,93	$ 139.626.957,17	84,0861%	$ 1.105.132.026,71	49,1369%	$645.799.714,05
15	Sem 15	27-ago-23	$ 28.606.240,88	2,1766%	2,3950%	$ 31.477.144,30	$ 2.870.903,42	86,2627%	$ 1.133.738.267,60	51,5319%	$677.276.858,35
16	Sem 16	3-sep-23	$ 41.010.412,32	3,1204%	15,3850%	$ 202.203.383,71	$ 161.192.971,40	89,3830%	$ 1.174.748.679,91	66,9170%	$879.480.242,06
17	Sem 17		$ 33.139.439,49								
18	Sem 18		$ 34.773.304,32								
19	Sem 19		$ 42.014.261,14								
20	Sem 20		$ 29.610.089,70								
			$ 1.314.285.774,56					**89,3830%**	**$ 1.174.748.679,91**	**66,9170%**	**$ 879.480.242,06**

La información consignada en esta tabla se tomó del flujo de caja presentado por el contratista a corte de 3 de septiembre de 2023. (Sobre el costo directo de la obra).

6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

La interventoría es ejercida por el ingeniero TORIBIO ANTONIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico, a través del contrato de interventoría cuyo objeto es la: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA".

6.2. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

El **CONSORCIO PAV- LOMA DEL BALSAMO**, teniendo en cuenta el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA y Plan de Manejo de Transito - PMT, implementó dichos programas durante el periodo, cuyos formatos se adjuntan al presente informe.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo del 9 de julio de 2023 y 4 de septiembre de 2023, el avance de la obra es del 61,23% incluido el avance del PMT y PAGA presentando un desfase del 22.46% menos respecto a lo programado, debido a la fuerte ola invernal que azota esta zona del departamento del Magdalena, el consorcio pretende ejecutar en el menor tiempo posible este proyecto, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas y calidad de la obra, teniendo en cuenta que se ha acentuado la ola invernal, nos hemos propuesto darle cumplimiento a un plan de acción para lograr un mayor avance sin desmejorar la calidad de la obra.



CRISTIAN CUENTAS MANOTAS
Rep. Legal CONSORCIO PAV-LOMA DEL BALSAMO

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO

I.N.V. E-414
ASTM C 78, AASHTO T 97 I.N.V. E-415, ASTM C 293, AASHTO T 177

JP INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S
DIAGONAL 19A # 21-36 BARRIO LOS CACIQUES, VALLEDUPAR
TELEFONO 5872155 - CELULAR 300 810 17 92

SOLICITANTE: CONSORCIO PAV-LOMA DEL BALSAMO

DIRECCIÓN SOLICITANTE:

OBRA Y LOCALIZACION: MEJORAMIENTO LA VIA TRONCAL DEL CARIBE-POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

PROCEDENCIA GRUESO:

PROCEDENCIA FINO:

CEMENTO UTILIZADO:

OBSERVACIONES: NORMA UTILIZADA INV - E 414

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ASENTAMIENTO	LECTURA MAQUINA	DISTANCIA ENTRE APOYOS	EJE MENOR DE LA VIGA	ALTURA DE LA VIGA	MÓDULO DE ROTURA	MÓDULO DE ROTURA
				(días)		(kN)	(mm)	(mm)	(mm)	(MPa)	(kg/cm²)
1			26/07/2023		I.N.V. E-414	**20,18**	465,0	150,0	151,0	**2,74**	**28,0**
2			26/07/2023		I.N.V. E-414	**19,67**	465,0	150,0	150,0	**2,71**	**27,6**

1. Los informes de laboratorio sin firmas originales del GERENTE o LABORATORISTA y sello del Laboratorios ("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen validez.
2. Los resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
4. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados.

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
Nit. 900891487-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JOSÉ E. PALENCIA MORALES
GERENTE

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO

I.N.V. E-414
ASTM C 78, AASHTO T 97 I.N.V. E-415, ASTM C 293, AASHTO T 177

JP INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S
DIAGONAL 19A # 21-36 BARRIO LOS CACIQUES, VALLEDUPAR
TELEFONO 5872155 - CELULAR 300 810 17 92

SOLICITANTE: CONSORCIO PAV-LOMA DEL BALSAMO

DIRECCIÓN SOLICITANTE:

OBRA Y LOCALIZACION: MEJORAMIENTO LA VIA TRONCAL DEL CARIBE-POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

PROCEDENCIA GRUESO:

PROCEDENCIA FINO:

CEMENTO UTILIZADO:

OBSERVACIONES: NORMA UTILIZADA INV - E 414

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ASENTAMIENTO	LECTURA MAQUINA	DISTANCIA ENTRE APOYOS	EJE MENOR DE LA VIGA	ALTURA DE LA VIGA	MÓDULO DE ROTURA	MÓDULO DE ROTURA
				(días)		(kN)	(mm)	(mm)	(mm)	(MPa)	(kg/cm²)
1			2/08/2023		I.N.V. E-414	**22,75**	465,0	150,0	151,0	**3,09**	**31,5**
2			2/08/2023		I.N.V. E-414	**25,25**	465,0	150,0	150,0	**3,48**	**35,5**

1. Los informes de laboratorio sin firmas originales del GERENTE o LABORATORISTA y sello del Laboratorios ("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen validez.
2. Los resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
4. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados.

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
Nit. 900891487-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JOSÉ E. PALENCIA MORALES
GERENTE

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO

I.N.V. E-414
ASTM C 78, AASHTO T 97 I.N.V. E-415, ASTM C 293, AASHTO T 177

JP INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S
DIAGONAL 19A # 21-36 BARRIO LOS CACIQUES, VALLEDUPAR
TELEFONO 5872155 - CELULAR 300 810 17 92

SOLICITANTE: CONSORCIO PAV-LOMA DEL BALSAMO

DIRECCIÓN SOLICITANTE:

OBRA Y LOCALIZACION: MEJORAMIENTO LA VIA TRONCAL DEL CARIBE-POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

PROCEDENCIA GRUESO:

PROCEDENCIA FINO:

CEMENTO UTILIZADO:

OBSERVACIONES: NORMA UTILIZADA INV - E 414

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ASENTAMIENTO	LECTURA MAQUINA	DISTANCIA ENTRE APOYOS	EJE MENOR DE LA VIGA	ALTURA DE LA VIGA	MÓDULO DE ROTURA	MÓDULO DE ROTURA
				(días)		(kN)	(mm)	(mm)	(mm)	(MPa)	(kg/cm²)
1	PLACA PAVIMENTO	17/07/2023	9/08/2023	23	I.N.V. E-414	**30,15**	465,0	150,0	150,0	**4,15**	**42,4**
2	PLACA PAVIMENTO	17/07/2023	9/08/2023	23	I.N.V. E-414	**29,05**	465,0	150,0	150,0	**4,00**	**40,8**

1. Los informes de laboratorio sin firmas originales del GERENTE o LABORATORISTA y sello del Laboratorios ("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen validez.
2. Los resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
4. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados.

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
Nit. 900891487-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JOSÉ E. PALENCIA MORALES
GERENTE

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
			2021		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**	
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**	
CÓDIGO EXPEDIENTE	141-20 con Licencia Ambiental No. 211 del 24 Febrero 2011			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	INVERSIONES SIRTORI&SOSSA S.A.S, GEOMICIVIL S.A.S Y MIDAS S.A.S			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	900740862-1, 90761033-2 Y 900170600-2			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CESAR			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	EL COPEY, CESAR			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				
UNIDAD DE MEDIDA	M3			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR				CONSUMIDOR		
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM							
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
			2021		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**	
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**	
CÓDIGO EXPEDIENTE	141-20 con Licencia Ambiental No. 211 del 24 Febrero 2011			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	INVERSIONES SIRTORI&SOSSA S.A.S, GEOMICIVIL S.A.S Y MIDAS S.A.S			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	900740862-1, 90761033-2 Y 900170600-2			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CESAR			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	EL COPEY, CESAR			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				
UNIDAD DE MEDIDA	M3			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR				CONSUMIDOR		
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM							
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
			2021		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**	
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**	
CÓDIGO EXPEDIENTE	141-20 con Licencia Ambiental No. 211 del 24 Febrero 2011			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	INVERSIONES SIRTORI&SOSSA S.A.S, GEOMICIVIL S.A.S Y MIDAS S.A.S			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	900740862-1, 90761033-2 Y 900170600-2			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CESAR			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	EL COPEY, CESAR			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				
UNIDAD DE MEDIDA	M3			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR				CONSUMIDOR		
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM							
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	
			2021		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**	
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**	
CÓDIGO EXPEDIENTE	141-20 con Licencia Ambiental No. 211 del 24 Febrero 2011			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	INVERSIONES SIRTORI&SOSSA S.A.S, GEOMICIVIL S.A.S Y MIDAS S.A.S			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	900740862-1, 90761033-2 Y 900170600-2			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CESAR			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	EL COPEY, CESAR			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				
UNIDAD DE MEDIDA	M3			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR				CONSUMIDOR		
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM							
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

Nit. 901.712.744-5

ALCALDÍA DE ALGARROBO

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	%	VARIACIÓN	ACTA MODIFICATIVA No. 2		%	MES No.1				MES No.2				MES No.3				MES No.4				MES No.5			
										CANT +/-	CANT + /-	Vr. PARCIAL		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1		PRELIMINARES																														
1,1	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19	0,40%	339,42	4094,37	$ 5.716.559,39	0,43%				0,1087%	0,1087%	0,1087%	0,1087%														
1,2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	$ 105.586,00	$ 96.055.385,30	7,31%	81,47	991,21	$ 104.657.793,47	7,96%						2,6544%	2,6544%	2,6544%													
Subtotal								$ 101.298.046,49				$ 110.374.352,87																				
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS																														
2,1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20	3,86%	197,51	2170,84	$ 55.877.498,82	4,25%	1,0629%	1,0629%	1,0629%	1,0629%																	
2,2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	90,41	$ 119.458,30	$ 10.800.463,82	0,82%	-10,14	80,27	$ 9.589.395,57	0,73%																			0,3648%	0,3648%
Subtotal								$ 61.593.978,02				$ 65.466.894,39																				
3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																														
3,1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,69	$ 89.297.485,26	6,79%	93,63	663,77	$ 103.962.014,21	7,91%								3,9551%	3,9551%												
3,2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99	49,51%	63,03	634,34	$ 722.501.141,57	54,97%									10,9946%	10,9946%	10,9946%	10,9946%								
3,3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50	2,92%	2141,70	6443,57	$ 57.512.363,73	4,38%									1,0940%	1,0940%	1,0940%	1,0940%								
Subtotal								$ 778.407.696,75				$ 883.975.519,51																				
4		OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES																														
4,1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,12	$ 115.540,10	$ 106.680.485,13	8,12%	27,08	950,40	$ 109.809.311,04	8,36%													2,089%	2,089%	2,089%	2,089%				
4,2	630.4	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M.	m2	768,50	$ 96.956,69	$ 74.511.341,01	5,67%	39,34	807,84	$ 78.325.419,74	5,96%																	1,490%	1,490%	1,490%	1,490%
4,3	671,1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE DE ANCHO	M3	30,00	$ 1.013.412,70	$ 30.402.380,97	2,31%	18,96	48,96	$ 49.616.685,74	3,78%																0,944%	0,944%	0,944%	0,944%	
Subtotal								$ 211.594.207,12				$ 237.751.416,53																				
5		SEÑALIZACION																														
5,1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30	0,55%		13,00	$ 7.200.344,30	0,55%																			0,274%	0,274%
Subtotal								$ 7.200.344,30				$ 7.200.344,30																				
6		BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA																														
6,1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX CULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78	5,44%	-60,73	3,13	$ 3.507.368,18	0,27%																				
6,2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX CULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20	4,80%	-6936,84	124,17	$ 1.108.284,30	0,08%																				
6,3	6.3P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mt 1m (platina de 2½/2" x ¼" con angulos de 2½/2" x ¼")	UND	4,00	$ 4.901.594,48	$ 19.606.377,91	1,49%	-3,00	1,00	$ 4.901.594,48	0,37%																				
Subtotal								$ 154.191.501,88				$ 9.517.246,96																				
								COSTO DIRECTO				$ 1.314.285.774,56	100,00%																				
								SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 1.314.285.774,56																					
								PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)				$ 14.831.606,00																					
								PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES)				$ 15.207.756,44																					
								VALOR TOTAL				$ 1.344.325.137,00																					

DESCRIPCION	
ADMINISTRACION	A=
IMPREVISTO	I=
UTILIDAD	U=
TOTAL A.I.U	A.I.U.=

													PORCENTAJE SEMANAL (%)	1,0629%	1,0629%	1,1716%	1,1716%	0,1087%	2,7631%	6,6094%	17,6040%	12,0886%	12,0886%	12,0886%	12,0886%	2,0888%	2,0888%	2,1766%	3,1204%	2,5215%	2,6458%	3,1967%	2,2529%
													VALOR SEMANAL	$ 13.969.374,71	$ 13.969.374,71	$ 15.398.514,55	$ 15.398.514,55	$ 1.429.139,85	$ 36.315.071,01	$ 86.866.938,26	$ 231.367.166,58	$ 158.878.319,25	$ 158.878.319,25	$ 158.878.319,25	$ 158.878.319,25	$ 27.452.327,76	$ 27.452.327,76	$ 28.606.240,88	$ 41.010.412,32	$ 33.139.439,49	$ 34.773.304,32	$ 42.014.261,14	$ 29.610.089,70
													PROCENTAJE ACUMULADO (%)	1,0629%	2,1257%	3,2974%	4,4690%	4,5777%	7,3408%	13,9503%	31,5543%	43,6429%	55,7314%	67,8200%	79,9086%	81,9973%	84,0861%	86,2626%	89,3830%	91,9045%	94,5503%	97,7%	100,0%
													VALOR ACUMULADO	$ 13.969.374,71	$ 27.938.749,41	$ 43.337.263,96	$ 58.735.778,52	$ 60.164.918,37	$ 96.479.989,37	$ 183.346.927,63	$ 414.714.094,21	$ 573.592.413,46	$ 732.470.732,70	$ 891.349.051,95	$ 1.050.227.371,19	$ 1.077.679.698,95	$ 1.105.132.026,71	$ 1.133.738.267,60	$ 1.174.748.679,91	$ 1.207.888.119,41	$ 1.242.661.423,72	$ 1.284.675.684,86	$ 1.314.285.774,56

Cristian Cuentas M.

CRISTIAN CUENTAS MANOTAS
C.C. 8.695.306 de Sabanalarga. Atlán.
Rep. Legal. CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO

BALANCE FINANCIERO A AGOSTO DE 2023.

CONTRATO ESPECIFICO No 2221186

En cumplimiento del contrato especifico 2221186 celebrado entre el Municipio de Algarrobo Magdalena y ENTerritorio que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA", dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos del Fondo Regional de Contratos Plan, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del proyecto; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del Contrato Específico, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Contrato Específico citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

1. **Generalidades del Contrato Especifico:** Relacionar los datos básicos o aspectos principales del Contrato Específico:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA				
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor efectivo**	**Valor total Aporte**	**%Aporte**
ENTERRITORIO			$ 1.470.889.286,35	100%
TOTAL			$ 1.470.889.286,35	

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de Algarrobo Magdalena, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 160123-04 del día 16, del mes Enero del año 2023, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 2023.CEN.01.000039 y 2023.CEN.01.000040, que soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LP-MALG-001-2023 Y CMA-MALG-002-2023, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detallle	**Número**	**Fecha de expedición**	**Valor CDP**	**Valor RP**	**Saldo**
Obra					
CDP	2023.CEN.01.000039	16/01/2023	$ 1.371.768.236,35		$ 0,00
RP	2023.CEN.01.000386	05/05/2023		$ 1.344.325.137,00	$ 27.443.099,35
Interventoría					
CDP	2023.CEN.01.000040	16/01/2023	$ 99.121.050,00		$ 0,00
RP	2023.CEN.01.000308	02/05/2023		$ 99.121.050,00	$ 0,00
Total			**1.470.889.286,35**	**$ 1.443.446.187,0**	**1.470.889.286,35**

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No XX - XX)

En caso de haber adiciones en valor al contrato específico, se hace necesario que se detalle el valor adicional, objeto o motivación del adicional y los soportes presupuestales de mismo. Realizar un cuadro adicional con la información del Otrosí.

2. Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se aperturó una cuenta No 326386711 Corriente en el banco de Bogotá denominada: "CONTRATO ESPECÍFICO N° 2221186 MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA", de fecha 22 del mes Junio del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	$221.013.286,08	$221.013.286,08	16/03/2023	$0
	Transferencia 2				
	Transferencia 3				
	Transferencia 4				
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		**$221.013.286,08**	$221.013.286,08		**$0**

Se anexan extracto de la de Cuenta corriente No.326386711, del mes de junio de 2023, donde se resaltan los aportes de las entidades.

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes marzo del año 2023 hasta el mes mayo del año 2023, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco de Bogotá, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de Algarrobo a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Marzo 2023	$ 24.224,00	$ 24.224,00
Abril 2023	$ 45.420,00	$ 45.420,00
Mayo 2023	$ 46.934,00	$ 46.934,00
Junio 2023	$ 45.420,00	$ 46.934,00
Julio 2023	$ 41.523,00	$ 40.009,00
Agosto 2023	$ 11.892,00	$ 11.892,00
Total	$ 215.413,00	$ 215.413,00

(Anexar la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o una general que señale todos los meses, y soporte del Traslado de los mismos a la cuenta del tesoro.(Folios No 02)

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	N° 150523-001		
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.		
Valor	$ 1.344.325.137	Cuenta o encargo Fiduciario	XXXXX
Valor Anticipo	$	Valor Girado	$
Porcentaje	%	Fecha de Giro	XX/XX/XXXXX
Detalle Orden	**Valor Orden**	**Fecha**	**Saldo Anticipo**
Total			
Rendimientos Financieros del Anticipo			
Periodo	**Valor Rendimientos**	**Valores Transferidos**	
feb-23	N/A		
Marzo-23	N/A		
Abril-23	N/A		
Total			

Adjuntar el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**Mar-2023**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$ 0,0
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	$221.013.286,08
	OTROS	$ 5.000
	RENDIMIENTOS TOTALES	$ 215.413,00
	RENDIMIENTOS ACUMULADO S	
	TOTAL INGRESOS	**$ 221.233.699,08**
22EGRESOS	OBRA	$ 112.788.887,70
	INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS	
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 215.413,00
	DESCUENTOS	$ 21.648.626,00
	RTE FUENTE	
	OTROS	$ 16.898,00
	TOTAL EGRESOS	**$ 134.669.824,70**
	SALDO FINAL MES AGOSTO 2023	**$ 86.563.874,38**

Se adjunta el extracto correspondiente al mes de agosto de 2023.

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar las fechas de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

3. **Balance General de la Contratación Derivada**

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de Obra

Objeto del Contrato Derivado:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.				
Número Contrato	N° 150523-001	**Valor:**	$ 1.344.325.137	**Plazo:**	CINCO (05) Meses
Nombre del Contratista	**CONSORCIO PAV ALGARROBO – LOMA DEL BALSAMO**				
Fecha de firma del contrato	15/05/2023	**Fecha de acta de inicio**	17/05/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	16/10/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1	$ 134.432.513,70	$ 21.643.626,00	$ 112.788.887,70		2023.CEN.01.000 744	25/07/2023
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL	**$ 134.432.513,70**	**$ 21.643.626,00**	**$ 112.788.887,70**			
Saldo Contrato	**$ 1.209.892.623.30**					

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	$ 134.432.513,70	$ 134.432.513,70	$ 112.788.887,70	$ 21.643.626,00	16,10%	0		$ 21.643.626,00
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								

Acta Parcial No 4								
TOTAL	**$ 134.432.513,70**	**$ 134.432.513,70**						

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato de Interventoria

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".					
Número Contrato	020523-001	**Valor:**	$ 99.120.563		**Plazo:**	CINCO (05) MESES
Nombre del Contratista	**ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO**					
Fecha de firma del contrato	02/05/2023	**Fecha de acta de inicio**		17/05/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	16/10/2023
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**Amortización Anticipo**	**No. Comprobante de egreso**	**Fecha de pago**
Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

4. Balance Financiero Contrato Específico

La entidad ENTerritorio, solo ha realizado un (01) desembolso, con el cual se pagó acta parcial N° 01 al contrato de Obra a nombre de CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, cuyo valor fue de $ 134.432.513,70. Los valores por concepto de deducciones a la fecha de este informe no han sido trasladados a las cuentas del Municipio.

Se han generado cinco meses en rendimientos financieros correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2023, los cuales se han enviado al Tesoro Nacional en su totalidad por valor acumulado de $ 215.413,00

Se firma el presente informe financiero, a los 05 días del mes de septiembre de 2023.

KELLY PEREZ AMARIS
SECRETARÍA DE HACIENDA
secretariafinanciera@algarrobo-magdalena.gov.co
perezkelly237@gmail.com

LILIBETH DE LA ROSA MENDOZA
CONTADORA PÚBLICA
Lilibeth.delarosa@hotmail.com

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023090408CC7025620318

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



347 1-2

MUNICIPIO DE ALGARROBO- MEJORAMIENTO DE
SECTOR PLAZA PRINCIPAL NO. 8 - 44 - CENT
CENTRO
ALGARROBO ,MAGDALENA
Entrega: UR Oficina: 2044 Gerencia Oficial 9 - Santa Marta
347

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2023**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 326386711
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0326
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**108,260,958.38**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-21,695,735.00
Total IVA:	-1,349.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	11,892.00
Saldo Final:	**86,575,766.38**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/08	GT26	Cargo IVA	ST.MARTA	G. Oficial Red 2		-1,349.00	108,259,609.38
10/08	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	ST.MARTA	G. Oficial Red 2		-7,100.00	108,252,509.38
10/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001006	-40,009.00	108,212,500.38
10/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	ST.MARTA	G. Oficial Red 2	0000000	-21,648,626.00	86,563,874.38
31/08	0678	Interes remuneracion especial	ST.MARTA	G. Oficial Red 2	0000000	11,892.00	86,575,766.38
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos Días Anteriores

Empresa: **MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8190032190**

Generado por: **KELLY YOHANA PEREZ AMARIS**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC6711	*****6711

Fecha
Ago 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/08/31	Interes remuneracion especial	0000000000	$0,00	$11.892,00
2023/08/10	Cargo IVA	0000000000	$1.349,00	$0,00
2023/08/10	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	0000000000	$7.100,00	$0,00
2023/08/10	Pago por Internet Corporativo	0000001006	$40.009,00	$0,00
2023/08/10	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$21.648.626,00	$0,00

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 733202

martes, 05 de septiembre de 2023, 9:27:35 AM

Detalle

$11,892.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******6711
Descripción:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha y hora inicio transacción	2023-09-05 9:26:15
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	45210
Código Único de Seguimiento	142005240
Dirección IP:	186.1.170.42
Referencia 1:	186.1.170.42
Referencia 2:	8190032190
Referencia 3:	
