CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2221186 DE 2023
INFORME No. 1 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".			
PARTICIPANTES	ENTerritorio MUNICIPIO DE ALGARROBO – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.			
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE ALGARROBO			
VALOR APORTES	ENTerritorio			$1.470.889.286,35
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO			$1.470.889.286,35
ADICIÓN:	NINGUNA			
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico.			
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/12/2022			
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA Secretario de Planeación e Infraestructura			
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	N/A			
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/02/2023			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A			
FECHA SUSPENSIONES	N/A	**FECHA REINICIOS**		N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/11/2023	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO**		28/11/2023
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$1.470.889.286,35	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**		$ 99.120.563,00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	10%	**Avance Financiero del periodo (%)**		30%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	100%	**Avance Financiero Acumulado (%)**		60%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4 No. 320 47 994000025132	22/02/2023	CUMPLIMIENTO	$147,088,928.64	(22/02/2023)	(22/06/2024)

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	02/08/2023	13/03/2023	$ 221.013.286,08
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	06/09/2023	22/09/2023	$ 221.013.286,08
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	15/09/2023	28/09/2023	$ 440.886.892,78
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$ 882.913.434,94

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero/2023	**$ 24.224,00**	**$ 24.224,00**
Marzo/2023	**$ 45.420,00**	**$ 45.420,00**
Mayo/2023	**$ 46.934,00**	**$ 46.934,00**
Junio/2023	**$ 45.420,00**	**$ 46.934,00**
Julio/2023	**$41.523,00**	**$40.009,00**
Agosto/2023	**$11.892,00**	**$11.892,00**
Septiembre/2023	**$22.439,00**	**$22.439,00**
Octubre/2023	**$27.681,00**	**$27.681,00**
TOTAL	**$265.533,00**	**$265.533,00**

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de Interventoría No. 020523-001 de 2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA	**($ 99.120.563,00)**

	DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA				
Nombre contratista	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 expedida en Barranquilla				
Fecha Firma del contrato	02/05/2023				
Plazo contrato	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha del acta de inicio del contrato	17/05/2023				
NOVEDADES	N/A				
Fecha Inicial Terminación Contrato	17/10/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		17/10/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	60%	60,22%	$59.692.220,70	2023.CEN.01.001018	02/10/2023
SEGUNDO PAGO	40%	39,78%	$39.428.342,3		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 59.692.220,70**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**60,22%**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 320 47 994000025782	03/05/2023	Cumplimiento del contrato	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(03/02/2024)
	03/05/2023	Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(05/10/2026)
	03/05/2023	Calidad del Servicio	$9.912.056,30	(03/05/2023)	(03/10/2023)
ESTADO DEL CONTRATO		**FINALIZADO**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*Se presenta informe de interventoría del periodo 01 de agosto al 31 de agosto. El cual presenta el desarrollo de las siguientes actividades:* ***ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:*** • *Se verificaron las hojas de vida de los trabajadores, se verificó el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato de interventoría y de obra, se verifico el cumplimiento del siso y de las medidas de bioseguridad, se le solicitaron los informes al contratista.* ***ACTIVIDADES TÉCNICAS***	(01/10/2023)	(16/10/2023)

	• *Se estudio las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y en general de toda la información referente al proyecto, se presentaron las observaciones y recomendaciones que consideraron pertinentes.* ***ACTIVIDADES FINANCIERAS*** • *Se revisó y estableció el presupuesto de obra del diseño aprobado con cierre financiero, ya que el presupuesto que arrojó el diseño tiene un mayor valor que el presupuesto oficial destinado para las obras, diferencia que fue aportada por el municipio.* ***ACTIVIDADES AMBIENTALES*** • *Se revisó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, indicando que se deben realizar unos ajustes al documento para que cumpla con los requerimientos del proyecto*		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
Contrato de Obra N°150523-001 de 2023	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA".			**($1.344.325.137)**	
Nombre contratista	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificado con NIT. 901.712.744-5 representado legalmente por Cristian Cuentas Manotas identificado con cedula de ciudadanía 8.649.306 expedida en Sabanalarga				
Fecha Firma del contrato	15/05/2023				
Plazo contrato	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha del acta de inicio del contrato	17 /05/2023				
NOVEDADES	NO APLICA				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16/10/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		16/10/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	N/A				
PRIMER PAGO	10%	10%	$ 134.432.513,70	2023.CEN.01.000701	25/07/2023
SEGUNDO PAGO	30%	20%	$262.865.027,40	2023.CEN.01.001009	22/09/2023
TERCER PAGO	61,23%	31,23%	$419.835.310,32	2023.CEN.01.000386	02/10/2023
CUARTO PAGO	75%	13,77%	$ 185.111.001,33		
QUINTO PAGO	90%	15%	$ 201.648.770,55		
SEXTO PAGO	100%	10%	$ 134.432.513,70		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 817.132.851,42**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**100%**		

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 85-44-101121673	17/05/2023	Cumplimiento del contrato	$134.432.513,70	(15/05/2023)	(15/02/2024)
	17/05/2023	Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$268.865.027,40	(15/05/2023)	(15/10/2026)
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101055849	17/05/2023	Estabilidad y calidad de la Obra	$403.297.541,10	(15/10/2023)	(15/10/2028)
	17/05/2023	Responsabilidad civil extracontractual (Amparos básicos predios laborales y operacionales)	$232.000.000,00	(15/05/2023)	(15/10/2023)
% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO			**4,75%**		
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO			**100%**		
% AVANCE PROGRAMADO			**100%**		
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

➢ **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR**

En el proceso de ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA en el periodo del 01 de octubre al 16 de octubre desde la supervisión designada se ha realizado seguimiento y control a la ejecución total de la obra garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos, los plazos y se mantenga la calidad de la construcción.

A los diez (10) días del mes de agosto de 2023 se suscribe Acta de modificación No. 002 que contiene cambios en referencia a menores y mayores cantidades de obra, con el propósito de cumplir con el objeto contractual. y brindar las garantías de estabilidad a lo largo del todo el tramo de construcción del pavimento tal como se evidencia en l acta adjunta en los anexos.

El supervisor de obra verificó que las actividades finales se realicen acorde con los estudios, diseños, especificaciones y normas técnicas aprobados para la ejecución del proyecto, además de garantizar que se sigan las medidas de seguridad y se cumpla el presupuesto establecido.

En virtud de los compromisos adquiridos en la reunión de visita y el comité operativo de seguimiento se realiza el cumplimiento de cada uno de ellos.

➢ CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

El contrato de Obra No 150523-001 del 15 de mayo de 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE –POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO -MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA" inició el día 17 de Mayo de 2023 una vez reunido los requisitos de perfeccionamiento y el cumplimiento de las garantías exigidas en el contrato de Obra.

Durante el periodo de tiempo que se informa, el contratista finalizó la ejecución de las actividades con un avance de obra equivalente al 4,75% del costo directo de la obra, para un porcentaje ejecutado acumulado de 100%.
Durante el periodo de tiempo del 01 de Octubre al 16 de Octubre de 2023, el contratista alcanzó un avance de obra equivalente al 10% del valor total del contrato, para un porcentaje ejecutado acumulado de 100%. Por parte de la interventoría se realizaron todas acciones pertinentes para lograr conseguir a satisfacción de las obras culminadas en el 100% de sus actividades.

Se suscribe el día 16 de Octubre de 2023 Acta Final al Contrato de Interventoría No. 020523-001 de 2023
por un porcentaje de avance del 100%.

CONTRATISTA	ACTA FINAL
TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía 72.135.609 expedida en Barranquilla	A los tres (03) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron por parte de la Interventoría TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía 72.135.609 expedida en Barranquilla, Atlántico. y por parte de la Entidad el Secretario de Planeación e Infraestructura DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA en calidad de Supervisor del Contrato N° 020523-001 con el fin de recibir a satisfacción las actividades parciales ejecutadas dentro del marco del Contrato en referencia con fecha de corte 3 de Septiembre de 2023.

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M	E VALOR MES (A * B * C * D)	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)	ACTA PARCIAL No.001 CANTIDAD EJECUTADA MES (1)	CANTIDAD EJECUTADA MES (2)	CANTIDAD EJECUTADA MES (3)	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	TOTAL PARCIAL	ACTA FINAL CANTIDAD EJECUTADA MES (4)	CANTIDAD EJECUTADA MES (5)	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	TOTAL PARCIAL
1	PERSONAL																
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN																
1.1.1	Director de Interventoria	$ 3.000.000,00	1	25%	235,00%	1.762.500,00	5,0	8.812.500,00	1,0	1,0	1,0	3,0	$ 5.287.500,00	1,0	1,0	2,0	$ 3.525.000,00
1.1.2	Ingeniero civil Residentes de de Interventoria	$ 2.700.000,00	1	100%	235,00%	6.345.000,00	5,0	31.725.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	$ 19.035.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 12.690.000,00
1.1.3	Ingeniero ambiental	$ 2.000.000,00	1	25%	235,00%	1.175.000,00	5,0	5.875.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	$ 3.525.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 2.350.000,00
1.1.3	Secretaria	$ 1.000.000,00	1	50%	235,00%	1.175.000,00	5,0	5.875.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	$ 3.525.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 2.350.000,00
1.2	PERSONAL DE APOYO																
1.2.1	topografo	$ 1.750.000,00	1	50%	235,00%	2.056.250,00	5,0	10.281.250,00	1,0	1,0	1,0	3,0	$ 6.168.750,00	1,0	1,0	2,0	$ 4.112.500,00
1.2.2	Cadenero	$ 1.200.000,00	1	50%	235,00%	1.410.000,00	5,0	7.050.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	$ 4.230.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 2.820.000,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	69.618.750,00					$ 41.771.250,00				$ 27.847.500,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS																
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	mes	Dedicacion	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL									
2.1.1	Papeleria y copias incluye papel y tinta de ploter	mes	1	5,0	100%	$ 111.000,00		555.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	333.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 222.000,00
2.1.2	Arriendo de Oficina (Incluye Servicios Publicos, servicio de oficina, dotacion de oficina)	mes	1	5,0	100%	$ 600.000,00		3.000.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	1.800.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 1.200.000,00
2.1.4	Equipo topografico	mes	1	5,0	100%	$ 450.000,00		2.250.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	1.350.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 900.000,00
2.1.6	Ensayos de Calidad	un	1	5	100%	$ 500.000,00		2.500.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	1.500.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 1.000.000,00
2.1.7	Gastos de desplazamiento del grupo de interventoria	mes	1	5,0	50%	$ 1.500.000,00		3.750.000,00	1,0	1,0	1,0	3,0	2.250.000,00	1,0	1,0	2,0	$ 3.000.000,00
							SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	12.055.000,00					$ 7.233.000,00				$ 6.322.000,00
	RESUMEN GENERAL																
							COSTO DIRECTO SIN IVA TOTAL (1 + 2)	81.673.750,00					$ 49.004.250,00				$ 34.169.500,00
	COSTO QUE NO SON AFECTADOS POR IVA																
3.3	Impuestos Municipales			8,00%				1.928.800,00					$ 1.157.280,00				$ 1.036.439,24
3.3.1	Estampilla Pro - Hospital (Troconis)			2,00%													
3.3.2	Estampilla Prouniversidad (UNIMAG)			2,00%													
3.3.3	Estampilla Procultura			1,00%													
3.3.4	Estampilla Adulto Mayor			1,00%													
3.3.5	Retencion en la fuente sobre contrato de obra interventoria			2,00%													
							SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	1.928.800,00					$ 1.157.280,00				$ 1.036.439,24
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO							83.602.550,00					$ 50.161.530,00				$ 35.205.939,24
	IVA (19%)							15.518.012,50					9.520.690,70				$ 4.222.403,06
	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA							99.120.563,00					$ 59.692.220,70				$ 39.428.342,30

Valor Total de la Obra	$	99.120.563,00
Acta Parcial No.001 (Mes de Junio, Julio y Agosto)	$	59.692.220,70 60,22%
Acta Final (Mes Septiembre y Octubre)	$	39.428.342,30 39,78%
Valor por ejecutar	$	-

➢ CONTRATO DE OBRA.

• Avance de la meta establecida en el contrato especifico.

Durante el periodo final del 01 de octubre de 2023 al 16 de octubre de 2023, el avance de ejecución en el periodo de la obra es del 10%; presentando un avance acumulado ejecutado del 100%.

• Actividades desarrolladas en el periodo del informe:
Donde se ejecutaron las siguientes actividades finales

- La semana veintiuno realizando la fundida de 144ml de bordillos, y los andenes desde el PT0+380 hasta el PT0+440 tanto en margen derecho como en margen izquierdo.
- Se realizó la fundida, se ejecutó la figuración de acero y la fundida de 2 registros. Así mismo se realizó la instalación de las rejillas metálicas para los registros, ultimando detalles como reparación de placas, andenes y bordillos y limpieza general de la vía.

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.
Resumen de las cantidades de obras realizadas en el mes de agosto comprendido desde el día 01 de octubre de 2023 con corte al 16 de Octubre de 2023

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT + /-
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	23,58
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	144,28
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	343,34
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	48,96
SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACION	UND	13,00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS		
CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS	M3	3,13
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS	KG	34,63

Resumen de las cantidades totales de obras realizadas acumuladas desde el día 17 de mayo de 2023 con corte al 16 de Octubre de 2023.

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT + /-
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4094,37
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	991,21
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	2170,84
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	80,27
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	663,77
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	634,34
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	6781,18
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	950,40
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	807,84
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	48,96
SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACION	UND	13,00
CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX COULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	0,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX COULVERT	KG	0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	0,00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS		
CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS	M3	3,13
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS	KG	124,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 1mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	2,00

• REGISTROS FOTOGRÁFICOS













- **Actualización del programa de ejecución del proyecto.**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT: 901.712.744-3

CRONOGRAMA DE A

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	%	VARIACION ACTA MODIFICATIVA No. 2 CANT +/-	CANT +/-	Vr. PARCIAL	%	MES No. 2 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES No. 3 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2
1		PRELIMINARES																					
1.1	310.1	310		DEMOLICIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19	0,40%	339,42	4094,37	$ 5.716.559,39	0,43%			0,1087%	0,1087%	0,1087%	0,1087%						
1.2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	$ 105.586,00	$ 96.055.385,30	7,31%	81,47	991,21	$ 104.657.793,47	7,96%						2,6544%	2,6544%	2,6544%				
Subtotal								$ 101.298.046,49				$ 110.374.352,87											
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS																					
2.1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20	3,86%	197,51	2170,84	$ 55.877.498,82	4,25%	1,0629%	1,0629%	1,0629%	1,0629%						
2.2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	90,41	$ 119.458,30	$ 10.800.463,82	0,82%	-10,14	80,27	$ 9.589.395,57	0,73%										
Subtotal								$ 61.593.978,02				$ 65.466.894,39											
3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																					
3.1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,69	$ 89.297.485,26	6,79%	93,63	663,77	$ 103.962.014,21	7,91%							3,9551%	3,9551%				
3.2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99	49,51%	61,03	634,34	$ 722.501.141,57	54,97%								10,9946%	10,9946%	10,9946%		
3.3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50	2,92%	2141,70	6443,57	$ 57.512.363,73	4,38%									1,0940%	1,0940%		
Subtotal								$ 778.407.696,75				$ 883.975.519,51											
4		OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES																					
4.1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,32	$ 115.540,10	$ 106.680.485,13	8,12%	27,08	950,40	$ 109.809.311,04	8,36%												
4.2	630.4	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	768,50	$ 96.956,60	$ 74.511.341,01	5,67%	39,34	807,84	$ 78.325.419,74	5,96%												
4.3	671.1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	30,00	$ 1.013.412,70	$ 30.402.380,97	2,31%	18,96	48,96	$ 49.616.685,74	3,78%												
Subtotal								$ 211.594.207,12				$ 237.751.416,53											
5		SEÑALIZACION																					
5.1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30	0,55%		13,00	$ 7.200.344,30	0,55%												
Subtotal								$ 7.200.344,30				$ 7.200.344,30											
6		BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA																					
6.1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX CULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78	5,44%	-60,73	3,13	$ 3.507.368,18	0,27%												
6.2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA PARA BOX CULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20	4,80%	-6936,84	124,17	$ 1.108.284,30	0,08%												
6.3	6.3P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4")	UND	400	$ 4.901.594,48	$ 19.606.377,91	1,49%	-3,00	1,00	$ 4.901.594,48	0,37%												
Subtotal								$ 154.231.501,98				$ 9.517.246,96											
								COSTO DIRECTO	$ 1.314.285.774,36	100,00%		$ 1.314.285.774,36	100,00%											
								SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 1.314.285.774,36			$ 1.314.285.774,36												
								PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PMA)	$ 14.811.608,00			$ 14.811.608,00												
								PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (3 MESES)	$ 15.207.730,84			$ 15.207.730,84												
								VALOR TOTAL	$ 1.344.305.137,20			$ 1.344.305.137,20												

DESCRIPCION	
ADMINISTRACIÓN	A=
IMPREVISTO	I=
UTILIDAD	U=
TOTAL A.I.U	A.I.U.=

PORCENTAJE SEMANAL (%)	1,0629%	1,0629%	1,1716%	1,1716%	0,1087%	2,7631%	6,6094%	17,6540%	12,2886%	12,2886%	1,0940%	1,0940%	1,0940%	1,0940%
VALOR SEMANAL	$ 13.969.374,71	$ 13.969.374,71	$ 15.398.514,55	$ 15.398.514,55	$ 1.429.139,85	$ 36.315.071,01	$ 86.866.938,26	$ 231.967.166,58	$ 158.878.319,25	$ 158.878.319,25	$ 14.376.792,72	$ 14.376.792,72	$ 14.376.792,72	$ 14.376.792,72
PROCENTAJE ACUMULADO (%)	1,0629%	2,1257%	3,2973%	4,4690%	4,5777%	7,3408%	13,9501%	31,5041%	43,7928%	56,0814%	57,1754%	58,2694%	59,3634%	60,4574%
VALOR ACUMULADO	$ 13.969.374,71	$ 27.938.749,41	$ 43.337.263,96	$ 58.735.778,52	$ 60.164.918,37	$ 96.479.989,37	$ 183.346.927,63	$ 414.714.094,21	$ 573.592.413,46	$ 732.470.732,71	$ 746.847.525,43	$ 761.224.318,15	$ 775.601.110,87	$ 789.977.903,59

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Durante el periodo final comprendido del 01 de Octubre de 2023 al 16 de Octubre de 2023, el informe muestra la ejecución al periodo de un 10% con un acumulado del 100%% de las actividades del contrato No.150523-001. Por su parte la interventoría trabajó en simultaneo garantizando el óptimo cumplimiento del debido proceso, dando cumplimientos a las especificaciones técnicas y de calidad de la obra.

- **RELACIÓN DE ANEXOS**

1. Extracto Bancario de la cuenta del contrato específico (al corte mensual más reciente), certificación bancaria que señale los rendimientos generados durante el mes del reporte.
2. Soporte de traslado de los rendimientos financieros a la Dirección General de Crédito Público
3. Informe de interventoría firmado que soporta el reporte del periodo con todos sus anexos.
8. Demás documentos que soporten la información reportada.

- **SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
SUPERVISOR

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

- Anexo 1: Informe Interventoría del periodo del 01 de octubre de 2023 al 16 de octubre de 2023
- Anexo 2: Informe Semanal
- Anexo 3: Bitácora
- Anexo 4: Acta parcial No. 6
- Anexo 5: Memoria de cantidades
- Anexo 6: Informe Contratista de Obra
- Anexo 7: Informe financiero

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE ALGARROBO
ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATISTA: TORIBIO ANDRADE YEJAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA

INFORME DE INTERVENTORIA No 6

01 DE OCTUBRE – 16 DE OCTUBRE DE 2023

INTRODUCCIÓN

El Señor **TORIBIO ANDRADE YEJAS**, en usos de sus facultades desarrolla la Interventoría Administrativa y Técnica del proyecto, **MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA**, para que cumpla con los estándares actuales de calidad de obra en los procesos de construcción de vías urbanas, para optimizar las vías y permita disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito, bien sea peatonal o vehicular que a diario circulan por las calles y carreras del casco urbano del municipio de Algarrobo.

OBJETIVO

El objeto del proyecto es: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA,** el cual se le adjudico a la firma TORIBIO ANDRADE YEJAS, mediante contrato de obra pública número **020523-001** de fecha Diecisiete (17) de mayo de 2023.

El presente informe contiene generalidades del desarrollo del contrato de obra y de interventoría.

1.1 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 150523-001

CONTRATISTA	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
REPRESENTANTE LEGAL	Cristian Cuentas Manotas identificado con cedula de ciudadanía 8.649.306 expedida en Sabanalarga
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA**
VALOR DEL CONTRATO	($1.344.325.137) INCLUIDO AIU
CONTRATO NUMERO:	150523-001
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	16 DE OCTUBRE DE 2023

POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, No 85-44-101121673 SEGUROS DEL ESTADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA "No. 150523-001 de fecha diecisiete (17) de mayo de 2023"

TOMADOR/ GARANTIZADO	CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
ASEGURADO Y BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ALGARROBO – ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 819.003.219-0

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	115,890	$134.432.513,70	15	05	2023	15	02	2024
Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	231,780	$268.865.027,40	15	05	2023	15	10	2026
Estabilidad y calidad de la Obra	347,670	$403.297.541,10	15	10	2023	15	10	2028

POLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, No 85-40-101055849 SEGUROS DEL ESTADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA "No. 150523-001 de fecha diecisiete (17) de mayo de 2023"

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad civil extracontractual (Amparos básicos predios laborales y operacionales)	200,000	$232,000,000.00	15	05	2023	15	10	2023

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 020523-001

CONTRATISTA	TORIBIO ANDRADE YEJAS
REPRESENTANTE LEGAL	TORIBIO ANDRADE YEJAS con CC 72.135.609 B/quilla
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.120.563,00
VALOR ADICION AL CONTRATO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (5) MESES.
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO de 2023
ADICION EN PLAZO	N/A
FECHA DE FINALIZACION	16 DE OCTUBRE DE 2023

1.2.1 ASPECTOS JURIDICOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTOIA "No. 320 47 994000025782 de fecha Tres (03) de Mayo de 2023. **Póliza Numero 320 47 994000025782, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

TOMADOR/ GARANTIZADO	TORIBIO ANDRADE YEJAS, CC 72.135.609
ASEGURADO Y BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ALGARROBO – ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 819.003.219-0

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	COBERTURA SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

Cumplimiento del contrato	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	03	02	2024
Pago de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	05	10	2026
Calidad del Servicio	8,545	$9.912.056,30	03	05	2023	03	10	2023

1.3 REVISIÓN TECNICA

SITUACIÓN:

Se realizará el mejoramiento de la vía terciaria localizado en el tramo K0+000 a K0+460,42 entre la Troncal del Caribe – Poblado Loma del Bálsamo en el Municipio de Algarrobo con la intervención de 0,46042 Kilómetros con pavimento en concreto rígido con espesor de 20 cm y MR 38 soportado sobre una Sub-Base Granular de 20 cm. Con una calzada de 6.0 m y esta a su vez compuestas por dos carriles cada uno de 3.0 m de ancho, Con un Bordillo de altura de servicios de 45 cm y 15 cm de ancho y anden de 0,85 m de ancho, además de obras de drenaje como Cunetas en concreto reforzado de 0,8m de ancho localizadas desde las abscisas K0+380 hasta la abscisa K0+460,42, con su señalización vial vertical.

1.4 ACTA MODIFICATORIA No.001

A los Diez (10) días del mes de Agosto de 2023, se reunieron el señor CRISTIAN CUENTAS MANOTAS representante legal del contratista, el señor TORIBIO ANDRADE YEJAS en calidad de interventor y el señor DEIBI RAFAEL GÓMEZ DE LA ROSA, Secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de supervisor. con el fin de aprobar la presente acta de modificación que contiene cambios en referencia a creación de ítems no previstos y menores y mayores cantidades de obra del contrato en referencia, de acuerdo con el cuadro de cantidades adjunto y que hace parte integral de la misma.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

ACTA MODIFICATIVA No. 1

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5

CONTRATISTA	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO Nit. 901.712.744-5 Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS C.C. 8.689.306 de Sabanalarga, Atlántico.	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 1.344.325.137,00
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALGARROBO– MAGDALENA	VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL N° 1	$ -
INTERVENTOR	TORIBIO ANDRADE YEJAS CC. No. 72.135.609 de Barranquilla	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.344.325.137,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 134.432.513,70
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA	VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 260.709.048,39
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.344.325.137,00	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	29%
VALOR ANTICIPO (0 %)	0	SALDO POR EJECUTAR	$ 949.123.574,91
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N°2	$ 260.709.048,39
FECHA DE INICIO	MAYO 17 DE 2023	Menos Amortización de Anticipo (0%)	$ -
FECHA TERMINACIÓN	OCTUBRE 17 DE 2023	VALOR TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL N° 2	$ 260.709.048,39
FECHA PRESENTE ACTA	AGOSTO 18 DE 2023		

								CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		VARIACIÓN		PRE-ACTA MODIFICATIVA No. 1	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT + /-	Vr. PARCIAL	CANT + /-	Vr. PARCIAL
1		PRELIMINARES															
1,1	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.756,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19		302.931,8	$ 4.229.533,79	725,63	$ 1.013.127,40	3.39,62	$ 473.898,20	4094,37	$ 5.716.559,39
1,2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	105.586,00	$ 96.055.385,30		909,74	96.055.807,68		$ -	81,47	$ 8.601.985,83	991,21	$ 104.657.793,47
							Subtotal	$ 101.298.046,49			$ 100.285.341,43		$ 1.013.127,40		$ 9.075.884,04		$ 110.374.352,87
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2,1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20		1.326,62	$ 34.147.172,27	646,71	$ 16.646.341,93	1.97,51	$ 5.083.984,62	2170,84	$ 55.877.498,82
2,2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	910,61	$ 11.945.830,00	$ 10.880.463,82			$ -		$ -	-10,16	$ 121.068,25	80,27	$ 9.589.395,57
							Subtotal	$ 61.593.978,02			$ 34.147.172,27		$ 16.646.341,93		$ 5.872.916,37		$ 65.466.894,39
3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO															
3,1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,68700,0	$ 89.297.485,26			$ -	570,14	$ 89.297.485,26	93,63	$ 14.664.538,95	663,77	$ 103.962.024,21
3,2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR – 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99			$ -	133,99	$ 152.616.125,00	63,03	$ 71.787.461,58	634,34	$ 722.501.141,57
3,3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50			$ -	134	$ 1.195.986,81	2479,31	$ 22.129.194,64	6781,18	$ 60.525.725,95
							Subtotal	$ 778.407.696,75			$ -		$ 243.109.579,06		$ 108.581.194,97		$ 886.989.891,73
4		OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES															
4,1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,32	$ 115.540,10	$ 106.680.495,13			$ -		$ -	27,08	$ 3.128.825,91	950,40	$ 109.809.311,04
4,2	630.6	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	768,50	$ 96.956,60	$ 74.511.341,01			$ -		$ -	39,34	$ 3.814.078,73	807,84	$ 78.325.419,74
4,3	671,1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	300,00	$ 101.341.270,00	$ 30.402.380,97			$ -		$ -	18,96	$ 1.921.403.477	481,96	$ 49.616.685,74
							Subtotal	$ 211.594.207,12			$ -		$ -		$ 26.157.209,41		$ 237.751.416,53
5		SEÑALIZACION															
5,1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30			$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 7.200.344,30
							Subtotal	$ 7.200.344,30			$ -		$ -		$ -		$ 7.200.344,30
6		BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA															
6,1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 2 IMPA PARA BOX COULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78			$ -		$ -	-63,86	$ 71.561.796,78	0,00	$ -
6,2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX COULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20			$ -		$ -	-7.061,01	$ 63.023.327,20	0,00	$ -
6,3	6.3.P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2 y1/2" x 1/4" con angulos de 2 y1/2" x 1/4").	UND	4,00	$ 4.901.596,88	$ 19.606.377,91			$ -		$ -	-4,00	$ 19.606.377,91	0,00	$ -
							Subtotal	$ 154.191.501,88			$ -		$ -		$ 154.191.501,88		$ -
				ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS													
NP-01	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 2 IMPA PARA CANAL DE REJILLAS	M3	0,00	$ 1.120.564,92	$ -						3,13	$ 3.501.765,36	3,13	$ 3.501.765,36
NP-02	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS	KG	0,00	$ 8.925,54	$ -						124,17	$ 1.108.256,55	124,17	$ 1.108.256,55
NP-03	6.3.P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 1mX 1m (platina de 2 y1/2" x 1/4" con angulos de 2 y1/2" x 1/4").	UND	0,00	$ 946.932,42	$ -						2,00	$ 1.893.864,83	2,00	$ 1.893.864,83
							Sub total										$ 6.503.884,74
							COSTO DIRECTO	$ 1.314.285.774,56			$ 134.432.513,70		$ 260.709.048,39				$ 1.314.285.774,56
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 1.314.285.774,56			$ 134.432.513,70		$ 260.709.048,39				$ 1.314.285.774,56
							PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 14.831.600,00									$ 14.831.600,00
							PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES)	$ 15.207.756,44									$ 15.207.756,44
							VALOR TOTAL	$ 1.344.325.137,00			$ 134.432.513,70		$ 260.709.048,39				$ 1.344.325.137,00

DESCRIPCION		
ADMINISTRACIÓN	A=	23%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista inicio labores el 17 de Mayo del 2023, sin Anticipo puesto que el contrato no contempla el pago de Anticipo, el contratista continuó en la semana veintiuno realizando la fundida de 144ml de bordillos, y los andenes desde el PT0+380 hasta el PT0+440 tanto en margen derecho como en margen izquierdo, En la semana veintidós se realizó la fundida, se ejecutó la figuración de acero y la fundida de 2 registros. Así mismo se realizó la instalación de las rejillas metálicas para los registros, ultimando detalles como reparación de placas, andenes y bordillos y limpieza general de la vía.

ACTAS DE OBRAS.

- El contratista presentó Acta Parcial No.006, radicada el 13 de Octubre con corte 01 de Octubre - 13 de Octubre, avance de obra por valor de **$ 134.432.513,70** con un porcentaje de avance final del **10%** del valor total del contrato, consiguiendo un porcentaje acumulado ejecutado del **100%**.

A continuación, se relacionan las tablas resumen de los procesos financieros objeto de este contrato y sus adicionales de obra:

1	VALOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de Mayo de 2023	$ 1.344.325.137,00
3	VALOR ANTICIPO (%) DEL CONTRATO INICIAL		$ 0
4	ACTA PARCIAL Nº 001	4 de Junio de 2023	$ 134.432.513,70
5	ACTA PARCIAL Nº 002	30 de Julio de 2023	$ 262.865.027,40
6	ACTA PARCIAL Nº 003	31 de Agosto de 2023	$ 419.835.310,32
7	ACTA PARCIAL Nº 004	14 de Septiembre de 2023	$ 185.111.001,33
8	ACTA PARCIAL Nº 005	30 de Septiembre de 2023	$ 201.648.770,55
9	ACTA PARCIAL Nº 006	13 de Octubre de 2023	$ 134.432.513,70
10	VR. TOTAL, EJECUTADO	13 de Octubre de 2023	$ 1.344.325.137,00
11	VR. POR EJECUTAR		$ 0

3. INCONVENIENTES.

Durante la finalización de las actividades finales, se presentaron dificultad con las lluvias persistentes en la zona.

La interventoría, quien además de exigir al Contratista el cumplimiento de lo pactado en el contrato, participo de manera proactiva en los cambios y decisiones, en busca del equilibrio de inversión, economía y buenas obras.

4. AVANCE DEL CONTRATO 150523-001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA

CATEGORIA INVERSIÓN: OBRA FISICA

EL AVANCE DEL PROYECTO ES DE $1.314.285.774,56 con un porcentaje de avance de ejecución del 4,75% del costo directo de la obra, para un porcentaje acumulado de 100%

5. AVANCE DEL CONTRATO 020523-001

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA.

CATEGORIA INVERSIÓN: OBRA FISICA

EL AVANCE DEL PROYECTO ES DE $ 99.120.563,00 con un porcentaje de avance de ejecución del 100%

A continuación, se relacionan las tablas resumen de los procesos financieros objeto de este contrato y sus adicionales de obra:

1	VALOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 de Mayo de 2023	$ 99.120.563,00
3	VALOR ANTICIPO (%) DEL CONTRATO INICIAL		$ 0
4	ACTA PARCIAL Nº 001	03 de Septiembre de 2023	$ 59.692.220,70

5	ACATA FINAL	16 de Octubre de 2023	$ 39.428.342,30
6	VR. TOTAL, EJECUTADO	16 de Octubre de 2023	$ 99.120.563,00
7	VR. POR EJECUTAR		$ 0

5.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Dentro de las actividades, para el continuo desarrollo de la topografía se encuentran debidamente calibrados los siguientes equipos:

- GPS topcon hider Vred Gnss.
- Estacion total topcon CTS-255 con precision angular.
- Nivel.
- Equipo Densidad de campo (Cono de arena).

Dentro de la maquinaria de trabajo utilizados en esta etapa del proyecto tenemos:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retro Excavadora – Oruga.	2
Cortadoras de acero (tronzadoras).	1
Compactador tipo rana	1

5.2. INFORMES SEMANALES

Se describen a continuación los avances semanales a corte del 04 de Septiembre de 2023 al 01 de Octubre de 2023 obtenidos en la ejecución del contrato de Obra No. 150523-001 (Porcentajes calculados con el costo directo de la obra)

Columna1	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1-S16		89,38%		66,92%	
S17	2,52%	91,90%	7,42%	74,34%	-4,90%
S18	2,65%	94,55%	7,14%	81,48%	-4,49%
S19	3,20%	97,75%	11,97%	93,45%	-8,77%

S20	2,25%	100,00%	1,80%	95,25%	0,45%
S21		100,00%	4,55%	99,80%	-4,55%
S22		100,00%	0,49%	100%	0,00%

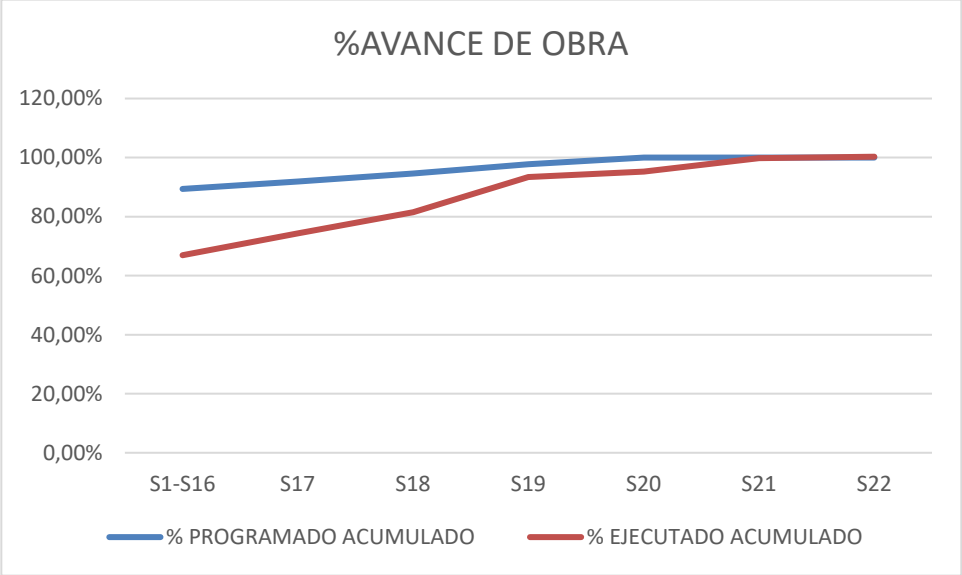

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los aspectos o condiciones a resaltar, presentadas del periodo del 01 de Octubre hasta el 16 de Octubre del 2023 de ejecución, donde el contratista ha finalizado las actividades:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT + /-
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	23,58
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	144,28
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	343,34
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	48,96
SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACION	UND	13,00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS		
CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS	M3	3,13
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS	KG	34,63

Cantidades finales ejecutadas hasta el 16 de octubre

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT + /-
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4094,37
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	991,21
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	2170,84
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	80,27
SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	663,77
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	634,34
ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	6781,18
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	950,40
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	807,84
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	48,96
SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACION	UND	13,00
CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX COULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	0,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX COULVERT	KG	0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	0,00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS		
CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS	M3	3,13
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS	KG	124,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 1mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	2,00

Cantidades ejecutadas acumuladas

6. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de tiempo que se informa, el contratista finalizó la ejecución de las actividades con un avance de obra equivalente al 4,75% del costo directo de la obra, para un porcentaje ejecutado acumulado de 100%.
- Durante el periodo de tiempo del 01 de Octubre al 16 de Octubre de 2023, el contratista alcanzó un avance de obra equivalente al 10% del valor total del contrato, para un porcentaje ejecutado acumulado de 100%. Por parte de la interventoría se realizaron todas acciones pertinentes para lograr conseguir a satisfacción de las obras culminadas en el 100% de sus actividades.



TORIBIO ANDRADE YEJAS
INTERVENTOR

- **ANEXOS FOTOGRAFICOS**































PARE

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato **INFORME SEMANAL 21**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	125 dias		

Semana Número: 21 Del: 2/10/2023 Al: 8/10/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 132 días

Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,5632%	99,4%
Valor de la Obra programada:	$ 7.402.522,43	$ 1.306.883.252,14

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,5545%	99,80%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 59.859.414,01	$ 1.311.598.251,11

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	99%	95,2410%	3,9913%
Durante el periodo	0,5632%	4,5545%	
Acumulado actual	99%	99,80%	

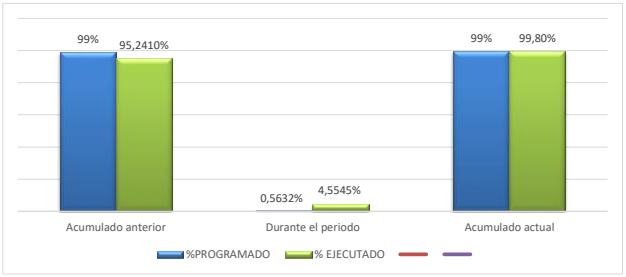

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana 21 se realizó la fundida de 144ml de bordillos, y los andenes desde el PT0+380 hasta el PT0+440 tanto en margen derecho como en margen izquierdo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

Para la semana 22 se realizara la fundida de los 2 registros que recolectan las aguas de las cunetas y las encamina al descole de boxcoulvert existente.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 4,5525% con respecto a lo programado de 0,5632% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 99,8%, presentandose un porcentaje de 3,9913% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALESSA TURIZO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14	20-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	12,7126%	$ 167.079.284,93	$ 139.626.957,17	84,0861%	$ 1.105.132.026,71	49,1369%	$645.799.714,05
15	Sem 15	27-ago-23	$ 28.606.240,88	2,1766%	2,3950%	$ 31.477.144,30	$ 2.870.903,42	86,2627%	$ 1.133.738.267,60	51,5319%	$677.276.858,35
16	Sem 16	3-sep-23	$ 41.010.412,32	3,1204%	15,3850%	$ 202.203.383,71	$ 161.192.971,40	89,3830%	$ 1.174.748.679,91	66,9170%	$879.480.242,06
17	Sem 17	10-sep-23	$ 33.139.439,49	2,5215%	7,4195%	$ 97.512.945,08	$ 64.373.505,59	91,9045%	$ 1.207.888.119,41	74,3364%	$976.993.187,14
18	Sem 18	17-sep-23	$ 34.773.304,32	2,6458%	7,1389%	$ 93.825.659,20	$ 59.052.354,88	94,5503%	$ 1.242.661.423,72	81,4753%	$1.070.818.846,35
19	Sem 19	24-sep-23	$ 42.014.261,14	3,1967%	11,9665%	$ 157.274.517,09	$ 115.260.255,95	97,7471%	$ 1.284.675.684,86	93,4419%	$1.228.093.363,43
20	Sem 20	1-oct-23	$ 14.805.044,85	1,1265%	1,7991%	$ 23.645.473,67	$ 8.840.428,82	98,9%	$ 1.299.480.729,71	95,2410%	$1.251.738.837,10
21	Sem 21	8-oct-23	$ 7.402.522,43	0,5632%	4,5545%	$ 59.859.414,01	$ 52.456.891,58	99,4%	$ 1.306.883.252,14	99,7955%	$1.311.598.251,11
			$ 1.314.285.774,56					**99,44%**	**$ 1.306.883.252,14**	**100%**	**$ 1.311.598.251,11**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO NIT. 901.712.744-5	Formato **INFORME SEMANAL 22**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PAV-LA LOMA	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA
Contrato No.	No.150523-001 DE 2023		
Valor Inicial:	$ 1.344.325.137,00		
Valor costo directo:	$ 1.314.285.774,56		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Plazo acumulado anterior informe	132 dias		

Semana Número: 22 Del: 9/10/2023 Al: 15/10/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 139 días

Nombre del Interventor TORIBIO ANDRADE YEJAS


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,5632%	100,0%
Valor de la Obra programada:	$ 7.402.522,42	$ 1.314.285.774,56

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,4854%	100%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.378.959,79	$ 1.314.285.774,56

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	99%	99,7955%	-0,0779%
Durante el periodo	0,5632%	0,4854%	
Acumulado actual	100%	100%	

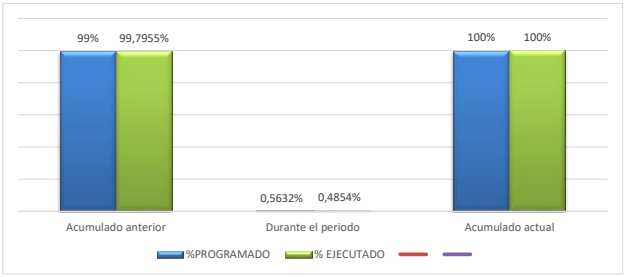

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana 22 se realizó la fundida se realizo la figuración de acero y la fundida de 2 registros. Asi mismo se realizo la instalación de las rejillas metalicas para los registros

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante esta semana se obtuvo un porcentaje de avance de 0,4854% con respecto a lo programado de 0,5632% y un porcentaje de avance total acumulado ejecutado de 100%, presentandose un porcentaje de 0,0779% más respécto a lo programado de obra en la semana.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra

Nombre: MARIEL YANCE OROZCO
cc. 1.004.308.058 de Ariguani
Residente de Obra

Residente de interventoría

Nombre: JALESSA TURIZO
Residente de interventoría

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	**SEMANA**	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14	20-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	12,7126%	$ 167.079.284,93	$ 139.626.957,17	84,0861%	$ 1.105.132.026,71	49,1369%	$645.799.714,05
15	Sem 15	27-ago-23	$ 28.606.240,88	2,1766%	2,3950%	$ 31.477.144,30	$ 2.870.903,42	86,2627%	$ 1.133.738.267,59	51,5319%	$677.276.858,35
16	Sem 16	3-sep-23	$ 41.010.412,32	3,1204%	15,3850%	$ 202.203.383,71	$ 161.192.971,40	89,3830%	$ 1.174.748.679,91	66,9170%	$879.480.242,06
17	Sem 17	10-sep-23	$ 33.139.439,49	2,5215%	7,4195%	$ 97.512.945,08	$ 64.373.505,59	91,9045%	$ 1.207.888.119,40	74,3364%	$976.993.187,14
18	Sem 18	17-sep-23	$ 34.773.304,32	2,6458%	7,1389%	$ 93.825.659,20	$ 59.052.354,88	94,5503%	$ 1.242.661.423,72	81,4753%	$1.070.818.846,35
19	Sem 19	24-sep-23	$ 42.014.261,14	3,1967%	11,9665%	$ 157.274.517,09	$ 115.260.255,95	97,7471%	$ 1.284.675.684,86	93,4419%	$1.228.093.363,43
20	Sem 20	1-oct-23	$ 14.805.044,85	1,1265%	1,7991%	$ 23.645.473,67	$ 8.840.428,82	98,9%	$ 1.299.480.729,71	95,2410%	$1.251.738.837,10
21	Sem 21	8-oct-23	$ 7.402.522,43	0,5632%	4,5545%	$ 59.859.414,01	$ 52.456.891,58	99,4%	$ 1.306.883.252,14	99,7955%	$1.311.598.251,11
22	Sem 22	15-oct-23	$ 7.402.522,42	0,5632%	0,4854%	$ 6.378.959,79	-$ 1.023.562,63	100%	$ 1.314.285.774,56	100%	$1.314.285.774,56
			$ 1.314.285.774,56					**100,00%**	**$ 1.314.285.774,56**	**100%**	**$ 1.314.285.774,56**

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 16/04/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CNA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
156523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.396.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ingeniero Residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida de 50ml de Bordillos y 30m² de andenes

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Volqueta Compactador Rana	2am 12am	SI		Seco - Soleado	X
				Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo permita los frentes de trabajo

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Version: 01	Fecha: 7/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.608 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Tecnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

No se labora en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Planta mezcla	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Tanque	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no otra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 18/04/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.155.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.648.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Compactación y colocación de formaletas para fundida de cortinas

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Trompo	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Bana compacta	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no otra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble y cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 14/04/2023	Consecutivo:	Pagina:	de:

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO AMORADE YEJAS, identificado con C.C. 72.139.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, Identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.396.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida la cuneta margen derecho. Fundida de 30 ml de bordillo.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado EM	Operativo SINO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Para compactar	Bien	SI		Sera - Soleado X	
Dumper	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble y cuando el estado del tiempo paralice las labores de trabajo.

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 20/09/2023	Consecutivo:	Pagina:	de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.645.316.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Compactación y colocación de formaletas para fundida de cabezotes

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Ranacompacta	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar dentro y cuando el estado del tiempo permita los frentes de trabajo.

Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 21/04/2023	Consecutivo:	Página: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.649.305.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ingeniero residente	Manuel Yance Ovalle		

Actividades Ejecutadas

Fundida de cunetas margen derecho. Fundida de Bordillos y 15M² de anden

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado BM	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Dama compacta	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo permita los frentes de trabajo

Manuel Yance Ovalle

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 22/09/2023	Consecutivo:	Página: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CIVA-MALG-003-2023	TORIBIO AMORADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.648.316.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Compactación de pam 20 m/l de bordillo y fundida de concreto Ende-

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Pana compactu	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Yance Ortiz
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 23/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Dilan Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida de cunetas mayor derecho asi mismo Fundida de bordillos y Anden del lado cunetas.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Plana compacta	Buen	SI		Seco - Soleado	X
Rompe	Buen	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble y cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Dilan Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 24/09/2023	Consecutivo:	Página:	de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MC-S-003-2023	TORRES ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.133.608 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
1800231001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.848.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Abad Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

No se labora en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retro Compacta	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Camioneta	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo.

Abad Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 25/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Adam Yance Cuevas		

Actividades Ejecutadas

Compactacion y armada de formaletas para muertos Lado izq-

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Para compactar	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Formaleta	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no otra afectada se debe diligenciar la Bitácora diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Adam Yance Cuevas
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA
BITACORA
Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 26/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CAIA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, Identificado con C.C. 72.155.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, Identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, Identificado con cedula de ciudadanía No. 8.647.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Mont Yanes Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida 66 cunetas margen derecho. Fundida de 2cm de Cordillos y anclen.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Para compacta	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:
*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora diariamente
*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice las frentes de trabajo

Mont Yanes Ortiz
Ing. Residente - Obra

Ing. Residente - Interventoria

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 27/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.643.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Abel Yane Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Compactación Fin, Armado y Armado de Formaletas, Para Fundida de Viga de Formaletas Para Bordillos

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Ranacompacta Tromp	Bien	SI		Seco - Soleado X	
	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no otra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Abel Yane Ortiz
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 28/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Mi residente	Manuel Yamil Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de cunetas margen derecho. Fundida de Bordillo margen derecho

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones
Mini compactador	Bien	SI	
Dumper	Bien	SI	

Estado del Tiempo	No. Horas
Seco - Soleado X	
Nublado	
Lluvias Moderadas	
Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no otra efectuada se debe diligenciar la Bitácora diariamente

*Anotar dobie x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yamil Orozco

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 29/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.155.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Aland Yance Correa		

Actividades Ejecutadas

Comprobación y armado de formaletas para fundida de viga - tipo muro de ala derecha.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retroexcavadora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo.

Aland Yance Correa

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 30/09/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yesus Ovalles		

Actividades Ejecutadas

Fundida de cuneta margen derecho. Fundida de andenes de cuneta margen izquierda

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Para Compactar	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Tiempo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los participantes no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yesus Ovalles

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 7/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.009 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Mand Yance Ornes		

Actividades Ejecutadas

NO se labor en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Herramienta menor	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Trapo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Mand Yance Ornes
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 2/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.155.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.647.386.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Ovalle		

Actividades Ejecutadas

Excavación de andenes margen derecho desde PK0+400. Excavación de cunetas margen izquierdo

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Ranas compactadoras	Buen	SI		Seco - Soleado X	
Bomba	Buen	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ovalle

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 3/10/2023	Consecutivo:	Pagina:	de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.648.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Ovares		

Actividades Ejecutadas

Fresado de bordillos y andenes margen derecho desde el PT 0+000

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Para compactar	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Rompe	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no otra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo.

Manuel Yance Ovares

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 4/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CAA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Orozco		

Actividades Ejecutadas

Fundida de bordillos, cunetas y andenes margen derecho
Vía en el PK 0+240

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retroexcavadora	Bien	SI		Sem - Soleado X	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el mismo

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Orozco

Ing. Residente - Interventoría

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 5/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre

Actividades Ejecutadas

Fundida un ppo de 25ml de muro Bordillo desde el PTO 4467 hasta el PTO 4492

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Formaleta	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Tiempo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo permita los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 6/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CVA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, Identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, Identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.647.396.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ingeniero residente	Manuel Yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Fundida de 25 mt de Bordillos desde el PTO 1467 hasta el PTO 1442 margen derecho

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Barra compactadora Dumpo	Mon Bien	SI SI		Seco - Soleado X	
				Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitacora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitacora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 7/10/2023	Consecutivo:	Página: de

Información Contrato de Interventoría

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, Identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.643.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Yeimi Yaneth Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Armada y Fundida de encofrado para protección del Terraplen desde el PI01+467 hasta el PI01+440

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Para Compacto	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Tampo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no otra electrada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble X cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoría

Yeimi Yaneth Ortiz
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 8/08/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.648.346.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Mari Yane Ortiz		

Actividades Ejecutadas

No se laboró en obra

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Runa compacta	Bien	SI		Seco - Soleado	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice las frentes de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Mari Yane Ortiz

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 9/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.155.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Abel Yance Omeo		

Actividades Ejecutadas

Armado y figurado de acero para vigas

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S:NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retrocargador	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Trompo	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya legrado el mismo

*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble X cuando el estado del tiempo paralice las frentes de trabajo

Abel Yance Omeo

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 10/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CIVA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.155.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150621-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.305.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Omeu		

Actividades Ejecutadas

Armado y Figrado de acero para registros, Armado de formaletas y para fundida de registros

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retrocompactador	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Trompo	Bien	SI		Nublado	
Vibrador concreto	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice las frentes de trabajo

Manuel Yance Omeu

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 11/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-VALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.548.316.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Omeo		

Actividades Ejecutadas

Fundida de registro MV, y muro cno, Armado y fundida de formaleta, para fundida de registro MV, y muro izquierdo.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Regla compuesta	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Trompo	Bien	SI		Nublado	
Vibrador manual	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo perdios los treinta días de trabajo

Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Omeo

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 12/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
15523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.548.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. Residente	Manuel Yance Ovalo		

Actividades Ejecutadas

Fundida de Registro Margen izquierdo. Colocación de rejillas de los registros

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo S/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retrocompactador	Bien	SI		Seco - Soleado	X
Rompedor	Bien	SI		Nublado	
Vibrocompactador	Bien	SI		Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre.

*Independiente que haya o no otra efectividad se debe diligenciar la Bitácora, diariamente.

*Anotar doble x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo.

Ing. Residente - Interventoria

Manuel Yance Ovalo
Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 13/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORRIJO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
155623-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Manuel Yance Ovies		

Actividades Ejecutadas

Fundida de vereda para salida de aguas de los regos hacia descole al box coulvert existente

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Retroexcavadora	Bien	SI		Seco - Soleado X	
Compactador	Bien	SI		Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:
*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre
*Independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente
*Anotar dobles x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Manuel Yance Ovies

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

PROCESO INTERVENTORIA

BITACORA

Diario de Inspección, Insumos y Productos

Versión: 01	Fecha: 14/10/2023	Consecutivo:	Pagina: de

Información Contrato de Interventoria

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
CMA-MALG-003-2023	TORIBIO ANDRADE YEJAS, identificado con C.C. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA"

Información Contrato de Obra

Contrato No.	Contratista	Contratante	Objeto del Contrato
150523-001	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, identificada con Nit. 901.712.744-5, representada legalmente por CRISTIAN CUENTAS MANOTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.648.306.	MUNICIPIO DE ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

Personal Profesional y Técnico

Contratista		Interventor	
Cargo	Nombre	Cargo	Nombre
Ing. residente	Mariel yance Ortiz		

Actividades Ejecutadas

Instalación de señalización vertical definitiva. limpieza general de la obra.

Observaciones

Maquinaria y Equipo	Estado B/M	Operativo SI/NO	Observaciones	Estado del Tiempo	No. Horas
Ranchera en tramo	Bien Bien	SI SI		Seco - Soleado	
				Nublado	
				Lluvias Moderadas	
				Lluvias Intensas	

Nota:

*Los compromisos no se retiran de la Bitácora hasta que no se haya logrado el cierre

*Independiente que haya o no obra efectuada se debe diligenciar la Bitácora, diariamente

*Anotar dobles x cuando el estado del tiempo paralice los frentes de trabajo

Mariel Yance Ortiz

Ing. Residente - Interventoria

Ing. Residente - Obra

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No. 150523-001. MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALGARROBO– MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO Nit. 901.712.744-5 Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS C.C. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.
VALOR INICIAL:	$ 1.344.325.137,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1:	$ 134.432.513,70
VALOR ACTA PARCIAL No. 2:	$ 268.865.027,40
VALOR ACTA PARCIAL No. 3:	$ 419.835.310,32
VALOR ACTA PARCIAL No. 4:	$ 185.111.001,33
VALOR ACTA PARCIAL No. 5:	$ 201.648.770,55
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO:	$ 134.432.513,70
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	MAYO 17 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	OCTUBRE 17 DE 2023
INTERVENTORIA:	TORIBIO ANDRADE YEJAS CC. No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	OCTUBRE 13 DE 2023

En el Municipio de Algarrobo, Magdalena, a los trece (13) días del mes de octubre de 2023, se reunieron el ingeniero **DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA**, Secretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato en referencia, el señor **TORIBIO ANDRADE YEJAS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico, interventoría del contrato y el señor **CRISTIAN CUENTAS MANOTAS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico, representante legal del **CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO,** identificado con **Nit. 901.712.744-5,** en su calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir respectivamente cada uno de los nombrados las obras finales objeto del contrato en referencia, dejando constancia de los siguientes hechos:

1. Que el **CONTRATO DE OBRA No. 150523-001**, cuyo objeto es el **MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA,** se ejecutó de acuerdo con el cuadro de cantidades, especificaciones técnicas del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjunto a la presente acta y que hace parte integral de la misma y al siguiente resumen:

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 134.432.513,70**
MENOS AMORITIZACIÓN DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 134.432.513,70**

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 134.432.513,70) ML.

2. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 1.344.325.137,00
Valor Acta de recibo parcial No. 1	$ 134.432.513,70
Valor Acta de recibo parcial No. 2	$ 268.865.027,40
Valor Acta de recibo parcial No. 3	$ 419.835.310,32
Valor Acta de recibo parcial No. 4	$ 185.111.001,33
Valor Acta de recibo parcial No. 5	$ 201.648.770,55
Valor Acta de recibo final y definitivo	$ 134.432.513,70
Valor por ejecutar	**$ 0,00**

3. Que el estado de cuentas del anticipo a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor del anticipo (0%)	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 1	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 2	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 3	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 4	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta Parcial No. 5	$ 0,00
Valor amortizado en el Acta de recibo final y definitivo	$ 0,00
Valor por amortizar	**$ 0,00**

4. Que a la fecha el contrato presenta un avance físico del: **100%**

5. Que mediante la presente acta se hace entrega final de las obras objeto del contrato en referencia.

6. Que las obras finales objeto del contrato fueron recibidas a entera satisfacción por el supervisor del contrato y la interventoria en representación del Municipio de ALGARROBO, MAGDALENA.

7. Que el valor por pagar al contratista en la presente acta de recibo final y definitivo de obra es la suma de **$ 134.432.513,70.**

8. Que el contratista **CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO,** declara estar a paz y salvo con los trabajadores, proveedores y subcontratista que participaron en el desarrollo del contrato.

9. Que el contratista **CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO,** manifiesta estar a paz y salvo con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de todos los trabajadores de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
Secretario de Planeación e Infraestructura
C.C. No. 19.518.350
SUPERVISOR

TORIBIO ANDRADE YEJAS
CC. No. 72.135.609 de Barranquilla
INTERVENTOR

CRISTIAN CUENTAS MANOTAS
CC No. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico
Rep. Legal. CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5
CONTRATISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO

CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO

NIT. 901.712.744-5

CONTRATISTA	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÀMO Nit. 901.712.744-5 Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS C.C. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico.	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 1.344.325.137,00
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALGARROBO– MAGDALENA	VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL N° 1	$ 0,00
INTERVENTOR	TORIBIO ANDRADE YEJAS CC. No. 72.135.609 de Barranquilla	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 1.344.325.137,00**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 134.432.513,70
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.	VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 268.865.027,40
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.344.325.137,00	VALOR ACTA PARCIAL N° 3	$ 419.835.310,32
VALOR ANTICIPO (0%)	$ 0,00	VALOR ACTA PARCIAL N° 4	$ 185.111.001,33
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES	VALOR ACTA PARCIAL N° 5	$ 201.648.770,55
FECHA DE INICIO	MAYO 17 DE 2022	**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO**	$ 134.432.513,70
FECHA TERMINACIÓN	OCTUBRE 17 DE 2022	**PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA**	**100,00%**
FECHA PRESENTE ACTA	OCTUBRE 13 DE 2023	SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
		VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO	$ 134.432.513,70
		Menos Amortización de Anticipo (0%)	$ 0,00
		VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO	**$ 134.432.513,70**

				CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		VARIACIÓN		ACTA MODIFICATIVA No. 1		ACTA PARCIAL N° 3		ACTA PARCIAL N° 4		ACTA PARCIAL N° 5		ACTA DE RECIBO FINAL	
Nº	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO + AIU**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**	**CANT +/-**	**Vr. PARCIAL**	**CANT +/-**	**Vr. PARCIAL**	**CANT +/-**	**Vr. PARCIAL**	**CANT +/-**	**Vr. PARCIAL**	**CANT +/-**	**Vr. PARCIAL**	**CANT +/-**	**Vr. PARCIAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**																					
1		**PRELIMINARES**																						
1,1	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.754,95	$ 1.396,20	$ 5.242.661,19	3029,318	$ 4.229.533,79	725,63	$ 1.013.127,40	339,42	$ 473.898,20	4094,37	$ 5.716.559,39		$ -	185,45	$ 258.925,29	153,97	$ 214.972,91	0,00	$ -
1,2	311.1	311		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	909,74	$ 105.586,00	$ 96.055.385,30	909,74	$ 96.055.807,64		$ -	81,47	$ 8.601.985,83	991,21	$ 104.657.793,47		$ -	55,64	$ 5.874.277,11	25,83	$ 2.727.708,72	0,00	$ (0,00)
							Subtotal	**$ 101.298.046,49**		**$ 100.285.341,43**		**$ 1.013.127,40**		**$ 9.075.884,04**		**$ 110.374.352,87**		**$ -**		**$ 6.133.202,40**		**$ 2.942.681,64**		**$ (0,00)**
2		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																						
2,1	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.973,33	$ 25.740,00	$ 50.793.514,20	1.326,62	$ 34.147.172,27	646,71	$ 16.646.341,93	197,51	$ 5.083.984,62	2170,84	$ 55.877.498,82		$ -	115,34	$ 2.968.915,95	82,17	$ 2.115.068,67	0,00	$ 0,00
2,2	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	m3	90,41	$ 119.458,30	$ 10.800.463,82		$ -		$ -	-10,14	-$ 1.211.068,25	80,27	$ 9.589.395,57	25,00	$ 2.986.457,50	11,22	$ 1.340.322,13	20,47	$ 2.445.228,64	23,58	$ 2.817.387,31
							Subtotal	**$ 61.593.978,02**		**$ 34.147.172,27**		**$ 16.646.341,93**		**$ 3.872.916,37**		**$ 65.466.894,39**		**$ 2.986.457,50**		**$ 4.309.238,08**		**$ 4.560.297,31**		**$ 2.817.387,31**
3		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**																						
3,1	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	570,14	$ 156.622,687000	$ 89.297.485,26		$ -	570,14	$ 89.297.485,26	93,63	$ 14.664.528,95	663,77	$ 103.962.014,21		$ -	35,49	$ 5.558.539,16	58,14	$ 9.105.989,79	0,00	$ -
3,2	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38	m3	571,31	$ 1.138.977,30	$ 650.713.679,99		$ -	133,99	$ 152.616.125,00	500,35	$ 569.885.016,57	634,34	$ 722.501.141,57	280,35	$ 319.312.287,44	115,48	$ 131.529.547,39	104,52	$ 119.043.181,74	0,00	$ -
3,3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO	kg	4.301,87	$ 8.925,54	$ 38.396.531,50		$ -	1041	$ 9.291.947,81	5740,13	$ 51.233.745,52	6781,18	$ 60.525.693,34	1655,14	$ 14.773.033,15	1290,15	$ 11.515.287,10	2794,84	$ 24.945.425,27	0,00	$ -
							Subtotal	**$ 778.407.696,75**		**$ -**		**$ 251.205.558,07**		**$ 635.783.291,05**		**$ 886.988.849,11**		**$ 334.085.320,59**		**$ 148.603.373,65**		**$ 153.094.596,80**		**$ -**

4		**OBRA DE URBANISMO Y DRENAJES**																							
4.1	672.3	672		BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	ml	923,32	$ 115.540,10	$ 106.680.485,13		$ -		$ -	27,08	$ 3.128.825,91	950,40	$ 109.809.311,04	460,00	$ 53.148.446,00	140,00	$ 16.175.614,00	206,12	$ 23.814.682,33	144,28	$ 16.670.568,71
4.2	630.4	672		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M	m2	768,50	$ 96.956,60	$ 74.511.341,01		$ -		$ -	39,34	$ 3.814.078,73	807,84	$ 78.325.419,74	212,50	$ 20.603.277,50	102,00	$ 9.889.573,20	150,00	$ 14.543.490,00	343,34	$ 33.289.079,04
4.3	671,1	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	30,00	$ 1.013.412,70	$ 30.402.380,97		$ -		$ -	18,96	$ 19.214.304,77	48,96	$ 49.616.685,74		$ -		$ -		$ -	48,96	$ 49.616.685,74
							Subtotal	**$ 211.594.207,12**		**$ -**		**$ -**		**$ 26.157.209,41**		**$ 237.751.416,53**		**$ 73.751.723,50**		**$ 26.065.187,20**		**$ 38.358.172,33**		**$ 99.576.333,49**
5		**SEÑALIZACION**																							
5.1	710.1	710		SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	13,00	$ 553.872,64	$ 7.200.344,30		$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 7.200.344,30		$ -		$ -			13,00	$ 7.200.344,30
							Subtotal	**$ 7.200.344,30**		**$ -**		**$ -**		$ -		**$ 7.200.344,30**		**$ -**		**$ -**				**$ 7.200.344,30**
6		**BOX CULVERT Y CAMARA DE CAIDA**																							
6.1	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA BOX COULVERT Y CANAL DE REJILLAS	M3	63,86	$ 1.120.564,92	$ 71.561.796,78		$ -		$ -	-63,86	-$ 71.561.796,78	0,00	$ -				$ -			0,00	$ 0,00
6.2	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA BOX COULVERT	KG	7.061,01	$ 8.925,54	$ 63.023.327,20		$ -		$ -	-7061,01	-$ 63.023.327,20	0,00	$ -				$ -			0,00	$ 0,00
6.3	6.3P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 6mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND	4,00	$ 4.901.594,48	$ 19.606.377,91		$ -		$ -	-4,00	-$ 19.606.377,91	0,00	$ -				$ -			0,00	$ 0,00
							Subtotal	**$ 154.191.501,88**		**$ -**		**$ -**		**-$ 154.191.501,88**		**$ -**		**$ -**		**$ -**				**$ (0,00)**
		ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS																							
NP-01	630.8	6.1		CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS	M3		$ 1.120.564,92						3,13	$ 3.501.798,39	3,13	$ 3.501.798,39							3,13	$ 3.501.798,39
NP-02	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS	KG		$ 8.925,54						124,17	$ 1.108.254,55	124,17	$ 1.108.254,13					$ 89,54	$ 799.157,64	34,63	$ 309.096,49
NP-03	6.3P	6.3	PARTICULAR - ALGARROBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 1mX 1m (platina de 2y1/2" x 1/4" con angulos de 2y1/2" x 1/4").	UND		$ 946.932,42						2,00	$ 1.893.864,83	2,00	$ 1.893.864,83					$ 2,00	$ 1.893.864,83	0,00	$ -
							Subtotal	**$ -**								**$ 6.503.917,35**						**$ 2.693.022,47**		**$ 3.810.894,88**
							COSTO DIRECTO	**$ 1.314.285.774,56**		**$ 134.432.513,70**		**$ 268.865.027,40**				**$ 1.314.285.774,56**		**$ 410.823.501,59**		**$ 185.111.001,33**		**$ 201.648.770,55**		**$ 113.404.959,98**
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 1.314.285.774,56**		**$ 134.432.513,70**		**$ 268.865.027,40**				**$ 1.314.285.774,56**		**$ 410.823.501,59**		**$ 185.111.001,33**		**$ 201.648.770,55**		**$ 113.404.959,98**
							PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	**$ 14.831.606,00**								**$ 14.831.606,00**	30%	**$ 4.449.481,80**		**$ -**		**$ -**		**$ 10.382.124,20**
							PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES)	**$ 15.207.756,44**								**$ 15.207.756,44**	30%	**$ 4.562.326,93**		**$ -**		**$ -**		**$ 10.645.429,51**
							VALOR TOTAL	**$ 1.344.325.137,00**		**$ 134.432.513,70**		**$ 268.865.027,40**				**$ 1.344.325.137,00**		**$ 419.835.310,32**		**$ 185.111.001,33**		**$ 201.648.770,55**		**$ 134.432.513,70**

DESCRIPCION		
ADMINISTRACIÓN	A=	23%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

										$ 134.432.513,70		**$ 268.865.027,40**				**$ 1.344.325.137,00**		**$ 419.835.310,32**		**$ 185.111.001,33**		**$ 201.648.770,55**		**$ 134.432.513,70**

Ing.DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA
Secretario de Planeación e Infraestructura
C.C. No. 19.518.350
SUPERVISOR

TORIBIO ANDRADE YEJAS
CC. No. 72.135.609 de Barranquilla
INTERVENTOR

CRISTIAN CUENTAS MANOTAS
CC No. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico
Rep. Legal. CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO
NIT. 901.712.744-5
CONTRATISTA

Formato de Memorias de Cantidad de Obras

CONTRATO DE OBRA No.150523-001 de 2023	Versión: 6	Fecha: 13/10/2023

OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA	FECHA DE CORTE		13/10/2023
ITEM 2.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)		UND	M3



DESCRIPCION	Localización y/o Abscisa	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES)	PT0+340-PT0+440	0,85	184,7	0,15		23,544

ITEM 4.1	BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI	UND	ML



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN Y/O ABSCISADO	DIMENSIONES			NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI						
MARGEN DERECHO	PT0+380-PT0+460		80,0			80
MARGEN IZQUIERDO	PT0+390-PT0+460		64,3			64
						144,28

Consorcio Pav-La Loma
Contratista

Deibi Gomez de la Rosa
SUPERVISOR

ITEM 4.2	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M						



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN Y/O ABSCISADO	DIMENSIONES			NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M						
MARGEN DERECHO	PT0+380-PT0+460	0,85	200	0,10		170,00
MARGEN IZQUIERDO	PT0+250-PT0+460	0,85	204	0,10		173,34
						343,34

Consorcio Pav-La Loma
Contratista

Deibi Gomez de la Rosa
SUPERVISOR

ITEM 4.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO						



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN Y/O ABSCISADO	DIMENSIONES			NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO						
CUNETAS LADO IZQUIERDO	K0+380-K0+460,2	0,8	87	0,4		27,84
CUNETAS LADO DERECHO	K0+380-K0+446	0,8	66,00	0,4		21,12
						48,96

Consorcio Pav-La Loma
Contratista

Deibi Gomez de la Rosa
SUPERVISOR

ITEM 5.1	SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACION						



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN Y/O ABSCISADO	DIMENSIONES			NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACION					13	13,00
						13,00

Consorcio Pav-La Loma
Contratista

Deibi Gomez de la Rosa
SUPERVISOR

ITEM NP-01	CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN Y/O ABSCISADO	DIMENSIONES			NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	ALTO		
CANAL DE REJILLAS LADO DERECHO	PT0+446	0,25	1,25	1,25		1,56
CANAL DE REJILLAS LADO IZQUIERDO	PT0+446	0,25	1,25	1,25		1,56
						3,13

Consorcio Pav-La Loma
Contratista

Deibi Gomez de la Rosa
SUPERVISOR

ITEM NP-02	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS						



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN Y/O ABSCISADO	DIMENSIONES			NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
		Ø	KG	LARGO		
		1/2"	5,96	1,25	8,214	48,96
						48,96

Consorcio Pav-La Loma
Contratista

Deibi Gomez de la Rosa
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023



Antes



Durante



Después

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

INFORME FINAL No. 6

PERIODO:

OCTUBRE 1° DE 2023 A OCTUBRE 13 DE 2023

ALGARROBO - MAGDALENA, OCTUBRE 13 DE 2023

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 6 – FINAL

OCTUBRE 1° DE 2023 A OCTUBRE 13 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VIA A INTERVENIR
MAGDALENA	ALGARROBO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA	VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 6 - FINAL

OCTUBRE 1° DE 2023 A OCTUBRE 13 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

ELABORO:	Residente de Obra Ing. MARIEL YANCE OROZCO Mat. Prof. 021037-0614443 ATL
REVISO Y APROBO:	Director de obra Ing. EDUARDO E. CABALLERO AVILA Mat. Prof. 08202-64430 ATL
VERSION:	1.0

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 6
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO. 7
4. INFORMACION DE CAMBIOS PROPUESTOS 7
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023 9
5.1. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el presente periodo 10
5.2. Estado de avance y acciones a seguir 10
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA MUNICIPIO DE ALGARROBO 11
6.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA MUNICIPIO DE ALGARROBO 11
6.1.1. Resumen mensual estado general del proyecto 11
Maquinaria y equipo de contrato de obra 11
6.1.2. Personal contrato de obra 11
6.1.3. Informe financiero y presupuestal al contrato de obra 11
6.1.4. Estado general de tiempo 12
6.1.5. Resumen ensayos de laboratorio 12
6.1.6. Control aporte legales y seguridad social contrato de obra 12
6.1.7. Informe avance físico-financiero 12
6.1.8. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 12
6.1.9. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra 12
6.1.10. Seguimiento a la inversión del anticipo 12
6.1.11. Programa de Inversiones 12
6.1.12. Seguimiento programa de inversiones 12
6.1.13. Actas de comité de obra 12
6.1.14. Informe semanal 12
7. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 12
7.2. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 13
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
9. ANEXOS 14
9.1. REGISTRO FOTOGRAFICO 15
9.2. COPIA DE BITÁCORA 17
9.3. INFORMES SEMANALES 18
9.4. FORMATOS FOC 19
9.5. ACTA FINAL DE OBRA 20

CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA.

1. INTRODUCCION

El presente informe contiene una descripción técnica de la ejecución de las obras propuestas en el acta modificatoria No. 1 por El CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, en su calidad de contratista de obra, quien socializó y sometió a aprobación de la supervisión del contrato e interventoría, las siguientes modificaciones, basadas en los estudios hidráulicos y el nuevo diseño geométrico, los cuales harían funcional el proyecto vial a construir.

La modificación contempla la construcción de una transición para el empalme con la vía troncal del caribe, así mismo, un cambio de dos Boxcoulvert, Construcción de 4 bocacalles y de dos registros para la recolección de aguas de las cuentas y las calles adyacentes.

Las mayores y menores cantidades propuestas se realizan para la construcción de:

- Transición en la abscisa PR0+000.

- Cambios de pendiente en el pavimento que sustituyen el Box coulvert 1 ubicado en la abscisa PR0+070.

- Cambios de pendiente en el pavimento con el fin de que funcione como batea la cual sustituye el Boxcoulvert 2 ubicado en la abscisa PR0+170.

-Cámara caída o Canal de rejillas PR0+446.

-Bocacalles CL 4 CRA 3ª; CL4 CRA 1; CL4 CRA 3.

Mayores y menores cantidades de obra que no varían el presupuesto inicial-contractual, ni el plazo de ejecución.

Cambios que fueron aprobados mediante acta modificativa No. 1 de fecha 10 de agosto de 2023 al **CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023.**

2. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Municipio de ALGARROBO, MAGDALENA



Localización del Proyecto en el Municipio de Algarrobo – Magdalena.


3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las obras de intervención que ejecutará el constructor a través del CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023, que tiene como objeto el **MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA**, estarán sujetas a las especificaciones generales y particulares del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ANDENES), SUBBASE GRANULAR CLASE C, PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR = 38, ACERO DE REFUERZO FY 280 MPA PARA PASADORES Y BARRAS DE ANCLAJES, INCLUYE SUMINISTRO Y FIGURADO, BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 15X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE FY 60000 PSI, CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,10 M, CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, SEÑALIZACION VERTICAL DEFINITIVA, GRUPO I (SP-SR), INCLUYE SUMNISTRO E INSTALACIONM, CONCRETO CLASE D 21MPA PARA CANAL DE REJILLAS, ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. PARA CANAL DE REJILLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA METALICAS DE DESAGUE DE 1mX 1m (Platina de 2y1/2" x 1/4" con ángulos de 2y1/2" x 1/4"), PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) Y PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (5 MESES).

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
LONGITUD	460,42 mts
ANCHO	6 mts
MR CONCRETO	38
BOMBEO	-2%

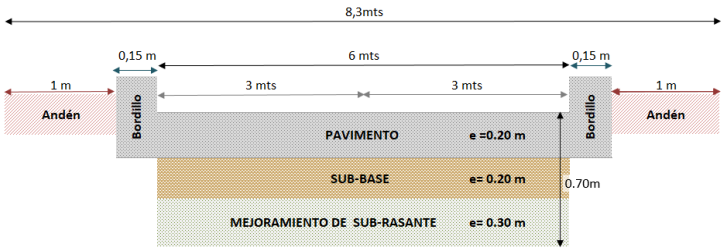

La zona a intervenir del proyecto representa una longitud de 460,42 metros lineales.

4. INFORMACION DE CAMBIOS PROPUESTOS

Basados en los estudios hidráulicos y al nuevo diseño geométrico de la vía, se ejecutaron las obras contratadas inicialmente y las obras objeto del acta modificativa No. 1:

- **Transición PR0+000:** Se realizó la construcción de la transición desde PR0+000 hasta el PR0+030 que empalma el pavimento con la vía nacional troncal del caribe, debido a que esta no se encontraba contemplada en el presupuesto inicial del proyecto, logrando con esto, el correcto funcionamiento de la vía.

Evidencia del estado de la vía en el PR0+000



- **Box Coulvert ubicado en el PR0+070**: Se realizó el cambio de pendiente desde la abscisa PR0+010 hasta la PR0+170, debido a que el flujo de agua producto de escorrentías por lluvia en ese tramo era mínima. El objetivo de este cambio es permitir que las aguas se recojan en la abscisa PR0+170. Al mantener una sola pendiente dentro de estos puntos, se asegura que las aguas fluyan hacia un único lugar de recolección. Esto contribuirá a evitar posibles problemas de drenaje y asegurará un correcto funcionamiento del sistema.

- **Box-Coulvert propuesto en la abscisa PR0+170:** Se construyó la batea en la abscisa PR0+170 con el fin de evitar futuros problemas relacionados con el drenaje y el flujo adecuado de agua en esa ubicación.

Dentro de nuestro objeto contractual, inicialmente se realizaron las actividades de excavación de la subrasante existente en todo el tramo, al evidenciar que la demanda de agua en ese punto no era alta, planteamos un cambio de pendiente hasta el PR0+170 para observar el comportamiento en ese punto,

donde se obtuvieron los resultados esperados y todas las aguas se recogían en el punto más crítico existente de la salida de agua inicial.

Evidencia construcción de batea en la abscisa PR0+170




- **Construcción de bocacalles:** Se realizó durante este periodo, la construcción de las bocacalles de las carreras que interceptan con la vía a intervenir, con sus respectivos andenes y bordillos, con el fin de proteger la estructura de pavimento en construcción.

Evidencia construcción de bocacalles





- **En el PR0+446:** se realizaron unos registros o cámaras de caída (rejillas de 1mx1m) que recolectan las aguas que vienen de las cunetas y dirigen la salida de las aguas hacia el descole del box-coulvert existente en el PR0+460,2. Debido a que las aguas que se recogen en las cunetas ubicadas en el margen derecho no tienen salida, ya que se ubican saliendo por el encole del box-coulvert existente lo cual implicaba realizar un corte en la aleta del mismo, causando una debilitación en la estructura y causando que el agua recolectada por la estructura se dirija a la vía cuando este es rebosado.

Evidencia de la estructura con respecto al nivel de terminación de las cunetas




5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 150523-001 DE 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSÁMO Nit. 901.712.744-5 Rep. Legal. CRISTIAN CUENTAS MANOTAS C.C. 8.649.306 de Sabanalarga, Atlántico.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.
VALOR INICIAL:	$ 1.344.325.137,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1:	$ 134.432.513,70
VALOR ACTA PARCIAL No. 2:	$ 268.865.027,40
VALOR ACTA PARCIAL No. 3:	$ 419.835.310,32
VALOR ACTA PARCIAL No. 4:	$ 185.111.001,33
VALOR ACTA PARCIAL No. 5:	$ 201.648.770,55
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO:	$ 134.432.513,70
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	MAYO 17 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	OCTUBRE 17 DE 2023
INTERVENTORIA:	TORIBIO ANDRADE YEJAS CC. No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlán.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. DEIBI RAFAEL GOMEZ DE LA ROSA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA ACTA FINAL:	OCTUBRE 13 DE 2023

POLIZA UNICA No. 85-44-101121673 (Anexo 0) Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 85-40-101055849 (Anexo 0) Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	15/05/2023	15/02/2024	$ 134.432.513,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2023	15/10/2026	$ 268.865.027,40
Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$ 403.297.541,10
Responsabilidad civil	15/05/2023	15/10/2023	$ 232.000.000,00

POLIZA UNICA No. 85-44-101121673 (Anexo 1) Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 85-40-101055849 (Anexo 1) Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	15/05/2023	15/02/2024	$ 134.432.513,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2023	15/10/2026	$ 268.865.027,40
Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$ 403.297.541,10
Responsabilidad civil	15/05/2023	15/10/2023	$ 232.000.000,00

POLIZA UNICA No. 85-44-101121673 (Anexo 2) Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 85-40-101055849 (Anexo 2) Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/05/2023	17/02/2024	$ 134.432.513,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	17/05/2023	15/10/2026	$ 268.865.027,40
Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$ 403.297.541,10
Responsabilidad civil	15/05/2023	17/10/2023	$ 232.000.000,00

POLIZA UNICA No. 85-44-101121673 (Anexo 3) Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 85-40-101055849 (Anexo 3) Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Desde (dd-mm-aaaa)**	**Hasta (dd-mm-aaaa)**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/05/2023	17/02/2024	$ 134.432.513,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	17/05/2023	15/10/2026	$ 268.865.027,40
Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$ 403.297.541,10
Responsabilidad civil	17/05/2023	17/10/2023	$ 232.000.000,00

5.1. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el presente periodo

Durante en el periodo comprendido entre el 1° y el 13 de octubre de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades (ver acta de recibo parcial No. 6 - final):

En la semana del 2 al 8 de octubre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Fundida de 144 ml de bordillos, y los andenes desde el PT0+380 hasta el PT0+440 tanto en margen derecho como en margen izquierdo. También se realizó fundida de 2 registros.





En la semana del 9 al 13 de octubre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Figuración de acero y la fundida de 2 registros. Así mismo se realizó la instalación de las rejillas metálicas para los registros.





5.2. Estado de avance y acciones a seguir

Durante este periodo las obras se encuentran en un porcentaje de avance de un **100%** las cuales fueron realizadas de acuerdo con las especificaciones técnicas del INVIAS, los materiales pétreos y de cantera fueron adquiridos en la cantera CONSORCIO ÁRIDOS DE GUATAPURÍ, identificada con Nit. 890.922.447-4, ubicada en el municipio de EL Copey, Cesar, que cuenta con todos los permisos y requisitos legales los cuales se adjuntaron en el informe parcial de obra No. 1, la evidencia de las licencias ambientales, titulo minero, requisitos legales del proveedor de materiales pétreos, indicado en el documento PGIO y plan de calidad de la obra.

De acuerdo con las especificaciones técnicas y previa solicitud de la interventoría se realizaron la toma de muestra para proctor y CBR y densidades de la subrasante, afirmado y subbase y ensayo de la máquina de los ángeles las cuales se adjuntan al presente informe.

INVERSIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	21-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	1,9962%	$ 26.236.127,79	$ 13.537.749,24	0,9662%	$ 12.698.378,55	1,9962%	$26.236.127,79
2	sem 2	28-may-23	$ 12.698.378,55	0,9662%	2,8169%	$ 37.021.677,89	$ 24.323.299,34	1,9324%	$ 25.396.757,10	4,8131%	$63.257.805,68
3	sem 3	4-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	5,4155%	$ 71.174.708,03	$ 57.165.664,18	2,9983%	$ 39.405.800,95	10,2286%	$134.432.513,70
4	sem 4	11-jun-23	$ 14.009.043,85	1,0659%	6,2351%	$ 81.947.084,90	$ 67.938.041,05	4,0642%	$ 53.414.844,80	16,4637%	$216.379.598,60
5	sem 5	18-jun-23	$ 1.310.665,30	0,0997%	3,9935%	$ 52.485.428,80	$ 51.174.763,50	4,1639%	$ 54.725.510,09	20,4571%	$268.865.027,40
6	sem 6	25-jun-23	$ 33.329.127,06	2,5359%	0,0000%	$ 0,00	-$ 33.329.127,06	6,6998%	$ 88.054.637,16	20,4571%	$268.865.027,40
7	sem 7	2-jul-23	$ 76.667.204,39	5,8334%	0,0000%	$ 0,00	-$ 76.667.204,39	12,5332%	$ 164.721.841,55	20,4571%	$268.865.027,40
8	sem 8	9-jul-23	$ 206.809.940,39	15,7355%	5,9783%	$ 78.571.991,95	-$ 128.237.948,45	28,2687%	$ 371.531.781,94	26,4354%	$347.437.019,35
9	Sem 9	16-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	2,7098%	$ 35.615.076,65	-$ 104.126.792,22	38,9013%	$ 511.273.650,82	29,1453%	$383.052.096,00
10	Sem 10	23-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,5903%	$ 7.758.678,98	-$ 131.983.189,89	49,5338%	$ 651.015.519,69	29,7356%	$390.810.774,99
11	Sem 11	30-jul-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9501%	$ 12.486.766,11	-$ 127.255.102,76	60,1663%	$ 790.757.388,57	30,6857%	$403.297.541,10
12	Sem 12	6-ago-23	$ 139.741.868,87	10,6325%	0,9173%	$ 12.056.499,31	-$ 127.685.369,57	70,7989%	$ 930.499.257,44	31,6030%	$415.354.040,41
Cantidades Programadas Inicialmente								**70,7989%**	**$ 930.499.257,44**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
MODIFICATORIA No. 002											
Cantidades Programadas Luego de la Modificatoria								**79,9086%**	**$ 1.050.227.371,19**	**31,6030%**	**$415.354.040,41**
13	Sem 13	13-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	4,8214%	$ 63.366.388,71	$ 35.914.060,95	81,9974%	$ 1.077.679.698,95	36,4244%	$478.720.429,11
14	Sem 14	20-ago-23	$ 27.452.327,76	2,0888%	12,7126%	$ 167.079.284,93	$ 139.626.957,17	84,0861%	$ 1.105.132.026,71	49,1369%	$645.799.714,05
15	Sem 15	27-ago-23	$ 28.606.240,88	2,1766%	2,3950%	$ 31.477.144,30	$ 2.870.903,42	86,2627%	$ 1.133.738.267,59	51,5319%	$677.276.858,35
16	Sem 16	3-sep-23	$ 41.010.412,32	3,1204%	15,3850%	$ 202.203.383,71	$ 161.192.971,40	89,3830%	$ 1.174.748.679,91	66,9170%	$879.480.242,06
17	Sem 17	10-sep-23	$ 33.139.439,49	2,5215%	7,4195%	$ 97.512.945,08	$ 64.373.505,59	91,9045%	$ 1.207.888.119,40	74,3364%	$976.993.187,14
18	Sem 18	17-sep-23	$ 34.773.304,32	2,6458%	7,1389%	$ 93.825.659,20	$ 59.052.354,88	94,5503%	$ 1.242.661.423,72	81,4753%	$1.070.818.846,35
19	Sem 19	24-sep-23	$ 42.014.261,14	3,1967%	11,9665%	$ 157.274.517,09	$ 115.260.255,95	97,7471%	$ 1.284.675.684,86	93,4419%	$1.228.093.363,43
20	Sem 20	1-oct-23	$ 14.805.044,85	1,1265%	1,7991%	$ 23.645.473,67	$ 8.840.428,82	98,9%	$ 1.299.480.729,71	95,2410%	$1.251.738.837,10
21	Sem 21	8-oct-23	$ 7.402.522,43	0,5632%	4,5545%	$ 59.859.414,01	$ 52.456.891,58	99,4%	$ 1.306.883.252,14	99,7955%	$1.311.598.251,11
22	Sem 22	15-oct-23	$ 7.402.522,42	0,5632%	0,4854%	$ 6.378.959,79	-$ 1.023.562,63	100%	$ 1.314.285.774,56	100%	$1.314.285.774,56
			$ 1.314.285.774,56					**100,00%**	**$ 1.314.285.774,56**	**100%**	**$ 1.314.285.774,56**

La información consignada en esta tabla se tomó del flujo de caja presentado por el contratista a corte de 13 de octubre de 2023. (Sobre el costo directo de la obra).

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA MUNICIPIO DE ALGARROBO

6.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA MUNICIPIO DE ALGARROBO

6.1.1. *Resumen mensual estado general del proyecto*

Se presenta en los anexos el formato diligenciado FOC-001 el cual contiene RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

Maquinaria y equipo de contrato de obra

Se anexo formato diligenciado FOC-002 COPIA DEL CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

6.1.2. Personal contrato de obra

Se anexa formato diligenciado FOC-003 COPIA CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

6.1.3. Informe financiero y presupuestal al contrato de obra

Se anexa formato diligenciado FOC-004 COPIA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

6.1.4. Estado general de tiempo

Se anexa formato FOC-005 ESTADO DEL TIEMPO

6.1.5. Resumen ensayos de laboratorio

Se anexa formato diligenciado FOC-006.

6.1.6. Control aporte legales y seguridad social contrato de obra

Se anexa formato diligenciado FOC-007.

6.1.7. Informe avance físico-financiero

Se anexa formato diligenciado FOC-008.

6.1.8. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

Se anexa formato diligenciado FOC-009.

6.1.9. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

Se anexa formato FOC-010.

6.1.10. Seguimiento a la inversión del anticipo

Se anexa formato diligenciado FOC-011.

6.1.11. Programa de Inversiones

Se anexa formato de seguimiento al programa de trabajo FOC-012

6.1.12. Seguimiento programa de inversiones

Se anexa formato de seguimiento al plan de inversión FOC-013.

6.1.13. Actas de comité de obra

Se anexa acta de comité de obra.

6.1.14. Informe semanal

Se anexan INFORMES SEMANALES DE AVANCE DE OBRA.

7. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

La interventoría es ejercida por el ingeniero TORIBIO ANTONIO ANDRADE YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.609 de Barranquilla, Atlántico, a través del contrato de interventoría cuyo objeto es la: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BALSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA".

7.2. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

El **CONSORCIO PAV- LOMA DEL BALSAMO**, teniendo en cuenta el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA y Plan de Manejo de Transito - PMT, implementó dichos programas durante el periodo, cuyos formatos se adjuntan al presente informe.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo del 1° al 13 de octubre de 2023, el avance de la obra es del 100% incluido el avance del PMT y PAGA presentando un avance total acorde a lo programado, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas y calidad de la obra. Adjuntamos al presente informe el manual de operación y mantenimiento de la vía intervenida, además, de las actas parciales de avance de obra con sus soportes, acta modificativa, plano record o AS-WILL final. Se recomienda el mantenimiento periódico de la vía construida, sobre todo la parte de las obras de artes.

CRISTIAN CUENTAS MANOTAS
Rep. Legal CONSORCIO PAV-LOMA DEL BALSAMO

9. ANEXOS

9.1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro histórico fotográfico













9.2. COPIA DE BITÁCORA

9.3. INFORMES SEMANALES

9.4. FORMATOS FOC

9.5. ACTA FINAL DE OBRA

9.6. LABORATORIOS

9.7. MEMORIAS DE CÁLCULO Y CARTERAS TOPOGRÁFICAS

BALANCE FINANCIERO A OCTUBRE DE 2023.

CONTRATO ESPECIFICO No 2221186

En cumplimiento del contrato especifico 2221186 celebrado entre el Municipio de Algarrobo Magdalena y ENTerritorio que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA", dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos del Fondo Regional de Contratos Plan, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del proyecto; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del Contrato Específico, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Contrato Específico citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

1. **Generalidades del Contrato Especifico:** Relacionar los datos básicos o aspectos principales del Contrato Específico:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA				
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor efectivo**	**Valor total Aporte**	**%Aporte**
ENTERRITORIO			$ 1.470.889.286,35	100%
TOTAL			$ 1.470.889.286,35	

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de Algarrobo Magdalena, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 160123-04 del día 16, del mes Enero del año 2023, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 2023.CEN.01.000039 y 2023.CEN.01.000040, que soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LP-MALG-001-2023 Y CMA-MALG-002-2023, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	**Número**	**Fecha de expedición**	**Valor CDP**	**Valor RP**	**Saldo**
Obra					
CDP	2023.CEN.01.000039	16/01/2023	$ 1.371.768.236,35		$ 0,00
RP	2023.CEN.01.000386	05/05/2023		$ 1.344.325.137,00	$ 27.443.099,35
Interventoría					
CDP	2023.CEN.01.000040	16/01/2023	$ 99.121.050,00		$ 0,00
RP	2023.CEN.01.000308	02/05/2023		$ 99.121.050,00	$ 0,00
Total			**1.470.889.286,35**	**$ 1.443.446.187,0**	**1.470.889.286,35**

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No XX - XX)

En caso de haber adiciones en valor al contrato específico, se hace necesario que se detalle el valor adicional, objeto o motivación del adicional y los soportes presupuestales de mismo. Realizar un cuadro adicional con la información del Otrosí.

2. Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se aperturó una cuenta No 326386711 Corriente en el banco de Bogotá denominada: "CONTRATO ESPECÍFICO N° 2221186 MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE – POBLADO LOMA DEL BÁLSAMO – MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA", de fecha 22 del mes Junio del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	$ 221.013.286,08	$221.013.286,08	16/03/2023	$0
	Transferencia 2	$ 221.013.286,08	$ 221.013.286,08	22/09/2023	
	Transferencia 3	$ 440.886.892,78	$ 440.886.892,78	28/09/2023	
	Transferencia 4				
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		**$882.913.434,94**	**$882.913.434,94**		**$0**

Se anexan extracto de la de Cuenta corriente No.326386711, del mes de octubre de 2023, donde se resaltan los aportes de las entidades.

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes marzo del año 2023 hasta el mes octubre del año 2023, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco de Bogotá, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de Algarrobo a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Marzo 2023	$ 24,224.00	$ 24,224.00
Abril 2023	$ 45,420.00	$ 45,420.00
Mayo 2023	$ 46,934.00	$ 46,934.00
Junio 2023	$ 45,420.00	$ 46,934.00
Julio 2023	$ 41,523.00	$ 40,009.00
Agosto 2023	$ 11,892.00	$ 11,892.00
Septiembre 2023	$ 22,439.00	$ 22,439.00
Octubre 2023	$ 27,681.00	$ 27,681.00
Total	$ 265,533.00	$ 265,533.00

(Anexar la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o una general que señale todos los meses, y soporte del Traslado de los mismos a la cuenta del tesoro.(Folios No 02)

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	N° 150523-001		
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.		
Valor	$ 1.344.325.137	Cuenta o encargo Fiduciario	XXXXX
Valor Anticipo	$	Valor Girado	$
Porcentaje	%	Fecha de Giro	XX/XX/XXXXX
Detalle Orden	**Valor Orden**	**Fecha**	**Saldo Anticipo**
Total			
Rendimientos Financieros del Anticipo			
Periodo	**Valor Rendimientos**	**Valores Transferidos**	
feb-23	N/A		
Marzo-23	N/A		
Total			

Adjuntar el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**Mar-23**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$ 0,0
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	$ 882,913,434.94
	OTROS	$5,000.00
	RENDIMIENTOS TOTALES	$ 265,533.00
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	TOTAL INGRESOS	**$ 883,183,967.94**
22EGRESOS	OBRA	$ 685,574,023.40
	INTERVENTORIA	$ 50,203,220.70
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS	
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 265,533.00
	DESCUENTOS	$ 21,648,626.00
	RTE FUENTE	
	OTROS	$ 45,688.00
	TOTAL EGRESOS	**$ 757,737,091.10**
	SALDO FINAL MES OCTUBRE 2023	**$ 125,446,876.84**

Se adjunta el extracto correspondiente al mes de octubre de 2023.

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar las fechas de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

3. **Balance General de la Contratación Derivada**

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de Obra

Objeto del Contrato Derivado:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.					
Número Contrato	N° 150523-001	**Valor:**	$ 1.344.325.137		**Plazo:**	CINCO (05) Meses
Nombre del Contratista	**CONSORCIO PAV ALGARROBO – LOMA DEL BALSAMO**					
Fecha de firma del contrato	15/05/2023	**Fecha de acta de inicio**		17/05/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	16/10/2023
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**Amortización Anticipo**	**No. Comprobante de egreso**	**Fecha de pago**
Anticipo						
Acta Parcial No 1	$ 134.432.513,70	$ 21.643.626,00	$ 112.788.887,70		2023.CEN.01.000 744	25/07/2023
Acta Parcial No 2	$ 262.865.027,40	$ 42.321.190,16	$220.543.837,24		2023.CEN.01.001 066	25/09/2023
Acta Parcial No 3	$ 419.835.310,32	$ 67.594.011,86	$ 352.241.298,46		2023.CEN.01.001 095	02/10/2023
Acta Parcial No 4						
TOTAL	**$ 817.132.851,42**	**$ 131.558.828,02**	**$ 685.574.023,40**			
Saldo Contrato	**$ 527.192.285.58**					

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	$ 134.432.513,70	$ 134.432.513,70	$ 112.788.887,70	$ 21.643.626,00	16,10%	$ 21.643.626,00		$ 0,00
Acta Parcial No 2	$ 262.865.027,40	$ 262.865.027,40	$ 220.543.837,24	$ 42.321.190,16	16,10%	0		$ 42.321.190,16
Acta Parcial No 3	$ 419.835.310,32	$ 419.835.310,32	$ 352.241.298,46	$ 67.594.011,86	16,10%			$ 67.594.011,86
Acta Parcial No 4								
TOTAL	**$ 817.132.851,42**	**$ 817.132.851,42**	**$ 685.574.023,40**	**$ 63.964.816,16**		**$ 21.643.626,00**		**$ 109.915.202,02**

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

- **Contrato de Interventoría**

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".				
Número Contrato	020523-001	**Valor:**	$ 99.120.563	**Plazo:**	CINCO (05) MESES
Nombre del Contratista	**ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO**				
Fecha de firma del contrato	02/05/2023	**Fecha de acta de inicio**	17/05/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	16/10/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1	$ 59.692.220,70	$ 9.489.000,00	$ 50.203.220,70		2023.CEN.01.001096	02/10/2023
Acta Parcial No 2						
TOTAL	**$ 59.692.220,70**	**$ 9.489.000,00**	**$ 50.203.220,70**			
Saldo Contrato	**$ 39.428.342,30**					

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	$ 59.692.220,70	$ 59.692.220,70	$ 50.203.220,70	$ 9.489.000,00	13,5%	$ 0		$ 9.489.000,00
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL	**$ 59.692.220,70**	**$ 59.692.220,70**	**$ 50.203.220,70**	**$ 9.489.000,00**				**$ 9.489.000,00**

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

4. Balance Financiero Contrato Específico

La entidad ENTerritorio, ha realizado tres (03) desembolsos, con los cuales se han pagado a corte de octubre 31 de 2023, las actas parciales N° 01, 02 y 03 al contrato de Obra a nombre de CONSORCIO PAV – LOMA DEL BALSAMO, cuyo valor total es de $ 685.574.023,40.
Del contrato de interventoría No. 020523-001, a nombre de ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO, se ha pagado a corte de octubre 31 de 2023, el acta parcial N° 01 por valor de $ 59.692.220,70
De los valores por concepto de deducciones a la fecha de este informe han sido trasladados a las cuentas del Municipio por la suma de $ 21.643.626,00, quedando pendiente por trasladar el valor de $ 119.404.202,02.
Se han generado siete meses en rendimientos financieros correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubrede 2023, los cuales se han enviado al Tesoro Nacional en su totalidad por valor acumulado de $ 265,533.00

Se firma el presente informe financiero, a los 02 días del mes de noviembre de 2023.

KELLY PEREZ AMARIS
SECRETARIA DE HACIENDA
secretariafinanciera@algarrobo-magdalena.gov.co
perezkelly237@gmail.com

LILIBETH DE LA ROSA MENDOZA
CONTADORA PÚBLICA
Lilibeth.delarosa@hotmail.com

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos Días Anteriores

Empresa: MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8190032190
Generado por: KELLY YOHANA PEREZ AMARIS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC6711	*****6711

Fecha
Oct 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/10/31	Interes remuneracion especial	0000000000	$0,00	$27.681,00
2023/10/04	Pago por Internet Corporativo	0000001004	$22.439,00	$0,00
2023/10/02	Cargo IVA	0000000000	$1.349,00	$0,00
2023/10/02	Cargo IVA	0000000000	$1.349,00	$0,00
2023/10/02	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	0000000000	$7.100,00	$0,00
2023/10/02	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	0000000000	$7.100,00	$0,00
2023/10/02	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$50.203.220,70	$0,00
2023/10/02	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$352.241.298,46	$0,00

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 803202

jueves, 02 de noviembre de 2023, 3:08:03 PM

Detalle

$27,681.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******6711
Descripción:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha y hora inicio transacción	2023-11-02 3:06:30
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	50164
Código Único de Seguimiento	255069957
Dirección IP:	186.1.170.42
Referencia 1:	186.1.170.42
Referencia 2:	8190032190
Referencia 3:	

Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 1

AÑO	MES	DÍA
2023	10	2

$ 50.203.220,70

Páguese a: ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO Nit: 72.135.609

La Suma de: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 326-38671-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERECIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO MAGDALENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

SECRETARIA FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2023

EGRESO No. 2023.CEN.01.001096

02 DE OCTUBRE DEL 2023

BENEFICIARIO: ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO Nit. 72.135.609

POR CONCEPTO DE: RESOLUCION N° 150923-002 / PAGO SEGUN ACTA PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 020523-001 / INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LO

POR VALOR DE: $ 50.203.220,70

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 326-38671-1	BANCO: BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL: BANCO BOGOTA CTE 326-3867

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	72135609 - ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO	$ 59.692.220,70	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 1018 - Registro 308			
24072201 - UNIMAGDALENA	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	$ 0,00	$ 1.194.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA UNIMAGDALENA			
24072202 - TROCONIS	891780185 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MEN	$ 0,00	$ 1.194.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA H. TROCONIS			
29179001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 597.000,00
DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA			
24360501 - RETEFUENTE SERVICIOS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 3.582.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. GRAL 6%			
29179002 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 597.000,00
DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR ESTAMPILLA			
24362501 - IMPOVENTAS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 1.430.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION IVA			
29179003 - ESTAMPILLA PRO DEPORTE	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 895.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTE			
11100554 - BANCO BOGOTA CTE 326-38671-1 - CO	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 50.203.220,70
DETALLE DEL PAGO: BANCO BOGOTA CTE 326-38671-1 - CONVENIO ENTERRITORIO			
TOTALES		$ 59.692.220,70	$ 59.692.220,70

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por: DE LA ROSA MENDOZA LILIBETH CONTADOR PÚBLICO	Aprobado por: PEREZ AMARIS KELLY YOHANA SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

ELABORÓ: MRUIZ IMPRIMIÓ: MRUIZ NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC

Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 1

AÑO	MES	DÍA
2023	10	2

$ 352.241.298,46

Páguese a: CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO Nit: 901.712.744

La Suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 326-38671-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERECIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO MAGDALENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

SECRETARIA FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2023

EGRESO No. 2023.CEN.01.001095

02 DE OCTUBRE DEL 2023

BENEFICIARIO: CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO Nit. 901.712.744

POR CONCEPTO DE: RESOLUCION N° 210923-002 / PAGO SEGUN ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO N° 150523-001 / MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.

POR VALOR DE: $ 352.241.298,46

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 326-38671-1	BANCO: BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL: BANCO BOGOTA CTE 326-3867

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSION	901712744 - CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO	$ 419.835.310,32	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 1052 - Registro 386			
24072201 - UNIMAGDALENA	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	$ 0,00	$ 8.397.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA UNIMAGDALENA			
24072202 - TROCONIS	891780185 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MEN	$ 0,00	$ 8.397.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA H. TROCONIS			
29179001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 4.198.000,00
DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA			
29101301 - CONTRIBUCIONES FONDO SEG-CIUDA	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 20.992.000,00
DETALLE DEL PAGO: FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA			
24362601 - CONTRATO DE OBRA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 8.397.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSTRUCCIÓN 2%			
29170401 - RETENCION IMPUESTO IND. Y CIO	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 2.519.011,86
DETALLE DEL PAGO: INDUSTRIA Y COMERCIO			
24079001 - MADRES COMUNITARIAS	900208247 - ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIA	$ 0,00	$ 4.198.000,00
DETALLE DEL PAGO: MADRES COMUNITARIAS			
29179002 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 4.198.000,00
DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR ESTAMPILLA			
29179003 - ESTAMPILLA PRO DEPORTE	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	$ 0,00	$ 6.298.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTE			
11100554 - BANCO BOGOTA CTE 326-38671-1 - CO	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 352.241.298,46
DETALLE DEL PAGO: BANCO BOGOTA CTE 326-38671-1 - CONVENIO ENTERRITORIO			
TOTALES		$ 419.835.310,32	$ 419.835.310,32

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
DE LA ROSA MENDOZA LILIBETH CONTADOR PUBLICO	PEREZ AMARIS KELLY YOHANA SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

ELABORÓ: MRUIZ IMPRIMIÓ: MRUIZ NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

SECRETARIA FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 2023.CEN.01.001018

VIGENCIA FISCAL - 2023

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	2023.CEN.01.000308	**FECHA REGISTRO**	MAY.02.2023
FECHA EXPEDICIÓN	SEP.26.2023	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATOS DE OBRAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
BENEFICIARIO	**72135609-ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO**		
DIRECCIÓN	CR 18 17 61 BRR EL RECREO	**TELÉFONO/CEL.**	3196035157
CONCEPTO	RESOLUCION N° 150923-002 / PAGO SEGUN ACTA PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 020523-001 / INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA".		
VALOR BRUTO	**$ 59.692.220,70**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 9.489.000,00**
VALOR NETO	**$ 50.203.220,70**	**SON.** CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	87 - COFINANCIACION NACIONAL	59.692.220,70

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
51117901	HONORARIOS	72135609 - ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO	59.692.220,70	0,00
24905401	HONORARIOS	72135609 - ANDRADE YEJAS TORIBIO ANTONIO	0,00	59.692.220,70

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0005 - ESTAMPILLA UNIMAGDALENA	2	59.692.220,70	1.194.000,00
0006 - ESTAMPILLA H. TROCONIS	2	59.692.220,70	1.194.000,00
0007 - PROCULTURA	1	59.692.220,70	597.000,00
0008 - RETEFUENTE SERV. GRAL 6%	6	59.692.220,70	3.582.000,00
0017 - ADULTO MAYOR ESTAMPILLA	1	59.692.220,70	597.000,00
0027 - RETENCION IVA	15	9.530.690,70	1.430.000,00
0091 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,5	59.692.220,70	895.000,00

FIRMAS RESPONSABLES:

DE LA ROSA MENDOZA LIMBETH *CONTADOR PÚBLICO*	**PEREZ AMARIS KELLY YOHANA** *SECRETARIA DE HACIENDA*	**PRIETO MONTEJO LICET BELEN** *ALCALDE MUNICIPAL*

FECHA IMPRESIÓN: 26/09/2023 **IP:** 186.1.191.2 **ELABORÓ:** LDELAROSA **IMPRIMIÓ:** MRUIZ

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

SECRETARIA FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 2023.CEN.01.001052

VIGENCIA FISCAL - 2023

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2023.CEN.01.000386	**FECHA REGISTRO**	MAY.15.2023
FECHA EXPEDICIÓN	OCT.02.2023	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATOS DE OBRAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
BENEFICIARIO	**901712744-CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO**		
DIRECCIÓN	CR 54 68 - 196 OF 104 ED PRADO OFFICCE CENTER	**TELÉFONO/CEL.**	3004630279
CONCEPTO	RESOLUCION N° 210923-002 / PAGO SEGUN ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO N° 150523-001 / MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - POBLADO LOMA DEL BALSAMO - MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA.		
VALOR BRUTO	**$ 419.835.310,32**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 67.594.011,86**
VALOR NETO	**$ 352.241.298,46**	**SON.** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	87 - COFINANCIACION NACIONAL	419.835.310,32

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070601	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL - ASIGNACION DE BIENES Y SER	901712744 - CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO	419.835.310,32	0,00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	901712744 - CONSORCIO PAV - LOMA DEL BALSAMO	0,00	419.835.310,32

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0005 - ESTAMPILLA UNIMAGDALENA	2	419.835.310,32	8.397.000,00
0006 - ESTAMPILLA H. TROCONIS	2	419.835.310,32	8.397.000,00
0007 - PROCULTURA	1	419.835.310,32	4.198.000,00
0013 - FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	419.835.310,32	20.992.000,00
0014 - RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSTRUCCIÓN 2%	2	419.835.310,32	8.397.000,00
0015 - INDUSTRIA Y COMERCIO	0,6	419.835.310,32	2.519.011,86
0016 - MADRES COMUNITARIAS	1	419.835.310,32	4.198.000,00
0017 - ADULTO MAYOR ESTAMPILLA	1	419.835.310,32	4.198.000,00
0091 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,5	419.835.310,32	6.298.000,00

FIRMAS RESPONSABLES:

DE LA ROSA MENDOZA LILIBETH *CONTADOR PÚBLICO*	**PEREZ AMARIS KELLY YOHANA** *SECRETARIA DE HACIENDA*	**PRIETO MONTEJO LICET BELEN** *ALCALDE MUNICIPAL*
