CONTRATO ESPECÍFICO Nº 169-2230013 DE 2023
INFORME No. 08 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.650.745.485,00)
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.650.745.485,00)
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto ONCE (11) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	RITA ALVAREZ DE LA HOZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO

	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO. (Si aplica)	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)		FECHA REINICIOS	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$5.281.070.546,73	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$369.674.938,27
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	Avance Financiero del periodo (%)	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	Avance Físico Acumulado (%)	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025262	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$565,074,548.50	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025262 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria:	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$565,074,548.50	01/03/2023	01/10/2024

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025262 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$565,074,548.50	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	**$1.160.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**1.160.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$592.992,00	N/A
Mayo 2023	$6.130.715,00	N/A
Junio 2023	$921.158,00	$6.130.715,00
Julio 2023	$721.773,00	N/A
Agosto 2023	$609.265,00	$7.051.873,00
Septiembre	$40.260.000,00	N/A
Octubre	$1.351.505,00	N/A
Noviembre	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**				**VALOR TOTAL CONTRATO**
MCM-CMA-001-2023	*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.*				$369.602.100
Nombre contratista	CONSORCIO INTERCONCORDIA Nit. No. 901.715.998-2				
Fecha Firma del contrato	23/05/2023				
Plazo contrato	6 meses				
Fecha del acta de inicio del contrato	26/05/2023				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	ACTA DE SUSPENSION No 1 – 01/06/2023 ACTA DE REINICIO No 1 – 01/07/2023				
Fecha Inicial Terminación Contrato	26/11/2023	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		28/12/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	50%	50%	$184.801.050,00		
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		
PÓLIZA No.		**AMPAROS**		**VIGENCIAS**	

	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
430-47-994000061075	08/08/2023	Cumplimiento del contrato	$36.960.210,00	26/05/2023	26/04/2024
	08/08/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$184.801.050	26/05/2023	26/04/2024
	08/08/2023	Pago de salarios, prestaciones sociales legales, e indemnizaciones laborales	$73.920.420	26/05/2023	26/12/2026
	08/08/2023	Calidad del servicio	$73.920.420	26/12/2023	26/12/2028
ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DEL INFORME	
		DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
1	*INFORME DE INTERVENTORIA No 1*	01/07/2023	31/07/2023
2	*INFORME DE INTERVENTORIA No 2*	01/08/2023	31/08/2023
3	*INFORME DE INTERVENTORIA No 3*	01/09/2023	30/09/2023
4	*INFORME DE INTERVENTORIA No 4*	01/10/2023	31/10/2023
5	*INFORME DE INTERVENTORIA No 5*	01/11/2023	30/11/2023

#AbriendoCampoAl Desarrollo

➢ *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO	
MCM-LP-001-2023	*MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*			$5.062.280.996,00	
Nombre contratista	CONSORCIO VIAS CONCORDIA Nit No. 901.711.440-7	LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ de CC No. 77.091.383			
Fecha Firma del contrato		16/05/2023			
Plazo contrato		6 meses			
Fecha del acta de inicio del contrato		26/05/2023			
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		ACTA DE SUSPENSION No 1 – 01 DE JUNIO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 – 01 DE JULIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	26/11/2023	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		28/12/2023	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% A PAGAR**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$1.012.456.199,20	1	02/06/2023
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**1.012.456.199,20**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			(PORCENTAJE)		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
	02/08/2023	Cumplimiento del contrato	$506.228.100,00	26/05/2023	26/04/2024

	02/08/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.012.456.200,00	26/05/2023	26/04/2024
21-44-101413837	02/08/2023	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.012.456.200,00	26/05/2023	26/12/2026
	02/08/2023	Estabilidad y calidad de las obras	$1.518.684.300,00	5 años, 0 meses,0 dias.	5 años, 0 meses,0 dias
	02/08/2023	Responsabilidad civil	$464.000.000,00	26/05/2023	26/12/2023
21-40-101211687	02/08/2023	Daño emergencia y lucro cesante	$464.000.000,00	26/05/2023	26/12/2023
	02/08/2023	Perjuicios extrapatrimoniales	$464.000.000,00	26/05/2023	26/12/2023


% DE AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	*15%*
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	*85%*
% DE AVANCE PROGRAMADO	*85%*
ESTADO	*SIN ATRASOS*

#AbriendoCampoAl Desarrollo

%EJECUTADO Vs %PROGRAMADO

DESCRIPCION	CANTIDADES EJECUTADAS	%EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO
EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	13,07	100%	$ 985.519,00	100,00%	$ 985.519,00
TERRAPLEN	4945,72	100%	$ 1.200.296.570,00	100,00%	$ 1.200.296.570,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	45,00	41%	$ 3.579.525,00	100,00%	$ 8.834.268,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	1,56	35%	$ 1.314.377,00	95,00%	$ 3.567.595,80
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	19,53	35%	$ 21.808.546,00	66,00%	$ 41.124.685,80
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	2334,91	25%	$ 21.499.805,00	100,00%	$ 35.832.932,00
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	13,56	35%	$ 3.734.638,00	66,00%	$ 7.042.460,04
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO		0%	$ -	0,00%	$ -
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS		0%	$ -	0,00%	$ -
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA		0%	$ -	0,00%	$ -
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	121,57	20%	$ 1.119.417,00	100,00%	$ 5.597.037,00
TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36" DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)		0%	$ -	0,00%	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO		0%	$ -	0,00%	$ -
SUBBASE GRANULAR CLASE C	1440,00	100%	$ 441.292.320,00	100,00%	$ 441.292.320,00
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	1680,00	88%	$ 1.942.212.720,00	86,00%	$ 1.908.917.644,80
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	211,00	88%	$ 214.004.218,00	74,00%	$ 180.128.668,80
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15M * 0,45M)		0%	$ -	0,00%	$ -
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	43300,00	88%	$ 398.706.360,00	100,00%	$ 452.320.004,00
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)		0%	$ -	0,00%	$ -
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO		0%	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTALIDAD		**85%**	**$ 4.250.554.015,00**	**85%**	**$ 4.285.939.705,24**
PMT	1	100%	$ 24.704.585,00	0%	$ -
PMA	1	100%	$ 43.554.000,00	0%	$ -
CARACTERIZACION	1	100%	$ 4.109.032,00	0%	$ -
TOTALIDAD		**85%**	**$ 4.322.921.632,00**	**85%**	**$ 4.285.939.705,24**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	%AVANCE	VALOR EJECUTADO	%PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO
EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMO PARA LA VIA	M3	13,07	100%	$985.519,00	100%	$985.519,00
TERRAPLEN	M3	4945,72	100%	$1.200.296.570,00	100%	$1.200.296.570,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	45,00	41%	$3.579.525,00	100%	$8.834.268,00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPA SOLADOS	M3	1,56	35%	$1.314.377,00	95%	$3.567.595,80
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA BOX	M3	19,53	35%	$21.808.546,00	66%	$41.124.685,80
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX	KG	2334,91	25%	$21.499.805,00	100%	$35.832.932,00
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	13,56	35%	$3.734.638,00	66%	$7.042.460,04
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA	KG	121,57	20%	$1.119.407,40	100%	$5.597.037,00
SUBBASE GRANULAR TIPO C	M3	1440	100%	$441.292.320,00	100%	$441.292.320,00
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	M3	1680	88%	$1.942.212.720,00	86%	$1.908.917.644,80
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	211	88%	$214.004.218,00	74%	$180.128.668,80
ACERO DE REFUERZO FY 4200MPA	KG	43300	88%	$398.706.360,00	100%	$452.320.004,00
SUBTOTAL				**$4.322.921.632,00**		**$4.285.939.705,24**
% EJECUTADO Vs PROGRAMADO				**85%**		**85%**

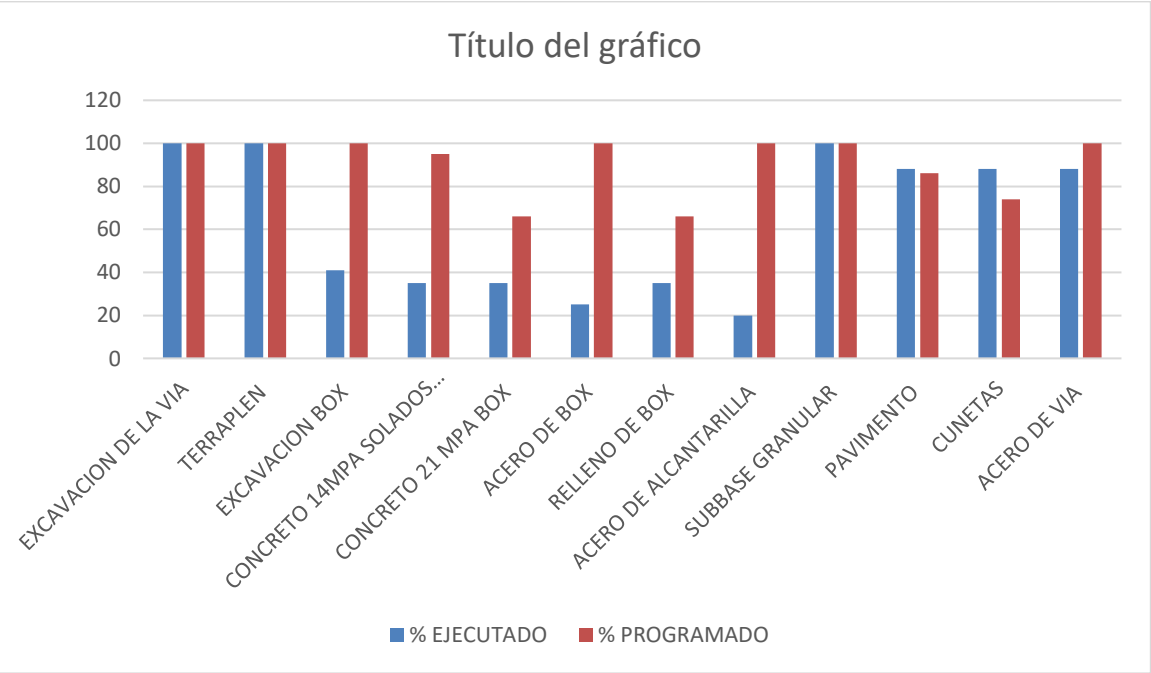

PROGRAMACION DE OBRA

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	**173 días**	**vie 26/05/23**	**mié 27/12/23**		**85%**
	INICIO DE OBRA	0 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23		100%
	SUSPENSION DE OBRA	23 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	2FC+5 días	100%
	REINICIO DE OBRA No 1	0 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	3FC+1 día	100%
	EXPLANACIONES	**39 días**	**sáb 1/07/23**	**vie 18/08/23**		**100%**
	EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	20 días	sáb 1/07/23	mié 26/07/23	4	100%
	TERRAPLEN	39 días	sáb 1/07/23	vie 18/08/23	4	100%
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT	**100 días**	**mar 8/08/23**	**lun 11/12/23**		**89%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	jue 2/11/23	mié 15/11/23	4FC+100 días	100%
	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	7 días	mié 22/11/23	jue 30/11/23	9FC+5 días	95%
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	10 días	mié 22/11/23	lun 4/12/23	9FC+5 días	66%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 8/08/23	mar 3/10/23	4FC+30 días	100%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	lun 4/12/23	lun 11/12/23	11	0%

#AbriendoCampoAl Desarrollo

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	10 días	mié 15/11/23	mar 28/11/23	15	100%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	lun 4/12/23	lun 11/12/23	11	0%
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	**142 días**	**sáb 1/07/23**	**lun 25/12/23**		**88%**
	SUBBASE GRANULAR CLASE C	60 días	lun 21/08/23	jue 2/11/23	4FC+40 días	100%
	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	70 días	mié 27/09/23	vie 22/12/23	22CC+30 días	86%
	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	15 días	mar 28/11/23	sáb 16/12/23	23CC+50 días	74%
	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15M * 0,45M)	12 días	lun 11/12/23	lun 25/12/23	24CC+10 días	0%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	50 días	sáb 1/07/23	vie 1/09/23	4	100%
	SEÑALIZACION	**4 días**	**vie 22/12/23**	**mié 27/12/23**		**0%**
	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	4 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23	23	0%
	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	4 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23	23	0%

REGISTRO DE CLIMA

	ESTADO DEL CLIMA MES DE OCTUBRE																												
ESTADO DEL CLIMA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
SECO		X	X				X	X	X	X	X			X				X		X			X	X					X	X
NUBLADO	X			X											X	X	X				X	X			X			X		
LLUVIA MODERADO																											X			
LLUVIA INTENSA																														
		Luis Muñoz A.																Daniel Ramos												
		CONTRATISTA																INTERVENTORIA												

En este periodo se presentaron 01 días de lluvias en la zona de la obra.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 2,3 — DESCRIPCION: CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX — UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX				1,56	M3	1,56
TOTAL						1,56

ESQUEMA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 2,4 — DESCRIPCION: ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA — UNIDAD: kg

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA				1362,03	kg	1.362,03
TOTAL						1.362,03

ESQUEMA



#AbriendoCampoAl Desarrollo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4.4 — DESCRIPCION: ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA — UNIDAD: kg

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero de refuerzo				11300,00	kg	11.300,00
				TOTAL		11.300,00

ESQUEMA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4.2 — DESCRIPCION: CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS — UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CUNETAS	389	0,7	0,15	41	M3	41
				TOTAL		41

ESQUEMA



#AbriendoCampoAl Desarrollo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 2,1 | DESCRIPCION: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO				45,00	M3	45,00	
TOTAL						45,00	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4,2 | DESCRIPCION: PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
PAVIMENTO RIGIDO	800	3	0,2	480	M3	480,00	
TOTAL						480,00	

#AbriendoCampoAlDesarrollo
Eliseo Barraza
Alcalde 2020 - 2023
Abriendo Campo al Desarrollo CONCORDIA - MAGDALENA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 2,5 | DESCRIPCION: RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO				13,56	M3	13,56	
				TOTAL		13,56	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 2,2 | DESCRIPCION: CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS				1,56	M3	1,56	
				TOTAL		1,56	

#AbriendoCampoAl Desarrollo

RELACION RESULTADOS ENSAYOS DE RESISTENCIA.

FECHA	*ABCISA*	*RESULTADO 7 DIAS*	*RESULTADO 28 DIAS*
18/08/2023	K3+750-K3+804	34,2	44,0
19/08/2023	K3+804-K3+858	33,7	45,4
22/08/2023	K3+858-K3+912	32,3	46,4
24/08/2023	K3+912-K3+966	33,0	42,8
25/08/2023	K3+966-K4+020	33,6	44,7
26/08/2023	K4+020-K4+074	33,2	41,9
31/08/2023	K4+074-K4+128	33,8	45,4
02/09/2023	K4+128-K4+182	33,7	46,4
05/09/2023	K4+182-K4+236	33,9	46,9
07/09/2023	K4+236-K4+290	34,7	46,0
09/09/2023	K4+290-K4+344	34,3	42,9
11/09/2023	K4+344-K4+398	33,2	46,3
12/09/2023	K4+398-K4+460	33,9	46,9

#AbriendoCampoAl Desarrollo

INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:

Una vez realizada la supervisión al contrato de la referencia, se anota un avance físico acumulado del 85% según el avance programado a la fecha de 85%, la obra se encuentra en ejecución.

Según lo contemplado en la bitácora de obra firmada por la firma contratista y la interventoría las actividades realizadas a la fecha son:

- Construcción de Pavimento rígido -MR 3.8 MPA.
- Cortes de placa en concreto rígido
- Construcción de cunetas en concreto rígido
- Toma de muestras de ensayo a flexión.
- Cortes de placa.
- Construcción de Box Coulvert
- Limpieza general
- Atención a recorrido por parte de en territorio
- Seguimiento al PMT y PMA.

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DEL BOX	M3	45,00
CONCRETO DE 14MPA PARA BOX	M3	1,56
CONCRETO DE 21 MPA PARA BOX	M3	19,53
ACERO DE REFUERZO BOX	KG	1362,03
RELLENO PARA BOX	M3	13,56
SUBBASE GRANULAR	M3	117,00
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	M3	480
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) – CUNETAS	M3	41

#AbriendoCampoAl Desarrollo

ACERO DE REFUERZO FY 4200MPA	KG	11300
AVANCE	15%	

Estas actividades corresponden al 15%.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La interventoría realiza supervisión a las actividades realizadas en campo.

- Construcción de Pavimento rígido -MR 3.8 MPA.
- Cortes de placa en concreto rígido
- Construcción de cunetas en concreto rígido
- Toma de muestras de ensayo a flexión.
- Cortes de placa.
- Construcción de box coulvert
- Seguimiento al PMT y PMA.

La interventoría revisa la revisión de los resultados a los ensayos de laboratorio, los cuales cumplen y da su aprobación para fundida de pavimento en concreto rígido.

La firma contratista recibe y aprueba acta parcial de obra No 4.
La firma contratista remite concepto técnico de aprobación de la Modificatoria No 1 al contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA.

El contratista de obra realiza las siguientes actividades supervisadas por la interventoría correspondientes a:

- Construcción de Pavimento rígido -MR 3.8 MPA.
- Cortes de placa en concreto rígido
- Construcción de cunetas en concreto rígido
- Toma de muestras de ensayo a flexión.
- Cortes de placa.
- Construcción de Box Coulvert
- Seguimiento al PMT y PMA.

La firma contratista remite a interventoría resultados de ensayos de resistencia
La firma contratista tramite acta de cobro No 4.
La firma contratista remite a la interventoría con fecha de 08 de noviembre la modificatoria al contrato con sus respectivos anexos técnicos.

Acta parcial de obra No 4.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	5.062.280.996,00
ANTICIPO 20%	$	1.012.456.199,20
VALOR ACTA PARCIAL No 4	$	779.385.691,00
Amortizacion 20%	$	155.877.138,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL	$	623.508.553,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Construcción de pavimento Rígido e instalación de formaleta para la misma







#AbriendoCampoAl Desarrollo





#AbriendoCampoAl Desarrollo


Desde aqui inicia
CONCORDIA
Municipio Cordial de Colombia
Bellavista 2
Rosario De Chengue 8
Balsamo 18


2023-10-12 09:10:03

- Corte de placas de pavimento en concreto rígido.





#AbriendoCampoAl Desarrollo

#AbriendoCampoAl Desarrollo

- Construcción de Cunetas en concreto











#AbriendoCampoAl Desarrollo

- CONSTRUCCION DE BOX







#AbriendoCampoAl Desarrollo





#AbriendoCampoAl Desarrollo





#AbriendoCampoAl Desarrollo

BITACORA DE OBRA

31-11-23
Estado Clima: Nublado
Personal: Director, Residente, SiSo, Almacenistas, Vigilante
Equipos: Trompos, Cortadora.
Se inicia jornada 7:00am
el dia de hoy se trabaja en la construcción de Cunetas ambos lados. y corte de Placas.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

02-11-23
Estado del Clima: Seco
Personal: Director, Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante.
Equipos: 2trompos, Cortadora de concreto.
Se inicia jornada 7:00 am.
Llega trituado a Obra.
Llega 70 bolsas de Cemento a Obra.
Se continua con la construcción de Cunetas ambos lados y corte de Placas.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

03-11-23
Estado Clima: Seco
Personal: Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante, Regulador
Equipos: 2trompos, cortadora de concreto.
Se inicia jornada 7:00am.
Se continua con la construcción de Cunetas ambos lados y corte de Placas.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

04-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Personal: Director, Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante, Regulador.
Equipos: 2trompos, Cortadora.
Se inicia jornada 7:00am.
Se continua con la construcción de Cunetas en ambos lados y sos bajantes.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

05-11-23
Estado del Clima: Lluvias.
Se presentan lluvias en la Madrugada dificultando el inicio de Actividades.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

07-11-23
Estado del Clima: Seco.
Personal: Residente, SSO, Almacenista, Vigilante, Regulador
Equipos: 2trompos, Cortadora.
Se inicia jornada 7:00am
Se continua con la construcción de Cunetas se prepara terreno para fundir el dia de mañana.

Luis Muñoz A — Daniel Ospino D

8-11-23
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, Cortadora.
Personal: Director, Residente, SiSo, Regulador, Vigilante, Almacenista.
Se inicia jornada 5:00am:
Se funden 60ml de Pavimento Rigido.
Se continua con la construcción de Cunetas en concreto.
Se continua con el corte de Placas.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

9-11-23
Estado Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, Cortadora Rigido.
Personal: Director, Residente, SiSo, Regulador, Vigilante, Almacenista.
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 40ml de Pav. Rigido.
Se continua con la construcción de Cunetas en concreto Rigido y cortes de Placas.

Luis Muñoz A. — Contratista
Daniel Ospino D. — Interventor

10-11-23
Estado del Clima: Seco
Equipos: 2trompos, Cortadora, Pajarita
Personal: Director, Reside, SiSo, Regulador, Vigilante, Almacenista
Se inicia Jornada 5:00am.
Se Funden 40ml de Pav Rigido
Se continua con la construcción de Cunetas en Concreto Rigido y cortes de Placas.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

11-11-23
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, Cortadora, Pajarita
Personal: Director, Residente, SiSo, Regulador, Vigilante, Almacenista.
Se inicia Jornada 5:00am.
Se Funden 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con la construcción de Cunetas y corte de Pavimento.

Luis Muñoz A. — Contratista
Daniel Ospino D. — Interventor

14-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: trompos, Cortadora, Pajarita
Personal: SiSo, topografia, Residente, Reguladores, Almacenista, Vigilante, Director
Se inicia jornada 5:00am
Se funden 50ml de Pav. Rigida
Se continua constr. de Cunetas en concreto.
Se continua corte de Pavimento.
Se atiende Visita en territorio, se realiza recorrido de verificación.

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

15-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: Trompo, Cortadora.
Personal: SiSo, topografo, Residente, Director, Reguladores, Almacenista, Vigilante
Se inicia jornada 6:00am, se continua con la construcción de cunetas y corte de Pav. Rigida

Luis Muñoz A — Contratista
Daniel Ospino D — Interventor

Powered by CamScanner

54

16-11-23.
Estado Clima: Nublado.
Equipos: 2 trompos, cortadora, Pajuela.
Personal: Residente, Director, Topografo, Vigilante, SSo, Regulador, Almacenista
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 60ml de Pav. Rigido.
Se Continua con la construcción de cunetas de concreto.
Se continua con el corte de Placas

Luis Hoyos A. Contratista
David Lopez D. Interventor

17-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: 2 trompos, cortadora, Pajuela.
Personal: Residente, Director, Topografo, Vigilante, SSo, Reguladores, Almacenista.
Se Inicia jornada 5:00am.
Se funden 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con la construcción de Cunetas de concreto, se continua con el corte de Placas.

Luis Hoyos A. Contratista
David Lopez D. Interventor

18-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2 trompos, Cortadora, Pajuela.
Personal: Residente, Director, topografo, Vigilante SSo Reguladores, Almacenista.
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 50 ml de Pav. Rigido
Se continua con la construcción de Cunetas.

Luis Hoyos A. Contratista
David Lopez D. Interventor

Powered by CamScanner

55

20-11-23
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2 trompos, Cortadora, Pajuela.
Personal: Residente, Director, Almacenista, topografo, Vigilante, SSo, Reguladores.
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con la const. de Cunetas.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

21-11-23
Estado del Clima: Nublado
Equipos: 2 trompos, cortadora, Pajuela.
Personal: Residente, Director, Almacenista, Vigilante, SSo, topografo, Reguladores.
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 50ml de Pav. Rigido, reconstrucción de Cunetas.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

22-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: 2 trompos, cortadora, Pajuela.
Personal: Residente, Director, Almacenista, Vigilante, SSo, topografo, Reguladores.
Se inicia jornada 6:00am.
Se funden 40ml de Pav. Rigido, construcción de Cunetas.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez Designado Interventor

56

23-11-23.
Estado Clima: Seco
Equipos: 2 trompos, Cortadora.
Se continua con la Fundida de Pavimento Rigido.
y construcción de Cunetas.
Personal: Director, Residente, Vigilante, SSo, topografia, Regulador, Almacenista.

Luis Hoyos A Contratista
David Lopez D. Interventor

24-11-23.
Estado del Clima: Seco
Equipos: 2 trompos, pajuela, cortadora.
Se continua a partir de la 5:00am
Fundida de 50ml de Pav. Rigido.
Construcción de Sobre Cunetas en concreto.
Corte de Placas de concreto.

Luis Hoyos A. Contratista
David Lopez D. Interventor

25-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: 2 trompos, Cortadora.
Personal: Director, Residente, Topografo, Almacenista, SSo, Vigilante.
Se continua const. de cunetas en concreto.
Se continua con el corte de Placas.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

57

27-11-23.
Estado del Clima: Lluvias Madrugada.
No se lograron realizar actividades por lluvia.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

28-11-23.
Estado Clima: Nublado.
Equipos: 1 trompos, Cortadora
Personal: Director, Residente, topografo, Almacenista, SSo, Vigilante.
Se continua con la const. de Cunetas en concreto.
Se inicia Fundida de 50ml de Pavimento Rigido
Se continua con corte de Placas en concreto Rigido.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

29-11-23
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 1 trompos, Cortadora, Pajuela, Volqueta.
Personal: Director, Residente, Topografo, Almacenista, SSo, Vigilante.
Se inicia excavación construcción de box.
Se continua Fundida de 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con el corte de Placas en concreto Rigido

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

30-11-23.
Estado Clima: Seco.
Se continua construcción Cuneta, 50ml de Pav. Rigido, corte de Placas de concreto rigido.

Luis Hoyos A. Contratista.
David Lopez D. Interventor

#AbriendoCampoAl Desarrollo
Eliseo Barraza
Alcalde 2020 - 2023
Abriendo Campo al Desarrollo CONCORDIA - MAGDALENA

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

El contratista avanza con un porcentaje de ejecución acumulado del 70% a corte del de Octubre del año 2023. El avance programado es de 67% a corte del 31 de octubre del año 2023.
No se presentan atrasos en la ejecución.

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

BITACORA DE OBRA MES NOVIEMBRE
SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL
MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS MES DE OCTUBRE
Se anexa INFORME DE INTERVENTORIA DE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REUNION VISITA TECNICA ENTERRITORIO
SE ANEXA DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE MODIFICATORIA.

- SUPERVISOR

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

REINALDO JUNIOR CERVANTES CARRANZA
Secretario de Infraestructura
Supervisor Entidad Ejecutora

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:
GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ
