CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 04 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	RITA ALVAREZ DE LA HOZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO. (Si aplica)	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	FECHA REINICIOS	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$671,844,375.00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	Avance Financiero del periodo (%)	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	Avance Físico Acumulado (%)	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria: *Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:*	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024

5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	**$2.300.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$2.300.000.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$2.300.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO
Mayo	$12.155.720,00	PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO
Junio		PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**				**VALOR TOTAL CONTRATO**	
(Tipo y No. Contrato)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				**$671.838.375,00**	
Nombre contratista	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA					
Fecha Firma del contrato	16/06/2023					
Plazo contrato	7 MESES					
Fecha del acta de inicio del contrato	18 DE JULIO DE 2023					
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A					
Fecha Inicial Terminación Contrato	18 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		N/A		
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**		**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$335.919.187,00			
PRIMER PAGO						
SEGUNDO PAGO						
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)						
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)						
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$335.919.187,00 ANTICIPO**			
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**			

#AbriendoCampoAl Desarrollo

	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
POLIZA No 85-44-101122304	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	28 de junio de 2023	Cumplimiento	$67.183.837,50	16/06/2023	16/05/2024
	28 de junio de 2023	Pagos de salarios, prestaciones	$134.367.675,00	16/06/2023	16/01/2027
	28 de junio de 2023	Calidad del servicio	$134.367.675,00	16/01/2024	16/01/2029
	28 de junio de 2023	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$335.919.187,50	16/06/2023	16/05/2024
ESTADO DEL CONTRATO			**FIRMA DE CONTRATO**		

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DEL INFORME	
		DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
1	*SE ANEXA INFORME DE INTERVENTORIA*	**18/07/2023**	**31/07/2023**

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
(Tipo y No. Contrato)	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		$9.765.000.033,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH	REP. LEGAL ALEJANDRO MEJIA BERMONT	
Fecha Firma del contrato		05 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato		7 meses	
Fecha del acta de inicio del contrato		18 DE JULIO DE 2023	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		Por determinar	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	18 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	Por determinar

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$1.953.000.007,00	318362	30 DE JULIO 2023
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			$1.953.000.007,00 ANTICIPO		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			(PORCENTAJE)		

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	27 DE JUNIO DE 2023	Cumplimiento del contrato	$976.500.004,00	05/06/2023	10/05/2024
		Estabilidad y calidad de las obras	$1.953.000.007,00	05/06/2023	05/06/2028
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.007,00	05/06/2023	10/05/2024
		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.004,00	05/06/2023	10/01/2027
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No 4000243	27 DE JUNIO DE 2023	AMPAROS ADICIONALES	$580.000.000	05/06/2023	10/01/2023

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	8%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	8%
% AVANCE PROGRAMADO	6%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

Las actividades reportadas por la interventoría corresponden a actividades previas necesarias para iniciar la ejecución de las obras.

- INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR. La Secretaría de Planeación firma acta de inicio con fecha 18 de julio de 2023. Se le solicita a la firma contratista a través de la interventoría la entrega de la programación de obra inicial. La firma contratista remite su programación de obra. CONTRATO DE INTERVENTORIA: Se firma Acta de inicio de interventoría el pasado 18 de julio del año 2023. La interventoría inicia sus actividades de supervisión. Las actividades aprobadas por la interventoría en este periodo son: • Instalación de valla informativa • Se inicia actividad de limpieza y descapote en la vía necesarias para dar cumplimiento al ancho de vía que se va a construir • La firma contratista realiza el traslado de maquinaria a campo se cuenta con una motoniveladora en el sector • La firma contratista realiza la instalación de las señales preventivas de obra • La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica


#AbriendoCampoAl Desarrollo

CONTRATO DE OBRA:


Se firma Acta de inicio de obra el pasado 18 de Julio del año 2023. La firma contratista inicia sus actividades de obra:

- La firma contratista realiza instalaron de señales preventivas.
- Limpieza y descapote de la via
- La firma contratista realiza el traslado de maquinaria a la zona.
- La firma contratista realiza la INSTALACION DE LA VALLA.
- La firma contratista realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo.

PROGRAMACION

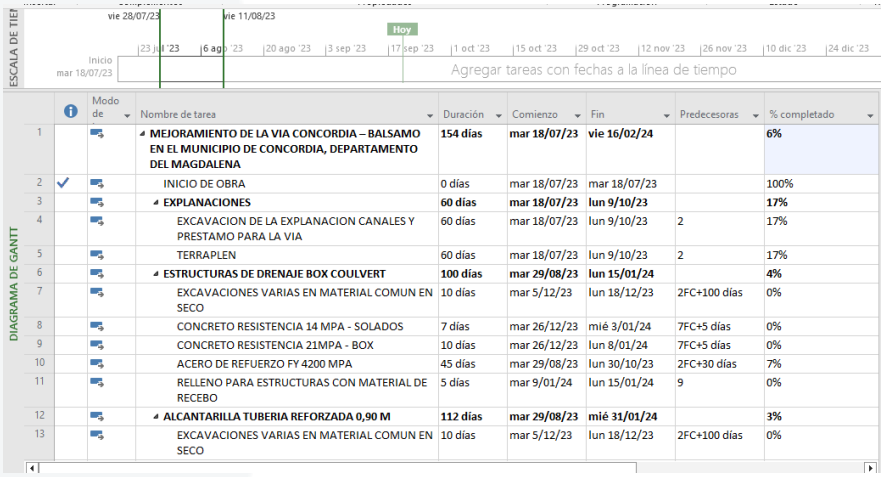

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1		**MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**	**154 días**	**mar 18/07/23**	**vie 16/02/24**		**6%**
2		INICIO DE OBRA	0 días	mar 18/07/23	mar 18/07/23		100%
3		**EXPLANACIONES**	**60 días**	**mar 18/07/23**	**lun 9/10/23**		**17%**
4		EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	17%
5		TERRAPLEN	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	17%
6		**ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT**	**100 días**	**mar 29/08/23**	**lun 15/01/24**		**4%**
7		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%
8		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	7FC+5 días	0%
9		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	10 días	mar 26/12/23	lun 8/01/24	7FC+5 días	0%
10		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	7%
11		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/01/24	lun 15/01/24	9	0%
12		**ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M**	**112 días**	**mar 29/08/23**	**mié 31/01/24**		**3%**
13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%

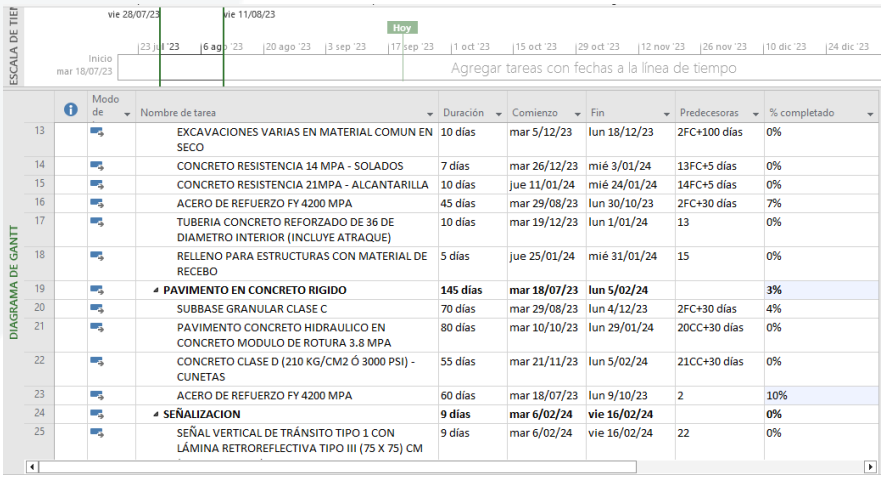

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%
14		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	13FC+5 días	0%
15		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA	10 días	jue 11/01/24	mié 24/01/24	14FC+5 días	0%
16		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	7%
17		TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	10 días	mar 19/12/23	lun 1/01/24	13	0%
18		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	jue 25/01/24	mié 31/01/24	15	0%
19		**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO**	**145 días**	**mar 18/07/23**	**lun 5/02/24**		**3%**
20		SUBBASE GRANULAR CLASE C	70 días	mar 29/08/23	lun 4/12/23	2FC+30 días	4%
21		PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	80 días	mar 10/10/23	lun 29/01/24	20CC+30 días	0%
22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	55 días	mar 21/11/23	lun 5/02/24	21CC+30 días	0%
23		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	10%
24		**SEÑALIZACION**	**9 días**	**mar 6/02/24**	**vie 16/02/24**		**0%**
25		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	9 días	mar 6/02/24	vie 16/02/24	22	0%


REGISTRO FOTOGRAFICO

- Instalación Valla Informativa



- Instalación de señales verticales



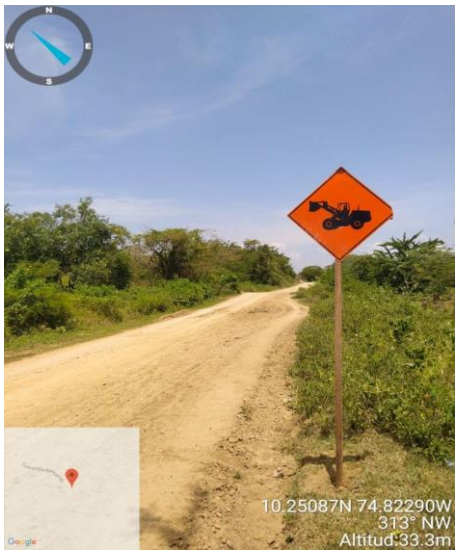




- Limpieza y descapote de vía



ESTADO DEL CLIMA

	ESTADO DEL CLIMA													
ESTADO DEL CLIMA	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
SECO				X						X	X	X		X
NUBLADO	X	X							X					
LLUVIA MODERADO					X		X							
LLUVIA INTENSA								X						

BITACORA DE OBRA

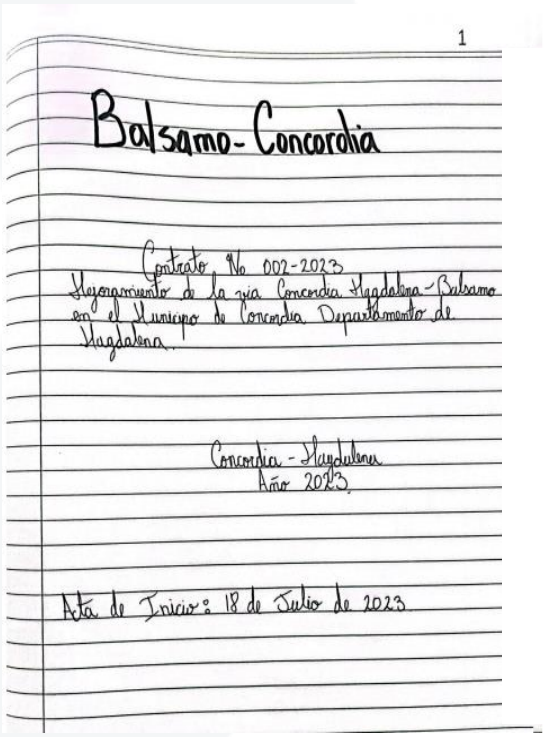

1

Balsamo - Concordia

Contrato No 002-2023
Mejoramiento de la via Concordia Magdalena - Balsamo en el Municipio de Concordia Departamento del Magdalena.

Concordia - Magdalena
Año 2023.

Acta de Inicio: 18 de Julio de 2023

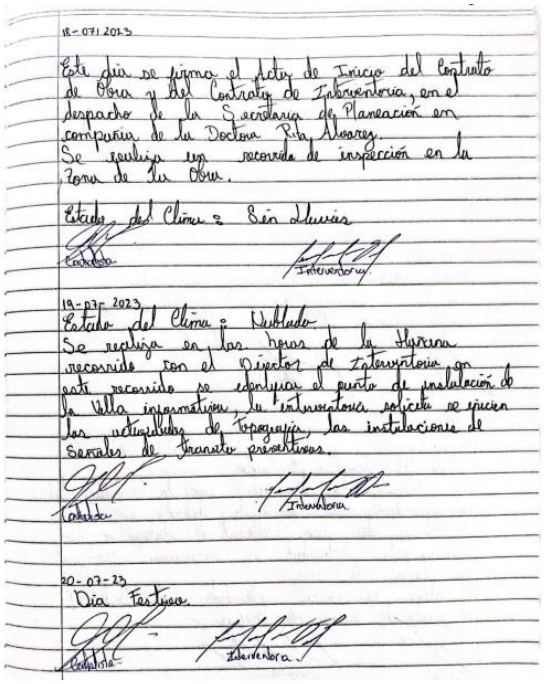
18-07-2023
Este dia se firma el acta de Inicio del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoria, en el despacho de la Secretaria de Planeación en compañia de la Doctora Pita Alvarez.
Se realiza un recorrido de inspección en la Zona de las Obras.
Estado del Clima: Sin Lluvias
Contratista
Interventoria

19-07-2023
Estado del Clima: Nublado.
Se realiza en las horas de la Mañana recorrido con el Director de Interventoria en este recorrido se continuar el punto de poblacion de la Villa inmaculada, la interventoria solicita se ejecuten las actividades de Topografia, las instalaciones de Señales de Transito preventivas.
Contratista
Interventoria

20-07-23
Dia Festivo
Contratista
Interventora.

#AbriendoCampoAl Desarrollo

4

21-07-23
Estado del Clima: Soleado
Este día, se reúnen con el traslado de Uruguaney (Natanuelalena) al Terrero, se realiza la Instalación de la Valla, respectivamente. Se inicia limpieza para el punto de Almacen

22-07-23
Estado del Clima: Lluvias Moderadas
Por las lluvias no es posible realizar intervenciones el día de hoy.

24-07-23
Estado del Clima: Soleado
Se inicia las labores con la Motoniveladora correspondiente a descarpote, debido a la presencia del grupo Natanuel de Trabajo en la Zona para Actividades de Limpieza en toda la vía. Paralelo se inicia actividades de Corte y Figurado de Aros de Refuerzo.

25-07-23
Estado del Clima: Llovizna en todo el Día. No se logro realizar actividades debido a las lluvias presentadas en la zona.

26-07-23
Estado del Clima: Variado
Se continua con las actividades de descapote con Uruguay (Natanuelalena). Se inician las actividades de Instalación de Señales preventivas en todos los frentes de intervención.

27-07-23
Estado del Clima: Soleado
Se continuan con las actividades de limpieza y descapote con Uruguay (Natanuelalena), se continua con la instalación de Señales preventivas verticales en todos frentes.

28-07-23
Estado del Clima: Soleado
Se continuan con las actividades de limpieza y Descapote.

Powered by CamScanner

6

28-07-23
Estado del Clima: Soleado

Se continuan las actividades de limpieza y Descapote con Uruguay (Natanuelalena) Se continua con la adecuación del Almacen y con la instalación de Señales Verticales.

31-07-23
Estado del Clima: Soleado

Se realiza comité por Covid por solicitud de la Interventoria, en donde Solicita el inicio de las Actividades de Cortes topograficos para poder realizar los Niveles con el fin de generar la Construcción de Terraplen, así mismo y especial que exista en campo Personaje de Natanuelalena para dar cumplimiento a la programación.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:
La entidad ejecutora cumple a satisfacción los plazos y actividades definidas en el cronograma del proyecto de conformidad con el contrato especifico y en estricto respeto de las disposiciones legales.

A la fecha de este informe la interventoría reporta un avance del 8% correspondiente a actividades preliminares

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
	N/A	N/A
		N/A

- SUPERVISOR
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

RITA ALVAREZ DE LA HOZ
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:
- ACTA DE INICIO FIRMADA

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:
GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ
