CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 05 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	RITA ALVAREZ DE LA HOZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)		

ESPECIFICO. (Si aplica)			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	FECHA REINICIOS	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$671,844,375.00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	Avance Financiero del periodo (%)	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	Avance Físico Acumulado (%)	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria: *Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del*	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024

siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	$2.300.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			$2.300.000.000,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$2.300.000.000,00

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO
Mayo	$12.155.720,00	PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO
Junio		PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
(Tipo y No. Contrato)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	**$671.838.375,00**
Nombre contratista	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA	
Fecha Firma del contrato	16/06/2023	
Plazo contrato	7 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	18 DE JULIO DE 2023	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha Inicial Terminación Contrato	18 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** N/A

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$335.919.187,00	1	AGOSTO
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$335.919.187,00 ANTICIPO**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		
		AMPAROS		**VIGENCIAS**	

	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
POLIZA No 85-44-101122304	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	28 de junio de 2023	Cumplimiento	$67.183.837,50	16/06/2023	16/05/2024
	28 de junio de 2023	Pagos de salarios, prestaciones	$134.367.675,00	16/06/2023	16/01/2027
	28 de junio de 2023	Calidad del servicio	$134.367.675,00	16/01/2024	16/01/2029
	28 de junio de 2023	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$335.919.187,50	16/06/2023	16/05/2024
ESTADO DEL CONTRATO			**FIRMA DE CONTRATO**		

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DEL INFORME	
		DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
1	*SE ANEXA INFORME DE INTERVENTORIA*	**18/07/2023**	**31/07/2023**
2	*INFORME DE INTERVENTORIA No 2*	**01/08/2023**	**31/08/2023**

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
(Tipo y No. Contrato)	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		$9.765.000.033,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH	REP. LEGAL ALEJANDRO MEJIA BERMONT	
Fecha Firma del contrato		05 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato		7 meses	
Fecha del acta de inicio del contrato		18 DE JULIO DE 2023	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		Por determinar	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	18 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		Por determinar	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$1.953.000.007,00	318362	30 DE JULIO 2023
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			$1.953.000.007,00 ANTICIPO		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			(PORCENTAJE)		

PÓLIZA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	27 DE JUNIO DE 2023	Cumplimiento del contrato	$976.500.004,00	05/06/2023	10/05/2024
		Estabilidad y calidad de las obras	$1.953.000.007,00	05/06/2023	05/06/2028
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.007,00	05/06/2023	10/05/2024
		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.004,00	05/06/2023	10/01/2027
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No 4000243	27 DE JUNIO DE 2023	AMPAROS	$580.000.000	05/06/2023	10/01/2023

		ADICION ALES			

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	7%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	15%
% AVANCE PROGRAMADO	19%
ATRASO	4%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

Las actividades reportadas por la interventoría corresponden a actividades previas necesarias para iniciar la ejecución de las obras.

- INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR.

La Secretaría de Planeación realiza la supervisión de las actividades avaladas por la interventoría, la firma contratista logra un avance a corte del 31 de agosto de 15%, en este periodo la firma contratista ejecuta actividades correspondientes a extendido y compactación de la subbase granular tipo C, armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento en concreto rígido Construcción de terraplén en puntos críticos, a la fecha el contratista presenta un atraso de 4% debido a la problemática presentada en el ingreso de materiales de construcción por las dificultades del paso del rio, ocasionando atrasos en el cumplimiento de la programación establecida.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Las actividades aprobadas por la interventoría en este periodo son:

- Se inician las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C.
- Se inician actividades de construcción de terraplén con comisión topográfica en los 3 tramos críticos a intervenir.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica.

CONTRATO DE OBRA:

La firma contratista realiza actividades correspondientes a:

- Se inician las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C.
- La firma contratista inicia las actividades de construcción de terraplén en los 3 tramos a intervenir.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica

Se presentan atrasos en la ejecución de las actividades de obra por las dificultades en el transporte de los materiales una vez se llega al paso del rio, debido a la falta permanente del servicio de ferry en la zona, esta situación ha generado retrasos en el cumplimiento de la programación a la fecha se presenta un porcentaje de atraso del 4% según el avance programado.

PROGRAMACION DE OBRA



Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	**154 días**	**mar 18/07/23**	**vie 16/02/24**		**19%**
	INICIO DE OBRA	0 días	mar 18/07/23	mar 18/07/23		100%
	EXPLANACIONES	**60 días**	**mar 18/07/23**	**lun 9/10/23**		**55%**
	EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	55%
	TERRAPLEN	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	55%
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT	**100 días**	**mar 29/08/23**	**lun 15/01/24**		**4%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%
	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	7FC+5 días	0%
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	10 días	mar 26/12/23	lun 8/01/24	7FC+5 días	0%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	7%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/01/24	lun 15/01/24	9	0%
	ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M	**112 días**	**mar 29/08/23**	**mié 31/01/24**		**3%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%


#AbriendoCampoAl Desarrollo



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	7%
TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	10 días	mar 19/12/23	lun 1/01/24	13	0%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	jue 25/01/24	mié 31/01/24	15	0%
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	**145 días**	**mar 18/07/23**	**lun 5/02/24**		**14%**
SUBBASE GRANULAR CLASE C	70 días	mar 29/08/23	lun 4/12/23	2FC+30 días	4%
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	80 días	mar 10/10/23	lun 29/01/24	20CC+30 días	0%
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	55 días	mar 21/11/23	lun 5/02/24	21CC+30 días	0%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	55%
SEÑALIZACION	**9 días**	**mar 6/02/24**	**vie 16/02/24**		**0%**
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	9 días	mar 6/02/24	vie 16/02/24	22	0%

AVANCE EJECUTADO VS AVANCE PROGRAMADO

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
TERRAPLEN	3323	$854.672.277,00	35%	55%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	1400	$450.051.000,00	40%	4%
ACERO DE REFUERZO FY 4200MPA	22056	$204.723.792,00	30%	55%
TOTAL		**$1.509.447.069,00**	**15%**	**19%**

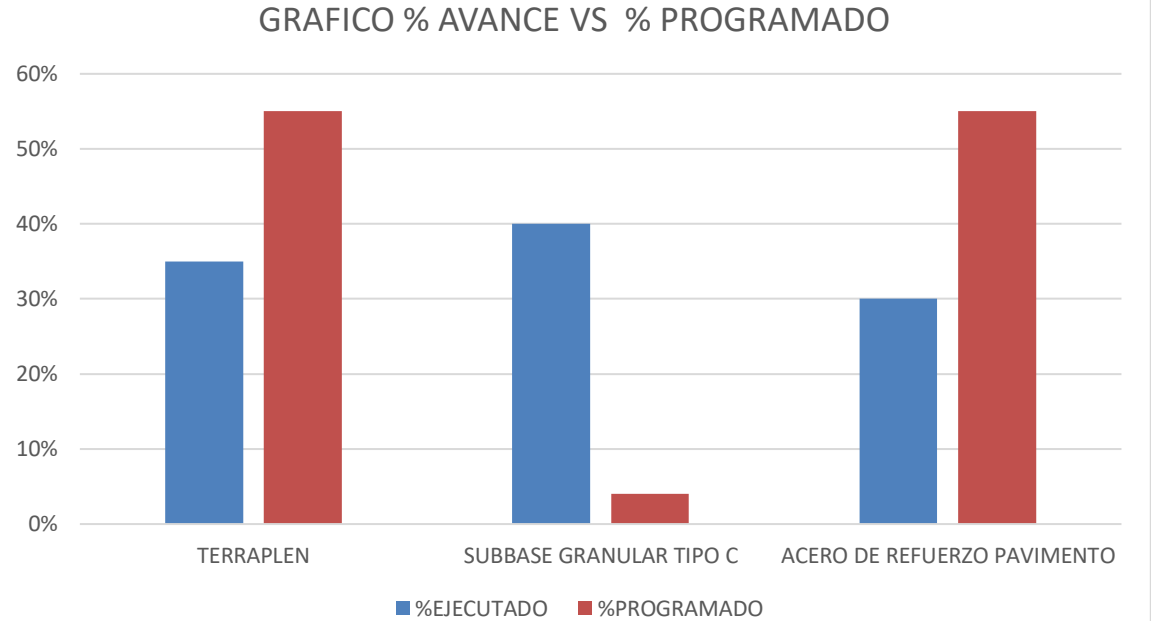

MEMORIAS DE CANTIDADES.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4.1 — DESCRIPCION: SUBBASE GRANULAR CLASE C — UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
SUBBASE GRANULAR TIPO C	1333,33333	7	0,15	1400,00	M3	1.400,00
					TOTAL	1.400,00

ESQUEMA



CONTRATISTA | INTERVENTORIA | SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4,4	DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	UNIDAD	kg

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Aacero de refuerzo				22056,00	kg	22.056,00
					TOTAL	22.056,00

ESQUEMA



CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	1,2	DESCRIPCION	SUBBASE GRANULAR CLASE C	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
TERRAPLEN	949,428571	7	0,5	3323,00	M3	3.323,00
					TOTAL	3.323,00

ESQUEMA



CONTRATISTA INTERVENTORIA SUPERVISION

#AbriendoCampoAl Desarrollo

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Conformación de terraplén



- Instalación de subbase granular tipo C



#AbriendoCampoAl Desarrollo





#AbriendoCampoAl Desarrollo

- Armado y figurado de Acero de Refuerzo






#AbriendoCampoAl Desarrollo



#AbriendoCampoAl Desarrollo

BITACORA DE OBRA

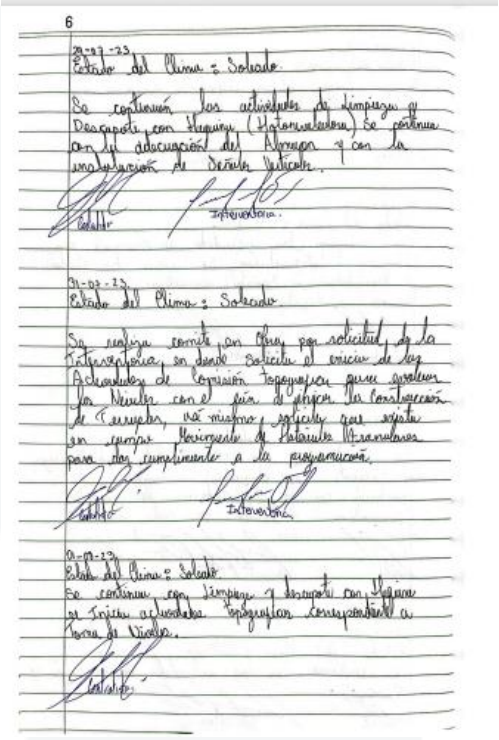

6

28-07-23
Estado del Clima : Soleado

Se continuan las actividades de limpieza y Descapote con Maquina (Retroexcavadora) Se continua con la adecuación del Terreno y con la instalación de Señal Vertical.

Contratista Interventoria.


31-07-23
Estado del Clima : Soleado

Se realiza remate con Oficio por solicitud de la Interventoria, en donde Solicita el inicio de las Actividades de Comisión Topografica para realizar las Niveles con el fin de proceder la Construcción de Cunetas, de mismo, solicita que siempre Mantengamos el Botalón Ambientales para dar cumplimiento a la programación.

Contratista Interventoria.

01-08-23
Estado del Clima : Soleado
Se continua con limpieza y descapote con Maquina se realizo actividades topograficas correspondiente a Toma de Niveles.

Contratista

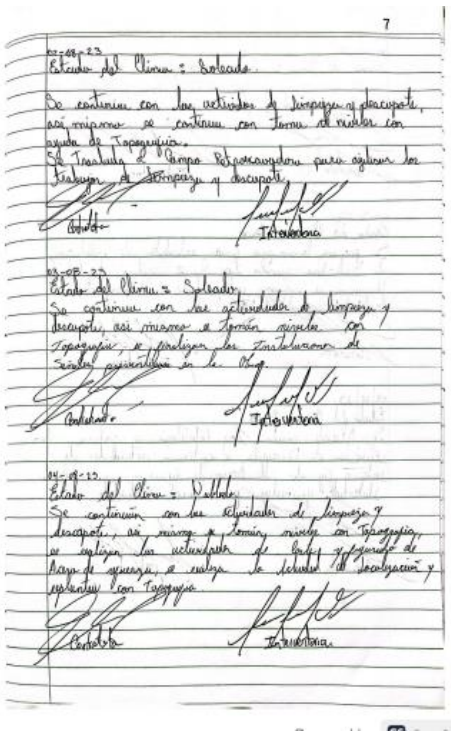

7

02-08-23
Estado del Clima : Soleado

Se continua con las actividades de limpieza y descapote, asi mismo se continua con Toma de niveles con ayuda de Topografia.
El Trabajo se Tiempo Retroexcavadora para agilizar los Trabajos de limpieza y descapote.


Contratista Interventoria

03-08-23
Estado del Clima : Soleado
Se continua con las actividades de limpieza y descapote, asi mismo a horas aprobe con Topografia, se realizan las Instalacion de Señal preventiva en la Obra.

Contratista Interventoria.

04-08-23
Estado del Clima : Nublado
Se continuan con las Actividades de limpieza y descapote, asi mismo se termina nivele con Topografia se realizan las actividades de Retiro y disposicion de Mayor de ganancia a cuenta de terreno de localización y replanteo con Topografia.

Contratista Interventoria.

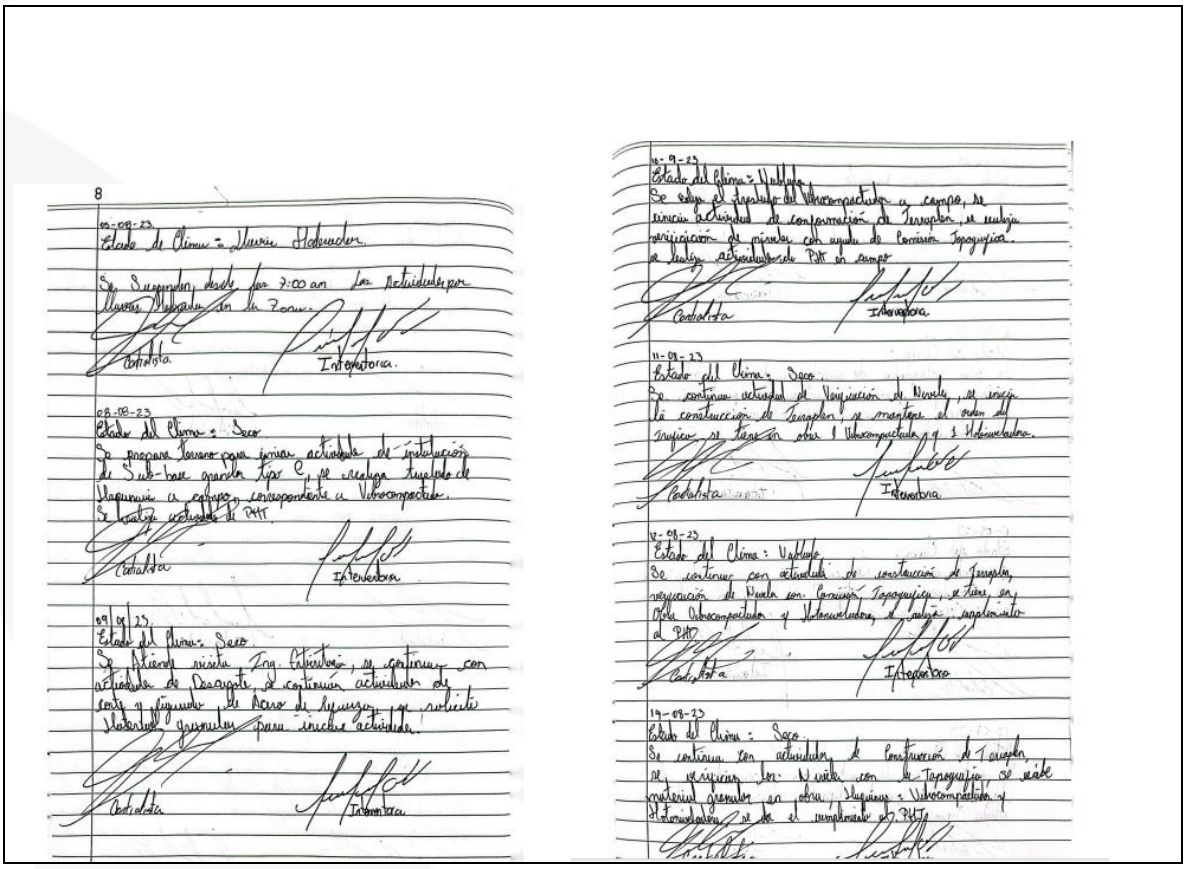

8

05-08-23
Estado del Clima: Lluvias Moderadas
Se suspenden desde las 7:00 am las actividades por lluvias Moderadas en la Zona.
Contratista. Interventoria.

08-08-23
Estado del Clima: Seco
Se preparo terreno para iniciar actividad de instalación de Sub-base granular tipo C y se realiza traslado de Maquinaria a campo correspondiente a Urbacompactos.
Se inician actividades de PMT.
Contratista Interventoria

09-08-23
Estado del Clima: Seco
Se ausenta visita Ing. Interventoria, se continuan con actividades de Descapote, se continuan actividades de corte y disposición de Acero de Refuerzo, se suspende Materiales requeridos para nuevas actividades.
Contratista Interventoria.


10-8-23
Estado del Clima: Lluvioso
Se retira el personal del Urbacompactos a campo, se continúa actividades de conformación de Terraplen, se realiza nivelación de niveles con equipo de Topografía.
se realiza actividades de PMT en campo
Contratista Interventoria.

11-08-23
Estado del Clima: Seco
Se continua actividad de Nivelación de Niveles, se realiza la construcción de Terraplen, se mantiene el orden del tramo se trabaja sobre 1 Urbacompactos y 1 Motoniveladora.
Contratista Interventoria.

12-08-23
Estado del Clima: Lluvioso
Se continuan con actividades de construcción de Terraplen, nivelación de Niveles con Topografía, se trabaja con (1) Urbacompactos y Motoniveladora, se realiza seguimiento al PMT
Contratista Interventoria

19-08-23
Estado del Clima: Seco
Se continua con actividades de Construcción de Terraplen, se realizan los Niveles con de Topografía, se lleva material granular en obra. Maquinaria: Urbacompactos y Motoniveladora se da el cumplimiento del PMT

#AbriendoCampoAl Desarrollo
Eliseo Barraza
Alcalde 2020 - 2023
Abriendo Campo al Desarrollo
CONCORDIA - MAGDALENA

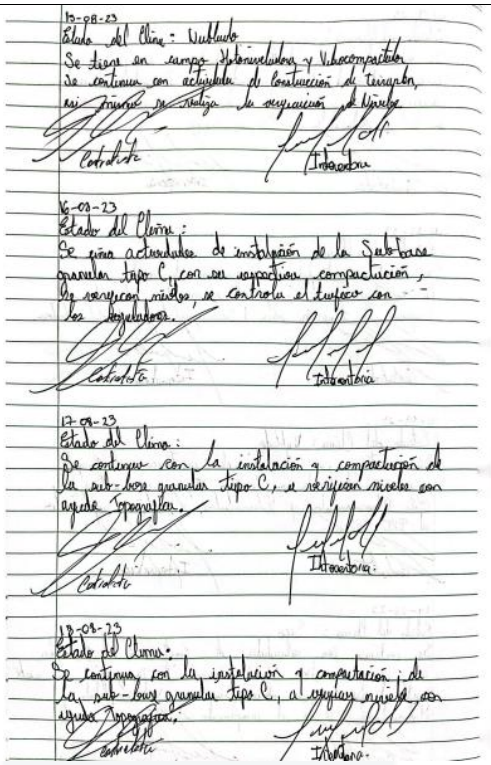
15-08-23
Estado del Clima: Nublado
Se tiene un campo Heterocelulosa y Heterocompactado se continua con actividades de construcción de Terraplen, asi mismo se realiza la conformación de Nivelar

Contratista Interventoria

16-08-23
Estado del Clima:
Se giran actividades de instalación de la Subbase granular tipo C, con su respectiva compactación, se conforman niveles, se controla el trafico con los Abanderados.


Contratista Interventoria

17-08-23
Estado del Clima:
Se continua con la instalación y compactación de la sub-base granular tipo C, se verifican niveles con ayuda Topografica.

Contratista Interventoria

18-08-23
Estado del Clima:
Se continua con la instalación y compactación de la sub-base granular tipo C, a vertidas niveles con ayuda Topografica.

Contratista Interventoria

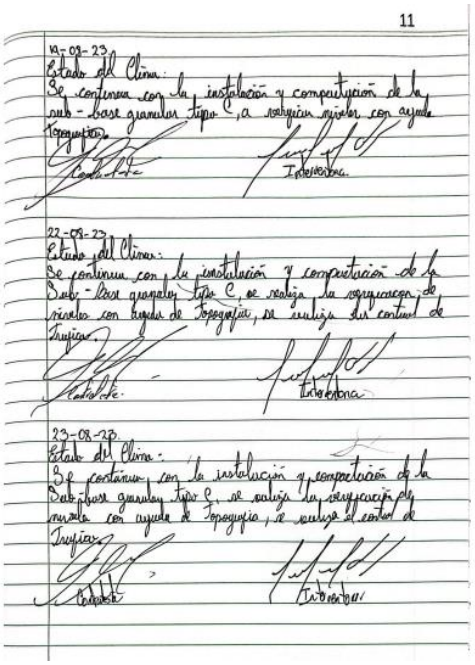
11

21-08-23
Estado del Clima:
Se continua con la instalación y compactación de la sub-base granular tipo C, a vertidas niveles con ayuda Topografica.

Contratista Interventoria

22-08-23
Estado del Clima:
Se continua con la instalación y compactación de la Subbase granular tipo C, se realiza la conformacion de niveles con ayuda de Topografia, se realiza el control de Trafico.

Contratista Interventoria

23-08-23
Estado del Clima:
Se continua con la instalación y compactación de la Subbase granular tipo C, se realiza la conformación de niveles con ayuda de Topografia, se realiza el control de Trafico.

Contratista Interventoria

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La firma contratista reporta un avance de ejecución de 15%, aprobado por la interventoría, se evidencia un atraso del 4% según el avance programado, estos atrasos se presentaron debido a las dificultades en el transporte del material por la falta de servicio de ferry en el paso del rio. La interventoría verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato.

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	N/A	N/A
		N/A

- SUPERVISOR

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

RITA ALVAREZ DE LA HOZ
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:
GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ

#AbriendoCampoAl Desarrollo
