INFORME MENSUAL No 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CONTRATO No MCM-CMA-002-2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
AÑO 2023

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".*
Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**				**VALOR TOTAL CONTRATO**	
(Tipo y No. Contrato)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				**$671.838.375,00**	
Nombre contratista	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA					
Fecha Firma del contrato	16/06/2023					
Plazo contrato	7 MESES					
Fecha del acta de inicio del contrato	18 DE JULIO DE 2023					
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A					
Fecha Inicial Terminación Contrato	18 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		N/A		
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**	
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$335.919.187,00	1	AGOSTO	
PRIMER PAGO						
SEGUNDO PAGO						
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)						
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)						
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$335.919.187,00 ANTICIPO**			

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				(PORCENTAJE)	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
POLIZA No 85-44-101122304	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	28 de junio de 2023	Cumplimiento	$67.183.837,50	16/06/2023	16/05/2024
	28 de junio de 2023	Pagos de salarios, prestaciones	$134.367.675,00	16/06/2023	16/01/2027
	28 de junio de 2023	Calidad del servicio	$134.367.675,00	16/01/2024	16/01/2029
	28 de junio de 2023	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$335.919.187,50	16/06/2023	16/05/2024
ESTADO DEL CONTRATO			**FIRMA DE CONTRATO**		

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

El presente contrato cuyo objeto el MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, tiene por objeto la construcción de 2,9KM de pavimento en concreto rígido.



INFORMACION GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

No. del contrato:	MCM-LP-002-2023
Tipo de contrato:	Licitación Pública de obra
Contratante:	Municipio de Concordia (Magdalena) Identificación Nit. No. 819.003.225-5
Contratista:	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Valor del contrato:	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES PESOS $9.765.000.033,00
Plazo del contrato:	Siete (07) meses
Interventoría	GRUPO TDA LTDA Rep Legal, STALIN GALVIS GARCIA
Supervisor:	Secretaria de Planeación
ACTA DE INICIO:	18 DE JULIO DEL AÑO 2023

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	27 DE JUNIO DE 2023	Cumplimiento del contrato	$976.500.004,00	05/06/2023	10/05/2024
		Estabilidad y calidad de las obras	$1.953.000.007,00	05/06/2023	05/06/2028
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.007,00	05/06/2023	10/05/2024
		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.004,00	05/06/2023	10/01/2027

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No 4000243	27 DE JUNIO DE 2023	AMPAROS ADICIONALES	$580.000.000	05/06/2023	10/01/2023

ACTA DE INICIO DE OBRA

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MCM-LP-002-2023

Entre los suscritos a saber, el Alcalde **ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS**, representante legal y ordenador del gasto, periodo 2020-2023 del Municipio de Concordia, Departamento del Magdalena, en adelante, **LA "ENTIDAD"**, por una parte; **UNION TEMPORAL CONCORDIA JH** proponente plural identificado con el Nit No. 901719615-5, representado legalmente por **ALEJANDRO MEJIA BERMONT** de CC No. 75.092.957 expedida en Manizales, en adelante **EL "CONTRATISTA",** y GRUPO TDA LTDA identificado con Nit. No. 900.136.753-7, representado legalmente por **STALIN GALVIS GARCIA** de CC No 15.174.303 expedida en Valledupar en adelante **EL "INTERVENTOR",** nos hemos reunido para suscribir la presente acta que da inicio formal al contrato de las especificaciones que se detallan más adelante. Se deja constancia que se encuentra presente la **Dra. RITA ALVAREZ DE LA HOZ** en calidad de **Secretaria de Planeación** Municipal y Supervisor por el Municipio del contrato de obra pública MCM-LP-002-2023, quien para efectos del presente documento se denominará **LA SECRETARIA.** El acta inicial corresponde al contrato:

No. del contrato:	MCM-LP-002-2023
Tipo de contrato:	Licitación Pública de obra
Contratante:	Municipio de Concordia (Magdalena)
Identificación	Nit. No. 819.003.225-5
Contratista:	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH
R/ Legal	Alejandro Mejía Bermont
Objeto del contrato:	EL CONTRATISTA, se obliga para con EL MUNICIPIO al "MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA-BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA"
Valor:	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES PESOS M/L ($9.765.000.033,00), equivalentes a 8.418,103 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2.023)
Plazo:	Siete (7) meses
Interventoría:	GRUPO TDA LTDA
R/ legal	Stalin Galvis García
Supervisor:	Secretario de Planeación
Disponibilidad presupuestal	Número: 2023.ALC.01.000100 Fecha: Marzo 07 del 2023 Valor: $10.112.886.452,00
Registro Presupuestal	Número: 2023.ALC.01.000302 Fecha: Junio 05 del 2023 Valor: $9.765.000.033,00
Garantía única de cumplimiento	POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4000783

#AbriendoCampoAl Desarrollo

	Nombre de amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Suma asegurada**
	Cumplimiento del contrato	05/06/2023	10/05/2024	$ 976.500.004
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	05/06/2023	05/06/2028	$ 1.953.000.007
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/06/2023	10/01/2027	$976.500.004
	Estabilidad y calidad de las obras	Cinco (5) años, cero (0) meses, cero (0) días		$1.953.000.007
Garantía Responsabilidad civil extracontractual	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL No. 4000243**			
	Nombre de amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Suma asegurada**
	Predios, labores u operaciones patronal Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios Vehículos No propios Extrapatrimoniales Lucro Cesante Daño emergente Cruzada Gastos médicos	05/06/2023	10/01/2024	$580.000.000
Fecha de inicio	Julio 18 de 2023			

Para mayor constancia, se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

CONTRATANTE

ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS
Alcalde
Municipio de Concordia Magdalena

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL CONCORDIA JH
Nit. No. 901719615-5
R/L. Alejandro Mejía Bermont
C. C. No. 75.092.957 de Manizales

INTERVENTOR CONTRATO

GRUPO TDA LTDA
Nit. No. 900.136.753-7
R/ L. Stalin Galvis García
C. C. No. 15.174.303 de Valledupar

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

RITA ALVAREZ DE LA HOZ
Secretaria de Planeación
Municipio de Concordia

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA:

La firma contratista inicia sus actividades de obra las cuales son aprobadas por esta interventoría:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C.
- La firma contratista continua las actividades de construcción de terraplén en los 3 tramos a intervenir.
- Se continua con el armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento rígido.
- Se iniciaron las actividades de construcción de pavimento en concreto rígido.
- Se iniciaron las actividades de corte de placas.
- Se iniciar las actividades de construcción de cunetas en concreto.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica

PROGRAMACION

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	**154 días**	**mar 18/07/23**	**vie 16/02/24**		**58%**
	INICIO DE OBRA	0 días	mar 18/07/23	mar 18/07/23		100%
	EXPLANACIONES	**60 días**	**mar 18/07/23**	**lun 9/10/23**		**100%**
	EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
	TERRAPLEN	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT	**100 días**	**mar 29/08/23**	**lun 15/01/24**		**56%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%
	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	7FC+5 días	0%
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	10 días	mar 26/12/23	lun 8/01/24	7FC+5 días	0%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	96%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/01/24	lun 15/01/24	9	0%
	ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M	**112 días**	**mar 29/08/23**	**mié 31/01/24**		**50%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	96%
	TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	10 días	mar 19/12/23	lun 1/01/24	13	0%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	jue 25/01/24	mié 31/01/24	15	0%
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	**145 días**	**mar 18/07/23**	**lun 5/02/24**		**44%**
	SUBBASE GRANULAR CLASE C	70 días	mar 29/08/23	lun 4/12/23	2FC+30 días	62%
	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	80 días	mar 10/10/23	lun 29/01/24	20CC+30 días	17%
	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	55 días	mar 21/11/23	lun 5/02/24	21CC+30 días	0%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
	SEÑALIZACION	**9 días**	**mar 6/02/24**	**vie 16/02/24**		**0%**
	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	9 días	mar 6/02/24	vie 16/02/24	22	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Conformación de terraplén



- Instalación de subbase granular tipo C







- Construcción de Pavimento en concreto rígido













- Construcción de Cunetas








- **AVANCE DE EJECUCION FISICA APROBADO**

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	20%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	45%
% AVANCE PROGRAMADO	58%
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**
ESTADO	**13% ATRASO**

A la fecha el contratista presenta un atraso de 13% debido a la problemática presentada en el ingreso de materiales de construcción por las dificultades del paso del rio, ocasionando atrasos en el cumplimiento de la programación establecida así mismo las fuertes lluvias presentadas en el mes de octubre generaron saturación en las vías lo cual ha dificultado el acceso.

AVANCE EJECUTADO VS AVANCE PROGRAMADO

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO
TERRAPLEN	6300M3	$1.620.353.700,00	66%	100%
SUBBASE GRANULAR TIPO C	2300M3	$739.369.500,00	66%	62%
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	1338M3	$1.559.103.162,00	37%	17%
CUNETAS	222,67M2	$230.713.286,00	35%	0%
ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO RIGIDO	25732,08KG	$238.845.176,00	35%	100%
TOTAL		**$4.388.384.824,00**	**45%**	**58%**

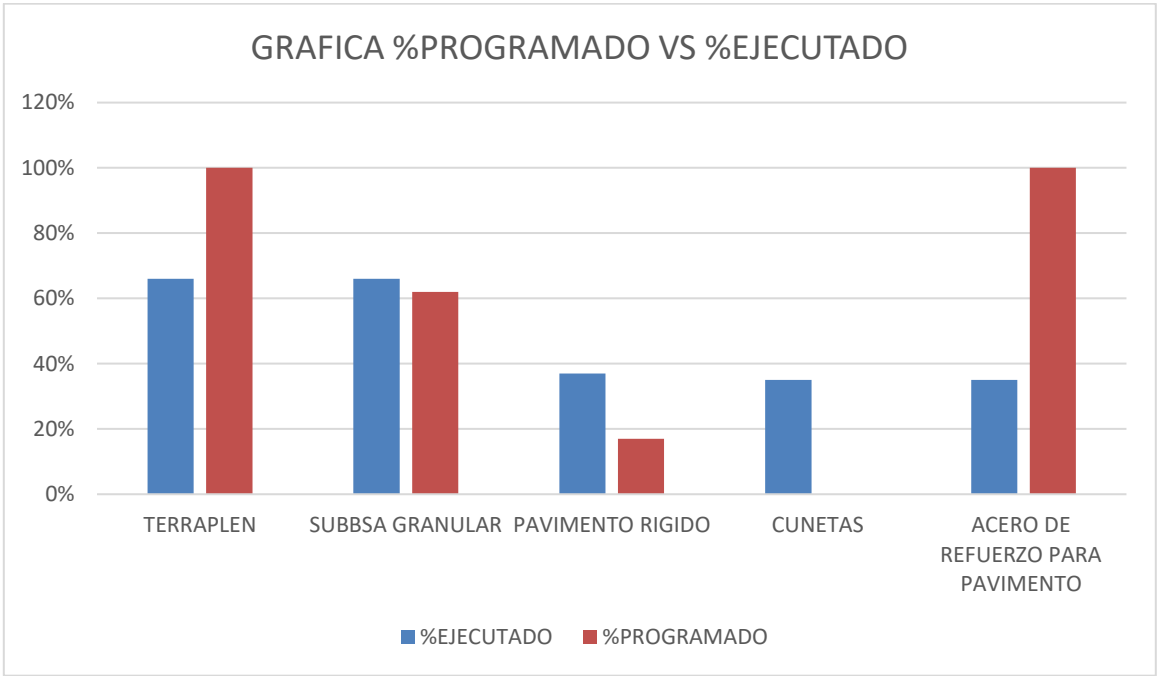

MEMORIAS DE CANTIDADES.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	1,2	DESCRIPCION	TERRAPLEN	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
TERRAPLEN	428,571429	7	0,5	1500,00	M3	1.500,00
					TOTAL	1.500,00

ESQUEMA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4,1	DESCRIPCION	SUBBASE GRANULAR CLASE C	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
SUBBASE GRANULAR TIPO C	476,190476	7	0,15	500,00	M3	500,00
					TOTAL	500,00

ESQUEMA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4,2	DESCRIPCION	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Largo	Ancho	Alto				
PAVIMENTO RIGIDO	2230	3	0,2	1338,00	M3	1.338,00	
					TOTAL	1.338,00	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4,2	DESCRIPCION	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Largo	Ancho	Alto				
CUNETAS	2120	0,7	0,15	222,67	M3	222,67	
					TOTAL	222,67	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4.4	DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	UNIDAD	kg

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Largo	Ancho	Alto				
Aacero de refuerzo				3676,08	kg	3.676,08	
					TOTAL	3.676,08	

CONTROL DE MAQUINARIA

CANTIDAD	***MAQUINARIA***
1	RETROEXCAVADORA
1	MOTONIVELADORA
2	TROMPOS
1	CORTADORA

CONTROL DE PERSONAL

CANTIDAD	***PERSONAL***
1	DIRECTOR DE OBRA
1	RESIDENTE
1	COMISION TOPOGRAFICA
1	SISO

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El contratista realizo la instalación de cada una de las señales de tránsito establecidas en el PMT dando cumplimiento así lo establecido en las especiaciones técnicas.

Se realiza la instalación de las señales de velocidad máxima permitida
Se realiza la instalación de la señal - INICIO DE OBRA Y FIN DE OBRA
Se realiza la instalación de señal - AUXILIAR DE TRANSITO
Se mantiene en campo el suministro de tubulares y/o barricadas
Se implementa el trabajo de auxiliar de tráfico con sus respectivas señales

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El contratista de obra ha ejecutado dentro del PMA

- Identificación de los usos potenciales de los recursos naturales del área de influencia del proyecto
- Propuestas estrategias que conduzcan al desarrollo sustentable y ambiental del área de influencia de la obra.

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS


- A la fecha la firma contratista a realizado 4 brigada de aseo con el personal de obra y comunidad.
- Se ha realizado la divulgación de información con ayuda de los volantes informativos
- Se ha realizado a la fecha 2 taller informativo con el equipo de trabajo.

Volantes informativos





BITACORA DE OBRA

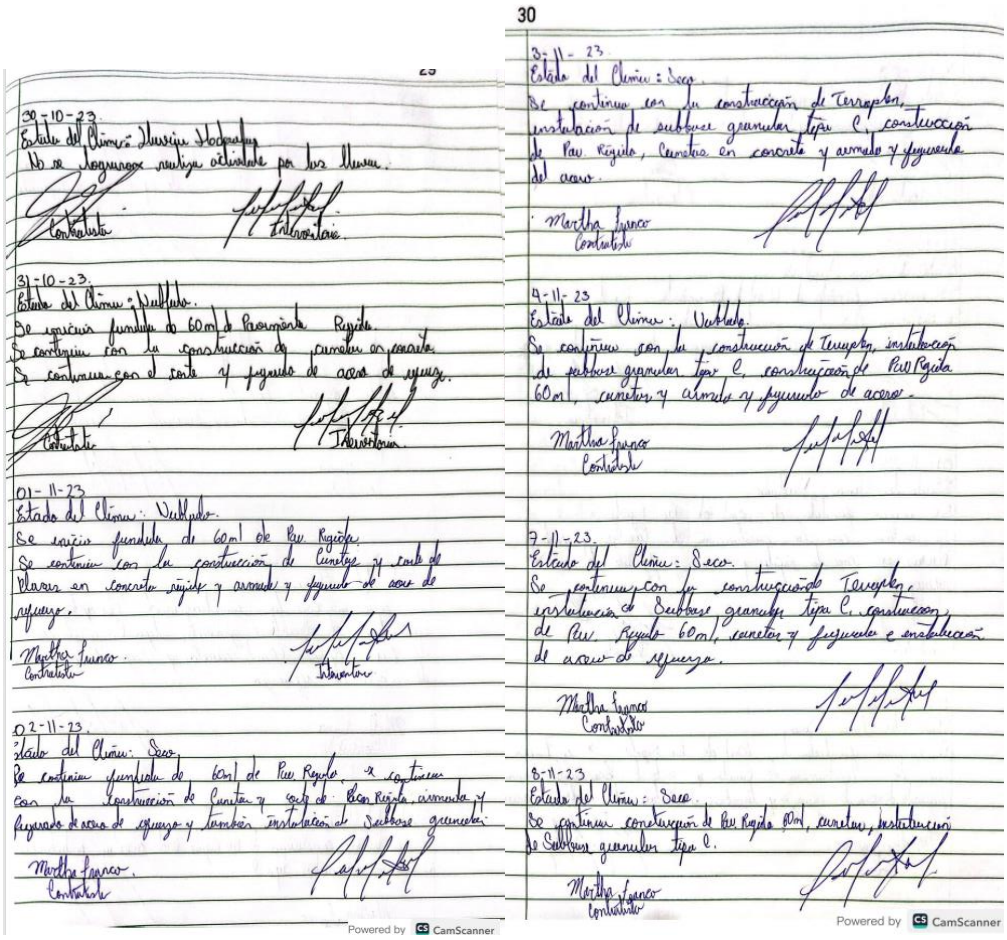

29

30-10-23.
Estado del Clima: Lluvioso Moderado
No se pudo realizar actividad por las lluvias.

Contratista | Interventoria

31-10-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se continuo con la construcción de cunetas en concreto.
Se continuo con el corte y fundido de acero de refuerzo.

Contratista | Interventoria

01-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuo con la construcción de Cunetas y corte de Placas en concreto rigido y armado y fundido de acero de refuerzo.

Martha Franco Contratista | Interventoria

02-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continuo fundido de 60m² de Pav Rigido. y continuo con la construcción de Cunetas y corte de Pavimento Rigido, armado y fundido de acero de refuerzo y tambien instalación de Subbase granular.

Martha Franco. Contratista

Powered by CamScanner

30

3-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuo con la construcción de Terraplen, instalación de subbase granular tipo C, construcción de Pav Rigido, cunetas en concreto y armado y fundido del acero.

Martha Franco Contratista

4-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuo con la construcción de Terraplen, instalación de subbase granular tipo C, construcción de Pav Rigido 60m², cunetas y armado y fundido de acero.

Martha Franco Contratista

7-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continuo con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular tipo C, construcción de Pav Rigido 60m², cunetas y fundido e instalación de acero de refuerzo.

Martha Franco Contratista

8-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continuo construcción de Pav Rigido 60m², cunetas, instalación de Subbase granular tipo C.

Martha Franco Contratista

Powered by CamScanner

9-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular Tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m. curados y fraguado e instalación de acero de refuerzo.

Martha Franco
Contratista

10-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular Tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m. curados, y fraguado e instalación de acero de refuerzo.

Martha Franco
Contratista

11-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de Subbase, granular tipo C, construcción de Pav Rigido 60m. curados, corte de placas, y armado y fraguado de Acero.

Martha Franco
Contratista

14-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m. curados, corte de placas, armado y fraguado de acero.

Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner

15-11-23
Estado del Clima: Nublado
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de subbase, armado y fraguado de acero, construccion 60m de Pav. Rigido, corte de Placas.

Martha Franco
Contratista

16-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase, armado y fraguado de acero, construccion de 70m de Pav. Rigido, corte de Placas.

Martha Franco
Contratista

17-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de Subbase Tipo C, armado y fraguado de acero construcción de 70m de Pav. Rigido, corte de Placas.

Martha Franco
Contratista

19-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan construccion de Terraplen, instalación de Subbase Tipo C, armado y fraguado de acero de construcción de 70m de Pav Rigido y corte de Placas.

Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner

20-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción del Terraplen
60 m/, instalación de subbase granular, figurado de cuneta de coronación,
cuneta de Pav. Rígido, construcción de Cunetas.

Matthew Franco
Contratista

21-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se continuan con el corte de plazoleta, instalación de Subbase y
conformación de Terraplen, construcción de Cunetas.
Se cierra jornada 3:00pm.

Matthew Franco
Contratista

22-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con el corte y figurado del cuneta, instalación de la
Subbase, conformación del Terraplen, construcción de Cunetas,
se cierra jornada a las 3:00pm.

Matthew Franco
Contratista

23-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua construcción de Subbase
construcción 50m/ Pav. Rígido.
Conformación Terraplen
Construcción de Cunetas.

Matthew Franco
Contratista

Powered by CamScanner

24-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav. Rígido 50m/
Construcción de Cunetas.

Matthew Franco
Contratista

25-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav. Rígido 50m/
Construcción de Cunetas.

Matthew Franco
Contratista

27-11-23.
Estado del Clima: Lluvia Fuerte.
No se logro ejecutar actividades.

Matthew Franco
Contratista

28-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuan con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav. Rígido 50m/
Construcción de Cunetas.

Matthew Franco
Contratista

Powered by CamScanner

29-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construcción de Pav. Rígido 60m!
Instalación de Subbase granular tipo C.
Construcción de Cunetas.
Conformación de Terraplen.

Martha Franco
Contratista

30-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continua con la construcción de Pav. Rígido de 60m!
Instalación de Subbase granular tipo C.
Construcción de Cunetas
Conformación de Terraplen

Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner

ESTADO DEL CLIMA

	ESTADO DEL CLIMA MES DE AGOSTO																												
ESTADO DEL CLIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SECO		X	X				X	X	X	X	X			X				X		X			X	X					X	X
NUBLADO	X			X											X	X	X				X	X			X			X		
LLUVIA MODERADO																											X			
LLUVIA INTENSA																											X			

Página 1

En el presente mes se evidencia un total de 01 días de lluvias moderas.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La firma contratista en este periodo presenta un avance total de 45% de actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, se evidencia un atraso del 13% según el avance programado. Una vez revisada la situación de los atrasos esta interventoría evidencia las dificultades en el transporte de los materiales una vez se llega al paso del rio, por falta permanente del servicio de ferry en la zona, esta situación ha generado retrasos en el cumplimiento de la programación, así mismo las lluvias presentadas en el mes anterior han generado dificultades para el ingreso de los materiales de obra.

Atentamente.

STALIN GALVIS
INTERVENTOR
GRUPO TDA LTDA
