CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 08 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	RITA ALVAREZ DE LA HOZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO

#AbriendoCampoAl Desarrollo
Eliseo Barraza Alcalde 2020 - 2023
Abriendo Campo al Desarrollo CONCORDIA - MAGDALENA

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO. (Si aplica)	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	FECHA REINICIOS	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$671,844,375.00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	Avance Financiero del periodo (%)	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	Avance Físico Acumulado (%)	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria: *Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:*	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024

5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	**$2.300.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$2.300.000.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$2.300.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	N/A
Mayo	$12.155.720,00	$13.331.480,00
Junio	$11.454.210,00	N/A
Julio	$1.372.761,00	$12.826.971,00
Agosto	$34.211,00	N/A
Septiembre	$14.159,00	N/A
Octubre	$12.994,00	n/a
Noviembre	N/A	N/A

#AbriendoCampoAl Desarrollo

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**				**VALOR TOTAL CONTRATO**
(Tipo y No. Contrato)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				**$671.838.375,00**
Nombre contratista	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA				
Fecha Firma del contrato	16/06/2023				
Plazo contrato	7 MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato	18 DE JULIO DE 2023				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA 22 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha Inicial Terminación Contrato	18 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		18 DE ABRIL DE 2024	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$335.919.187,00	1	AGOSTO
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					

(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$335.919.187,00 ANTICIPO**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		

	FECHA DE EXPEDICIÓN	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
POLIZA No 85-44-101122304	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	28 de junio de 2023	Cumplimiento	$67.183.837,50	16/06/2023	16/05/2024
	28 de junio de 2023	Pagos de salarios, prestaciones	$134.367.675,00	16/06/2023	16/01/2027
	28 de junio de 2023	Calidad del servicio	$134.367.675,00	16/01/2024	16/01/2029
	28 de junio de 2023	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$335.919.187,50	16/06/2023	16/05/2024
ESTADO DEL CONTRATO			**FIRMA DE CONTRATO**		

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*SE ANEXA INFORME DE INTERVENTORIA*	**18/07/2023**	**31/07/2023**
2	*INFORME DE INTERVENTORIA No 2*	**01/08/2023**	**31/08/2023**
3	*INFORME DE INTERVENTORIA No 3*	**01/09/2023**	**30/09/2023**
4	*INFORME DE INTERVENTORIA No 4*	**01/10/2023**	**31/10/2023**
5	*INFORME DE INTERVENTORIA No 5*	**01/11/2023**	**30/11/2023**
6	*INFORME DE INTERVENTORIA No 6*	**01/12/2923**	**31/12/2023**

#AbriendoCampoAl Desarrollo

➢ *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO	
(Tipo y No. Contrato)	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.			$9.765.000.033,00	
Nombre contratista	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH	REP. LEGAL ALEJANDRO MEJIA BERMONT			
Fecha Firma del contrato		05 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato		7 meses			
Fecha del acta de inicio del contrato		18 DE JULIO DE 2023			
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		OTRO SI NO 1 AL CONTRATO DE OBRA – 22 DE DICIEMBRE DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	18 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		18 DE ABRIL DE 2024	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$1.953.000.007,00	318362	30 DE JULIO 2023
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			$1.953.000.007,00 ANTICIPO		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			(PORCENTAJE)		

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
		Cumplimiento del contrato	$976.500.004,00	05/06/2023	10/05/2024

POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	27 DE JUNIO DE 2023	Estabilidad y calidad de las obras	$1.953.000.007,00	05/06/2023	05/06/2028
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.007,00	05/06/2023	10/05/2024
		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.004,00	05/06/2023	10/01/2027
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No 4000243	27 DE JUNIO DE 2023	AMPAROS ADICIONALES	$580.000.000	05/06/2023	10/01/2023

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	29%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	74%
% AVANCE PROGRAMADO	54%
ATRASO	
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

SE AJUSTA PROGRAMACION DE OBRA SEGÚN NUEVA FECHA DE TERMINACION – 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024.
EL %PROGRAMADO ES ARROJADO SEGÚN LA REPROGRAMACION No 1.

- INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR.

La Secretaría de Infraestructura realiza la supervisión de las actividades avaladas por la interventoría, la firma contratista logra un avance a corte del 31 de Diciembre de 2023 de 74%, en este periodo la firma contratista ejecuta actividades correspondientes a extendido y compactación de la subbase granular tipo C, armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento en concreto rígido, Construcción de terraplén en puntos críticos, construcción de cunetas, construcción de pavimento rígido, a la fecha el contratista ha presentado un avance significativo en las actividades debido a los atrasos presentados en los meses anteriores.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Las actividades aprobadas por la interventoría en este periodo son:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C en los 3 tramos a intervenir.
- Se continúan las actividades de construcción de terraplén con comisión topográfica en los 3 tramos críticos a intervenir.
- La firma contratista realiza corte y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento.
- Se inician actividades de construcción de pavimento en concreto rígido.
- Se inician actividades de construcción de cunetas en concreto.
- Se inicia actividades de corte de placas de concreto rígido.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica.

La interventoría firma y avala el tramite al acta parcial de obra No 3 de fecha 20 de diciembre de 2023.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	9.765.000.033,00
ANTICIPO 20%	$	1.953.000.007,00
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$	2.811.751.187,00
Amortizacion 20%	$	562.350.237,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL	$	2.249.400.950,00

CONTRATO DE OBRA:


La firma contratista realiza actividades correspondientes a:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C.
- La firma contratista continua las actividades de construcción de terraplén en los 3 tramos a intervenir.
- Se continua con el armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento rígido.


- Se iniciaron las actividades de construcción de pavimento en concreto rígido.
- Se iniciaron las actividades de corte de placas.
- Se iniciar las actividades de construcción de cunetas en concreto.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica

La firma contratista da cumplimiento al plan de contingencia presentando, por lo que se evidencia avance en las actividades programadas.
La firma contratista tramita Modificatoria No 1 al contrato de obra para que el mismo sea revisado y avalado por la interventoría, el pasado 22 de diciembre de 2023 se firma OTRO SI No 1 al contrato de obra y al contrato de interventoría.
El pasado 20 de diciembre de 2023 la firma contratista remite el acta parcial de obra No 3 a la firma interventoría para su respectiva revisión y/o aprobación.

PROGRAMACION DE OBRA

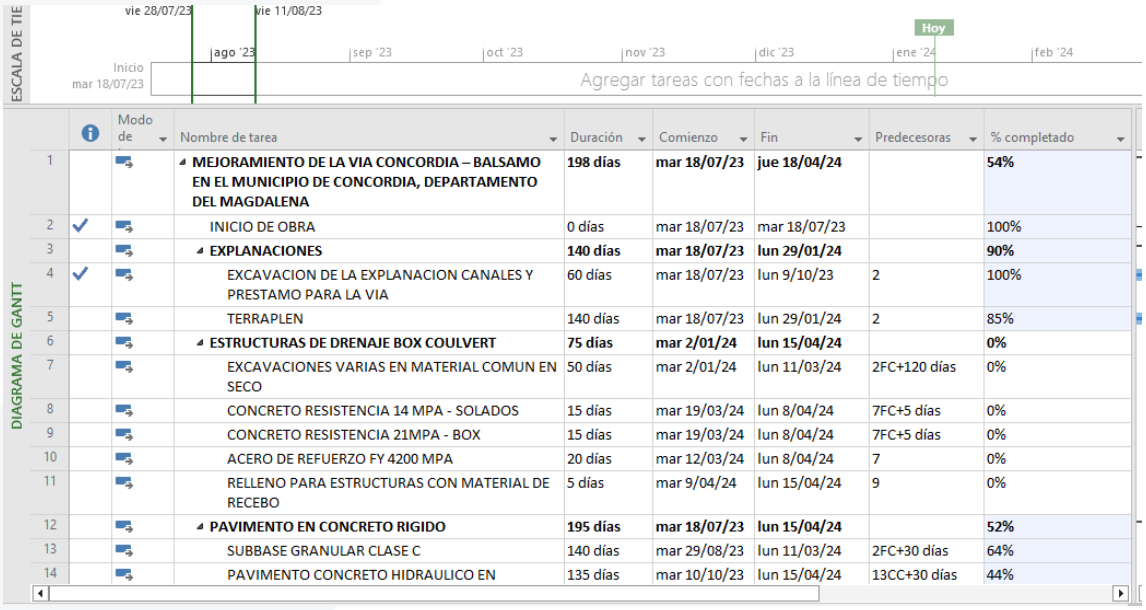

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1		**MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**	**198 días**	**mar 18/07/23**	**jue 18/04/24**		**54%**
2	✓	INICIO DE OBRA	0 días	mar 18/07/23	mar 18/07/23		100%
3		**EXPLANACIONES**	**140 días**	**mar 18/07/23**	**lun 29/01/24**		**90%**
4	✓	EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
5		TERRAPLEN	140 días	mar 18/07/23	lun 29/01/24	2	85%
6		**ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT**	**75 días**	**mar 2/01/24**	**lun 15/04/24**		**0%**
7		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	50 días	mar 2/01/24	lun 11/03/24	2FC+120 días	0%
8		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	15 días	mar 19/03/24	lun 8/04/24	7FC+5 días	0%
9		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	15 días	mar 19/03/24	lun 8/04/24	7FC+5 días	0%
10		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	20 días	mar 12/03/24	lun 8/04/24	7	0%
11		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	9	0%
12		**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO**	**195 días**	**mar 18/07/23**	**lun 15/04/24**		**52%**
13		SUBBASE GRANULAR CLASE C	140 días	mar 29/08/23	lun 11/03/24	2FC+30 días	64%
14		PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN	135 días	mar 10/10/23	lun 15/04/24	13CC+30 días	44%

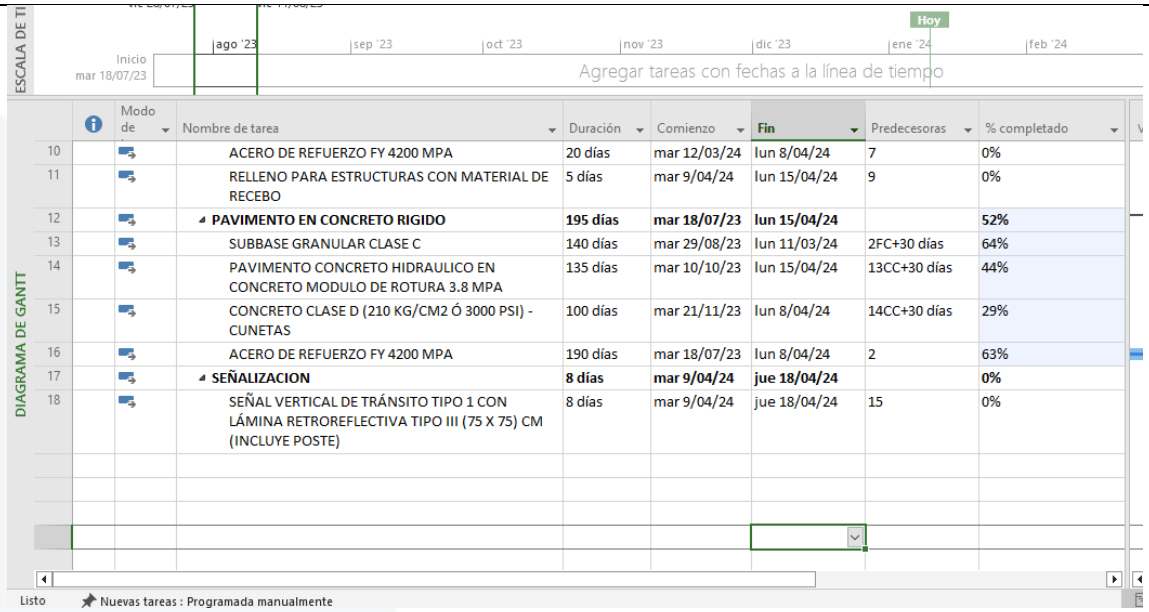

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
10		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	20 días	mar 12/03/24	lun 8/04/24	7	0%
11		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	9	0%
12		**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO**	**195 días**	**mar 18/07/23**	**lun 15/04/24**		**52%**
13		SUBBASE GRANULAR CLASE C	140 días	mar 29/08/23	lun 11/03/24	2FC+30 días	64%
14		PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	135 días	mar 10/10/23	lun 15/04/24	13CC+30 días	44%
15		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	100 días	mar 21/11/23	lun 8/04/24	14CC+30 días	29%
16		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	190 días	mar 18/07/23	lun 8/04/24	2	63%
17		**SEÑALIZACION**	**8 días**	**mar 9/04/24**	**jue 18/04/24**		**0%**
18		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	8 días	mar 9/04/24	jue 18/04/24	15	0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
TERRAPLEN	3211,29M3
SUBBASE GRANULAR CLASE C	350M3
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	1200M3
CUNETAS	230M3
ACERO DE FUERZO	25500KG
TOTAL	**29%**

En el mes de noviembre se dio un avance ejecutado del 29% alcanzando un avance ejecutado acumulado del 74%, así las cosas, programado de 54% SEGÚN REPORGRAMACION No 1.

RELACION ACTIVIDADES EJECUTADAS VS PROGRAMADA - ACUMULADAS

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO
TERRAPLEN	9511,29M3	$2.446.294.277,00	66%	100%
SUBBASE GRANULAR TIPO C	2650M3	$851.882.250,00	66%	64%
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	2538M3	$2.957.401.962,00	37%	44%
CUNETAS	452,67M2	$469.021.346,00	35%	29%
ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO RIGIDO	51232,08KG	$475.536.176,00	35%	63%
TOTAL		**$7.200.136.011,00**	**74%**	**54%**

En el presente periodo la firma contratista alcanza un avance de 74% según el avance programado de 54% se evidencia que no existieron atrasos en el periodo correspondiente y que la firma contratista da cumplimiento al plan de contingencia No 1 remitido.
La interventoría avala el avance ejecutado y las actividades correspondiente según el ACTA PARCIAL DE OBRA No 3.

#AbriendoCampoAl Desarrollo

MEMORIAS DE CANTIDADES.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4.4	DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	UNIDAD	kg

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Aacero de refuerzo				25500,00	kg	25.500,00
					TOTAL	25.500,00

ESQUEMA



CONTRATISTA | INTERVENTORIA | SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4.2	DESCRIPCION	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CUNETAS	2191	0,7	0,15	230	M3	230
					TOTAL	230

ESQUEMA



CONTRATISTA | INTERVENTORIA | SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4,2 | DESCRIPCION: PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
PAVIMENTO RIGIDO TRAMO 2	2000	3	0,2	1200,00	M3	1.200,00
TOTAL						1.200,00

ESQUEMA



CONTRATISTA | INTERVENTORIA | SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4,1 | DESCRIPCION: SUBBASE GRANULAR CLASE C | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
SUBBASE GRANULAR TIPO C	333	7	0,15	350	M3	350
TOTAL						350

ESQUEMA



CONTRATISTA | INTERVENTORIA | SUPERVISION

#AbriendoCampoAlDesarrollo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	1.2	DESCRIPCION	TERRAPLEN	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
TERRAPLEN TRAMO 2 Y TRAMO 3	917,51	7	0,5	3211,29	M3	3.211,29
					TOTAL	3.211,29

ESQUEMA



Martha Isaaco P.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SUPERVISION

#AbriendoCampoAlDesarrollo

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Conformación de terraplén





- Instalación de subbase granular tipo C







#AbriendoCampoAl Desarrollo

- Construcción de Pavimento en concreto rígido













- Construcción de Cunetas en concreto





#AbriendoCampoAl Desarrollo

ESTADO DEL CLIMA

	ESTADO DEL CLIMA MES DE DICIEMBRE																												
ESTADO DEL CLIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
NUBLADO				X	X													X												
LLUVIA MODERADO																															
LLUVIA INTENSA																															

Página 1

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La firma contratista en este periodo presenta un avance de del 29% de actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, no se evidencian atrasos según la Reprogramación de Obra, la firma contratista da cumplimiento al plan de contingencia presentado.

El pasado 22 de Diciembre del año 2023 se firma el OTRO SI No 1 al contrato de obra y al contrato de interventoría.

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS

- SUPERVISOR

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

Secretario de infraestructura Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

Se anexa memorias de cantidades.
Otro Si No 1 al contrato de obra y contrato de interventoría

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:
GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ
