CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 09 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	ROLANDO COLON ESCORCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	RITA ALVAREZ DE LA HOZ	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	REINALDO CERVANTES	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO. (Si aplica)	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	11 de diciembre de 2023		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)	
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	FECHA REINICIOS	N/A	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024	
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$671,844,375.00	
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	7%	Avance Financiero del periodo (%)	45%	
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	81%	Avance Físico Acumulado (%)	81%	

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria: *Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:*	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024

5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	$2.300.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	21/11/2023	23/11/2023	$2.250.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	27/12/2023	28/12/2023	$2.250.000.000,00
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$6.800.000.000,00

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	N/A
Mayo	$12.155.720,00	$13.331.480,00
Junio	$11.454.210,00	N/A
Julio	$1.372.761,00	$12.826.971,00
Agosto	$34.211,00	N/A
Septiembre	$14.159,00	N/A
Octubre	$12.994,00	N/A
Noviembre	$2.103.601,00	$2.103.601,00
Diciembre	$199.340,00	$199.340,00
Enero de 2024	$212.000,00	$212.000,00
TOTAL	**$28.535.366,00**	**$28.535.366,00**

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
(Tipo y No. Contrato)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.			**$671.838.375,00**	
Nombre contratista	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA				
Fecha Firma del contrato	16/06/2023				
Plazo contrato	7 MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato	18 DE JULIO DE 2023				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA 22 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha Inicial Terminación Contrato	18 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		18 DE ABRIL DE 2024	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$335.919.187,00	1	AGOSTO
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					

(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$335.919.187,00 ANTICIPO**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		

	FECHA DE EXPEDICIÓN	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
POLIZA No 85-44-101122304	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	28 de junio de 2023	Cumplimiento	$67.183.837,50	16/06/2023	16/05/2024
	28 de junio de 2023	Pagos de salarios, prestaciones	$134.367.675,00	16/06/2023	16/01/2027
	28 de junio de 2023	Calidad del servicio	$134.367.675,00	16/01/2024	16/01/2029
	28 de junio de 2023	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$335.919.187,50	16/06/2023	16/05/2024
ESTADO DEL CONTRATO			**FIRMA DE CONTRATO**		

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*SE ANEXA INFORME DE INTERVENTORIA*	**18/07/2023**	**31/07/2023**
2	*INFORME DE INTERVENTORIA No 2*	**01/08/2023**	**31/08/2023**
3	*INFORME DE INTERVENTORIA No 3*	**01/09/2023**	**30/09/2023**
4	*INFORME DE INTERVENTORIA No 4*	**01/10/2023**	**31/10/2023**
5	*INFORME DE INTERVENTORIA No 5*	**01/11/2023**	**30/11/2023**
6	*INFORME DE INTERVENTORIA No 6*	**01/12/2923**	**31/12/2023**
7	*INFORME DE INTERVENTORIA No 7*	**01/01/2024**	**31/01/2024**

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO	
(Tipo y No. Contrato)	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.			$9.765.000.033,00	
Nombre contratista	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH	REP. LEGAL ALEJANDRO MEJIA BERMONT			
Fecha Firma del contrato		05 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato		7 meses			
Fecha del acta de inicio del contrato		18 DE JULIO DE 2023			
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		OTRO SI NO 1 AL CONTRATO DE OBRA – 22 DE DICIEMBRE DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	18 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	18 DE ABRIL DE 2024		

CONCEPTO	% REQUERIDO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	$1.953.000.007,00	2023.ALC.01.000515	30/06/2023
PRIMER PAGO	20%	$1.614.332.794,00	2023.ALC.01.000926	24/11/2023
SEGUNDO PAGO		$630.000.000	2023.ALC.01.000936	01/12/2023
TERCER PAGO	45%	$2.249.400.950,00	2023.ALC.01.001069	28/12/2023
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)				
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)				

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA	6.446.733.751,00
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS	81%

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPARO S	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*

		Cumplimiento del contrato	$976.500.004,00	05/06/2023	10/05/2024

POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	27 DE JUNIO DE 2023	Estabilida d y calidad de las obras	$1.953.000.007,00	05/06/2023	05/
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.007,00	05/06/2023	10/
		Pago de salarios, prestacio nes e indemniz aciones	$976.500.004,00	05/06/2023	10/
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No 4000243	27 DE JUNIO DE 2023	AMPARO S ADICION ALES	$580.000.000	05/06/2023	10/

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	7%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	81%
% AVANCE PROGRAMADO	69%
ATRASO	
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

SE AJUSTA PROGRAMACION DE OBRA SEGÚN NUEVA FECHA DE TERMINACION – 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024.
EL %PROGRAMADO ES ARROJADO SEGÚN LA REPROGRAMACION No 1.

- INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR.

La Secretaría de Infraestructura realiza la supervisión de las actividades avaladas por la interventoría, la firma contratista logra un avance a corte del 29 de enero de 2024 de 81%, en este periodo la firma contratista ejecuta actividades correspondientes a extendido y compactación de la subbase granular tipo C, armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento en concreto rígido, Construcción de terraplén en puntos críticos, construcción de cunetas, construcción de pavimento rígido, a la fecha el contratista ha presentado un avance significativo en las actividades debido a los atrasos presentados en los meses anteriores.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Las actividades aprobadas por la interventoría en este periodo son:
La firma contratista inicia sus actividades de obra las cuales son aprobadas por esta interventoría:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C en Tramo 3.
- La firma contratista continua las actividades de construcción de terraplén en tramo 2 y tramo 3.
- Se continua con el armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento rígido.
- Se continua con las actividades de construcción de pavimento en concreto rígido en tramo 3.
- Se continúan las actividades de corte de placas.
- Se continúan las actividades de construcción de cunetas en concreto en tramo 1, tramo 3.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica.

CONTRATO DE OBRA:


La firma contratista realiza actividades correspondientes a:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C en Tramo 3.
- La firma contratista continua las actividades de construcción de terraplén en tramo 2 y tramo 3.
- Se continua con el armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento rígido.
- Se continua con las actividades de construcción de pavimento en concreto rígido en tramo 3.
- Se continúan las actividades de corte de placas.

- Se iniciaron las actividades de construcción de pavimento en concreto rígido.
- Se iniciaron las actividades de corte de placas.
- Se iniciar las actividades de construcción de cunetas en concreto.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica
- Se continúan las actividades de construcción de cunetas en concreto en tramo 1, tramo 3.

La firma contratista da cumplimiento al plan de contingencia presentando, por lo que se evidencia avance en las actividades programadas.

PROGRAMACION DE OBRA

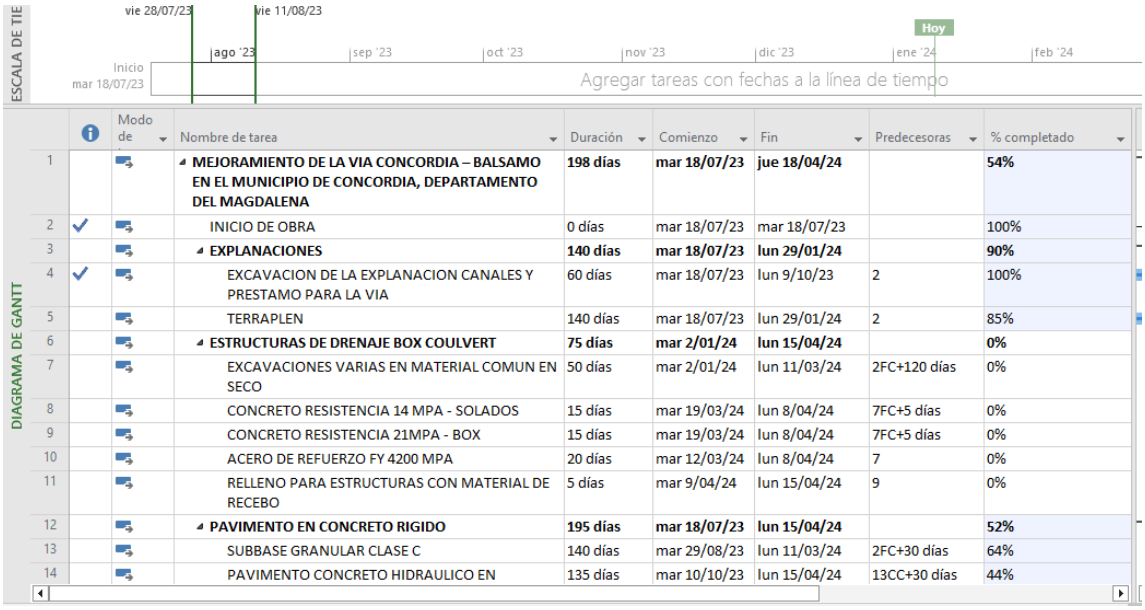

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1			**MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**	**198 días**	**mar 18/07/23**	**jue 18/04/24**		**54%**
2	✓		INICIO DE OBRA	0 días	mar 18/07/23	mar 18/07/23		100%
3			**EXPLANACIONES**	**140 días**	**mar 18/07/23**	**lun 29/01/24**		**90%**
4	✓		EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
5			TERRAPLEN	140 días	mar 18/07/23	lun 29/01/24	2	85%
6			**ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT**	**75 días**	**mar 2/01/24**	**lun 15/04/24**		**0%**
7			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	50 días	mar 2/01/24	lun 11/03/24	2FC+120 días	0%
8			CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	15 días	mar 19/03/24	lun 8/04/24	7FC+5 días	0%
9			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	15 días	mar 19/03/24	lun 8/04/24	7FC+5 días	0%
10			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	20 días	mar 12/03/24	lun 8/04/24	7	0%
11			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	9	0%
12			**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO**	**195 días**	**mar 18/07/23**	**lun 15/04/24**		**52%**
13			SUBBASE GRANULAR CLASE C	140 días	mar 29/08/23	lun 11/03/24	2FC+30 días	64%
14			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN	135 días	mar 10/10/23	lun 15/04/24	13CC+30 días	44%




DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
8			CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	15 días	mar 19/03/24	lun 8/04/24	7FC+5 días	0%
9			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	15 días	mar 19/03/24	lun 8/04/24	7FC+5 días	0%
10	✓		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	20 días	mar 29/08/23	lun 25/09/23	7	100%
11			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	9	0%
12			**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO**	**195 días**	**mar 18/07/23**	**lun 15/04/24**		**69%**
13			SUBBASE GRANULAR CLASE C	140 días	mar 29/08/23	lun 11/03/24	2FC+30 días	80%
14			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	135 días	mar 10/10/23	lun 15/04/24	13CC+30 días	61%
15			CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	100 días	mar 21/11/23	lun 8/04/24	14CC+30 días	52%
16			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	190 días	mar 18/07/23	lun 8/04/24	2	75%
17			**SEÑALIZACION**	**8 días**	**mar 9/04/24**	**jue 18/04/24**		**0%**
18			SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	8 días	mar 9/04/24	jue 18/04/24	15	0%

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La firma contratista en este periodo presenta un avance total de 81% de actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, no se evidencias atrasos según la reprogramación No 1 al contrato, en el periodo del presente informe la firma contratista ejecuta un 8% de avance en obra correspondiente a las actividades de: construcción de pavimento en concreto rígido en tramo 3, construcción de terraplén en tramo 2 y tramo 3, construcción de cunetas en tramo tramo 3. Corte de placas en concreto rígido, remates en tramo 1 y tramo3.

En el presente periodo la firma contratista alcanza un avance de 81% según el avance programado de 69% se evidencia que no existieron atrasos en el periodo correspondiente y que la firma contratista da cumplimiento al plan de contingencia No 1 remitido.

La interventoría avala el avance ejecutado y las actividades correspondiente según el ACTA PARCIAL DE OBRA No 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO




2024-02-16 09:24:44


2024-02-16 09:14:17


2024-02-16 08:13:55


2024-02-16 10:37:33


2024-02-16 10:36:42


2024-02-16 10:36:26


2024-02-16 11:20:40


2024-02-16 11:20:35


2024-02-17 08:24:04

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
NUBLADO				X	X													X													
LLUVIA MODERADO																															
LLUVIA INTENSA																															

Página 1

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:
La firma contratista en este periodo presenta un avance total de 81% de actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, no se evidencias atrasos según la reprogramación No 1 al contrato, en el periodo del presente informe la firma contratista ejecuta un 8% de avance en obra correspondiente a las actividades de: construcción de pavimento en concreto rígido en tramo 3, construcción de terraplén en tramo 2 y tramo 3, construcción de cunetas en tramo tramo 3. Corte de placas en concreto rígido, remates en tramo 1 y tramo3.

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS

- SUPERVISOR: Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

Secretario de infraestructura Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

Se anexa memorias de cantidades.

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:
GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ
