ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISOR: RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
PERIODO DE COBRO: Del 16 de Diciembre al 29 de Febrero de 2023.

CONTRATO No. 007 de 2022.
FECHA DE INICIO: 19 de Mayo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 01: 12 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO No. 02: 06 de febrero de 2023
FECHA DE REINICIO No. 03: 01 de Septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: (08) OCHO MESES + (04) CUATRO MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 15 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 23 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Marzo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA No. 02 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL
I.	**PATINODROMO Y GRADERÍAS**				**$ 3 728 067 726.08**			**$ 3 860 165 251.75**		**$ 1 108 746 415.44**		**$ 946 359 703.93**			**$ 3 601 530 089.78**		**$ 678 911 093.11**		**$ 203 376 454.19**		**$ 2 937 393 666.69**
1.	**PRELIMINARES**				**$ 94 463 513.42**			**$ 94 798 313.49**		**$ 94 798 313.49**		**$ -**			**$ 94 798 313.49**		**$ -**		**$ -**		**$ 94 798 313.49**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 94 463 513.42**			**$ 94 798 313.49**		**$ 94 798 313.49**		**$ -**			**$ 94 798 313.49**		**$ -**		**$ -**		**$ 94 798 313.49**
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO. SE UTILIZARÁ EQUIPO DE PRECISIÓN, PERSONAL EXPERTO, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS.	M2	39 131.53	$ 2 414.00	$ 94 463 513.42	39 270.22	$ 2 414.00	$ 94 798 313.49	39 270.22	$ 94 798 313.49	0.00	$ -	39 270.22	$ 2 414.00	$ 94 798 313.49	0.00	$ -	0.00	$ -	39 270.22	$ 94 798 313.49
2.	**PISTA DE PATINAJE - PISTA DE VELOCIDAD, PISTA DE RUTA Y ZONA TECNICA**				**$ 1 738 861 585.42**			**$ 1 828 717 379.66**		**$ 465 222 151.69**		**$ 561 339 408.58**			**$ 1 844 452 842.00**		**$ 313 475 276.17**		**$ 140 547 331.29**		**$ 1 480 584 167.73**
2.1	**PISTA DE VELOCIDAD 200m**				**$ 619 305 769.14**			**$ 664 903 759.18**		**$ 75 615 713.64**		**$ 323 928 332.92**			**$ 680 639 221.52**		**$ -**		**$ 140 547 331.29**		**$ 540 091 377.85**
2.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	3 190.74	$ 963.00	$ 3 072 682.62	3 147.78	$ 963.00	$ 3 031 311.56	3 147.78	$ 3 031 311.56	0.00	$ -	3 147.78	$ 963.00	$ 3 031 311.56	0.00	$ -	0.00	$ -	3 147.78	$ 3 031 311.56
2.1.2	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m.	M3	638.15	$ 15 224.00	$ 9 715 195.60	944.33	$ 15 224.00	$ 14 376 538.08	944.33	$ 14 376 538.08	0.00	$ -	944.33	$ 15 224.00	$ 14 376 538.08	0.00	$ -	0.00	$ -	944.33	$ 14 376 538.08
2.1.3	CONFORMACIÓN EN AFIRMADO	M3	319.08	$ 101 762.00	$ 32 470 218.96	936.43	$ 101 762.00	$ 95 292 824.80	572.00	$ 58 207 864.00	364.43	$ 37 084 960.80	936.43	$ 101 762.00	$ 95 292 824.80	0.00	$ -	0.00	$ -	936.43	$ 95 292 824.80
2.1.4	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	797.69	$ 101 394.00	$ 80 880 979.86	786.94	$ 101 394.00	$ 79 791 486.12		$ -	786.94	$ 79 791 486.12	786.94	$ 101 394.00	$ 79 791 486.12	0.00	$ -	0.00	$ -	786.94	$ 79 791 486.12
2.1.5	BASE GRANULAR, CBR >80% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	319.08	$ 128 194.00	$ 40 904 141.52	314.78	$ 128 194.00	$ 40 352 643.24		$ -	314.78	$ 40 352 643.24	314.78	$ 128 194.00	$ 40 352 643.24	0.00	$ -	0.00	$ -	314.78	$ 40 352 643.24
2.1.6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.	M2	3 190.74	$ 6 963.00	$ 22 217 122.62	3 147.78	$ 6 963.00	$ 21 917 987.96		$ -	3 147.78	$ 21 917 987.96	3 147.78	$ 6 963.00	$ 21 917 987.96	0.00	$ -	0.00	$ -	3 147.78	$ 21 917 987.96
2.1.7	CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	M2	3 190.74	$ 43 709.00	$ 139 464 054.66	3 147.78	$ 43 709.00	$ 137 586 289.79		$ -	3 147.78	$ 137 586 289.79	3 147.78	$ 43 709.00	$ 137 586 289.79	0.00	$ -	0.00	$ -	3 147.78	$ 137 586 289.79
2.1.8	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"c/20cm.	ML	414.22	$ 72 356.00	$ 29 971 302.32	213.58	$ 72 356.00	$ 15 453 499.57		$ -	99.44	$ 7 194 965.01	99.44	$ 72 356.00	$ 7 194 965.01	0.00	$ -	0.00	$ -	99.44	$ 7 194 965.01
2.1.9	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES.	M2	3 190.74	$ 6 254.00	$ 19 954 887.96	3 147.78	$ 6 254.00	$ 19 686 212.37		$ -	0.00	$ -	3 441.55	$ 6 254.00	$ 21 523 430.39	0.00	$ -	1 720.77	$ 10 761 695.58	1 720.77	$ 10 761 695.58
2.1.10	SISTEMA HERCULAN (EQUIVALENTES Y/O SIMILARES) MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE.	M2	3 190.74	$ 75 423.00	$ 240 655 183.02	3 147.78	$ 75 423.00	$ 237 414 965.69		$ -	0.00	$ -	3 441.55	$ 75 423.00	$ 259 571 744.57	0.00	$ -	1 720.77	$ 129 785 635.71	1 720.77	$ 129 785 635.71
2.2	**PISTAS DE PATINAJE - PISTA DE RUTA 400m**				**$ 1 119 555 816.28**			**$ 1 163 813 620.48**		**$ 389 606 438.05**		**$ 237 411 075.66**			**$ 1 163 813 620.48**		**$ 313 475 276.17**		**$ -**		**$ 940 492 789.88**
2.2.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	2 665.31	$ 963.00	$ 2 566 693.53	2 532.20	$ 963.00	$ 2 438 504.27	2 532.20	$ 2 438 504.27	0.00	$ -	2 532.20	$ 963.00	$ 2 438 504.27	0.00	$ -	0.00	$ -	2 532.20	$ 2 438 504.27
2.2.2	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m.	M3	533.07	$ 15 224.00	$ 8 115 457.68	759.66	$ 15 224.00	$ 11 565 043.29	759.66	$ 11 565 043.29	0.00	$ -	759.66	$ 15 224.00	$ 11 565 043.29	0.00	$ -	0.00	$ -	759.66	$ 11 565 043.29
2.2.3	CONFORMACIÓN EN AFIRMADO	M3	266.54	$ 101 762.00	$ 27 123 643.48	455.80	$ 101 762.00	$ 46 382 630.12	455.80	$ 46 382 630.12	0.00	$ -	455.80	$ 101 762.00	$ 46 382 630.12	0.00	$ -	0.00	$ -	455.80	$ 46 382 630.12
2.2.4	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	666.33	$ 101 394.00	$ 67 561 864.02	633.05	$ 101 394.00	$ 64 187 357.63	633.05	$ 64 187 357.63	0.00	$ -	633.05	$ 101 394.00	$ 64 187 357.63	0.00	$ -	0.00	$ -	633.05	$ 64 187 357.63
2.2.5	BASE GRANULAR, CBR >80% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	266.54	$ 128 194.00	$ 34 168 828.76	253.22	$ 128 194.00	$ 32 461 226.99		$ -	253.22	$ 32 461 226.99	253.22	$ 128 194.00	$ 32 461 226.99	0.00	$ -	0.00	$ -	253.22	$ 32 461 226.99
2.2.6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.	M2	2 665.31	$ 6 963.00	$ 18 558 553.53	2 532.20	$ 6 963.00	$ 17 631 677.27		$ -	2 532.20	$ 17 631 677.27	2 532.20	$ 6 963.00	$ 17 631 677.27	0.00	$ -	0.00	$ -	2 532.20	$ 17 631 677.27
2.2.7	CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	M2	2 665.31	$ 43 709.00	$ 116 498 034.79	2 532.20	$ 43 709.00	$ 110 679 733.11		$ -	2 532.20	$ 110 679 733.11	2 532.20	$ 43 709.00	$ 110 679 733.11	0.00	$ -	0.00	$ -	2 532.20	$ 110 679 733.11
2.2.8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.75m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	629.87	$ 72 356.00	$ 45 574 873.72	383.74	$ 72 356.00	$ 27 765 638.19	383.74	$ 27 765 638.19	0.00	$ -	383.74	$ 72 356.00	$ 27 765 638.19	0.00	$ -	0.00	$ -	383.74	$ 27 765 638.19
2.2.9	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES.	M3	2 665.31	$ 6 254.00	$ 16 668 848.74	2 532.20	$ 6 254.00	$ 15 836 350.66		$ -	0.00	$ -	2 532.20	$ 6 254.00	$ 15 836 350.66	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
2.2.10	SISTEMA HERCULAN (EQUIVALENTES Y/O SIMILARES) MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE.	M2	2 665.31	$ 75 423.00	$ 201 025 676.13	2 532.20	$ 75 423.00	$ 190 985 781.20		$ -	0.00	$ -	2 532.20	$ 75 423.00	$ 190 985 781.20	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	106.70	$ 988 377.00	$ 105 459 825.90	102.32	$ 988 377.00	$ 101 134 759.94	102.32	$ 101 134 759.94	0.00	$ -	102.32	$ 988 377.00	$ 101 134 759.94	0.00	$ -	0.00	$ -	102.32	$ 101 134 759.94
2.2.12	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	12 804.00	$ 7 723.00	$ 98 885 292.00	6 918.76	$ 7 723.00	$ 53 433 617.46	6 918.76	$ 53 433 617.46	0.00	$ -	6 918.76	$ 7 723.00	$ 53 433 617.46	0.00	$ -	0.00	$ -	6 918.76	$ 53 433 617.46
2.2.13	CERRAMIENTO EXTERIOR CONSTRUIDO EN TUBO CIRCULAR DE 2" C/1.5m - H=2.0m, CON TABLAS PROTECTORAS EN POLIPROPILENO - PARTE INFERIOR, Y PARTE SUPERIOR EN LAMINA DE POLICARBONATO.	ML	388.00	$ 529 888.00	$ 205 596 544.00	622.72	$ 529 888.00	$ 329 973 974.91		$ -	0.00	$ -	622.72	$ 529 888.00	$ 329 973 974.91	591.59	$ 313 475 276.17	0.00	$ -	591.59	$ 313 475 276.17
2.2.14	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS.	ML	720.00	$ 238 544.00	$ 171 751 680.00	667.96	$ 238 544.00	$ 159 337 325.44	346.68	$ 82 698 887.15	321.28	$ 76 638 438.29	667.96	$ 238 544.00	$ 159 337 325.44	0.00	$ -	0.00	$ -	667.96	$ 159 337 325.44
3.	**GRADERÍAS PISTAS DE PATINAJE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 1 894 742 627.24**			**$ 1 936 649 558.60**		**$ 548 725 950.26**		**$ 385 020 295.35**			**$ 1 662 278 934.29**		**$ 365 435 816.94**		**$ 62 829 122.90**		**$ 1 362 011 185.47**
3.1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 50 205 313.31**			**$ 219 037 091.73**		**$ 121 491 822.96**		**$ 42 374 246.22**			**$ 220 473 450.36**		**$ 48 615 400.67**		**$ 7 882 685.55**		**$ 220 364 155.40**
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	406.72	$ 33 653.00	$ 13 687 348.16	3 217.39	$ 33 653.00	$ 108 274 930.83	3 116.19	$ 104 869 247.23	0.00	$ -	3 217.39	$ 33 653.00	$ 108 274 930.83	101.20	$ 3 405 683.60	0.00	$ -	3 217.39	$ 108 274 930.83
3.1.2	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL DE SUB-BASE SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	182.38	$ 101 167.00	$ 18 450 837.46	201.95	$ 101 167.00	$ 20 431 161.25		$ -	0.00	$ -	201.95	$ 101 167.00	$ 20 431 161.25	201.60	$ 20 395 267.20	0.00	$ -	201.60	$ 20 395 267.20
3.1.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	190.03	$ 17 345.00	$ 3 296 070.35	4 914.02	$ 17 345.00	$ 85 233 710.99	958.35	$ 16 622 575.73	2 157.84	$ 37 427 739.82	4 996.83	$ 17 345.00	$ 86 670 069.62	1 430.64	$ 24 814 449.87	450.00	$ 7 805 250.00	4 996.83	$ 86 670 015.42
3.1.4	NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE CORTE MANUAL.	M3	136.78	$ 33 653.00	$ 4 603 057.34	151.47	$ 33 653.00	$ 5 097 288.66		$ -	146.99	$ 4 946 506.40	151.47	$ 33 653.00	$ 5 097 288.66	0.00	$ -	2.30	$ 77 435.55	149.29	$ 5 023 941.95
3.1.5	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO .	M3	406.72	$ 25 000.00	$ 10 168 000.00	-	$ 25 000.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 25 000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.2	**CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 827 911 526.58**			**$ 773 282 414.59**		**$ 427 234 127.30**		**$ 76 187 331.89**			**$ 634 251 789.01**		**$ 98 912 560.84**		**$ 29 845 160.10**		**$ 632 179 180.14**
3.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.	M3	15.58	$ 544 708.00	$ 8 486 550.64	33.81	$ 544 708.00	$ 18 416 638.55	20.37	$ 11 094 673.61	0.00	$ -	22.72	$ 544 708.00	$ 12 376 916.24	2.35	$ 1 282 242.63	0.00	$ -	22.72	$ 12 376 916.24
3.2.2	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	43.10	$ 806 301.00	$ 34 751 573.10	48.71	$ 806 301.00	$ 39 274 115.41	47.80	$ 38 541 187.80	0.91	$ 732 927.61	54.20	$ 806 301.00	$ 43 700 707.90	5.49	$ 4 426 592.49	0.00	$ -	54.20	$ 43 700 707.90
3.2.3	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	73.71	$ 722 301.00	$ 53 240 806.71	100.45	$ 722 301.00	$ 72 558 024.65	100.45	$ 72 558 024.65	0.00	$ -	102.85	$ 722 301.00	$ 74 291 547.05	2.40	$ 1 733 522.40	0.00	$ -	102.85	$ 74 291 547.05
3.2.4	PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	16.23	$ 808 361.63	$ 13 119 709.25	13.84	$ 808 361.63	$ 11 190 958.41	13.84	$ 11 190 958.41	0.00	$ -	13.84	$ 808 361.63	$ 11 190 958.41	0.00	$ -	0.00	$ -	13.84	$ 11 190 958.41
3.2.5	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	16.00	$ 988 377.00	$ 15 814 032.00	2.80	$ 988 377.00	$ 2 767 455.60		$ -	2.26	$ 2 236 968.95	8.83	$ 988 377.00	$ 8 731 717.77	6.57	$ 6 494 748.81	0.00	$ -	8.83	$ 8 731 717.77
3.2.6	GRADERIAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI - DE ESPESOR - E=0.12m. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. FUNDIR EN UNA SOLA ETAPA.	M3	86.40	$ 979 945.00	$ 84 667 248.00	45.63	$ 979 945.00	$ 44 717 046.23		$ -	42.83	$ 41 974 493.76	52.25	$ 979 945.00	$ 51 205 575.66	9.42	$ 9 231 081.90	0.00	$ -	52.25	$ 51 205 575.66
3.2.7	ESCALERAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M3	22.88	$ 1 041 154.00	$ 23 821 603.52	5.85	$ 1 041 154.00	$ 6 094 915.52		$ -	2.08	$ 2 165 600.32	2.08	$ 1 041 154.00	$ 2 165 600.32	0.00	$ -	0.00	$ -	2.08	$ 2 165 600.32
3.2.8	COLUMINAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M3	36.09	$ 1 043 900.00	$ 37 674 351.00	21.70	$ 1 043 900.00	$ 22 652 630.00	21.70	$ 22 652 630.00	0.00	$ -	22.92	$ 1 043 900.00	$ 23 930 363.60	1.22	$ 1 277 733.60	0.00	$ -	22.92	$ 23 930 363.60
3.2.9	VIGAS AEREAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M3	89.44	$ 1 003 683.00	$ 89 769 407.52	54.80	$ 1 003 683.00	$ 55 003 885.95	18.89	$ 18 962 623.07	18.89	$ 18 962 623.07	41.17	$ 1 003 683.00	$ 41 323 967.69	3.39	$ 3 398 721.56	0.00	$ -	41.17	$ 41 323 967.69
3.2.10	PLACAS AEREAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M2	228.80	$ 171 372.00	$ 39 209 913.60	167.20	$ 171 372.00	$ 28 652 712.91	59.02	$ 10 114 718.18	59.02	$ 10 114 718.18	161.72	$ 171 372.00	$ 27 714 965.33	43.68	$ 7 485 529.96	0.00	$ -	161.72	$ 27 714 965.33
3.2.11	TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=3.500PSI - IMPERMEABILIZADO. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	M3	32.48	$ 999 183.00	$ 32 453 463.84	38.12	$ 999 183.00	$ 38 088 855.96		$ -	0.00	$ -	38.12	$ 999 183.00	$ 38 088 855.96	11.66	$ 11 650 473.78	26.46	$ 26 438 382.18	38.12	$ 38 088 855.96
3.2.12	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO.	ML	33.70	$ 112 658.00	$ 3 796 574.60	34.80	$ 112 658.00	$ 3 920 498.40		$ -	0.00	$ -	34.80	$ 112 658.00	$ 3 920 498.40	0.00	$ -	30.24	$ 3 406 777.92	30.24	$ 3 406 777.92
3.2.13	BANCA EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000PSI ANCHO = 1.80m, E=0.07m. PARA LOS CAMERINOS. SEGÚN DISEÑO.	ML	12.00	$ 175 156.00	$ 2 101 872.00	8.90	$ 175 156.00	$ 1 558 888.40		$ -	0.00	$ -	8.90	$ 175 156.00	$ 1 558 888.40	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.2.14	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	50 369.60	$ 7 723.00	$ 389 004 420.80	55 468.83	$ 7 723.00	$ 428 385 788.60	31 350.42	$ 242 119 311.58	0.00	$ -	38 074.74	$ 7 723.00	$ 294 051 226.28	6 724.32	$ 51 931 914.71	0.00	$ -	38 074.74	$ 294 051 226.29
3.3	**ESTRUCTURAS METALICAS, RECUBRIMIENTOS LATERALES Y CUBIERTAS**				**$ 308 576 955.27**			**$ 387 566 011.34**		**$ -**		**$ 261 809 087.74**			**$ 352 317 101.94**		**$ 81 319 003.55**		**$ 9 189 064.37**		**$ 352 317 155.67**
3.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50cm, CONECTORES Y ACABADO FINA	KG	14 208.01	$ 18 527.00	$ 263 231 801.27	18 471.96	$ 18 527.00	$ 342 230 055.14		$ -	14 131.22	$ 261 809 087.74	16 001.70	$ 18 527.00	$ 296 463 461.44	1 532.37	$ 28 390 263.45	338.11	$ 6 264 163.97	16 001.70	$ 296 463 515.17
3.3.2	CUBIERTAS EN LÁMINA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	493.00	$ 91 978.00	$ 45 345 154.00	492.90	$ 91 978.00	$ 45 335 956.20		$ -	0.00	$ -	607.25	$ 91 978.00	$ 55 853 640.50	575.45	$ 52 928 740.10	31.80	$ 2 924 900.40	607.25	$ 55 853 640.50
3.4	**PISOS DE CONCRETO Y ACABADOS**				**$ 52 115 808.60**			**$ 11 967 149.32**		**$ -**		**$ -**			**$ 27 575 598.20**		**$ 20 027 662.20**		**$ -**		**$ 20 027 662.20**
3.4.1	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm.	M2	428.50	$ 67 701.00	$ 29 009 878.50	-	$ 67 701.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 67 701.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -

ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISOR: RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
PERIODO DE COBRO: Del 16 de Diciembre al 29 de Febrero de 2023.

CONTRATO No. 007 de 2022.
FECHA DE INICIO: 19 de Mayo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 01: 12 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO No. 02: 06 de febrero de 2023
FECHA DE REINICIO No. 03: 01 de Septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: (06) OCHO MESES + (04) CUATRO MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 15 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 23 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Marzo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA No. 02 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL
3.4.2	JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON PROFUNDIDAD DE 1.0cm + SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, CORDON DE ESPUMA SOBRE FONDO DE JUNTA Ø10mm.	ML	176.00	$ 19 110.00	$ 3 363 360.00	176.00	$ 19 110.00	$ 3 363 360.00		$ -	0.00	$ -	1 048.02	$ 19 110.00	$ 20 027 662.20	1 048.02	$ 20 027 662.20	0.00	$ -	1 048.02	$ 20 027 662.20
3.4.3	MEDIACAÑA DE 10cm EN GRANITO FUNDIDO No 1 BLANCO, PARA PISOS DE TIENDAS, INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO, DILATACIÓN VERTICAL EN BRONCE CADA 1.50m, DILATACIÓN HORIZONTAL EN BRONCE SOBRE PISO Y DILATACIÓN HORIZONTAL EN PVC SOBRE MURO	ML	460.35	$ 42 886.00	$ 19 742 570.10	200.62	$ 42 886.00	$ 8 603 789.32		$ -	0.00	$ -	176.00	$ 42 886.00	$ 7 547 936.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.5	**MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL**				**$ 88 412 095.12**			**$ 52 729 755.66**		**$ -**		**$ -**			**$ 19 945 327.96**		**$ -**		**$ 15 912 212.88**		**$ 15 912 212.88**
3.5.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=20cm, f'u=10.0MPa, BLOQUE DE 0.20x0.19x0.39m, COLOR GRIS CLARO ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4.	M2	385.44	$ 91 602.00	$ 35 307 074.88	-	$ 91 602.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 91 602.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.5.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO E=15cm, f'u=10.0MPa, BLOQUE DE 0.15x0.19x0.39m, COLOR GRIS CLARO LISO. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE.	M2	372.00	$ 67 116.00	$ 24 967 152.00	488.47	$ 67 116.00	$ 32 784 427.70		$ -	0.00	$ -	-	$ 67 116.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.5.3	DOVELAS CON GROUTING DE f'c=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	M3	19.28	$ 687 133.00	$ 13 247 924.24	12.66	$ 687 133.00	$ 8 702 347.05		$ -	0.00	$ -	12.66	$ 687 133.00	$ 8 702 347.05	0.00	$ -	10.41	$ 7 151 405.41	10.41	$ 7 151 405.41
3.5.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.	KG	1 928.00	$ 7 723.00	$ 14 889 944.00	1 455.78	$ 7 723.00	$ 11 242 980.91		$ -	0.00	$ -	1 455.78	$ 7 723.00	$ 11 242 980.91	0.00	$ -	1 134.38	$ 8 760 807.47	1 134.38	$ 8 760 807.47
3.6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 90 215 284.00**			**$ 86 679 663.22**		**$ -**		**$ 1 487 014.20**			**$ 86 868 330.22**		**$ 6 129 858.00**		**$ -**		**$ 7 616 872.20**
3.6.1	TUBERÍA P.V.C.-S 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	154.00	$ 112 417.00	$ 17 312 218.00	153.70	$ 112 417.00	$ 17 278 492.90		$ -	0.00	$ -	153.70	$ 112 417.00	$ 17 278 492.90	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.2	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	258.00	$ 52 122.00	$ 13 447 476.00	257.89	$ 52 122.00	$ 13 441 846.82		$ -	0.00	$ -	257.89	$ 52 122.00	$ 13 441 846.82	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.3	TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	36.00	$ 40 720.00	$ 1 465 920.00	8.20	$ 40 720.00	$ 333 904.00		$ -	0.00	$ -	8.20	$ 40 720.00	$ 333 904.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.4	TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	114.00	$ 31 600.00	$ 3 602 400.00	129.20	$ 31 600.00	$ 4 082 720.00		$ -	0.00	$ -	129.20	$ 31 600.00	$ 4 082 720.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.5	PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC, INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	24.00	$ 98 862.00	$ 2 372 688.00	16.00	$ 98 862.00	$ 1 581 792.00		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 98 862.00	$ 1 581 792.00	14.00	$ 1 384 068.00			14.00	$ 1 384 068.00
3.6.6	PUNTO SANITARIO DE 3" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 3 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	14.00	$ 93 500.00	$ 1 309 000.00	14.00	$ 93 500.00	$ 1 309 000.00		$ -	0.00	$ -	26.00	$ 93 500.00	$ 2 431 000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.7	PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	38.00	$ 71 224.00	$ 2 706 512.00	35.00	$ 71 224.00	$ 2 492 840.00		$ -	0.00	$ -	23.00	$ 71 224.00	$ 1 638 152.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.8	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 4" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	42.00	$ 43 304.00	$ 1 818 768.00	42.00	$ 43 304.00	$ 1 818 768.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 43 304.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	17.00	$ 556 671.00	$ 9 463 407.00	22.00	$ 556 671.00	$ 12 246 762.00		$ -	0.00	$ -	22.00	$ 556 671.00	$ 12 246 762.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.10	CONEXIÓN A RED DE ALACANTARILLADO EXISTENTE INCLUYE ROTURA DE VIA, DEMOLIOCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE DESAGUE EN PVC DE 8", TAPE Y RESANE DEL PAVIMENTO, PERMISO ANTE OBRAS PUBLICAS.	UN	1.00	$ 440 845.00	$ 440 845.00	1.00	$ 440 845.00	$ 440 845.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 440 845.00	$ 440 845.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.11	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 240kg/cm2 (f'c=3.500PSI) IMPERMEABILIZADO, H=2.0m, E=0.10m, TAPA EN CONCRETO DE D=0.70m, REFORZADA CON 20kg DE HIERRO PDR-60; SOLADO E=0.20m, AGARRADERAS EN HIERRO LISO DE D=1/2", PASOS EN HIERRO DE D=3/4" @0.30m, PINTADOS CON ANTICORROSIVO; CAÑUELAS EN CONCRETO	ML	10.00	$ 1 571 096.00	$ 15 710 960.00	6.00	$ 1 571 096.00	$ 9 426 576.00		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 1 571 096.00	$ 9 426 576.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.6.12	TUBERÍA P.V.C.-S 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	130.00	$ 158 193.00	$ 20 565 090.00	140.50	$ 158 193.00	$ 22 226 116.50		$ -	9.40	$ 1 487 014.20	151.50	$ 158 193.00	$ 23 966 239.50	30.00	$ 4 745 790.00	0.00	$ -	39.40	$ 6 232 804.20
3.7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 42 130 979.00**			**$ 43 422 752.76**		**$ -**		**$ -**			**$ 42 300 052.76**		**$ 19 722 244.48**		**$ -**		**$ 19 722 244.48**
3.7.1	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1 1/4" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	72.00	$ 28 160.00	$ 2 027 520.00	12.00	$ 28 160.00	$ 337 920.00		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 28 160.00	$ 337 920.00	12.00	$ 337 920.00	0.00	$ -	12.00	$ 337 920.00
3.7.2	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	150.00	$ 19 907.00	$ 2 986 050.00	203.78	$ 19 907.00	$ 4 056 648.46		$ -	0.00	$ -	203.78	$ 19 907.00	$ 4 056 648.46	158.15	$ 3 148 292.05	0.00	$ -	158.15	$ 3 148 292.05
3.7.3	REGISTRO RED WHITE 1 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1.1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	8.00	$ 263 734.00	$ 2 109 872.00	6.00	$ 263 734.00	$ 1 582 404.00		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 263 734.00	$ 1 582 404.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.7.4	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	24.00	$ 72 736.00	$ 1 745 664.00	16.00	$ 72 736.00	$ 1 163 776.00		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 72 736.00	$ 1 163 776.00	14.00	$ 1 018 304.00	0.00	$ -	14.00	$ 1 018 304.00
3.7.5	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	4.00	$ 61 297.00	$ 245 188.00	6.00	$ 61 297.00	$ 367 782.00		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 61 297.00	$ 367 782.00	6.00	$ 367 782.00	0.00	$ -	6.00	$ 367 782.00
3.7.6	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	29.00	$ 61 297.00	$ 1 777 613.00	14.00	$ 61 297.00	$ 858 158.00		$ -	0.00	$ -	14.00	$ 61 297.00	$ 858 158.00	12.00	$ 735 564.00	0.00	$ -	12.00	$ 735 564.00
3.7.7	PUNTO HIDRÁULICO DUCHAS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	4.00	$ 70 075.00	$ 280 300.00	8.00	$ 70 075.00	$ 560 600.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 70 075.00	$ 560 600.00	8.00	$ 560 600.00	0.00	$ -	8.00	$ 560 600.00
3.7.8	PUNTO HIDRÁULICO LAVATRAPEROS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2.00	$ 64 456.00	$ 128 912.00	1.00	$ 64 456.00	$ 64 456.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 64 456.00	$ 64 456.00	1.00	$ 64 456.00	0.00	$ -	1.00	$ 64 456.00
3.7.9	EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO DUPLEX TIPO HIDROFLO COMPUESTO POR DOS (2) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTA PRESION CONSTRUCCION STD EN HIERRO, , OBTURACION POR SELLO MECANICO, ACCIONADA CADA UNA POR MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 3HP, 3500 RPM, 220 / 440 VOLTIOS + UN (1) TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL DE 300LTS DE CAPACIDAD, INCLUYE TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS DOS (2) BOMBAS COMO LA DEL TANQUE HIDRONEUMATICO.	UN	1.00	$ 17 268 470.00	$ 17 268 470.00	1.00	$ 17 268 470.00	$ 17 268 470.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 17 268 470.00	$ 17 268 470.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.7.10	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 2" EN PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	180.00	$ 40 376.00	$ 7 267 680.00	297.70	$ 40 376.00	$ 12 019 935.20		$ -	0.00	$ -	297.70	$ 40 376.00	$ 12 019 935.20	287.94	$ 11 625 821.03	0.00	$ -	287.94	$ 11 625 821.03
3.7.11	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1 1/2" EN PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	138.00	$ 32 030.00	$ 4 420 140.00	58.18	$ 32 030.00	$ 1 863 505.40		$ -	0.00	$ -	58.18	$ 32 030.00	$ 1 863 505.40	58.18	$ 1 863 505.40	0.00	$ -	58.18	$ 1 863 505.40
3.7.12	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	30.00	$ 25 029.00	$ 750 870.00	41.30	$ 25 029.00	$ 1 033 697.70		$ -	0.00	$ -	41.30	$ 25 029.00	$ 1 033 697.70	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.7.13	CONEXIÓN A TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2", UNION 2", SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1.00	$ 1 122 700.00	$ 1 122 700.00	2.00	$ 1 122 700.00	$ 2 245 400.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1 122 700.00	$ 1 122 700.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.8	**BAJANTE AGUA LUVIA Y DESAGUE**				**$ 158 773 932.60**			**$ 131 313 222.94**		**$ -**		**$ 3 162 615.30**			**$ 40 029 861.30**		**$ 31 411 208.00**		**$ -**		**$ 34 573 823.30**
3.8.1	BAJANTE DE AGUA LLUVIAS 6", INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	60.00	$ 91 096.00	$ 5 465 760.00	48.00	$ 91 096.00	$ 4 372 608.00		$ -	0.00	$ -	48.00	$ 91 096.00	$ 4 372 608.00	48.00	$ 4 372 608.00	0.00	$ -	48.00	$ 4 372 608.00
3.8.2	TRAGANTE DE AGUA LLUVIA 6X4" METALICO	UN	4.00	$ 59 698.00	$ 238 792.00	4.00	$ 59 698.00	$ 238 792.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 59 698.00	$ 238 792.00	4.00	$ 238 792.00	0.00	$ -	4.00	$ 238 792.00
3.8.3	CANALETA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 A=40CM H=20CM, CON SEPARADORES A 1,5 MTS	ML	72.00	$ 101 726.00	$ 7 324 272.00	61.00	$ 101 726.00	$ 6 205 286.00		$ -	0.00	$ -	61.00	$ 101 726.00	$ 6 205 286.00	61.00	$ 6 205 286.00	0.00	$ -	61.00	$ 6 205 286.00
3.8.4	TUBERÍA P.V.C.-ALL 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24.00	$ 49 979.00	$ 1 199 496.00	6.00	$ 49 979.00	$ 299 874.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 49 979.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.8.5	TUBERÍA P.V.C.-S 10", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	44.00	$ 132 327.00	$ 5 822 388.00	134.46	$ 132 327.00	$ 17 792 688.42		$ -	23.90	$ 3 162 615.30	51.90	$ 132 327.00	$ 6 867 771.30	28.00	$ 3 705 156.00	0.00	$ -	51.90	$ 6 867 771.30
3.8.6	TUBERÍA P.V.C.-S 12", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	169.90	$ 175 934.00	$ 29 891 186.60	164.18	$ 175 934.00	$ 28 884 844.12		$ -	0.00	$ -	52.00	$ 175 934.00	$ 9 148 568.00	52.00	$ 9 148 568.00	0.00	$ -	52.00	$ 9 148 568.00
3.8.7	TUBERÍA P.V.C.-S 14", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	75.00	$ 235 507.00	$ 17 663 025.00	75.60	$ 235 507.00	$ 17 804 329.20		$ -	0.00	$ -	-	$ 235 507.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.8.8	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 240kg/cm2 (f'c=3.500PSI) IMPERMEABILIZADO, H=2.0m, E=0.10m, TAPA EN CONCRETO DE D=0.70m, REFORZADA CON 20kg DE HIERRO PDR-60; SOLADO E=0.20m, AGARRADERAS EN HIERRO LISO DE D=1/2", PASOS EN HIERRO DE D=3/4" @0.30m, PINTADOS CON ANTICORROSIVO; CAÑUELAS EN CONCRETO.	ML	12.00	$ 1 571 096.00	$ 18 853 152.00	-	$ 1 571 096.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 1 571 096.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.8.9	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm. EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS.	ML	247.00	$ 238 544.00	$ 58 920 368.00	162.80	$ 238 544.00	$ 38 834 963.20		$ -	0.00	$ -	-	$ 238 544.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -

ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISOR: RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
PERIODO DE COBRO: Del 16 de Diciembre al 29 de Febrero de 2023.

CONTRATO No. 007 de 2022.
FECHA DE INICIO: 19 de Mayo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 01: 12 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO No. 02: 06 de febrero de 2023
FECHA DE REINICIO No. 03: 01 de Septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: (08) OCHO MESES + (04) CUATRO MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 15 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 23 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Marzo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA No. 02 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL
3.8.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	12.00	$ 571 190.00	$ 6 854 280.00	20.00	$ 571 190.00	$ 11 423 800.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 571 190.00	$ 2 284 760.00	4.00	$ 2 284 760.00	0.00	$ -	4.00	$ 2 284 760.00
3.8.11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100x200x100cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1.00	$ 5 456 038.00	$ 5 456 038.00	1.00	$ 5 456 038.00	$ 5 456 038.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 5 456 038.00	$ 10 912 076.00	1.00	$ 5 456 038.00	0.00	$ -	1.00	$ 5 456 038.00
3.8.12	TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 110mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	22.50	$ 48 230.00	$ 1 085 175.00	-	$ 48 230.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 48 230.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.9	**PAÑETES, ENCHAPES Y PINTURAS**				**$ 61 687 274.58**			**$ 43 684 338.86**		**$ -**		**$ -**			**$ 47 254 071.30**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.9.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CUARTOS HUMEDOS.	M2	277.60	$ 31 855.00	$ 8 842 948.00	131.16	$ 31 855.00	$ 4 178 101.80		$ -	0.00	$ -	-	$ 31 855.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.9.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES.	ML	83.28	$ 12 380.00	$ 1 031 006.40	124.00	$ 12 380.00	$ 1 535 120.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 12 380.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.9.3	ENCHAPE PARA MUROS DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.	M2	134.88	$ 80 136.00	$ 10 808 743.68	131.16	$ 80 136.00	$ 10 510 637.76		$ -	0.00	$ -	247.00	$ 80 136.00	$ 19 793 592.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.9.4	PLACAS EN GRANITO NATURAL PARA MESONES DE LAVAMANOS. TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, INCLUYE POCETAS EN EL MISMO MATERIAL, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE.	ML	33.70	$ 556 805.00	$ 18 764 328.50	34.80	$ 556 805.00	$ 19 376 814.00		$ -	0.00	$ -	34.80	$ 556 805.00	$ 19 376 814.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.9.5	PLACAS EN GRANITO NATURAL PARA BANCAS EN CONCRETO EN LOS CAMERINOS. TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=1.60m O EQUIVALENTE.	ML	12.00	$ 908 277.00	$ 10 899 324.00	8.90	$ 908 277.00	$ 8 083 665.30		$ -	0.00	$ -	8.90	$ 908 277.00	$ 8 083 665.30	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.9.6	DIVISIONES VERTICALES PARA LOS LOCKERS DE LOS CAMERINOS, CONSISTENTE EN DOS (2) PLACAS DE GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=40cm, ALTO=100cm, UNIDAS ENTRE SÍ CON EPOXICO TIPO HILTI Y FIJADAS	UN	14.00	$ 810 066.00	$ 11 340 924.00	-	$ 810 066.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 810 066.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.10	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 155 733 208.38**			**$ 144 189 169.18**		**$ -**		**$ -**			**$ 148 485 362.24**		**$ 59 297 879.20**		**$ -**		**$ 59 297 879.20**
3.10.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18, SEGÚN MEDIDAS, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION	M2	46.40	$ 266 478.00	$ 12 364 579.20	29.60	$ 266 478.00	$ 7 887 748.80		$ -	0.00	$ -	36.08	$ 266 478.00	$ 9 614 526.24	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.10.2	VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA 744. INCLUYE VIDRIO INCOLORO 5mm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	14.88	$ 445 306.00	$ 6 626 153.28	24.55	$ 445 306.00	$ 10 932 262.30		$ -	0.00	$ -	30.32	$ 445 306.00	$ 13 501 677.92	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.10.3	BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8" CADA 1.50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 1.10	ML	168.00	$ 358 946.00	$ 60 302 928.00	166.50	$ 358 946.00	$ 59 764 509.00		$ -	0.00	$ -	166.50	$ 358 946.00	$ 59 764 509.00	165.20	$ 59 297 879.20	0.00	$ -	165.20	$ 59 297 879.20
3.10.4	DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80m, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES. PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.	M2	88.30	$ 787 673.00	$ 69 551 525.90	75.96	$ 787 673.00	$ 59 831 641.08		$ -	0.00	$ -	75.96	$ 787 673.00	$ 59 831 641.08	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.10.5	DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON DIMENSIONES 0.96x0.46m, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.	UN	4.00	$ 719 020.00	$ 2 876 080.00	6.00	$ 719 020.00	$ 4 314 120.00		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 719 020.00	$ 4 314 120.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.10.6	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS CORONA DE 12" REF. C250212SK O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UN	22.00	$ 182 361.00	$ 4 011 942.00	8.00	$ 182 361.00	$ 1 458 888.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 182 361.00	$ 1 458 888.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 58 980 249.80**			**$ 42 777 989.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 42 777 989.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.11.1	ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BAÑOS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	M2	33.70	$ 169 184.00	$ 5 701 500.80	14.00	$ 169 184.00	$ 2 368 576.00		$ -	0.00	$ -	14.00	$ 169 184.00	$ 2 368 576.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.2	REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	22.00	$ 35 653.00	$ 784 366.00	28.00	$ 35 653.00	$ 998 284.00		$ -	0.00	$ -	28.00	$ 35 653.00	$ 998 284.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.3	SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.	UN	18.00	$ 1 519 903.00	$ 27 358 254.00	10.00	$ 1 519 903.00	$ 15 199 030.00		$ -	0.00	$ -	10.00	$ 1 519 903.00	$ 15 199 030.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.4	ORINAL BLANCO CON FLUXOMETRO	UN	4.00	$ 1 314 019.00	$ 5 256 076.00	8.00	$ 1 314 019.00	$ 10 512 152.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 1 314 019.00	$ 10 512 152.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.5	GRIFERIA PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS CON DESAGUE O EQUIVALENTE.	UN	23.00	$ 167 069.00	$ 3 842 587.00	16.00	$ 167 069.00	$ 2 673 104.00		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 167 069.00	$ 2 673 104.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.6	GRIFERIA SENCILLA PARA DUCHA DE CORONA O EQUIVALENTE.	UN	4.00	$ 144 994.00	$ 579 976.00	8.00	$ 144 994.00	$ 1 159 952.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 144 994.00	$ 1 159 952.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.7	SANITARIO PARA PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA, COLOR BLANCO. INCLUYE MUEBLE PLASTICO ALONGADO COLOR BLANCO MARCA CORONA O EQUIVALENTE.	UN	6.00	$ 747 713.00	$ 4 486 278.00	4.00	$ 747 713.00	$ 2 990 852.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 747 713.00	$ 2 990 852.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.8	LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.	UN	17.00	$ 287 544.00	$ 4 888 248.00	10.00	$ 287 544.00	$ 2 875 440.00		$ -	0.00	$ -	10.00	$ 287 544.00	$ 2 875 440.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.9	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) - COLOR BLANCO + GRIFERÍA O EQUIVALENTE.	UND	6.00	$ 465 873.00	$ 2 795 238.00	4.00	$ 465 873.00	$ 1 863 492.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 465 873.00	$ 1 863 492.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.10	SANITARIO AVANTI PLUS , COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.	UN	2.00	$ 493 244.00	$ 986 488.00	2.00	$ 493 244.00	$ 986 488.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 493 244.00	$ 986 488.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.11	LAVATRAPEROS, EN FIBRA DE VIDRIO PORCELANIZADA DE 46x46cm, INCLUYE MESÓN DE CONCRETO PARA SOPORTE Y GRIFERÍA.	UN	2.00	$ 474 605.00	$ 949 210.00	1.00	$ 474 605.00	$ 474 605.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 474 605.00	$ 474 605.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
3.11.12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 45x50cm + GRIFERÍA.	UN	4.00	$ 338 007.00	$ 1 352 028.00	2.00	$ 338 007.00	$ 676 014.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 338 007.00	$ 676 014.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
II.	**CANCHA MÚLTIPLE EN CONCRETO Y GRADERÍA**				**$ 362 802 577.56**			**$ 194 884 936.66**		**$ -**		**$ 5 241 234.84**			**$ 172 916 805.84**		**$ 158 612 155.00**		**$ 9 063 416.00**		**$ 172 916 805.84**
4.	**PRELIMINARES - CANCHA MÚLTIPLE**				**$ 890 775.00**			**$ 890 775.00**		**$ -**		**$ 890 775.00**			**$ 890 775.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 890 775.00**
4.1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 890 775.00**			**$ 890 775.00**		**$ -**		**$ 890 775.00**			**$ 890 775.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 890 775.00**
4.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	925.00	$ 963.00	$ 890 775.00	925.00	$ 963.00	$ 890 775.00		$ -	925.00	$ 890 775.00	925.00	$ 963.00	$ 890 775.00	0.00	$ -	0.00	$ -	925.00	$ 890 775.00
								$ -							$ -						
5.	**CANCHA MÚLTIPLE Y DRENAJE CANCHA**				**$ 233 728 530.40**			**$ 192 460 141.82**		**$ -**		**$ 2 816 440.00**			**$ 142 188 121.00**		**$ 130 308 265.00**		**$ 9 063 416.00**		**$ 142 188 121.00**
5.1	**CANCHA MÚLTIPLE EN CONCRETO**				**$ 172 609 799.40**			**$ 142 188 121.00**		**$ -**		**$ 2 816 440.00**			**$ 142 188 121.00**		**$ 130 308 265.00**		**$ 9 063 416.00**		**$ 142 188 121.00**
5.1.1	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE.	M3	185.00	$ 15 224.00	$ 2 816 440.00	185.00	$ 15 224.00	$ 2 816 440.00		$ -	185.00	$ 2 816 440.00	185.00	$ 15 224.00	$ 2 816 440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	185.00	$ 2 816 440.00
5.1.2	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	185.00	$ 101 394.00	$ 18 757 890.00	185.00	$ 101 394.00	$ 18 757 890.00		$ -	0.00	$ -	185.00	$ 101 394.00	$ 18 757 890.00	185.00	$ 18 757 890.00	0.00	$ -	185.00	$ 18 757 890.00
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	11.20	$ 988 377.00	$ 11 069 822.40	-	$ 988 377.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 988 377.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.1.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	1 344.00	$ 7 723.00	$ 10 379 712.00	-	$ 7 723.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 7 723.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.1.5	BORDILLO DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.30m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	124.00	$ 72 356.00	$ 8 972 144.00	-	$ 72 356.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 72 356.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.1.6	CANCHA EN CONCRETO f'c=3.000PSI - E=15cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	925.00	$ 120 595.00	$ 111 550 375.00	925.00	$ 120 595.00	$ 111 550 375.00		$ -	0.00	$ -	925.00	$ 120 595.00	$ 111 550 375.00	925.00	$ 111 550 375.00	0.00	$ -	925.00	$ 111 550 375.00
5.1.7	JUEGO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA PARA LA CANCHA MULTIPLE. INCLUYE REDES CON GUAYA Y REFUERZO EN EL CENTRO Y TENSOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	UN	1.00	$ 9 063 416.00	$ 9 063 416.00	1.00	$ 9 063 416.00	$ 9 063 416.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 9 063 416.00	$ 9 063 416.00	0.00	$ -	1.00	$ 9 063 416.00	1.00	$ 9 063 416.00
5.2	**DRENAJE CANCHA MÚLTIPLE**				**$ 61 118 731.00**			**$ 50 272 020.82**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
5.2.1	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS.	ML	124.00	$ 238 544.00	$ 29 579 456.00	124.00	$ 238 544.00	$ 29 579 456.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 238 544.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.2.2	TUBERÍA P.V.C.-S 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	105.00	$ 92 500.00	$ 9 712 500.00	18.47	$ 92 500.00	$ 1 708 105.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 92 500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.2.3	TUBERÍA P.V.C.-S 10", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	28.00	$ 132 327.00	$ 3 705 156.00	32.97	$ 132 327.00	$ 4 362 291.88		$ -	0.00	$ -	-	$ 132 327.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.2.4	TUBERÍA P.V.C.-S 12", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	48.00	$ 175 934.00	$ 8 444 832.00	46.91	$ 175 934.00	$ 8 253 063.94		$ -	0.00	$ -	-	$ 175 934.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.2.5	TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 110mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.50	$ 48 230.00	$ 651 105.00	-	$ 48 230.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 48 230.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	12.00	$ 442 763.00	$ 5 313 156.00	6.00	$ 442 763.00	$ 2 656 578.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 442 763.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
5.2.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100x100x100cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1.00	$ 3 712 526.00	$ 3 712 526.00	1.00	$ 3 712 526.00	$ 3 712 526.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 3 712 526.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
6.	**GRADERÍAS CANCHA MÚLTIPLE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 128 183 272.16**			**$ 1 534 019.84**		**$ -**		**$ 1 534 019.84**			**$ 29 837 909.84**		**$ 28 303 890.00**		**$ -**		**$ 29 837 909.84**
6.1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 5 049 772.26**			**$ 1 534 019.84**		**$ -**		**$ 1 534 019.84**			**$ 29 837 909.84**		**$ 28 303 890.00**		**$ -**		**$ 29 837 909.84**
6.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	61.10	$ 33 653.00	$ 2 056 198.30	30.08	$ 33 653.00	$ 1 012 282.24		$ -	30.08	$ 1 012 282.24	585.08	$ 33 653.00	$ 19 689 697.24	555.00	$ 18 677 415.00	0.00	$ -	585.08	$ 19 689 697.24
6.1.2	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL DE SUB-BASE SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	12.88	$ 101 167.00	$ 1 303 030.96	-	$ 101 167.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 101 167.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -

ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISOR: RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
PERIODO DE COBRO: Del 16 de Diciembre al 29 de Febrero de 2023.

CONTRATO No. 007 de 2022.
FECHA DE INICIO: 19 de Mayo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 01: 12 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO No. 02: 06 de febrero de 2023
FECHA DE REINICIO No. 03: 01 de Septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: (08) OCHO MESES + (04) CUATRO MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 15 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 23 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Marzo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA No. 02 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL
6.1.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	9.40	$ 17 345.00	$ 163 043.00	30.08	$ 17 345.00	$ 521 737.60		$ -	30.08	$ 521 737.60	585.08	$ 17 345.00	$ 10 148 212.60	555.00	$ 9 626 475.00	0.00	$ -	585.08	$ 10 148 212.60
6.1.4	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3). MEDIDO EN SITIO.	M3	61.10	$ 25 000.00	$ 1 527 500.00	-	$ 25 000.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 25 000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
6.2	**CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 123 133 499.90**			**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
6.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.	M3	4.70	$ 544 708.00	$ 2 560 127.60	-	$ 544 708.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 544 708.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
6.2.2	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	56.40	$ 806 301.00	$ 45 475 376.40	-	$ 806 301.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 806 301.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
6.2.3	GRADERIAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI - DE ESPESOR - E=0.12m. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. FUNDIR EN UNA SOLA ETAPA.	M3	19.74	$ 979 945.00	$ 19 344 114.30	-	$ 979 945.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 979 945.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
6.2.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	7 219.20	$ 7 723.00	$ 55 753 881.60	-	$ 7 723.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 7 723.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
III.	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN - ZONAS EXTERIORES**				**$ 1 194 158 882.00**			**$ 1 194 158 882.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 1 163 485 364.00**		**$ 71 185 676.00**		**$ 73 148 708.00**		**$ 144 334 384.00**
7.	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**				**$ 1 194 158 882.00**			**$ 1 194 158 882.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 1 163 485 364.00**		**$ 71 185 676.00**		**$ 73 148 708.00**		**$ 144 334 384.00**
7.1	**INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN**				**$ 18 173 561.00**			**$ 18 173 561.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 18 173 561.00**		**$ 1 077 640.00**		**$ -**		**$ 1 077 640.00**
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO 37,5kVA - 13,2 KV/240/120V	UN	1.00	$ 6 935 913.00	$ 6 935 913.00	1.00	$ 6 935 913.00	$ 6 935 913.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6 935 913.00	$ 6 935 913.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.1.2	CRUCETA DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR	UN	1.00	$ 1 943 429.00	$ 1 943 429.00	1.00	$ 1 943 429.00	$ 1 943 429.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1 943 429.00	$ 1 943 429.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANJANTE EN TUBERIA IMC DE 4"X6 METROS, INCLUYE CAPACETE	UN	1.00	$ 1 077 640.00	$ 1 077 640.00	1.00	$ 1 077 640.00	$ 1 077 640.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1 077 640.00	$ 1 077 640.00	1.00	$ 1 077 640.00	0.00	$ -	1.00	$ 1 077 640.00
7.1.4	KIT SPT EN ACERO AUSTENITICO INOX PARA TRANSFORMADOR	UN	1.00	$ 333 274.00	$ 333 274.00	1.00	$ 333 274.00	$ 333 274.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 333 274.00	$ 333 274.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.1.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO GENERAL CON 4 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO #1/0 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 10 OHMIOS	UN	1.00	$ 2 030 564.00	$ 2 030 564.00	1.00	$ 2 030 564.00	$ 2 030 564.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2 030 564.00	$ 2 030 564.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMIDIRECTA	UN	1.00	$ 5 852 741.00	$ 5 852 741.00	1.00	$ 5 852 741.00	$ 5 852 741.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5 852 741.00	$ 5 852 741.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.2	**ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION**				**$ 61 272 155.00**			**$ 61 272 155.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 55 899 045.00**		**$ 52 618 027.00**		**$ -**		**$ 52 618 027.00**
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL BIFASICA EN BAJA TENSION EN CABLE 3X(2F #4/0 AL SERIE 8000 + 1N #4/0 AL SERIE 8000), EN TUBERIA DE 3X3" PVC , DESDE BORNES DEL TRASNFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL.	ML	285.00	$ 121 737.00	$ 34 695 045.00	285.00	$ 121 737.00	$ 34 695 045.00		$ -	0.00	$ -	-	$ 121 737.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO DE CONTROL ILUMINACION MASTILES Y LAMPARAS EN CABLE 2F #2/0 THHN AL SERIE 8000 + 1N #2/0 THHN AL SERIE 8000 + 1T #2 AWG CU, EN TUBERIA DE 2" PVC DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO CONTROL DE ILUMINACION.	ML	5.00	$ 69 891.00	$ 349 455.00	5.00	$ 69 891.00	$ 349 455.00		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 69 891.00	$ 349 455.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA TABLERO SUBESTACION CABLE 2F #8 CU THHN + 1N #8 CU THHN + 1T #8 CU THHN EN TUBERIA PVC DE 1".	ML	5.00	$ 39 879.00	$ 199 395.00	5.00	$ 39 879.00	$ 199 395.00		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 39 879.00	$ 199 395.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 2 Y 3, EN CABLE 2F #6 THHN AL SERIE 8000 + 1T #8 CU THHN EN TUBERIA PVC DE 1"	ML	400.00	$ 24 623.00	$ 9 849 200.00	400.00	$ 24 623.00	$ 9 849 200.00		$ -	0.00	$ -	360.00	$ 24 623.00	$ 8 864 280.00	360.00	$ 8 864 280.00	0.00	$ -	360.00	$ 8 864 280.00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 4 Y 6, EN CABLE 2F #4 THHN AL SERIE 8000 + 1T #8 CU THHN EN TUBERIA PVC DE 1"	ML	300.00	$ 25 725.00	$ 7 717 500.00	300.00	$ 25 725.00	$ 7 717 500.00		$ -	0.00	$ -	335.00	$ 25 725.00	$ 8 617 875.00	335.00	$ 8 617 875.00	0.00	$ -	335.00	$ 8 617 875.00
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 1 Y ALIMENTADOR GARITA, EN CABLE 2F #10 THHN CU + 1T #12 CU THHN, EN TUBERIA PVC DE 3/4"	ML	10.00	$ 31 096.00	$ 310 960.00	10.00	$ 31 096.00	$ 310 960.00		$ -	0.00	$ -	845.00	$ 31 096.00	$ 26 276 120.00	845.00	$ 26 276 120.00	0.00	$ -	845.00	$ 26 276 120.00
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 5, EN CABLE 2F #2 THHN AL SERIE 8000 + 1T #8 CU THHN, EN TUBERIA PVC DE 1-1/2",	ML	180.00	$ 26 686.00	$ 4 803 480.00	180.00	$ 26 686.00	$ 4 803 480.00		$ -	0.00	$ -	332.00	$ 26 686.00	$ 8 859 752.00	332.00	$ 8 859 752.00	0.00	$ -	332.00	$ 8 859 752.00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO #3x14 CU PARA CONEXIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO CANCHA POSTES 8 METROS	ML	120.00	$ 8 541.00	$ 1 024 920.00	120.00	$ 8 541.00	$ 1 024 920.00		$ -	0.00	$ -	48.00	$ 8 541.00	$ 409 968.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO #3x12 CU PARA CONEXIÓNADO DE LOS CIRCUITOS DE LOS REFLECTORES EN MASTILES DE 15 METROS	ML	200.00	$ 11 611.00	$ 2 322 200.00	200.00	$ 11 611.00	$ 2 322 200.00		$ -	0.00	$ -	200.00	$ 11 611.00	$ 2 322 200.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.3	**TABLERO DE BAJA TENSION Y CAJAS DE REGISTROS**				**$ 28 987 110.00**			**$ 28 987 110.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 31 404 555.00**		**$ 17 490 009.00**		**$ -**		**$ 17 490 009.00**
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA BAJA TENSIÓN IP54. MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 16, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA, ALTO(MM):2100, ANCHO(MM): 1100, FONDO(MM): 600, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE PARA 800A, DERIVACION DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, PRENTE MUERTO METALICO, KIT AISLADORES PORTABARRA.	UN	1.00	$ 6 005 657.00	$ 6 005 657.00	1.00	$ 6 005 657.00	$ 6 005 657.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6 005 657.00	$ 6 005 657.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTROL MANUAL DE ALUMBRADO, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 16, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA, ALTO(MM):600, ANCHO(MM): 500, FONDO(MM): 400, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), CONTROL MANUAL, PARA ALUMBRADO PUBLICO	UN	1.00	$ 6 415 328.00	$ 6 415 328.00	1.00	$ 6 415 328.00	$ 6 415 328.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6 415 328.00	$ 6 415 328.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER BIFASICO DE 12 CIRCUITOS, PARA LA SUBESTACION, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PROTECCION PRINCIPAL Y BREAKERS ENCHUFABLES	UN	1.00	$ 432 273.00	$ 432 273.00	1.00	$ 432 273.00	$ 432 273.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 432 273.00	$ 432 273.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTROS EN CONCRETO DE 1,0 X 1,0 X 1,0 METROS, INCLUYE MARCO Y TAPA METALICA	UN	8.00	$ 675 348.00	$ 5 402 784.00	8.00	$ 675 348.00	$ 5 402 784.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 675 348.00	$ 5 402 784.00	8.00	$ 5 402 784.00	0.00	$ -	8.00	$ 5 402 784.00
7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS REGISTROS EN CONCRETO DE 0,3 X 0,30 X 0,30 METROS, INCLUYE MARCO , TAPA METALICA Y 3 EMPALMES DE DERIVACION TIPO GEL PARA CONEXIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	UN	20.00	$ 483 489.00	$ 9 669 780.00	20.00	$ 483 489.00	$ 9 669 780.00		$ -	0.00	$ -	25.00	$ 483 489.00	$ 12 087 225.00	25.00	$ 12 087 225.00	0.00	$ -	25.00	$ 12 087 225.00
7.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA PARA POSTES DE LUCES CANCHA	UN	2.00	$ 530 644.00	$ 1 061 288.00	2.00	$ 530 644.00	$ 1 061 288.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 530 644.00	$ 1 061 288.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.4	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**				**$ 17 687 640.00**			**$ 17 687 640.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 17 687 640.00**		**$ -**		**$ 17 687 640.00**		**$ 17 687 640.00**
7.4.1	CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1.00	$ 17 687 640.00	$ 17 687 640.00	1.00	$ 17 687 640.00	$ 17 687 640.00		$ -		$ -	1.00	$ 17 687 640.00	$ 17 687 640.00		$ -	1.00	$ 17 687 640.00	1.00	$ 17 687 640.00
7.5	**ILUMINACION EXTERIOR Y POSTES METALICOS**				**$ 1 047 778 064.00**			**$ 1 047 778 064.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 1 018 958 816.00**		**$ -**		**$ 45 289 574.00**		**$ 45 289 574.00**
7.5.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE REFLECTORES MARCA ALUTRAFIC, ANSER 460W	UN	45.00	$ 4 938 722.00	$ 222 242 490.00	45.00	$ 4 938 722.00	$ 222 242 490.00		$ -	0.00	$ -	45.00	$ 4 938 722.00	$ 222 242 490.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.5.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMPARA TIPO AP 30W MARCA ALUTRAFIC, STREET SOLAR	UN	58.00	$ 3 315 593.00	$ 192 304 394.00	58.00	$ 3 315 593.00	$ 192 304 394.00		$ -	0.00	$ -	55.00	$ 3 315 593.00	$ 182 357 615.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.5.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE REFLECTOR MARCA ALUTRAFIC, LED SOLAR PROYECTOR 60W	UN	44.00	$ 8 401 793.00	$ 369 678 892.00	44.00	$ 8 401 793.00	$ 369 678 892.00		$ -	0.00	$ -	44.00	$ 8 401 793.00	$ 369 678 892.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.5.4	SUMINISTRO E INSTLACION DE REFLECTOR MARCA ALUTRAFIC, ANTARES 48L DE 80W	UN	12.00	$ 1 771 043.00	$ 21 252 516.00	12.00	$ 1 771 043.00	$ 21 252 516.00		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 1 771 043.00	$ 21 252 516.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METÁLICO CILINDRICO DE 15M DE ALTURA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CANASTILLA PARA PROYECTORES , PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN .	UN	10.00	$ 5 979 050.00	$ 59 790 500.00	10.00	$ 5 979 050.00	$ 59 790 500.00		$ -	0.00	$ -	10.00	$ 5 979 050.00	$ 59 790 500.00	0.00	$ -	5.00	$ 29 895 250.00	5.00	$ 29 895 250.00
7.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 8M DE ALTURA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CANASTILLA DE SOPORTE PARA PROYECTORES , PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	18.00	$ 3 848 581.00	$ 69 274 458.00	18.00	$ 3 848 581.00	$ 69 274 458.00		$ -	0.00	$ -	18.00	$ 3 848 581.00	$ 69 274 458.00	0.00	$ -	4.00	$ 15 394 324.00	4.00	$ 15 394 324.00
7.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 5M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, INCLUYE BRAZO, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	66.00	$ 1 715 679.00	$ 113 234 814.00	66.00	$ 1 715 679.00	$ 113 234 814.00		$ -	0.00	$ -	55.00	$ 1 715 679.00	$ 94 362 345.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.6	**ILUMINACION EXTERIOR Y POSTES METALICOS**				**$ 20 260 352.00**			**$ 20 260 352.00**		**$ -**		**$ -**			**$ 21 361 747.00**		**$ -**		**$ 10 171 494.00**		**$ 10 171 494.00**
7.6.1	SALIDA A LAMPARAS 120 V. EN CABLE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	32.00	$ 172 481.00	$ 5 519 392.00	32.00	$ 172 481.00	$ 5 519 392.00		$ -	0.00	$ -	37.00	$ 172 481.00	$ 6 381 797.00	0.00	$ -	33.00	$ 5 691 873.00	33.00	$ 5 691 873.00
7.6.2	SALIDA TOMACORRIENTE 120 V. (2P+T) EN CABLE DE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	15.00	$ 165 083.00	$ 2 476 245.00	15.00	$ 165 083.00	$ 2 476 245.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 165 083.00	$ 1 320 664.00	0.00	$ -	7.00	$ 1 155 581.00	7.00	$ 1 155 581.00
7.6.3	SALIDA TOMACORRIENTE 120 V. GFCI EN CABLE DE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	2.00	$ 209 603.00	$ 419 206.00	2.00	$ 209 603.00	$ 419 206.00		$ -	0.00	$ -	11.00	$ 209 603.00	$ 2 305 633.00	0.00	$ -	10.00	$ 2 096 030.00	10.00	$ 2 096 030.00
7.6.4	SALIDA TOMACORRIENTE 220 V. EN CABLE DE COBRE 2F #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	1.00	$ 197 003.00	$ 197 003.00	1.00	$ 197 003.00	$ 197 003.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 197 003.00	$ 197 003.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA DE 40 W	UN	28.00	$ 276 142.00	$ 7 731 976.00	28.00	$ 276 142.00	$ 7 731 976.00		$ -	0.00	$ -	24.00	$ 276 142.00	$ 6 627 408.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER DE 20 W	UN	4.00	$ 48 292.00	$ 193 168.00	4.00	$ 48 292.00	$ 193 168.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 48 292.00	$ 193 168.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
7.6.7	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	18.00	$ 87 715.00	$ 1 578 870.00	18.00	$ 87 715.00	$ 1 578 870.00		$ -	0.00	$ -	18.00	$ 87 715.00	$ 1 578 870.00	0.00	$ -	14.00	$ 1 228 010.00	14.00	$ 1 228 010.00
7.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2X1,6W	UN	7.00	$ 306 356.00	$ 2 144 492.00	7.00	$ 306 356.00	$ 2 144 492.00		$ -	0.00	$ -	9.00	$ 306 356.00	$ 2 757 204.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
IV.	**ZONAS EXTERIORES - ANDENES, ZONAS DE JUEGOS, ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO EXTERIOR**				**$ 1 630 449 945.00**			**$ 834 395 091.21**		**$ -**		**$ 80 035 223.13**			**$ 856 787 491.46**		**$ 160 315 791.04**		**$ 230 226 132.99**		**$ 470 577 147.16**
8.	**ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VÍAS**				**$ 1 457 319 079.36**			**$ 728 185 555.98**		**$ -**		**$ 75 938 180.08**			**$ 760 530 961.76**		**$ 160 315 791.04**		**$ 182 898 766.35**		**$ 419 152 737.47**
8.1	**TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES**				**$ 784 172 218.13**			**$ 262 565 022.97**		**$ -**		**$ 74 909 467.85**			**$ 281 388 219.75**		**$ 160 315 791.04**		**$ 28 885 524.79**		**$ 264 110 783.68**

ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISOR: RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
PERIODO DE COBRO: Del 16 de Diciembre al 29 de Febrero de 2023.

CONTRATO No. 007 de 2022.
FECHA DE INICIO: 19 de Mayo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 01: 12 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO No. 02: 06 de febrero de 2023
FECHA DE REINICIO No. 03: 01 de Septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: (08) OCHO MESES + (04) CUATRO MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 15 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 23 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Marzo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA No. 02 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL
8.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	6 429.21	$ 963.00	$ 6 191 329.23	5 191.52	$ 963.00	$ 4 999 430.97		$ -	5 191.52	$ 4 999 433.76	5 374.83	$ 963.00	$ 5 175 957.53	0.00	$ -	183.31	$ 176 526.57	5 374.83	$ 5 175 960.33
8.1.2	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	1 285.85	$ 101 394.00	$ 130 377 474.90	1 038.30	$ 101 394.00	$ 105 277 736.97		$ -	335.39	$ 34 006 986.89	1 133.72	$ 101 394.00	$ 114 952 263.19	603.97	$ 61 238 720.24	165.12	$ 16 742 039.38	1 104.48	$ 111 987 746.51
8.1.3	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x8cm, TRAFICO VEHICULAR. INCLUYE MORTERO DE PEGA, BASE EN ARENA, COMPACTACIÓN E INSTALACIÓN.	M2	2 137.92	$ 78 569.00	$ 167 974 236.48	-	$ 78 569.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 78 569.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.1.4	PISO EN BALDOSA DE CONCRETO TIPO CUADRATICA DE 40x40cm - ESPESOR=8.0cm - TRÁFICO PESADO, EN COLORES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO, TIPO ALFA O EQUIVALENT. INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 Y ALISTADO PISO EN ARENA.	M2	3 060.16	$ 100 437.00	$ 307 353 289.92	-	$ 100 437.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 100 437.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.1.5	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO fc=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	ML	1 997.10	$ 72 356.00	$ 144 502 167.60	1 906.89	$ 72 356.00	$ 137 975 215.03		$ -	496.20	$ 35 903 047.20	2 030.89	$ 72 356.00	$ 146 947 359.03	1 369.30	$ 99 077 070.80	165.39	$ 11 966 958.84	2 030.89	$ 146 947 076.84
8.1.6	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm. EN CONCRETO REFORZDO fc=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS.	ML	112.00	$ 238 544.00	$ 26 716 928.00	60.00	$ 238 544.00	$ 14 312 640.00		$ -	0.00	$ -	60.00	$ 238 544.00	$ 14 312 640.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.1.7	RAMPAS DISCAPACITADOS - E=10cm, CONCRETO CLASE D (fc=3.000PSI) ESTRIADAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MOLDE - SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	ML	12.00	$ 88 066.00	$ 1 056 792.00	-	$ 88 066.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 88 066.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.2	**PAISAJISMO**				**$ 92 359 813.50**			**$ 37 224 582.34**		**$ -**		**$ -**			**$ 37 224 582.34**		**$ -**		**$ 20 963 520.00**		**$ 20 963 520.00**
8.2.1	CONTENEDOR DE RAIZ DE 1.40x1.40x1.40m EN CONCRETO DE fc=2.000PSI, ANCHO DE PARED 10cm, CON REMATE SUPERIOR EN BORDILLO DE 20x20cm, BASE EN LECHO FILTRANTE CON GRAVILLA DE 3/4" Y RELLENO CON TIERRA NEGRA HASTA -2.0cm DEL NIVEL SUPERIOR DEL	UN	30.00	$ 1 048 176.00	$ 31 445 280.00	30.00	$ 1 048 176.00	$ 31 445 280.00		$ -	0.00	$ -	30.00	$ 1 048 176.00	$ 31 445 280.00	0.00	$ -	20.00	$ 20 963 520.00	20.00	$ 20 963 520.00
8.2.2	SIEMBRA DE ARBOL NATIVO, ALTURA h=3.0m. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN Y SOSTENIMIENTO.	UN	70.00	$ 186 068.00	$ 13 024 760.00	30.00	$ 186 068.00	$ 5 582 040.00		$ -	0.00	$ -	30.00	$ 186 068.00	$ 5 582 040.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.2.3	EMPRADIZACIÓN ZONAS VERDES. INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LA GRAMA, TIERRA NEGRA Y FERTILIZANTES.	M2	1 470.50	$ 32 567.00	$ 47 889 773.50	6.06	$ 32 567.00	$ 197 262.34		$ -	0.00	$ -	6.06	$ 32 567.00	$ 197 262.34	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3	**ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES**				**$ 580 787 047.73**			**$ 428 395 950.67**		**$ -**		**$ 1 028 712.23**			**$ 441 918 159.67**		**$ -**		**$ 133 049 721.56**		**$ 134 078 433.79**
8.3.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	373.00	$ 963.00	$ 359 199.00	1 068.24	$ 963.00	$ 1 028 712.23		$ -	1 068.24	$ 1 028 712.23	1 068.24	$ 963.00	$ 1 028 712.23	0.00	$ -	0.00	$ -	1 068.24	$ 1 028 712.23
8.3.2	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	74.60	$ 101 394.00	$ 7 563 992.40	213.65	$ 101 394.00	$ 21 662 564.48		$ -	0.00	$ -	213.65	$ 101 394.00	$ 21 662 564.48	0.00	$ -	213.65	$ 21 662 564.48	213.65	$ 21 662 564.48
8.3.3	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO fc=3.000PSI, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600grsM3.	M2	373.00	$ 88 736.00	$ 33 098 828.00	1 068.24	$ 88 736.00	$ 94 791 078.43		$ -	0.00	$ -	1 068.24	$ 88 736.00	$ 94 791 078.43	0.00	$ -	1 068.24	$ 94 791 078.43	1 068.24	$ 94 791 078.43
8.3.4	SHOCK PAD (PISO EN CAUCHO ENCAPSULADO) PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES - ACABADO EN COLORES DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTÓNICO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	M2	240.00	$ 145 667.00	$ 34 960 080.00	357.83	$ 145 667.00	$ 52 124 313.94		$ -	0.00	$ -	357.83	$ 145 667.00	$ 52 124 313.94	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.5	MODULO DE JUEGO INFANTIL TIPO GRANDE. CONSTRUIDO EN LÁMINA VULCANIZADA ENCAUCHADA ANTIDESLIZANTE. JUEGOS MOTRICES PARA NIÑOS DE 0 - 6 AÑOS Y OBSTACULOS PARA NIÑOS DE 6 - 12 AÑOS.	UN	2.00	$ 88 073 725.50	$ 176 147 451.00	1.00	$ 88 073 725.50	$ 88 073 725.50		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 88 073 725.50	$ 88 073 725.50	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.6	JUEGO INFANTIL TRADICIONAL CONSTRUIDO CON ELEMENTOS SEGUROS E INMUNIZADA AL VACÍO Y A PRESIÓN.	UN	6.00	$ 13 805 533.00	$ 82 833 198.00	4.00	$ 13 805 533.00	$ 55 222 132.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 13 805 533.00	$ 55 222 132.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.7	JUEGO INFANTIL TIPO CARRUSEL. CONSTRUIDO EN LÁMINA VULCANIZADA ENCAUCHADA ANTIDESLIZANTE.	UN	6.00	$ 21 055 621.00	$ 126 333 726.00	2.00	$ 21 055 621.00	$ 42 111 242.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 21 055 621.00	$ 42 111 242.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.8	BANCA DE CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30, INCLUYE BASES EN CONCRETO DE fc=2.000PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	30.00	$ 577 683.00	$ 17 330 490.00	20.00	$ 577 683.00	$ 11 553 660.00		$ -	0.00	$ -	30.00	$ 577 683.00	$ 17 330 490.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.9	CANECA PARA BASURAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE BASES EN CONCRETO DE fc=2.000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	8.00	$ 691 549.00	$ 5 532 392.00	13.00	$ 691 549.00	$ 8 990 137.00		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 691 549.00	$ 11 064 784.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.10	BANCA EN ACERO INOXIDABLE - SIN ESPALDAR. INCLUYE BASES EN CONCRETO DE fc=2.000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	8.00	$ 1 417 683.00	$ 11 341 464.00	8.00	$ 1 417 683.00	$ 11 341 464.00		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 1 417 683.00	$ 17 012 196.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.11	BATERIA DE JUEGOS METALICOS PARA PARQUE BIO-SALUDABLE, CONSTA DE (9 ELEMENTOS).	UN	1.00	$ 24 900 842.44	$ 24 900 842.44	1.00	$ 24 900 842.44	$ 24 900 842.44		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 24 900 842.44	$ 24 900 842.44	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.12	FUENTE DE AGUA EN CONCRETO fc=3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE FORMALETA, Y ACABADOS.	UN	2.00	$ 4 959 794.00	$ 9 919 588.00	-	$ 4 959 794.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 4 959 794.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
8.3.13	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO fc=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PARA CERRAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES	ML	162.91	$ 72 356.00	$ 11 787 515.96	229.37	$ 72 356.00	$ 16 596 078.65		$ -	0.00	$ -	229.37	$ 72 356.00	$ 16 596 078.65	0.00	$ -	229.37	$ 16 596 078.65	229.37	$ 16 596 078.65
8.3.14	CERRAMIENTO DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, SEGUN DISEÑOS	ML	162.91	$ 237 423.00	$ 38 678 580.93	-	$ 237 423.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 237 423.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
9.	**PARQUEADERO VEHICULAR**				**$ 87 362 121.05**			**$ 97 439 316.77**		**$ -**		**$ 4 097 043.05**			**$ 87 486 311.24**		**$ -**		**$ 47 327 366.64**		**$ 51 424 409.69**
9.1	**PARQUEADERO**				**$ 87 362 121.05**			**$ 97 439 316.77**		**$ -**		**$ 4 097 043.05**			**$ 87 486 311.24**		**$ -**		**$ 47 327 366.64**		**$ 51 424 409.69**
9.1.1	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	4 311.15	$ 963.00	$ 4 151 637.45	4 254.46	$ 963.00	$ 4 097 043.05		$ -	4 254.46	$ 4 097 043.05	4 254.46	$ 963.00	$ 4 097 043.05	0.00	$ -	0.00	$ -	4 254.46	$ 4 097 043.05
9.1.2	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE.	M3	862.23	$ 15 224.00	$ 13 126 589.52	850.89	$ 15 224.00	$ 12 953 973.72		$ -	0.00	$ -	673.52	$ 15 224.00	$ 10 253 599.36	0.00	$ -	673.52	$ 10 253 599.36	673.52	$ 10 253 599.36
9.1.3	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO fc=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	ML	317.00	$ 72 356.00	$ 22 936 852.00	512.38	$ 72 356.00	$ 37 073 767.28		$ -	0.00	$ -	512.38	$ 72 356.00	$ 37 073 767.28	0.00	$ -	512.38	$ 37 073 767.28	512.38	$ 37 073 767.28
9.1.4	SEÑALES DE TRANSITO DE 0.75x0.75m, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4". SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	12.00	$ 313 476.00	$ 3 761 712.00	8.00	$ 313 476.00	$ 2 507 808.00		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 313 476.00	$ 3 761 712.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
9.1.5	CAPA DE GRAVILLA GRUESA SUELTA Y EXTENDIDA PARA ZONA DE PARQUEADEROS.	M3	431.12	$ 100 634.00	$ 43 385 330.08	405.50	$ 100 634.00	$ 40 806 724.72		$ -	0.00	$ -	320.97	$ 100 634.00	$ 32 300 189.55	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
10.	**CERRAMIENTO EXTERIOR**				**$ 77 029 500.00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10.1	**CERRAMIENTO EXTERIOR**				**$ 77 029 500.00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10.1.1	CERRAMIENTO PERIMETRAL CON VIGA DE CIMENTACIÓN 30x30cm EN CONCRETO REFORZADO fc=3.000PSI; ANTEPECHO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=20cm - ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR CON MORTERO 1:4 ; MALLA ESLABONADA 2x2" - CALB.12 Y SOPORTE EN TUBO REDONDO 2" EMBEBIDO EN COLUMNETA DE CONCRETO DE 20x20cm Y CINTA DE 10x20cm SOBRE MURO EN CONCRETO fc=3.000PSI. INCLUYE ACABADOS.	M2	250.00	$ 308 118.00	$ 77 029 500.00	-	$ 308 118.00	$ -		$ -	0.00	$ -	-	$ 308 118.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
11.	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				**$ 8 739 244.59**			**$ 8 770 218.46**		**$ -**		**$ -**			**$ 8 770 218.46**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11.1	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				**$ 8 739 244.59**			**$ 8 770 218.46**		**$ -**		**$ -**			**$ 8 770 218.46**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11.1.1	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO.	M2	39 131.53	$ 223.33	$ 8 739 244.59	39 270.22	$ 223.33	$ 8 770 218.46		$ -	0.00	$ -	39 270.22	$ 223.33	$ 8 770 218.46	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
COSTOS DIRECTOS					**$ 6 915 479 130.64**			**$ 6 083 604 161.62**		**$ 1 108 746 415.44**		**$ 1 031 636 161.90**			**$ 5 794 719 751.08**		**$ 1 069 024 715.15**		**$ 515 814 711.18**		**$ 3 725 222 003.69**
COSTOS INDIRECTOS					**$ 2 074 643 739.19**			**$ 1 825 081 248.49**		**$ 332 623 924.63**		**$ 309 490 848.57**			**$ 1 738 415 925.32**		**$ 320 707 414.55**		**$ 154 744 413.35**		**$ 1 117 566 601.11**
	ADMINISTRACIÓN	24.00%			$ 1 659 714 991.35			$ 1 460 064 998.79		$ 266 099 139.71		$ 247 592 678.86			$ 1 390 732 740.26		$ 256 565 931.64		$ 123 795 530.68		$ 894 053 280.89
	IMPREVISTOS	1.00%			$ 69 154 791.31			$ 60 836 041.62		$ 11 087 464.15		$ 10 316 361.62			$ 57 947 197.51		$ 10 690 247.15		$ 5 158 147.11		$ 37 252 220.04
	UTILIDAD	5.00%			$ 345 773 956.53			$ 304 180 208.08		$ 55 437 320.77		$ 51 581 808.10			$ 289 735 987.55		$ 53 451 235.76		$ 25 790 735.56		$ 186 261 100.18
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 8 990 122 870.00**			**$ 7 908 685 410.00**		**$ 1 441 370 340.00**		**$ 1 341 127 010.00**			**$ 7 533 135 676.00**		**$ 1 389 732 130.00**		**$ 670 559 125.00**		**$ 4 842 788 605.00**
	ÍTEMS NO PREVISTOS																				
12	**PATINODROMO Y GRADERÍAS**							**$ 195 850 215.07**		**$ -**		**$ -**			**$ 94 795 716.91**		**$ 73 434 953.82**		**$ 10 122 631.41**		**$ 83 557 585.22**
12.1	**CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**							**$ 176 435 406.41**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12.1.1	TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO fc=4.000PSI - IMPERMEABILIZADO. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA	M3				165.63	$ 1 065 217.64	$ 176 435 406.41		$ -	0.00	$ -	-	$ 1 065 217.64	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
12.2	**MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL**							**$ 3 714 205.82**		**$ -**		**$ -**			**$ 79 409 976.22**		**$ 71 711 620.46**		**$ 6 557 004.48**		**$ 78 268 624.93**
12.2.1	DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				50.10	$ 34 986.17	$ 1 752 807.12		$ -	0.00	$ -	50.10	$ 34 986.17	$ 1 752 807.12	0.00	$ -	50.10	$ 1 752 807.12	50.10	$ 1 752 807.12
12.2.2	ALFAJÍAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				30.30	$ 37 666.58	$ 1 141 297.37		$ -	0.00	$ -	30.30	$ 37 666.58	$ 1 141 297.37	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
12.2.3	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				20.04	$ 40 923.22	$ 820 101.33		$ -	0.00	$ -	20.04	$ 40 923.22	$ 820 101.33	0.00	$ -	20.04	$ 820 101.33	20.04	$ 820 101.33
12.2.4	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H-10	M2								$ -		$ -	206.48	$ 72 970.88	$ 15 067 027.30	206.48	$ 15 067 027.30	0.00	$ -	206.48	$ 15 067 027.30
12.2.5	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=15CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M, COLOR GRIS CLARO ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4.	M2								$ -		$ -	219.36	$ 89 871.43	$ 19 714 322.70	181.23	$ 16 287 471.16	38.13	$ 3 426 797.63	219.36	$ 19 714 268.78
12.2.6	CONCRETO CICLOPEO PARA BASE DE MUROS Y CERRAMIENTO	M3								$ -		$ -	42.01	$ 495 600.00	$ 20 821 444.56	42.01	$ 20 821 444.56	0.00	$ -	42.01	$ 20 821 444.56
12.2.7	FRISO PARA MUROS Y PLACA AEREAS	M3								$ -		$ -	721.09	$ 27 864.92	$ 20 092 975.84	701.09	$ 19 535 677.44	20.00	$ 557 298.40	721.09	$ 20 092 975.84
12.3	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**							**$ 15 700 602.84**		**$ -**		**$ -**			**$ 1 848 888.02**		**$ 1 723 333.36**		**$ -**		**$ 1 723 333.36**

ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISOR: RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
PERIODO DE COBRO: Del 16 de Diciembre al 29 de Febrero de 2023.

CONTRATO No. 007 de 2022.
FECHA DE INICIO: 19 de Mayo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 01: 12 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO No. 02: 06 de febrero de 2023
FECHA DE REINICIO No. 03: 01 de Septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: (06) OCHO MESES + (04) CUATRO MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 15 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 23 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Marzo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA No. 02 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS			ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL	VALOR TOTAL
12.3.1	REGISTRO RED WHITE 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN				1.00	$ 125 554.66	$ 125 554.66		$ -		$ -	1.00	$ 125 554.66	$ 125 554.66	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15 PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES	ML				155.20	$ 50 096.90	$ 7 775 038.88		$ -		$ -	34.40	$ 50 096.90	$ 1 723 333.36	34.40	$ 1 723 333.36	0.00	$ -	34.40	$ 1 723 333.36
12.3.3	EQUIPO PARA RIEGO PREENSAMBLADO COMPUESTO POR UN (01) ELECTROBOMBA. INCLUYE TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN.	UN				1.00	$ 7 800 009.30	$ 7 800 009.30		$ -		$ -	-	$ 7 800 009.30	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
12.4	**TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES**							**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 13 536 852.67**	**$ -**		**$ -**		**$ 3 565 626.93**	
12.4.1	MORTERO DE NIVELACIÓN	M2								$ -		$ -	130.30	$ 27 364.75	$ 3 565 626.93	0.00	$ -	130.30	$ 3 565 626.93	130.30	$ 3 565 626.93
12.4.2	ENCHAPE ANTIDESLIZANTE PARA PISOS	M2								$ -		$ -	130.30	$ 76 525.14	$ 9 971 225.74	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
13	**ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VÍAS**							**$ 636 024 754.38**		**-**		**153 682 590.21**			**$ 683 349 520.37**		**347 812 946.62**		**151 660 727.57**		**653 156 264.40**
13.1	**TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES**							**$ 636 024 754.38**		**$ -**		**$ 153 682 590.21**			**$ 683 349 520.37**		**$ 347 812 946.62**		**$ 151 660 727.57**		**$ 653 156 264.40**
13.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3				1 696.63	$ 33 653.00	$ 57 096 650.37		$ -	663.78	$ 22 338 281.99	1 779.44	$ 33 653.00	$ 59 883 492.51	665.66	$ 22 401 360.52	385.71	$ 12 980 300.44	1 715.15	$ 57 719 942.95
13.1.2	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO Y/O ESTAMPADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm.	M2				6 201.29	$ 93 356.06	$ 578 928 104.01		$ -	1406.92	$ 131 344 308.22	6 678.37	$ 93 356.06	$ 623 466 027.86	3 485.70	$ 325 411 586.10	1 485.50	$ 138 680 427.13	6 378.12	$ 595 436 321.45
14	**CANCHA MÚLTIPLE Y SENDERO PEATONALES**							**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 260 512 267.50**		**$ 198 609 951.90**		**$ 49 586 955.00**		**$ 248 196 906.90**
14.1	**CANCHA MÚLTIPLE Y SENDEROS PEATONALES**							**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 149 022 996.90**		**$ 149 022 996.90**		**$ -**		**$ 149 022 996.90**
14.1.1	CONFORMACIÓN EN AFIRMADO	M3								$ -	$ -	$ -	1 464.43	$ 101 762.00	$ 149 022 996.90	1 464.43	$ 149 022 996.90	0.00	$ -	1 464.43	$ 149 022 996.90
14.2	**CANCHA MÚLTIPLE EN CONCRETO**							**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 111 489 270.60**		**$ 49 586 955.00**		**$ 49 586 955.00**		**$ 99 173 910.00**
14.2.1	PINTURA DE PLACA DE CANCHA	M2								$ -	$ -	$ -	372.90	$ 24 414.00	$ 9 103 980.60	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
14.2.2	DEMARCACION DE CANCHA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.05, INCL. MANO DE OBRA	ML								$ -	$ -	$ -	342.00	$ 9 390.00	$ 3 211 380.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
14.2.3	MALLA CONTRAIMPACTO ESLABONADA EN MODULOS 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 4.5MT Y APOYOS CADA 3MTS.	M2								$ -	$ -	$ -	435.00	$ 227 986.00	$ 99 173 910.00	217.50	$ 49 586 955.00	217.50	$ 49 586 955.00	435.00	$ 99 173 910.00
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**							**$ -**		**-**		**-**			**$ 82 101 875.00**		**82 101 875.00**		**-**		**82 101 875.00**
15.1	**ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION**							**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 82 101 875.00**		**$ 82 101 875.00**		**$ -**		**$ 82 101 875.00**
15.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL BIFASICA EN BAJA TENSION EN CABLE 3X(2F #4/0 AL SERIE 8000 + 1N #4/0 AL SERIE 8000 + 1T #1/0 AL SERIE 8000), EN TUBERIA DE 3X3" PVC , DESDE BORNES DEL TRASNFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL.	ML								$ -		$ -	310.00	$ 211 814.00	$ 65 662 340.00	310.00	$ 65 662 340.00	0.00	$ -	310.00	$ 65 662 340.00
15.1.2	ACOMETIDA PARA EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO DUPLEX TIPO HIDROFLO TRIFASICA (3F #4 AL SERIE 8000 + 1T #6 AL SERIE 8000)	ML								$ -		$ -	315.00	$ 52 189.00	$ 16 439 535.00	315.00	$ 16 439 535.00	0.00	$ -	315.00	$ 16 439 535.00
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS								**$ 831 874 969.45**		**$ -**		**$ 153 682 590.21**			**$ 1 120 759 379.78**		**$ 701 959 727.34**		**$ 211 370 313.98**		**$ 1 067 012 631.52**
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS								**$ 249 562 490.84**		**$ -**		**$ 46 104 777.06**			**$ 336 227 813.93**		**$ 210 587 918.20**		**$ 63 411 094.19**		**$ 320 103 789.46**
	ADMINISTRACIÓN	24.00%						$ 199 649 992.67		$ -		$ 36 883 821.65			$ 268 982 251.15		$ 168 470 334.56		$ 50 728 875.36		$ 256 083 031.56
	IMPREVISTOS	1.00%						$ 8 318 749.69		$ -		$ 1 536 825.90			$ 11 207 593.80		$ 7 019 597.27		$ 2 113 703.14		$ 10 670 126.32
	UTILIDAD	5.00%						$ 41 593 748.47		$ -		$ 7 684 129.51			$ 56 037 968.99		$ 35 097 986.37		$ 10 568 515.70		$ 53 350 631.58
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS							**$ 1 081 437 460.29**		**$ -**		**$ 199 787 367.27**			**$ 1 456 987 193.71**		**$ 912 547 645.54**		**$ 274 781 408.17**		**$ 1 387 116 420.98**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 6 915 479 130.64				$ 6 915 479 131.07		$ 1 108 746 415.44		$ 1 185 318 752.11			$ 6 915 479 130.86		$ 1 770 984 442.49		$ 727 185 025.16		$ 4 792 234 635.21
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 2 074 643 739.19				$ 2 074 643 739.32		$ 332 623 924.63		$ 355 595 625.63			$ 2 074 643 739.26		$ 531 295 332.75		$ 218 155 507.55		$ 1 437 670 390.56
	ADMINISTRACIÓN	24.00%		$ 1 659 714 991.35				$ 1 659 714 991.46		$ 266 099 139.71		$ 284 476 500.51			$ 1 659 714 991.41		$ 425 036 266.20		$ 174 524 406.04		$ 1 150 136 312.45
	IMPREVISTOS	1.00%		$ 69 154 791.31				$ 69 154 791.31		$ 11 087 464.15		$ 11 853 187.52			$ 69 154 791.31		$ 17 709 844.42		$ 7 271 850.25		$ 47 922 346.35
	UTILIDAD	5.00%		$ 345 773 956.53				$ 345 773 956.55		$ 55 437 320.77		$ 59 265 937.61			$ 345 773 956.54		$ 88 549 222.12		$ 36 359 251.26		$ 239 611 731.76
	CERTIFICACIÓN RETIE			$ 4 500 000.00				$ 4 500 000.00							$ 4 500 000.00						
	CERTIFICACIÓN RETILAP			$ 4 700 000.00				$ 4 700 000.00							$ 4 700 000.00						
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 8 999 322 870.00**				**$ 8 999 322 870.00**	**16.02%**	**$ 1 441 370 340.00**	**17.12%**	**$ 1 540 914 378.00**			**$ 8 999 322 870.00**	**25.58%**	**$ 2 302 279 775.00**	**10.50%**	**$ 945 340 533.00**	**69.23%**	**$ 6 229 905 026.00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**8 999 322 870.00**
ANTICIPO (%)		**15%**
VALOR PRESENTE ACTA SIN AMORTIZAR	**$**	**945 340 533.00**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA		**10.50%**
VALOR PARA AMORTIZAR	**$**	**141 801 079.95**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**803 539 453.05**

SECRETARIA DE PLANEACIÓN:

Firma:
IDALIDES DE JESÚS CASTRO
SECRETARIA DE PLANEACION M/PAL

SUPERVISIÓN:

Firma:
RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
SUPERVISOR DELEGADO

EL CONTRATISTA:

Firma:
JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
REP. LEGAL CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22
CONTRATISTA DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Firma:
YOSER IVAN SUÁREZ RODRÍGUEZ
REP. LEGAL CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
INTERVENTORÍA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.


Copias: Contratista, Interventor, Supervisión

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM:	2.1.9	**UNIDAD:**	M2	**CANT. CONTRACTUAL:**	3 441.55
CANT. COBRADA:	1 720.77	**CANT. ACUMULADA:**	1 720.77		

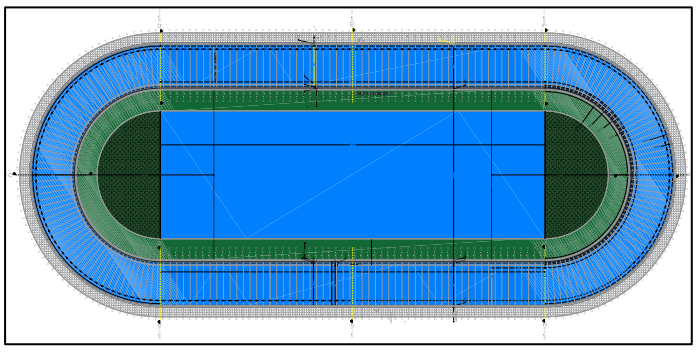



LOCALIZACIÓN	ÁREA	ESPESOR	% EJECUCIÓN	VOLUMÉN TOTAL
Limpieza de Asfalto	1 720.77		100%	1 720.77

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**1 720.77**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1 720.77**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SISTEMA HERCULAN (EQUIVALENTES Y/O SIMILARES) MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO		
ITEM:	2.1.10	**UNIDAD:** M2	**CANT. CONTRACTUAL:** 3 441.55	**CANT. COBRADA:** 1 720.77		**CANT. ACUMULADA:** 1 720.77	

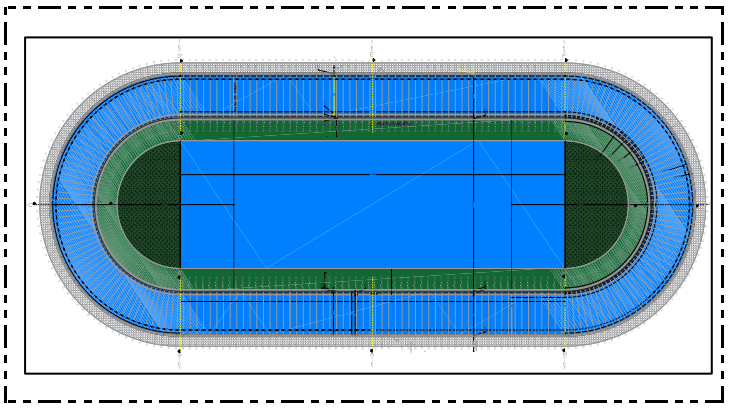



LOCALIZACIÓN	ÁREA	ESPESOR	% EJECUCIÓN	VOLUMÉN TOTAL
Recubrimiento de Zona de Calentamiento y Pista de Velocidad	1 720.77		100%	1 720.77

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**1 720.77**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1 720.77**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM: 3.1.3	**UNIDAD:** M3	**CANT. CONTRACTUAL:** 4 996.83	**CANT. COBRADA:** 4 996.83	**CANT. ACUMULADA:**	450.00

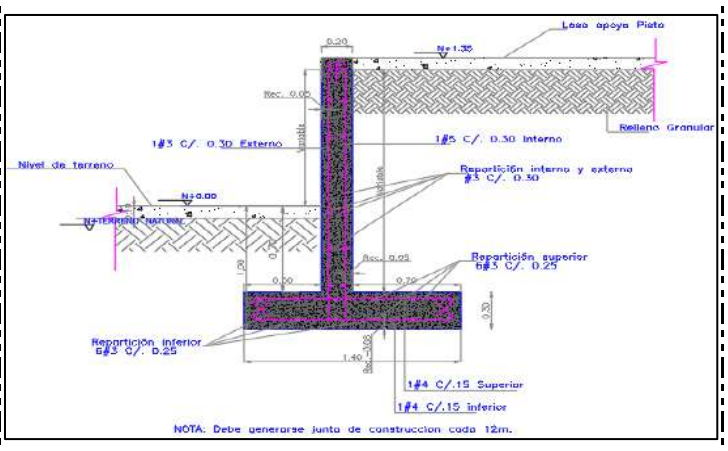

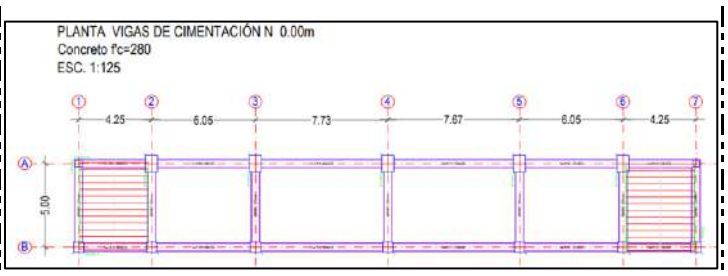



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Profundidad	Volumen		
Zapata Tipo 2	2.60	2.60	1.15	7.77	14.00	108.84
Zapata Tipo 4	3.10	3.10	1.05	10.09	10.00	100.91
Zapata Tipo 5	1.40	1.40	1.30	2.55	4.00	10.19
Viga de Cimentación Eje A	19.70	0.50	0.10	0.99	2.00	1.97
Viga de Cimentación Eje B	21.00	0.50	0.10	1.05	2.00	2.10
Viga de Cimentación Ejes 1 y 7.	3.10	0.50	0.10	0.16	4.00	0.62
Area Interna de Pistas de Patinaje	Area = 4.400.00 m2		0.15	660.00	1.00	660.00
Relleno Muro de Pista de Velocidad de 200m	61.01	0.50	0.70	21.35	2.00	42.71
	61.01	0.70	0.35	14.95	2.00	29.89
Area interna Pista de Patinaje de 200m	Area = 284.70 m2		0.15	42.71	1.00	42.71
Relleno zona verde				3 546.90	1.00	3 546.90
Relleno zona verde				450.00	1.00	450.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**450.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**4 996.83**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE CORTE MANUAL.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	3.1.4	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	151.47	**CANT. COBRADA:**	149.29	**CANT. ACUMULADA:**	2.30

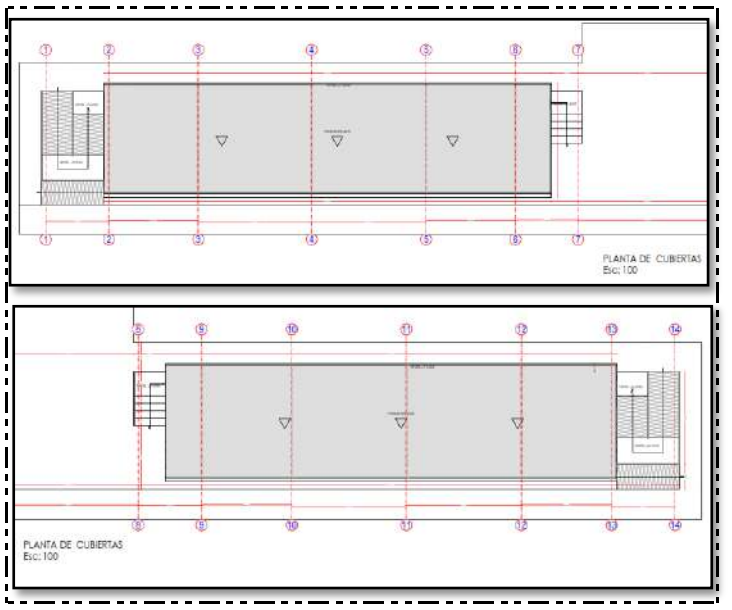



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Profundidad	Volumen		
Area de Graderias	40.16	12.20	0.15	73.49	2.00	146.99
Contrapiso de Garitas	2.95	2.60	0.15	1.15	2.00	2.30

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**2.30**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**149.29**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=3.500PSI - IMPERMEABILIZADO. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	3.2.11	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	38.12	**CANT. COBRADA:**	38.12	**CANT. ACUMULADA:**	26.46

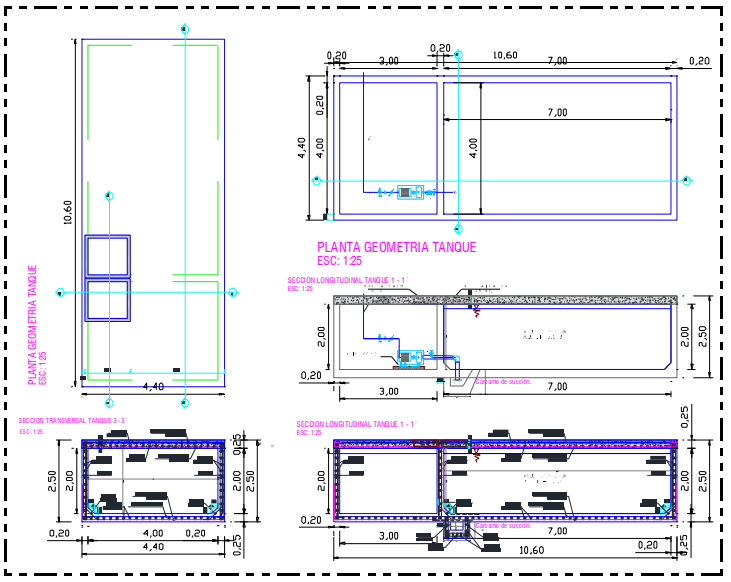



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Espesor		
Placa Inferior	10.60	4.40	0.25	1	11.66
Patín Inferior	11.00	0.25	0.25	1	0.69
Cárcamo de Succión	1.20	1.40	0.25	1	0.42
	0.25	1.40	0.20	2	0.14
	0.80	0.25	0.20	2	0.08
Muros	10.60	2.00	0.20	2	8.48
	4.00	2.00	0.20	3	4.80
Placa Superior	10.60	4.40	0.25	1	11.66
Base para Bombas	0.77	0.5	0.5	1	0.19

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**26.46**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**38.12**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO		

ITEM:	3.2.12	**UNIDAD:**	ML	**CANT. CONTRACTUAL:**	34.80	**CANT. COBRADA:**	30.24
CANT. ACUMULADA:	30.24						

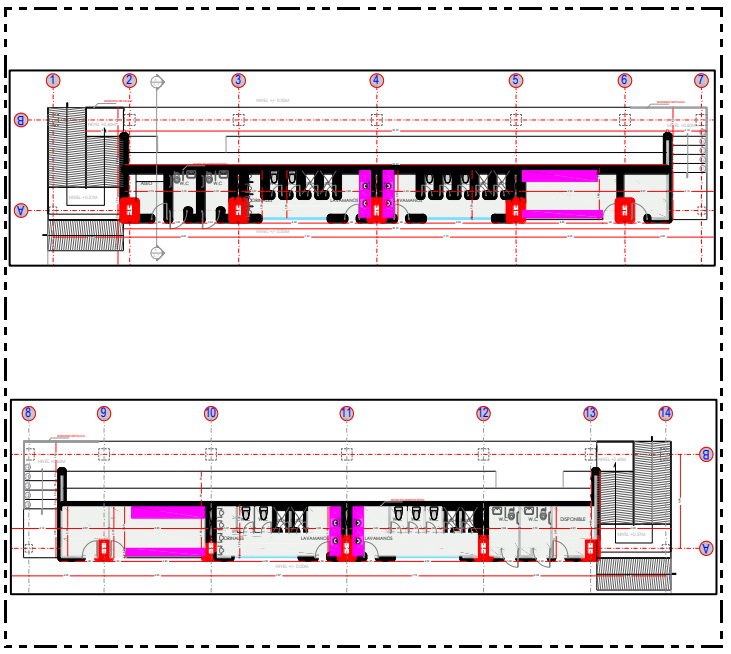



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Espesor		
Tienda No. 01	4.02			1	4.02
Tienda No. 01	4.45			1	4.45
Tienda No. 02	3.92			1	3.92
Tienda No. 02	4.45			1	4.45
Camerino No. 01	3.35			1	3.35
Camerino No. 02	3.35			1	3.35
Baño Mujeres	3.35			1	3.35
Baño Hombres	3.35			1	3.35

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**30.24**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**30.24**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50cm, CONECTORES Y ACABADO FINA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM: 3.3.1	**UNIDAD:** KG	**CANT. CONTRACTUAL:** 16 001.70	**CANT. COBRADA:** 16 001.70	**CANT. ACUMULADA:**	338.11

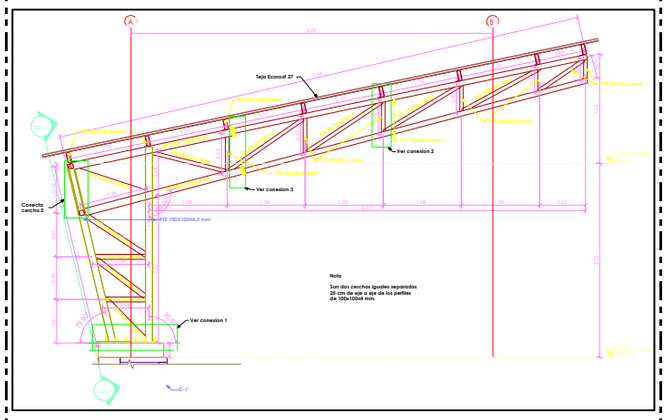

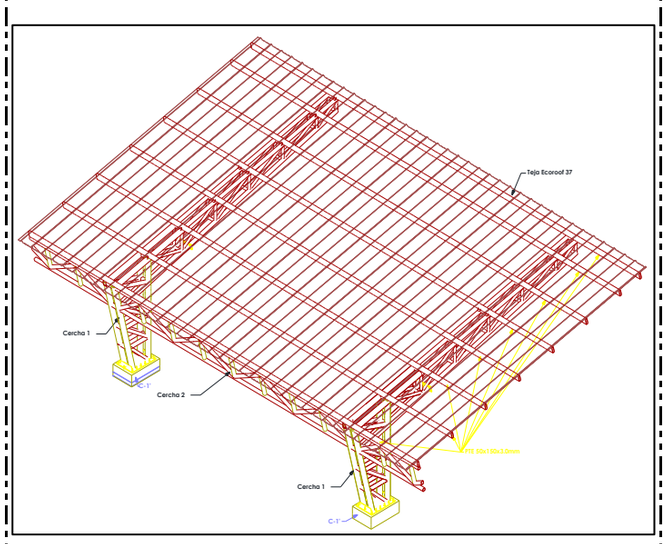



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO [Kg/ml]	PESO [Kg]	CANT.	PESO TOTAL
	Long	Ancho	Espesor				
Platina No. 01	0.76	0.51	0.0254	7850.00 Kg/m3	77.28	10	772.84
Platina No. 02	0.35	0.10	0.009		2.47	20	49.46
Platina No. 03	0.20	0.15	0.095		22.37	80	1 789.80
Perno de Anclaje tipo "J" Φ=5/8"	0.85			1.55 Kg/m3	1.32	140.00	184.45
Perfil PTE 50x50x3.0mm	1.07			4.51 Kg/m3	4.83	20	96.51
	1.28				5.77	20	115.46
	1.26				5.68	20	113.65
	1.23				5.55	20	110.95
	1.20				5.41	20	108.24
	0.77				3.47	20	69.45
	0.30				1.35	20	27.06
	0.37				1.67	20	33.37
	0.43				1.94	20	38.79
	0.49				2.21	20	44.20
	0.55				2.48	20	49.61
	0.58				2.62	20	52.32
Perfil PTE 70x70x3.0mm	4.98			6.39 Kg/m3	31.82	20	636.44
	4.90				31.31	20	626.22
	0.64				4.09	20	81.79
	0.78				4.98	20	99.68
	0.76				4.86	20	97.13
	0.83				5.30	20	106.07
	0.97				6.20	20	123.97
	1.04				6.65	20	132.91
Perfil PTE 100x100x4.0mm	2.59			12.14 Kg/m3	31.44	20	628.85
	2.07				25.13	20	502.60
	2.24				27.19	20	543.87
	2.24				27.19	20	543.87
Perfil PTE 100x100x4.0mm	0.25			12.14 Kg/m3	3.04	120.00	364.20
Perfil PTE 70x70x3.0mm	100.68			6.39 Kg/m3	643.35	2.00	1 286.69
	0.25			6.39 Kg/m3	1.60	100.00	159.75
Templete Φ=5/8"	80.60			1.55 Kg/m3	124.93	2.00	249.86
Correas PTE 50x150x3.0mm	30.50			9.22 Kg/m3	281.21	16.00	4 499.36
Perfil PTE 50x100x3.0mm	7.85			6.86 Kg/m3	53.85	2.00	107.70
Gradas Cancha Multiple	1.00			608.24 Kg/m3	608.24	2.00	1 216.47
Estructura Garita Correas, Perfiles…	1.00			169.06 Kg/m3	169.06	2.00	338.11

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**338.11**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**16 001.70**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO


CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	CUBIERTAS EN LÁMINA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	3.3.2	**UNIDAD:**	M2	**CANT. CONTRACTUAL:**	607.25	**CANT. COBRADA:**	607.25	**CANT. ACUMULADA:**	31.80

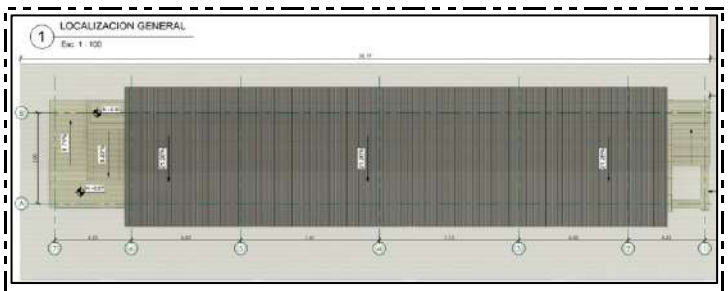

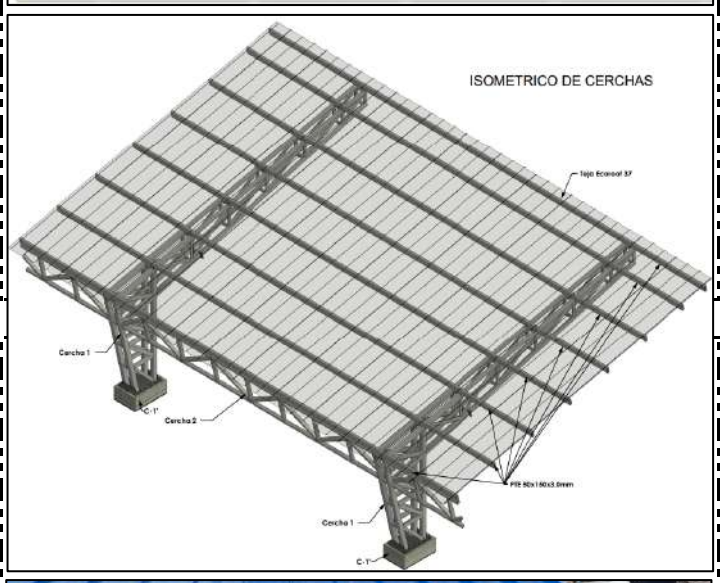



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Cubierta Graderias	30.50	7.85	239.43	1	239.43
	30.50	7.85	239.43	1	239.43
Cubierta Gradas Cancha Múltiple	10.50	4.60	48.30	2	96.60
Cubierta, Garitas	5.30	3.00	15.90	2	31.80

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**31.80**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**607.25**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	DOVELAS CON GROUTING DE f'c=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	3.5.3	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	12.66	**CANT. COBRADA:**	10.41	**CANT. ACUMULADA:**	10.41

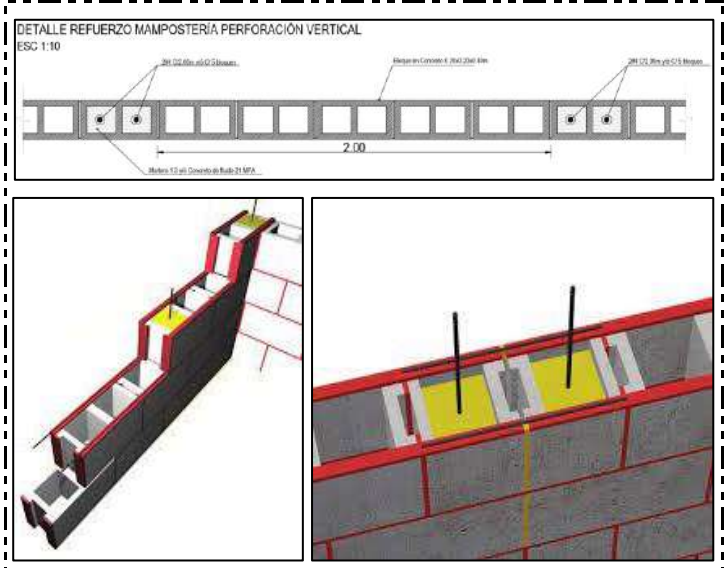



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Altura		
Dovelas Eje A	0.18	0.10	3.10	104	5.80
Dovelas Divisiones	0.18	0.10	2.20	44	1.74
Dovelas Parte Baja	0.18	0.10	1.50	106	2.86

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**10.41**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**10.41**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO


CONTRATO Nº 007 DE 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM: 3.5.4	**UNIDAD:** KG	**CANT. CONTRACTUAL:** 1 455.78	**CANT. COBRADA:** 1 134.38	**CANT. ACUMULADA:**	1 134.38



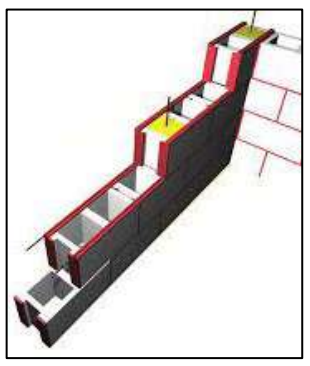

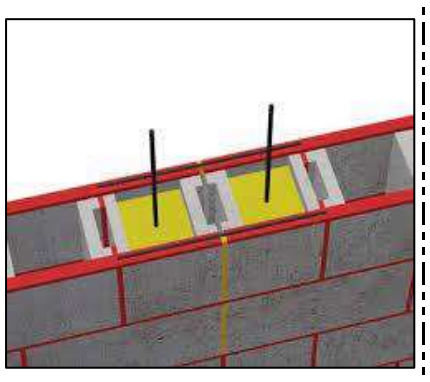

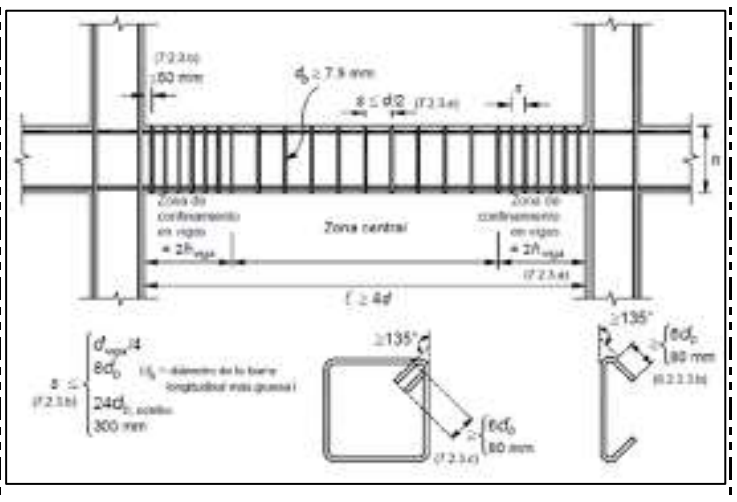



ELEMENTO / LOCALIZACIÓN	Long	Peso Unitario	CANT.	PESO TOTAL [Kg]
Refuerzo Dovelas Eje A	4.10	1.550	104.00	660.92
Refuerzo Dovelas Divisiones	2.20	1.550	44.00	150.04
Refuerzo Dovelas Parte Baja	1.60	1.550	106.00	262.88
Dintel (15*12cm), Cuarto de Aseo	1.20	0.994	2.00	2.39
	0.15	0.250	18.00	0.68
WC Mujeres, Dintel (15*12cm)	1.20	0.994	2.00	2.39
	0.15	0.250	18.00	0.68
	0.80	0.994	2.00	1.59
	0.15	0.250	18.00	0.68
WC Hombres, Dintel (15*12cm)	1.20	0.994	2.00	2.39
	0.15	0.250	18.00	0.68
	0.80	0.994	2.00	1.59
	0.15	0.250	18.00	0.68
Baños Hombres, Dintel (15*12cm)	1.20	0.994	2.00	2.39
	0.15	0.250	20.00	0.75
	4.40	0.994	2.00	8.75
	0.15	0.250	60.00	2.25
Baños Mujeres, Dintel (15*12cm)	1.20	0.994	2.00	2.39
	0.15	0.250	20.00	0.75
	4.40	0.994	2.00	8.75
	0.15	0.250	60.00	2.25
Local 1, Dintel (15*12cm)	1.00	0.994	2.00	1.99
	0.15	0.250	12.00	0.45
	4.45	0.994	2.00	8.85
	0.15	0.250	60.00	2.25
Cuarto Disp. Dintel (15*12cm)	1.20	0.994	2.00	2.39
	0.15	0.250	16.00	0.60
	0.80	0.994	2.00	1.59
	0.15	0.250	12.00	0.45

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**1 134.38**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1 134.38**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	JUEGO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA PARA LA CANCHA MULTIPLE. INCLUYE REDES CON GUAYA Y REFUERZO EN EL CENTRO Y TENSOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	5.1.7	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	1.00	**CANT. COBRADA:** 1.00	**CANT. ACUMULADA:** 1.00

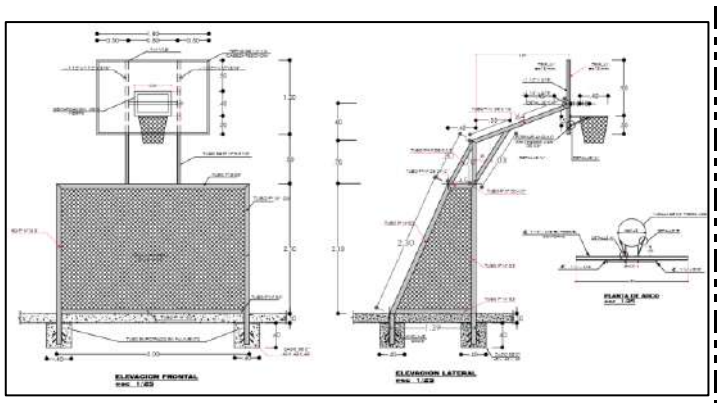



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Juego completo de Estructura para cancha multiple, Incluye dos arcos, con dos tableros para baloncesto y la cancha de Voleibol.				1	1.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**1.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO		
ITEM:	7.4.1	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	1.00	**CANT. COBRADA:**	1.00	**CANT. ACUMULADA:**	1.00

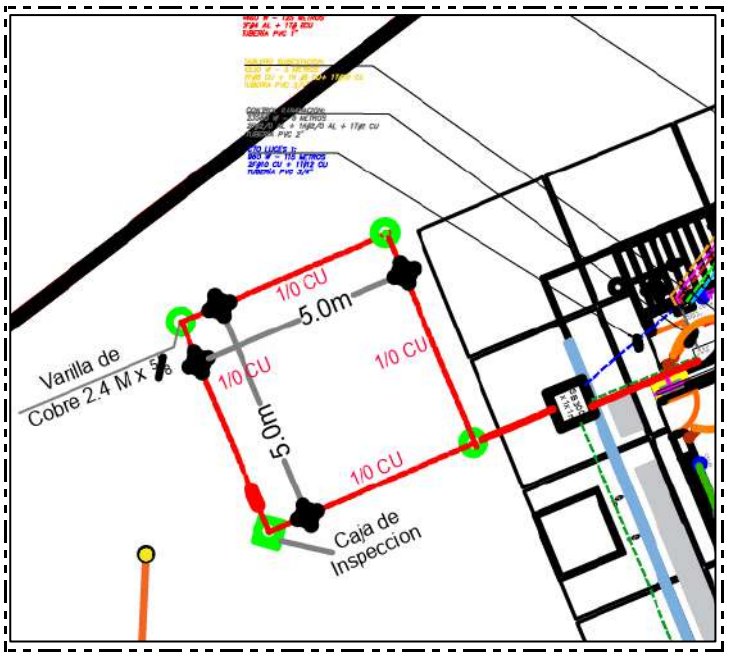



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Malla de Protección contra descargas					1.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**1.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO CILINDRICO DE 15M DE ALTURA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CANASTILLA PARA PROYECTORES , PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN .	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO		
ITEM:	7.5.5	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	10.00	**CANT. COBRADA:**	5.00	**CANT. ACUMULADA:**	5.00

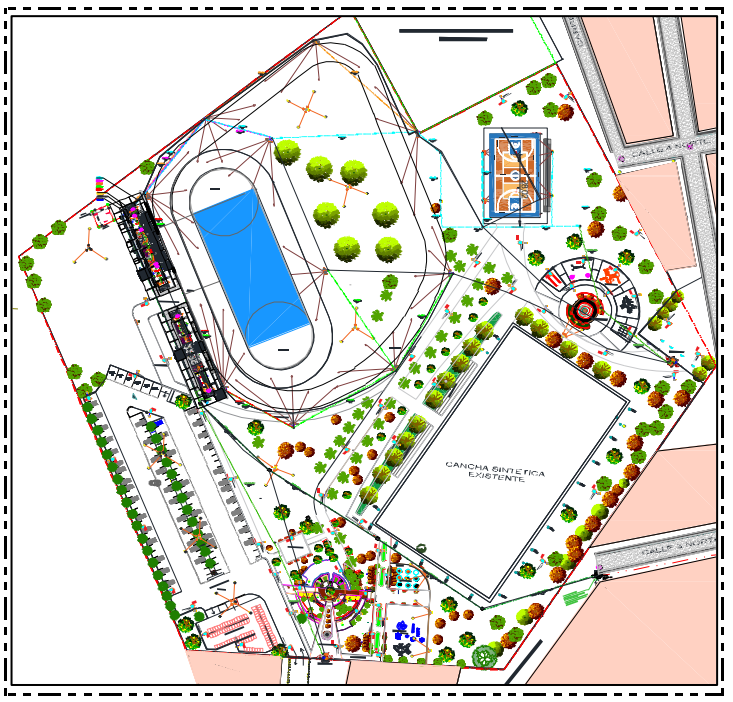





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Mastiles para - iluminación de Pistas de Patinaje					5.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**5.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**5.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO


CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 8M DE ALTURA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CANASTILLA DE SOPORTE PARA PROYECTORES , PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	7.5.6	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	18.00	**CANT. COBRADA:**	4.00	**CANT. ACUMULADA:**	4.00

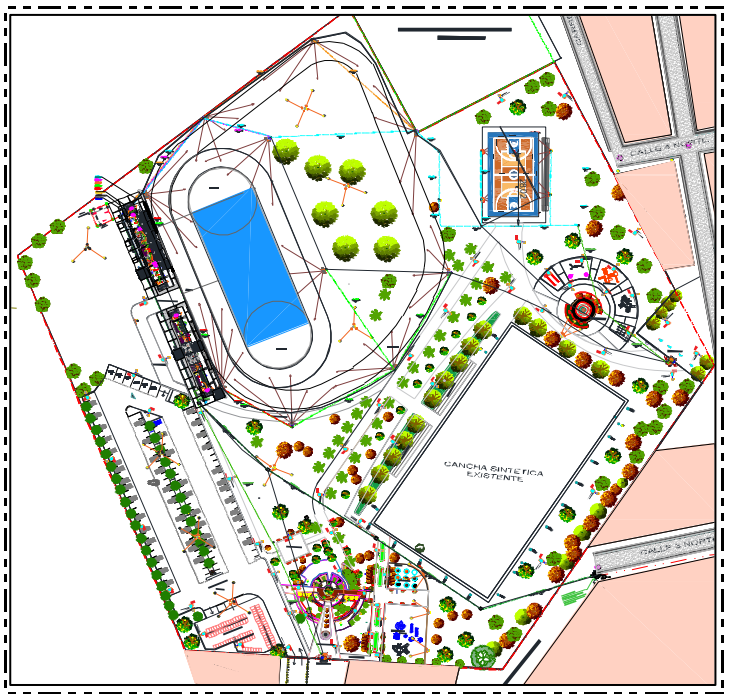

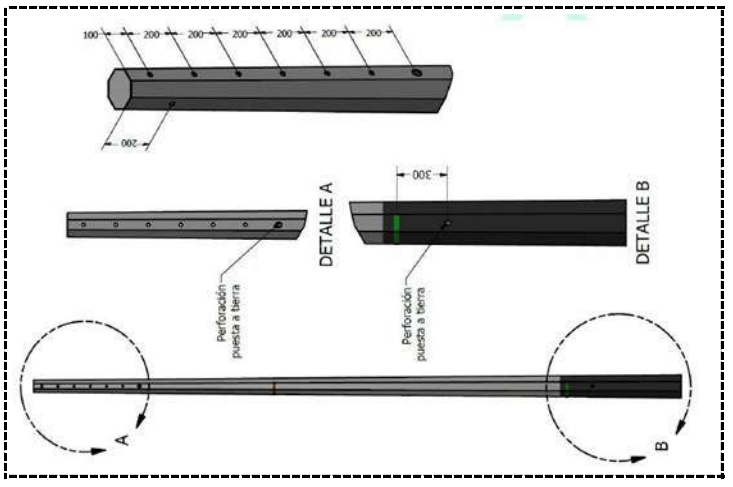

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Postes, Cancha Múltiple					4.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**4.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**4.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO


CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SALIDA A LAMPARAS 120 V. EN CABLE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	7.6.1	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	37.00	**CANT. EJECUTADA:** 0.00	**CANT. ACUMULADA:** 33.00

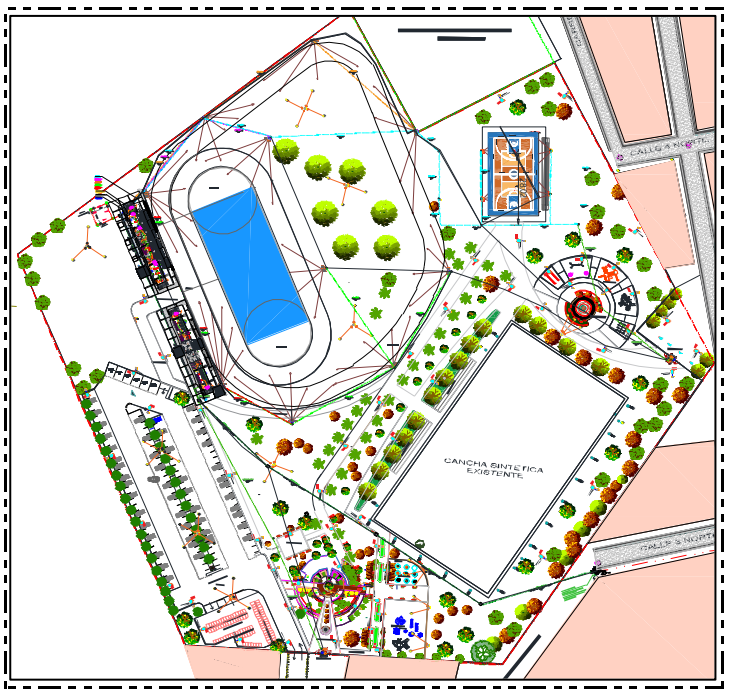

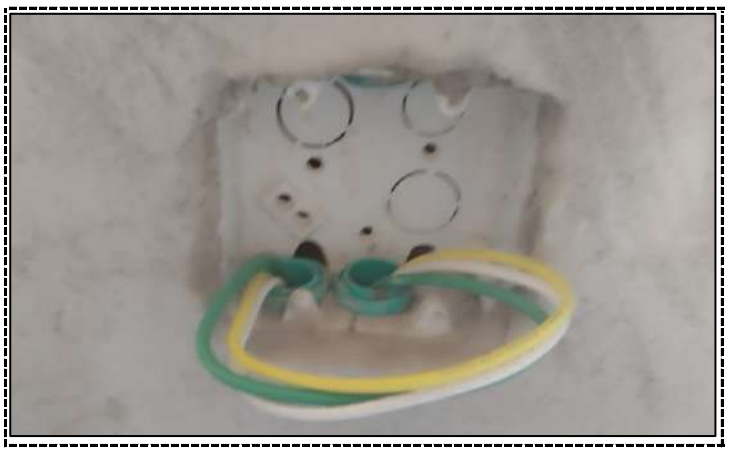

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Cuarto de Aseo					2
Baño PMR Mujeres					2
Baño PMR Hombres					2
Baños Hombres					6
Baño Mujeres					6
Local o Tienda					4
Cuarto Disponible					2
Lamparas de Emergencia					9

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**33.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**33.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO


CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SALIDA TOMACORRIENTE 120 V. (2P+T) EN CABLE DE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	7.6.2	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	8.00	**CANT. EJECUTADA:** 0.00	**CANT. ACUMULADA:** 7.00

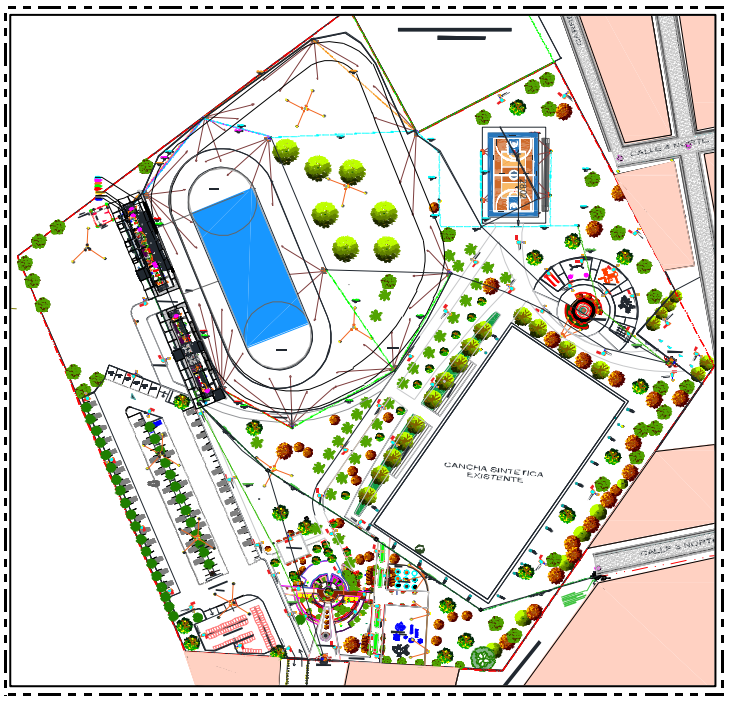

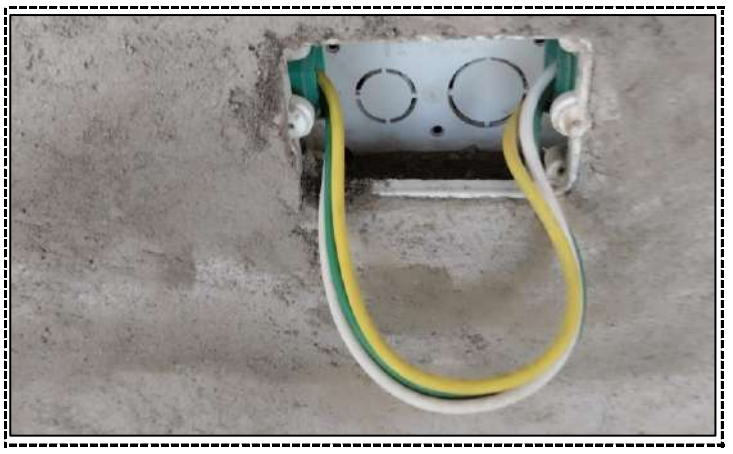

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Local o Tienda					4.00
Cuarto Disponible					1.00
Cuarto Eléctrcio					1.00
Cuarto Disponible					1.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**7.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**7.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SALIDA TOMACORRIENTE 120 V. GFCI EN CABLE DE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4"	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	7.6.3	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	11.00	**CANT. EJECUTADA:**	0.00	**CANT. ACUMULADA:**	10.00

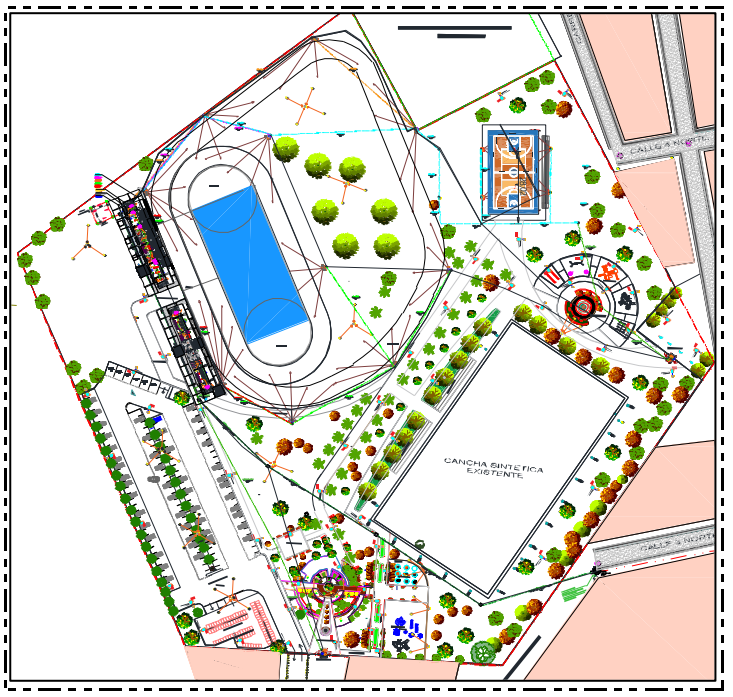



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Baño PMR Mujeres					2.00
Baño PMR Hombres					2.00
Baños Hombres					2.00
Baño Mujeres					2.00
Local o Tienda					2.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**10.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**10.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	7.6.7	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	18.00	**CANT. EJECUTADA:**	0.00	**CANT. ACUMULADA:**	14.00

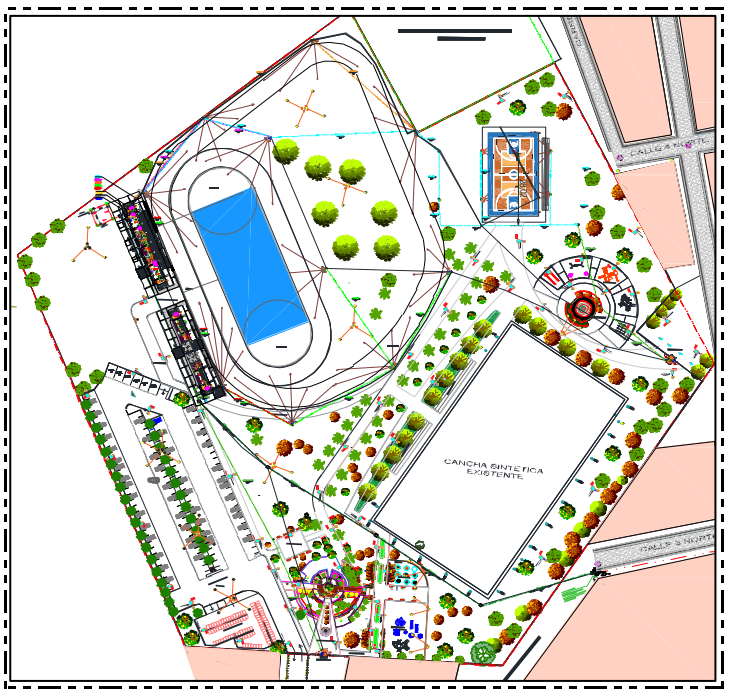



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Cuarto de Aseo					2.00
Baño PMR Mujeres					2.00
Baño PMR Hombres					2.00
Baños Hombres					2.00
Baño Mujeres					2.00
Local o Tienda					2.00
Cuarto Disponible					2.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**14.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**14.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	8.1.1	**UNIDAD:**	M2	**CANT. CONTRACTUAL:**	5 374.83	**CANT. COBRADA:**	5 374.83	**CANT. ACUMULADA:**	183.31

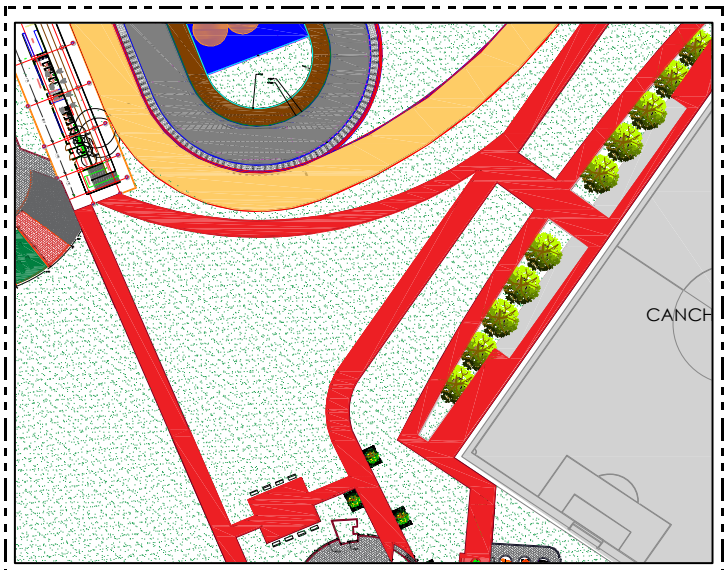



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Área	Espesor		
Senderos Peatonal Perimetro Externo Pista de 200m	535.96		1	535.96
Senderos Peatonales	3 090.49		1	3 090.49
	86.91		1	86.91
	363.47		1	363.47
Entrada Principal	271.77		1	271.77
Entrada Secundaria	671.43		1	671.43
Separador Parqueadero	171.50		1	171.50
Acceso a Cancha Multiple	183.31		1	183.31

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**183.31**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**5 374.83**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	8.1.2	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	1 133.72	**CANT. COBRADA:**	1 104.48	**CANT. ACUMULADA:**	165.12

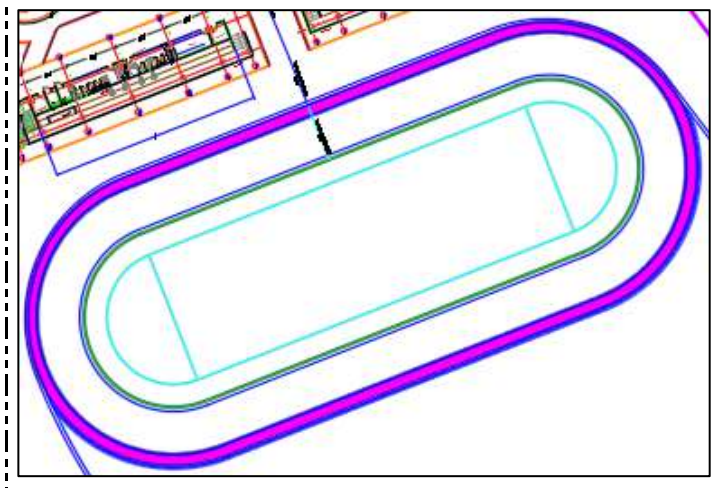



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Área	Espesor		
Senderos Peatonal Perimetro Externo Pista de 200m	491.04	0.20	1	98.21
Senderos Peatonales	612.56	0.20	1.00	122.51
	174.62	0.20	1.00	34.92
	346.78	0.20	1.00	69.36
	379.73	0.20	1.00	75.95
	337.50	0.20	1.00	67.50
	695.90	0.20	1.00	139.18
	695.97	0.20	1.00	139.19
	168.77	0.20	1.00	33.75
	188.49	0.20	1.00	37.70
	416.75	0.20	1.00	83.35
	188.70	0.20	1.00	37.74
	438.50	0.20	1.00	87.70
	87.00	0.20	1.00	17.40
	300.09	0.2	1.00	60.02

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**165.12**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1 104.48**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO		
ITEM:	8.1.5	**UNIDAD:**	ML	**CANT. CONTRACTUAL:**	2 030.89	**CANT. COBRADA:**	2 030.89	**CANT. ACUMULADA:**	165.39

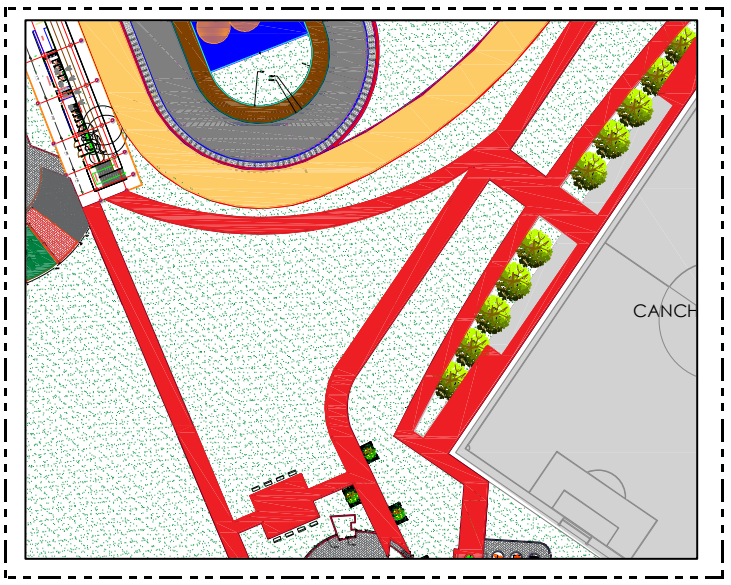



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Bordillos Senderos Peatonales	372.20			1	372.20
	235.00			1	235.00
	525.00			1	525.00
	253.30			1	253.30
Bordillos Cancha	124.00			1	124.00
Bordillos Senderos Peatonales	96.00			1	96.00
	96.00			1	96.00
	109.00			1	109.00
	55.00			1	55.00
	85.00			1	85.00
	51.00			1	51.00
	29.39			1	29.39

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**165.39**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**2 030.89**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	CONTENEDOR DE RAIZ DE 1.40x1.40x1.40m EN CONCRETO DE f'c=2.000PSI, ANCHO DE PARED 10cm, CON REMATE SUPERIOR EN BORDILLO DE 20x20cm, BASE EN LECHO FILTRANTE CON GRAVILLA DE 3/4" Y RELLENO CON TIERRA NEGRA HASTA -2.0cm DEL NIVEL SUPERIOR DEL	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	8.2.1	**UNIDAD:**	UN	**CANT. CONTRACTUAL:**	30.00	**CANT. COBRADA:** 20.00	**CANT. ACUMULADA:** 20.00

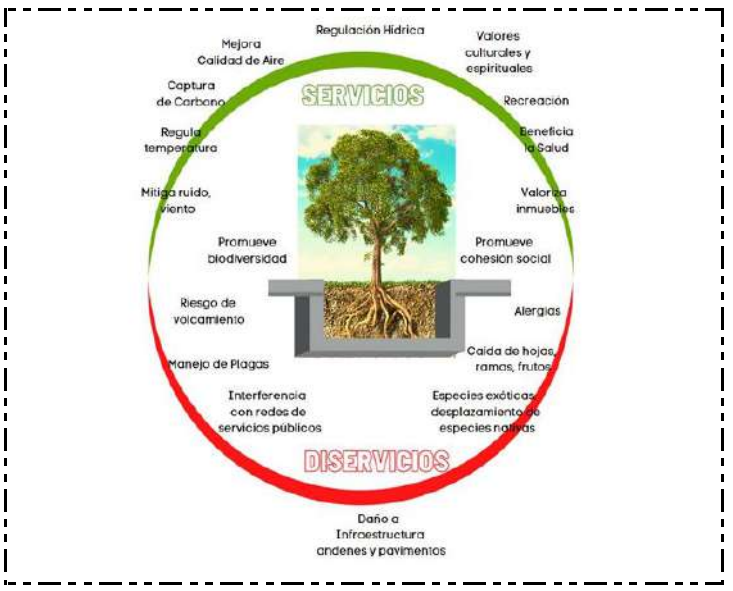



LOCALIZACIÓN	ÁREA	ESPESOR	CANT.	VOL. TOTAL
Contenedores de Raices			20	20.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	**20.00**
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	**20.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	8.3.2	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	213.65	**CANT. COBRADA:**	213.65	**CANT. ACUMULADA:**	213.65

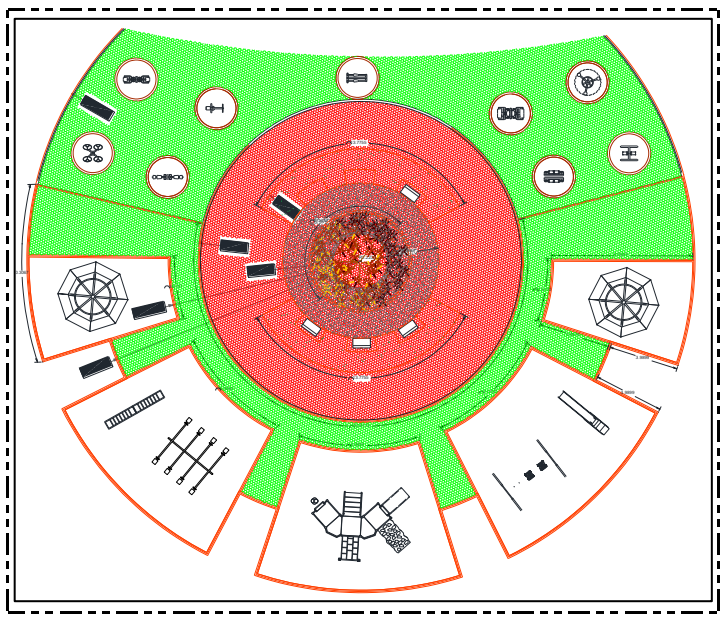



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Área	Espesor		
Juegos Infantiles	610.42	0.20	1.00	122.08
	457.82	0.20	1.00	91.56

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	**213.65**
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	**213.65**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600grxM3.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	8.3.3	**UNIDAD:**	M2	**CANT. CONTRACTUAL:**	1 068.24	**CANT. COBRADA:**	1 068.24	**CANT. ACUMULADA:**	1 068.24

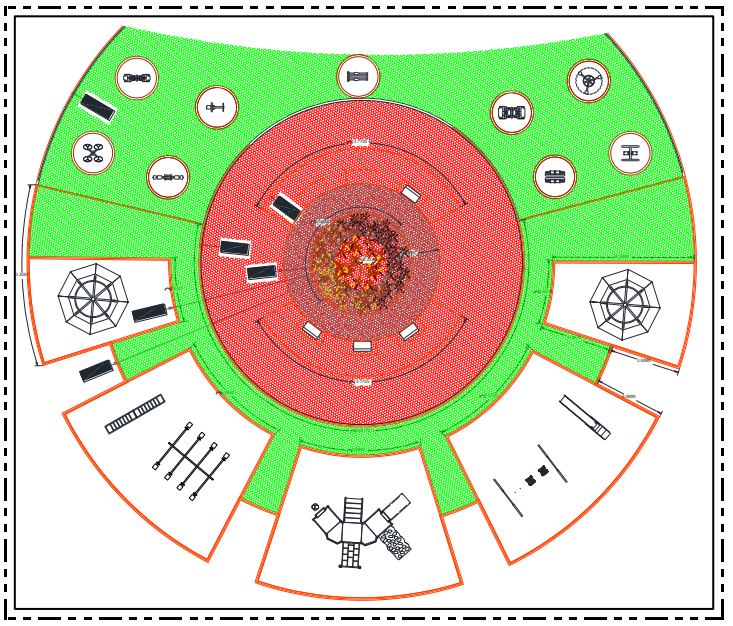



LOCALIZACIÓN	ÁREA	ESPESOR	CANT.	VOL. TOTAL
Juegos infantiles	891.07		1	891.07
Gimnasio al aire libre	177.17		1	177.17

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	**1 068.24**
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	**1 068.24**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PARA CERRAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	8.3.13	**UNIDAD:**	ML	**CANT. CONTRACTUAL:**	229.37	**CANT. COBRADA:**	229.37	**CANT. ACUMULADA:**	229.37

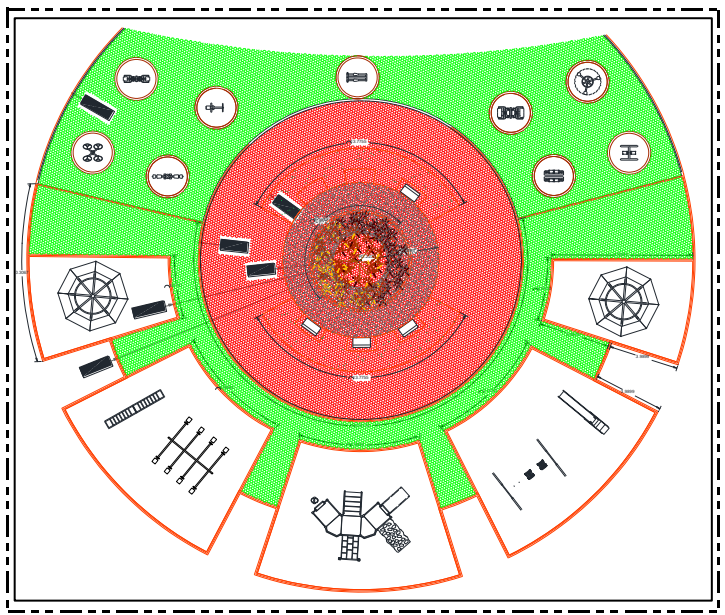



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Espesor		
Bordillos	157.04		1.00	157.04
	72.32		1.00	72.32

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	**229.37**
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	**229.37**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	9.1.2	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	673.52	**CANT. COBRADA:**	673.52	**CANT. ACUMULADA:**	673.52

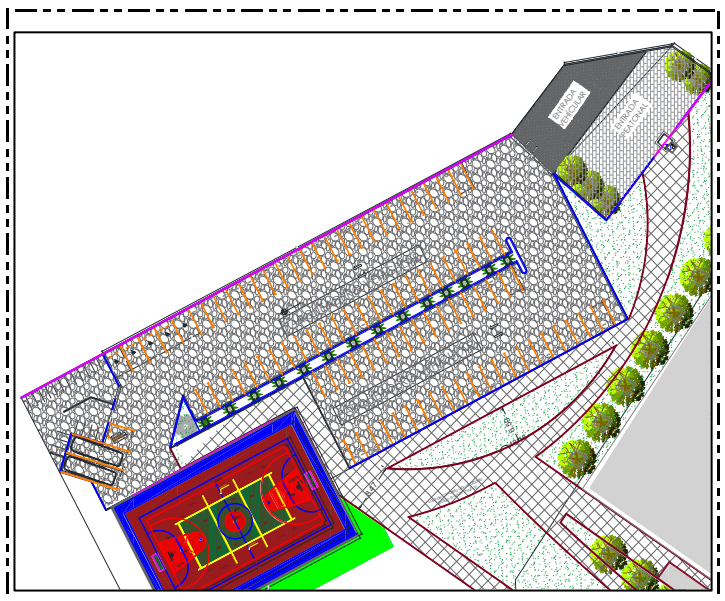



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Area	Espesor		
Parqueadero	3 367.58	0.20	1.00	673.52

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	**673.52**
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	**673.52**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	9.1.3	**UNIDAD:**	ML	**CANT. CONTRACTUAL:**	512.38	**CANT. COBRADA:**	512.38	**CANT. ACUMULADA:**	512.38

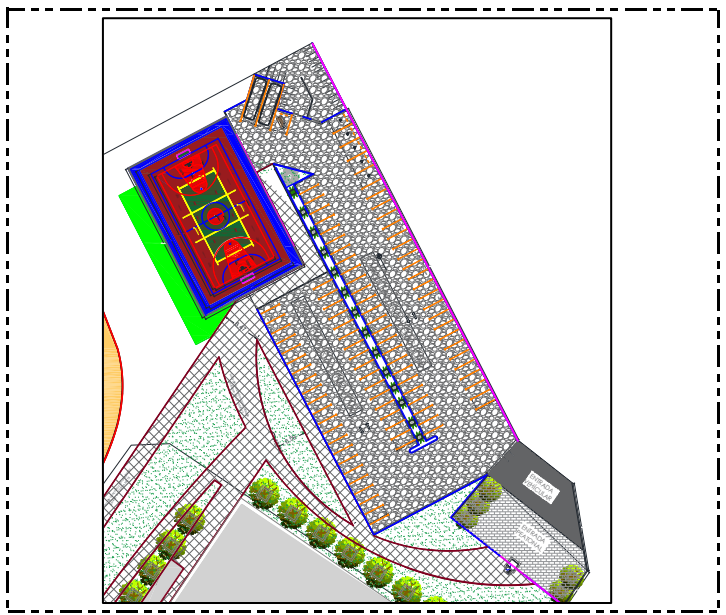



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Espesor		
Bordillos	256.19		1.00	256.19
	256.19		1.00	256.19
	256.19		1.00	256.19

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	**512.38**
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	**512.38**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI			**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM:	12.2.1	**UNIDAD:**	ML	**CANT. CONTRACTUAL:**	50.10	**CANT. COBRADA:**	50.10	**CANT. ACUMULADA:**	50.10

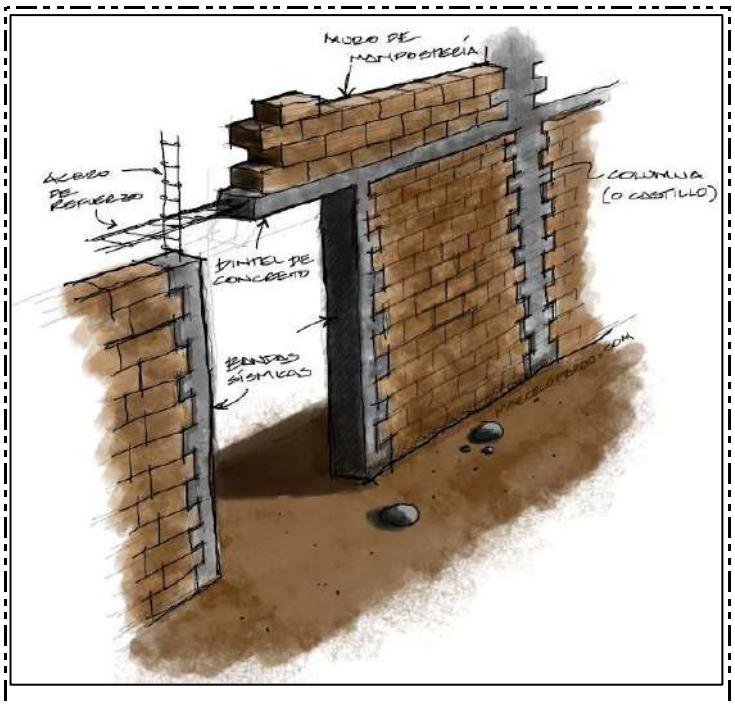



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Altura		
Dinteles en Puertas					
Puerta de Aseo	1.10			1	1.10
Baños PMR Mujeres	1.10			1	1.10
Baños PMR Hombres	1.10			2	2.20
Baño Mujeres	1.10			2	2.20
Baños Mujeres	1.10			2	2.20
Locales o Tiendas	1.10			2	2.20
Cuartos Disponibles	1.10			2	2.20
Cuarto Electrico	1.10			2	2.20
Dinteles en Ventanas					
Ventanas Tiendas	4.45			2	8.90
Ventana Cuarto de Aseo	0.50			1	0.50
Baños PMR Mujeres	0.50			2	1.00
Baños PMR Hombres	0.50			2	1.00
Baño Mujeres	4.00			2	8.00
Baños Mujeres	4.00			2	8.00
Cuarto Electrico	0.50			1	0.50
Garitas					
Puertas	3.40			2	6.80

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**50.10**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**50.10**

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI		**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM: 12.2.3	**UNIDAD:** ML	**CANT. CONTRACTUAL:** 20.04	**CANT. COBRADA:** 20.04	**CANT. ACUMULADA:** 20.04	

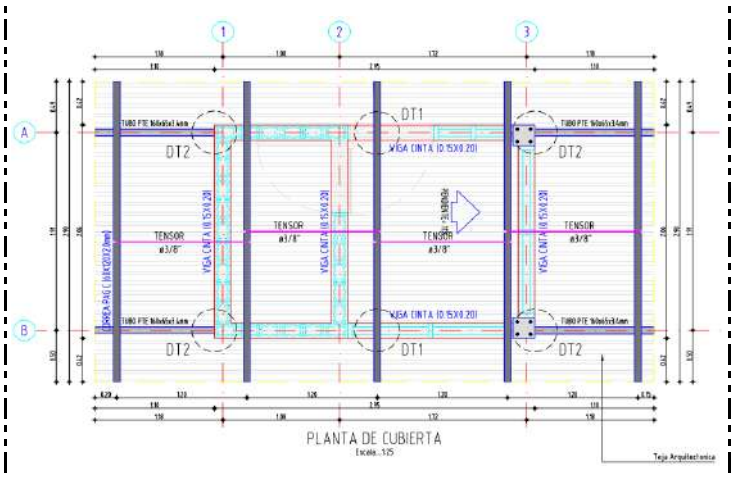



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Altura		
VIGA CINTA EN GARITAS					
GARITA 1	2.95			2	5.90
	2.06			2	4.12
GARITA 2	2.95			2	5.90
	2.06			2	4.12

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**20.04**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**20.04**

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=15CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M, COLOR GRIS CLARO ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4.			**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM:	12.2.5	**UNIDAD:** M2	**CANT. CONTRACTUAL:** 219.36	**CANT. COBRADA:**	219.36	**CANT. ACUMULADA:**	38.13

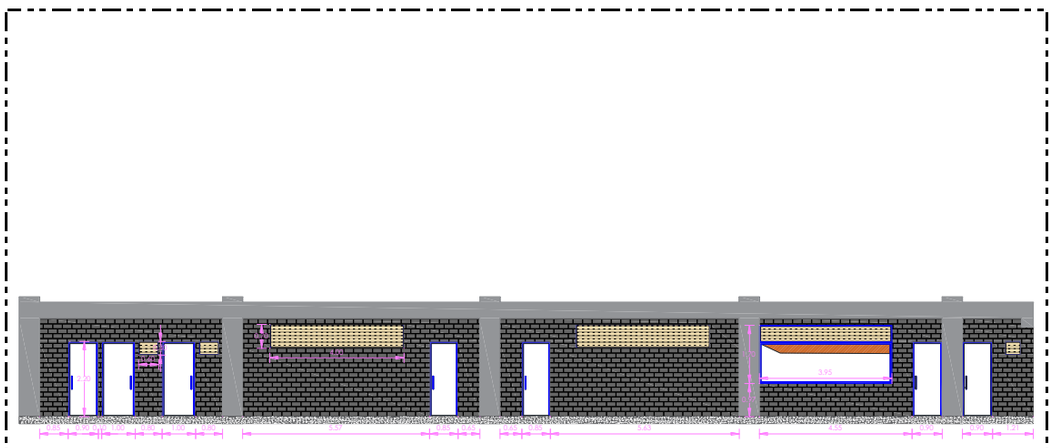

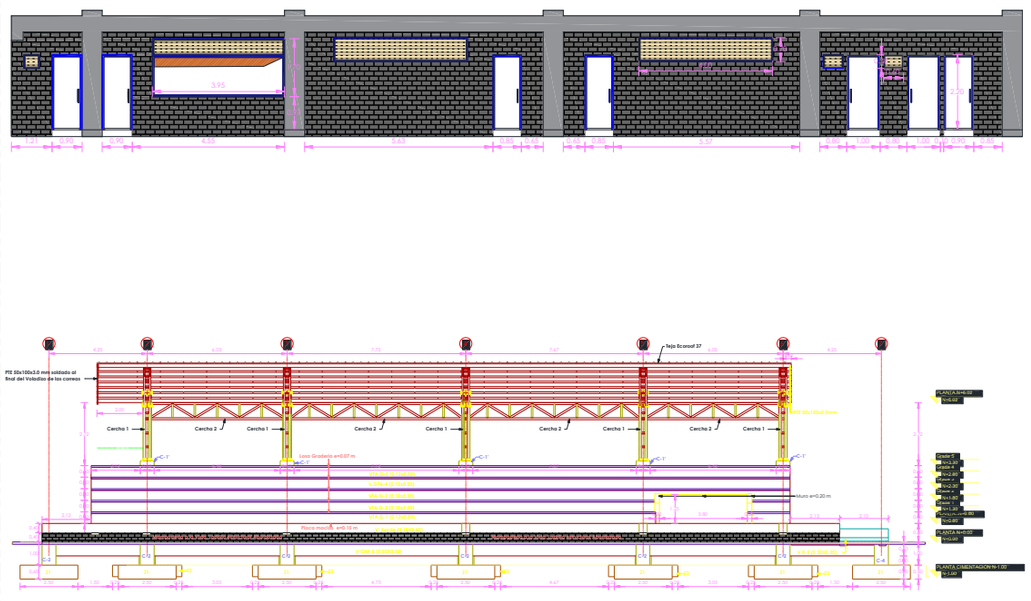



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Modulo 1					
Cuarto de Aseo Baño PMR Mujeres Baño PMR Hombres	5.45	3.07	16.73	1	16.73
Puertas	1.00	2.20	2.20	-2	-4.40
	0.90	2.20	1.98	-1	-1.98
Ventanas	0.60	0.40	0.24	-1	-0.24
Baños Hombres	7.07	3.07	21.70	1	21.70
Puertas	0.85	2.20	1.87	-1	-1.87
Ventanas	4.00	0.70	2.80	-1	-2.80
Baño Mujeres	7.13	3.07	21.89	1	21.89
Puertas	0.85	2.20	1.87	-1	-1.87
Ventanas	4.00	0.70	2.80	-1	-2.80
Local o Tienda	5.45	3.07	16.73	1	16.73
Puertas	0.90	2.20	1.98	-1	-1.98
Ventanas	3.95	1.70	6.72	-1	-6.72
Cuarto Disponible	2.12	3.07	6.51	1	6.51
Puertas	0.90	2.20	1.98	-1	-1.98
Ventanas	0.60	0.40	0.24	-1	-0.24
Modulo 2					
Cuarto Eléctrcio	2.12	3.07	6.51	1	6.51
Puertas	0.90	2.20	1.98	-1	-1.98
Ventanas	0.60	0.40	0.24	-1	-0.24
Local o Tienda	5.45	3.07	16.73	1	16.73
Puertas	0.90	2.20	1.98	-1	-1.98
Ventanas	3.95	1.70	6.72	-1	-6.72
Baños Hombres	7.07	3.07	21.70	1	21.70
Puertas	0.85	2.20	1.87	-1	-1.87
Ventanas	4.00	0.70	2.80	-1	-2.80
Baño Mujeres	7.13	3.07	21.89	1	21.89
Puertas	0.85	2.20	1.87	-1	-1.87
Ventanas	4.00	0.70	2.80	-1	-2.80
Baño PMR Mujeres Baño PMR Hombres Cuarto Disponible	5.45	3.07	16.73	1	16.73
Puertas	1.00	2.20	2.20	-2	-4.40
	0.90	2.20	1.98	-1	-1.98
Ventanas	0.60	0.40	0.24	-1	-0.24
Zona Frontal					
Parte Baja de las Graderías	34.50	0.45	15.53	2	31.05
Laterales					
Zona Escaleras			9.20	2	18.40
Zona Rampa de Acceso			9.20	2	18.40
Garitas					
Muros Garita			19.07	2	38.13

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**38.13**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**219.36**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	FRISO PARA MUROS Y PLACA AEREAS	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM:	12.2.7	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	721.09
CANT. COBRADA:	721.09	**CANT. ACUMULADA:**	20.00		

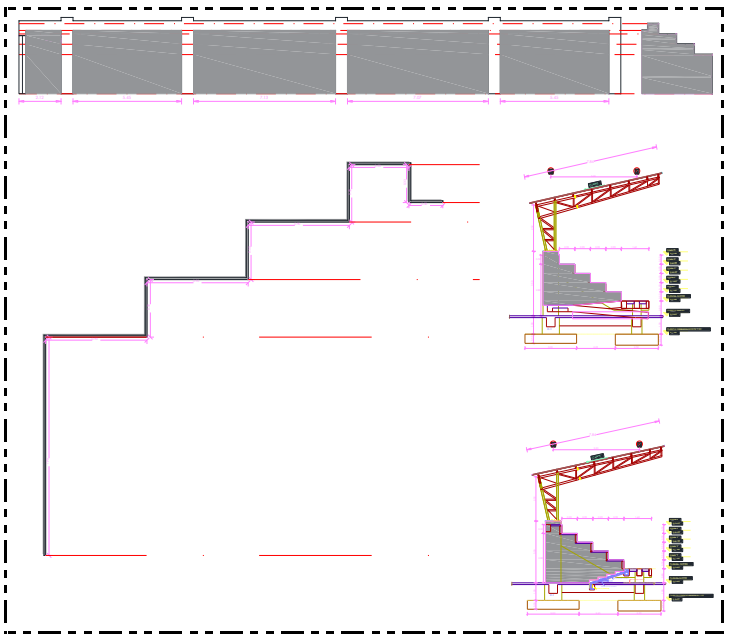



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Área		
Muros Divisiones			9.20	24	220.86
Frisos de Placas, Gradas, Muros, Vigas	7.29	5.45	39.73	2	79.46
	7.29	7.07	51.54	2	103.08
	7.29	7.13	51.98	2	103.96
	7.29	5.45	39.73	2	79.46
	7.29	2.12	15.45	2	30.91
Columnas y Vigas Exteriores			23.98	2	47.96
Caras Laterales, Escalera			9.90	2	19.80
Caras Laterales, Rampa			7.80	2	15.60
Baños Garitas	5	2	10.00	2	20.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**20.00**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**721.09**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD MORTERO DE NIVELACIÓN			**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR** CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM: 12.4.1	**UNIDAD:** M2	**CANT. CONTRACTUAL:** 130.30	**CANT. COBRADA:** 130.30		**CANT. ACUMULADA:** 130.30

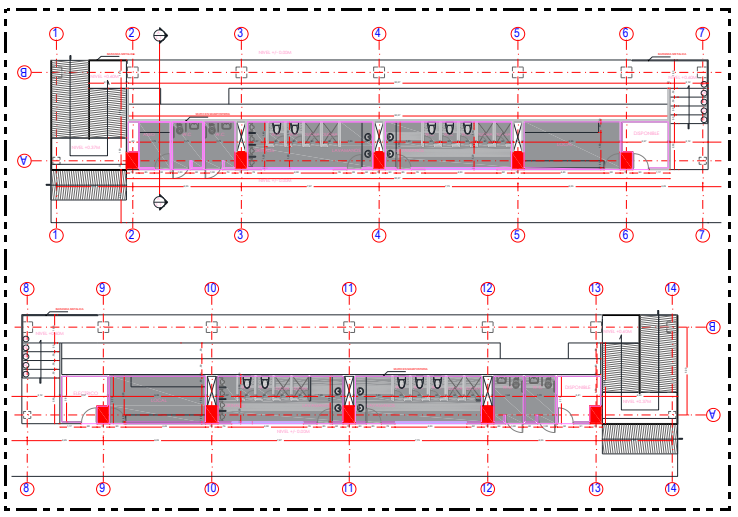



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	AREA		
Cuarto de Aseo			4.70	1	4.70
Baños PMR			4.45	4	17.80
Baños Mujeres			18.35	2	36.70
Baños Hombres			18.35	2	36.70
Local			14.20	2	28.40
Baños Garitas			3.00	2	6.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**130.30**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**130.30**

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22


CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
ITEM:	13.1.1	**UNIDAD:**	M3	**CANT. CONTRACTUAL:**	1 779.44
CANT. COBRADA:	1 715.15	**CANT. ACUMULADA:**	385.71		

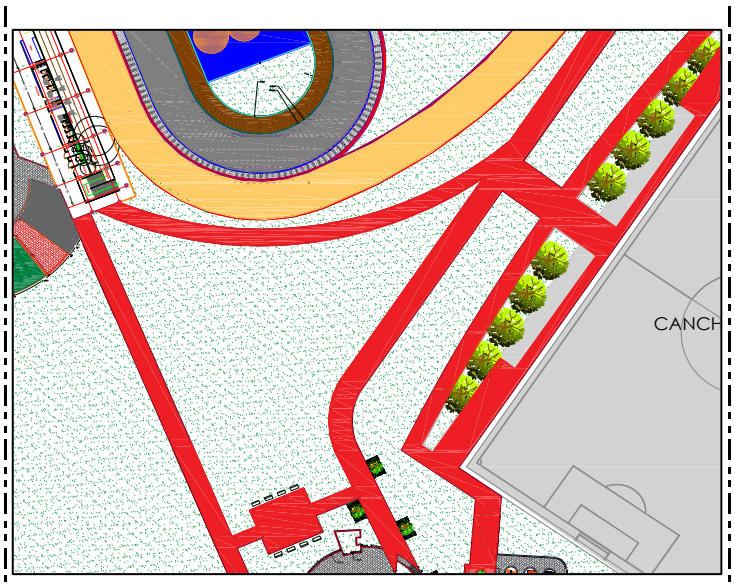



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Alto	Volumen		
Bordillos	2514.17	0.30	0.55	414.84	2.00	829.68
Excavacion Cimentacion Malla Contra Impacto	124.00	0.30	0.50	18.60	1.00	18.60
Fallos y Estabilizacion en Senderos Peatonales	407.86	1.00	0.20	81.57	1.00	81.57
	174.62	1.00	0.20	34.92	1.00	34.92
	346.78	1.00	0.20	69.36	1.00	69.36
	379.73	1.00	0.20	75.95	1.00	75.95
	337.50	1.00	0.20	67.50	1.00	67.50
	695.90	1.00	0.20	139.18	1.00	139.18
	695.97	1.00	0.20	139.19	1.00	139.19
	168.77	1.00	0.20	33.75	1.00	33.75
	188.49	1.00	0.20	37.70	1.00	37.70
Cimentacion de Graderias de Cancha Múltiple	55.00	0.40	0.70	15.40	1.00	15.40
	1.00	1.00	0.70	0.70	1.00	0.70
Excavacion Bordillos	357.90	0.30	0.55	59.05	0.92	54.14
Zona Verde de Calentamiento	293.7668733		0.40	117.51	1.00	117.51

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**385.71**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**1 715.15**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO Y/O ESTAMPADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	13.1.2	**UNIDAD:**	M2	**CANT. CONTRACTUAL:**	6 678.37	**CANT. COBRADA:**	6 378.12	**CANT. ACUMULADA:**	1 485.50

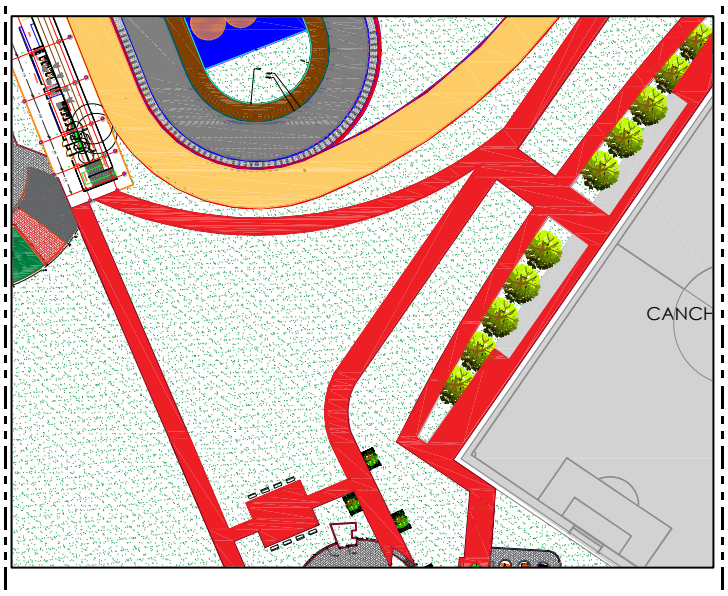



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANT.	VOL. TOTAL
	Área	Espesor		
Senderos Peatonal Perimetro Externo Pista de 200m	491.04	0.10	1	491.04
Piso de Graderias	612.56	0.10	1	612.56
Senderos Peatonal	174.62	0.10	1	174.62
	346.78	0.10	1	346.78
	379.73	0.10	1	379.73
	337.50	0.10	1	337.50
	695.90	0.10	1	695.90
	695.97	0.10	1	695.97
	168.77	0.10	1	168.77
	188.49	0.10	1	188.49
	801.26	0.10	1	801.26
	885.00	0.10	1	885.00
	600.50	0.10	1	600.50

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**1 485.50**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**6 378.12**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 007 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE EL CESAR".

ACTIVIDAD	MALLA CONTRAIMPACTO ESLABONADA EN MODULOS 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 4,5MT Y APOYOS CADA 3MTS.	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO

ITEM:	14.2.3	**UNIDAD:**	M2	**CANT. CONTRACTUAL:**	435.00	**CANT. COBRADA:**	435.00	**CANT. ACUMULADA:**	217.50

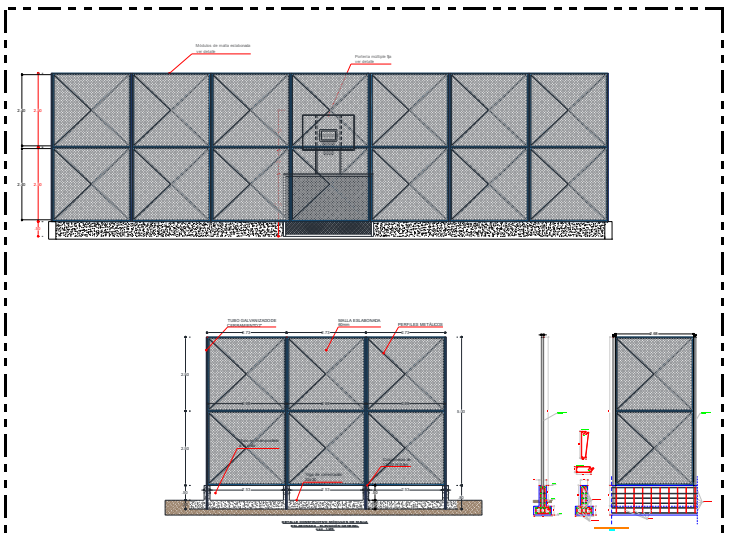

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	VOL. TOTAL
	Long	Ancho	Area		
Malla Contra Impacto	37.00	2.50	92.50	2	185.00
	25.00	5.00	125.00	2	250.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA:	**217.50**
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO:	**435.00**

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
