CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2210723 DE 2021
INFORME No. 20 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$9.600.000.000,00
	ADICION No 01		$32.400.000,00
	VALOR TOTAL ACTUALIZACION		$9.632.400.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2023		
PRÓRROGA No 1	OCHO (8) MESES		
TIEMPO TOTAL	VEINTICUATRO (24) MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No 1	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA No 2	TRES (03) MESES		
TIEMPO TOTAL	VEINTISIETE (27) MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No 2	VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE 2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	IDALIDES DE JESUS CASTRO CANTILLO		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 **(28 DE ABRIL DE 2023);** Adición No. 1, Prórroga No. 2 y Modificación No. 2 **(20 DE DICIEMBRE DE 2023)**		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$8.999.904.640	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$632.495.360

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	$960.000.000	12/11/ 2021	17/11/20 23

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	**FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	19/12/2021	15/03/2022	$ 960.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	15/06/2022	22/07/2022	$960.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	21/07/2023	8/08/2023	$2.880.000.000,00
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	27/11/2023	29/11/ 2023	$1.920.000.000,00
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$6.720.000.000,00**

MES /AÑO	**VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA**	**VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL**

02/2022	$577.846,83	$577.846,83
03/2022	$1.020.578,30	$1.020.578,30
04/2022	$1.055.763,72	$1.055.763,72
05/2022	$1.020.535,86	$1.020.535,86
07/2022	$1.396.402,66	$1.396.402,66
08/2022	$1.052.878,70	$1.052.878,70
09/2022	$576.457,95	$576.457,95
10/2022	$527.245,15	$527.245,15
11/2022	$510.622,76	$510.622,76
12/2022	$527.810,24	$527.810,24
01/2023	$528.076,82	$528.076,82
02/2023	$476.706,74	$476.706,74
03/2023	$527.371,21	$527.371,21
04/2023	$510.243,37	$510.243,37
05/2023	$527.213,42	$527.213,42
06/2023	$510.224,34	$510.224,34
07/2023	$527.267,49	$527.267,49
08/2023	$2.237.665,56	$2.237.665,56
09/2023	$2.501.525,06	$2.501.525,06
10/2023	$2.410.698,49	$2.410.698,49
11/2023	$830.646,60	$830.646,60
12/2023	$1.831.444,01	$1.831.444,01
01/2024	$716.204,68	$726.204,68
02/2024	$669.353,02	$659.353,02

03/2024	$715.470,27	$715.470,27

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➢ *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR INICIAL CONTRATO
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 001-2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$600.095.360,00
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YOSER IVAN SUAREZ RODRIGUEZ	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	23/03/2022	
PLAZO CONTRATO	8 MESES	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE MAYO DE 2022	
SUSPENSIÓN N°1	29/09/2022	
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 1	12/11/2022	
REINICIO N°1	12/12/2022	
SUSPENSIÓN N° 2	15/12/2022	
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 2	6/01/2023	
REINICIO N°2	6/02/2023	
SUSPENSIÓN N° 3	23/05/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE REINICIO N°2	23 DE MAYO DE 2023	
REINICIO N° 3	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
PRORROGA 1	4 MESES	
PRORROGA 2	3 MESES	
VALOR ADICIONAL	$32.400.00,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$632.495.360,00	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE MARZO DE 2024	

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15	15	$90.014.304,00	1391	09/08/2022
PRIMER PAGO	91,58	91,58	$579.241.576,00	2585	12/10/2023
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$579.241.576,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**91,58%**	

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)				
ASEGURADORA	**N° DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101185991	CUMPLIMIENTO	$63.249.536,00	05/09/2023 – 30/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101185991	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$63.249.536,00	05/09/2023 – 31/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101185991	CALIDAD DEL SERVICIO	$63.249.536,00	31/12/2023 – 31/12/2028

Garantías aprobadas mediante la Resolución No. 093 del 23 de octubre de 2023

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101379053	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$90.014.304,00	19/05/2022 – 23/09/2023

Garantías aprobadas mediante la Resolución No. 007 del 21 de febrero de 2023

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA Nº 007 DE 2022	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$8.999.322.870
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2022	
PLAZO CONTRATO	OCHO (8) MESES	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE MAYO DE 2022	
SUSPENSIÓN N°1	29/09/2022	
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 1	12/11/2022	
REINICIO N° 1	12/12/2022	
SUSPENSIÓN N°2	18/12/2022	
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 2	06/01/2023	
REINICIO N° 2	06/02/2023	
SUSPENSIÓN N°3	23/05/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON ACTA DE REINICIO N° 2	23 DE MAYO DE 2023	
REINICIO N° 3	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
PRORROGA N° 1	4 MESES	
PRORROGA N° 2	3 MESES	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15	15	$1.349.898.430,50	1392	09/08/2022
PRIMER PAGO	16,02	16,02	$1.441.370.340,00	1774-2019	27/07/2023 - 8/08/2023
SEGUNDO PAGO	17,12	17,12	$1.540.914.378,00	2607	2/11/2023
TERCER PAGO	25,58	25,58	$2.302.279.775,00	3139	12/18/2023
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					

PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$5.284.564.493,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**58,72%**	

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)				
ASEGURADORA	**N° DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101173847	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287,00	15/06/2022 – 30/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101173847	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/05/2022 – 30/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101173847	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022 – 31/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101173847	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287,00	31/12/2023 – 31/12/2028

Garantías aprobadas mediante la Resolución No. 091-2 del 11 de octubre de 2023

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
Durante el periodo transcurrido del 1 al 31 de marzo de 2024 el contratista ejecutó las siguientes actividades:

AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR EJECUTADO PRESENTE MES CON AIU**
1. PATINODROMO Y GRADERIAS					
2. PISTA DE PATINAJE - PISTA DE VELOCIDAD, PISTA DE RUTA Y ZONA TECNICA					
2.2 PISTAS DE PATINAJE - PISTA DE RUTA 400m					
2.2.13	CERRAMIENTO EXTERIOR CONSTRUIDO EN TUBO CIRCULAR DE 2" C/1.5m - H=2.0m, CON TABLAS PROTECTORAS EN POLIPROPILENO - PARTE INFERIOR. Y PARTE SUPERIOR EN LAMINA DE POLICARBONATO.	ML	31,14	$ 529.888,00	**$ 21.450.139,82**
3. GRADERÍAS PISTAS DE PATINAJE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
3.1.4	NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE CORTE MANUAL.	M3	2,18	$ 33.653,00	**$ 95.350,73**
3.5 MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL					
3.5.3	DOVELAS CON GROUTING DE f'c=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	M3	1,25	$ 687.133,00	**$ 1.116.591,13**
3.5.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.	KG	321,40	$ 7.723,00	**$ 3.226.825,47**
3.6 INSTALACIONES SANITARIAS					
3.6.2	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	179,60	$ 52.122,00	**$ 12.169.444,56**


3.6.5	PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	2,00	$ 98.862,00	**$ 257.041,20**
3.6.6	PUNTO SANITARIO DE 3" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 3 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	23,00	$ 93.500,00	**$ 2.795.650,00**
3.6.7	PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	23,00	$ 71.224,00	**$ 2.129.597,60**
3.6.8	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 4" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0,00	$ 43.304,00	**$ 0,00**
3.6.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 556.671,00	**$ 1.447.344,60**
3.6.10	CONEXIÓN A RED DE ALACANTARILLADO EXISTENTE INCLUYE ROTURA DE VIA, DEMOLIOCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE DESAGUE EN PVC DE 8", TAPE Y RESANE DEL PAVIMENTO, PERMISO ANTE OBRAS PUBLICAS.	UN	1,00	$ 440.845,00	**$ 573.098,50**
3.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS					
3.7.2	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	45,63	$ 19.907,00	**$ 1.180.863,33**
3.7.3	REGISTRO RED WHITE 1.1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1.1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	6,00	$ 263.734,00	**$ 2.057.125,20**

3.7.4	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 72.736,00	**$ 189.113,60**
3.7.5	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	0,00	$ 61.297,00	**$ 0,00**
3.7.6	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 61.297,00	**$ 159.372,20**
3.7.12	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	41,30	$ 25.029,00	**$ 1.343.807,01**
3.7.13	CONEXIÓN A TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2", UNION 2", SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 1.122.700,00	**$ 1.459.510,00**
3.9 PAÑETES, ENCHAPES Y PINTURAS					
3.9.3	ENCHAPE PARA MUROS DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.	M2	131,40	$ 80.136,00	**$ 13.688.831,52**
8. ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VÍAS					
8.1 TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES					
8.1.2	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km).	M3	29,24	$ 101.394,00	**$ 3.853.915,61**
12,4	**TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES**				
12.4.2	ENCHAPE ANTIDESLIZANTE PARA PISOS	M2	67,50	$ 76.525,14	**$ 6.715.081,04**
13. ZONAS EXTERIORES - ANDENES, ZONAS DE JUEGOS, ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO EXTERIOR					
13.1 TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES					

13.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	64,28	$ 33.653,00	**$ 2.812.345,95**
13.1.2	PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO Y/O ESTAMPADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm.	M2	300,25	$ 93.356,06	**$ 36.438.618,34**
TOTAL DE AVANCE DE OBRA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024					**$ 115.159.667,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 8.999.322.870,00**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO MES DE MARZO DE 2024					**1,28%**

A continuación, se presenta el cuadro de los porcentajes programados Vs ejecutado

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES Y PORCENTAJE ACUMULADO		
MES	**% EJECUTADO**	**%PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN PRORROGA 2**
MAYO 2022	0,22%	0,00%
JUNIO 2022	1,18%	0,46%
JULIO2022	0,22%	0,89%
AGOSTO 2022	2,34%	4,00%
SEPTIEMBRE 2022	3,01%	6,55%
FEBRERO 2023	5,04%	2,52%
MARZO 2023	4,00%	3,84%
ABRIL 2023	1,46%	0,80%
MAYO 2023	2,63%	2,39%
SEPTIEMBRE 2023	13.03%	8,53%
OCTUBRE 2023	12.71%	14,71%
NOVIEMBRE 2023	4.08%	4,08%
DICIEMBRE 2023	8,91%	11,25%
ENERO 2024	6,42%	12,55%
FEBRERO 2024	3,97%	13,86%
MARZO 2024	1,28%	8,72%
ACUMULADO	**77,95%**	**70,51%**

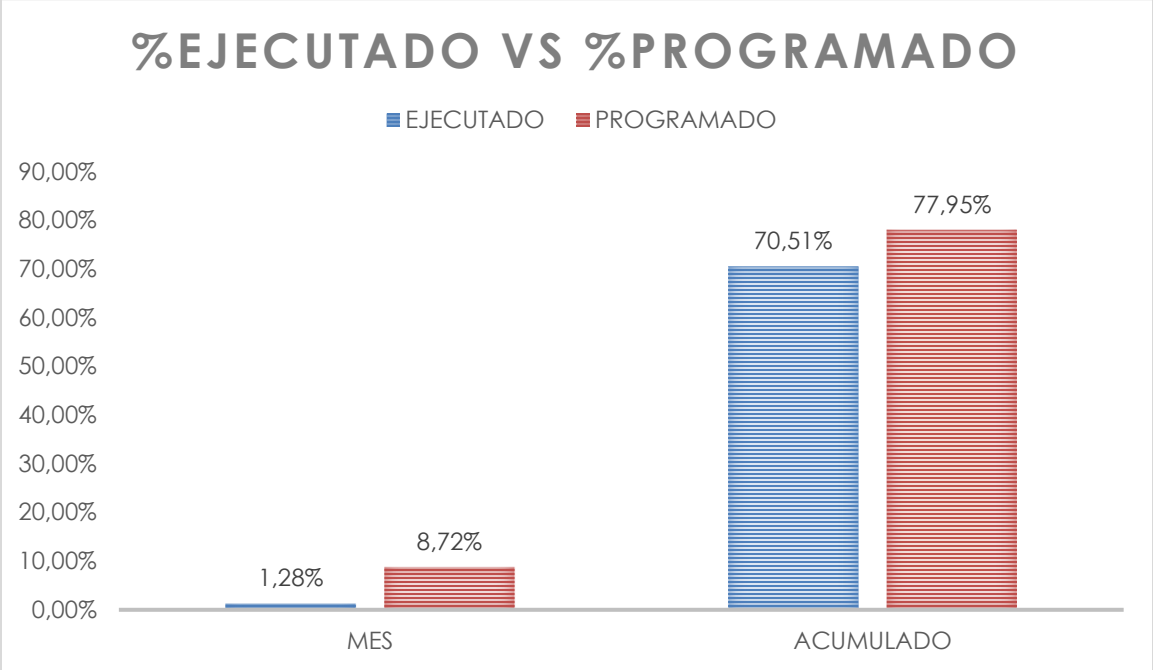

Teniendo en cuenta lo reportado en el cuadro y la gráfica anterior, el porcentaje ejecutado acumulado a corte del 31 de marzo de 2024 es de 70,51%, frente a un 77,95% programado según reprogramación generada por la Prórroga No 02, evidenciando un retraso de 7,44%; justificado principalmente según información suministrada por el contratista, por la demora experimentada en la entrega de materiales clave, como los mástiles y lámparas para la iluminación del proyecto, así como las láminas de policarbonato necesarias para finalizar el cerramiento de las pistas de patinaje. Este contratiempo ha afectado el inicio de otras actividades dependientes de la conclusión de estas, como el proceso de certificación RETIE y RETILAP ante AFINIA, empresa prestadora del servicio de energía eléctrica; Como parte del respaldo La Interventoría, representada por CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO, ha recibido y respaldado la información del contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO











14/03/24 16:50
El Paso


14/03/24 16:50
El Paso

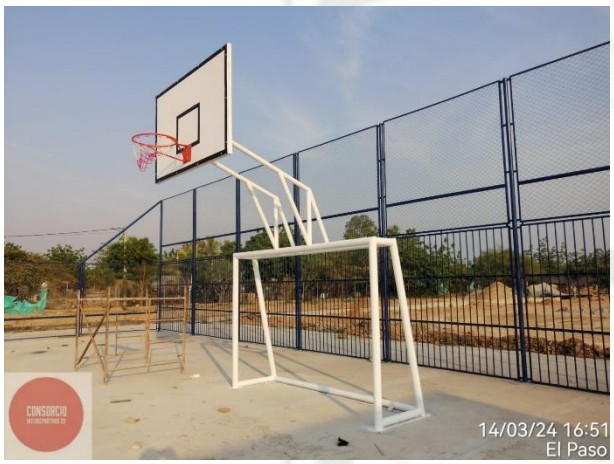
14/03/24 16:51
El Paso


2/04/24 11:30
El Paso


2/04/24 11:29
El Paso


2/04/24 14:29
El Paso







Informe presentado por:

Ing. RICARDO ANDRÉS MEJÍA PEINADO
Supervisor delegado

Revisó:

IDALIDES DE JESÚS CASTRO CANTILLO
Secretario de planeación municipal
