
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión N° 15 CONVENIO 23001315 H3 DE 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenimiento lado aire aeródromo municipio de LA PRIMAVERA VICHADA
FECHA DEL INFORME	**01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025**
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. PATIÑO SILVA ALVARO** **Supervisor Convenio Interadministrativo** 23001315 H3 DE 2023
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023
INTERVINIENTES	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil AEROCIVIL Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Comando de Ingenieros COING Central administrativa y contable especializada de Ingenieros CENAC Batallón de Ingenieros de Combate N° 28 “CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el AEROCIVIL y Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- CENAC de Ingenieros a través del COING y sus unidades designadas, para mejoramiento de infraestructura lado aire de aeródromos priorizados por AEROCIVIL.
CANTIDAD PARA EJECUTAR	1. CONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE: Pista: 1500m x 23m 2. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE DE LA PISTA Y LA PLATAFORMA. Construcción de zanjas de infiltración toda la parte lateral de la pista y calle de rodaje, canales de recolección de aguas superficiales en la parte perimetral de la plataforma. 3. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO El cerramiento contará con una altura de 2,4m y estará formado por una rejilla metálica galvanizada y plastificada de 50x50 m Sobre el vallado se colocará el alambre de espino galvanizado para garantizar la no intrusión de personal no autorizado a las instalaciones aeroportuarias. Los postes de sujeción del cerramiento, que serán también de acero galvanizado de un diámetro de 60mm, se situarán cada 3m.

	4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LA PISTA PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJES a. Pista: ▪ Umbral ▪ Eje de vía ▪ Fajas de umbral ▪ Señal punto de visada ▪ Señal de zona de toma de contacto ▪ Señal de zona de faja lateral de pista b. Calle de rodaje: ▪ Eje de calle de rodaje ▪ Señal mejorada de calle de rodaje ▪ Señal de borde de calle de rodaje ▪ Señal de plataforma de viraje en la pista ▪ Señal de punto de espera en pista ▪ Señal con instrucciones obligatorias ▪ Señal de información c. Plataforma de aeronaves ▪ Señales de puestos de estacionamiento de aeronaves ▪ Líneas de seguridad en planta 5. CONSTRUCCIÓN FRANJA DE PISTA: Para la franja de seguridad longitudinal que se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia mayor a 60 metros en material de Afirmado.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Combate N° 28“CR. ARTURO HERRA CASTAÑO”
POBLACION BENEFICIADA	La principal población beneficiada es la comunidad que habita la región de la primavera, santa Rosalía con una población aproximada de 7900 habitantes (cifras proyectadas por el DANE dic 2023).
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de diciembre del 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 17.621.001.061,00 millones de pesos**
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 de diciembre del 2023
FECHA DE ENTREGA	

AHE 28

MODIFICATORIOS	N/A

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

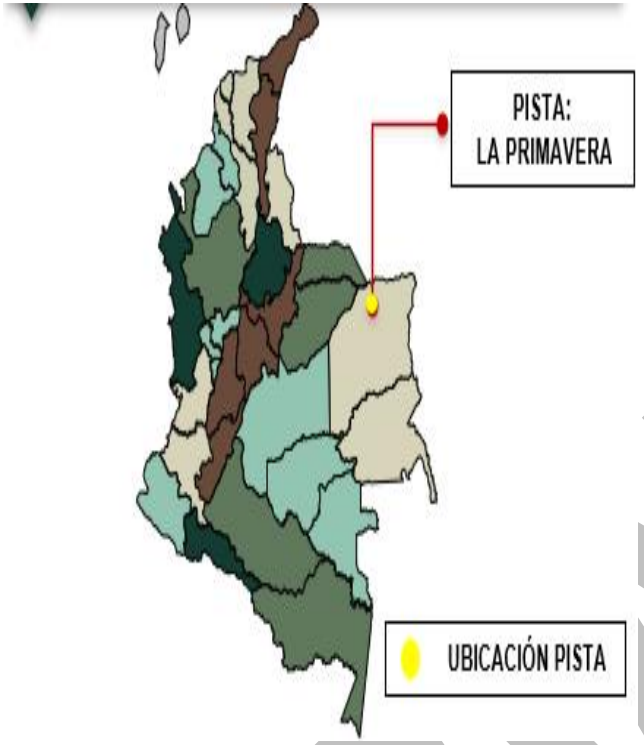



IV. INFORMACION JURIDICA

1. Se suscribió el convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023 el 15 de diciembre del 2023 por parte de la AEROCIVIL y el CENAC de Ingenieros.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

N° CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO	POLIZA	APROVACION POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
2240118	FERRETERIA EL HIDRANTE S. A	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 40.426.641.364,69	12-jul-24	12-may-25	$ 70.675.548.551,77	N°1445101112655	11/07/2024	24/05/2024	$ 838.432.164,68

BIAHE 28

2240092	DUBRANDS SAS	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E INSUMOS LOGISTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 1.794.846.171,30	24-jun-24	24-abr-25	$ 1.794.846.171,30	100324664	30/05/2024	24/05/2024	$ -
2240093	UNION TEMPORAL CORPOACAR 2023	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMBISTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, LABORATORIOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA,	$ 1.133.130.515,00	24-jun-24	24-abr-25	$ 2.160.893.210,00	41-40-101052630	4/06/2024	24/05/2024	$ -

BIAHE 28

		PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)								
2240094	CONSORCIO AEROPISTAS CPG	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL, Y DE OPERACIÓN LOGISTICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 2.931.318.628,85	19-jun-24	19-abr-25	$ 5.873.299.657,69	N°1145101144038	7/06/2024	24/05/2024	$

BIAHE 28

2240263	**CONSORCIO CONCRETO VICHADA**	SUMINISTRO DE **CONCRETO PREMEZCLADO** PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO **(ADJUDICADO 17/10/2024)**	40.072.933.078	27-dic-2024	27-Agos-2025	40.072.933.078	30-40-101022521	19/12/2024	27/12/2024	

BIAHE 28

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista **CP. LOPEZ GRACIANO** del **BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°28 (BIAHE 28)** de acuerdo con el concepto técnico:

DESCRIPCION	**UNIDAD**	**ENTREGADO**
Cal	Kg	**60.150.00**
Base Granular	m3	**4.691.7**
Sub- Base Granular	m3	**6.681.26**
Concreto MR 45 Kg/cm2	m3	**-**
acero trasversal 1" liso long.0.30 mts espaciado cada 0.30 mts (juntas de transferencia)	Kg	**24.984**
Acero longitudinal 1/2"corruguado Long. 085 mts espaciado cada 1 mts (juntas de amarre)	kg	**5.492**
Geotextil T2400	m2	**5.082.00**
Geo celda 356-120	m2	**5.022.16**

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Demerito y desgaste	Enero 2024	$ 1.321.575.079,58
TOTAL			**$** 1.321.575.079,58

4. BALANCE CONTRACTUAL

	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO
PLAN DE COMPRAS	$ 17.621.001.061,00	$ 0
VALOR DEMERITO	$ 2.643.150.159,15	$ 1.321.575.079,57
ADMINISTRACION	$ 440.525 026,53	$ 220.262.513,26

VI. INFORMACIÓN TECNICA

Desde el inicio de los trabajos constructivos se inicia con el descapote de la zona vegetal y la demolición de la carpeta asfáltica existente y a la fecha no se ha definido del punto de relleno de ese material vegetal, cabe relatar que a la fecha se han realizado, Excavación de 948m3, Demolición Pista 8.620 m2 y un Descapote 73.746,57 m2, estos trabajos de maquinaria han sido suspendidos debido a:

- A la fecha se ha enviado orden de suministro correspondiente al motor de arranque de la Excavadora y se han tratado en reuniones las diferentes fechas de entrega. Sin embargo, cabe recalcar, se continúa la espera de dicho material requerido.
- A la fecha se ha enviado la orden de suministro correspondiente a los repuestos que son necesarios para el sostenimiento de la maquinaria, cabe aclarar la recepción de algunos repuestos, sin embargo, sigue teniendo novedades.

BIA HE 28

AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES





BIAHE

PROYECTO CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

Presupuesto: $ 17.621.001.061,00 **millones de pesos**
Programado General: 94%
Ejecutado General: 6.019%
Atraso o avance general: -87.981%
De acuerdo con la primera programación avalada v4

VII. EVIDENCIAS VISUALES

AVANCE	DESCRIPCIÓN
• Se realiza demolición de 520metros de carpeta asfáltica. • Se realiza replanteo del nuevo cerramiento de la pista y se verifica la diferencia entre el existente vs el nuevo. • Se realiza la construcción de bodega de almacenamiento conformada por piso de concreto de 302,9m2. • Se realiza el suministro e instalación de vigas de columnas metálicas e instalación de cubierta para el techo	

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Se presentaron bloqueos por parte de la población civil en el sector de puerto borracho, impidiendo el paso del material granular por supuestos daños en vías por dichos vehículos de transporte de material.
- Se realizaron reuniones y se llego a un acuerdo con dicha población civil para el paso del material.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- El aeródromo La Primavera cuenta con una terminal aérea en deplorable estado, en los contornos no hay conexión del acueducto, los campamentos existentes para los trabajos de recuperación de la zona llevan el agua desde el casco urbano.
- Al momento se hace necesario el permiso de captación de aguas y el permiso para el punto de depósito o relleno del material vegetal, ya que no contamos con todo el personal de interventoría en punto
- Dia 12 de diciembre de 2025 se solicita por escrito se identificó que los puntos de captación y puntos de vertimiento a la fecha no se ha recibido la autorización formal de dichos puntos

BIAHE 2

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS					
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**		**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
001	05/12/2024	Riesgos laborales		Personal de soldados los cuales trabajan en el proyecto	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR), OVEROL, CASCO, GUANTES PAR, GAFAS. TAPAOIDOS	09/10/2024	67	SOLDADOS COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES	PRIMERA VEZ	N/A
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OTRAS ACTIVIDADES: N/A

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Al momento no se recibe repuesto del motor de arranque Excavadora.
- El operador logístico CORPOACAR en repetidas ocasiones ha entregado los insumos y/o repuestos para maquinaria amarilla de manera errónea e incompleta.
- La planta de concreto se encuentra en funcionamiento, solo falta suministrar el material.
- Se debe tratar el tema sobre la comunidad, que presenta quejas que genera temas de orden público por posible daño en vías.
- Se presenta la visita por dos funcionarios de la alcadia, manifestando su preocupación por el depósito de materiales resultantes de la obra en predios privados (Planta de concreto), al respecto durante la reunión se aclaró que este material se está depositando para adelantar adecuaciones en la vía de acceso hacia la misma.
- Se realizaron actas de vecindad, trayecto planta de concreto hasta obra y ferretería Hidrante encargado de suministrar material granular

- A la espera de las facturas para realizar el Kardex tema el cual ha sido tratado en los diferentes comités operativos

XII. CONCLUSIONES

- Se presentan atrasos con gran porcentaje ya que, se requiere de manera prioritaria dichos repuestos como lo son: Motor de arranque de Excavadora, turbo cargador de Retroexcavadora, filtros para Volquetas, etc.
- Se debe tener en cuenta, que en repetidas ocasiones los operadores logísticos envíen el material de manera correcta ya que, un envió erróneo genera lapsos de tiempo significativos para generar avances en el proceso.
- Es prioridad el ingreso del material de repuestos de mantenimiento para garantizar así la continuidad y celeridad del proceso, cabe resaltar que de no ser así los tiempos de procesos constructivos serán considerablemente afectados en su tiempo de ejecución.

XIII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar celeridad a la entrega de diferentes repuestos o solicitudes que se requieran durante el proceso para darle un avance y asi no presentar atrasos como lo hemos venido evidenciando.
- Se recomienda tener más en cuenta por parte de los operadores logísticos, las necesidades más necesarias para darle solución de manera más efectiva y de manera correcta, al momento de realizar un envio verificar si es el indicado en la orden de suministro y poder cumplir con el requerimiento por parte de la unidad.
- Se debe tener en cuenta las condiciones climatológicas, por el momento nos encontramos en verano y las vías se encuentran transitables por el momento, cabe resaltar, una vez iniciado el invierno por la región las vías no permiten transitar vehículos para el ingreso de material, repuestos o maquinarias de apoyo.

ST. RODRIGUEZ AMADO JUAN FELIPE
Residente Convenio Interadministrativo
23001315 H3 DE 2023

SV MONTENEGRO CARDOZO
JEFE DE EQUIPO BIAHE 28

BIAHE 28

Mayor. PATIÑO SILVA ALVARO
Ejecutivo y Segundo comandante del BIAHE 28
Supervisor Convenio Interadministrativo
23001315 H3 DE 2023

BIAHE 28
