

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		**PROYECTO DRAGADOS**	**684 días**	**lun 13/06/22**	**mié 12/06/24**			**$ 133,074,967,041**
2		**FASE IA - REHABILITACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA**	**684 días**	**lun 13/06/22**	**mié 12/06/24**			**$ 133,074,967,041**
3		INICIO DE PROYECTO	0 días	lun 13/06/22	lun 13/06/22		6	$ 0
4		MODELACIÓN HIDRAÚLICA	5 días	mié 13/07/22	lun 18/07/22			$ 0
5		**A. REHABILITACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA LAGUA DE CUCUNUBÁ**	**684 días**	**lun 13/06/22**	**mié 12/06/24**			**$ 108,635,529,734**
6		SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	58 días	lun 13/06/22	sáb 13/08/22	3		$ 0
7		TOPOBATIMETRIA INICIAL	58 días	lun 13/06/22	sáb 13/08/22			$ 0
8		**PRELIMINARES**	**684 días**	**lun 13/06/22**	**mié 12/06/24**			**$ 1,165,977,872**
9		Comisión topobatimétrica inicial y control topobatimétrico durante la obra (para dos frentes de trabajo 1 y 2)	684 días	lun 13/06/22	mié 12/06/24		10CC;12CC+4C días	$ 582,988,936
10		Comisión topobatimétrica inicial y control topobatimétrico durante la obra (para dos frentes de trabajo 3 y 4)	684 días	lun 13/06/22	mié 12/06/24	9CC		$ 582,988,936
11		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**618 días**	**lun 22/08/22**	**mié 12/06/24**			**$ 44,214,691,683**
12		Remoción y extracion de sedimentos - Incluye cargue del material	618 días	lun 22/08/22	mié 12/06/24	9CC+40 días	14CC;15CC+1C días;19CC+20	$ 44,214,691,683
13		**REMOCIÓN Y TRANSPORTE**	**618 días**	**lun 22/08/22**	**mié 12/06/24**			**$ 62,854,770,809**
14		Trasiego de material en barcaza. Incluye descargue de material y cargue en volqueta o extendido en las orillas	618 días	lun 22/08/22	mié 12/06/24	12CC	16CC+20 días	$ 41,575,178,613
15		Transporte y disposición de material extraído	608 días	jue 1/09/22	mié 12/06/24	12CC+10 días		$ 16,167,205,783
16		Explanación y extendida de material removido	598 días	lun 12/09/22	mié 12/06/24	14CC+20 días		$ 5,112,386,413
17		**OTRAS ACTIVIDADES**	**598 días**	**lun 12/09/22**	**mié 12/06/24**			**$ 400,089,370**
18		Remoción y disposición de material vegetal, árboles y demás elementos	588 días	jue 22/09/22	mié 12/06/24	12CC+30 días		$ 38,528,987
19		Suministro e Instalacion Cerca en alambre de pua 4 hilos. Con poste en madera	598 días	lun 12/09/22	mié 12/06/24	12CC+20 días	20CC	$ 42,298,040
20		Desmonte y reinstalación de cercas existentes	598 días	lun 12/09/22	mié 12/06/24	19CC		$ 39,369,955
21		Instalación de protección marginal con pilote en madera rolliza (incluye pilote)	588 días	jue 22/09/22	mié 12/06/24	12CC+30 días		$ 279,892,388
22		**B. REHABILITACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA LAGUNA DE PALACIO**	**455.82 días**	**lun 13/06/22**	**jue 12/10/23**			**$ 24,439,437,307**
23		SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	45 días	lun 13/06/22	sáb 30/07/22			$ 0
24		TOPOBATIMETRIA INICIAL	28 días	lun 13/06/22	mar 12/07/22			$ 0
25		**PRELIMINARES**	**427 días**	**lun 13/06/22**	**mar 12/09/23**			**$ 364,368,085**

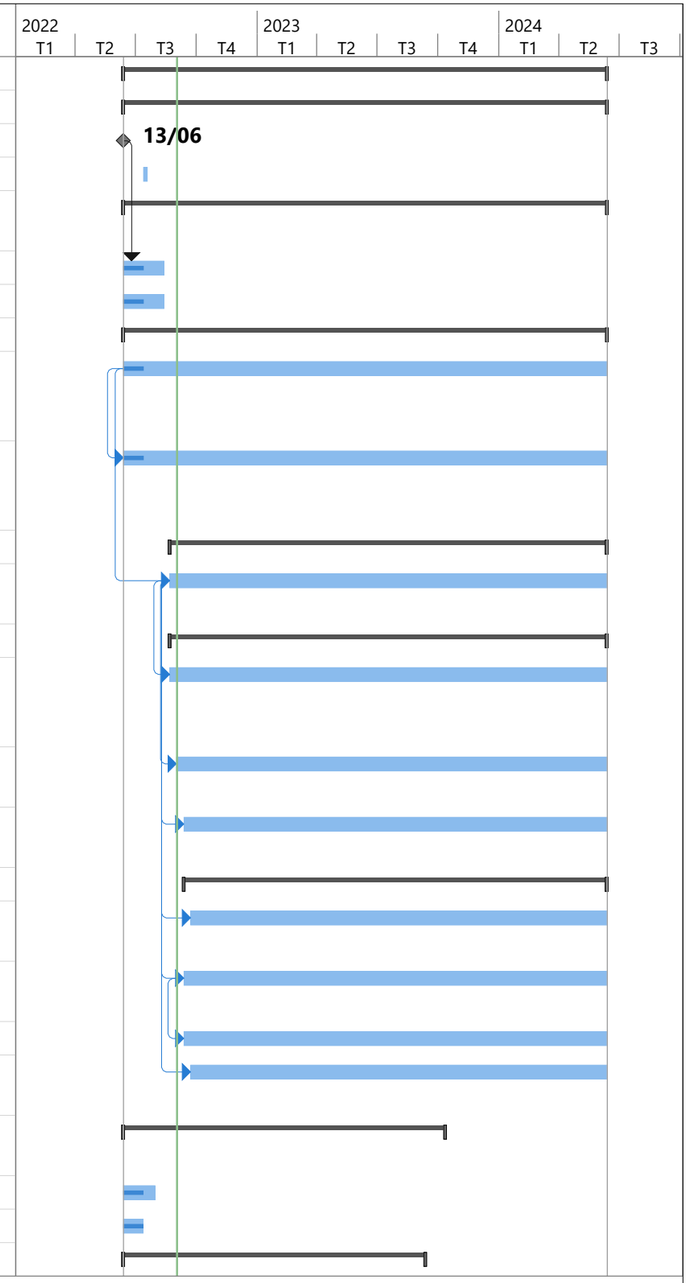

Proyecto: PROGRAMACIÓN PR
Fecha: vie 2/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
26		Comisión topobatimétrica inicial y control topobatimétrico durante la obra (para dos frentes de trabajo 1 y 2)	427 días	lun 13/06/22	mar 12/09/23			$ 364,368,085
27		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**422 días**	**mar 19/07/22**	**jue 12/10/23**			**$ 9,856,834,347**
28		Remoción y extracion de sedimentos - Incluye cargue del material	422 días	mar 19/07/22	jue 12/10/23		30CC;34CC+4 días;35CC+70	$ 9,856,834,347
29		**REMOCIÓN Y TRANSPORTE**	**422 días**	**mar 19/07/22**	**jue 12/10/23**			**$ 14,012,289,546**
30		Trasiego de material en barcaza. Incluye descargue de material y cargue en volqueta o extendido en las	422 días	mar 19/07/22	jue 12/10/23	28CC	31CC+10 días	$ 9,268,404,527
31		Transporte y disposición de material extraído	412 días	vie 29/07/22	jue 12/10/23	30CC+10 di	32CC+15 días	$ 3,604,174,573
32		Explanación y extendida de material removido	397 días	sáb 13/08/22	jue 12/10/23	31CC+15 di		$ 1,139,710,446
33		**OTRAS ACTIVIDADES**	**418 días**	**vie 22/07/22**	**jue 12/10/23**			**$ 205,945,329**
34		Remoción y disposición de material vegetal, árboles y demás elementos	418 días	vie 22/07/22	jue 12/10/23	28CC+4 días		$ 5,137,198
35		Suministro e Instalacion Cerca en alambre de pua 4 hilos. Con poste en madera	352 días	sáb 1/10/22	jue 12/10/23	28CC+70 días		$ 22,558,955
36		Desmonte y reinstalación de cercas existentes	362 días	mié 21/09/22	jue 12/10/23	28CC+60 di		$ 21,509,439
37		Instalación de protección marginal con pilote en madera rolliza (incluye pilote)	377 días	lun 5/09/22	jue 12/10/23	28CC+45 días		$ 156,739,737
38		FIN	0 días	mié 12/06/24	mié 12/06/24			$ 0

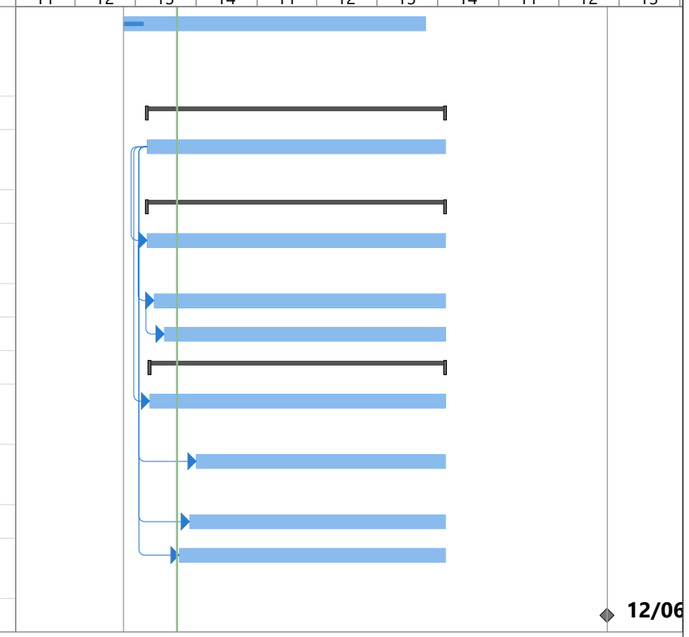

Proyecto: PROGRAMACIÓN PR
Fecha: vie 2/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
