CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230147 DE 2023
INFORME No. 004 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 30, OCTUBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE SABANAS DE SAN ANGEL- ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL- MAGDALENA		
PARTICIPANTES	DNP ENTerritorio		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$ 5.000.000.000,00
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		0
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		0
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$ 5.000.000.000,00
ADICIÓN:	NOMBRE DE ENTIDAD QUE ADICIONA	DD/MM/AÑO	0
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE MESES 12		
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/06/2023		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	CARLOS RAFAEL CONTRERAS GAMARRA		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO (Si aplica)	04/06/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO ANEXAR DOCUMENTO SOPORTE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	DD/MM/AÑO	**FECHA REINICIOS**	DD/MM/AÑO
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	DD/MM/AÑO	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)**	DD/MM/AÑO

VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$VALOR ESTIPUALDO	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	$VALOR ESTIPUALDO
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	**Avance Financiero del periodo (%)**	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	0%	**Avance Físico Acumulado (%)**	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
320-47-994000026267	29/06/2023		500.000.000,00	(29/06/2023)	(28/02/2025)

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO	$
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			$
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**SUMATORIA DESEMBOLSOS REALIZADOS**

Carrera 3 No 3 – 10
Cod postal: 475001
312 675 18 24
www. sabanasdesanangel-magdalena.gov.co
planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co
Alcaldía de Sabanas de san ángel magdalena

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA (SI APLICA)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO	
(Tipo y No. Contrato)	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO, MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL- ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL			**$ (388.203.942,00) M/CTE.**	
Nombre contratista	Maquinas obras y proyectos zomac s.a.s				
Fecha Firma del contrato	(22/09/2023)				
Plazo contrato	(7) meses				
Fecha del acta de inicio del contrato	(26/09/2023)				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No. XX	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO) SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO GENERADO EN EL PERIODO A REPORTAR				
Fecha Inicial Terminación Contrato	(26/04/2024)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
PRIMER PAGO					

SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		
PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-10142593	(25/09/2023)	CUMPLIMIENTO	$38.820.394,20	(22/09/2023)	(22/10/2024)
		BUEN MANEJO	$97.050.985,50	(22/09/2023)	(22/10/2024)
		PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	$19.410.197,00	(22/09/2023)	(22/04/2027)
		CALIDAD DE SERVICIO POR PERJUICIOS	$38.820.394,20	(22/04/2024)	(22/04/2029)
ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*(Se presenta informe de interventoría del mes xx el cual presenta xxxxxx)*	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
2		(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
(Tipo y No. Contrato)	MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL-ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA	**4.521.844.365,86 MCTE.**
Nombre contratista	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGION CARIBE "ASOREC"	
Fecha Firma del contrato	(08/09/2023)	
Plazo contrato	(7) MESES	

Fecha del acta de inicio del contrato	(26/09/2023)				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No. XX	(DD/MM/AÑO)				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(26/04/2024)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101424757	(14/09/2023)	CUMPLIMIENTO GENERAL	$452.184.436,59	(08/09/2023)	(08/08/2023)
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	$1.130.461.091	(08/09/2023)	(08/08/2024)
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LEGALES	$225.092.218,29	(08/09/2023)	(08/04/2027)
		Estabilidad y calidad de las obras	$452.184.436,59		

21-40-101218629	(14/09/2023)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$464.000.000,00	(08/09/2023)	(08/04/2024)

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	**0.3 %**
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	**30,92 %**
% AVANCE PROGRAMADO	**14%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**


DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	**FECHA REUNIÓN O VISITA**	**COMPROMISOS**
	DD/MM/AÑO	relacionar los compromisos y fecha de cumplimiento
		Incluir las filas que sean necesarias

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

CARLOS RAFAEL CONTRERAS GAMARRA
SUPERVISOR

ANEXO DE INFORME DE INTERVENTORIA
ANEXO 1.

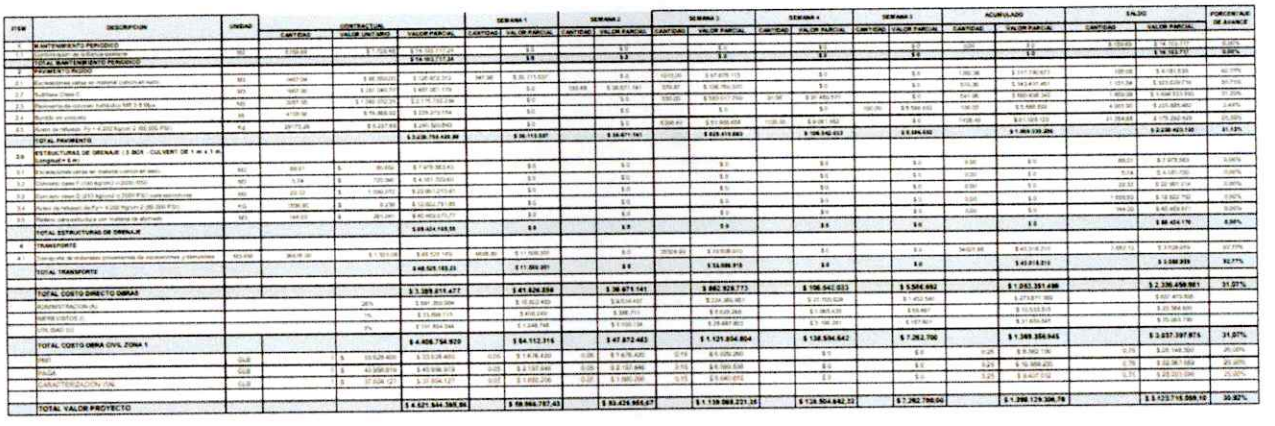

ANEXO 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA.

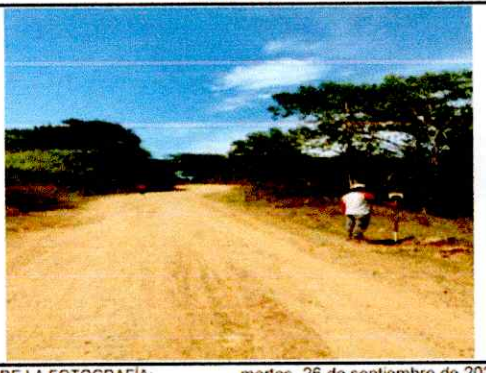
FOTO No.1	FOTO No.2
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: martes, 26 de septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: miércoles, 27 de septiembre de 2023
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
Inicio del replanteo a través del levantamiento topografico.	Replanteo de obra - Topografia
FOTO No.3	**FOTO No.4**
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: jueves, 28 de septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: miércoles, 4 de octubre de 2023
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL / TRAMO 1	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL / TRAMO 1
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
Inicio de obra - Corte de subrasante, excavaciones.	Compactacion Subbase Clase C

FOTO No.5	FOTO No.6
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: lunes, 9 de octubre de 2023	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: martes, 10 de octubre de 2023
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL / TRAMO 1
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
Extendida de Subbase Clase C y compactacion. Alistamiento de rieles	Inicio de fundida tramo 1
FOTO No.7	**FOTO No.8**
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: viernes, 13 de octubre de 2023	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: jueves, 12 de octubre de 2023
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL BODEGA CONTRATISTA	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL BODEGA CONTRATISTA
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
Corte de pavimento para dilataciones.	Trabajos de elaboracion de concreto para pacimento
