CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE



MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01
PERIODO: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN
2 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
- 2.1 Objeto del Contrato
- 2.2 Alcances del Frente
- 2.3 Actores
- 2.4 Costos Totales
- 2.5 Anticipo
- 2.6 Plazos
- 2.7 Resumen de fechas y plazos
- 2.8 Eventos que han Modificado el Programa

3 LOCALIZACION

4 INFORME TÉCNICO
- 4.1 Estado General del Proyecto
- 4.2 Avance por Capítulos
- 4,2,1 Control Presupuestal
- 4,2,2 Avance Porcentual
- 4.3 Control y Análisis de Programación de Obra
- 4.4 Control de materiales de obra (Ensayos y certificaciones)
- 4.5 Ensayos de laboratorio
- 4.6 Descripcion de actividades
- 4.7 Control Diario de Personal
- 4.8 Control de Equipos
- 4.9 Registro Fotográfico
- 4.11 Actas de Comité
- 4.12 Libro de Obra

5 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
- 5.1 Control de Pólizas

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

1. INTRODUCCIÓN

El departamento nacional de planeación DNP incluyó en su plan estratégico 2014-2018 "todos por un nuevo país", el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación de instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación - territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional.

Por lo anterior, ENterritorio y el Municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena acordaron suscribir un contrato especifico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de designar recursos del Fondo Regional para los Pactos territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asi mismo el Municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena abrió el PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023, resultando a favor del CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE P-LP-MSSA-010-2023 – NIT. 901766780-2.

El presente informe mensual No 1, que está comprendido en el periodo del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, tiene el objetivo de resumir y recopilar las principales actividades realizadas por el contratista, así como también las principales acciones y novedades que se van desarrollando a lo largo del proyecto.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

2.1		INFORME MENSUAL No. 1
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO		

PERÍODO: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE** **INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

2.1 OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA					
2.2 ALCANCES DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA:**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
	OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
2.3 ACTORES	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE			RL. LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ	
	No. CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023				
	INTERVENTOR:	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC			RL. ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA	
	No. CONTRATO:	P-CMA-MSSA-003-2023				
2.4 COSTOS TOTALES (INC. AIU Y/O IVA):	**OBRA:**	INICIAL	$	1,427,378,283.00		
		ADICIÓN	$	-		
		TOTAL	$	1,427,378,283.00		
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	$	152,953,080.00		
		ADICIÓN	$	-		
		TOTAL	$	152,953,080.00		
	TOTAL INTERVENTORÍA Y OBRA:				**$ 1,580,331,363.00**	
2.5 ANTICIPO:	**PORCENTAJE:**					
	VALOR ANTICIPO OBRA:					
	VALOR ANTICIPO INTERVENTORÍA:					
2.6 PLAZOS DEL CONTRATO:	**OBRA:**	INICIAL	4	MESES		
		PRÓRROGAS	0	MESES		
		TOTAL	**4**	**MESES**		
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	4	MESES		
		PRÓRROGAS	0	MESES		
		TOTAL	**4**	**MESES**		
2.7 RESUMEN DE FECHAS Y PLAZOS:	**OBRA:**	FECHA DE INICIO			28-Nov-2024	
		PLAZO INICIAL			**4 MESES**	
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			28-Mar-2024	
		PLAZO ADICIONAL			0 MESES	
		TIEMPO SUSPENDIDO			0 MESES	
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN			**28-Mar-2024**	
	INTERVENTORÍA:	FECHA DE INICIO			28-Nov-2024	
		PLAZO INICIAL			**4 MESES**	
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			28-Mar-2024	
		PLAZO ADICIONAL			0 MESES	
		TIEMPO SUSPENDIDO			0 MESES	
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN			**28-Mar-2024**	

ESTADO ACTUAL: **En Ejecución**

PORCENTAJE DE EJECUCION: **38.59%**

OBSERVACIONES:

2.8 EVENTOS QUE MODIFICAN EL PROGRAMA:	**SUSPENSION N° 1:**	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A
	SUSPENSION N° 2:	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

3. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La vía objeto del contrato de obra No. P-LP-MSSA-010-2023, se encuentra localizada entre los municipios de Sabanas de San Angel y Algarrobo, en el departamento del Magdalena. El proyecto se ejecutara en un solo tramo el cual se relaciona a continuación:

MEJORAMIENTO (LONGITUD 640 MTS)

Tramo: k0+000 al k0+640

COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA





4. INFORME TÉCNICO

4.1		INFORME MENSUAL No. 1
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

1. RESUMEN BÁSICO:

FECHAS		PLAZOS			VALOR CONTRATO		
		ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA
CONTRATO DE OBRA	P-LP-MSSA-010-2023	INICIAL	4	4	INICIAL	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
ACTA DE INICIO	28 de November de 2023	PRORROGAS			ADICIÓN	$ -	$ -
TERMINACIÓN INICIAL	28 de March de 2024	TOTAL	4	4	CONTRATO	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
TERMINACIÓN FINAL	28 de March de 2024	SUSPENSIONES					

2. ESTADO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEFINIDAS EN EL PERÍODO	DISEÑOS CRÍTICOS PENDIENTES POR DEFINICIÓN

3. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS:

SERVICIO	OBSERVACIÓN
TELEFONO	No aplica
ACUEDUCTO	No aplica
ENERGIA	No aplica
GAS	No aplica

4. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN:

AVANCE PONDERADO DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

EJECUCIÓN	ESPERADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO DEL PERÍODO ANTERIOR	0.00%	0.00%	0.00%
AVANCE DURANTE EL PERÍODO	28.90%	38.59%	9.69%
ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	28.90%	38.59%	9.69%


ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

DÍAS DE:	ADELANTO	ATRASO	FECHA PROYECTADA
ANTERIOR	0	0	28-Mar-2024
ACTUAL	0	0	28-Mar-2024

PLAZOS

MESES	TOTAL	TRANSCURRIDO		RESTANTE	
INICIAL	4	1.00	25.0%	3.00	75.0%
PROYECTADO	4				

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

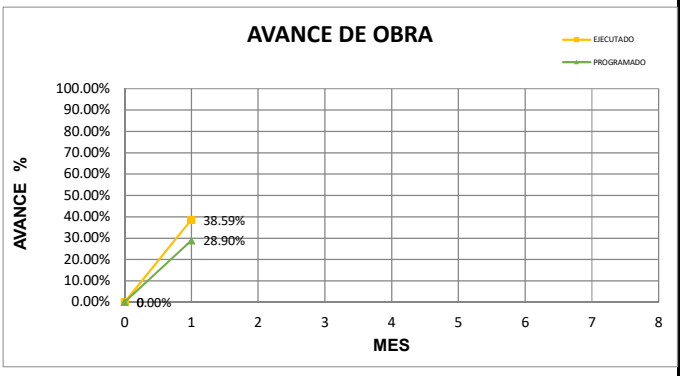

5. PRESUPUESTO DE OBRA:

CONCEPTO		PRESUPUESTO DE OBRA		AVANCE:	
		CONTRACTUAL	EJECUTADO	EJECUTADO	RESTANTE
Costos Directos		**$ 1,054,429,685.14**	**$ 423,711,753.40**		
Administración	26.00%	$ 274,151,718.14	$ 110,165,055.88		
Imprevistos	1.00%	$ 10,544,296.85	$ 4,237,117.53		
Utilidades	3.00%	$ 31,632,890.55	$ 12,711,352.60		
Total AIU	**30.00%**	**$ 316,328,905.54**	**$ 127,113,526.01**		
PMT		**$ 22,428,400.00**		**38.59%**	**61.41%**
PAGA		**$ 33,063,168.53**			
CARACTERIZACION VIAL		**$ 1,128,123.79**			
TOTAL		**$ 1,427,378,283.00**	**$ 550,825,279.41**		

6. OBSERVACIONES GENERALES:

SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA INICIAL, PRESENTANDO UN AVANCE DE 9,69% POR ARRIBA DE LO ESPERADO.

CONTROL PRESUPUESTAL

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					Diciembre			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO													
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4224,00	$ 2.293,20	$ 9.686.476,80	0,68%	4224,00	$ 9.686.477,00	0,68%	4224,00	$ 9.686.477,00	0,68%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO													
2,1	Subbase Clase C	m3	571,20	$ 372.808,80	$ 212.948.387,00	14,92%	571,20	$ 212.948.387,00	14,92%	571,20	$ 212.948.387,00	14,92%	**0,00**
2,2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	m3	678,40	$ 1.406.165,80	$ 953.942.879,00	66,83%	212,00	$ 298.107.150,00	20,88%	212,00	$ 298.107.150,00	20,88%	466,40
2,3	Bordillo en concreto	m3	1280,00	$ 74.109,10	$ 94.859.648,00	6,65%	76,29	$ 5.653.783,00	0,40%	76,29	$ 5.653.783,00	0,40%	1203,71
2,4	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	M3	9088,86	$ 10.927,80	$ 99.321.201,00	6,96%	2235,54	$ 24.429.534,00	1,71%	2235,54	$ 24.429.534,00	1,71%	**6853,32**
	SUBTOTAL BASICO DE OBRA				**$ 1.370.758.592,00**								
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			**1**	**$ 33.063.168,53**	**$ 33.063.168,53**	2,32%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**	**$ 22.428.400,00**	**$ 22.428.400,00**	1,57%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
CARACTERIZACION VIAL		gl	**1,00**	**$ 1.128.123,79**	**$ 1.128.123,79**	0,08%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 1.427.378.284,00**	**100,00%**		**$ 550.825.331,00**	**38,59%**		**$ 550.825.331,00**	**38,59%**	




4.3		INFORME MENSUAL No. 1
AVANCE PORCENTUAL		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

AVANCE PORCENTUAL CONTRATO DE OBRA No. L-LP-MSSA-010-2023


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1,427,378,283.00**

VALOR EJECUTADO	$550,825,331.00	38.59%
SALDO POR EJECUTAR	$876,552,952.00	61.41%

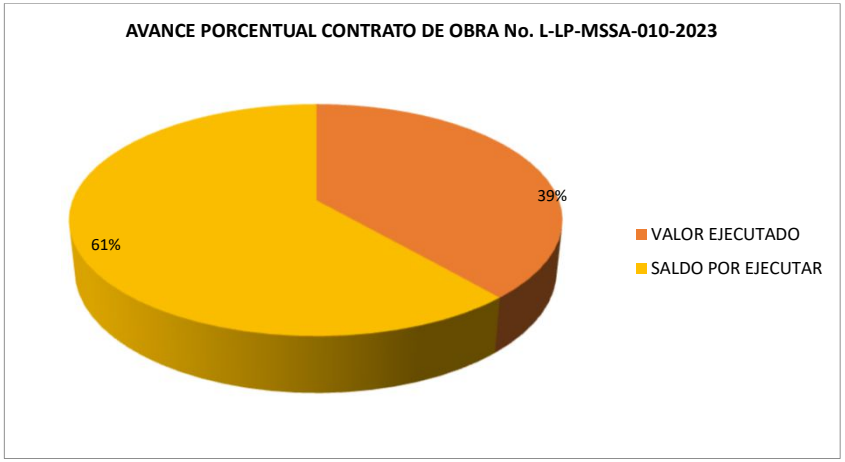

4.4		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		

FECHA DE CORTE:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

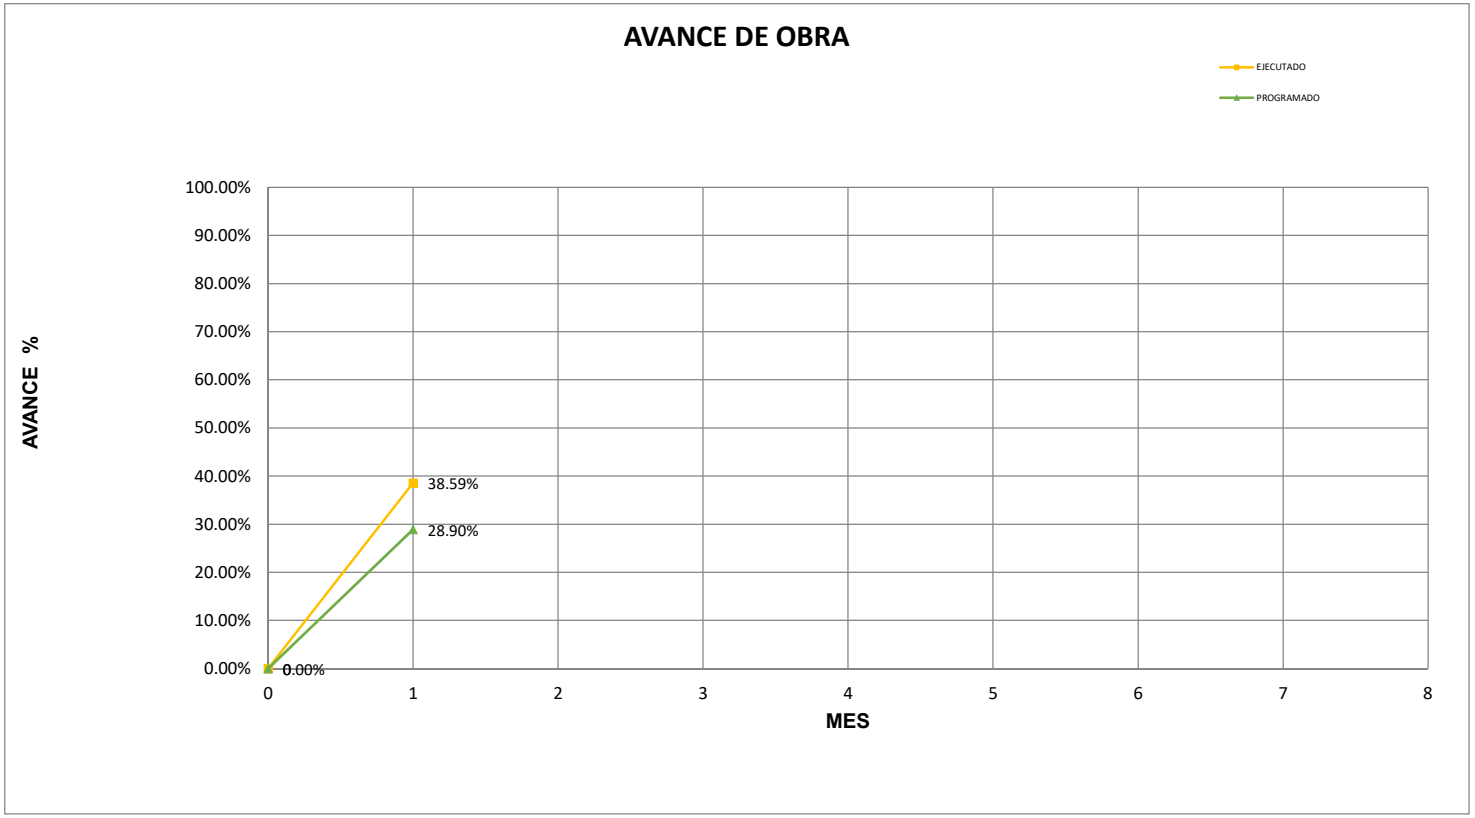

OBSERVACIONES:

DUANTE EL PERIODO SE EVIDENCIO UN ADELANTO EN EL AVANCE DE OBRA DE 9,69% POR ENCIMA DEL PROGRAMADO, EJECUTANDOSE ESTA CON TOTAL NORMALIDAD.

4.5		INFORME MENSUAL No. 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		
PERÍODO: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE** **INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.6		INFORME MENSUAL No. 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

SEMANA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza replanteo con apoyo de un levantamiento topográfico (con estación total)
- Se realizan desvíos sobre el k0+300, lo cual atrasó las actividades programadas.
- Corte y figurado de acero para las placas, dovelas y bordillos.
- Suministro de materiales pétreos, concreto, aceros.
- Instalación de rieles de acuerdo con la modulación de las placas.
- Extensión de plástico de polietileno.
- Vaciado de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.

CONTROL PERSONAL

4.7.1		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

PERSONAL	DEDICACIÓN	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																																		
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Director de Obra	30%	1	1		1					1				1			1		1	1				1	1			1				1	1			
Residente de Obra	100%	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	
Profesional SS - SGT	25%				1				1		1							1					1					1			1			1		
Maestros de Obra	100%	1	1	1	2	2	3		3	3	3	3		3		3	3	3	3	3	3		3	3	3		3	3			3	3	3	3	3	
Ayudantes	100%	2	2	2	3	4	4		7	7	9	9		9		9	12	12	12	12	12		12	12	12		12	12			12	12	12	12	12	
Topografo	100%	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	
Cadenero	100%	1	1	1	1	2	2		2	2	2	2		2			2	2	2	2	2		2	2	2		2	2			2	2	2	2	2	
Celador	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		**8**	**8**	**7**	**11**	**11**	**12**	**1**	**16**	**16**	**18**	**17**	**1**	**18**	**1**	**14**	**21**	**21**	**21**	**21**	**20**	**1**	**21**	**21**	**21**	**1**	**20**	**22**	**1**	**1**	**21**	**21**	**21**	**21**	**20**	**1**

OBSERVACIONES:

Se observa que durante el periodo se ha cumplido con el personal requerido en obra.

4.7.2		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DIARIO DE PERSONAL INTERVENTORÍA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

PERSONAL	DEDICACIÓN	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																																	
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Director de Interventoría	30%	1	1		1					1				1			1		1	1				1	1			1				1	1			
Ingeniero Residente	100%	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	
Profesional SS - SGT	25%								1			1				1	1							1	1							1			1	
Topográfo Inspector	100%			1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	
Cadeneros	100%			1	1	1	1		2	2	2	2		2		2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2			1	1	2	2	1	
TOTAL		**2**	**2**	**3**	**4**	**3**	**3**	**0**	**5**	**5**	**4**	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**	**6**	**4**	**5**	**5**	**4**	**0**	**4**	**6**	**6**	**0**	**4**	**5**	**0**	**0**	**3**	**5**	**5**	**4**	**4**	**0**

4.8		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DE EQUIPOS		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

MAQUINARIA Y EQUIPOS	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																																			
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
motoniveladora champions		1	1	1	1	1		1	1	1							1	1	1	1			1			1	1			1	1	1		1	
vibro 12 toneladas										1									1				1							1		1			
pajarita Cat 420 D			1	1	1	1		1	1	1	1		1		1		1	1	1	1			1	1		1	1			1	1	1	1	1	
volqueta chevrolet x 6 m^3			1	1	1	1		1	1	1	1		1		1		1	1	1	1			1	1		1	1			1	1	1	1	1	
Cortadora de concreto																																			
vibro concreto																2	2					2									2				
vibrocompacatadora (rana)																3	3					3									3				
Planta electrica																2	2					2									2				
Mezcladora																2	2					2									2				
martillo de demolicion																																			
Equipo topografico		1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	
Herramienta menor		1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	
TOTAL	**0**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**6**	**4**	**0**	**4**		**4**	**11**	**14**	**5**	**6**	**5**	**0**	**11**	**6**	**4**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**6**	**9**	**6**	**4**	**5**	**0**

OBSERVACIONES:

Los equipos y herramientas deben ser llevados a mantenimiento periodicamente, para su correcto funcionamiento.

4.9		INFORME MENSUAL No. 1
REGISTRO FOTOGRAFICO		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Registro fotográfico









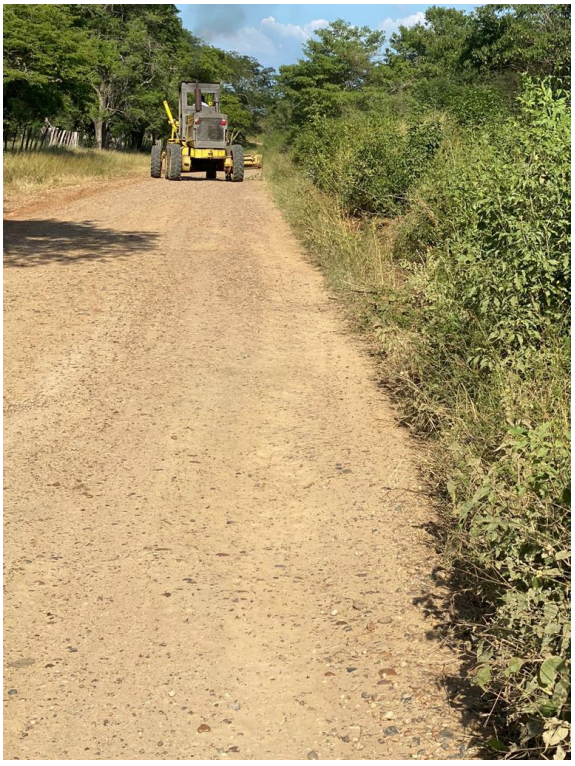








































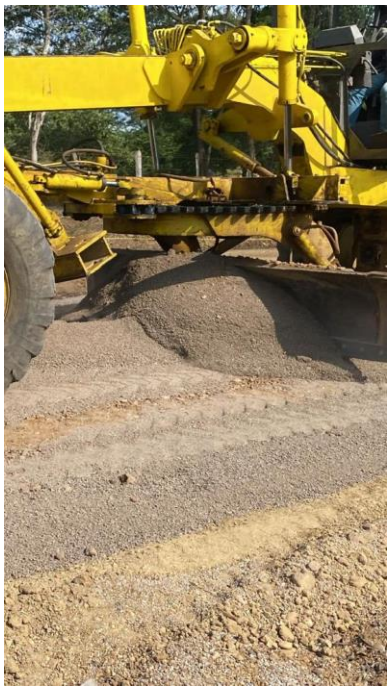



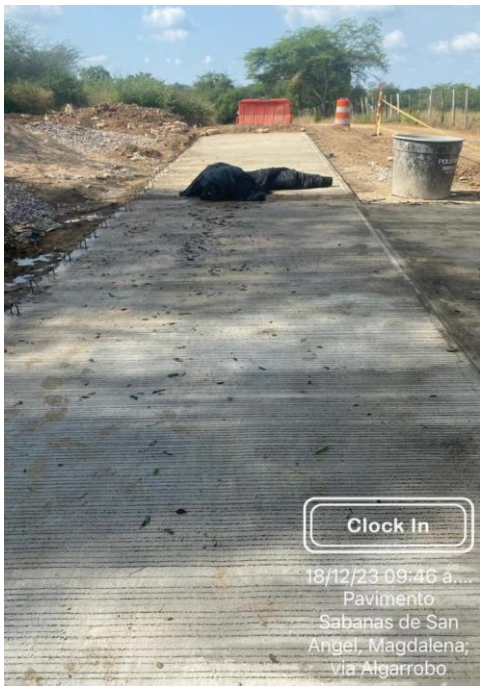


Clock In
18/12/23 09:46 a....
Pavimento
Sabanas de San
Angel, Magdalena;
via Algarrobo

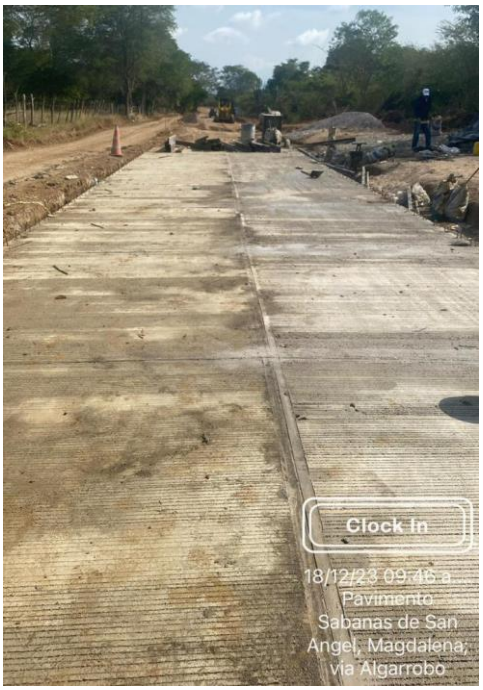
Clock In
18/12/23 09:46 a....
Pavimento
Sabanas de San
Angel, Magdalena;
via Algarrobo
























4.10		INFORME MENSUAL No. 1
INFORMES SEMANALES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01**	

INFORMES SEMANALES

	SABANAS DE SAN ÁNGEL SÍ AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	FECHA 3/01/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 5 Del: 25/12/2023 Al: 30/12/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	15,06%	28,90%	10,58%	38,59%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 215.020.264,55	$ 412.569.418,92	$ 151.016.622,34	$ 550.825.279,41

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	13,84%	28,01%	9,69%
Durante el periodo	15,06%	10,58%	
Acumulado actual	28,90%	38,59%	

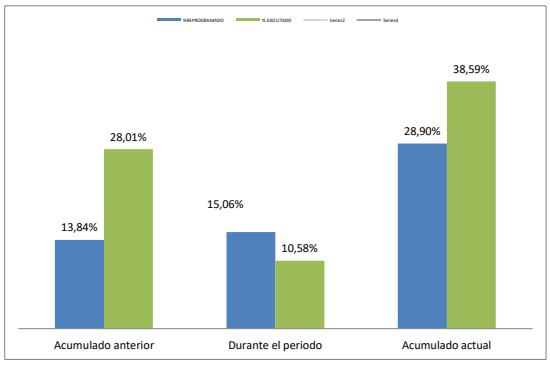

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: VERIFICAACION DE NIVELES, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, CONCRETO, ACEROS, SE REALIZO EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA**
C.C. 72.000.324 de Sabanas de San Angel

	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	FECHA 21/12/2023

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 4 Del: 18/12/2023 Al: 23/12/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 27 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,46%	13,84%		
Obra Física Ejecutada (%)			6,26%	28,01%
Valor de la Obra programada:	$ 49.387.288,59	$ 197.549.154,37		
Valor de la Obra Ejecutada:			$ 89.353.880,52	$ 399.808.657,07

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	10,38%	21,75%	14,17%
Durante el periodo	3,46%	6,26%	
Acumulado actual	13,84%	28,01%	

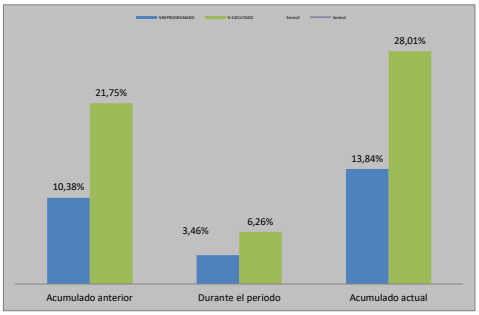

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, CONCRETO, ACEROS, EXTENSIÓN DE PLÁSTICO DE POLIETILENO, SE REALIZO EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA**
C.C. 72.000.324 de Sabanas de San Angel

	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	FECHA 18/12/2023

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 3 Del: 11/12/2023 Al: 16/12/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 20 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,46%	13,84%		
Obra Física Ejecutada (%)			3,15%	24,90%
Valor de la Obra programada:	$ 49.387.288,59	$ 197.549.154,37		
Valor de la Obra Ejecutada:			$ 44.962.415,91	$ 355.417.192,47

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	10,38%	21,75%	11,06%
Durante el periodo	3,46%	3,15%	
Acumulado actual	13,84%	24,90%	

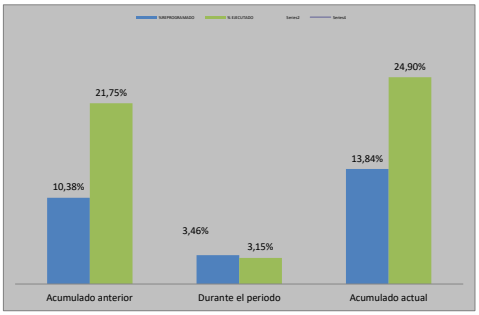

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON:SE REALIZO LA EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE MATERIAL SELECCIONADO PARA DAR UNIFORMIDAD AL TERRENO, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, CONCRETO, ACEROS. SE INSTALACION DE RIELES, EXTENSIÓN DE PLÁSTICO DE POLIETILENO, SE REALIZO EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA**
C.C. 72.000.324 de Sabanas de San Angel

	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	FECHA 11/12/2023

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 2 Del: 4/12/2023 Al: 9/12/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 13 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,46%	10,38%		
Obra Física Ejecutada (%)			6,15%	21,75%
Valor de la Obra programada:	$ 49.387.288,59	$ 148.161.865,78		
Valor de la Obra Ejecutada:			$ 87.783.764,40	$ 310.454.776,55

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6,92%	15,60%	11,37%
Durante el periodo	3,46%	6,15%	
Acumulado actual	10,38%	21,75%	

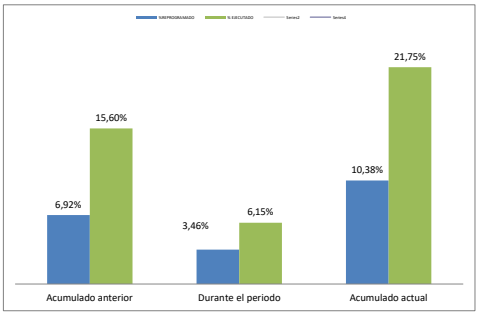

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

EL DIA 27 DE NOVIEMBRE SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: INSTALACION DE SAÑALES DE TRANSITO, CONFORMACION DE LA BANCA EXISENTE, EXTENSION Y COMPACTACION DE SUBBASE CLASE C.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA**
C.C. 72.000.324 de Sabanas de San Angel

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

4/12/2023

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2022		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 1 Del: 27/11/2023 Al: 2/12/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 6 días

Nombre del Supervisor MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	3,46%	3,46%	15,60%	15,60%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 49.387.288,59	$ 49.387.288,59	$ 222.671.012,15	$ 222.671.012,15

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior			12,14%
Durante el periodo	3,46%	15,60%	
Acumulado actual	3,46%	15,60%	

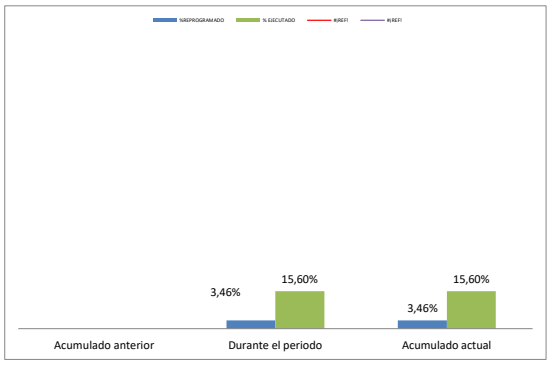

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

EL DIA 28 DE NOVIEMBRE SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: INSTALACION DE SAÑALES DE TRANSITO, CONFORMACION DE LA BANCA EXISENTE, EXTENSION Y COMPACTACION DE SUBBASE CLASE C.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA**
C.C. 72.000.324 de Sabanas de San Angel

4.11		INFORME MENSUAL No. 1
LIBRO DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01**	

BITACORA

DIA	MES	AÑO
27	11	2023

Bitacora de Obra.

* Objeto: Mejoramiento de la via sabanas de san angel- Algarrobo municipio de sabanas de san Angel, Departamento del magdalena.

* Contratista: Consorcio Villanueva- MAESTRE

* Valor: $ 1.425.891.346,32 m/cte

* Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

* Interventoria: Maquinas obras y proyectos S.A.S Zona C.

* Fecha de inicio: 27 Noviembre de 2023

* Fecha de terminación: 27 de Marzo de 2024

27 NOV 2023

Nota 1:

con esta fecha se da inicio a las actividades contratadas en el contrato, ingresa personal a obra así mismo maquinaria y demas herramientas de trabajo como personal autorizado para el diligenciamiento de la bitacora tenemos a la ingeniera residente de obra Lorens Villanueva martinez y como residente de interventoria Angie Paola Alfaro molina. se contemplan actividades de levantamiento topográfico y Abscisado de la vía

Angie ALfaro

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

28 NOV 2023

Nota 2:

Con maquinaria en SITIO tipo motoniveladora, y tipo pajarita se inicio con la intervencion de 1 primer pramo de desvio que va desde la abscisa K0+000 hasta K0+300.

Angie ALFaro

Interventoria

29 NOV 2023

Nota 3:

Se sigue con la intervencion del desvio para el flujo vehicular no se ve afectado y se continua con la demarcacion del abscisado.

Angie ALFaro

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

30 NOV 2023

Nota 4:

Inician labores de descapote para el acopio de materiales (cemento, Arena, gravilla)

Angie ALFaro
Interventoría

1 DIC 2023

Nota 5:

Se interviene el primer tramo de la vía iniciando desde la abscisa K0+000 con la motoniveladora haciendo el corte para la preparación del terreno. hasta la abscisa K0+50.

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoría

2 DIC. 2023

Nota 6:

Se interviene segundo tramo de la via. con abscisa K0+50 hasta K0+100 siguiendo los parametros de la comision de topografia.

Angie ALFaro
Interventoria

3 DIC 2023

NOTA 7:

Domingo NO se contemplan Labores.

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

4 DIC 2023

Nota 8:

Inician labores, se retira talud que impide continuación de las labores topografía.

Angie Alfaro
Interventoria

5 DIC 2023

Nota 9:

Se inicia con la perfilación del turno y dejarlo a cota nivel para proceder con la instalación de la subbase en el tramo 1. Se recibe por parte del proveedor primer despacho de concreto. el cual se deja acopiado en obra.

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

6 DIC 2023

Nota 10:

Se instalo subbase en el tramo 1, se le dio el grado de humedad requerido y luego se procedio a compactar el terreno teniendo en cuenta que este ya ha sido sellado con el vibro compactador.

Angie Alfaro
Interventoria

7 DIC 2023

Nota 11:

Se recibe en obra viajes de gravilla y Arena, se procede a marcar los puntos con topografia para la ubicacion de los viajes.

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

Norma

8 DIC 2023

Nota 12:

Festivo — No se reportan Actividades.

Angie ALFaro
Interventoria

9 DIC 2023

Nota 13:

Inicion Labores de colocacion de rieles desde la abscisa K0+00 hasta K0+45 iniciando por el cami derecho de la via tomando en cuenta el punto de referencia K0+000

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

Norma

10 DIC 2023

NOTA 14:

DOMINGO - NO REPORTA ACTIVIDADES.

Angie ALFARO
Interventoria

11 DIC 2023

NOTA 15:

SE PUNTO EL PRIMER TRAMO DE LA VIA
K0+000 HASTA K0+45 SIN NINGUN INCONVENIENTE.

Angie ALFARO
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

12 DIC 2023

Nota 16:

Se retiran los ricles instalados para la fundida anterior y se instalan para la fundida del carril izquierdo en la abscisa K0+000 hasta K0+45.

Angie Alfaro
interventoria

13 DIC 2023

Nota 17:

preparacion del terreno desde la abscisa K0+50 hasta K0+100 con maquinaria, se funde carril izquierdo desde el punto K0+00 hasta K0+45.

Angie Alfaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

14 DIC 2023

NOTA 18

instalación de subbase en el tramo 2 abscisa K0+50 hasta K0+100

Angie Alfaro
Interventoria

15 DIC 2023

NOTA 19:

se cerca el terreno objeto de cuando las cotas de nivelación dadas por la comisión de Topografia, se humedece el terreno y se compacta hasta el grado requerido.

Angie Alfaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

16 DIC 2023

NOTA 20:

Se mide la y se instalan vidrios en el segundo tramo.

Angie ALfaro
Interventoria

17 DIC 2023

NOTA 21:

Domingo

Angie ALfaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

18 DIC 2023

NOTA 22:

Actividades de Fundida Km 45 hasta Km 90 carril derecho

Angie ALFaro
Interventoria

19 DIC 2023

NOTA 23:


Actividades de topografía y nivelación

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

20 DIC 2023

NOTA 24

Se recibe en obra material Cemento, Arena y Gravilla.




Angie ALfaro
Interventoría

21 DIC 2023

NOTA 25:

NO se reportan Actividades debido a fuerte aguacero en la madrugada del 21 de DIC el cual impide el ingreso a obra tanto de material como del personal.



Angie ALfaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoría

22 DIC 2023

NOTA 26

Se recibe material de subbase en obra para proceder a su instalación y compactación cuando se le de el Grado de humedad.

Angie Alfaro
Interventoria

23 DIC 2023

NOTA 27


Se extiende material de subbase.

Angie ALFARO
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoría

24 DIC 2023

NOTA 28

Domingo - No reportan Actividades.




Angie ALfaro
Interventoria

25 DIC 2023

NOTA 29

Festivo - NO Reportan Actividades



Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

26 DIC 2023

Nota 30

Se prepara terreno y se instalan rieles.

Angie ALfaro
Interventoria

27 DIC 2023

Nota 31

Actividades de fundida con 1 18 q, erdo kotas hasta kota 90. El personal de trabajo se le da una pausa activa y charlas. Se realizan cortes de junta de dilatacion de placas

Angie ALfaro
Angie Paola Alfaro molina
Interventoria

28 DIC 2023

NOTA 32

La maquinaria tipo motoniveladora sigue sus labores de nivelación del terreno.

Angie ALFaro

Interventoria

29 DIC 2023

NOTA 33

Se retiran excedentes de material de la obra que no sera utilizado en la misma.

Angie ALFaro

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

30 DIC 2023

NOTA 34

Llega a obra material como Arena, cemento y gravilla. se reportan actividades con la maquinaria. tipo pajarita y motoniveladora en conjunto de la topografia.

Angie ALFaro
Interventoria

31 DIC 2023

NOTA 35

Domingo

Angie ALFaro
Angie Paola Alfaro molina
Interventoria

Norma

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DE POLIZAS CONTRATISTA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

CONTROL PÓLIZAS CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-44-101125016 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

GARANTÍA	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-Nov-2023	31-10-2023	29-Jun-2024	$ 142,585,134.53				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10-Nov-2023	10/31/2023	6/29/2024	$ 356,462,836.58				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10-Nov-2023	31-10-2023	28-02-2027	$ 71.292.567,32				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10-Nov-2023	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.		$ 142,585,134.63				

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-40-101057341 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

GARANTÍA	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
Predios labores y operaciones.	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 232.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				
Vehículos propios y no propios	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				

5.2		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01	

CONTROL PÓLIZAS MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 21-44-101431160
TIPO DE PÓLIZA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Sep-2024	$ 15,295,308.00				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Jul-2024	$ 38,238,270.00				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Mar-2027	$ 7,647,654.00				
CALIDAD DEL SERVICIO	27-Nov-2023	1-Mar-2024	1-Mar-2029	$ 15,295,308.00				

CONCLUSIONES

La interventoría ejerce como lo dice el objeto de su contrato "realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental", las cuales son sus funciones.

Esta interventoría realizó la verificación y aprobación de cada una de las actividades que llevará a cabo el constructor para el desarrollo de la obra.

El dia 28 de noviembre se firmó el acta de inicio de obra e interventoria.

El presente periodo tuvo un avance alto con respecto a la programación, llegando a 38,59% contra una ejecución programada del 28,90%, mostrando así un avance con respecto a la programación del 9,69%.

Se realizaron los trabajos de desvíos y se evidencia la disposición de maquinaria, equipo, personal y materiales por parte del contratista, en los diferentes puntos de acopio.

Se esta a la espera de los resultados de los laboratorios, para revisión de esta interventoria.

De acuerdo con la normatividad de la administración municipal de San Ángel y según lo estipulado en los documentos previos que hacen parte del Pliego de Condiciones, por parte del contratista se realizó la socialización del proyecto con la comunidad del sector antes del inicio de las obras y teniendo en cuenta la presencia de las veedurías ciudadanas. Por ende, se le solicitó al contratista respetar las fechas de ejecución informadas a la comunidad.

En lo que concierne a los aspectos administrativos, jurídicos y financieros cada solicitud de modificación o desarrollo de un proceso administrativo o contable de parte del contratista debe ser recibida, evaluada y aprobada o denegada por esta interventoría, para que se puedan ser llevar a cabo en la obra.

Se realizo el cambio de supervisor Municipal, dado a que a partir del 01 de enero de 2024 ocupa el cargo de secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal el Señor LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR identificado con CC. N° 1.079.660.920 de Sabanas de San Ángel Magdalena.

se anexan formato de control de lluvias.

Angie ALFaro

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
RL. MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


PERIODO: 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Soleado **SL** Lluvias Leves **LL** Lluvias Medias **LM** Luvias fuertes **LF**

DIA / HORA	NOVIEMBRE - DICIEMBRE																																
	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
6:00 - 7:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
7:00 - 8:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
8:00 - 9:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
9:00 - 10:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
10:00 - 11:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
11:00 - 12:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
12:00 - 13:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
13:00 - 14:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
14:00 - 15:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
15:00 - 16:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
16:00 - 17:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
NOCTURNA																								LF											
LL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SL	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

TOTAL SEMANAL					
LL	**0**	0	0	3	0
LM	**0**	0	0	2	0
LF	**0**	0	0	3	0
SL	**77**	77	77	69	77

OBSERVACIONES:

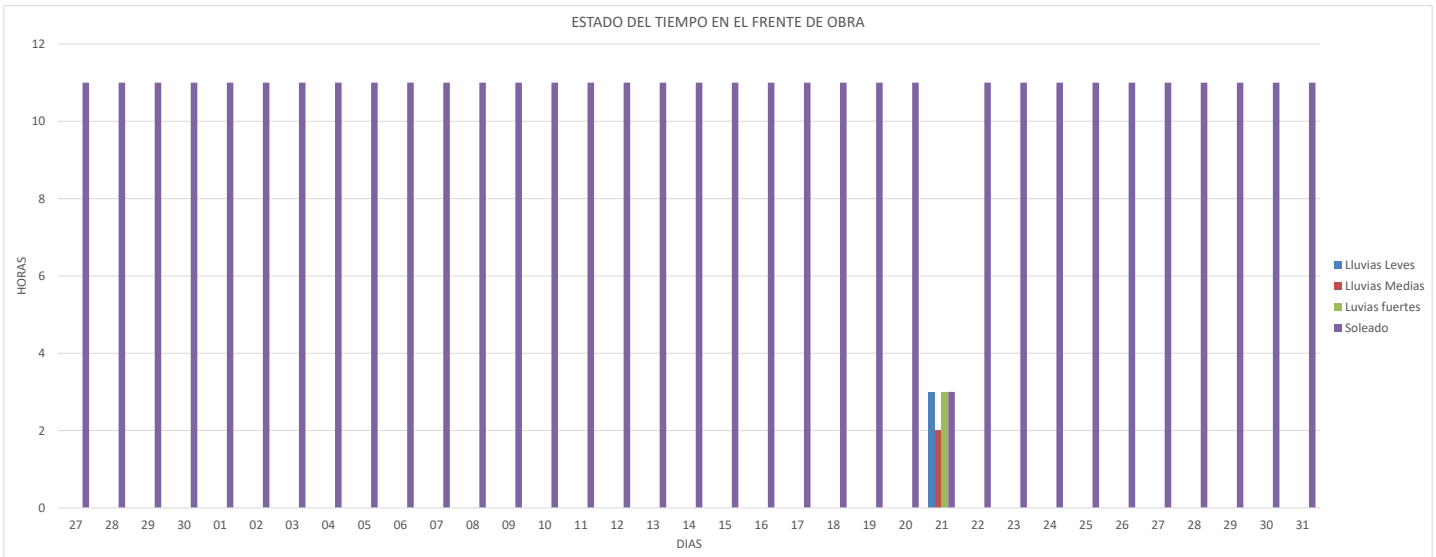

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-12-2023

No.	1	**MANTENIMIENTO PERIODICO**		
ITEM DE PAGO	310	Conformación de la Banca existente	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT.	TOTAL
Conformación de la Banca existente	K0+000 - K0+640	640.00		6.60			4224.00
TOTAL							**4224.00**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA









LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-12-2023


No.	2	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	320.30	Subbase Clase C	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Se realizo en todo el tramo cumpliendo la especificación INVIAS. Capa de la subbase es de 0.15 m	K0+000 - K0+640	640.00	0.15	5.95			571.20
TOTAL							**571.20**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA



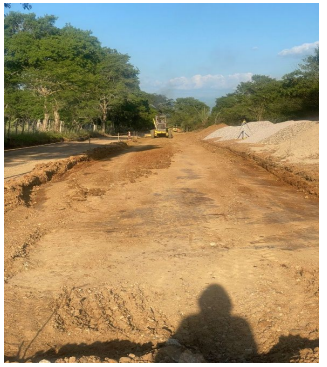





LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-12-2023

No.	3	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	500.1	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Placas de Pavimento	K0+000 - K0+200	200.00	0.20	5.30			212.00
TOTAL							**212.00**


OBSERVACIONES:

ESQUEMA







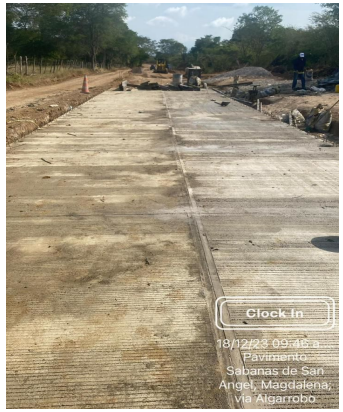

LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-12-2023

No.	4	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	672.1	Bordillo en concreto	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Bordillos con refuerzo transversal de fleje de 3/8"	K0+000 - K0+076,29	76.29					76.29
TOTAL							**76.29**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA



LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


FECHA: 29-12-2023

No.	5	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	640.1	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	UNIDAD	Kg

DESCRIPCION	LONG (m)	No de Juntas Transversales	No Dovelas x Junta	DIAMETRO DE DOVELA (Pulg)	LONG DE CORTE (m)	LONGITUD DE CORTE (m)	TOTAL
Acero de refuerzo Placa de Pavimento (Dóvelas)	200.00	67.00	18.00	1"	0.35	4.00	1688.20
Acero de refuerzo para Barra de anclaje o Acero de barras de Transferencia Pavimento	200.00			1/2"	0.85	1.00	170.00
DESCRIPCION	**No DE CANASTILLA X JUNTA**	**LONGITUD DE CORTE (m)**	**No de Juntas Transversales**	**DIAMETRO DE BARRA (Pulg)**	**PESO (Kg/ml)**		**TOTAL**
Acero para Canastilla para Dovelas	2.0	11	67.00	1/4"	0.256		377.34
TOTAL							**2235.54**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA

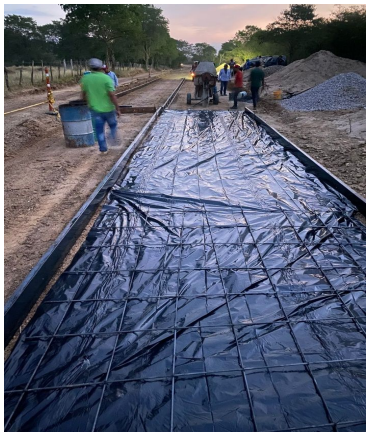



LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11		SANTA ANA, MAGDALENA		3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO		SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN		TELÉFONO 3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2023	29/06/2024	$142,585,134.63
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/10/2023	29/06/2024	$356,462,836.58
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/10/2023	28/02/2027	$71,292,567.32
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$142,585,134.63

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	CIUDAD: SANTA ANA, MAGDALENA	TELÉFONO:	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	CIUDAD: SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	TELÉFONO	3145491232

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262465(3900)000003836868(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926246-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101125016	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	28	02	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057341**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**29**	**02**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**

ACLARACIONES

Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0 , EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232


BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	NIT: 901.766.780-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	NIT: 819.003.224-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOD

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262481(3900)000000369659(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926248-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023,

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE**
TIPO PERSONA:	JURÍDICA
NIT:	901766780-2
DIRECCIÓN:	Calle 3 # 7B – 11 de la Ciudad de Santa Marta,
REPRESENTANTE LEGAL:	LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
C. C. No.	1.085.228.495 expedida en Santa Ana
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
NIT.	819.003.224-8
ALCALDESA	EVYS DEL AMPARO MEZA SAGBINI.
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 57.402.371 expedida en Fundación.
ORDENADOR DEL GASTO:	ALCALDESA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL.
DIRECCIÓN:	Carrera 3 No.36 – 10 Barrio El Centro – Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel.
1. OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
2. VALOR:	MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($1.425.851.346,32) M/CTE
3. PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
4. SUPERVISOR:	CARLOS CONTRERAS GAMARRA
5. CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
6. IDENTIFICACIÓN:	C.C. NO. 72.000.324 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO :	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	28 DE MARZO DE 2024

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023,

En la Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre 2023, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.000.324 expedida en Barranquilla, actuando en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publica del Municipio de Sabanas de San Ángel, Delegado como Supervisor por parte del **MUNICIPIO, el contratista, , LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.228.495 expedida en Santa Ana, obrando en su reconocida condición de Representante Legal de **CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE . Y ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.065.836.606 Ex. en Valledupar, Representante Legal de **MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC**,, con el objeto de dar inicio al contrato en cuestión.

En común acuerdo las partes deciden dar por iniciado el contrato de la referencia.

Para constancia de anterior, se firma la presente acta en el municipio de sabanas de san Ángel magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre del 2023, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

CARLOS CONTRERAS GAMARRA
C.C. No72.000.324 Ex en Barranquilla
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Sabanas de San Ángel

LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
C.C. No. 085.228.495 expedida en Santa Ana
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S

Angie ALFaro
ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
1.065.836.606 Ex. en Valledupar
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101431160**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2023**	**01**	**11**	**2023**	**00:00**	**01**	**03**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	**NIT: 901.636.135-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 3 - 08	SAN DIEGO, CESAR	3126146502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-003-2023, CUYO OBJETO ES; INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL NIT 819.003.224 - 8, EMPRESA NACIONL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, ENTERRITORIO NIT 899.999.316 - 1 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) NIT 899.999.011 - 0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	01/09/2024	$15,295,308.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2023	01/07/2024	$38,238,270.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	01/03/2027	$7,647,654.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2024	01/03/2029	$15,295,308.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****308,516.00	$ *******8,000.00	$ ******60,138.00	$ **********376,655.00	$ *******76,476,540.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101431160, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2023



21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-CMA-MSSA-03-2023,

FECHA DE INICIO :	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	28 DE MARZO DE 2024

En la Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre 2023, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.000.324 expedida en Barranquilla, actuando en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publica del Municipio de Sabanas de San Ángel, Delegado como Supervisor por parte del **MUNICIPIO, el contratista, , LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.228.495 expedida en Santa Ana, obrando en su reconocida condición de Representante Legal de **CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE . Y ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.065.836.606 Ex. en Valledupar, Representante Legal de **MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC,,** con el objeto de dar inicio al contrato en cuestión.

En común acuerdo las partes deciden dar por iniciado el contrato de la referencia.

Para constancia de anterior, se firma la presente acta en el municipio de sabanas de san Ángel magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre del 2023, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

CARLOS CONTRERAS GAMARRA
C.C. No72.000.324 Ex en Barranquilla
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Sabanas de San Ángel

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
C.C. 1.065.836.606 No. expedida Valledupar
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
