CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE



MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN
2 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
- 2.1 Objeto del Contrato
- 2.2 Alcances del Frente
- 2.3 Actores
- 2.4 Costos Totales
- 2.5 Anticipo
- 2.6 Plazos
- 2.7 Resumen de fechas y plazos
- 2.8 Eventos que han Modificado el Programa

3 LOCALIZACION

4 INFORME TÉCNICO
- 4.1 Estado General del Proyecto
- 4.2 Avance por Capítulos
- 4,2,1 Control Presupuestal
- 4,2,2 Avance Porcentual
- 4.3 Control y Análisis de Programación de Obra
- 4.4 Control de materiales de obra (Ensayos y certificaciones)
- 4.5 Ensayos de laboratorio
- 4.6 Descripcion de actividades
- 4.7 Control Diario de Personal
- 4.8 Control de Equipos
- 4.9 Registro Fotográfico
- 4.11 Actas de Comité
- 4.12 Libro de Obra

5 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
- 5.1 Control de Pólizas

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

1. INTRODUCCIÓN

El departamento nacional de planeación DNP incluyó en su plan estratégico 2014-2018 "todos por un nuevo país", el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación de instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación - territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional.

Por lo anterior, ENterritorio y el Municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena acordaron suscribir un contrato especifico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de designar recursos del Fondo Regional para los Pactos territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asi mismo el Municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena abrió el PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023, resultando a favor del CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE P-LP-MSSA-010-2023 – NIT. 901766780-2.

El presente informe mensual No 3, que está comprendido en el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024, tiene el objetivo de resumir y recopilar las principales actividades realizadas por el contratista, así como también las principales acciones y novedades que se van desarrollando a lo largo del proyecto.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

2.1		INFORME MENSUAL No. 1
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO		

PERÍODO:	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03**	

2.1 OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
2.2 ALCANCES DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA:**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
	OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
2.3 ACTORES	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE		RL. LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ	
	No. CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023			
	INTERVENTOR:	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC		RL. ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA	
	No. CONTRATO:	P-CMA-MSSA-003-2023			
2.4 COSTOS TOTALES (INC. AIU Y/O IVA):	**OBRA:**	INICIAL	$ 1,427,378,283.00		
		ADICIÓN	$ -		
		TOTAL	$ 1,427,378,283.00		
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	$ 152,953,080.00		
		ADICIÓN	$ -		
		TOTAL	$ 152,953,080.00		
	TOTAL INTERVENTORÍA Y OBRA:			**$ 1,580,331,363.00**	
2.5 ANTICIPO:	**PORCENTAJE:**				
	VALOR ANTICIPO OBRA:				
	VALOR ANTICIPO INTERVENTORÍA:				
2.6 PLAZOS DEL CONTRATO:	**OBRA:**	INICIAL	4	MESES	
		PRÓRROGAS	0	MESES	
		TOTAL	**4**	**MESES**	
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	4	MESES	
		PRÓRROGAS	0	MESES	
		TOTAL	**4**	**MESES**	
2.7 RESUMEN DE FECHAS Y PLAZOS:	**OBRA:**	FECHA DE INICIO		28-Nov-2024	
		PLAZO INICIAL		**4 MESES**	
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		28-Mar-2024	
		PLAZO ADICIONAL		0 MESES	
		TIEMPO SUSPENDIDO		0 MESES	
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN		**28-Mar-2024**	
	INTERVENTORÍA:	FECHA DE INICIO		28-Nov-2024	
		PLAZO INICIAL		**4 MESES**	
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		28-Mar-2024	
		PLAZO ADICIONAL		0 MESES	
		TIEMPO SUSPENDIDO		0 MESES	
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN		**28-Mar-2024**	

ESTADO ACTUAL: **En Ejecución**

PORCENTAJE DE EJECUCION: **60.56%**

OBSERVACIONES:

2.8 EVENTOS QUE MODIFICAN EL PROGRAMA:	**SUSPENSION N° 1:**	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A
	SUSPENSION N° 2:	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

3. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La vía objeto del contrato de obra No. P-LP-MSSA-010-2023, se encuentra localizada entre los municipios de Sabanas de San Angel y Algarrobo, en el departamento del Magdalena. El proyecto se ejecutara en un solo tramo el cual se relaciona a continuación:

MEJORAMIENTO (LONGITUD 640 MTS)

Tramo: k0+000 al k0+640

COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA





4. INFORME TÉCNICO

4.1		INFORME MENSUAL No. 1
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

1. RESUMEN BÁSICO:

FECHAS		PLAZOS			VALOR CONTRATO		
		ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA
CONTRATO DE OBRA	P-LP-MSSA-010-2023	INICIAL	4	4	INICIAL	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
ACTA DE INICIO	28 de November de 2023	PRORROGAS			ADICIÓN	$ -	$ -
TERMINACIÓN INICIAL	28 de March de 2024	TOTAL	4	4	CONTRATO	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
TERMINACIÓN FINAL	28 de March de 2024	SUSPENSIONES					

2. ESTADO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEFINIDAS EN EL PERÍODO	DISEÑOS CRÍTICOS PENDIENTES POR DEFINICIÓN

3. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS:

SERVICIO	OBSERVACIÓN
TELEFONO	No aplica
ACUEDUCTO	No aplica
ENERGIA	No aplica
GAS	No aplica

4. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN:

AVANCE PONDERADO DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

EJECUCIÓN	ESPERADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO DEL PERÍODO ANTERIOR	56.50%	52.79%	-3.71%
AVANCE DURANTE EL PERÍODO	27.33%	7.77%	-19.56%
ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	83.83%	60.56%	-23.27%


ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

DÍAS DE:	ADELANTO	ATRASO	FECHA PROYECTADA
ANTERIOR	0	0	28-Mar-2024
ACTUAL	0	0	28-Mar-2024

PLAZOS

MESES	TOTAL	TRANSCURRIDO		RESTANTE	
INICIAL	4	3.00	75.0%	1.00	25.0%
PROYECTADO	4				

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

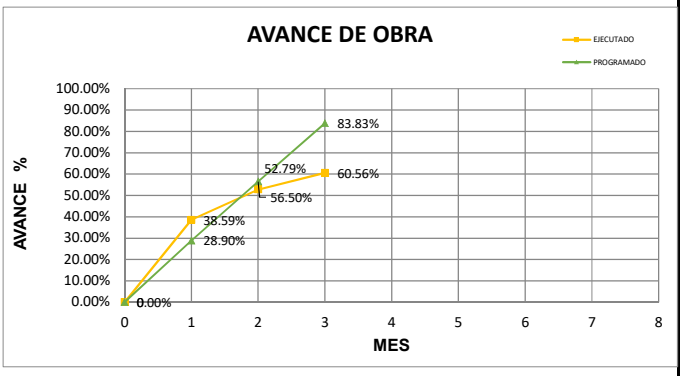

5. PRESUPUESTO DE OBRA:

CONCEPTO		PRESUPUESTO DE OBRA		AVANCE:	
		CONTRACTUAL	EJECUTADO	EJECUTADO	RESTANTE
Costos Directos		**$ 1,054,429,685.14**	**$ 664,892,335.22**		
Administración	26.00%	$ 274,151,718.14	$ 172,872,007.16		
Imprevistos	1.00%	$ 10,544,296.85	$ 6,648,923.35		
Utilidades	3.00%	$ 31,632,890.55	$ 19,946,770.06		
Total AIU	**30.00%**	**$ 316,328,905.54**	**$ 199,467,700.57**		
PMT		**$ 22,428,400.00**		**60.56%**	**39.44%**
PAGA		**$ 33,063,168.53**			
CARACTERIZACION VIAL		**$ 1,128,123.79**			
TOTAL		**$ 1,427,378,283.00**	**$ 864,360,035.79**		

6. OBSERVACIONES GENERALES:


DURANTE ESTE PERIODO SE EVIDENCIA UN ATRASO SIGNIFICATIVO DE 23,27% DONDE SE DEDUCE QUE NO SE PUDO MITIGAR EL ATRASO QUE SE PRESENTÓ DURANTE EL MES DE ENERO. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA CON EL FIN DE ADELANTAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA.

4.2		INFORME MENSUAL No. 3
CONTROL PRESUPUESTAL		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

CONTROL PRESUPUESTAL

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					Febrero			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO													
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4224,00	$ 2.293,20	$ 9.686.476,80	0,68%	0,00	$ -	0,00%	4224,00	$ 9.686.477,00	0,68%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO													
2,1	Subbase Clase C	m3	571,20	$ 372.808,80	$ 212.948.387,00	14,92%	0,00	$ -	0,00%	571,20	$ 212.948.387,00	14,92%	**0,00**
2,2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	m3	678,40	$ 1.406.165,80	$ 953.942.879,00	66,83%	63,60	$ 89.432.144,88	6,27%	381,60	$ 536.592.869,00	37,59%	296,80
2,3	Bordillo en concreto	m3	1280,00	$ 74.109,10	$ 94.859.648,00	6,65%	180,00	$ 13.339.638,00	0,93%	680,00	$ 50.394.188,00	3,53%	600,00
2,4	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	M3	9088,86	$ 10.927,80	$ 99.321.201,00	6,96%	744,63	$ 8.137.167,71	0,57%	5009,07	$ 54.738.115,00	3,83%	**4079,79**
		SUBTOTAL BASICO DE OBRA			**$ 1.370.758.592,00**								
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			**1**	**$ 33.063.168,53**	**$ 33.063.168,53**	2,32%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**	**$ 22.428.400,00**	**$ 22.428.400,00**	1,57%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
CARACTERIZACION VIAL		**gl**	**1,00**	**$ 1.128.123,79**	**$ 1.128.123,79**	0,08%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 1.427.378.284,00**	**100,00%**		**$ 110.908.950,59**	**7,77%**		**$ 864.360.036,00**	**60,56%**	

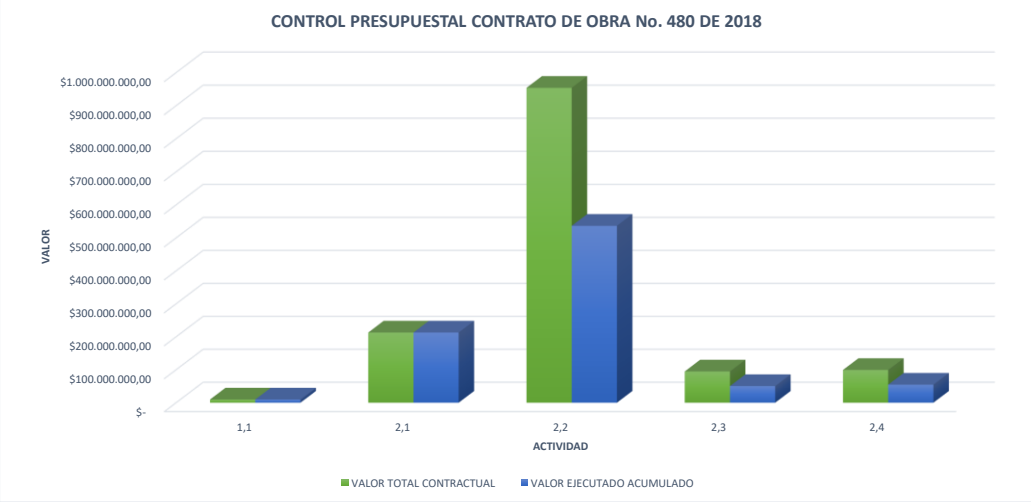


4.3		INFORME MENSUAL No. 1
AVANCE PORCENTUAL		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

AVANCE PORCENTUAL CONTRATO DE OBRA No. L-LP-MSSA-010-2023


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1,427,378,283.00**

VALOR EJECUTADO	$864,360,035.79	60.56%
SALDO POR EJECUTAR	$563,018,247.21	39.44%

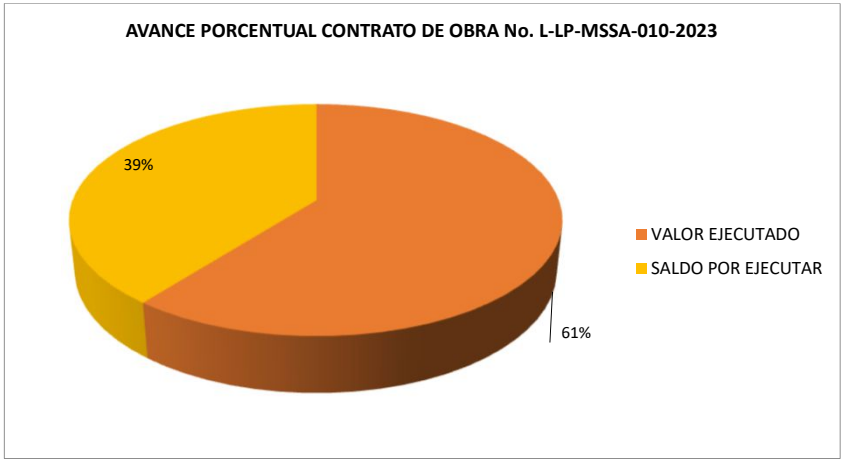

4.4		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		

FECHA DE CORTE:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

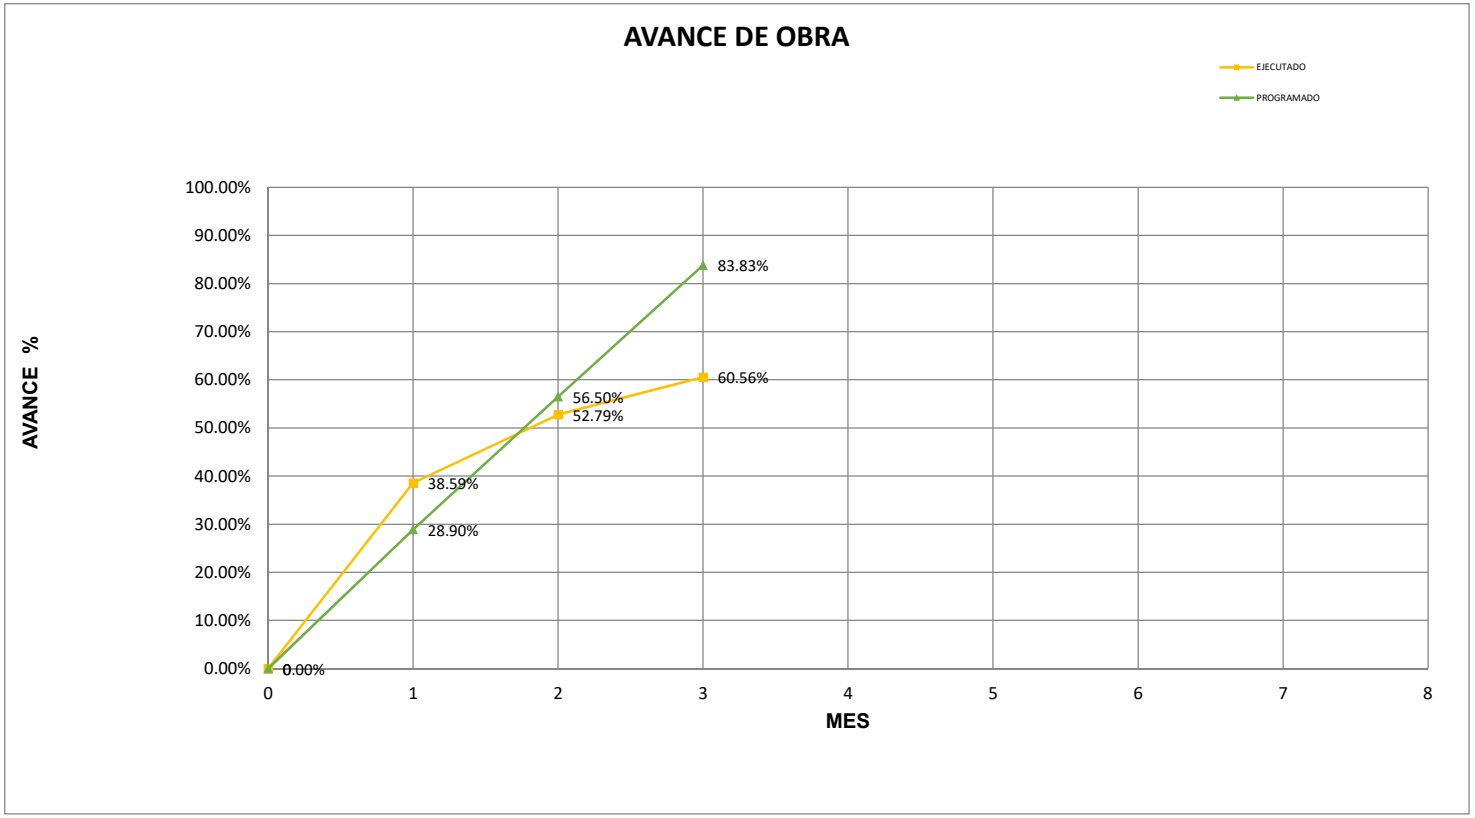

OBSERVACIONES:

DUANTE EL PERIODO SE EVIDENCIO UN ATRASO EN EL AVANCE DE OBRA DE 23,27% POR DEBAJO DEL PROGRAMADO. SE DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTIGENCIA.

4.5		INFORME MENSUAL No. 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		
PERÍODO: PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE** **INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.6		INFORME MENSUAL No. 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Ajuste de cotas del terreno por parte de la comisión de topografía hasta la abscisa k0+410.
- Encofrado y fundida de bordillos.
- Retiro de material proveniente de excavación desde la abscisa k0+410 hasta k0+640.
- Instalación de subbase clase c hasta la abscisa k0+410.
- Actividades de céreo y compactación del terreno, dándole su grado de humedad requerido.
- Instalación de pavimento y bordillo homogéneo hasta la abscisa k0+340.

CONTROL PERSONAL

4.7.1		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

PERSONAL	DEDICACIÓN	FEBRERO DE 2024																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Director de Obra	30%			1			1				1				1		1	1			1		1		1					
Residente de Obra	100%	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
Profesional SS - SGT	25%			1							1				1			1				1								
Maestros de Obra	100%	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3					
Ayudantes	100%	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		11	12	12	12	12	12					
Topografo	100%	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
Cadenero	100%	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					
Celador	100%	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
TOTAL		**20**	**20**	**22**	**0**	**20**	**21**	**20**	**20**	**20**	**22**	**0**	**20**	**20**	**22**	**20**	**21**	**22**	**0**	**19**	**21**	**21**	**21**	**20**	**21**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

OBSERVACIONES:

Se observa que durante el periodo se ha cumplido con el personal requerido en obra. No se laboro en la última semana, por lo tanto no se reporta personal en obra.

4.7.2 CONTROL DIARIO DE PERSONAL INTERVENTORÍA		INFORME MENSUAL No. 1
PERÍODO: PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE** **INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

PERSONAL	DEDICACIÓN	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Director de Interventoría	30%			1			1	1			1				1						1		1							
Ingeniero Residente	100%	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1					
Profesional SS - SGT	25%						1			1				1							1		1							
Topográfo Inspector	100%	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1					
Cadeneros	100%	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	1					
TOTAL		**3**	**3**	**4**	**0**	**3**	**5**	**3**	**3**	**4**	**4**	**0**	**2**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**0**	**3**	**5**	**3**	**5**	**4**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.8		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DE EQUIPOS		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

MAQUINARIA Y EQUIPOS	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
motoniveladora champions		1	1				1	1	1										1										
vibro 12 toneladas																													
pajarita Cat 420 D		1	1				1	1	1										1										
volqueta chevrolet x 6 m^3		1	1				1	1	1										1										
Cortadora de concreto																													
vibro concreto		1	1				1	1	1										1										
vibrocompacatadora (rana)		3			3					3			3		3		3		3	3		3		3					
Planta electrica		2			2					2			2		2		2		2	2		2		2					
Mezcladora		2			2					2			2		2		2		2	2		2		2					
martillo de demolicion																													
Equipo topografico	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
Herramienta menor	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
TOTAL	**2**	**13**	**6**	**0**	**9**	**2**	**2**	**6**	**6**	**9**	**0**	**2**		**2**	**9**	**2**	**9**	**0**	**13**	**9**	**2**	**9**	**2**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OBSERVACIONES:

Los equipos y herramientas deben ser llevados a mantenimiento periodicamente, para su correcto funcionamiento.
Se evidencia la falta de materiales petreos en obra.

4.9		INFORME MENSUAL No. 1
REGISTRO FOTOGRAFICO		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03**	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

MÁQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC
NIT: 901636135-4

Registro fotográfico





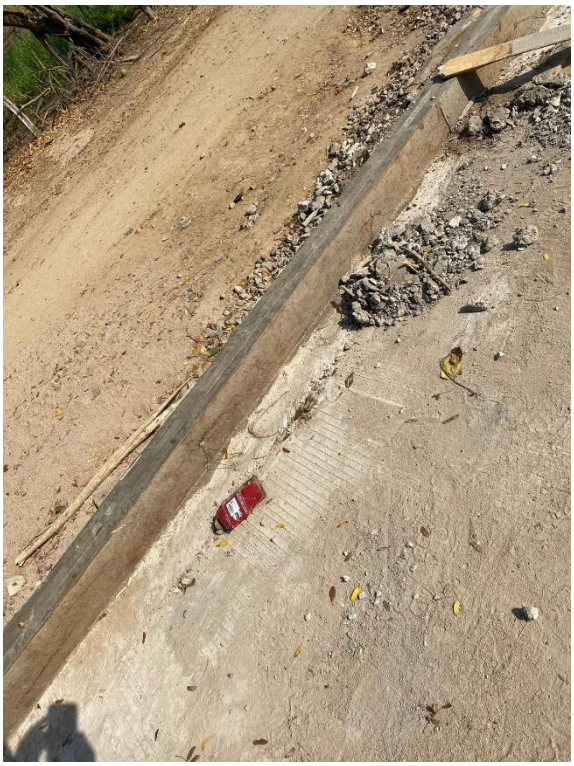



















4.10		INFORME MENSUAL No. 1
INFORMES SEMANALES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

INFORMES SEMANALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

4/03/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 14 Del: 26/02/2024 Al: 2/03/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 97 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	83,83%	0,00%	60,56%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 78.077.592,08	$ 1.196.628.309,77	$ 0,00	$ 864.420.288,18

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	78,36%	60,56%	-23,27%
Durante el periodo	5,47%	0,00%	
Acumulado actual	83,83%	60,56%	

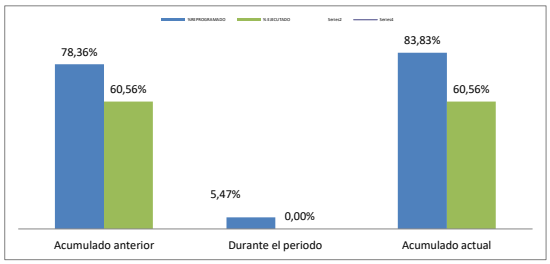

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESA SEMANA NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DEBIDO A LA FALA DE MATERIALES PÉTREOS, DADO A QUE LA CANTERA NO HA REALIZADO DESPACHOS, ASI MISMO LAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS FUERON LLEVADAS A MANTENIMIENTO DURANTE ESOS DÍAS. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA GESTIONAR EL INGRESO DE MATERIALES Y REACTIVAR LAS ACTIVIDADES LO ANTES POSIBLE. EL DIA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO SE RECIBIÓ VISITA POR PARE DE ENterritorio, DONDE SE PUDO VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

26/02/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 13 Del: 19/02/2024 Al: 24/02/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 90 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	78,36%	1,61%	60,56%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 78.077.592,08	$ 1.118.550.717,69	$ 22.980.790,36	$ 864.420.288,18

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	72,89%	58,95%	-17,80%
Durante el periodo	5,47%	1,61%	
Acumulado actual	78,36%	60,56%	

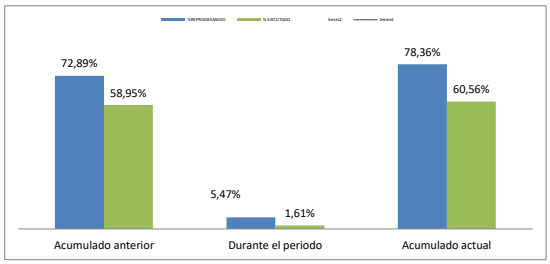

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

PREPARACIÓN DE TERRENO, COMPACTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA, CORTE Y FIGURADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

19/02/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 12 Del: 12/02/2024 Al: 17/02/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 83 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	72,89%	1,39%	58,95%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 78.077.592,08	$ 1.040.473.125,61	$ 19.840.558,13	$ 841.439.497,83

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	67,42%	57,56%	-13,94%
Durante el periodo	5,47%	1,39%	
Acumulado actual	72,89%	58,95%	

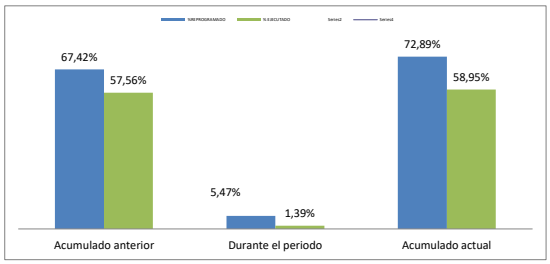

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

ENCOFRADO DE PLACAS, VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA, CORTE Y FIGURADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 4/02/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Semana Número: 11 Del: 5/02/2024 Al: 10/02/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,46%	67,42%	2,83%	57,56%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 77.934.854,25	$ 962.395.533,53	$ 40.394.805,41	$ 821.598.939,69

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	61,96%	54,73%	-9,86%
Durante el periodo	5,46%	2,83%	
Acumulado actual	67,42%	57,56%	

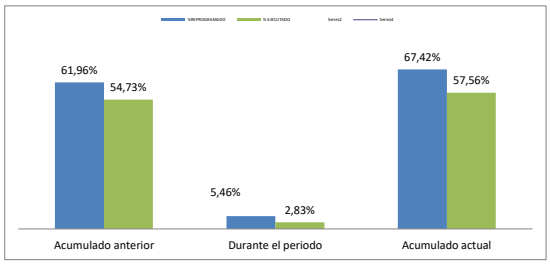

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA. RETIRO DE RIELES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES DESDE LA ABSCISA 0+410 HASTA 0+640, COMPACTACIÓN DE SUBBASE.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

5/02/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 10 Del: 29/01/2024 Al: 3/02/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 69 días

Nombre del Supervisor MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,46%	61,96%	1,94%	54,73%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 77.934.854,25	$ 884.460.679,28	$ 27.691.138,69	$ 781.204.134,29

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	56,50%	52,79%	-7,23%
Durante el periodo	5,46%	1,94%	
Acumulado actual	61,96%	54,73%	

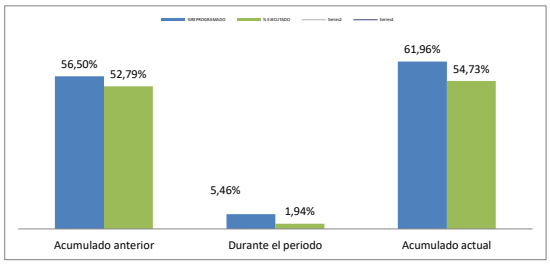

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

FIGURADO DE ACERO, DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE BORDILLO, VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS, COMPACTACIÓN DE TERRENO.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

4.11		INFORME MENSUAL No. 1
LIBRO DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03**	

BITACORA

1 Febrero 2024

* Nota 67

Deseo cofrado de bordillo, se amarró hierro longitudinal de 3/8" para bordillo y se encofró el mismo.

2 Febrero 2024

* Nota 68

Actividades de fundida de bordillo. preparación de terreno y nivelación.

3 Febrero 2024

* Nota 69

Ajuste de cota nivel y Actividades de enrriedado.

4 Febrero 2024

* Nota 70

Domingo.

Angie Al Faro

Angie Paola Alfaro molina
Interventoria

5 Febrero 2024

* Nota 71

Fundida de Placas

6 Febrero 2024

* Nota 72

Actividades de descapote y encofrado de placas.

7 Febrero 2024

* Nota 73

Actividades de retiro de material provenientes de excavación de la obra en las abscisas K0+440 hasta K0+640.

8 Febrero 2024

* Nota 74

Siguen las actividades de retiro de material de la calzada.

9 Febrero. 2024

* Nota 75:

Ingresa material de subbase a la obra se ingresa y se cierra.

10 Feb 2024

* Nota 76:

Se compacta el material de subbase clase E.

11 Feb 2024

* Nota 77:

Domingo

Angie ALFARO

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

12 Feb 2024

* Nota 78:

Actividades de encofrado de placas.

13 Feb 2024

* Nota 79:

Fundida de placas, se recibe material en obra (cemento, grava y arena.

14 Feb 2024

Nota 80:

Se desencofra y encofran nuevas placas

15 Feb 2024

* Nota 81

Actividades de fundida de placas.

16 Feb 2024

* Nota 82:

Amarrado de hierro en bordillo.

17 Feb 2024

Nota 83:

Actividades de encofrado de bordillo y fundida de mismo.

18 Feb 2024

* Nota 84

Domingo

Angie ALFARO
Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

19 Feb 2024

* Nota 85

Preparación de Terreno, encofrado de placas /

20 Feb 2024

* Nota 86:

Fundida de placas.

21 Feb 2024

* Nota 87:

Desencofrado de placas y encofrado de bordillo. /

22 Feb 2024

* Nota 88:

Fundida de bordillo y sembrado de pasto /

23 Feb 2024

* Nota 89:

Desencofrado de bordillo y encofrado de placas. /

24 Feb 2024

* Nota 90:

Fundida de placas llegando hasta Kot 340 completando ambos carriles y bordillos. /

25 Feb 2024

* Nota 91:

Domingo

Angie ALFARO
Angie Paola Alfaro molina
Interventoria

26 Feb 2024

nota 92

Se suspenden actividades principalmente debido a la espera del despacho de material (Cemento), se procede con el retiro de herramientas como vigas y tramo de la obra con el fin de darles un mantenimiento y así poder garantizar un buen funcionamiento en la siguiente jornada.

/ / /

27 Feb 2024

* nota 93

no se reportan actividades, se espera entrega de materiales.

/ / /

28 Feb 2024

nota 94:

no se reportan actividades, se espera entrega de materiales.

/ / /

29 Feb 2024

* nota 95:

no se reportan actividades, se espera entrega de materiales.

Angie ALFARO

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DE POLIZAS CONTRATISTA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

CONTROL PÓLIZAS CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-44-101125016 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

GARANTÍA	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-Nov-2023	31-10-2023	29-Jun-2024	$ 142,585,134.53				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10-Nov-2023	10/31/2023	6/29/2024	$ 356,462,836.58				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10-Nov-2023	31-10-2023	28-02-2027	$ 71.292.567,32				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10-Nov-2023	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.		$ 142,585,134.63				

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-40-101057341 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

GARANTÍA	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
Predios labores y operaciones.	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 232.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				
Vehículos propios y no propios	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				

5.2		INFORME MENSUAL No. 1
CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE febrero DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	

CONTROL PÓLIZAS MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 21-44-101431160
TIPO DE PÓLIZA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Sep-2024	$ 15,295,308.00				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Jul-2024	$ 38,238,270.00				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Mar-2027	$ 7,647,654.00				
CALIDAD DEL SERVICIO	27-Nov-2023	1-Mar-2024	1-Mar-2029	$ 15,295,308.00				

La interventoría ejerce como lo dice el objeto de su contrato "realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental", las cuales son sus funciones.

Esta interventoría realizó la verificación y aprobación de cada una de las actividades que llevará a cabo el constructor para el desarrollo de la obra.

El dia 28 de noviembre se firmó el acta de inicio de obra e interventoria.

El presente periodo tuvo un avance de 60,56% contra una ejecución programada del 83,83%, mostrando así un atraso con respecto a la programación del 23,27%.

Este atraso se debe que no se realizaron todas las actividades programadas, debido a la falta de materiales pétreos en obra, dado a que la cantera no ha realizado despachos.

Es necesario que el contratista implemente un plan de contingencia lo mas proo posible, para mitigar el atraso presentado. es importante tener en cuenta que el plazo del contrato está próximo a vencerse.

Durante la última semana se recibió visita por pare de ENterritorio, donde en compañía del secretario de planeación se pudo verificar las cantidades y avance de obra que se tiene hasta la fecha.

De acuerdo con la normatividad de la administración municipal de San Ángel y según lo estipulado en los documentos previos que hacen parte del Pliego de Condiciones, por parte del contratista se realizó la socialización del proyecto con la comunidad del sector antes del inicio de las obras y teniendo en cuenta la presencia de las veedurías ciudadanas. Por ende, se le solicitó al contratista respetar las fechas de ejecución informadas a la comunidad.

En lo que concierne a los aspectos administrativos, jurídicos y financieros cada solicitud de modificación o desarrollo de un proceso administrativo o contable de parte del contratista debe ser recibida, evaluada y aprobada o denegada por esta interventoría, para que se puedan ser llevar a cabo en la obra.

se anexan formato de control de lluvias.

Angie ALFaro

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

RL. MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Soleado	**SL**	Lluvias Leves	**LL**	Lluvias Medias	**LM**	Luvias fuertes	**LF**

DIA / HORA	AGOSTO																													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01
	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	
6:00 - 7:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
7:00 - 8:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
8:00 - 9:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
9:00 - 10:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
10:00 - 11:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
11:00 - 12:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
12:00 - 13:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
13:00 - 14:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
14:00 - 15:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
15:00 - 16:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
16:00 - 17:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
NOCTURNA																														
LL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SL	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

TOTAL SEMANAL					
LL	**0**	0	0	0	0
LM	**0**	0	0	0	0
LF	**0**	0	0	0	0
SL	**77**	77	77	77	11

OBSERVACIONES:

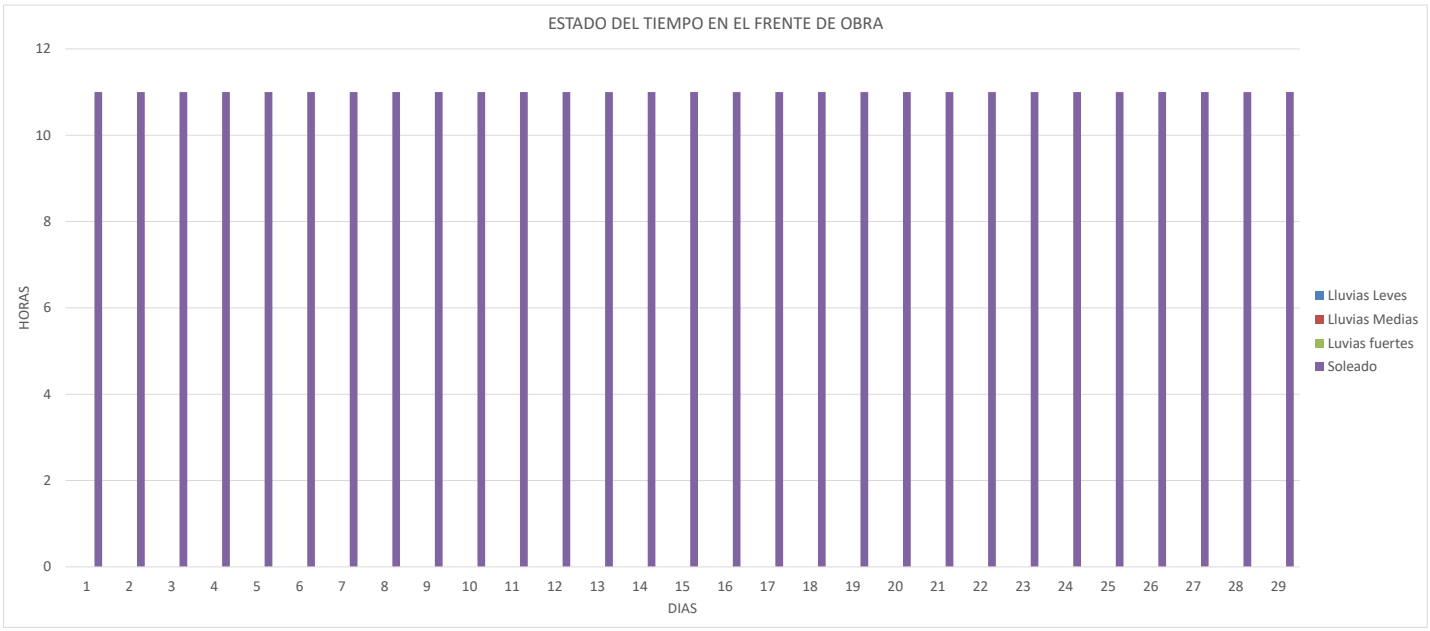

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 3

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-02-2024

No.	1	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	500.1	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Placas de Pavimento	K0+318 - K0+340	42.00	0.20	5.30			44.52
TOTAL							**44.52**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA









LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 3

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-02-2024

No.	2	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	672.1	Bordillo en concreto	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Bordillos con refuerzo transversal de fleje de 3/8"	K0+250 - K0+380	180.00					180.00
TOTAL							**180.00**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA





LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 3

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 29-02-2024

No.	3	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	640.1	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	UNIDAD	Kg

DESCRIPCION	CANTIDAD DE ELEMENTOS	FLEJES CADA (m)	LONG (m)	BARRA NUMERO	PESO (Kg/ml)	LONGITUD DE CORTE (m)	PESP TOTAL (Kg)
Flejes o Refuerzo Longitudinal BORDILLOS	33		180.00	3	0.557	6.000	110.29
Refuerzo Transversal o flejes BORDILLOS	600	0.3		3	0.557	0.500	167.10
DESCRIPCION	**LONG (m)**	**No de Juntas Transversales**	**No Dovelas x Junta**	**DIAMETRO DE DOVELA (Pulg)**	**LONG DE CORTE (m)**	**LONGITUD DE CORTE (m)**	**TOTAL**
Acero de refuerzo Placa de Pavimento (Dóvelas)	42.00	14.00	18.00	1"	0.35	4.00	352.80
Acero de refuerzo para Barra de anclaje o Acero de barras de Transferencia Pavimento	42.00			1/2"	0.850	1.000	35.70
	No DE CANASTILLA X JUNTA	**LONGITUD DE CORTE (m)**	**No de Juntas Transversales**	**DIAMETRO DE BARRA (Pulg)**	**PESO (Kg/ml)**		**TOTAL**
Acero para Canastilla para Dovelas	2.00	11.00	14.00	1/4"	0.256		78.85
TOTAL							**744.73**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA





LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

ALEJANDRO VIDAL DACONTE	
Laboratorista de suelos y concretos	
Laboratorista de suelos y materiales	

Empresa:	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
Localización:	SAB.SAN ANGELMAGD
Fecha de entrega Informes:	feb-24



1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO PAVIMENTO RIGIDO SAB.DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

RESULTADOS ENSAYOS A LA FLEXIÓN

Según Norma INV E - 414 - 13

CILINDRO Y/O VIGUETA	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIFICA		Carga Máxima (P)	Resistencia Rotura (MR)			
N°	INFORMES	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Días	MR (kgf/cm^2)	MR (lbf/in^2)	KN	(lbf/in^2)	Kgf/cm^2	%	Proyectada a 28 días (psi)
1	VIGA PAV. PK0+155/232 DER.	4	1	24	1	2	24	28	38	535.6	26.5	546.6	38.3	101.0%	
1	VIGA PAV. PK0+155/232 IZQ.	6	1	24	3	2	24	28	38	535.6	27.0	557.0	39.0	102.6%	
1	VIGA PAV. PK0+232+310 DER.	27	1	24	24	2	24	28	38	535.6	27.2	561.0	39.3	103.3%	
1	VIGA PAV. PK0+232+310 DER.	30	1	24	27	2	24	28	38	535.6	26.9	555.0	39.0	102.3%	

LABORATORISTA

Angie ALFaro

APROBÓ

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84 - 300 401 35 64
Email: vidaldiazhermanos@gmail.com
Aracataca - Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE
Laboratorista de Suelos y Concretos
Laboratorio de Suelos y Materiales

EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
LOCALIZACIONJ: SAB.SAN ANGEL -MAGD.
Fecha De Entrega Informe: FEBRERO/2024



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO **PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.**

ENSAYOS A LA COMPRESION

CILINDRO Y/O VIGUETA No.	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIF	Carga Máxima	Resistencia Rotura	
	BORDILLOS	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	DIAS	PSI	KN	PSI	Res. Prob. 28 días
1	BORDILLO PK0+155/232 IZQ.	4	1	2024	3	2	2024	28	3.000	386.6	3.073	
1	BORDILLO PK0+155/232 DER.	6	1	2024	3	2	2024	28	3.000	387.2	3.078	
1	BORDILLO PK0+232/310 DER.	27	1	2024	24	2	2024	28	3.000	387.2	3.078	
1	BORDILLO PK0+/232/310 IZQ.	30	1	2024	27	2	2024	28	3.000	386.5	3.072	

LABORATORISTA

APROBO

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84
E-mail.vidaldiazhermanos@gmail.com - Aracataca Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL ALGARROBO MAGD.

SECTOR: PK0+280/305 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: ENERO 29 /2024**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+280 EJE**	**No.2 PK0+305 DER.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**6210**	**6110**					
Peso frasco y arena restante	**3460**	**3460**					
Peso arena total usada	**2750**	**2750**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**1010**	**1010**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**673**	**673**					
Peso material extraído húmedo	**1510**	**1505**					
% humedad	**8.4**	**8.5**					
Peso material extraído seco Grs.	**1393**	**1387**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.07**	**2.06**					
Densidad máx.. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**97.2**	**97.0**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

SECTOR: PK0+235/260 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: ENERO 25 /2024**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+235 EJE**	**No.2 PK0+260 IZQ.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**6020**	**6010**					
Peso frasco y arena restante	**3250**	**3300**					
Peso arena total usada	**2770**	**2710**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**1030**	**970**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**687**	**647**					
Peso material extraído húmedo	**1550**	**1460**					
% humedad	**8.8**	**8.7**					
Peso material extraído seco Grs.	**1424**	**1343**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.07**	**2.07**					
Densidad máx.. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**97.3**	**97.4**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARRO MAGD.

SECTOR: PK0+175/230 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: ENERO 10 /2024**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+175 DER.**	**No.2 PK0+230 EJE.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**6030**	**6050**					
Peso frasco y arena restante	**3390**	**3430**					
Peso arena total usada	**2640**	**2620**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**900**	**880**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**600**	**587**					
Peso material extraído húmedo	**1361**	**1354**					
% humedad	**9.1**	**8.9**					
Peso material extraído seco Grs.	**1247**	**1243**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.08**	**2.12**					
Densidad máx.. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**97.6**	**99.4**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11		SANTA ANA, MAGDALENA		3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO		SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN		TELÉFONO 3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2023	29/06/2024	$142,585,134.63
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/10/2023	29/06/2024	$356,462,836.58
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/10/2023	28/02/2027	$71,292,567.32
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$142,585,134.63

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	CIUDAD: SANTA ANA, MAGDALENA	TELÉFONO:	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	CIUDAD: SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	TELÉFONO	3145491232

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262465(3900)000003836868(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926246-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101125016	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	28	02	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057341**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**29**	**02**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**

ACLARACIONES

Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0 , EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232


BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	NIT: 901.766.780-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	NIT: 819.003.224-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOD

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262481(3900)000000369659(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926248-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101431160**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2023**	**01**	**11**	**2023**	**00:00**	**01**	**03**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	**NIT: 901.636.135-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 3 - 08	SAN DIEGO, CESAR	3126146502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-003-2023, CUYO OBJETO ES; INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL NIT 819.003.224 - 8, EMPRESA NACIONL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, ENTERRITORIO NIT 899.999.316 - 1 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) NIT 899.999.011 - 0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	01/09/2024	$15,295,308.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2023	01/07/2024	$38,238,270.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	01/03/2027	$7,647,654.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2024	01/03/2029	$15,295,308.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****308,516.00	$ *******8,000.00	$ ******60,138.00	$ **********376,655.00	$ *******76,476,540.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101431160, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2023



21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General
