CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE



MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024		

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

2 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

- 2.1 Objeto del Contrato
- 2.2 Alcances del Frente
- 2.3 Actores
- 2.4 Costos Totales
- 2.5 Anticipo
- 2.6 Plazos
- 2.7 Resumen de fechas y plazos
- 2.8 Eventos que han Modificado el Programa

3 LOCALIZACION

4 INFORME TÉCNICO

- 4.1 Estado General del Proyecto
- 4.2 Avance por Capítulos
- 4,2,1 Control Presupuestal
- 4,2,2 Avance Porcentual
- 4.3 Control y Análisis de Programación de Obra
- 4.4 Control de materiales de obra (Ensayos y certificaciones)
- 4.5 Ensayos de laboratorio
- 4.6 Descripcion de actividades
- 4.7 Control Diario de Personal
- 4.8 Control de Equipos
- 4.9 Registro Fotográfico
- 4.11 Actas de Comité
- 4.12 Libro de Obra

5 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

- 5.1 Control de Pólizas

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

1. INTRODUCCIÓN

El departamento nacional de planeación DNP incluyó en su plan estratégico 2014-2018 "todos por un nuevo país", el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación de instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación - territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional.

Por lo anterior, ENterritorio y el Municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena acordaron suscribir un contrato especifico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de designar recursos del Fondo Regional para los Pactos territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asi mismo el Municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena abrió el PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023, resultando a favor del CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE P-LP-MSSA-010-2023 – NIT. 901766780-2.

El presente informe mensual No 4, está comprendido en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, tiene el objetivo de resumir y recopilar las principales actividades realizadas por el contratista, así como también las principales acciones y novedades que se van desarrollando a lo largo del proyecto.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

2.1		INFORME MENSUAL No. 4
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO		

PERÍODO:	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04**	

2.1 OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
2.2 ALCANCES DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA:**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
	OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
2.3 ACTORES	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE			RL. LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
	No. CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023			
	INTERVENTOR:	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC			RL. ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
	No. CONTRATO:	P-CMA-MSSA-003-2023			
2.4 COSTOS TOTALES (INC. AIU Y/O IVA):	**OBRA:**	INICIAL	$	1,427,378,283.00	
		ADICIÓN	$	-	
		TOTAL	$	1,427,378,283.00	
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	$	152,953,080.00	
		ADICIÓN	$	-	
		TOTAL	$	152,953,080.00	
	TOTAL INTERVENTORÍA Y OBRA:				**$ 1,580,331,363.00**
2.5 ANTICIPO:	**PORCENTAJE:**				
	VALOR ANTICIPO OBRA:				
	VALOR ANTICIPO INTERVENTORÍA:				
2.6 PLAZOS DEL CONTRATO:	**OBRA:**	INICIAL	4	MESES	
		PRÓRROGAS	45	dias	
		TOTAL	**5.5**	**MESES**	
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	4	MESES	
		PRÓRROGAS	45	dias	
		TOTAL	**5.5**	**MESES**	
2.7 RESUMEN DE FECHAS Y PLAZOS:	**OBRA:**	FECHA DE INICIO			28-Nov-2024
		PLAZO INICIAL			**4 MESES**
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			28-Mar-2024
		PLAZO ADICIONAL			45 DIAS
		TIEMPO SUSPENDIDO			0 MESES
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN			**12-May-2024**
	INTERVENTORÍA:	FECHA DE INICIO			28-Nov-2024
		PLAZO INICIAL			**4 MESES**
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			28-Mar-2024
		PLAZO ADICIONAL			45 DIAS
		TIEMPO SUSPENDIDO			0 MESES
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN			**12-May-2024**

ESTADO ACTUAL:	**En Ejecución**
PORCENTAJE DE EJECUCION:	**74.11%**
PORCENTAJE DURANTE EL PERIODO:	**13.55%**

2.8 EVENTOS QUE MODIFICAN EL PROGRAMA:	**PRORROGA N° 1:**	FECHA:	25-Mar-2024
		TIEMPO:	45 DIAS
		SUSPENSION:	N/A
		TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2024
		MOTIVACIÓN:	Prorrogar al plazo de ejecución del contrato de obra N° P-LP-MSSA-010-2023, cuarenta y cinco (45) días contados desde la finalización del plazo inicial.
	SUSPENSION N° 1:	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

3. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La vía objeto del contrato de obra No. P-LP-MSSA-010-2023, se encuentra localizada entre los municipios de Sabanas de San Angel y Algarrobo, en el departamento del Magdalena. El proyecto se ejecutara en un solo tramo el cual se relaciona a continuación:

MEJORAMIENTO (LONGITUD 640 MTS)

Tramo: k0+000 al k0+640

COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA





4. INFORME TÉCNICO

4.1		INFORME MENSUAL No. 4
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

1. RESUMEN BÁSICO:

FECHAS		PLAZOS			VALOR CONTRATO		
		ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA
CONTRATO DE OBRA	P-LP-MSSA-010-2023	INICIAL	4	4	INICIAL	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
ACTA DE INICIO	28 de November de 2023	PRORROGAS	45 DIAS	45 DIAS	ADICIÓN	$ -	$ -
TERMINACIÓN INICIAL	28 de March de 2024	TOTAL	5,5 MESES	5,5 MESES	CONTRATO	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
PRORROGA	25 de March de 2024						
TERMINACIÓN FINAL	12 de mayo de 2024	SUSPENSIONES					

2. ESTADO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEFINIDAS EN EL PERÍODO	DISEÑOS CRÍTICOS PENDIENTES POR DEFINICIÓN
SE REALIZA LA PRORROGA N° 001 - CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023 CON FECHA DEL 25/03/2024.	

3. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS:

SERVICIO	OBSERVACIÓN
TELEFONO	No aplica
ACUEDUCTO	No aplica
ENERGIA	No aplica
GAS	No aplica

4. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN:

AVANCE PONDERADO DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

EJECUCIÓN	ESPERADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO DEL PERÍODO ANTERIOR	60.56%	60.56%	0.00%
AVANCE DURANTE EL PERÍODO	17.74%	13.55%	-4.19%
ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	78.30%	74.11%	-4.19%


ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

DÍAS DE:	ADELANTO	ATRASO	FECHA PROYECTADA
ANTERIOR	0	0	28 de marzo de 2024
ACTUAL	0	0	12 de mayo de 2024

PLAZOS

MESES	TOTAL	TRANSCURRIDO		RESTANTE	
INICIAL	4.00	4.00	72.73%	1.50	27.3%
PROYECTADO	5.50				

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

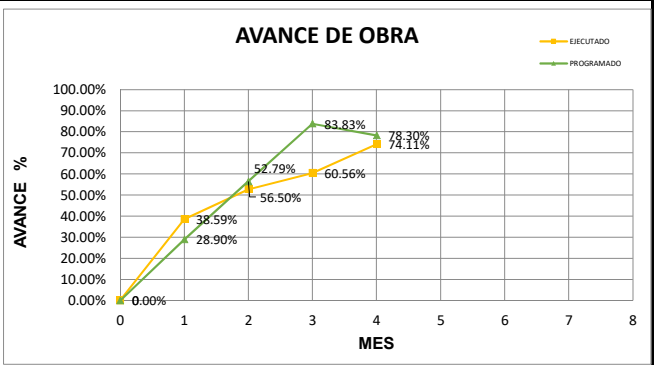

5. PRESUPUESTO DE OBRA:


CONCEPTO		PRESUPUESTO DE OBRA		AVANCE:	
		CONTRACTUAL	EJECUTADO	EJECUTADO	RESTANTE
Costos Directos		**$ 1,054,429,685.14**	**$ 813,704,614.61**		
Administración	26.00%	$ 274,151,718.14	$ 211,563,199.80		
Imprevistos	1.00%	$ 10,544,296.85	$ 8,137,046.15		
Utilidades	3.00%	$ 31,632,890.55	$ 24,411,138.44		
Total AIU	**30.00%**	**$ 316,328,905.54**	**$ 244,111,384.39**		
PMT		**$ 22,428,400.00**		**74.11%**	**25.89%**
PAGA		**$ 33,063,168.53**			
CARACTERIZACION VIAL		**$ 1,128,123.79**			
TOTAL		**$ 1,427,378,283.00**	**$ 1,057,815,999.00**		

6. OBSERVACIONES GENERALES:

DURANTE ESTE PERIODO SE EVIDENCIO UN ATRASO DONDE SE DEDUCE, QUE NO SE PUDO EJECUTAR EL 100% DE LA OBRA, POR LO QUE SE HIZO NECESARIO SOLICITAR UNA PRORROGA EN TIEMPO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL. ASI MISMO SE PRORROGO EL TIEMPO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 45 DIAS, QUEDANDO COMO FECHA DE FINALIZACION EL 12 DE MAYO DE 2024. SEGUN LA NUEVA REPORGRAMACION DE OBRA EL CONTRATO DE OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 4,19% DADO A QUE NO SE LABORO DURANTE QUINCE DIAS POR FALTA DE MATERIALES.

CONTROL PRESUPUESTAL

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					Marzo			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO													
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4224,00	$ 2.293,20	$ 9.686.476,80	0,68%	0,00	$ -	0,00%	4224,00	$ 9.686.477,00	0,68%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO													
2,1	Subbase Clase C	m3	571,20	$ 372.808,80	$ 212.948.387,00	14,92%	0,00	$ -	0,00%	571,20	$ 212.948.387,00	14,92%	**0,00**
2,2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	m3	678,40	$ 1.406.165,80	$ 953.942.879,00	66,83%	127,20	$ 178.864.289,76	12,53%	508,80	$ 715.457.159,00	50,12%	169,60
2,3	Bordillo en concreto	m3	1280,00	$ 74.109,10	$ 94.859.648,00	6,65%		$ -	0,00%	680,00	$ 50.394.188,00	3,53%	600,00
2,4	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	M3	9088,86	$ 10.927,80	$ 99.321.201,00	6,96%	1335,28	$ 14.591.672,78	1,02%	6344,35	$ 69.329.788,00	4,86%	**2744,51**
				SUBTOTAL BASICO DE OBRA	**$ 1.370.758.592,00**								
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			**1**	**$ 33.063.168,53**	**$ 33.063.168,53**	2,32%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**	**$ 22.428.400,00**	**$ 22.428.400,00**	1,57%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
CARACTERIZACION VIAL		gl	**1,00**	**$ 1.128.123,79**	**$ 1.128.123,79**	0,08%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 1.427.378.284,00**	**100,00%**		**$ 193.455.962,54**	**13,55%**		**$ 1.057.815.999,00**	**74,11%**	

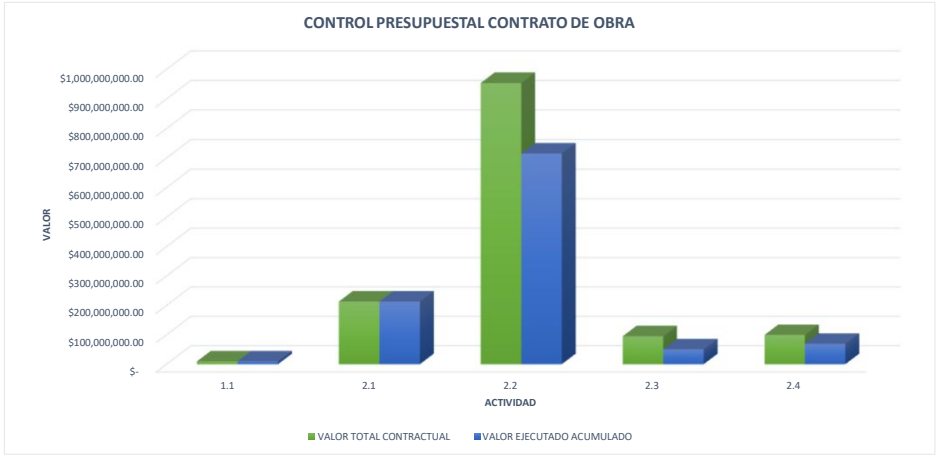


4.3		INFORME MENSUAL No. 4
AVANCE PORCENTUAL		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

AVANCE PORCENTUAL CONTRATO DE OBRA No. L-LP-MSSA-010-2023


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1,427,378,283.00**

VALOR EJECUTADO	$1,057,815,999.00	74.11%
SALDO POR EJECUTAR	$369,562,284.00	25.89%

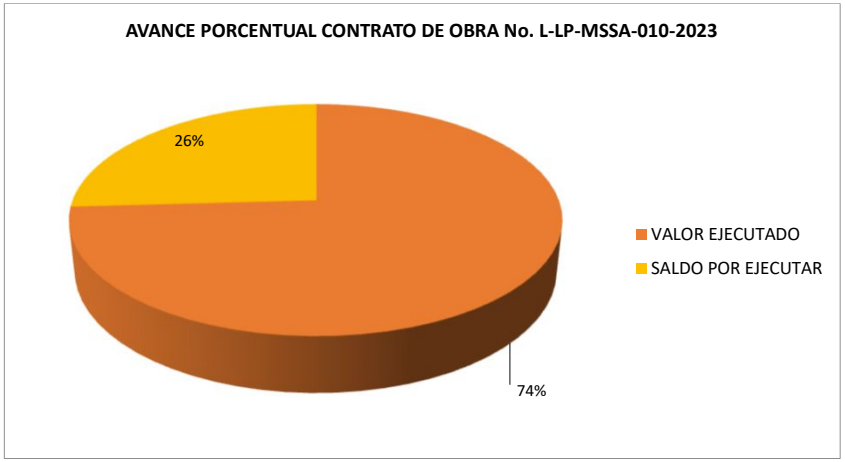

4.4		INFORME MENSUAL No. 4
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		

FECHA DE CORTE: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

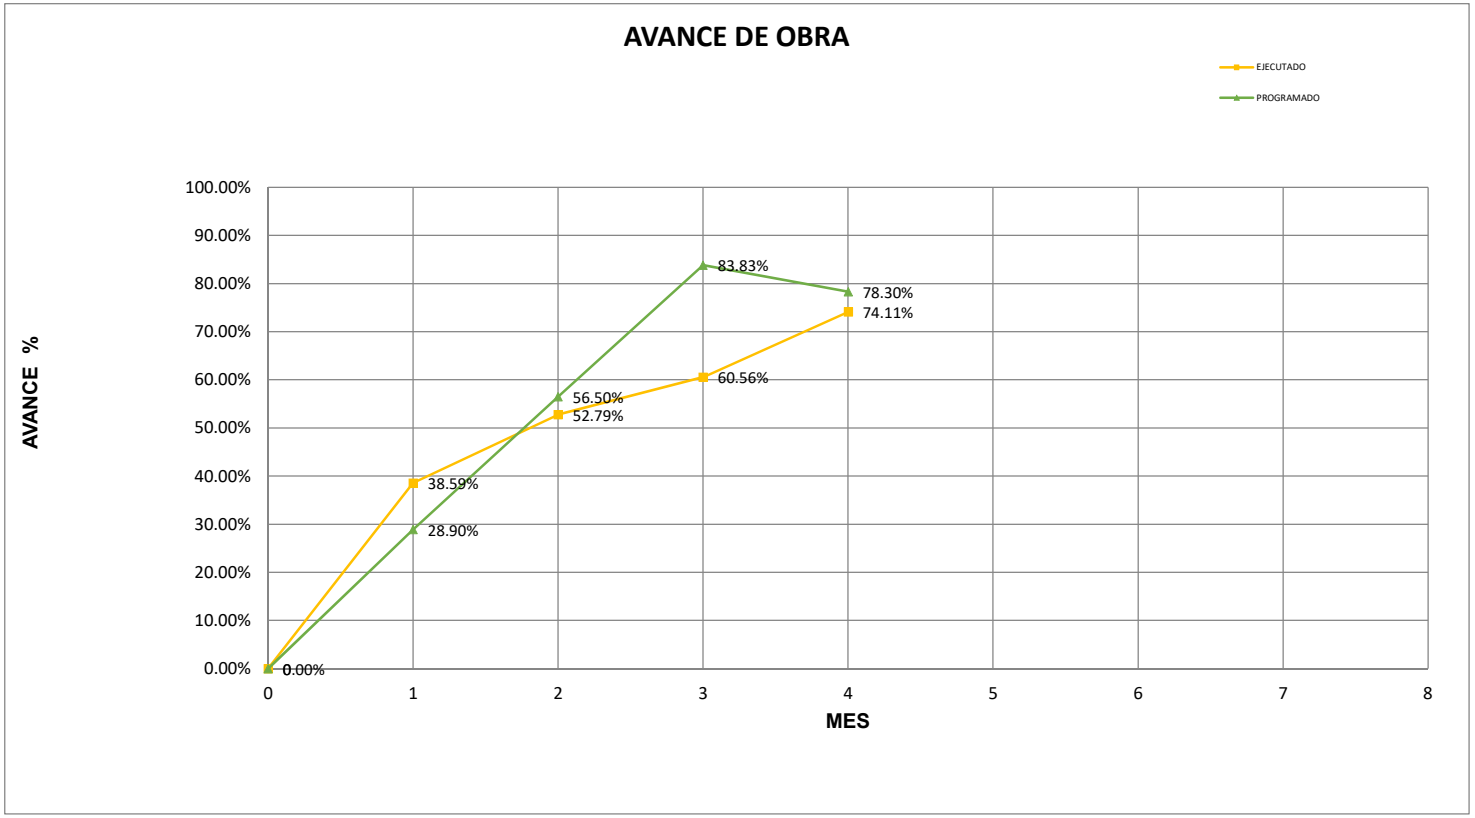

OBSERVACIONES:

DUANTE EL PERIODO SE EVIDENCIO UN ATRASO EN EL AVANCE DE OBRA DE 4,19% POR DEBAJO DE LA NUEVA REPROGRAMACION. SE DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTIGENCIA.

4.5		INFORME MENSUAL No. 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		
PERÍODO: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE** **INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.6		INFORME MENSUAL No. 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Ajuste de cotas del terreno por parte de la comisión de topografía
- Instalación de subbase clase c.
- Actividades de céreo y compactación del terreno, dándole su grado de humedad requerido.
- Corte y figurado de acero.
- Instalación de pavimento hasta la abscisa 0+500.
- Retiro de material
- Suministro de materiales.

CONTROL PERSONAL

4.7.1		INFORME MENSUAL No. 4
CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

PERSONAL	DEDICACIÓN	MARZO DE 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Director de Obra	30%											1	1		1	1	1			1	1		1			1	1	1				
Residente de Obra	100%											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
Profesional SS - SGT	25%														1					1				1			1					
Maestros de Obra	100%											3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3				
Ayudantes	100%											12	12	12	12	11	12		12	12	12	11	12	12		12	12	12				
Topografo	100%											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
Cadenero	100%											1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2				
Celador	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**20**	**21**	**20**	**22**	**20**	**21**	**1**	**20**	**22**	**21**	**19**	**21**	**21**	**1**	**21**	**22**	**21**	**1**	**1**	**1**	**1**

OBSERVACIONES:

DURANTE EL PERIODO EL PERSONAL ESTUVO EN OBRA LOS DÍAS QUE SE LABORÓ, TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE EL 1 HASTA EL 10 DE MARZO NO SE LABORO POR FALTA DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA CANTERA, ASI MISMO NO SE LABORARON LOS DÍAS 28 Y 29 POR SER DÍAS SANTOS (SEMANA SANTA).

4.7.2		INFORME MENSUAL No. 4
CONTROL DIARIO DE PERSONAL INTERVENTORÍA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

PERSONAL	DEDICACIÓN	MARZO DE 2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Director de Interventoría	30%												1	1	1				1				1			1		1				
Ingeniero Residente	100%											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
Profesional SS - SGT	25%												1		1				1				1				1					
Topográfo Inspector	100%											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
Cadeneros	100%											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**	**4**	**5**	**3**	**3**	**0**	**5**	**3**	**3**	**3**	**5**	**3**	**0**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.8		INFORME MENSUAL No. 4
CONTROL DE EQUIPOS		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

MAQUINARIA Y EQUIPOS	MARZO DE 2024																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
motoniveladora champions											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
vibro 12 toneladas											1		1		1																
pajarita Cat 420 D											1	1	1	1	1			1			1		1				1				
volqueta chevrolet x 6 m^3											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
Cortadora de concreto													1	1							1					1					
vibro concreto																2		2		2		2			2	2	2				
vibrocompacatadora (rana)																3		3		3		3			3	3	3				
Planta electrica																3		3		3		3			3	3	3				
Mezcladora																3		3		3		3			3	3	3				
martillo de demolicion																															
Equipo topografico														1					1												
Herramienta menor											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**4**	**6**	**6**	**5**	**14**		**15**	**4**	**10**	**5**	**14**	**4**	**0**	**14**	**15**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**

OBSERVACIONES:

Los equipos y herramientas fueron llevados a mantenimiento durante los dias que no se laboro por falta de material, por lo que se encuentran funcionando con total normalidad.
se evidencio en los dias comprendidos del 1 al 10, la fala de materiales.

4.9		INFORME MENSUAL No. 4
REGISTRO FOTOGRAFICO		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MÁQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC
NIT: 901636135-4

Registro fotográfico













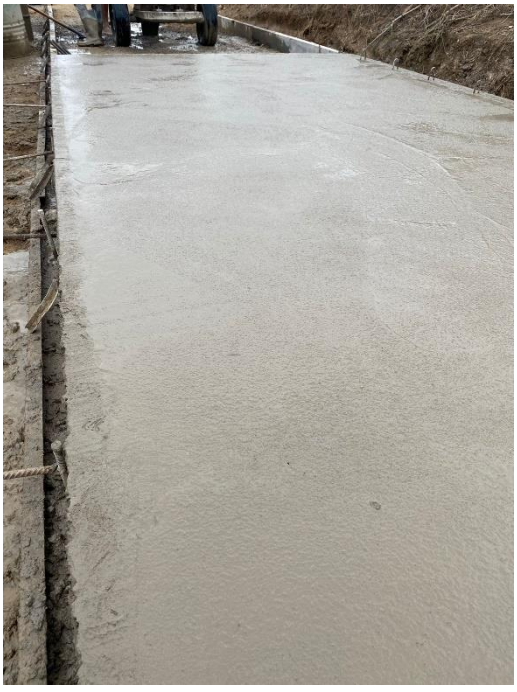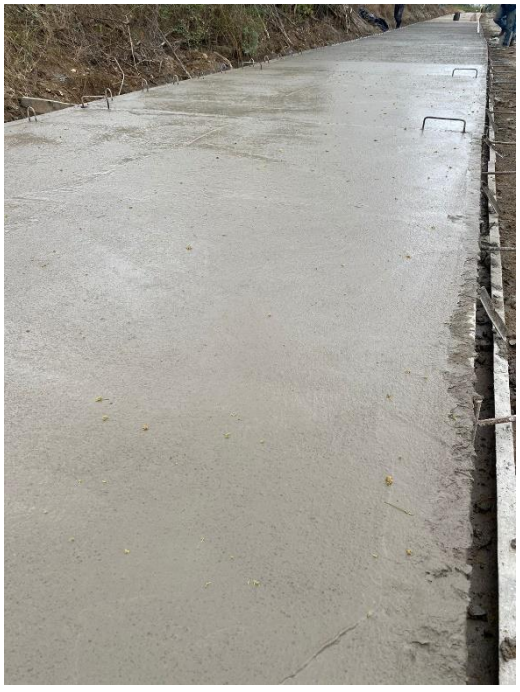












4.10		INFORME MENSUAL No. 4
INFORMES SEMANALES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04**	

INFORMES SEMANALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 1/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Prorroga:	**45 días**
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024
Fecha de Vencimiento actualizada:	**12/05/2024**
Semana Número:	18 Del: 25/03/2024 Al: 30/03/2024
Nombre del Supervisor	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
Representante Legal	ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 125 días

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	4,43%	78,30%	1,72%	74,11%
Valor de la Obra programada / ejecutada:	$ 63.232.857,94	$ 1.117.565.826,67	$ 24.550.906,47	$ 1.057.830.045,53

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	73,87%	72,39%	-4,19%
Durante el periodo	4,43%	1,72%	
Acumulado actual	78,30%	74,11%	

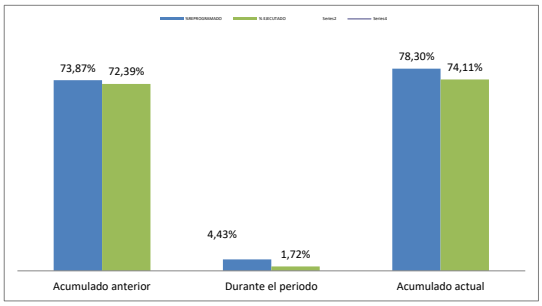

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE NIVELACION, VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA, CORTE Y FIGURADO DE ACERO. SE LABORO HASTA EL DIA MIERCOLES, RESPETANDO LAS CREENCIAS DE LOS TRABAJADORES EN LOS DIAS SANTOS.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR
Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 25/03/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Prorroga:	**45 días**
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024
Fecha de Vencimiento actualizada:	**12/05/2024**
Semana Número:	17 Del: 18/03/2024 Al: 23/03/2024
Nombre del Supervisor	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
Representante Legal	ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 118 días

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	4,44%	73,87%	5,06%	72,39%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 63.304.226,85	$ 1.054.332.968,74	$ 72.225.341,12	$ 1.033.279.139,06

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	69,43%	67,33%	-1,48%
Durante el periodo	4,44%	5,06%	
Acumulado actual	73,87%	72,39%	

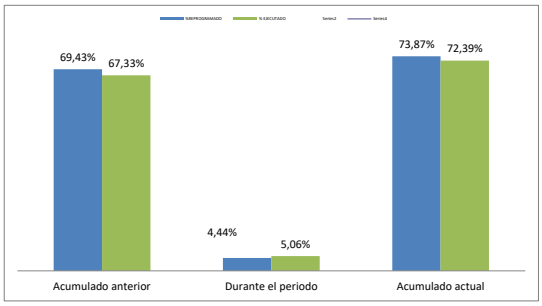

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE NIVELACION, VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA, CORTE Y FIGURADO DE ACERO.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR
Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 18/03/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Prorroga:	**45 días**
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024
Fecha de Vencimiento actualizada:	**12/05/2024**
Semana Número:	16 Del: 11/03/2024 Al: 16/03/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 111 días
Nombre del Supervisor	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
Representante Legal	ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,44%	69,43%		
Obra Física Ejecutada (%)			6,77%	67,33%
Valor de la Obra programada:	$ 63.304.226,85	$ 991.028.741,89		
Valor de la Obra Ejecutada:			$ 96.633.509,76	$ 961.053.797,94

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,00%	60,56%	-2,10%
Durante el periodo	4,44%	6,77%	
Acumulado actual	69,43%	67,33%	

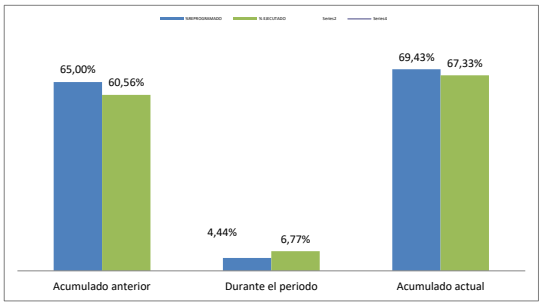

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CORTE Y CONFORMACION DEL TERRENO, EXTENSION Y COMPACTACION DE SUBBASE, NIVELACION, VACIADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA, CORTE Y FIGURADO DE ACERO. SE REALIZO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS ACIVIDADES FALTANTES.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

11/03/2024

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Prorroga:	**45 dias**		
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		
Fecha de Vencimiento actualizada:	**12/05/2024**		
Semana Número:	15 Del: 4/03/2024 Al: 9/03/2024	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	104 días
Nombre del Supervisor	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC		
Representante Legal	ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA		

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	4,44%	65,00%	0,00%	60,56%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 63.304.226,85	$ 927.724.515,04	$ 0,00	$ 864.420.288,18

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	60,56%	60,56%	-4,44%
Durante el periodo	4,44%	0,00%	
Acumulado actual	65,00%	60,56%	

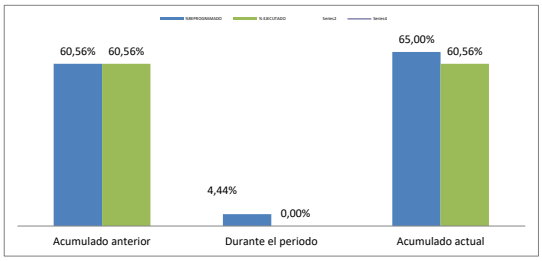

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALES PÉTREOS, DADO A QUE LA CANTERA NO HA REALIZADO DESPACHOS, EL DIA 07 DE MARZO EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITO A ESTA INTERVENTORIA UNA PRORROGA POR 45 DIAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA DE FINALIZACION ESTA PROXIMA Y QUE AUN FALTA EL 39,44% DE EJECUCION.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.086.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

4.11		INFORME MENSUAL No. 4
LIBRO DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04**	

BITACORA

			1	marzo	2024
1	*	NOTA 96:			
2					
3		No se reportan actividades			
4		esta de materiales.			
5					
6			2	marzo	2024
7		NOTA 97:			
8					
9		No se reportan actividades.			
10					
11			3	marzo	2024
12		NOTA 98:			
13					
14		Domingo, no contemplan actividades.			
15					
16			4	marzo	
17		NOTA 99:			
18					
19		no se reportan actividades.			
20					
21			5	marzo	2024
22		Nota 100:			
23		no se reportan actividades.			
24					
25			6	marzo	2024
26		NOTA 101:			
27		No se reportan actividades.			
28					
29			7	marzo	2024
30		NOTA 102:			
31		no se reportan actividades.			
32					
33			8	marzo	2024
34		NOTA: 103:			
35		NO SE REPORTAN ACTIVIDADES.			
36					
37		NOTA 104:	9	marzo	2024
38		No se reportan actividades			
39		NOTA 105:	10	marzo	2024
40		Domingo.			

Norma

Angie Alfaro

11 marzo 2024

Nota 106:

Se realizan Actividades de Cerco desde la obscisa K0+340 hasta K0+410, instalación de subbase y compactación.

12 marzo 2024

Nota 107:

Se realizan actividades de conformación, corte, instalación de subbase y cerco desde abscisa K0+410 hasta K0+500.

13 marzo 2024

Nota 108:

Se reportan Actividades de riego y compactación en abscisas K0+410 hasta K0+500.

14 marzo 2024

Nota 109:

Actividades de topografía nivelación de terreno desde K0+500 hasta K0+640, corte del terreno y instalación de subbase.

15 marzo 2024

Nota 110:

Actividades de cerco y compactación desde K0+500 hasta K0+640.

16 marzo 2024

Nota 111:

Actividades de fundida de placas.

17 marzo 2024

Nota 112:

Domingo - no Actividades

Anbil Alfaro

nota 113: 18 marzo 2024

Actividades de enmicelado y Fundida.

19 marzo 2024

NOTA 114:

Nivelación de niveles con comisión de topografía.

20 marzo 2024

nota 115:

Actividades de Fundida de placas.

21 marzo 2024

Nota 116:

Nivelación y enmicelados para Fundir.

22 marzo 2024

nota 117:

Actividades de Fundida de placas.

23 marzo 2024

nota 118:

encofrado y nivelación de niveles.

24 marzo 2024

nota 119:

Domingo - no Actividades.

Angie Alfaro

nota 120: 25 marzo 2024

Actividades de Fundida de placas.

26 marzo 2024

nota 121.

Actividades de Fundida de placas.

27 marzo 2024

nota 122:

enmicelado, nivelacion de vigas y Fundida.

28 marzo 2024

nota 123:

Festivo - no actividades

29 marzo 2024

nota 124:

Festivo - no actividades.

30 marzo 2024

nota 125:

no Actividades

31 marzo 2024

nota 126:

Domingo - no actividades.

Angie Arroyo

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1		INFORME MENSUAL No. 4
CONTROL DE POLIZAS CONTRATISTA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

CONTROL PÓLIZAS CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-44-101125016 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-Nov-2023	31-10-2023	29-Jun-2024	$ 142,585,134.53				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10-Nov-2023	10/31/2023	6/29/2024	$ 356,462,836.58				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10-Nov-2023	31-10-2023	28-02-2027	$ 71.292.567,32				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10-Nov-2023	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.		$ 142,585,134.63				

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-40-101057341 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
Predios labores y operaciones.	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 232.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				
Vehículos propios y no propios	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				

5.2		INFORME MENSUAL No. 4
CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04	

CONTROL PÓLIZAS MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 21-44-101431160
TIPO DE PÓLIZA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Sep-2024	$ 15,295,308.00				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Jul-2024	$ 38,238,270.00				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Mar-2027	$ 7,647,654.00				
CALIDAD DEL SERVICIO	27-Nov-2023	1-Mar-2024	1-Mar-2029	$ 15,295,308.00				

CONCLUSIONES

La interventoría ejerce como lo dice el objeto de su contrato "realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental", las cuales son sus funciones.

Esta interventoría realizó la verificación y aprobación de cada una de las actividades que llevará a cabo el constructor para el desarrollo de la obra.

El dia 28 de noviembre se firmó el acta de inicio de obra e interventoria.

El presente periodo tuvo un avance de 74,11% contra una ejecución programada del 78,30%, mostrando así un atraso con respecto a la nueva programación de 4,19%.

Este atraso se debe que no se realizaron todas las actividades programadas, debido a la falta de materiales pétreos en obra, dado a que la cantera no realizo los despachos en los tiempos acordados.

Dado a que la fecha de terminación inicial del contrato de obra era el 28 de marzo de 2024 y que el porcentaje de ejecución era de 60,56%, el contratista solicitó una prórroga, la cual fue analizada y concedida, por un plazo de 45 días, quedando como fecha final el 12 de mayo de 2024.

Se firmó la Prorroga N° 1 de fecha 25 de marzo de 2024 con el fin de adicionar 45 días al contrato de obra. Se solicitó al contratista actualizar las respectivas polizas, por las cuales se esta a la espera.

Se verifico el pago de seguridad social del personal en obra.

De acuerdo con la normatividad de la administración municipal de San Ángel y según lo estipulado en los documentos previos que hacen parte del Pliego de Condiciones, por parte del contratista se realizó la socialización del proyecto con la comunidad del sector antes del inicio de las obras y teniendo en cuenta la presencia de las veedurías ciudadanas. Por ende, se le solicitó al contratista respetar las fechas de ejecución informadas a la comunidad.

En lo que concierne a los aspectos administrativos, jurídicos y financieros cada solicitud de modificación o desarrollo de un proceso administrativo o contable de parte del contratista debe ser recibida, evaluada y aprobada o denegada por esta interventoría, para que se puedan ser llevar a cabo en la obra.

se anexan formato de control de lluvias.

Angie ALFaro

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

RL. MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO

Soleado	**SL**	Lluvias Leves	**LL**	Lluvias Medias	**LM**	Luvias fuertes	**LF**

DIA / HORA	MARZO																													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
6:00 - 7:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
7:00 - 8:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
8:00 - 9:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
9:00 - 10:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
10:00 - 11:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
11:00 - 12:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
12:00 - 13:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
13:00 - 14:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
14:00 - 15:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
15:00 - 16:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
16:00 - 17:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
NOCTURNA																														
LL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SL	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

TOTAL SEMANAL					
LL	**0**	0	0	0	0
LM	**0**	0	0	0	0
LF	**0**	0	0	0	0
SL	**33**	77	77	77	66

OBSERVACIONES: NO SE REGISTRARON LLUVIAS DURANTE EL PERIODO.

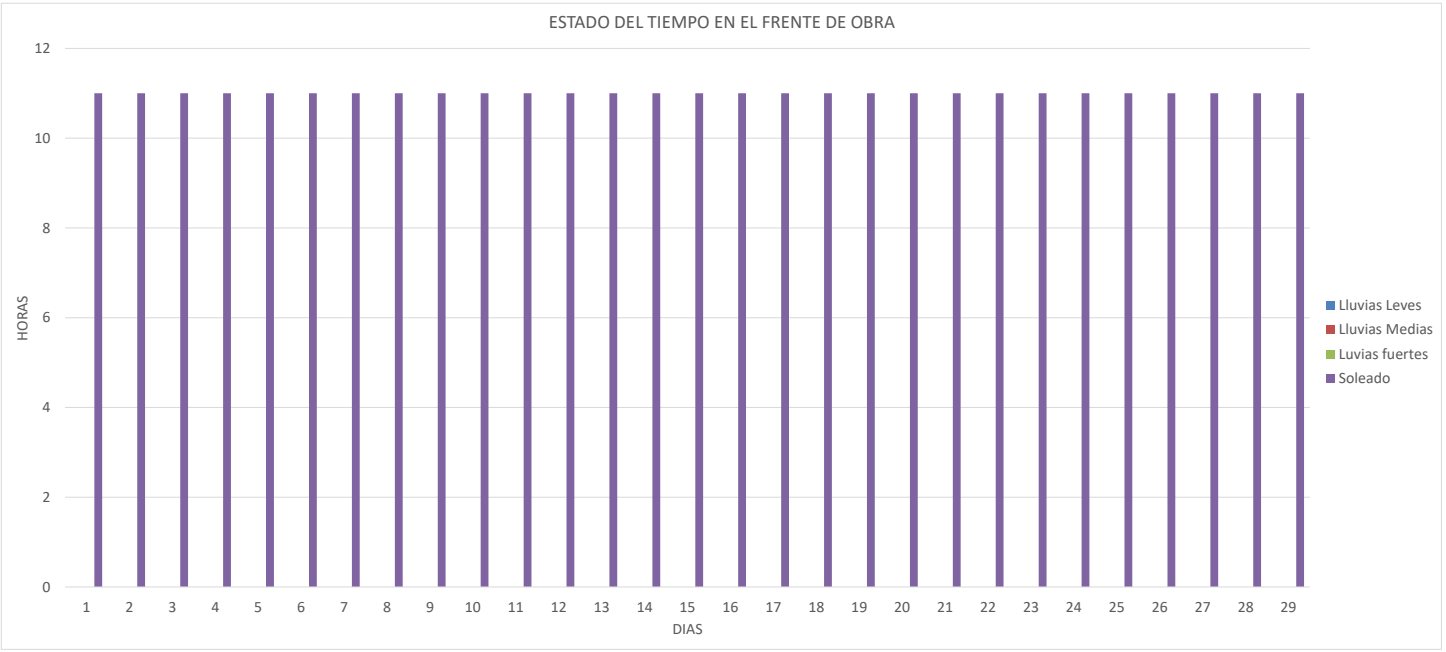

ALEJANDRO VIDAL DACONTE	
Laboratorista de suelos y concretos	
Laboratorista de suelos y materiales	

Empresa:	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
Localización:	SAB.SAN ANGELMAGD
Fecha de entrega Informes:	mar-24



1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO PAVIMENTO RIGIDO SAB.DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

RESULTADOS ENSAYOS A LA FLEXIÓN

Según Norma INV E - 414 - 13

CILINDRO Y/O VIGUETA	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIFICA		Carga Máxima (P)	Resistencia Rotura (MR)			
N°	INFORMES	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Días	MR (kgf/cm^2)	MR (lbf/in^2)	KN	(lbf/in^2)	Kgf/cm^2	%	Proyectada a 28 días (psi)
1	VIGA PAV. PK0+450 DER.	5	2	24	4	3	24	28	38	535.6	26.4	545.0	38.1	100.3%	
1	VIGA PAV. PK0+550 IZQ.	15	2	24	14	3	24	28	38	535.6	27.1	559.0	39.1	103.0%	
1	VIGA PAV. PK0+500 DER.	17	2	24	16	3	24	28	38	535.6	27.5	567.3	40.0	104.5%	
1	VIGA PAV. PK0+520 DER.	17	2	24	16	3	24	28	38	535.6	27.3	563.2	39.4	104.0%	

LABORATORISTA

Angie ALFaro

APROBÓ

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84 - 300 401 35 64
Email: vidaldiazhermanos@gmail.com
Aracataca - Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE	
Laboratorista de suelos y concretos	
Laboratorista de suelos y materiales	

Empresa:	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
Localización:	SAB.SAN ANGELMAGD
Fecha de entrega Informes:	mar-24



1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO PAVIMENTO RIGIDO SAB.DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

RESULTADOS ENSAYOS A LA FLEXIÓN

Según Norma INV E - 414 - 13

CILINDRO Y/O VIGUETA	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIFICA		Carga Máxima (P)	Resistencia Rotura (MR)			
N°	INFORMES	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Días	MR (kgf/cm^2)	MR (lbf/in^2)	KN	(lbf/in^2)	Kgf/cm^2	%	Proyectada a 28 días (psi)
1	VIGA PAV. PK0+450 DER.	5	2	24	19	2	24	14	38	535.6	24.8	511.6	35.8	94.2%	
1	VIGA PAV. PK0+550 IZQ.	15	2	24	29	2	24	14	38	535.6	23.5	485.0	34.0	89.3%	
1	VIGA PAV. PK0+500 DER.	17	2	24	2	3	24	14	38	535.6	23.9	493.0	34.5	91.0%	
1	VIGA PAV. PK0+520 DER.	17	2	24	2	3	24	14	38	535.6	23.5	485.0	34.0	89.3%	

LABORATORISTA

Angie ALFaro

APROBÓ

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84 - 300 401 35 64
Email: vidaldiazhermanos@gmail.com
Aracataca - Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE	
Laboratorista de suelos y concretos	
Laboratorista de suelos y materiales	

Empresa:	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
Localización:	SAB.SAN ANGELMAGD
Fecha de entrega Informes:	feb-24



1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO PAVIMENTO RIGIDO SAB.DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

RESULTADOS ENSAYOS A LA FLEXIÓN

Según Norma INV E - 414 - 13

CILINDRO Y/O VIGUETA	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIFICA		Carga Máxima (P)	Resistencia Rotura (MR)			
N°	INFORMES	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Días	MR (kgf/cm^2)	MR (lbf/in^2)	KN	(lbf/in^2)	Kgf/cm^2	%	Proyectada a 28 días (psi)
1	VIGA PAV. PK0+450 DER.	5	2	24	12	2	24	7	38	535.6	20.3,	419.0	29.3	77.1%	
1	VIGA PAV. PK0+550 IZQ.	15	2	24	22	2	24	7	38	535.6	21.2	437.2	30.6	80.5%	
1	VIGA PAV. PK0+500 DER.	17	2	24	24	2	24	7	38	535.6	22.1	456.0	31.9	84.0%	
1	VIGA PAV. PK0+520 DER.	17	2	24	24	2	24	7	38	535.6	21.9	452.0	31.6	83.2%	

LABORATORISTA

Angie ALFaro

APROBÓ

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84 - 300 401 35 64
Email: vidaldiazhermanos@gmail.com
Aracataca - Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL ALGARROBO MAGD.

SECTOR: PK0+450/550 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: FEBRERO 10/2024**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+460 IZQ.**	**No.2 PK0+510 DER.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**5990**	**5650**					
Peso frasco y arena restante	**3260**	**2950**					
Peso arena total usada	**2730**	**2700**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**990**	**960**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**660**	**640**					
Peso material extraído húmedo	**1475**	**1460**					
% humedad	**8.9**	**8.7**					
Peso material extraído seco Grs.	**1354**	**1343**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.05**	**2.10**					
Densidad máx.. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**96.3**	**98.5**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 3

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 30-03-2024

No.	1	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	500.1	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Placas de Pavimento	K0+380 - K0+500	120,00	0,20	5,30			127,20
TOTAL							**127,20**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA











LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

ING. LORENS VILLANUEVA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 3**		SABANAS DE SAN ANGEL SI AVANZA DESPACHO ALCALDESA MUNICIPAL
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		FECHA: 30-03-2024
No.	2	**PAVIMENTO RIGIDO**	
ITEM DE PAGO	640.1	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	UNIDAD Kg

DESCRIPCION	LONG (m)	No de Juntas Transversales	No Dovelas x Junta	DIAMETRO DE DOVELA (Pulg)	LONG DE CORTE (m)	LONGITUD DE CORTE (m)	TOTAL
Acero de refuerzo Placa de Pavimento (Dóvelas)	120,00	40,00	18,00	1"	0,35	4,00	1008,00
Acero de refuerzo para Barra de anclaje o Acero de barras de Transferencia Pavimento	120,00			1/2"	0,850	1,000	102,00
	No DE CANASTILLA X JUNTA	**LONGITUD DE CORTE (m)**	**No de Juntas Transversales**	**DIAMETRO DE BARRA (Pulg)**	**PESO (Kg/ml)**		**TOTAL**
Acero para Canastilla para Dovelas	2,00	11,00	40,00	1/4"	0,256		225,28
TOTAL							**1335,28**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA





LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
Interventor

Sabanas de San Ángel-Magdalena, marzo 08 de 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANAGEL, MAGDALENA
LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR
Sr. secretario de Planeación Municipal
E. S. D.

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. P-CMA-MSSA-003-2023. CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Asunto: : SOLICITUD DE PF.ORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° P-LP-MSSA-010-2023.

Cordial saludo,

Mediante oficio OF-02-2024 del 07 de marzo de 2024, el contratista CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE, remite a esta interventoria un documento que tiene como finalidad la solicitud de prorroga al contrato de obra N° P-LP-MSSA-010-2023, por un término de cuarenta y cinco (45) días. Una vez revisado este documento se concluye que el contratista tiene los soportes necesarios para realizar esta solicitud, teniendo en cuenta los retrasos en la entrega de los materiales, han impedido la normal ejecución de actividades como el vaciado de las placas en pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa y construcción de Bordillos.

De acuerdo a las revisiones realizadas, esta interventoria avala la prórroga hasta el 12 de mayo de 2024.

El contratista debe adelantar las gestiones administrativas necesarias para la generación y puesta en marcha de planes de choque que tengan como prioridad la implementación de nuevos frentes de obra, ejecutando todas las actividades que se puedan realizar de manera paralela, con el consecuente aumento de los rendimientos, recursos, materiales, maquinaria y mano de obra, que permitan materializar en obras los valores plasmados en el flujo de inversión semanal y mensual, tendientes a la finalización del proyecto en la fecha estipulada para esta prórroga.

Un aspecto importante a mencionar es que el tiempo solicitado arroja una fecha de finalización por encima de la del convenio suscrito por la entidad contrato especifico NO. 2230151 DERIVADO DEL PACO FUNCIONAL MAGDALENA CONTRATO DE MANDATO N° 221009 SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio, por lo que esta interventoría advierte sobre esta situación para que la entidad contratante tome las medidas a que haya lugar.

Por lo tanto, esta interventoría aprueba la **ADICION EN TIEMPO** por un término de **cuarenta y cinco (45) días**, y le solicita a la Administración Municipal se sirvan conceder esta prórroga.

Cordialmente,

Angie ALFaro

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
RL. MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
Interventor

Anexos:

Oficio OF-02-2024 solicitud de prorroga
Carta enviada por el proveedor MINTRANSMAQ S.A.S
Reprogramación de obra y flujo de fondos

Sabanas de San Ángel, Magdalena 07 de marzo de 2024 **OF-02-2024**

Señores
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
RL. ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
Interventor

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° P-LP-MSSA-010-2023. "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.

Cordial saludo…

Ante el próximo vencimiento del plazo del contrato de obra pública N° P-LP-MSSA-010-2023, cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía Sabanas de San Ángel - Algarrobo Municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena" en mi calidad de representante legal, me permito solicitar, sea estudiada la solicitud de conceder una prórroga al contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

i. Retrasos en el avance de las actividades contractuales por falta de materiales.

A pesar de que desde el **CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE** se realizó con anterioridad la programación de compra de material granular a la cantera **MINTRANSMAQ S.A.S** de Bosconia Cesar, se han venido presentando atrasos en cuanto al despacho, según lo manifestado por la cantera debido a inconvenientes con la maquinaria.

En razón a lo anterior, las actividades de vaciado de las placas en pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa, y construcción de Bordillos se han visto afectadas desde el 26 de febrero, dado a que no recibimos material en la fecha programada.

Ahora bien, mediante oficio de fecha 6 de marzo de 2024, la cantera indica que se espera que el material esté llegando a obra en el transcurso de la próxima semana, no obstante, teniendo en cuenta que a la fecha se tiene un avance del 60,56% y que la terminación del contrato está establecida para el 28 de marzo de

MINTRANSMAQ S.A.S

NIT:901563824-6

Bosconia, 6 de marzo de 2024

Se¶or(es):
CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

Apreciado cliente, lamentamos el malestar que hayamos podido generar con el retraso de su pedido.
Queremos informarle que, debido a inconvenientes presentados con la maquina trituradora hemos presentado retrasos con la producción de su pedido, Preveemos que en un plazo de 05 dias el material llegara a sus instalaciones.

Por lo tanto el operador minero de MINTRANSMAQ S.A.S tal como aparece al pie la firma, (RUCOM-2023051524390)) del contrato de concesi· n minera NÜ 0363-20 Licencia ambiental NÛ 1266 del 23 de Dic 2008, ofrece disculpas por los atrasos que se puedan generar en su obra y que pronto nos comunicaremos con ustedes para informar la reprogramaci· n de los despachos.

Cordialmente,

Antonio José Blanco Chacón
Operador minero
Mintransmaq S.A.S

2024, es evidente que en el plazo que queda de ejecución no se logrará culminar satisfactoriamente las actividades contractuales para el cumplimiento del objeto contractual.

En mérito de lo expuesto, y con el fin de garantizar el total cumplimiento de la ejecución del proyecto, resulta necesario y procedente prorrogar en un término de **cuarenta y cinco (45) días** el plazo vigente para la ejecución del Contrato de obra N° P-LP-MSSA-010-2023, a partir de la fecha de finalización del contrato citado para dar cumplimiento en tiempo a la totalidad de la ejecución.

Es importante precisar que una vez se normalice el despacho del material, por parte del CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE se activará un plan de contingencia para subsanar el atraso y terminar con normalidad las actividades faltantes. En marco de las actividades planteadas, se tiene lo siguiente:

- Ingreso de mayor número de cuadrillas.
- Crear una logística pertinente para el suministro de materiales y el acopio del material faltante para culminar las actividades de concreto.
- Elaborar un horario extensivo de trabajo
- Cabe resaltar que, con el fin de optimizar el rendimiento de los equipos, se realizó el mantenimiento de estos, por lo cual una vez se reinicien las actividades no se tendrán inconvenientes.

Por lo expuesto anteriormente solicitamos se sirvan conceder el termino por el cual se solicita la prórroga al contrato, en cuarenta y cinco (45) días, lo siguiente para cumplir con el objeto contractual.

Anexo oficio remitido por la empresa MINTRANSMAQ S.A.S.

Cordialmente,

LORENS PAOLA VILLANEUVA MARTINEZ
Rep. Legal CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

No de contrato de obra	LP 003 – 2023	**Fecha de terminacion**	Doce (12) de mayo de 2024
objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	**Contratista**	
Valor	$ 1.427.378.283,00	**Interventor**	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC
Plazo	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS	**Supervisor**	
Fecha de inicio	Veintiocho (28) de noviembre de 2023	**Fecha de Reprogramacion No 1**	

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

FLUJO DE CAJA SEGÚN PRESUPUESTO MODIFICATORIA No 1

PRESUPUESTO CONTRATO						DIAS				120,00			MES 4		MES 5		MES 6	
													8	9	10	11	12	
No	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Comienzo**	**Fin**	**DIAS PROGRAMADOS**	**DIAS TRANSCURRIDO A 2 DE MARZO 2024**	**VALORES EJECUTADOS DEL 28/11/2023 AL 2/3/2024**	**SALDO POR EJECUTA**	**DIAS FALTANTE**	**QUINCENA No 8 4/03 - 18/03**	**QUINCENA No 9 19/03 - 1/04**	**QUINCENA No 10 2/04 - 16/04**	**QUINCENA No 11 17/04 - 1/05**	**QUINCENA No 12 2/05 - 12/05**	
I - MANTENIMIENTO PERIODICO																		
1,1	CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE	M2	4.224,00	$ 2.293	$ 9.686.476,80	28/11/2023	4/12/2023	7,00	94,00	$ 9.686.476,80	$ -	71,00						
II - PAVIMENTO RIGIDOMOVIMIENTO DE TIERRAS																		
2,1	SUBBASE CLASE C	M3	571,20	$ 372.809	$ 212.948.386,56	28/12/2023	21/02/2024	56,00		$ 212.948.386,56	$ -							
2,2	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA	M3	678,40	$ 1.406.166	$ 953.942.878,72	18/12/2023	27/03/2024	101,00		$ 536.592.869,00	$ 417.350.009,72		$ 104.337.502,43	$ 104.337.502,43	$ 104.337.502,43	$ 104.337.502,43		
2,3	BORDILLO EN CONCRETO	M3	1280,00	$ 74.109	$ 94.859.648,00	28/02/2024	27/03/2024	29,00		$ 50.394.188,00	$ 44.465.460,00		$ 11.116.365,00	$ 11.116.365,00	$ 11.116.365,00	$ 11.116.365,00		
2,4	ACERO DE REFUERZO Fy=4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI).	M2	9088,86	$ 10.928	$ 99.321.200,60	18/12/2023	27/03/2024	101,00		$ 54.738.115,00	$ 44.583.085,60		$ 11.145.771,40	$ 11.145.771,40	$ 11.145.771,40	$ 11.145.771,40		
	PMT	UN	1,00	$ 22.428.400,00	$ 22.428.400,00	27/02/2024	27/03/2024	30,00			$ 22.428.400,00					$ 11.214.200,00	$ 11.214.200,00	
	PAGA	UN	1,00	$ 33.063.168,53	$ 33.063.168,53	27/02/2024	27/03/2024	30,00			$ 33.063.168,53					$ 16.531.584,27	$ 16.531.584,27	
	CARACTERIZACION VIAL	UN	1,00	$ 1.128.123,79	$ 1.128.123,79	27/02/2024	27/03/2024	30,00			$ 1.128.123,79						$ 1.128.123,79	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 1.427.378.283**					$ 864.360.035,36	$ 563.018.247,64		$ 126.599.638,83	$ 126.599.638,83	$ 126.599.638,83	$ 154.345.423,09	$ 28.873.908,06	
										$ 864.360.035,36	$ 1.427.378.283,00		$ 990.959.674,19	$ 1.117.559.313,02	$ 1.244.158.951,85	$ 1.398.504.374,94	$ 1.427.378.283,00	
% programado mensual										60,56%	39,44%	0,00%	8,87%	8,87%	8,87%	10,81%	2,02%	
% programado acumulado										60,56%	39,44%	39,44%	69,43%	78,29%	87,16%	97,98%	100,00%	

Angie ALFaro

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
R/L MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
R/L CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE

Nombre: LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR
SUPERVISOR MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-CMA-MSSA-03-2023,

FECHA DE INICIO :	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	28 DE MARZO DE 2024

En la Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre 2023, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.000.324 expedida en Barranquilla, actuando en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publica del Municipio de Sabanas de San Ángel, Delegado como Supervisor por parte del **MUNICIPIO, el contratista, , LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.228.495 expedida en Santa Ana, obrando en su reconocida condición de Representante Legal de **CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE . Y ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.065.836.606 Ex. en Valledupar, Representante Legal de **MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC,,** con el objeto de dar inicio al contrato en cuestión.

En común acuerdo las partes deciden dar por iniciado el contrato de la referencia.

Para constancia de anterior, se firma la presente acta en el municipio de sabanas de san Ángel magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre del 2023, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

CARLOS CONTRERAS GAMARRA
C.C. No72.000.324 Ex en Barranquilla
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Sabanas de San Ángel

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
C.C. 1.065.836.606 No. expedida Valledupar
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101431160**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2023**	**01**	**11**	**2023**	**00:00**	**01**	**03**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	**NIT: 901.636.135-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 3 - 08	SAN DIEGO, CESAR	3126146502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-003-2023, CUYO OBJETO ES; INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL NIT 819.003.224 - 8, EMPRESA NACIONL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, ENTERRITORIO NIT 899.999.316 - 1 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) NIT 899.999.011 - 0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	01/09/2024	$15,295,308.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2023	01/07/2024	$38,238,270.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	01/03/2027	$7,647,654.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2024	01/03/2029	$15,295,308.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****308,516.00	$ *******8,000.00	$ ******60,138.00	$ **********376,655.00	$ *******76,476,540.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101431160, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2023



21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023,

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE**
TIPO PERSONA:	JURÍDICA
NIT:	901766780-2
DIRECCIÓN:	Calle 3 # 7B – 11 de la Ciudad de Santa Marta,
REPRESENTANTE LEGAL:	LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
C. C. No.	1.085.228.495 expedida en Santa Ana
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
NIT.	819.003.224-8
ALCALDESA	EVYS DEL AMPARO MEZA SAGBINI.
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 57.402.371 expedida en Fundación.
ORDENADOR DEL GASTO:	ALCALDESA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL.
DIRECCIÓN:	Carrera 3 No.36 – 10 Barrio El Centro – Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel.
1. OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
2. VALOR:	MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($1.425.851.346,32) M/CTE
3. PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
4. SUPERVISOR:	CARLOS CONTRERAS GAMARRA
5. CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
6. IDENTIFICACIÓN:	C.C. NO. 72.000.324 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO :	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	28 DE MARZO DE 2024

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023,

En la Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre 2023, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS CONTRERAS GAMARRA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.000.324 expedida en Barranquilla, actuando en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publica del Municipio de Sabanas de San Ángel, Delegado como Supervisor por parte del **MUNICIPIO, el contratista, , LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.228.495 expedida en Santa Ana, obrando en su reconocida condición de Representante Legal de **CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE . Y ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.065.836.606 Ex. en Valledupar, Representante Legal de **MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC**,, con el objeto de dar inicio al contrato en cuestión.

En común acuerdo las partes deciden dar por iniciado el contrato de la referencia.

Para constancia de anterior, se firma la presente acta en el municipio de sabanas de san Ángel magdalena, a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre del 2023, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

CARLOS CONTRERAS GAMARRA
C.C. No72.000.324 Ex en Barranquilla
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Sabanas de San Ángel

LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
C.C. No. 085.228.495 expedida en Santa Ana
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S

Angie ALFaro
ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
1.065.836.606 Ex. en Valledupar
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11		SANTA ANA, MAGDALENA		3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO		SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN		TELÉFONO 3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2023	29/06/2024	$142,585,134.63
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/10/2023	29/06/2024	$356,462,836.58
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/10/2023	28/02/2027	$71,292,567.32
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$142,585,134.63

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	CIUDAD: SANTA ANA, MAGDALENA	TELÉFONO:	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	CIUDAD: SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	TELÉFONO	3145491232

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262465(3900)000003836868(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926246-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101125016	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	28	02	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057341**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**29**	**02**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**

ACLARACIONES

Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0 , EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232


BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	NIT: 901.766.780-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	NIT: 819.003.224-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOD

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262481(3900)000000369659(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926248-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
