ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. Excavación a maquina ZONA SALON COMUNAL POR REPOSICION DE MATERIAL	50,50	28,30	0,30				428,75
2. Excavación a maquina de la L para zapata de muro de contencion zona salon comunal	63,50	1,40	0,55				48,90
TOTAL PRESENTE ACTA:							477,64

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

PLANO DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

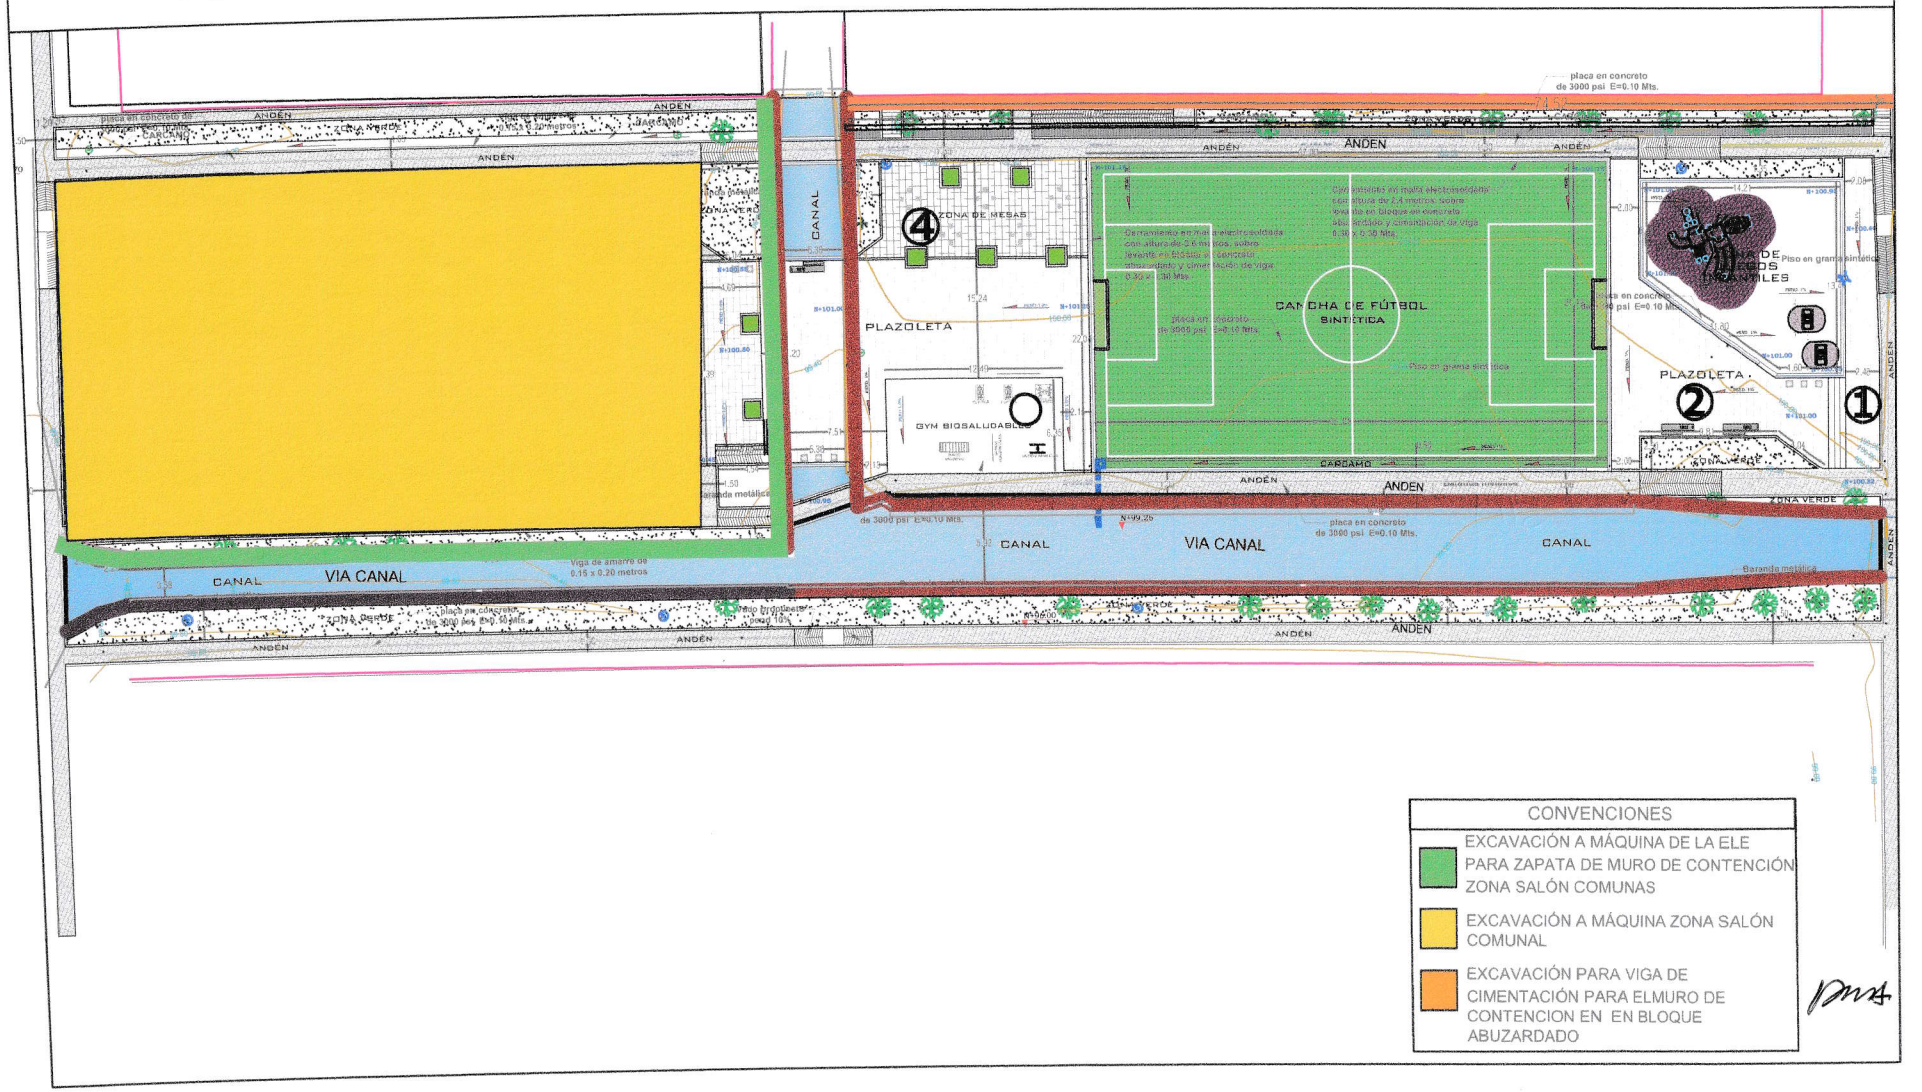

CONVENCIONES
EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE LA ELE PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN ZONA SALÓN COMUNAS
EXCAVACIÓN A MÁQUINA ZONA SALÓN COMUNAL
EXCAVACIÓN PARA VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ELMURO DE CONTENCION EN EN BLOQUE ABUZARDADO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)

PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

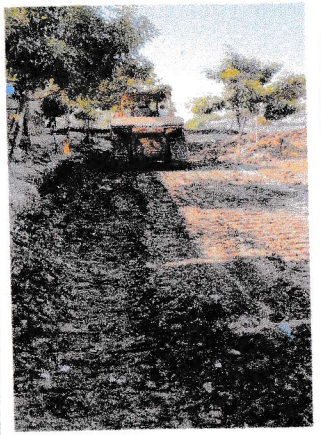



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG	ANCHO	ALTURA		ML	M2	M3
1. Excavacion a maquina para muro de contencion tipo 3 de la pista de patinaje lado 2	Ver cartera topográfica						\ 658,38
2. Excavacion para reposicion de material via peatonal	Ver cartera topográfica						\ 277,20
3. Excavacion para colocar filtro en piedra ciclopea en la via peatonal	\ 10,60	\ 5,30	\ 0,60				\ 33,71
4. Excavacion paralela al muro lateral del colegio para pilotes y zapatas tipo3, 2 y 1(por cartera topográfica)	Ver cartera topográfica						\ 139,47
Cantidad contractual según modificartoria No.3	**17.380,00**						
Acumulado anterior	**15.785,09**						
Acumulado a presente acta	**17371,49**						
Obra por ejecutar	**8,51**						
				TOTAL PRESENTE ACTA:			1.108,76

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

PLANO DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETAS

