ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP-10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA

PARQUE JORGE ROBLEDO


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

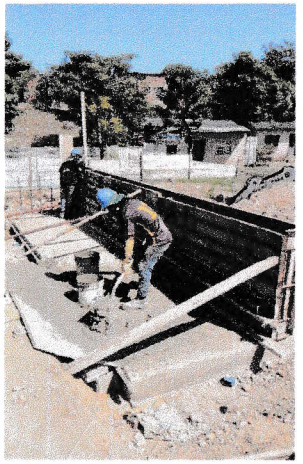



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES M	M2	M3
1. CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 1) TIPO 3	8,00	1,90	0,30				4,56
2. CONCRETO PARA INICO DE MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 1) TIPO 3	8,00	0,20	1,00				1,60
3. CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 3) TIPO 3	14,00	1,90	0,30				7,98
4. CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 3) TIPO 2	4,00	1,60	0,25				1,60
5. CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 3) TIPO 1	5,00	1,10	0,25				1,38

PLANO CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS,NO INCLUYE ACERO

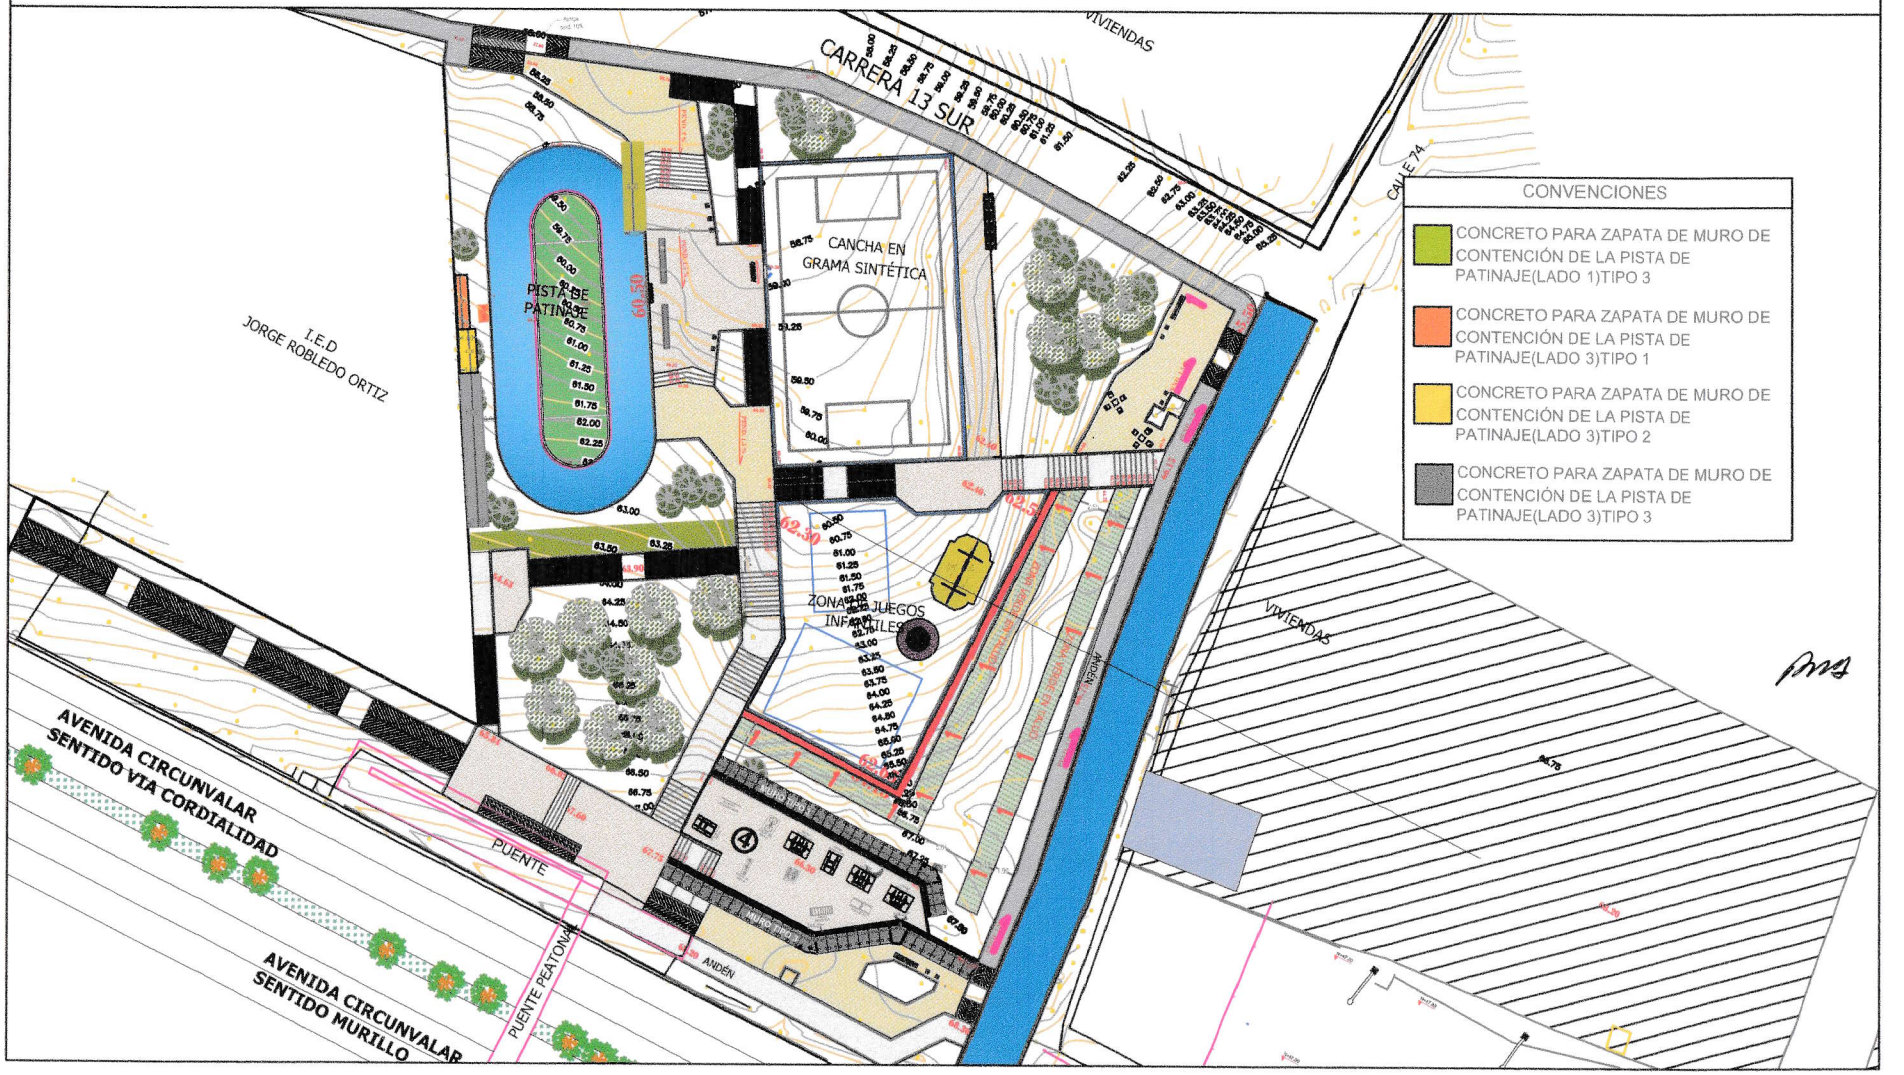

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



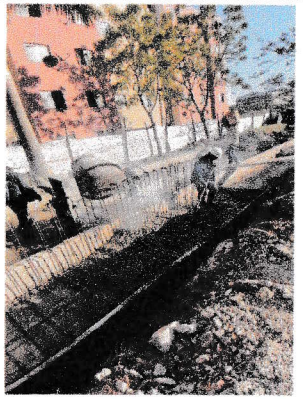

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. Concreto de 4.000 psi para zapatas de la ele del muro de contencion zona salon comunal	78,80	1,20	0,20				18,91
2. Concreto de 4.000 psi para muro de contencion zona salon comunal	61,80	0,20	1,40				17,30
3. Concreto de 4.000 psi para muro de contencion de la cancha de futbol BASE DE PUENTE ENTRE CANCHA Y ZONA DE SALON COMUNAL	17,00	0,25	1,40				5,95


Cantidad contractual según modificatoria No.3	148,00
Acumulado anterior	87,5824
Acumulado a presente acta	146,86
Obra por ejecutar	1,14

TOTAL PRESENTE ACTA:	42,17

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

PLANO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA MUROS Y PLACA

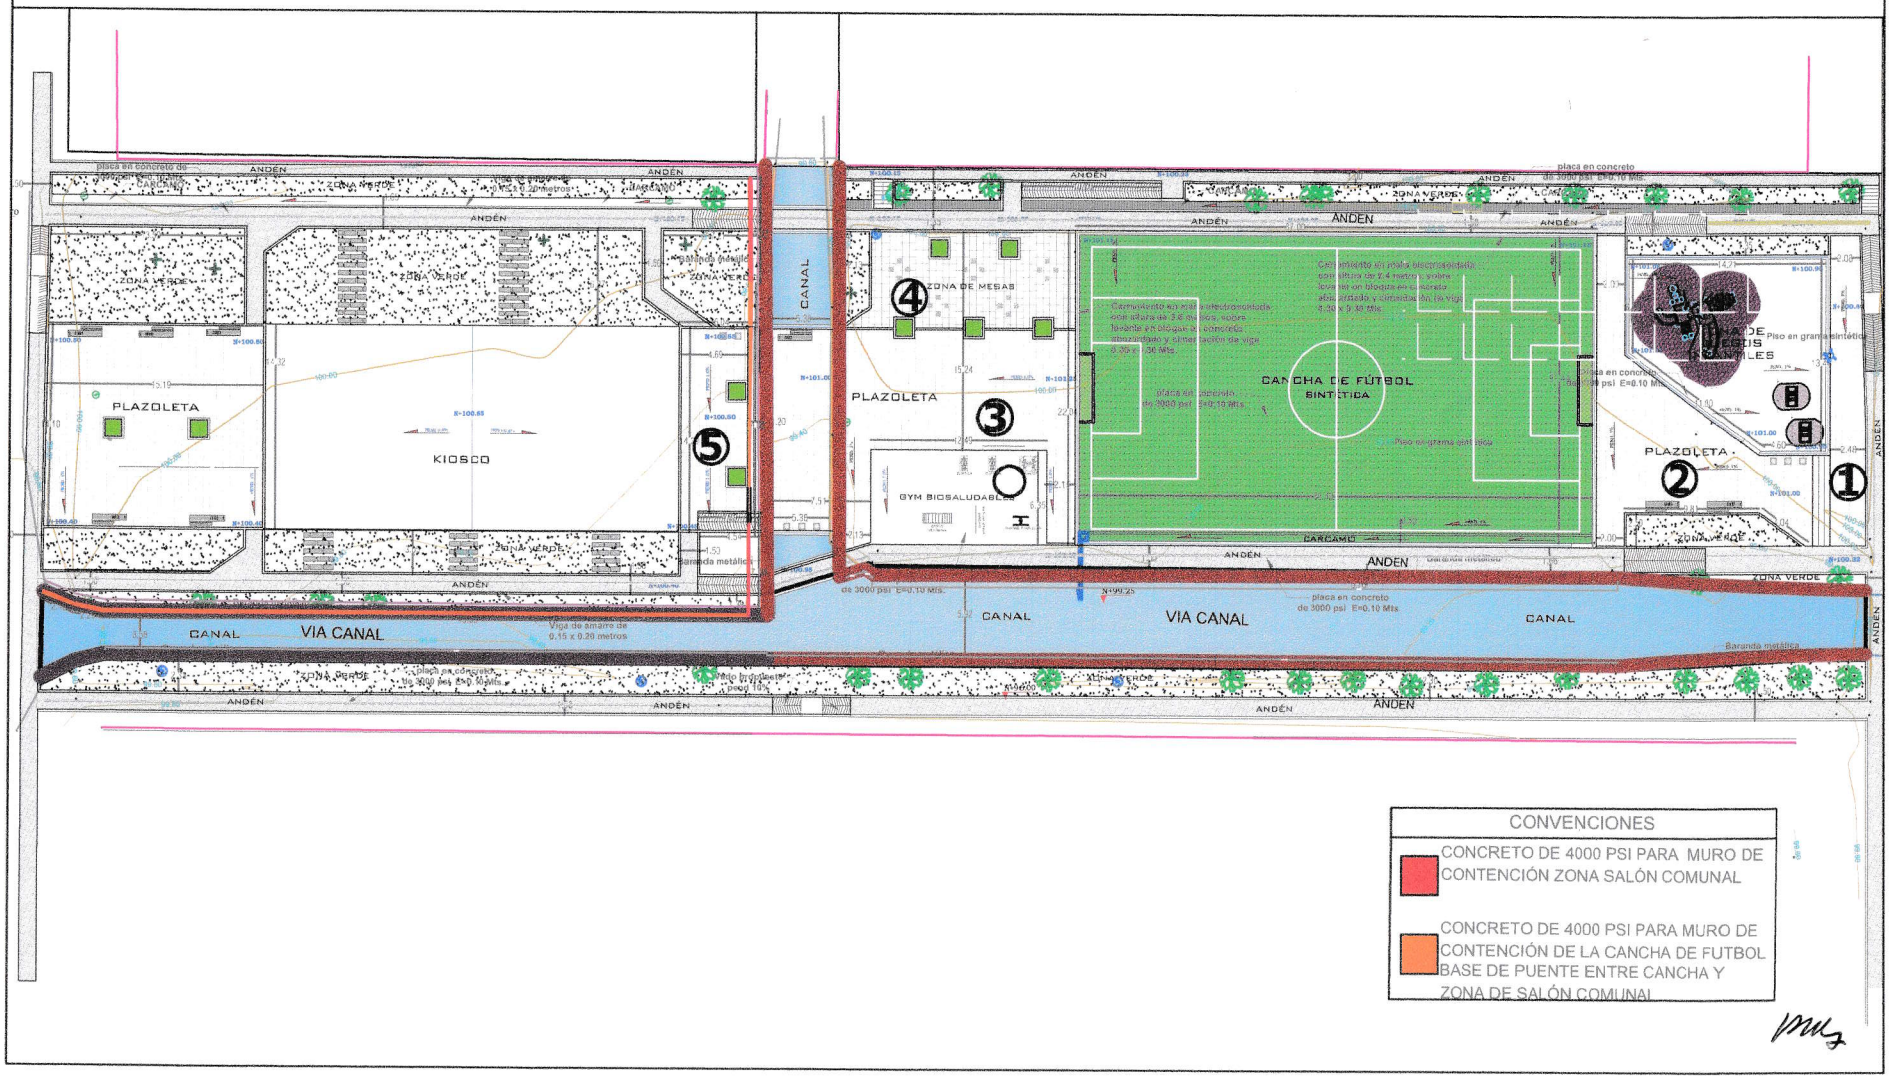

CONVENCIONES

- CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN ZONA SALÓN COMUNAL
- CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL BASE DE PUENTE ENTRE CANCHA Y ZONA DE SALÓN COMUNAL

PLANO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA MUROS Y PLACA

