TERRITORIAL MAGDALENA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Informe final de supervisión.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Oficio DT-MAG-46699 DEL 11-08-2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

VÍA PLATO – SALAMINA CODIGO 2701 TRAMO BAHÍA HONDA – PEDRAZA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 KM.

Actividades ejecutadas:

Suministro de 718.3 M3 de Afirmado en la vía 2701: PLATO - SALAMINA, distribuidos así:

- Entre PR72+603 AL PR73+0000, L= 397,0 mt, A= 6,0 mt y Esp prom = 0.20 mt
- Entre PR81+545 AL PR81+873, L= 329,0 mt, A= 5,0 mt y esp prom = 0.15 mt ; colocados, extendidos y compactados.

Área intervenida Aproximada: 4.027 m2


Así mismo, se realizó la intervención y colocación de material de Afirmado entre el **PR40+0055 y el PR45+0944** en el paso Nacional por Aracataca, atendiendo los daños existentes en el tramo, los cuales se relacionan a continuación:

- PR72+603 AL PR73+0000
- PR81+545 AL PR81+873

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de Afirmado, incluye la disponibilidad de equipo y maquinaria, el transporte y el suministro del afirmado y transporte al sitio de la obra, no incluye mano de obra	M3	718.30	$ 170,000.00	$ 122,111,000.00
SUBTOTAL OBRAS					$
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA, GESTION SOCIAL Y PREDIAL)					$ -
(1) VALOR TOTAL BÁSICO DEL SUMINISTRO					$ 122,111,000.00
(2) VALOR IVA (19% del SUMINISTRO)					$ 23,201,090.00
(3) =(1)+(2) VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)					$ 145,312,090.00
AJUSTE					$ -
VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)					**$ 145,312,090.00**


UBICACIÓN DEL CORREDOR 2701 TRAMO BAHÍA HONDA – PEDRAZA

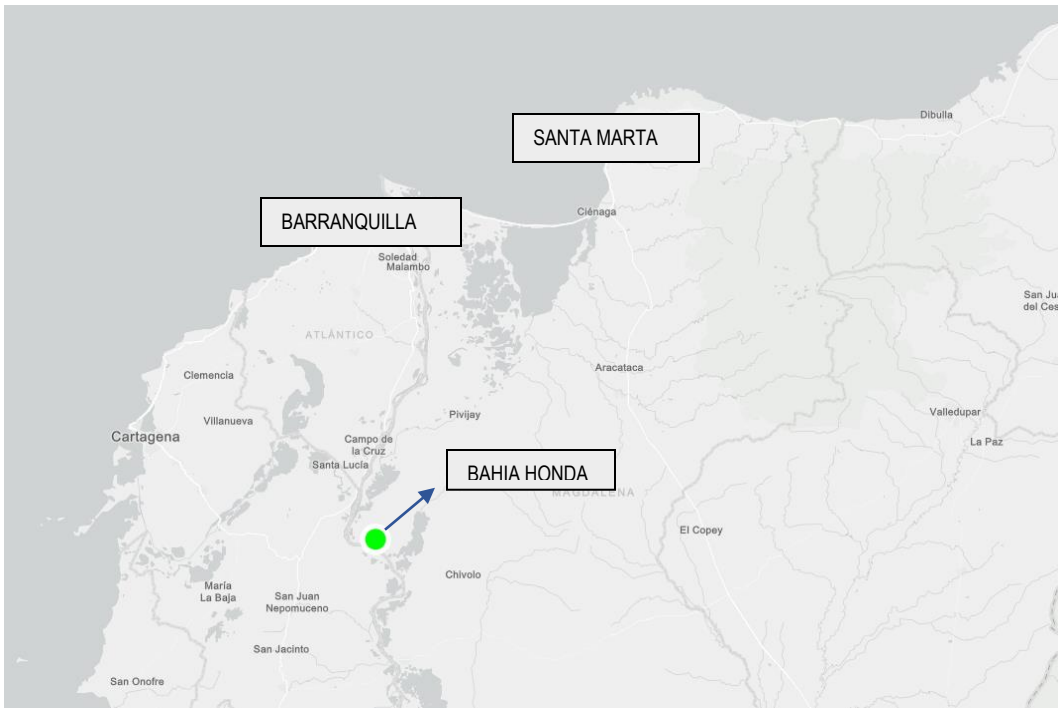



UBICACIÓN DEL CORREDOR 4518 PASO NACIONAL POR ARACATACA



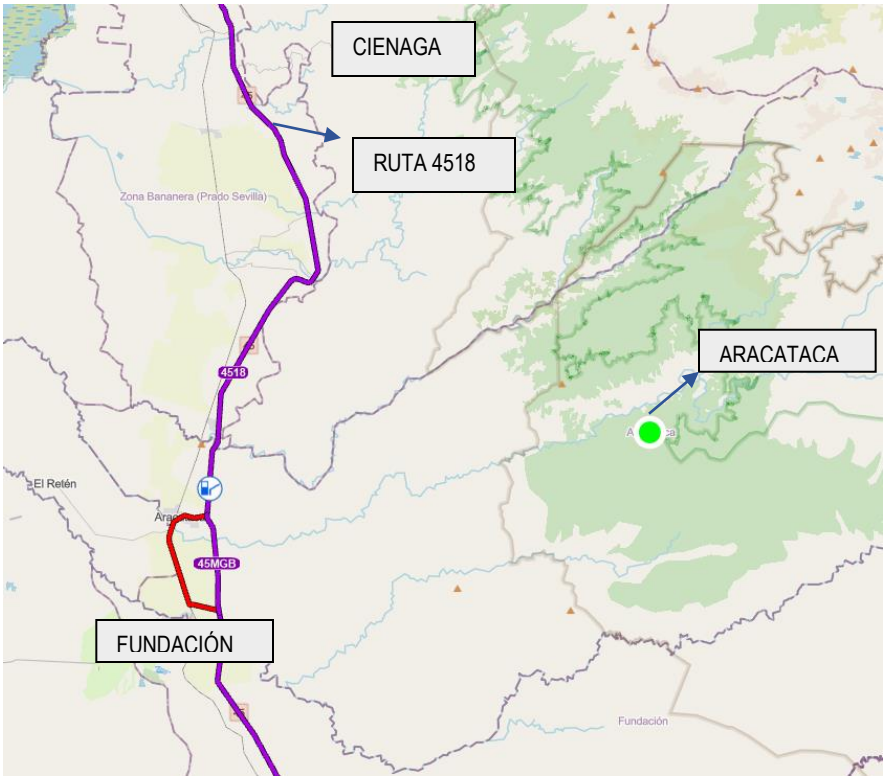

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2620-2023		
CONTRATISTA:	JTEC INGENERIA Y CONSULTORÍA S.A.S	NIT:	901403804
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	11/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-MAG-46699
VALOR INICIAL:	$ 96.893.608,00		
VALOR ADICIONES:	$ 48.445.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 145.338.608,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	1 mes		
PRÓRROGA 1:	15 días		
PRÓRROGA 2:	3 meses y 10 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
913823	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02/ Nación	$ 96.893.608,00	$ 96.893.608,00	$ -
913823	2023 – ADICION 1	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02 / Nación	$ 48.445.000,00	$ 48.445.000,00	$ -
TOTAL				$ 145.312.090,00		$ -

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$80,920,000.00	$15,374,800.00	-	$ 96,294,800.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 y final.	$ 41,191,000.	$ 7,826,290.00	-	$ 49,017,290.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de Diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra del 100%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 145.312.090,00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
6/10/2023	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
6/10/2023	No. 1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prorroga No. 1 (15 días)	Aprobado
N/A	N/A	Prorroga No. 2 (3 meses y 10 días)	Aprobado
N/A	N/A	Adición No. 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: :ACTA DE ENTREGA Y RECIBO
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIEMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$9.689.360,80	14-44-101189168 ANEXO 5	8/8/2023	30/4/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$29.068.082,40	14-44-101189168 ANEXO 5		
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	$43.061.582,40	14-44-101189168 ANEXO 5	8/9/2023	31/10/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$116.000.000,00	5	08/08/2024	30/04/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nota: El presente contrato no contó con interventoría. La supervisión directa se realizó por la Dirección Territorial Magdalena con el apoyo de la administración Vial.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en	N/A

		ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	$	$	$	$

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

N/A

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS N/A **TIPO DE GARANTÍA:** N/A **NOMBRE:** N/A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A			
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A			
Calidad del Servicio	N/A			

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. No se presentaron aspectos técnicos relevantes en la ejecución del presente contrato.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. No se presentaron aspectos jurídicos relevantes en la ejecución del presente contrato.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. No se presentaron aspectos administrativos y/o financieros relevantes en la ejecución del presente contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. No se presentaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad relevantes en la ejecución del presente contrato.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Se realizó seguimiento al proyecto en campo con apoyo de la Administración Vial Grupo 1.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a las cantidades de obra ejecutadas, tramitadas y la calidad de estas.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No. 13202-097750 BLV
CARGO: DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA.
