199

CPB-BAGRE-020

El Bagre Antioquia, 17 de Abril de 2023

Ingeniero
DOIVER NISPERUZA
Director Técnico.
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
La Cuidad

Referencia: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asunto: PLAN DE CONTIGENCIA EJE N°2.

Respetado Ingeniero,

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE basados en los compromisos adquiridos en el comité de obra #4 de fecha 11 de enero de 2023, oficializa en la presente comunicación el PLAN DE CONTIGENCIA correspondiente al EJE N°2 entre las abscisas k 0 + 063 al k 0+285, el cual consta de diez (10) folios

Lo expuesto anteriormente, ha sido revisada y avalada por el Supervisor de Apoyo y la Interventoría.

Sin otro particular,

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

María Angelica Ortiz
17 de Abril 2023
8:00 am

C.C Ing. Ing. Edwin Valencia. Director Interventoría- CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022.
C.C Ing. Jorge Iván Valencia Carvajal. Supervisor de Apoyo- EDTB

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

PLAN DE CONTIGENCIA
EJE N°2
CONTRATO DE OBRA N° 029 DE 2022

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
EDER DEL TORO **DIRECTOR DE OBRA** **CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**	**JORGE VALENCIA CARVAJAL** **SUPERVISOR DE APOYO** **EDTB**	**EDWIN VALENCIA PINZÓN** **DIRECTOR INTERVENTORÍA** **CONSORCIO INTERPLACAS** **EL BAGRE 2022**

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 46 #55-26 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 3

2. ALCANCE 3

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 4

2.2 PLAN DE CONTINGENCIA 4

3. PLAZO PARA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 8

4. DIVULGACION DE INICIOS DE TRABAJO 8

5. CRONOGRAMA 8

6. CONCLUSIONES 10

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 50 # 25-20 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

1. OBJETIVOS

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, contratista de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB elaboró este plan de contingencia, para el aseguramiento y cumplimiento de las actividades que van desde la demolición y la construcción de pavimento rígido de 4000 P.S.I en el EJE N°2 en el tiempo estipulado el cual está enmarcado en el contrato de obra 029/2022 cuyo objeto es "Reposición de pavimento en concreto rígido, obras complementarias y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los barrios bijao, metrópolis, casa roja, cornaliza, la victoria, las delicias, la vega y casa loma en el EJE N°1 en la cr 46 entre dg 58 y tv 45, tv 45 entre cr 46 y cl 63, cr 45 entre cl 63 y cl 64a, cr 45 entre dg 58 y cr 46. EJE N° 2 en la dg 58 entre cr 46 y cr 45, cr 45 entre cl 58 y cl 56. EJE N° 3 en la cr 48 entre cr 46 cll 57c. EJE N°.301 en la cl 57a entre cr 48 y cr 46a. EJE N°..4 en la cr 48 entre cl 57c y cl 55. EJE N°. 401 en la cl 49b entre cr 48 y cr 50, cl 50 entre cr 48 y cr 50, cr 50 entre cl 50 y 49b, cr 48a entre 50 y 49. EJE N°.403 en la cl 50 entre cr 48 y cr 46d. EJE N°.404 en la cr 46d entre cl 50 y cl 51. EJE N°.405 en la cl 51 entre cr 48 y cr 46d. EJE N°.5 en la cr 48 entre cl 55 y cl 49. eje no. 6 cl 49 bis entre cr 48 y cr 49a. EJE N°.601 cr 46 entre cl 51 y el aeropuerto, en zona urbana del Municipio de El bagre Departamento de Antioquia.

2. ALCANCE

Este plan de contingencia adoptado por el Consorcio se llevará a cabo con el fin de intervenir el EJE N°2 y mejorar los rendimientos en la ejecución del k 0 + 063 al k 0 + 285, con el propósito de que esta nueva intervención no genere un atraso al Programas de Obra vigente, de acuerdo al comité de obra #4, en el cual se concluye que el pavimento rígido presenta la siguiente característica:

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 #33-08 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

- Desgaste en la capa de rodadura
- A su vez hace énfasis que la calzada de 5.0m, no presenta otro tipo de daño (grietas longitudinales, grietas transversales, desportillamiento en juntas, baches, escalonamiento de juntas longitudinales y transversales)

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

La vía presenta una sección de 5.0 m de calzada más 1.20m de anden a cada lado y respectivos bordillos sobre la calle 57 en dirección al sector de la yee (come come), la misma se encuentra abierta al tránsito vehicular, cuenta con obras de drenaje (7 sumideros laterales) lo cuales no presentan ningún tipo de colmatación.



Fuente: Estado actual del pavimento

2.2 PLAN DE CONTINGENCIA

Este incluye como mínimo el programa de obra o cronograma de actividades a ejecutar, los recursos a utilizar para implementar, tanto en mano de obra, materiales y su fuente de suministro, maquinaria y equipos. En él se observa los ítems y los tiempos estimados

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 18 #25-26 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

en ella y están desarrolladas considerando la gestión de operaciones propia del proyecto. Referente al valor de la mano de obra, costo del alquiler del equipo o el costo de la operación para la ejecución de las actividades en el eje N°2, no se relaciona ya que es irrelevante del desarrollo o rendimiento del proyecto y solo hace parte de los costos de operación para el Consorcio.

El plan de contingencia para la reparación del concreto de 4000 P.S.I para placas de pavimento rígido es indispensable la demolición, el transporte y la conformación de la subbase con el respectivo céreo, para esto en el proceso de construcción se dispondrá de la comisión topográfica para dar continua pista para la instalación del pavimento en concreto.

Las actividades que están asociadas al eje a intervenir se listan a continuación:

- Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts
- Demolición de Pavimento existentes en sector de proyecto, espesor (e=22cm).
- Transporte de material producto de la demolición
- Conformación de la subbase (cereo)
- Suministro e Instalación de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rígido e=22cm.
- Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar
- Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 # 25-28 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

ACTIVIDADES	PERSONAL	MAQUINARIA Y EQUIPOS	MATERIALES
Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts	Oficial (1) Ayudante (2)	Herramienta menor.	Malla de cerramiento Postes de Madera de 2 x 2
Demolición de Pavimento existentes, espesor (e=22cm).	Operador de maquinaria (1), Controladoras de tráfico (2)	Retroexcavadora (1)	
Transporte de material producto de la demolición	conductor de volqueta (2)	Volqueta (2)	
Conformación de la subbase (cereo)	Operador vibrocompactador (1) Operador motoniveladora (1) Operador retrocargador (1) Comisión topográfica (1) Controladoras de tráfico (2)	Vibrocompactador (1) Motoniveladora (1) Retrocargador (1) Carro tanque (1)	Materiales será adquiridos por el CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE en aquellas canteras que cuenten con licencia ambiental y el respectivo título minero

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 49 #25-28 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

Suministro e Instalación de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rígido e=22cm.	Maestro (1) Oficial (1) Obrero (17) Comisión topográfica (1) Controladoras de tráfico (2)	Mezcladora (2) Reglas Vibratorias (2) Formaleta metálica (rieles) Vibradores de concreto (2) Herramienta menor.	Materiales pétreos serán adquiridos por el CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE en aquellas canteras que cuenten con licencia ambiental y el respectivo título minero, el cemento suministrado por CEMEX.
Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar.	Oficial (1) Ayudante (2)	Cortadora de concreto (1) Herramienta menor.	SIKAFLEX, SIKAROD
Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi.	Oficial (1) Ayudante (2) Se dispondrá de mayor personal cuando se requiera la instalación de este	Herramienta menor.	Acero de refuerzo 6000 P.S.I, será suministrado por CEMEX

En cuanto a la señalización propia en la intervención de este eje, la misma se regirá siguiendo los lineamientos en el PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT, avalado por el

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 # 25-34 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

ente contratante e interventoría y aprobado por la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de El Bagre.

3. PLAZO PARA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El plazo de ejecución es de veinticinco (25) días, con inicio de actividades el día 5 de junio, los cuales podrán verse prorrogables debido de la intervención de ejes adyacente, de tal forma de no verse afectada por las intervenciones físicas en el momento de iniciar la demolición y posterior construcción del pavimento rígido, debido al cierre total de la vía y proporcionar rutas alternas de circulación, de acuerdo a lo establecido en el PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT

4. DIVULGACION DE INICIOS DE TRABAJO

Previo a los inicios de los trabajos pautados en el eje de intervención se realizará una divulgación en las viviendas y/o infraestructuras ubicadas en las márgenes del área de influencia del contrato de la referencia (dg 58 entre cr 46 y cr 45, cr 45 entre cl 58 y cl 56), la cual será llevada a cabo por personal de este Consorcio.

Es importante mencionar que se solicitará acompañamiento de la Secretaria de Tránsito y Transporte, para garantizar una movilidad segura en dicho eje y las rutas alternas que los transeúntes deberán tomar debido al cierre de este.

5. CRONOGRAMA

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 #21-26 - Barrio Palonegro de Mayo
El Bagre - Antioquia

EL BAGRE
COMPROMISO DE TODOS

CRONOGRAMA PLAN DE CONTIGENCIA EJE N°2

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

DIA 25 Duración de la actividad

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1,10	Malla de cerramiento (tela editiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts	ml	217,55	2,00
1,20	Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.	m^2	1196,53	3,00
	Transporte de material producto de la demolición	m^3 x km	4187,84	3,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			
2,30	Cereo y compactación de Sub-base granular.	m^2	1196,53	7,00
1,30	Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.	m^2	1196,53	14,00
1,40	Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar	ml	407,00	15,00
1,50	Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi	kg	2895,97	11,00

MES 1

SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

6. CONCLUSIONES

La situación analizada y tratada en el comité de obra del día 11 de enero de 2023 en acta # 04, dejando constancia que, aunque los ensayos de laboratorios SI CUMPLIERON el presenta un desgaste en la capa de rodadura y el cual no presenta otro daño como grietas longitudinales, grietas transversales, desportillamiento en juntas, baches, escalonamiento de juntas longitudinales y transversales. Por oficio CIP-ANT-BAGRE-010 con fecha 12 de enero de 2023, la dirección de la Interventoría envía a Consorcio Pavimentos El Bagre por medio del cual hace saber que le solicita al contratista ***"..Realizar la demolición y reconstrucción del pavimento rígido.."***

Consorcio Pavimentos El Bagre realizará la demolición y construcción del pavimento rígido desde el k 0 + 063 al k 0 + 285, cuyo tiempo de ejecución será de 25 días con inicio de actividades el día 5 de junio, los cuales podrán verse prorrogables debido de la intervención de ejes adyacente, de acuerdo a cronograma presentado

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 #38-28 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



Descripción: Interrupcion a la calzada en tiempos de fraguado del concreto



Descripción: Interrupcion a la calzada en tiempos de fraguado del concreto

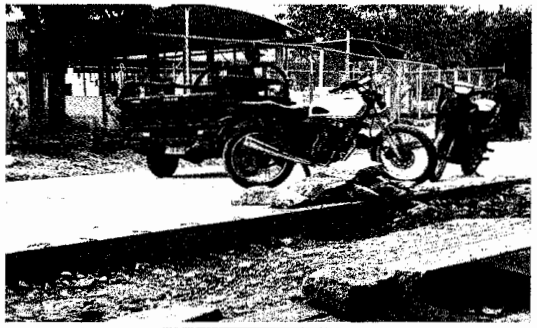

Descripción: Transito de motocicletas en tiempos de fraguado del concreto



Descripción: Transito de motocicletas en tiempos de fraguado del concreto

Julian Angel Rincon
Residente de Obra
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

210

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			VERSIÓN	1		
				PAGINA	1	DE	2

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	028 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



Descripción: Capa de rodadura



Descripción: Desintegración de la capa de rodadura

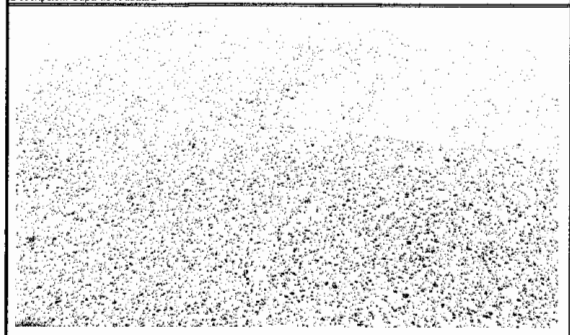

Descripción: Desintegración de la capa de rodadura



Descripción: Desintegración de la capa de rodadura

Julian Angel Rincon
Residente de Obra
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

277

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	11 (Día)	1 (Mes)	2022 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 029 **DE** 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 035 **DE** 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Jorge Ivan Valencia Carvajal	Supervisor de Apoyo	EDTB
Julian Angel Rincón	Residente de Obra	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Janer Zapa Alian	Representante Legal	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Edwin Fernando Valencia Pinzón	Director de Interventoria	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Isaac Sosa Camargo	Supervisor de Obras Civiles	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Pavimento Rigido EJE No.2 (come come)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	11 (Día)	1 (Mes)	2022 (Año)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Generación de compromisos, decisiones y observaciones propias dada por cada una de las partes que intervienen en el comité

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Siendo las 2:00pm; se inicia el comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios y observaciones, trayendo ides mas efectivas, buscando con ello avanzar, generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

(SUPERVISOR DE APOYO) Ing. Jorge Valencia, menciona el compromiso y la necesidad de entrega de un Informe técnico por parte de Supervisor, la Interventoría manifiesta que este deberá estar involucrado tanto el Contratannte, el Contratista, la supervisión de apoyo, el supervisor por parte de la Alcaldía del Municipio fija una visita tecnica al EJE N°2 el dia 13 de enero.

(ALCALDIA MUNICIPAL) Arq. Arrieta considera muy importante que se tome a consideración el tema que ha venido presentado el pavimento desde el k 0 + 063 al k 0 + 285 y se decida por parte de la EDTB que se va hacer y cual seria el plan de acción, pues considera a titulo propio habrá problemas futuros, sino se llegasen atacar.

(CONTRATISTA) Ing. Julián comenta que los ensayos de laboratorios realizados donde se obtuvieron que los resultados SI CUMPLIERON pues fueron superiores al requerimiento mínimo exigido contractualmente y manifiesta que el pavimento rígido instalado se cumplió con las especificaciones técnicas, que se presentaron inconvenientes con la comunidad a no respetar la señalizacion e irrumpir en la via aun cuando no se habia habilitado el paso vehicular. (SOSA) Interventoría expresa que si bien es cierto el pavimento no presenta otro daño como grietas longitudinales, grietas transversales, desportillamiento en juntas, baches, escalonamiento de juntas longitudinales y transversales, si presenta desgaste en la capa de rodadura en un pavimento en una edad tan temprana, el contratista deberá realizar la demolición de pavimento rígido instalado, el Ing. Dolver (EDTB) resalta que se debe esperar el informe que presente la EDTB sobre la solución final de este pavimento.

La interventoría (Ing Valencia) expresa que oficializara al contratista la problemática del pavimento el cual ya ha expresado en varias oportunidades de manera verbal que este deberá demoler las losas y entregue un PLAN DE CONTINGENCIA y sea presentado ante la CIP para ser revisado de manera conjunta y asi obtener su aprobación y posterior implementación.

Secretaria de Obras Publicas (Arrieta), que de esta reunión es importante que la solución final queda clara y por escrito, orientándose hacia la culminación satisfactoria del Eje N°2

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Visita Tecnica eje N°2	13/01/2023	EDTB, CONTRATISTA, SUPERVISOR DE APOYO.
Plan de contigencia revisado por el Supervisor de apoyo y aprobado por la Interventoria	27/01/2023	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	11	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Doiver Nisperuza	Doiver Nisperuza.
Jorge Ivan Valencia Carvajal	
Julian Angel Rincón	
Janer Zapa Alian	
Edwin Fernando Valencia Pinzón	
Isaac Sosa Camargo	
Carlos Andres Arrieta	

215

CPB-BAGRE-016

El Bagre Antioquia, 23 de Marzo de 2023

Ingeniero
Edwin Valencia
Director de Interventoría
Consorcio Interplacas el Bagre 2022
La Cuidad

Referencia: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Luisa Acosta Soto
Secretaria Interventoría
23/03/2023
12:49pm

Asunto: Aprobación de Estudios y Diseños para atención de puntos críticos en la avenida la Juventud

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contratante entrego al Consorcio Pavimentos El Bagre los planos y especificaciones técnicas del proyecto acorde al anexo técnico el cual forman parte integral del contrato de la referencia. Nos permitimos aclarar que los estudios y diseños presentados por el ente contratante (EDTB) no contemplan los puntos críticos del (Parque Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao).

Por lo anterior, Consorcio Pavimentos El Bagre oficializa a través de la presente comunicación los estudios y diseños pluviales de mitigación de los puntos críticos antes descritos, situación analizada y tema tratado en el comités tecnicos de obra, dejando constancia que los estudios y diseños iniciales tuvieron falencias en el momento de su formulación las cuales no referenciaron la problemática pluvial existente, de lo cual se obligó a realizar complemento a los mismo. Cada uno de los estudios tuvo por objeto atender las necesidades pluviales en los puntos del (Parque Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao)., en busca de una obra más eficaz para tener en cuenta la necesidad de cada uno de ellos, dichos diseños fueron concertados en comités antes citado con la participación Interventoría, Supervisor de Apoyo, Supervisor de la EDTB para el contrato, Secretario de obras públicas, Secretaria de planeación del Municipio.

Los estudios y diseños están conformados por la siguiente documentación:

- Planos
- Especificaciones Técnicas
- Presupuesto
- Informe Hidráulico

Solicitamos, que los Estudios y Diseños Pluviales presentados por el Consorcio Pavimentos El Bagre, sean revisados y aprobados por la Interventoría, en aras de garantizar el cumplimiento el objeto del contrato.

Cordialmente,

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE.

C.C Ing. Doiver Antonio Nisperuza López, Director Técnico - EDTB

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

217

CIP

CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

El Bagre, Abril 11 de 2023 CIP-ANT-BAGRE-015

Señores
Charles Stiven Cano Ochoa
Gerente General y Representante Legal

Doiver Antonio Nisperuza López/
Director Técnico EDTB

EDTB - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
Cll 50# 47ª-19 2do piso
Bagre, Antioquia

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 035 DE 2022"

ASUNTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PLUVIAL EN PUNTOS CRITICOS DE LA AV. LA JUVENTUD.

Atento Saludo,

Por medio de la presente me permito dar a conocer los antecedentes y las actuaciones que se han realizado por parte de la interventoría y el contratista de obra antes la situación que se presenta en los puntos críticos en la avenida la juventud (Parque Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao).

ANTECEDENTES:

1. Los estudios previos del proceso precontractual y los diseños entregados por la entidad contratante EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) no contemplan los puntos críticos del (Parque Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao).
2. En comité técnicos de obra, se a informado la necesidad de atender los puntos críticos que son los primero en sufrir inundaciones en la avenida la juventud, donde se evidencia que la misma ha sido detectada antes de la ejecución de la pavimentación y que los estudios y diseños tuvieron falencias en el momento de su formulación las cuales no referenciaron la problemática pluvial., de igual forma hemos manifestado y puesto en conocimiento al ente contratante y la Alcaldía

Calle 11 # 10 - 33 Brr Bosque Centro | Sahagún - Córdoba
Cel: 304 329 3398
E-mail: interventoriainterplacas2022@gmail.com | ingenieriajjmm@gmail.com

Recibido
K.D.
11/04/2023
Hora: 3:05 pm
102

Municipal a través de la Secretaria de Planeación en reiteradas oportunidades de forma verbal. Además, en reuniones y comités técnicos de obra con profesionales de esta interventoría enuncia que los puntos críticos no se evidenciaron en el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio.

3. En Oficio CPB-BAGRE-016 allegado por el contratista, el cual oficializa los estudios y diseños pluviales de los puntos críticos para su aprobación.
4. La interventoría le da el visto bueno a los estudios y diseños entregados por el contratista.

Por lo anterior, elevamos la solicitud dadas las diferentes circunstancias y en aras de mitigar la problemática presente en la avenida juventud y en la cual vemos con preocupación esta situación, por tal motivo respetuosamente le solicitamos de carácter urgente solucione este inconveniente, se atienda, analice y se realice una definición y formalización de los recursos necesarios y prioritarios a ejecutar teniendo en cuenta las condiciones pluviales de los sectores descritos.

Adicionalmente y teniendo en cuenta lo aspectos antes detallados y todas las observaciones y actuaciones anteriormente plasmadas, me permito realizar las siguientes conclusiones:

1. Queda claro que las obras a ejecutar en el desarrollo del contrato se basan en el proyecto entregado por la EDTB, por tal motivo las falencias que no se haya tenido en cuenta en los estudios previos, correspondiente a los puntos críticos no será responsabilidad del contratista y mucho menos en las obligaciones de responsabilidad de la interventoría.
2. Las funciones de la interventoría es informar al ente contratante sobre el cambio de condiciones presentadas en el contrato 029/2022 en diseños pertinentes.
3. De no efectuarse los estudios y diseños pluviales, se deberá emitir por parte de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) la decisión definitiva y comunicarla al contratista de obra y la interventoría que el sistema de acueducto y alcantarillado que posee el contrato de obra 029/2022 es el idóneo y no se aprueba los estudios y diseños pluviales en los puntos críticos (Parque Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao), y que el contratista se ajustara a los planos, actividades y especificaciones originales.

CIP
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

Le solicitamos que a la mayor brevedad sea solucionado este impase que le permita al contratista e interventoría dar cumplimiento al mandato contractual, en el tiempo establecido, puesto que el tiempo de ejecución contractual avanza en nuestra contra.

Con esmerada atención,

Edwin Fernando Valencia Pinzón
Director Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Anexo: Comité de obra #1 (3 folios)
Comité de obra # 3 (3 folios)

c.c DESPACHO ALCALDE – MUNICIPIO DE EL BAGRE.
c.c Juan Camilo Urieta, SECRETARIA DE PLANEACION – MUNICIPIO DE EL BAGRE
c.c Carlos Arrieta Gómez, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS – MUNICIPIO DE EL BAGRE
c.c Janer Zapa, REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

220

El Bagre, 24 de abril de 2023 CPB-BAGRE-022

Señores:
EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZÓN
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
El Bagre, Antioquia

REFERENCIA: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE N°2 PARA EL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial Saludo

Por medio del presente oficio, yo Janer Zapa Alean identificado con número de cédula de ciudadanía 1.040.492.597, en mi calidad como representante legal de la empresa CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022.; la cual actúa como contratista ejecutora del contrato de obra en referencia, me permito remitir modificatoria del contrato de obra N°2, con su respectiva justificación técnica relacionada en el comité de obra N°5 con fecha del día 16-01-23 y comité de obra N°11 con fecha del día 22-04-23, sobre la necesidad de implementar cambios técnicos y presupuestal. Lo que deja la modificatoria N°2, en un balance presupuestal por el mismo valor del contractual de $ 14.403.443.555, sin necesidad de tener adición en recursos financieros., lo antes expuesto para dar trámite a la modificatoria con el fin de cumplir con la meta física del proyecto y no incurrir en retrasos.

Recibido Sandra Andrea Soto Interventoría 24/04/2023 Hora 8:30am

103

Se adjunta los siguientes documentos:

- Acta Modificatoria y/o Balance de obra N°.2
- Informe Técnico Modificatorio.
- Análisis de Precios Unitarios – Apu,s
- Comité técnico N°5
- Comité técnico N°11
- Informe hidráulico sistema pluvial de mitigación
- Informe de especificaciones técnicas
- Planos
- Memorias de Calculo

Cordialmente,

JANER ZAPA ALEAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
CONTRATISTA DE OBRA

Anexos: Modificatoria N°2 (6 folios)
Apu,s (9 folio)
Informe Técnico Modificatorio N°1 (19 folios)
Comité técnico N°5 (4 folio)
Comité técnico N°11 (3 folio)
Informe hidráulico sistema pluvial de mitigación (17 folio)
Informe de especificaciones técnicas (17 folio)
Planos (7 folio)
Memorias de cálculo (38 folios)
Oficio CPB-BAGRE-016 (02 folios)

Copia: Ing. Doiver Antonio Nisperuza López, Director Técnico- EDTB
Arq. Carlos Arrieta Gómez, Secretario de Obras Publicas.

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	2 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 029 **DE** 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 035 **DE** 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Jorge Ivan Valencia Carvajal	Supervisor de Apoyo	EDTB
Julian Angel Rincón	Residente de Obra	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Janer Zapa Alean	Representante Legal	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Edwin Fernando Valencia Pinzón	Director de Interventoria	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Isaac Sosa Camargo	Supervisor de Obras Civiles	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL
Johan Andrés Vásquez	Coordinador Técnico Operativo	Aguas de El bagre SA ESP

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Sistema de alcantarillado
Interferencias de predios en replanteo

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En la anterior reunión se había solicitado ajuste en el plan de manejo de tráfico (PMT), al contratista de obra.
Se había solicitado por parte del contratista de obra visita de campo para definir sistema de alcantarillado y acueducto en el eje#2.
Se da por cerrado los compromisos.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Modificación técnica de descarga del sistema de alcantarillado
ítems no previstos, cantidades mayores y menores
Modificatoria #1

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	2	11	2022
		(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

De la reunión de campo con todos los especialistas de obra, interventoría, supervisor de municipio, funcionarios de aguas de El Bagre, EDTB. Se concluye.

Funcionario de aguas de El Bagre S.A ESP; Los planes maestros representan la guía de intervención de los proyectos de infraestructura, por ende, cada obra hidráulica debe estar articulado en las proyecciones del PMAA, en este caso evaluado por parte del área técnica de Aguas de El bagre pudimos constatar que los diseños planteados por la intervención vial proyecto pavimentación de la zona urbana del municipio, donde direccionaban las aguas residuales hacia el colector de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Floresta representaba una dificultad, por ende se recomendó cambiar la dirección del flujo para evitar un desbordamiento de la capacidad de caudal de tratamiento de la planta, se planteó la recolección de las aguas residuales del sector llevando como dirección la planteada en el plan maestro tomando como arranques el sector llamado Come Come en el Barrio la Floresta, con el propósito de dejar un cumplimiento parcial de lo recomendado y planteado en el plan Maestro, adicionalmente, el replanteo de las direcciones de los flujos garantizaran fuerza tractiva, para lograr cumplir con la fuerza cortante suficiente que genere un autolavado de las redes, no permitiendo así, la acumulación de biopelículas que puedan traer problemas de colmatación, así también las velocidades flujos se garantizaran por medio de las pendientes de caída, con este concepto permitimos dar a conocer la percepción de la empresa Aguas De El Bagre, como empresa prestadora será la encargado de recibir y administrador.

Dentro del componente acueducto se determinó no remplazar la red existente de 18" PVC de presión en el eje #2, ya que su vida útil aún estaba dentro de los tiempos de resistencia y durabilidad, ya que esta tubería no tiene más de 8 años de uso, para por debajo de un periodo de 50 años según establece la curva de regresión que determina su tensión máxima de servicio.

Contratista de interventoría; al estar sustentado el cambio del sentido del flujo de alcantarillado en el eje#2 (come come), por las razones antes expuestas y en apoyo técnico de los especialistas de interventoría, se deja sentado el cambio de tubería de 20" a 8" y el sentido del flujo.

Así también como avalar la determinación de dejar el tubo existente de acueducto de 18" del eje#2 (come come), por las razones antes expuestas.

Contratista de obra; en los replanteos topográficos, ítems contractuales, memorias de cálculo del presupuesto inicial., en el comité anterior #2 se informó de las falencias. En este comité resaltaremos esos ítems que entraran en un balance y/o modificatoria.

En el caso puntual de la tubería de 20" de alcantarillado y 18" de presión del eje #2 (come come) por las modificaciones técnicas tomadas, serían menores cantidades en los ítems:
6.9 Suministro e instalación tubería en PVC Novafort 20"
6.21 Suministro e instalación tubería en PVC U.M RDE 21 Ø 18"
6.38 Suministro e instalación unión de tubería 18" PVC ó similar

Así mismo como la revisión de la cantidad de acero en las memorias de cálculo del presupuesto donde las fórmulas no coinciden con las cantidades necesarias y que serían cantidades a mayores en lo ítems:
3.5 Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi
4.9 Acero de refuerzo 60000 psi

Así como error de escritura en las unidades de medida que no guardan concordancia real con las cantidades y es imposible utilizar la unidad de medida contractual, se corregirán y entrarán en la modificatoria, los ítems:

6.52 KIT SILLA YEE Ø8" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) – (unidad de medida m – a und)
6.53 KIT SILLA YEE Ø10" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) – (unidad de medida m – a und)
6.54 KIT SILLA YEE Ø12" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) – (unidad de medida m –a und)
6.55 KIT SILLA YEE Ø14" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) – (unidad de medida m – a
6.56 KIT SILLA YEE Ø16" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) – (unidad de medida m – a
6.57 KIT SILLA YEE Ø18" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) – (unidad de medida m – a
4.4 Suministro e instalación de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para Separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa) – (unidad de medida m3 – a ml)

Así también del ítem contractual y APU 6,44 Pozos de Inspección D=1.20 y 6,45 Pozos de Inspección D=1.50, se solicita modificación técnica de no usar mampostería y reemplazarla por concreto., argumentado el replanteo de las materiales iniciales se da principalmente para dar garantías en 2 conceptos aplicativos importantes dentro del proceso constructivo, primeramente en el componente estructural ya que proporciona garantías en la capacidad de soporte de cargas vivas en el alto tránsito vehicular, los Manjoles en concreto y acero, generan una fuerza reactiva que garantiza la estabilidad de los pozos de aguas residuales, adicionalmente, los coeficientes de permeabilidad, presentes en la mampostería presentan menos capacidad para la filtración de las aguas subterráneas (el casco urbano del municipio al estar a orillas del río Nechí, en épocas de invierno aumenta las niveles de agua infiltradas por las condiciones geológicas y geotécnicas del casco urbano), lo que implicarían en posibles socavaciones y debilitamiento de las estructuras como también la disolución de las cargas contaminantes direccionas a los puntos de vertimiento. El contratista se compromete que al presentar el nuevo APU sostiene el valor unitario contractual y no aumentar el precio a mayor del APU de dicha modificación técnica.

El presupuesto contractual no contemplo las conexiones domiciliarias de acueducto, por lo que se hace necesario he indispensable para realizar dichas conexiones y no dejar sin servicio de acueducto a la comunidad, por lo que se propone crear ítems no previstos de suministro e instalación de collarines de derivación y suministro e instalación de acometida manguera PF

Como también, en procesos constructivos deficientes y materiales inadecuados los antejardines de las viviendas están sufriendo averías con el paso de la demolición de andes y recuperación de espacio publico para andenes y ciclorruta, lo que hace necesario crear un ítem no previsto de reparación de antejardín en concreto de 3000 psi.

Igualmente, no se cuenta con ítem de demolición de pozos existentes, ningún ítem contractual cubre esta actividad necesaria por la construcción de los nuevos manholes (mh), por lo que se propone realizar este ítem no previsto.

Contratista de interventoría; le solicita al contratista de obra revisar y ajustar en los costos directos el porcentaje de impuestos y deducciones de acuerdo con el estatuto tributario municipal y la normatividad vigente del municipio de El Bagre, donde los impuestos y deducciones quedaron contractualmente con el 16%, y el estatuto del municipio para contratos de obra pública son del 15%.

Contratista de interventoría; está de acuerdo con los argumentos sobre los ítems no previstos y los cambios técnicos tratados en comité y solicita al contratista de obra, finalizar y adjuntar los respectivos documentos soporte de dichos cambios técnicos, como balance y modificatoria, apus´s, y todo lo necesario y requerido documentalmente., para revisión, visto bueno y aprobación.

EDTB; expresa que realizara la revisión de la documentación que se presentara por parte del contratista de obra para visto bueno a la mayor brevedad posible y evitar en incurrir en retrasos.

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Presentar balance y modificatoria #1	Lo más pronto	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Cambio técnicos en el eje#2	Lo más pronto	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 15 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Doiver Nisperuza	Doiver Nisperuza.
Jorge Ivan Valencia Carvajal	
Julian Angel Rincón	
Janer Zape Alian	
Edwin Fernando Valencia Pinzón	
Isaac Sosa Camargo	
Carlos Andres Arrieta	
Johan Andrés Vásquez	

225

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	26 (Día)	10 (Mes)	2022 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 029 **DE** 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 035 **DE** 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Jorge Ivan Valencia Carvajal	Supervisor de Apoyo	EDTB
Julian Angel Rincón	Residente de Obra	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Janer Zapa Alean	Representante Legal	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Edwin Fernando Valencia Pinzón	Director de Interventoria	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Isaac Sosa Camargo	Supervisor de Obras Civiles	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL
Johan Andrés Vásquez	Coordinador Técnico Operativo	Aguas de El bagre SA ESP

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Dar a conocer las actividades de inicio de obra
Solicitudes por parte de interventoria

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	26	10	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Plan detallado de trabajo (PDT)
Actividades a ejecutar
Estudios y diseños previos
PMT

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta; una vez impartida el acta de inicio con fecha del 25 de octubre del 2022.

Contratista de obra; realiza la socialización de las actividades a ejecutar, se dan a conocer las diferentes labores con las cuales se dará inicio la ejecución del proyecto

La EDTB; recuerda al contratista de obra e interventoría la necesidad de las socializaciones con la comunidad y comerciantes por ejes de intervención, para que la comunidad este informada y al día de las obras y tiempos de ejecución de cada eje.

Contratista de interventoría; Se hicieron recomendaciones respecto a las actas de vecindad para tener una claridad de las propiedades que están colindantes al área de intervención, el contratista de obra inicio replanteo con comisión de topografía y se está a la espera de las situaciones que se puedan presentar, estas se darán a conocer en el siguiente comité de obra.

Contratista de interventoría; solicita al contratista de obra entregar un plan detallado de trabajo (PDT), que incluya actividades, microactividades, programación y flujo de caja ajustado a la realidad para revisión, visto bueno, aprobación., y se constituye como guía para cobros y pagos de actas parciales.

Supervisor del municipio; le solicita al contratista de obra y contratista de interventoría gestionar con tiempo ante la oficina de planeación, todas las interferencias que se vaya presentando con predios y ocupaciones de espacio publico con el replanto del nuevo diseño geométrico, andes y zonas sociales del proyecto, para que la oficina encargada realice los tramites respectivos y no generar atrasos en la ejecución de actividades.

Contratista de interventoría; hace hincapié en la aplicación correcta del plan de manejo de tráfico (PMT) por ejes de intervención, e involucrar e informar a la policía nacional, oficina de tránsito del municipio para su visto bueno, observaciones, recomendaciones y acompañamiento, del (PMT).

Contratista de obra; solicita una visita de campo con todos los presentes y especialistas de obra e interventoría, para revisar los replanteos de topografía, diseño de alcantarillado, diseño sistema acueducto.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Plan detallado de trabajo (PDT)	lo más pronto	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Socialiación proyecto por ejes con la comunidad	inmediata	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Realizar visita de campo	27/11/2022	TODOS

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	26	10	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)






OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 31 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Doiver Nisperuza	
Jorge Ivan Valencia Carvajal	
Julian Angel Rincón	
Janer Zapa Alian	
Edwin Fernando Valencia Pinzón	
Isaac Sosa Camargo	
Carlos Andres Arrieta	
Johan Andrés Vásquez	

228

CIP

CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

El Bagre, abril 26 de 2023 CIP-ANT-BAGRE-018

Ingeniero.
Doiver Antonio Nisperuza López
Director Técnico EDTB
EDTB - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
Cll 50# 47ª-19 2do piso
Bagre, Antioquia

REFERENCIA: "CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022"

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 035 DE 2022"

ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE DE OBRA Y/O MODIFICATORIA N°02.

Por medio del presente oficio, se adjunta balance modificatoria N°02 para el contrato de obra en referencia, el cual fue presentado por parte del contratista de obra, dicha solicitud fue previamente revisada y aprobada por esta interventoría. Con base a lo anterior, se da constancia de que las cantidades presentadas están acorde y son indispensables para el cumplimiento de la meta física del proyecto incluyendo la cantidad mayores y/o menores adicionalmente los ítems no previstos. Por lo tanto, para llevar a cabo la ejecución de estas actividades, se remite a la entidad contratante solicitud de tramite necesario para formalizar el balance N°02, y cumplir con la programación de obra propuestas.

En el presente cuadro, se evidencia información detallada financiera actualizada del contrato de obra con la modificatoria N°2:

Calle 11 # 10 - 33 Brr Bosque Centro | Sahagún - Córdoba
Cel: 304 329 3398
E-mail: interventoriainterplacas2022@gmail.com | ingenieriajjmm@gmail.com

Recibido
F. D
26/04/2023
Hora 10:4

CIP
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA INICIAL	$ 14.403.443.555
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ADICIONAL EN MODOFICATORIA N°2	$ 0
PORCENTAJE DE ADICION	0,00%
VALOR ACTUALIZADO EN MODOFICATORIA N°2	$ 14.403.443.555
VALOR TOTAL:	CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 14.403.443.555) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Del cuadro del balance, se concluye que no es necesario adicionar en recursos el contrato de obra, porque el balance realizado entre cantidades mayores y menores, más ítem no previsto no aumenta ni disminuye el valor contractual del contrato de obra.

Por otra parte, esta interventoría, en revisión informa que no se hace necesario adicionar los contratos de obra, e interventoría en tiempo ni en recursos.

Atentamente,

Edwin Fernando Valencia Pinzón
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Anexos: Modificatoria N°2 (6 folios)
Apu,s (9 folio)
Informe Técnico Modificatorio N°1 (19 folios)
Comité técnico N°5 (4 folio)
Comité técnico N°11 (3 folio)
Informe hidráulico sistema pluvial de mitigación (17 folio)
Informe de especificaciones técnicas (17 folio)
Planos (7 folio)
Memorias de cálculo (38 folios)
Oficio CPB-BAGRE-016 (02 folios)
Oficio CIP-ANT-BAGRE-015 (03 folios)

C.C Janer Zapa Alean – CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
C.C Ing. Charles Stiven Cano Ochoa, Gerente General – EDTB.
C.C Ing. Carlos Arrieta Gómez - Secretario de Obras Públicas.

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	22 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 029 **DE** 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 035 **DE** 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Jorge Ivan Valencia Carvajal	Supervisor de Apoyo	EDTB
Julian Angel Rincón	Residente de Obra	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Janer Zapa Alean	Representante Legal	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Edwin Fernando Valencia Pinzón	Director de Interventoria	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Isaac Sosa Camargo	Supervisor de Obras Civiles	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL
Johan Andrés Vásquez	Coordinador Técnico Operativo	Aguas de El bagre SA ESP
Holman Grueso	Profesional de Urbanismo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Faber Trespalacios	Alcalde	ALCALDA MUNICIPAL DE EL BAGRE

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cambios técnicos, sistema pluvial de mitigación
Balance y/o modificatoria

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Compromisos pendientes en comité anterior
Sistema pluvial de mitigación
Items no previstos
Cambios técnicos

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	22 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta.

Contratista de interventoría; se recibe por parte del contratista de obra de manera formal los estudios y diseños del sistema pluvial de mitigación de los puntos críticos de la avenida la juventud el día 23/03/2023, y por medio de del oficio CIP-ANT-BAGRE-015 con fecha 11/04/2023 se da respuesta de revisión y visto bueno, dando constancia que las actividades de obra y cantidades son acorde y necesarias.

Contratista de obra; en comité anterior se solicitó avance en el proceso de recuperación de espacio público en el eje #5 margen izquierdo para la construcción del parque lineal, cabe recordar que en varias visitas de campo conjunto con replanteo de topografía se evidenció las interferencias con cubiertas y paramentos existentes con el diseño del parque lineal.

Adicionando a lo anterior que el parque lineal no cuenta con los ítems contractuales suficientes para construirlo y que no tuvieron en cuenta en la fase de estudios y diseños, faltando como; iluminación y mobiliario eléctrico ítems no previsto donde se necesitaría adición de recursos al contrato.

El día 21/04/2023 llega a las oficinas del consorcio pavimentos El Bagre, el comunicado el radicado N°: 2023-431 20/04/2023 por parte de la secretaria de planeación municipal. Donde se informa que la verificación de área de los predios y estudio de títulos está en un 95%, encontrando que dichos predios en este sector antes del 2021 tenían la connotación de predios privados, al tener tal calidad se dificulta la intervención de los mismo ya que tocaría que los propietarios de forma voluntaria cedieran una franja de tierra para el desarrollo del proyecto como primera opción. Lo otro sería pensar en la compra de la franja de tierra la cual conllevaría a un proceso tedioso como es la radicación ante el concejo municipal para la autorización de dichas compras, con la dificultad de que esto debió de haberse contemplado en la etapa de los estudios y diseños del proyecto.
Debido a lo anterior manifestado por la oficina de planeación, el consorcio concluye que la gestión por parte del municipio para acceder a ese espacio es inviable para los tiempos del contrato suscrito, motivo por el cual se le solita a los presentes, interventoría, EDTB, funcionarios de la alcaldía municipal pronunciarse al respecto y el futuro del parque lineal propuesto en los diseños para el eje #5 margen izquierda.
Contratante EDTB y alcaldía municipal; con el panorama presentado del cual acaba de salir el municipio en materia de seguridad, a dificultado los trabajos y avances en materia de urbanismo y planeación, dado que gran parte del comercio en este sector del parque lineal abandonaron temporalmente el casco urbano del municipio, lo que arrastro retrasos en los avances de estudio de títulos y predios, sin embargo, con el 95% de progreso se muestra poco factible la ejecución del parque lineal. Por lo tanto, la solicitud que se le realiza al contratista de obra e interventoría en el marco de un balance y/o modificatoria apremiante mencionado en comités anteriores y en este comité de obra, es desistir de construir el parque lineal y utilizar los recursos para dicho balance y/o modificatoria.

Contratista de obra; en comité de obra #5 se informó y dio claridad que por diseño y planos se contempló una cicloruta como parte de las áreas sociales,, en el cual se dejó claro que aunque existe en diseños, contractualmente no está un ítem para le ejecución de esta actividad y se hace necesario crear el ítem no previsto Suministro e instalación de Concreto Pigmentado para ciclo rutas en concreto de 3000 Psi, e= 15cm. Incluye malla electrosoldada y pintura de demarcación, con un área de 1.186,84 m2

Contratista de obra; en reuniones sostenidas y visitas de campo, se evidencio interferencias de espacio publico en zonas donde se van a ejecutar obras, la secretaria de planeación a realizado la recuperación de espacio público en algunos sectores, y para los sectores que cuentan con más de 15 años ocupando esos espacios, la secretaria de planeación realiza la solicitud de incluir en este balance la necesidad de 10 casetas en acero inoxidable para realizar reubicación. Lo que sería necesario crear ítem no previsto:

1.Suministro, instalación y transporte de casetas modulares para vendedores ambulantes según diseño. Incluye instalación de tubería tipo galvanizado, lamina inoxidable, aplicación de pintura epoxica, instalación de lavaplatos en acero inoxidable (incluye todos los accesorios para su correcta instalación.).

Contratista de obra; informamos que en el balance realizado hasta el momento dejando de construir los ejes 601, la glorieta y sus ejes de empalme por los motivos técnicos descritos, sumando los cambios sucesivos que en comités técnicos de obras y en reuniones se han requerido. Hasta el momento comunicamos, que no será necesario adicionar en recurso el contrato de obra.

Contratista de interventoría; requerimos al contratista de obra, finalizar el balance y/o modificatoria, anexar los documentos técnicos necesarios de soporte, para revisión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Balance y/o modificatoria	Lo más pronto	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	22	4	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 4 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Doiver Nisperuza	Doiver Nisperuza.
Jorge Ivan Valencia Carvajal	
Julian Angel Rincón	
Janer Zapa Alian	
Edwin Fernando Valencia Pinzón	
Isaac Sosa Camargo	
Carlos Andres Arrieta	
Johan Andrés Vásquez	
Holman Grueso	
Faber Trespalacios	

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	16 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 029 **DE** 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 035 **DE** 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Jorge Ivan Valencia Carvajal	Supervisor de Apoyo	EDTB
Julian Angel Rincón	Residente de Obra	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Janer Zapa Alean	Representante Legal	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Edwin Fernando Valencia Pinzón	Director de Interventoria	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Isaac Sosa Camargo	Supervisor de Obras Civiles	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL
Johan Andrés Vásquez	Coordinador Técnico Operativo	Aguas de El bagre SA ESP
Holman Grueso	Profesional de Urbanismo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Faber Trespalacios	Alcalde	ALCALDA MUNICIPAL DE EL BAGRE

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cambios técnicos, alcantarillado, sistema pluvial de mitigación
Revisión de estudios y diseños

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Compromisos pendientes en comité anterior
Sistema pluvial de mitigación
Items no previstos
Cambios técnicos
Ciclo ruta
Separador central
Descargar sistema de alcantarillado
Interferencia de espacio público con replanteo topográfico

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	16 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta.

Contratista de obra; dando continuidad a la solicitud de la mitigación de los puntos críticos por medio de un sistema pluvial en la avenida la juventud, preocupación presenta por interventoría, alcaldía municipal, EDTB y funcionarios de Aguas de El bagre SA ESP, en comités anteriores y visitas de campo, nos permitimos informar.
La problemática avidenciada en los tres puntos identificados como críticos en la avenida la juventud y que son los primeros en sufrir inundaciones, por dos aspectos:
El primero, que no se cuenta con sistema pluvial idóneo, y que actualmente se encuentra un sistema combinado alcantarillado y aguas lluvias, sistema obsoleto y objeto reposición de redes de alcantarillado en este contrato de obra y no contempla diseño de redes pluviales.
El segundo, la sedimentación que presenta actualmente en la margen derecha del rio nechí, esta sedimentación ha disminuido notablemente la capacidad hidráulica del rio lo que ocasiona crecientes súbitas, y alcanza cotas de inundación inicialmente por la tubería existente al permitir el retorno del flujo hidráulico por las líneas de alcantarillado, y la evidencia principal es el mantenimiento periódico que realiza la empresa Aguas de El bagre SA ESP, descolmatando estas salidas del alcantarillado.
Es de aclarar que el diseño de alcantarillado en los estudios y diseños no es un sistema combinado, y no ataca la problemática del sistema pluvial, ni lo mitiga.
Así también dejar claro que la solución definitiva al problema de las inundaciones por crecientes súbitas, radican principalmente de la excesiva sedimentación que existe en el margen derecho del rio nechí., y que dicha solución de bajar los niveles de sedimentación del rio están por fuera del alcancé objeto del contrato de obra pública 029 de 2022.

La propuesta es de un sistema pluvial no combinado que ayude a la mitigación de la problemática de las aguas superficiales propias de la avenida la juventud y controlar el retorno por el sistema del rio nechí con válvulas antirretorno tipo charnelas.

El sistema pluvial de mitigación consiste en; Sumideros tipo rejilla y sumideros transversales encargados de captar las aguas superficiales y escorrentía de la avenida la juventud, que a su vez descargaran en pozos de inspección para después ser transportados por líneas de tubería de alcantarillado con descarga en el rio nechí, acompañada de un sistema de válvula antirretorno tipo charnela en la línea final de descargar al rio, que permitirá controlar las aguas tanto como pluviales de la avenida la juventud, como las aguas por creciente súbita del rio nechí.

Los estudios y diseños del sistema pluvial de mitigación en los tres puntos críticos se encuentran en un avance del 90%. De lo cual comunicamos que consiste en las siguientes actividades principales:
Pozos de inspección.
Excavaciones
Tubería de alcantarillado Novafort
Concretos de atraque
Lateral de Rejilla Tipo B
Transversal ST-40
Válvula Antirretorno Tipo charnela

Las actividades antes mencionadas cuentan con ítems contractuales lo cuales irían a mayores cantidades de obra, y también se generarían ítems no previstos., lo que implica adicionar en recursos y tiempo el contrato para poder ejecutar las actividades, que en un primer balance presupuestal y con un avance del 90% en diseños esta rondado los $1.100.000.000 de pesos.

Contratista de interventoría; recalca al contratista, al contratante EDTB y al municipio que se ceñirá al cumplimento de sus funciones de supervisión, vigilancia y buenas prácticas constructivas, y que por ende esos puntos críticos deben ser mitigados en el marco de este contrato, y solicita al contratante y municipio pronunciarse a la necesidad inminente de adicionar en recursos y tiempo el contrato para ejecutar las actividades.

Contratante EDTB y alcaldía municipal; son consecuentes con la necesidad de mitigar y son pioneras en que dichas obras adicionales deben llevarse a cabo. Sin embargo, informa que el rubro presupuestal del municipio es corto ya que se destinó recursos para otras obras de infraestructura en el municipio, por tal motivo los recursos que propone adicionar el contratista de obra aproximadamente $1.100.000.000 de pesos, actualmente no están disponible.

Contratista de obra; como propuesta de solución a la dificultad de la adición de los recursos, propone revisar ejes de diseños como el eje #601, que para ejecutar la geometría vial propuesta, es necesario realizar gestiones administrativas con la aeronáutica civil quién es la de los lineamientos para que el municipio opere al aeropuerto El tomin, y donde se hace necesario recortar áreas pertenecientes al aeropuerto, procesos que son tediosos y largos lo que hace esa gestión prácticamente inviable, y que tuvieron que ser prevista en la etapa de formulación y estudios y diseños del proyecto. Adicionando que la vía existente para acceder al aeropuerto y al campamento de la compañía mineros S.A está en condiciones de operación y movilidad idóneas., se propone dejar de construir este eje y redistribuir los recursos en un balance para ejecutar las obras de mitigación pluvial.

Igualmente, para el Sector de la Glorieta (entrada principal al municipio y casco urbano), la isleta central con sus transiciones de empalme de niveles los cuales se definieron como Ejes 201 y 202 los ejes de los dos carriles de la Glorieta y los Ejes del 501 al 515 como los ejes de transición de empalme y ejes adyacentes.
Agregando que el pavimento de la glorieta fue construido en el año 2015 con reposición de acueducto y alcantarillado, y actualmente esta en condiciones de operación optimas agregando que la vida útil de un pavimento regido mínimo es de 20 años de servicio, y el actual cuenta con 8 años.

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	16	1	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 2 (Día) 2 (Mes) 2023 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Dolver Nisperuza	Dolver Nisperuza.
Jorge Ivan Valencia Carvajal	
Julian Angel Rincón	
Janer Zapa Alian	
Edwin Fernando Valencia Pinzón	
Isaac Sosa Camargo	
Carlos Andres Arrieta	
Johan Andrés Vásquez	
Holman Grueso	
Faber Trespalacios	

ANEXO 11. BITACORA DE OBRA

Viernes 23 de diciembre de 2022
Se presenta día Soleado
Personal de obra (ingeniero residente (2), Director de obra (1), maestro de obra (2), oficial de obra (4), Topografo, cuadrilla de obra (3) Maquinaria, Excavadora (1), Retroexcavadora Cargadora (2) minicargador (2), vibrocompactador (1), Volquetes (3).
Actividades realizadas: Continua la construccion de pavimento y anden en eje 5. Entre abscisas Km 7+20 al Km 7+861.27.

Sabado 24 de diciembre de 2022
Se presenta un Sabado.
Personal de obra ingeniero residente (2), Director de obra (1) maestro de obra (2) oficial de obra (4) Topografo (1), cuadrilla obra (3) Maquinaria Excavadora (1) retroexcavadora (2) vibrocompactador (1) minicargador (2) Volquetes (3). Actividades realizadas:
Finaliza la construccion de pavimento y anden en eje N. 5 en abscisas Km 7+20 al Km 7+861.27 - Se realiza corte y relleno de filo de junta para continuar.

Lunes 26 de diciembre de 2022
Se presenta un Sabado
Personal de obra ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (1) cuadrilla de obra (3) Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), vibrocompactador (1) minicargador (2), Volquetes (3). Actividades realizadas: Se inician labores de topografia para replanteo del sector pendiente del tramo denominado Eje 401. Se inician las actividades de delineamiento de los ejes de Viandas en el Sector pendiente de los tramos Eje 401 y Eje 402.
Inician actividades de demolicion de pavimento existente y anden en el Sector pendiente del Eje 401 entre abscisas Km 7+20 al Km 7+861.27. El contratista realiza instalacion de tubos del sistema pluvial en eje 5 en el Parqueadero. Por este Periodo se continua con el pendiente de instalacion rejilla SL.

238

Martes 27 de diciembre 2022

Se presenta día Sabado

Personal de obra Ingeniero residente (2) Director de obra (1) Topografo (1) Maestro de obra (2) oficial de obra (4) Cuadrilla de obra (3) Maquinaria Retroexcavadora engomada (2), Compactadora (2), motoconformadora (2), vibrocompactador (1) volquetas (3). Actividades realizadas Continuan labores de topografia para replanteo en el frame denominado EJE 401. Continuan las actividades de Alineamiento de los ejes de vivienda en los frames EJE 401 y EJE 402. Se continua con actividades de demolición de pavimento existente y cordones en EJE 401 entre abscisas Ko+000 al Ko+169.23. Se realizan labores de topografia y retiro de vivienda en frame EJE 5 abscisa Ko+341.5 al Ko+420.

Miercoles 28 de diciembre de 2022

Se presenta dia sabado

Personal de obra ingeniero Residente (2) Director de obra (1) Topografo (1) Maestro de obra (2) Cuadrilla de obra (3) oficial de obra (4). Maquinaria Retroexcavadora Engomada (2) Compactadora (1), vibrocompactador (1) Motoconformadora (2), volquetas (3) Actividades realizadas. Finalizan labores de topografia para replanteo en el frame denominado EJE 401 entre abscisas Ko+000 al Ko+169.23 y se da inicio en siguiente frame EJE 402 de intervención comprendido entre abscisas Ko+300.16 al Ko+329.8. Finalizan las actividades de Alineamiento de los ejes de vivienda en los frames EJE 401 y EJE 402. Finalizan actividades de demolición de pavimento existente pendiente en EJE 401 entre abscisas Ko+000 al Ko+169.230 y se da continuidad a esta actividad en frame EJE 402 comprendido entre abscisas Ko+300.16 y Ko+329.8 Se realizan las actividades de excavación de la tubería en EJE 401 entre abscisas Ko+000 al Ko+169.230 pena el suministro e instalación de rocka de acueducto con los siguientes accesorios de mangueras PP y collarin de derivación y rocka de alcantarillado con su respectivo accesorio domiciliario. Se van realizando los pozos de inspección - Pregunta de en este frame, este día se hizo también en frame EJE 5 abscisa Ko+341.5 al Ko+420, también para instalar

Plano

Jueves 29 de diciembre de 2022

Se presenta dia Sabado.

Personal de obra Ingeniero Residente (2) Director de obra (1) Topografo (1) maestro de obra (2). oficial de obra (4) Cuadrilla de obra (3)

Norma

Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), excavadora (1), minicargadora (1) vibrocompactador (1), Volqueta (3). Actividades Realizadas Continuar los excavaciones de la tubería en EJE 401 entre abscisas Km 0+70 al Km 0+169.23 para el Suministro e instalación de redes de acueducto con los respectivos accesorios de manguera PF y collarín de derivación y redes de alcantarillado con su respectiva tubería de acometidas domiciliarias. Simultáneamente se están realizando los pozos de inspección. Continua esta misma actividad en EJE 5 entre abscisas Km 0+341.51 al Km 0+420 también se realiza suministro plantilla en Km 0+326

Viernes 30 de diciembre de 2022

Se presenta día soleado

Personal de obra Ingeniero Residente (2), Director de obra (1), inspector de obra (2) Topografo (1), oficial de obra (4), ayudantes de obra (3). Maquinaria, excavadora (1) Retroexcavadora Cargadora (1), minicargadora (2) vibrocompactador (1). Actividades realizadas: Finalizan las labores de topografía para replanteo en el tramo denominado EJE 402 entre abscisas Km 0+304.16 al Km 0+329.8. Continuan las actividades de excavaciones de la tubería en EJE N.401 entre abscisas Km 0+70 al Km 0+169.23 para el suministro e instalación de redes de acueducto con sus respectivos accesorios de manguera PF y collarín de derivación y redes de alcantarillado con su respectiva tubería de acometidas domiciliarias. Inician actividades de terraplen en EJE 401 entre abscisas Km 0+70 al Km 0+169.23 en los sectores del tramo que se requiere, también se instala el empradizamiento en CAL, esta actividad se realiza también en EJE 5 entre abscisas Km 0+341.51 al Km 0+420. Continuan labores de construcción placa huella.

Sabado 31 de diciembre de 2022

Se Presenta día soleado.

Personal de obra Ingeniero Residente (2) Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (1) oficial de obra (4) Cuadrilla de obra (3) Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), excavadora (1) vibrocompactador (1), Volqueta (3) Actividades de obra Continuan actividades de terraplen en EJE 401 entre abscisas Km 0+70 al Km 0+169.23 para el suministro e instalación de redes de acueducto con los respectivos accesorios de manguera PF y collarín de derivación y redes de alcantarillado con sus respectivas tuberías de acometidas domiciliarias. Continuan actividades de topografía en EJE 401 abscisas Km 0+70 al Km 0+169.23 en los sectores del tramo se instala bordillo en el costado izquierdo de progresiva en Km 0+70 se toman muestras

de este material para ensaye de laboratorio en obra del Km 100 + Km 120 Esta actividad se continua realizando y finalizo en los días Km 94 + Km 120

Enero 01 del 2023 al Enero 09 de 2023
No se trabajo en obra por receso Celebraciones navideñas

Martes 10 de Enero de 2023
Se presenta día Soleado
Personal de obra ingeniero Residente (2) Practicante de obra (1) Topografo (1) Maestro de obra (2), Oficial de obra (4), Ayudante de obra (3), Maquinaria Motoconformadora Cargadora (2), excavadora Retroexcavadora (2), Minicargador (2), Volqueta (3). Actividades realizadas: Finalizo las actividades de Excavacion e instalacion de tuberia para el paso del trazo en Eje 401 entre abscisa Km 70 + Km 169.23. Finalizo las actividades de relleno en Eje 401 entre abscisa Km 70 + Km 169.23. Se inicio instalacion de Subbase granular en Eje 401 entre abscisa Km 70 + Km 169.23 el contratista en su informe mensual a Subbase granular en abscisa Km 70. Trabajo laborado en turno de 5 entre abscisa Km 94 + Km 120

Miercoles 11 de enero de 2023
Se presenta día Soleado
Personal de obra ingeniero Residente (2) Practicante de obra (1) Topografo (1) Maestro de obra (2) oficial de obra (4) ayudante de obra (3) Maquinaria Motoconformadora Cargadora (2) Excavadora (2), minicargador (2) volqueta (3). Actividades realizadas: Finalizo instalacion de subbase granular en Eje 401 entre abscisa Km 70 + Km 169.23 el contratista realizo transporte de material para ensaye de laboratorio de material subbase granular con abscisa Km 150. Se inicio trabajo pruebas de laboratorio CBR y proctor Eje 401 en abscisa Km 150 continua laborando Concreto en Eje 5 entre abscisa Km 94 + Km 120

Jueves 12, de enero de 2023
Se presento día Soleado
Personal de obra Ingeniero Residente (2) Director de obra (1)
Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrilla de obra (3) Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), excavadora (2)
Minicargador (2) vibrocompactador (1), volquetes (3) Actividades realizadas Se inicia la construccion de pavimentos y anclajes en Eje 401 entre abscisas Kotopo al Kot 169.23, el contratista en su control de calidad trajo muestra para ensayo de laboratorio a resistencia de concreto para pavimento en abscisa Ko to 30, continuan actividades de vaciado de concreto en eje 5 entre abscisas Kot 340.51 al Kot 340.


Viernes 13 de enero de 2023
Se presento día Soleado.
Personal de obra Ingeniero Residente (2), Director de obra (1), Topografo (1)
Maestro de obra (2), cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4) Maquinaria
Retroexcavadora, Cargadora (2), Excavadora (1), Minicargador (2),
Vibrocompactador (1), volquetes (3). Actividades realizadas, continua la construcción de pavimento y anclajes en EJE 401. entre abscisas Kotopo al Kot 169.23 Finaliza vaciado de concreto en eje 5 entre abscisas Kot 340.51 al Kot 340.

Sabado 14 de enero de 2023
Se presenta día Soleado
Personal de obra Ingeniero Residente (2) Director de obra (1), Topografo (1)
Maestro de obra (2), cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4)
Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2)
Volquetes (3). Actividades realizadas, Continua la construcion de pavimento y anclajes en Eje 401 entre abscisas Kotopo al Kot 169.23
El contratista realiza la toma de muestra para ensayo a resistencia de Mezcla de Concreto de pavimento, en abscisa Ko 0+20,

Lunes 16 de enero de 2023
Se presenta día Soleado
Personal de obra Ingeniero Residente (2) Director de obra (1), Topografo (1)
Maestro de obra (2), cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4) Maquinaria

242


Retroexcavadora cargadora (2), Excavadora (1), Minicargador (2), Vibrocompactador (1), volquetas (3). Actividades realizadas. Continua la construcción de pavimento y anderes en Eje 401 entre abscisas Km 0+0 al Km 1+169,23. Se realiza corte y aplicación de sello de juntas para pavimento en este Eje.



Martes 17 de enero de 2023

Se presenta día Soleado

Personal de obra Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrilla de obra (3). Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2), Vibrocompactador (1), volquetas (3). Actividades realizadas, Continua la construcción de pavimento y anderes en Eje 401 entre abscisas Km 0+0 al Km 1+169,23 Se realiza corte y aplicacion de Sello de juntas para pavimento.



Miercoles 18 de enero de 2023

Se presento día Soleado

Personal de obra ingeniero residente (2) Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (5) oficial de obra (4) Cuadrilla de obra (3). Maquinaria Retroexcavadora Excavadora (2), Excavadora (1), minicargador (2), Vibrocompactador (1), Volquetas (3) Actividades realizadas, Finalizo la Construccion de pavimento y anderes en Eje 401 entre abscisas Km 0+0 al Km 1+169,23. Se realiza corte y aplicación de Sello de juntas para Pavimento.





Jueves 19 de Enero de 2023

Se presento día Soleado.

Personal de obra ingeniero residente (2). Director de obra (1), Topografo (1), Maestro de obra (2) oficial de obra (4) cuadrilla de obra (3). Maquinaria: Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2) Vibrocompactador (1) volquetas (3). Actividades realizadas, proceso de actividades de tubería en Eje 402, se realizo excavacion en abscisa Km 3+14,16 al Km 3+25 para la instalación de codos de acuerdo con los respectivos procesos de manejo PE y entrega de documentos y redes de alcantarillado con su respectivo Retiro

Para acometida domiciliaria. Finalizando se va realizando la construccion de pozos de inspección.






Viernes 20 de enero de 2023

Se presenta dia Sabado

Personal de obra Ingeniero Residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria, retroexcavadora (2), Retroexcavadora Cargadora (2), compactador (2), Volqueta (7)

Actividades realizadas. Finalizan las actividades de excavacion de tuberia en Eje N. 402 entre abscisa Km 2+316 al Km 2+329,8 para el Suministro e instalacion de tubo de acueducto con los respectivos accesorios de drenaje PF y collarin de derivacion y pedir los alcantarillados para concreto de la respectiva tuberia de acometida domiciliaria. Se construye pozos de inspeccion.






Sabado 21 de enero de 2023

Se presenta dia Sabado

Personal de obra Ingeniero Residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2), Volquetes (3), Actividades realizadas. Se realizan las actividades de terraplen en eje 402, entre abscisa Km 2+316 al Km 2+329,8 en las tuberias respectivas, tambien se instala el empalmamiento en CPL. El contratista realiza tapar de nuestra pozo cuando dar lugar en instalacion de empalmamiento CPL en abscisa Km 2+316 y Km 2+315





Lunes 23 de enero de 2023

Se presenta dia Sabado

Personal de obra Ingeniero Residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Residente ambiental Cargadora (2), excavadora (1), minicargador (2), ambientador Volquetes (3), Actividades realizadas. Se realiza instalacion Subbase granular en eje 402 entre abscisa Km 2+316 al Km 2+329,8, se toman muestras para ensayo de laboratorio granulometria Subbase granular en abscisa Km 2+310 y Km 2+326. Se realiza tapar pozo para cruce laboratorio CPL y Eje 402 [illegible]

Martes 24 de enero de 2023

Se presenta día soleado.

Personal de obra ingeniero residente (2) Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2) oficial de obra (4), candelillo de obra (3), Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2) excavadora (1) minicargador (2), Volquetes (3)

Actividades Realizadas Se realizo la construccion de pavimento y andenes en Eje 402 entre abscisa Kot304.16 al Kot329.81, el contratista tomo muestra de laboratorio para ensayo a material de mezcla de concreto para pavimento En abscisa kot310 y Kot325. Se realizo corte y aplicacion de sello de juntas para pavimento.

Se llevo a cabo Comite tecnico en las instalaciones de la EDTB, Comite N.6 donde el tema a tratar es Suspension del contrato a partir del 25 de enero de 2023 debido al orden publico que imposibilita la ejecucion de la obra.

Martes 11 de abril de 2023

Se presento día soleado

Personal de obra Ingeniero residente de obra (2) Director de obra (1) Topografo (1) maestro de obra (2) oficial de obra (4), Candelillo de obra (3), Maquinaria Retroexcavadora cargadora (2), excavadora (1) minicargador (2), volquetes (3). Actividades realizadas, Mediante comite tecnico N.10 realizado el dia 11 de abril de 2023 Se da inicio a las actividades en obra, reanudando el presente dia. Realiza la construccion de pavimento y andenes en Eje 402 entre abscisa Kot304.16 al Kot329.81, el contratista realiza toma de muestra para ensayo de laboratorio a material de mezcla de concreto para pavimento en abscisa Kot310 y Kot325. Se realiza corte y aplicacion de sello de juntas para pavimento en todo Eje.

Miercoles 12 de abril de 2023

Se presenta día Soleado en la mañana, tarde lluvias a las 3 pm

Personal de obra ingeniero residente de obra (2) Director de obra (1) Topografo (1) maestro de obra (2) oficial de obra (4), candelillo de obra (3) Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2), excavadora (1) minicargador (2)

245

Vibrocompactador (1), Volquetes (3). Actividades de obra. Las lluvias que se presentaron impidieron generar labores en obra.

Jueves 13 de abril de 2023
Presenta día soleado
Personal de obra, ingeniero residente de obra (2), Director de obra (1)
Topografo (1), maestro de obra (2), Cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4)
Maquinaria, Vibrocompactador (1), Cargador (2), Excavadora (1), Volquete (3)
Excavadora (1), Retroexcavadora Cargadora (2). Actividad realizada.
Se realiza corte y aplicación de sello de juntas para pavimento en
Gr. 402

Viernes 14 de abril de 2023
Se presenta día soleado
Personal de obra, Ingeniero Residente de obra (2), Director de obra (1)
Topografo (1), maestro de obra (2), cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4)
Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), Volquete (3)
Minicargador (2), Vibrocompactador (2). Actividades de obra realizadas.
Se realizan labores de limpieza y aseo en los frentes de obra
El personal encargado de Seguridad y Salud en el trabajo realiza
Inspecciones de obra y delimitación de las áreas de trabajo.

Sabado 15 de abril de 2023
Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana
Personal de obra, Ingeniero Residente (2), Director de obra (1)
Topografo (1), Maestro de obra (2), Oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3)
Maquinaria, Vibrocompactador (1), Retroexcavadora Cargadora (2)
Minicargador (2), y volquetes (3). Actividades realizadas.
En horas de la mañana se presentaron lluvias intensas, no fue
posible realizar labores en Obra.

Viernes

Lunes 17 de abril de 2023
Se presenta día soleado
Personal de obra, Ingeniero Residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrillo de obra (3), Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), excavadora (1), Minicargador (2), Vibrocompactador (1) Volqueteos (3). Actividades Realizadas, Se da inicio en las actividades de excavación para Suministro e instalación de tubería pluvial en tramo de Intersección EJE N.301

Martes 18 de abril de 2023
Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana que impiden labores en obra. Personal de obra, Ingeniero Residente (2) Director de obra (1) Maestro de obra (2) Topografo (1), oficial de obra (4), cuadrillo de obra (3) Maquinaria, Retroexcavadora cargadora (2), excavadora (1), Minicargador (2) Vibrocompactador (1), volqueteos (3) Actividades realizadas: No se ejecutaron labores en obra, las lluvias presentadas impidieron las labores.

Miercoles 19 de abril de 2023
Se presenta día soleado
Personal de obra, Ingeniero Residente (2), Residente de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrillo de obra (3), Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), Minicargador (2), vibrocompactador (1), Volqueteos (3). Actividades Realizadas, Se realizan labores de limpieza y aseo en las frentes de obra, el personal encargado de seguridad y Salud en el trabajo realiza inspección en obra y delimitación de las áreas de trabajo.

Jueves 20 de abril de 2023
Se presenta día Soleado
Personal de obra, Ingeniero de obra (2), Director de obra (1) Topografo (1), maestro de obra (2), cuadrillo de obra (3) oficial de obra (4), Maquinaria, Retroexcavadora cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2), vibrocompactador (3), volqueteos (2) Actividades de obra, Continuan las actividades de excavación

Para suministro e instalación de tubería pluvial en frente de intervención denominado GJ N. 301.

Viernes 21 de abril de 2023

Lluvias intensas durante horas de la madrugada y se prolongan en la tarde. Personal de obra, Ingeniero residente (2), Director de obra (1) Oficial de obra (4), maestro de obra (2), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2) Volquetes Vibrocompactador. Actividades realizadas, No se labora, las lluvias presentadas de 4 am a 11 am impidieron el desarrollo de obra.

Sabado 22 de abril de 2023

Lluvias intensas, se presenta fuertes lluvias durante la madrugada Personal de obra, Ingeniero residente (2), Director de obra (1) Topografo (1) maestro de obra (2), Cuadrilla de obra (3), Oficial de obra (4), Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2) Excavadora (1), minicargador (2) Vibrocompactador (1), volquetes (3) Actividades realizadas, No se labora, Se presentan lluvias durante toda la mañana.

Lunes 24 de abril de 2023

Se presenta día Soleado

Personal de obra Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), Oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3) Maquinaria Retroexcavadora cargadora (2), Excavadora (1) Minicargador (2), Vibrocompactador (1), volquetes (3), Actividades realizadas Continuan las actividades de excavación, Para instalación de instalación de tuberia pluvial en frente de intervención denominado GJ N. 301. Se realiza Excavación para la construcción de Pozos pluviales requeridos.

Martes 25 de abril de 2023

Se presentan lluvias intensas en horas de la mañana, 4 am hasta 10:30 am

Personal de obra. Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrillas de obra (3), Maquinaria, Excavadora (1), Retroexcavadora Cargadora (2), minicargador (2), Vibrocompactador (1), volquetas (3). Actividades realizadas: No se ejecutaron actividades de obra, las horas presentadas no permitieron (6) labores en campo.

Miercoles 26 de abril de 2023

Se presenta día Soleado

Personal de obra Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1), Maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrilla de obra (3), Maquinaria, Excavadora (1), vibrocompactador (1), Retroexcavadora Cargadora (2), minicargador (2) Volquetas (3) Actividades realizadas, Se realizan labores de limpieza y aseo en las frentes de obra, el personal encargado de Seguridad y salud en el trabajo realiza inspección en obra.

Jueves, 27 de abril de 2023

Se presenta día Soleado

Personal de obra Ingeniero residente (2) Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3) Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2), volquetas (3) Actividades realizadas, Continuan las actividades de excavacion para suministro e instalacion de tuberia pluvial en frente Eje N. 3&1. Se realiza Semanalmente en esta actividad la construccion de los pozos.

Viernes, 28 de abril de 2023

Se presenta día Soleado.

Personal de obra Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), Oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria, Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), minicargador (2), Vibrocompactador (1), Volquetas (3). Actividades realizadas, Finalizan las actividades de excavacion e instalacion de tuberia pluvial en frente de intervencion

Norma

Senamurado Cje N, 301. Se realizo Simultaneamente la actividad la construcción de los pozos pluviales requeridos.

Sabado, 29 de abril de 2023

Se presenta dia Sabado

Personal de obra ingeniero residente (2), oficial de obra (4), Director de obra (1) Cuadrilla de obra (3), maestro de obra (2), Mayordomo, Retroexcavadora Cargador (2), excavadora (1), mini cargador (2), vibrocompactador (1), Volquetes (3) Actividades realizada Se realizan los pozos de inspección para el sistema de red pluvial proyectada en tramo de intersección Cje 301.

Lunes, 01 de mayo de 2023

Se presentan lluvias en horas de la madrugada 3 am a hora am Personal de obra ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), Cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4), Mayordomo Retroexcavadora Cargador (2), excavador (1) mini cargador (2), volquete (3) No se ejecutaron labores de obra por lluvias presentadas durante las horas de la mañana.

Martes, 02 de mayo de 2023


Se presentaron lluvias en horas de la madrugada de 4 am a 9 Joam Personal de obra ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), cuadrilla de obra (3) Mayordomo, Retroexcavadora Cargador (2), excavadora (1) mini cargador (2), vibrocompactador (1), volquete (3) No se ejecutaron labores de obra por causa de lluvias presentadas en horas de la madrugada.

Miercoles 03 de mayo de 2023

Se presenta dia laborado

Personal de obra, ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4), maestro de obra (2)

Maquinaria Retroexcavadora Cargadora (2), Excavadora (1), Mezcladora (2) Vibrocompactador (1), Volquetes (3). Actividades realizadas se continua con la construcción de los pozos de inspección para el sistema de red pluvial proyectado en tramo eje 301.



Jueves 04 de mayo de 2023

Se presenta día Soleado

Personal de obra ingeniero residente (2) Director de obra (1) Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3) Maquinaria, Excavadora (1) Retroexcavadora Cargadora (2), Mezcladora (2), Vibrocompactador (1), volquetes (3). Actividades relacionadas, Se continua con la construcción de los pozos de inspección para el sistema de red pluvial Proyectado en tramo eje 301.






Viernes 05 de mayo de 2023

Se presento día Soleado

Personal de obra Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria, Excavadora (1), Retroexcavadora Cargadora (2), Mezcladora (2), Vibrocompactador (1) Actividades realizadas, Finaliza la construcción de los pozos de inspección para el Sistema de red pluvial Proyectado en tramo eje 301.





Sabado, 06 de mayo de 2023

Se presentan dias lluviosos, lluvia intensa en horas de la mañana. Personal de obra, ingeniero residente (2), oficial de obra (4), Topografo (1) Director de obra (1), Cuadrilla de obra, Maquinaria, Retroexcavadora cargadora (2) Excavadora (1), mezcladora (2), vibrocompactador, volquetes (3). Actividades realizadas, No se ejecutaron actividades en obra, las lluvias presentadas impedieron la ejecución de labores en obra.





Lunes 08 de mayo de 2023

Se presentan lluvias intensas desde las 4 am hasta las 11 am

Personal de Obra ingeniero residente (2) Director de obra (1)

Norma

Topografo (1) maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria, excavadora (1), Retroexcavadora cargadora (2), minicargadora (2), Vibrocompactador (1), Volquetes (3). Actividades realizadas. No se ejecutan actividades en obra, la fuertes lluvias impidieron los labores en obra

Martes, 09 de mayo de 2023

Se presentan lluvias intensas desde las 4:30 a.m hasta las 10 a.m. Personal de obra, Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) Maestro de obra. (3), oficial de obra (4), Cuadrillo de obra. (3). Maquinaria, Excavadora (1), Retroexcavadora Cargadora (2), Vibrocompactador (1) minicargador (2) No se laboro, las lluvias presentadas impidieron el desarrollo de las actividades de obra.

Miercoles, 10 de mayo de 2023

Se presenta día soleado

Personal de obra, Ingeniero residente (2), Director de obra (1), Topografo (1) maestro de obra (2), Cuadrilla de obra (3), oficial de obra (4), Maquinaria, Excavadora (1), Retroexcavadora cargadora (2) minicargador (2) Vibrocompactador (1), volquetes (3), Actividades realizadas, Se realizan labores de limpieza y aseo en los frentes de obra, el personal encargado de Seguridad y Salud en el trabajo realiza la inspección en obra y delimitacion de areas de trabajo.

Jueves, 11 de mayo de 2023

Se presenta día soleado

Personal de obra, ingeniero residente (2), Director de obra (1), topografo (1) Maestro de obra (2), oficial de obra (4), Cuadrilla de obra (3), Maquinaria, Excavadora (1), Retroexcavadora, cargadora (2) minicargador (2), volquete (3) Vibrocompactador (1), Actividades realizadas, Se inician labores de topografia para replanteo del tramo comprendido Este 404 y 405. Tambien Se inician las actividades de delimitamiento de los aceras de ambos lados de los tramos Este 404 y Este 3, calle Distrital, Cuadrilla y calle Lopez Arellano, y se da a entender abastecimiento de materiales faltantes para ejecución en obra (Km 3+865.23 al Km 3+923.62)

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 12. REGISTRO FOTOGRAFICO

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 49 #44-38 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	1	DE	3	
EJE Nº 301 PLUVIAL			DESDE	17 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	2	DE	3

EJE N° 301 PLUVIAL	DESDE	17 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"

254


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	3 DE 3

EJE N° 301 PLUVIAL	DESDE	17 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA				



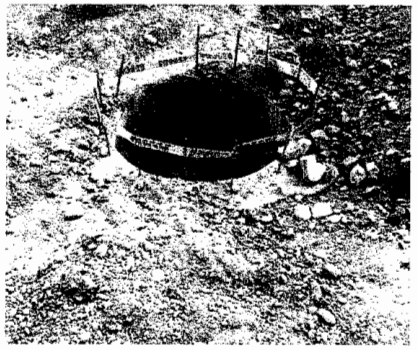

Descripción: Pozos de inspecion D=1.20

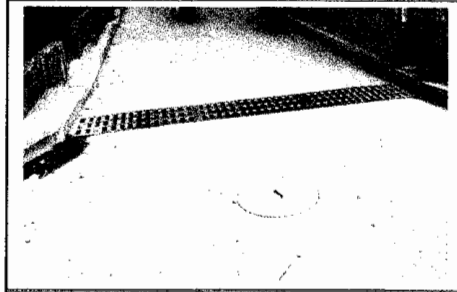



Descripción: Rejillas Transversales para sistema Pluvial ST


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 9	

EJE Nº 402	DESDE	29 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO RISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera colliza cada 3 mts

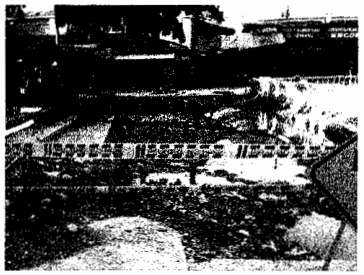




Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	2	DE	9	
EJE Nº 402		DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA		11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERFLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



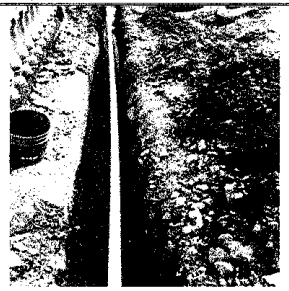

Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

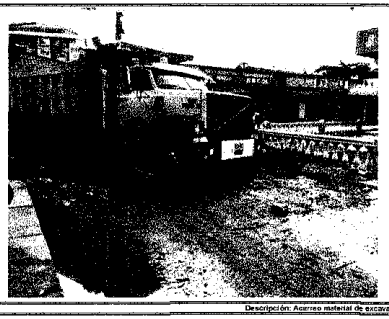



Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		VERSIÓN	1
			PAGINA	3 DE 9

EJE Nº 402	DESDE	28 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO MISPIRUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Grava-Arcillosa) para suelo estabilizado con CAL

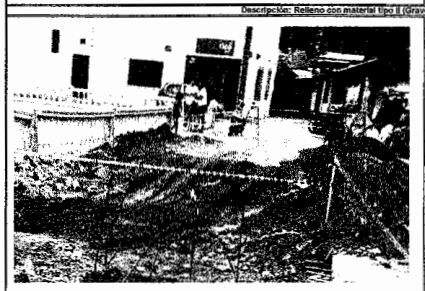

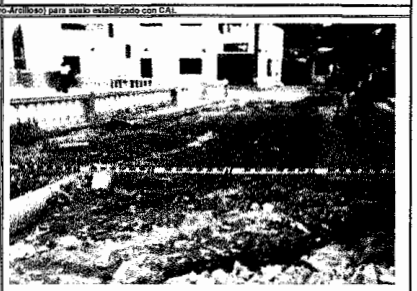

Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.


252


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	4 DE 9

EJE Nº 402	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

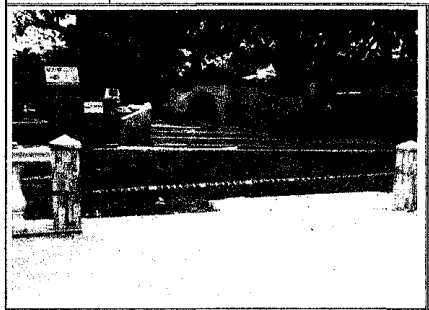

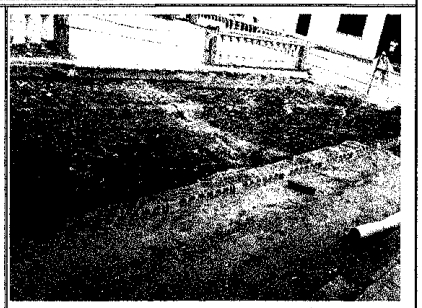

Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería de Alcantarillado.



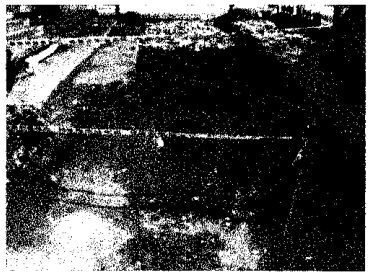


Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.


	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	5	DE	9
EJE N° 402		DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PROPIETARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



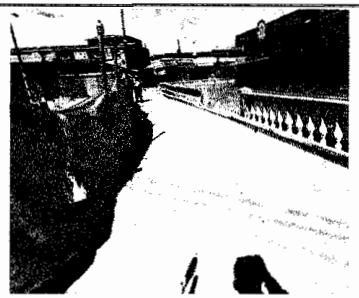

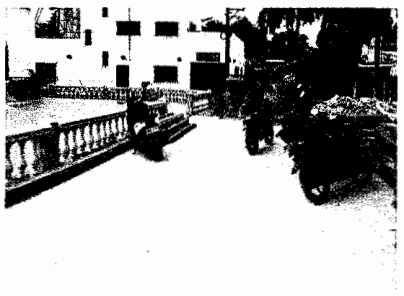





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN		1	
								PAGINA	6	DE	9
EJE N° 402		DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA		11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



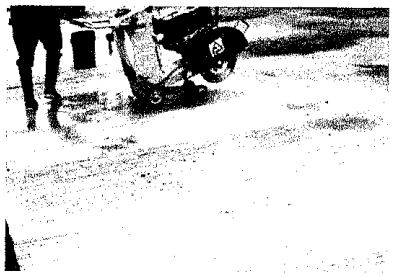

Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar



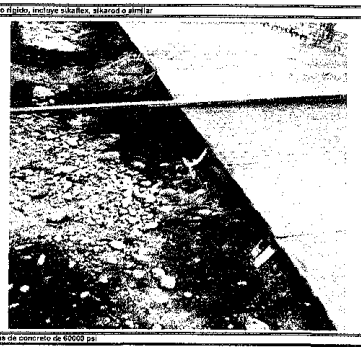


Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	7	DE	8

EJE Nº 402	DESDE	30 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	11 (Día)	4 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

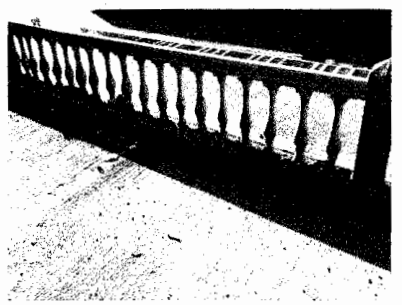

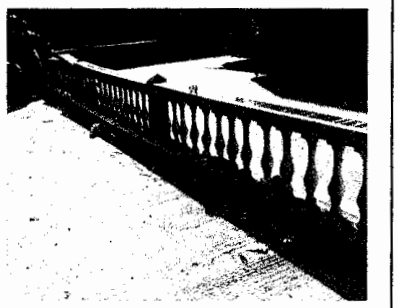

Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)



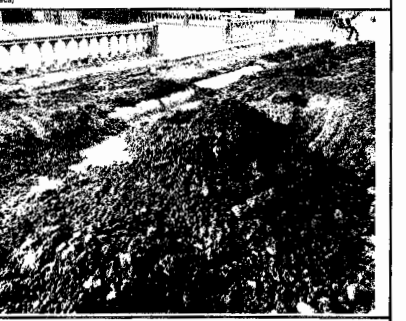


Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN		1		
								PAGINA	8	DE	9	
EJE N° 402		DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA		11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)		


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA				



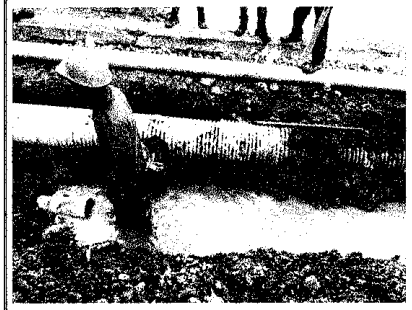

Descripción: Suministro e Instalacion tubería en PVC Novafort 16"

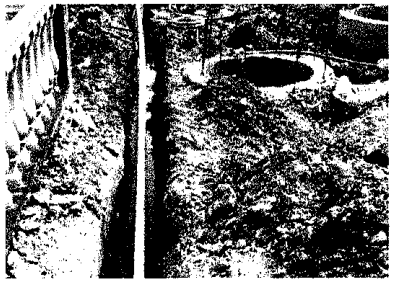

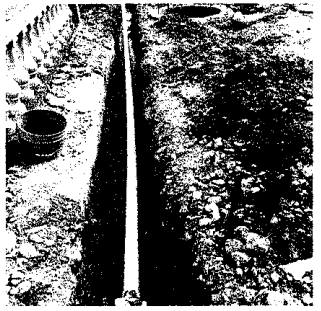

Descripción: Suministro e Instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
						VERSIÓN	1			
						PAGINA	9	DE	9	

EJE Nº 402	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	11 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



Descripción: Pozos de inspeccion D=1,20






Descripción: Tapas de concreto D=1,20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	28 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

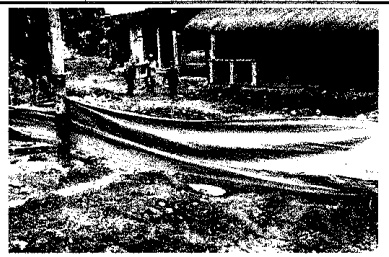



Descripción: Malla de cerramiento (tela adhiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	2	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMURE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+159,23)	DESDE	28 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Corte de pavimento Rigido





Descripción: Corte de pavimento Rigido

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	4 DE 17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+189,23)	DESDE	28 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	(Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts






Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	5	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	28 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

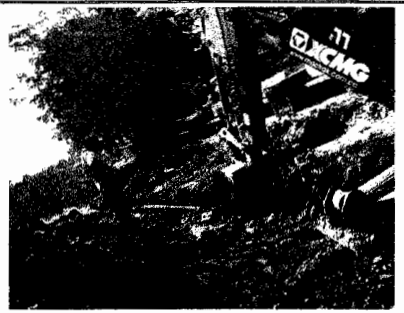



Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN	1		
								PAGINA	6	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	7	DE	17
EJE N° 401 (K0+070 - K0+189,23)		DESDE	25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Grava-Arcillosa) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	8	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería de Alcantarillado.






Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	9	DE	17

EJE Nº 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	16 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

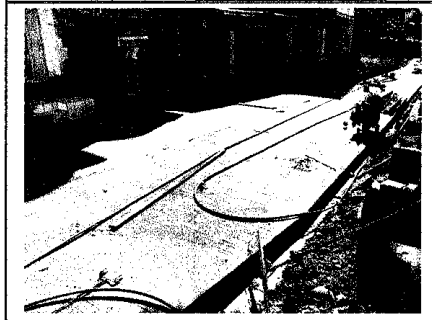



Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.



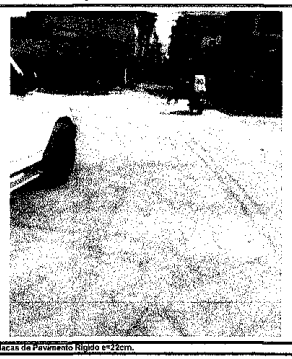


Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	10 DE 17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	16 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

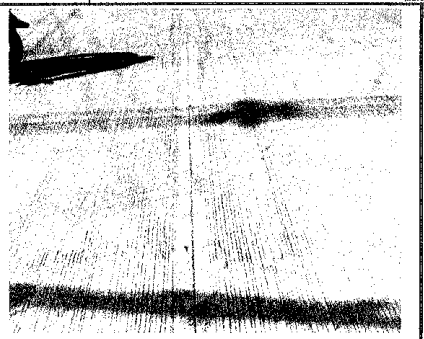

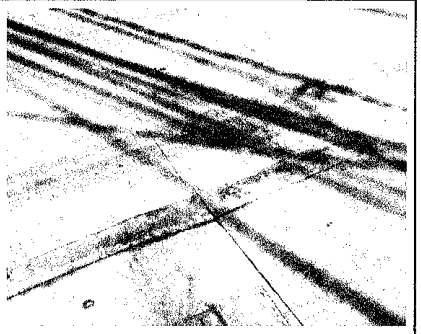

Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar

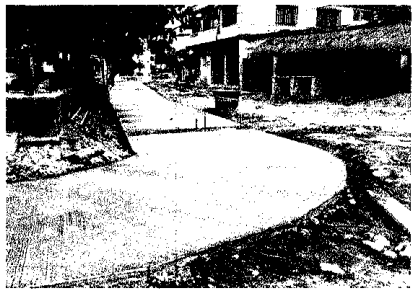

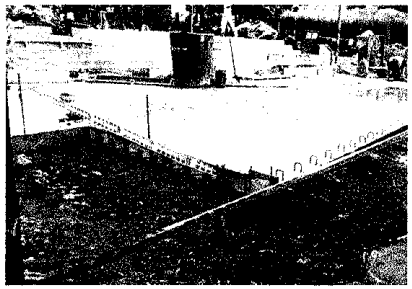

Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	11	DE	17

EJE Nº 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 45000 psi





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.16 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Diferentes cada placa)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN	1		
								PAGINA	12	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

I. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)



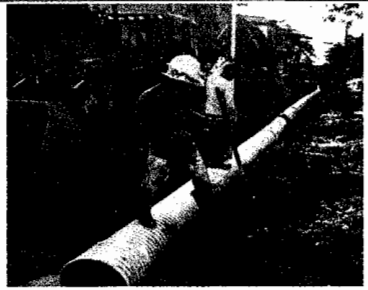

Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 16"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	13 DE 17

EJE N° 461 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	16 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE, ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"


274

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	14	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	16 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

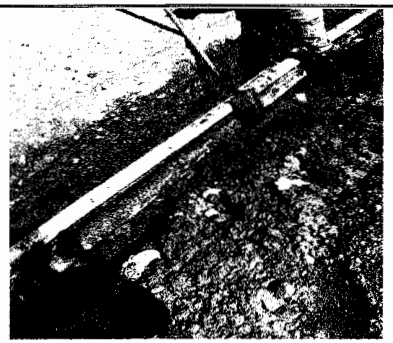



Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"





Descripción: Pozos de inspección D=1.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	15 DE 17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+168,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NESPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Cajas para acometidas Domiciliarias





Descripción: Tapas de concreto D=1,20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN	1			
								PAGINA	16	DE	17	

EJE N° 401 (K0+079 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: TUBERIA PVC Ø 160 mm (incluya accesorios, hidrosellos y lubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias





Descripción: KIT SILLA YEE 28" x 06" INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	17	DE	17

EJE N° 401 (K0+070 - K0+169,23)	DESDE	26 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	18 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



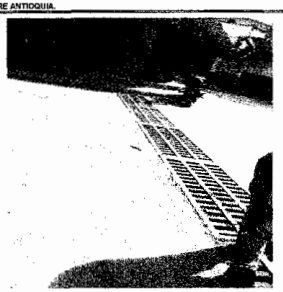

Descripción: Rejillas Transversales para sistema Pluvial ST



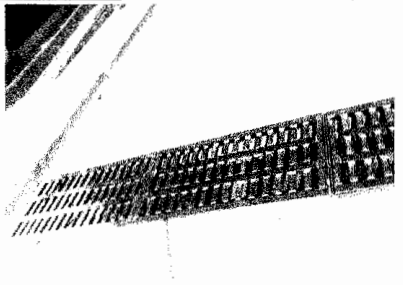

Descripción: Rejillas Transversales para sistema Pluvial ST

127


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+070 Y K0+160,23 - K0+304,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



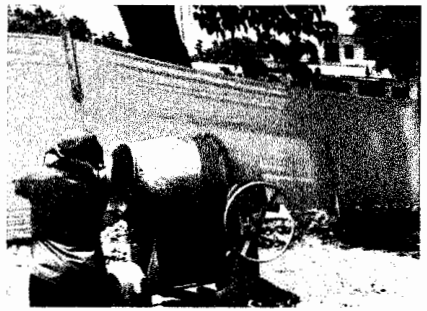

Descripción: Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	2	DE	15	
EJE N° 401 (K0+00 - K0+070 Y K0+169,23 - K0+364,16)		DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA		15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.






Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									VERSIÓN	1		
										PAGINA	3	DE	15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+070 Y K0+169,23 - K0+304,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

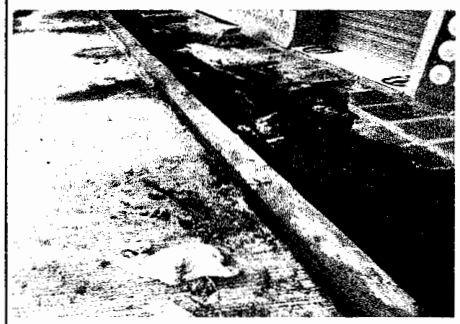



Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material comun de 0,0 - 2,0 mts





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	4 DE 15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+070 Y K0+169,23 - K0+384,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)



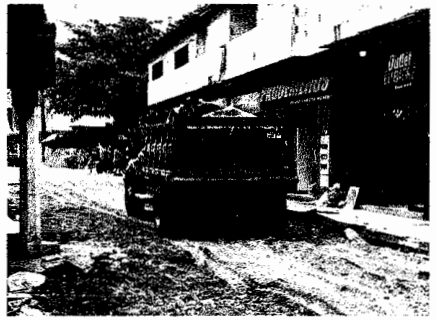


Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		VERSIÓN	1		
			PAGINA	5	DE	15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+079 Y K0+169,73 - K0+364,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		

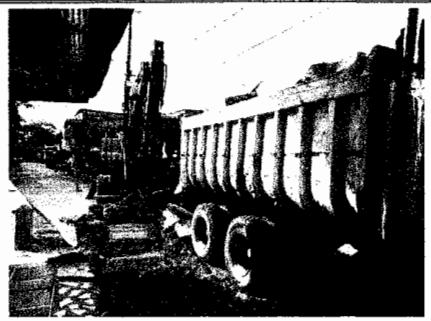



Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (lackyo cargue y Transporte)






Descripción: Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	6	DE	15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+070 Y K0+169,23 - K0+304,18)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

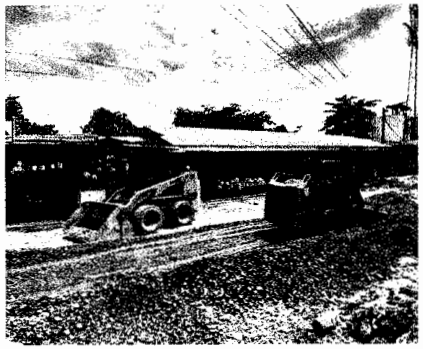

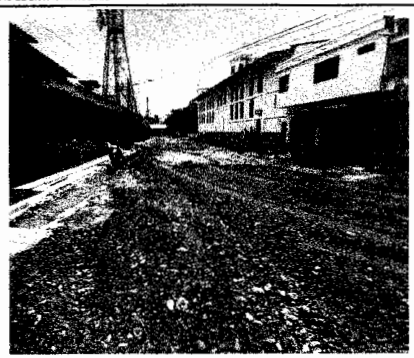

Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.



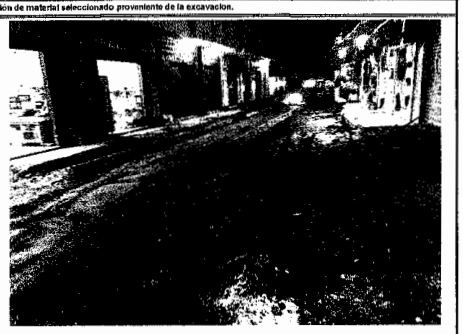

Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tubería de Alcantarillado.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	7	DE	15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+978 Y K0+189,23 - K0+384,19)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.



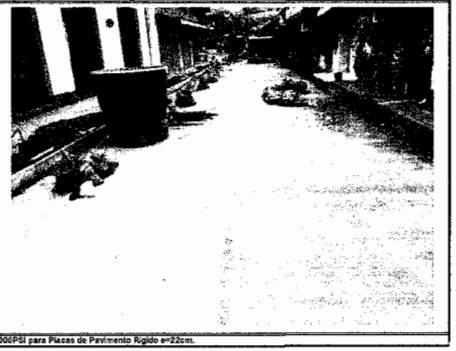


Descripción: Suministro e instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	8 DE 15

EJE N° 481 (K0+00 - K0+070 Y K0+189,23 - K0+304,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	020 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DORVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

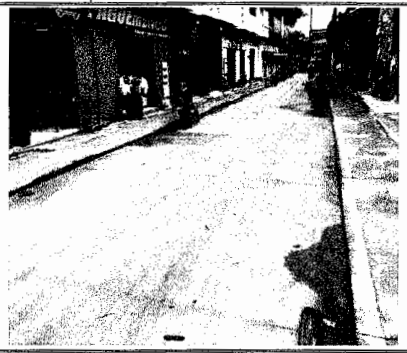



Descripción: Suministro e instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.





Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rigido, incluye sikaflex, sikarod o similar


289

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	9	DE	15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+979 Y K0+189,23 - K0+304,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

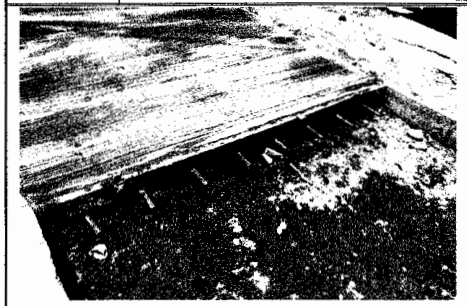



Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

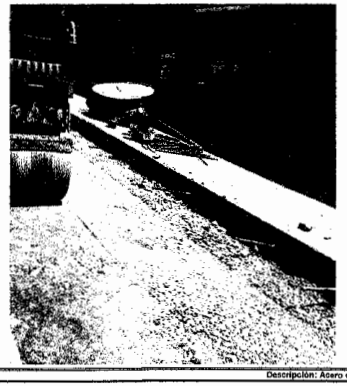



Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	10 DE 15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+070 Y K0+109,23 - K0+384,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOINER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



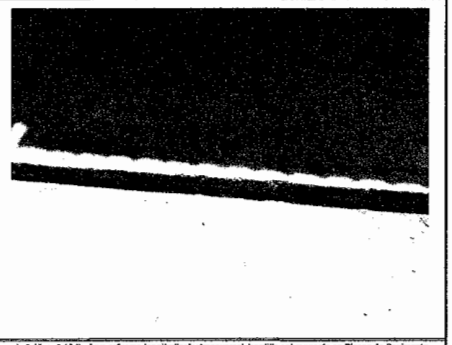

Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)





Descripción: Anden en concreto de 3000 PSI e=0,15mts (incluye malla electrosoldada) incluye linea de losetas tipo braile y rampas de acceso de movilidad reducida

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		VERSIÓN	1
		PAGINA	11 DE 15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+970 Y K0+169,23 - K0+304,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalación tubería en PVC Novafort 8"






Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	12	DE	15

EJE N° 401 (K0+000 - K0+070 Y K0+169,23 - K0+384,16)	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

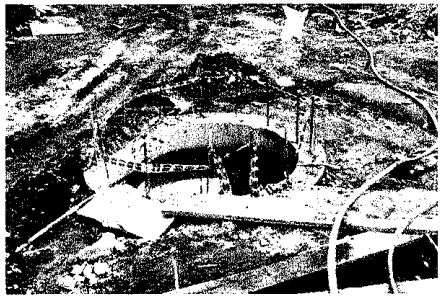

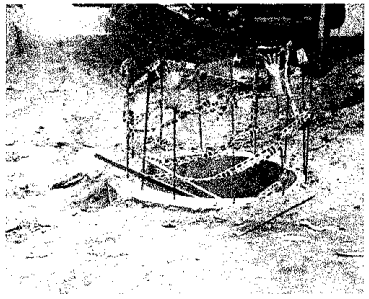

Descripción: Pozos de Inspección D=1.20

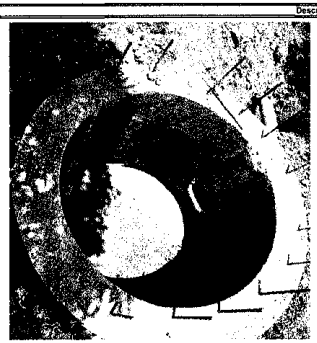

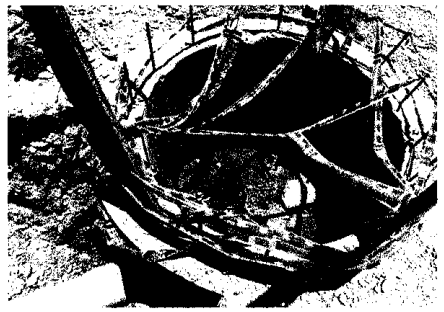


Descripción: Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspección D=1.20, e=0.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN		1		
							PAGINA	13	DE	15	
EJE N° 401 (K0+00 - K0+078 Y K0+169,23 - K0+304,16)		DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA		15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

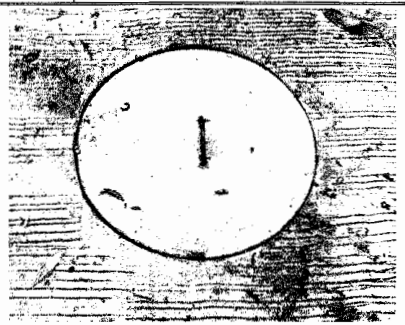



Descripción: Tapas de concreto D=1.20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto

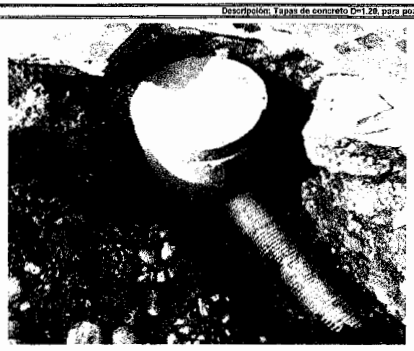



Descripción: TUBERIA PVC Ø 160 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	14	DE	15

EJE Nº 401	DESDE	25 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: KIT SILLA YEE Ø4" x Ø8" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)






Descripción: Cajas para acometidas Domiciliarias


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	15	DE	15

EJE N° 401 (K0+00 - K0+870 Y K0+169,23 - K0+304,16)	DESDE	29 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	15 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

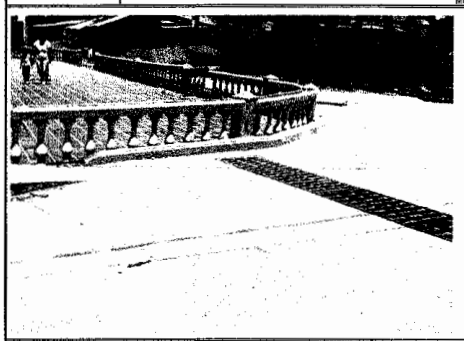

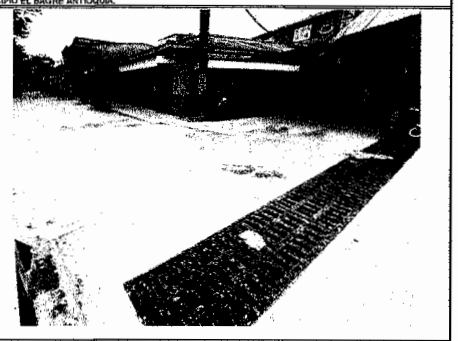

Descripción: Rejillas Transversales para sistema Pluvial ST

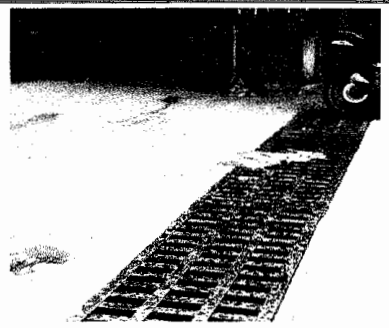



Descripción: Rejillas Transversales para sistema Pluvial ST

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	3

EJE N° 5 PLUVIAL	DESDE	26 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	24 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

294

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	2 DE 3

EJE N° 5 PLUVIAL	DESDE	26 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	24 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tubería en PVC Novafort 8"





Descripción: Suministro e instalacion tubería en PVC Novafort 8"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	3	DE	3

EJE N° 5 PLUVIAL	DESDE	28 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	24 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalación de Rejilla SL



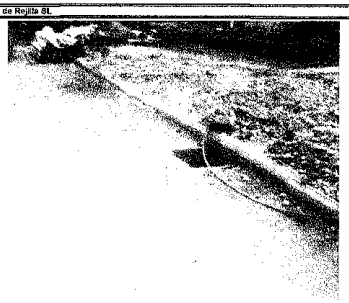

Descripción: Suministro e instalación de Rejilla SL

202


	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN	1			
								PAGINA	1	DE	3	

EJE Nº 2 PLUVIAL	DESDE	28 (Día)	10 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	16 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO MISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



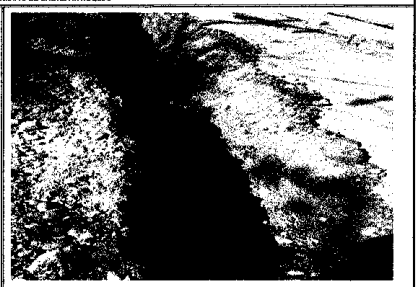

Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)






Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	2	DE	3	
EJE N° 2 PLUVIAL		DESDE	28 (Día)	10 (Mes)	2022 (Año)	HASTA		16 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NIEBREUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

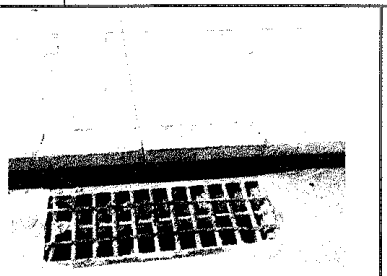



Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

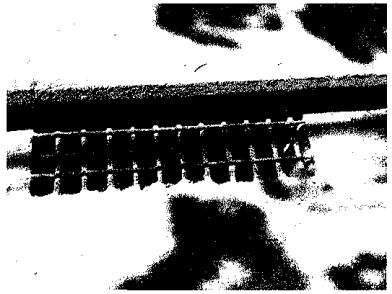

Descripción: Suministro e instalacion de rejilla SL para sistema pluvial

301

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		VERSIÓN	1
		PAGINA	3 DE 3

EJE N° 301 FLUVIAL	DESDE	17 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	9 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y FRONTALES DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e Instalacion tuberia en PVC Novafort 8"





Descripción: Suministro e Instalacion tuberia en PVC Novafort 8"

302

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

EJE N° 1 PLUVIAL	DESDE	25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	24 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	005 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)






Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	2	DE	3	

EJE N° 6 PLUVIAL	DESDE	26 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	24 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

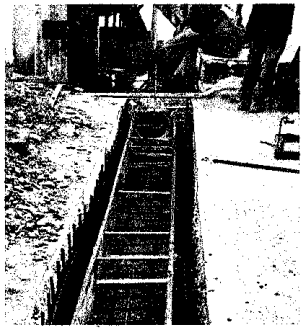

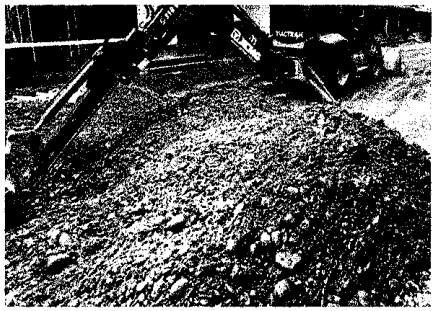

Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia de Alcantarillado.

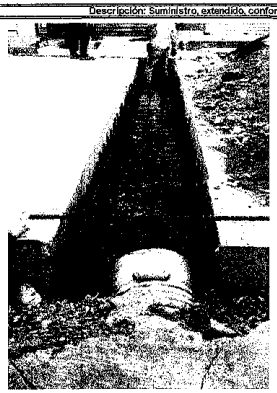




Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 12"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	3	DE	3

EJE N° 5 PLUVIAL	DESDE	26 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	24 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO MISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

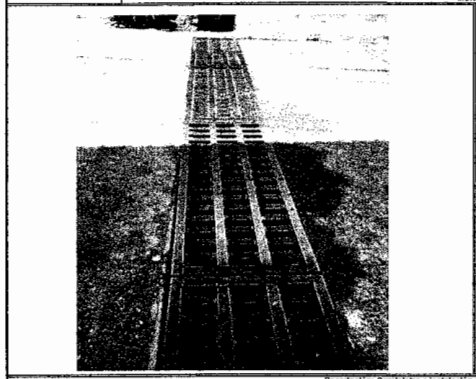



Descripción: Suministro e instalación de Rejilla Sumidero Transversal ST

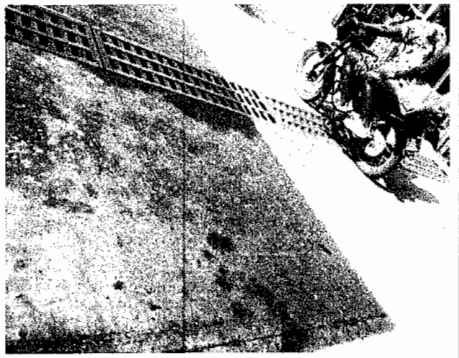



	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	1	DE	16

EJE 5 (K0+341,5 Al, K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Malla de cerramiento (tela adfitiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 16

EJE 5 (K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.



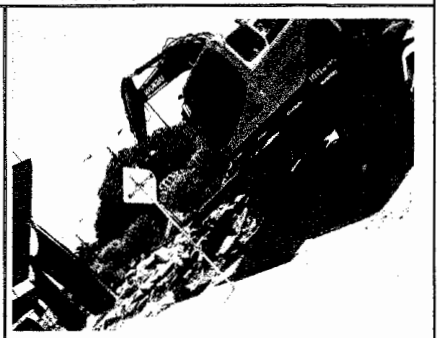

Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	3 DE 18

EJE E(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	(Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DORVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.






Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	4	DE	18	

EJE 6(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

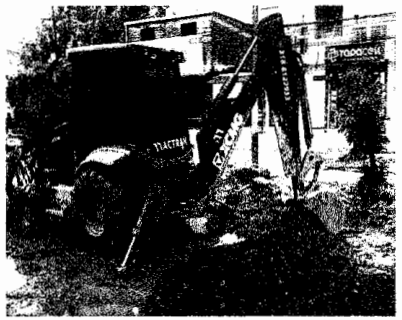

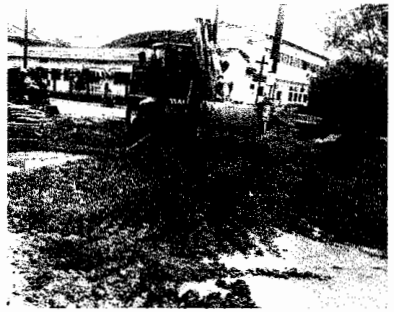

Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)

309

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	5	DE	18	

EJE 6(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN	1			
								PAGINA	6	DE	18	
EJE 6(K0+341,6 AL K0+420)		DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)			

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Grava-Arcillosa) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

311

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	7	DE	18

EJE 6(K8+341,5 AL K8+430)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia de Alcantarillado.



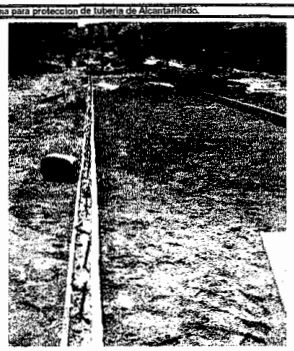

Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	8	DE	18

EJE 5(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO MISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.






Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	9 DE 18

EJE 6(K0+341,6 AL K0+429)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

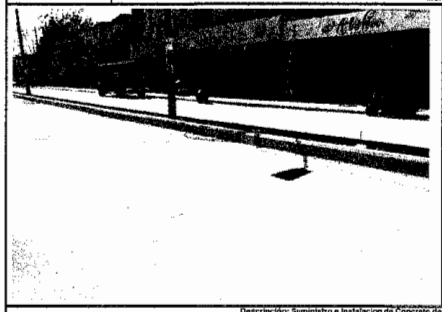

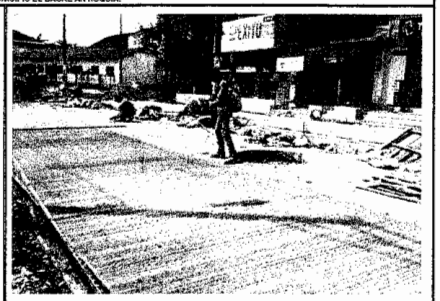

Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.






Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.


	REGISTRO FOTOGRÁFICO		VERSIÓN	1	
			PAGINA	10 DE 18	

EJE 6(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

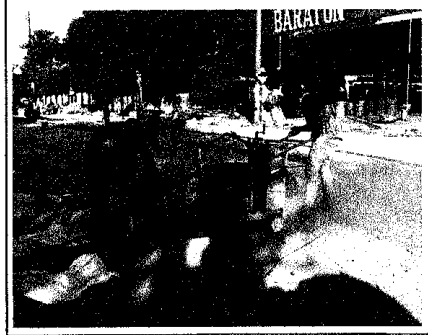

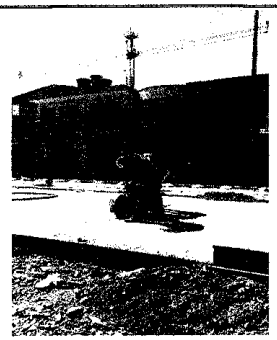

Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar

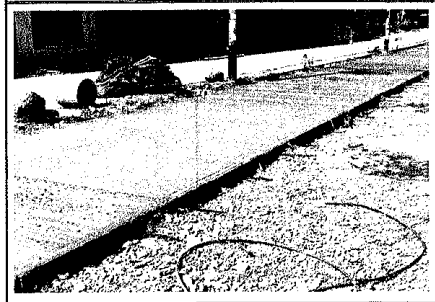

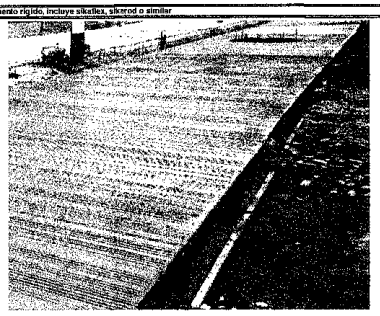

Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 68000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	11	DE	18

EJE 5(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



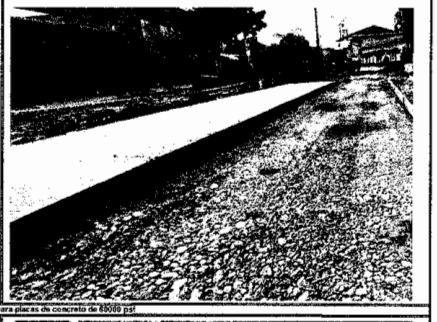

Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi






Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	12	DE	18


EJE 5(K0+341,6 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

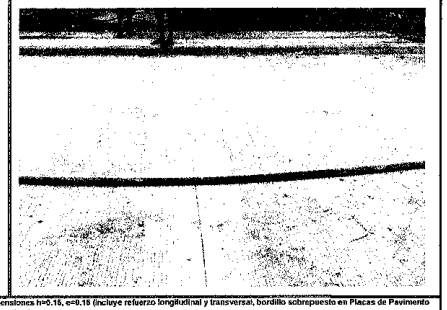

Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

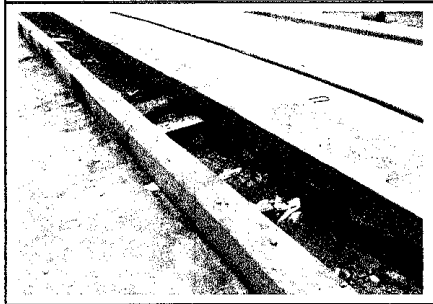

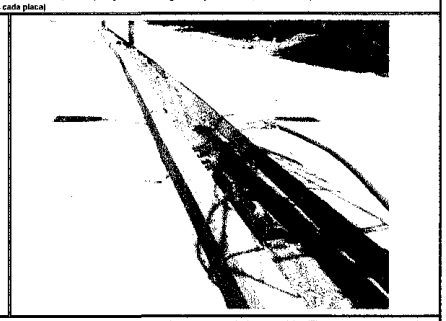



Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN	1			
								PAGINA	13	DE	18	
EJE 5(K0+341,5 AL K0+420)		DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)			


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO INSPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				

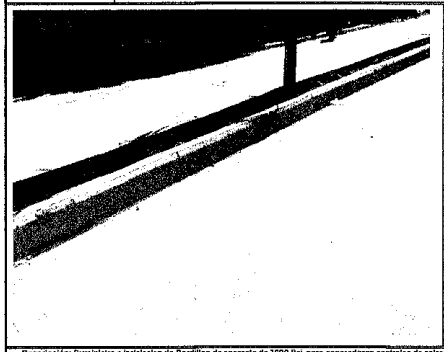

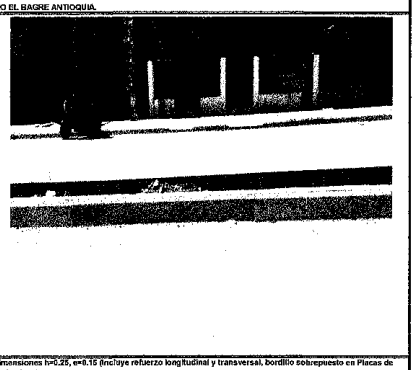

Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

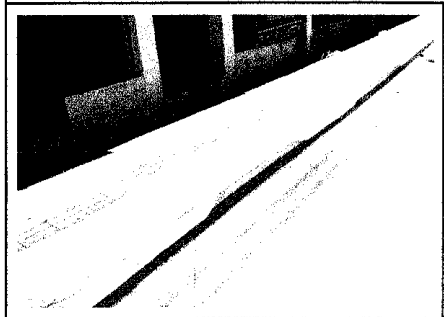



Descripción: Andén en concreto de 3000 PSI e=0,15mts (incluye malla electrosoldada) incluye linea de losetas tipo braille y rampas de acceso de movilidad reducida

215

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	14 DE 18

EJE 5(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Anden en concreto de 3000 PSI e=8, 16mts (incluye malla electrosoldada) incluye linea de losetas tipo braille y rampas de acceso de movilidad reducida

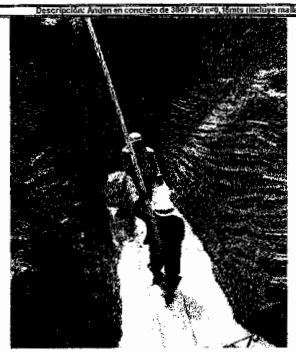



Descripción: Suministro e instalacion tubería en PVC Novafort 16"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN	1		
								PAGINA	15	DE	16

EJE 5(K0+34 LS AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalación tubería en PVC Novafort 14"





Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 4"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		VERSIÓN	1	
			PAGINA	16	DE 16

EJE 6(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	095 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				






Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 6"







Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN		1		
								PAGINA	17	DE	18	
EJE 6(K9+341,5 AL K8+428)			DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES												
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE		CONTRATO N°	029 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		CONTRATO N°	035 DE 2022								
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.											

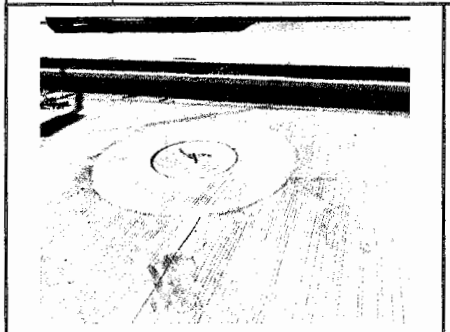

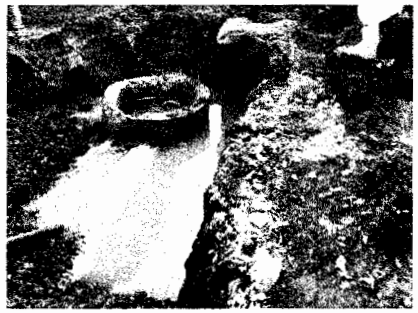

Descripción: Pozos de Inspeccion D=1.20

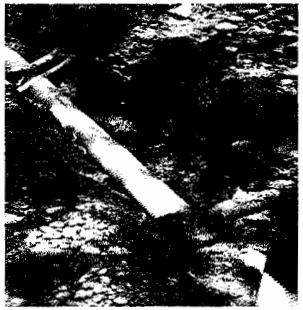



Descripción: TUBERIA PVC Ø 160 mm (incluye accesorios, hidrosellos y fabricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1	
		PAGINA	18 DE 18	

EJE 6(K0+341,5 AL K0+420)	DESDE	27 (Día)	12 (Mes)	22 (Año)	HASTA	13 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO HISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: KIT SILLA YEE Ø16" x 66" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)





Descripción: KIT SILLA YEE Ø14" x 66" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No.3

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DEL 25 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO / 11 DE ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2023

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Barrio [illegible] - Zona Urbana
El Bagre - Antioquia

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3.1. Localización 5
3.2. Ubicación del proyecto 6
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. Cerramiento y señalización en obra 9
4.2. Capacitación personal de obra 12
4.3. Inducción y reinducción de personal 13
4.4. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP 14
4.5. Manejo de maquinaria y equipos 14
4.6. Acompañamiento al personal de obra 16
5. Personal vinculado en obra 16
5.1. Incidentes 18
5.2. Accidentes de trabajo 18
5.3. Análisis de ausentismo 19
5.4. Análisis de accidentalidad 22
6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 23
7. CONCLUSIONES 23

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ELABORADO POR:	AURA MARIA PEDROZO	**CARGO:**	SISO
FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2022	**PERIODO:**	25 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO / 11 DE ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2023
TARJETA PROFESIONAL	Resolución No.0014 del 11 de enero de 2022	**FIRMA**	Aura Maria Pedrozo

1. INTRODUCCIÓN

Los lineamientos establecidos son planteados como una herramienta técnica para el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

En desarrollo de las funciones a realizar por parte del contratista, se elaboró el presente informe mensual que contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo del 25 de diciembre de 2022 al 24 de enero de 2023 y del 11 de abril al 10 de mayo de 2023, con el fin de dar cumplimiento las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contrato objeto: ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento en el reporte, registros e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; además, se debe verificar el seguimiento del programa de Bioseguridad por recomendación de las autoridades médicas a nivel nacional y departamental, así mismo controlar y supervisar el uso adecuado de los elementos de protección personal suministrados por el contratista para el contrato de obra No. 029 de 2022.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar control y seguimiento al personal de obra durante la ejecución del proyecto.
- Promover el buen uso de los elementos de protección personal
- Fomentar orden y aseo a los puntos de trabajo
- Garantizar la seguridad del personal de obra y la maquinaria que se encuentra desarrollando labores en obra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

3.1. Localización



Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas 7°36'17"N 74°48'31"O, aproximadamente. En la Figura 2 se presenta la localización general de los tramos de vía correspondiente al proyecto, acorde con los tramos de diseño proyectados.

3.2. Ubicación del proyecto

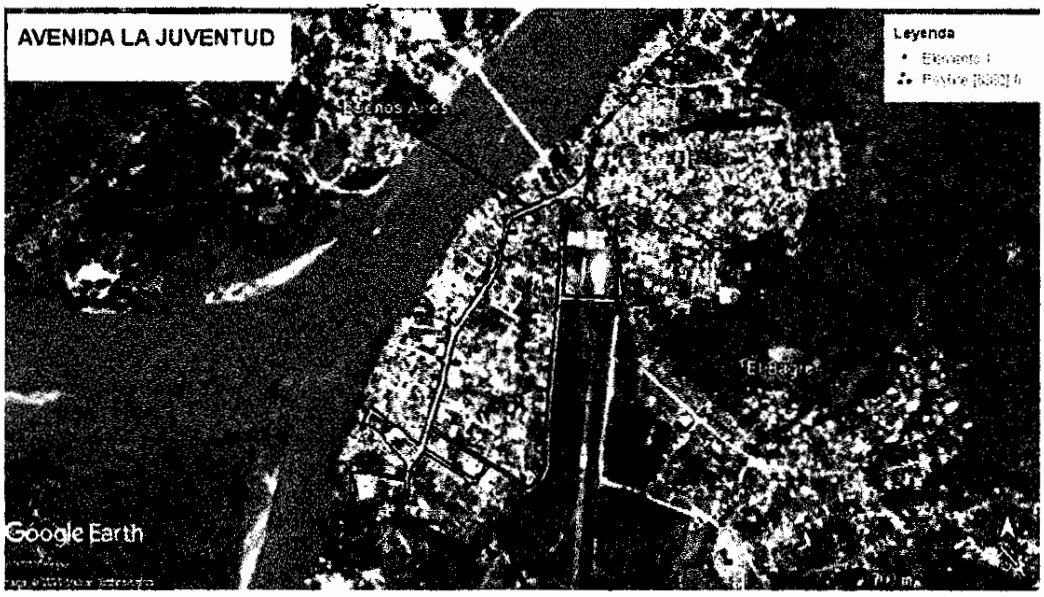


Figura 2. Localización vía de estudio (fuente: google earth)

El área en estudio está ubicada en la zona urbana del municipio de El Bagre. Este proyecto de vía tiene influencia en todo el municipio debido a la intervención en zona comercial el cual beneficiaria a toda la población del municipio directa e indirectamente.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Evaluación de Riesgos y Peligros Laborales, es un instrumento para la tipificación, análisis, valoración, priorización y establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en las diferentes actividades que se realizan en las organizaciones públicas y privadas, que por lo general ocasionan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que afectan a sus colaboradores.

Con la finalidad de identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para el establecimiento de procedimientos de evaluación y control de los factores de riesgos laborales que pudieran presentarse en las distintas actividades que se realicen en la ejecución del contrato ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.*** se llevó a cabo el siguiente control y seguimiento, presentando en el siguiente informe las diferentes acciones de control y vigilancia desarrolladas por el contratista.

Durante el desarrollo del presente periodo, el contratista realizo labores en obra de demolición excavación y diferentes actividades pertenecientes a la ejecución de pavimento rígido. El profesional encargado de seguridad y salud en el trabajo implemento un seguimiento diario de las actividades desarrolladas durante la jornada laboral, donde se inspecciono los equipos y maquinarias utilizadas para garantizar las óptimas condiciones, también se verifico el uso correcto de los EPP por parte de los trabajadores.

Se continuo con las medidas de seguridad establecidas para cada tramo de intervención, se mantiene cerramiento perimetral con lona verde para evitar el ingreso de personal no autorizado a los puntos en los cuales se está trabajando y a su vez, proteger las viviendas y negocios aledaños.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista realizo la compra y acopio de materiales tipo cemento y varilla de acero, estos insumos se almacenaron en los puntos de almacenamiento de materiales establecido por el contratista, se manejan medidas preventivas para evitar posibles situaciones que pongan en riesgo al personal de obra y a la comunidad aledaña a los sitios:

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- Eliminación y evacuación de los residuos y escombros.

Para el proyecto en desarrollo, los centros de acopio cuentan con cubierta que permite almacenar los materiales de forma segura, evitando exposición a la intemperie, precipitaciones de lluvias u otros agentes que promuevan el deterioro de lo que allí se almacena.

Respecto a las actividades en obra, se realiza acompañamiento diario al personal que ejecutan las actividades, verificando el estado actual de sus EPP, suministrando elementos de protección personal a los trabajadores de nuevo ingreso y se realiza

seguimiento constante en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de verificar aquellos casos donde se requiere realizar reemplazo de dotación o suministro suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, lo cuales usan durante la ejecución de las actividades de obra, estos son de uso individual y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.


Adicionalmente, se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra sobre el uso de elementos de protección personal, los temas relacionados con la bioseguridad, los peligros en el trabajo y temas relacionados en seguridad y salud en el trabajo. También se han implementado pausas activas que permitan el esparcimiento y descanso temporal de los trabajadores, permitiendo interactuar y eliminar posibles situaciones de estrés u otras emociones que dificulten su buen desarrollo laboral.

En este periodo de trabajo, el contratista desarrollo ejecución de concretos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente que aplica respecto a la recolección y buena disposición de residuos se garantizó en obra la debida separación de los residuos sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la clasificación en un punto de encuentro.

4.1. Cerramiento y señalización en obra

En el presente periodo, la señalización se fue adaptando según las actividades ejecutadas en esta acta parcial, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de excavaciones correspondientes instalación de tuberías de acueducto, pozos, tuberías de presión, acometidas domiciliarias, cajas de inspección domiciliarias. Así mismo cada frente de trabajo cuenta con cintas peligro y señales verticales empleadas cuando se desarrollan obras de tal envergadura, con la única función de guiar en forma segura al

tránsito vehicular y peatonal orientado hacia la prevención del riesgo; según lo establecido en el Plan de Manejo de Transito (PMT) del contrato de obra 029/2022

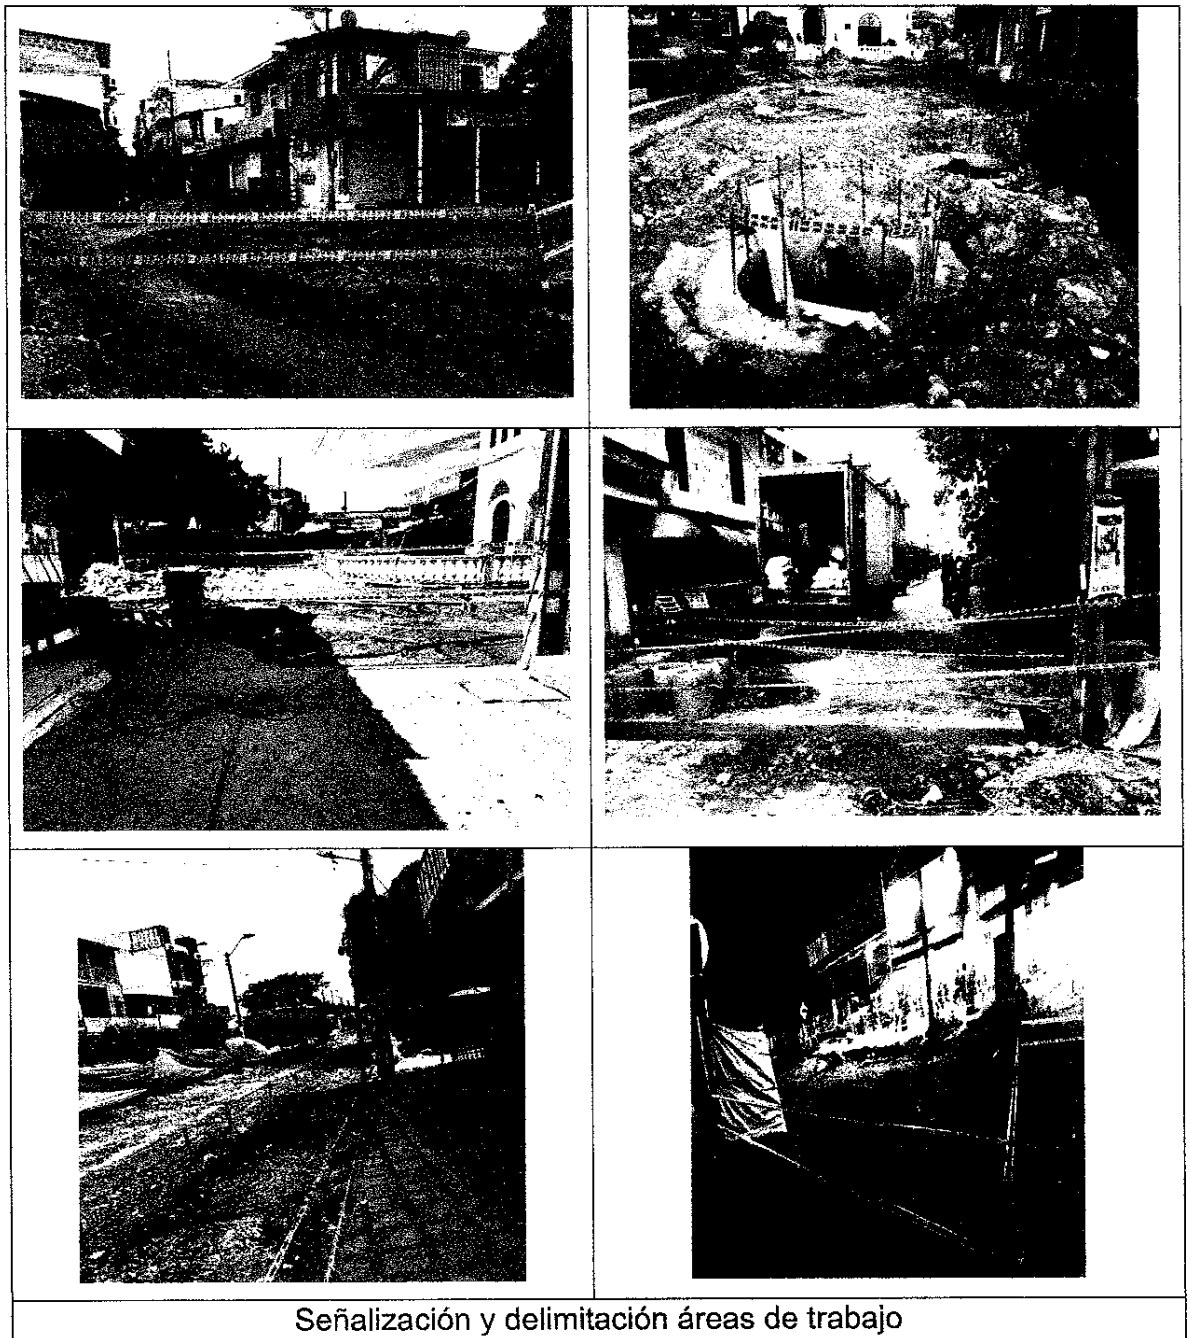

Señalización y delimitación áreas de trabajo

De acuerdo con los ejes que se ejecutaron en el acta parcial N3, Consorcio Pavimentos El Bagre llevo a cabo la lista de chequeo rutinaria para dicho periodo, tal y como se observa a continuación:

EJE	CANTIDAD	OBSERVACION
N°401	3	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.
N°402	1	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.
N° 5	3	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.
N°3	2	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.

Tabla 1. Consolidado Lista de Chequeo Rutinaria

Los soportes se pueden evidenciar en el **ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA**

4.2. Capacitación personal de obra

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de Salud Ocupacional y de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 20019 Consorcio Pavimentos El Bagre en este periodo cuya intervención abarco al EJE No.401 desde la abscisa K0+070 a la K0+169.2, el EJE No.402, el EJE No.3 y el EJE No.5 desde la abscisa K0+341.51 a K0+420.7, en los cuales se realizaron 3 charlas por lapso de 10 a 15 minutos, sobre Convivencia laboral, Actividades preventivas, Riesgos silenciosos. Cuyos soportes están en el **ANEXO 2 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).** De acuerdo con esto se formula una matriz de charlas diarias la cual se observa a continuación:

TIPO	CANTIDAD	TEMA	No. Personas	Tiempo (horas)	HHC
Charlas	1	Convivencia laboral – ambiente positivo	16	0,25	4,00
Charlas	1	Actividades preventivas y técnicas de autocuidado	17	0,25	4,25
Charlas	1	Riesgos silenciosos y enfermedades laborales	23	0,17	3,83
		TOTAL	**56**	**0,67**	**12**

Tabla 2. Relación de Capacitaciones





Capacitaciones al personal de obra





Pausas activas

4.3. Inducción y reinducción de personal

Posterior al retorno laboral se realizaron inducciones y reinducciones de seguridad y salud en el trabajo al personal activo. Las capacitaciones dictadas abarcaban los siguientes temas: Reportes de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras; identificación de peligros y evaluación de riesgos; uso de EPP permanente; clasificación de residuos; roles y responsabilidades SGSST.

Para verificar los conocimientos básicos que los trabajadores poseen acerca de la identificación de peligros y el uso de EPP se realizó una evaluación con los temas tratados durante la inducción. El total del personal que fue capacitado en este periodo fue de 80 trabajadores. Por otra parte, los resultados de las evaluaciones demuestran que el personal es apto para cumplir con su labor y tareas asignadas de manera segura, responsable y eficaz.

(VER ANEXO 3 FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

4.4. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP

El contratista de obra suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, los cuales son de uso individual y son adecuados para la naturaleza y característica del trabajo, todo ello conforme a la Resolución 2400 de 1979. Durante este periodo el Consorcio realiza la entrega de los elementos de protección personal respectivos **(VER ANEXO 4 ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)**

PERIODO DE ENTREGA	TOTAL DE EPP Y DOTACION ENTREGADOS
Desde el 25 de diciembre al 24 de enero	201
Desde el 11 de abril al 10 de mayo	75
Entrega elementos de protección personal	

4.5. Manejo de maquinaria y equipos

Para el presente periodo en la ejecución de las actividades en obra, se utilizó la relación presente en la siguiente tabla.

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD	CODIGO
Camioneta	1	DOBLE CABINA	N/A
Retroexcavadora de llanta	1	CATERPILLAR	416E
Retrocargador de llanta	1	LLACTRAK	N/A
Minicargador	1	CATERPILLAR	236B
Minicargador	1	LLACTRAK	795
Taladro	1	BOSCH	1800
Pulidora	1	MAKITA	N/A
Mezcladora	1	BAUKER	N/A
Compactadora tipo Rana	1	WARNING	N/A
Tronzadora	1	DEWALT	130199

Tabla 3. Equipos y maquinarias del contratista

Se llevaron a cabo las inspecciones a través de los preoperacionales a los equipos establecidos en la tabla 3, verificando el estado óptimo de funcionamiento, así mismo se fueron tomando las acciones correctivas pertinentes de los elementos que se encontraban dañados con desgaste o vencidos **(VER ANEXO 5 INSPECCION PREOPERACIONALES)**

4.6. Acompañamiento al personal de obra

Se realiza este para verificar las condiciones de Bioseguridad y Seguridad Industrial, el personal está atento a las recomendaciones del profesional SISO en campo, utilizando todos los elementos de protección personal.

5. Personal vinculado en obra

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. En la siguiente tabla se observa la cantidad de personal presente en el período comprendido entre el del 25 de diciembre de 2022 al 24 de enero de 2023 y del 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023.

CARGO	CANTIDAD
Director de Obra	1
Ingeniero Residente	1
SISO	2
Ingeniera Ambiental	1
Topógrafo	1
Paleteras	6
Operadores de Maquinaria	4
Secretaria	1
Almacenista	1
Maestro	2
Conductor	1
Cadenero	2
Vigilante	4
Oficial	5
Ayudante	48
Total	**80**

PERSONAL VINCULADO	80
Total	**80**

Tabla 4. Personal de obra

5.1. Incidentes

Durante este periodo no se presentaron incidentes de trabajo tanto para el personal calificado como no calificado, en la siguiente tabla se refleja la tabulación de esta:

PERSONAL VINCULADO	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 5. Incidentes

Este indicador nos refleja que en la empresa no se han presentado incidentes en el periodo del 25 de diciembre al 24 de enero y del 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023, lo cual demuestra el compromiso de Consorcio Pavimentos El Bagre frente a las actividades de prevención en los temas de SST.

5.2. Accidentes de trabajo

Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo en la empresa

PERSONAL VINCULADO	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 6. Accidentes

Durante este periodo no se presentaron accidentes en los ejes de ejecución, Se seguirá reforzando al personal de obra los actos y condiciones inseguras, charlas en SST y sus consecuencias y medidas de seguridad.

5.3. Análisis de ausentismo

Durante el periodo, se reportaron ausentismos y se detallan a continuación:

Fecha de consulta a EPS, IPS o Fecha de ausentismo por causa no médica			Nombre completo del Trabajador	Patología o motivo del ausentismo laboral (Por causa médica o no médica)	Diagnostico	CC	Días Incapacidad por causa médica.	Tiempo ausentismo por causa no médica	Cargo
DD	MM	AA							
03	4	2023	Ramiro contreras Pastrana	Medicina General	**R101:** Dolor abdominal localizado en parte superior. **R11X:** Nausea y vomito	X	2		Ayudante de Obra
04	4	2023	Carolina Andrea Quintero Hernández	Medicina General	**J068:** Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores. **H650:** Otitis media aguda serosa	X	3		Paletera
08	4	2023	Yeison de Jesús Ospino Tovar	Medicina General	**R101:** Dolor pélvico y perineal	X	3		Ayudante de Obra
17	4	2023	Carolina Andrea Quintero Hernández	Medicina General	**J209:** Bronquitis aguda, no especificada	X	5		Paletera
22	4	2023	Alfonso Enrique Sánchez Roqueme	Medicina General	**K052:** Periodontitis aguda **L020:** Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de la cara	X	5		Ayudante de Obra
25	4	2023	María Camila Ramos Marín	Medicina General	**J069:** Infección aguda de las vías respiratorias	X	3		Paletera

Fecha de consulta a EPS, IPS o Fecha de ausentismo por causa no médica			Nombre completo del Trabajador	Patología o motivo del ausentismo laboral (Por causa médica o no médica)	Diagnostico	CC	Días Incapacidad por causa médica.	Tiempo ausentismo por causa no médica	Cargo
DD	MM	AA							
					superiores, no especificada				
26	4	2023	Jorge Armando Acevedo Mejía	Medicina General	K521: Diarrea funcional	X	3		Ayudante de Obra
03	5	2023	Monica Patricia Beretel Martelo	Medicina General	**F419:** Trastorno de ansiedad , no especificado	X	1		Almacenista
05	5	2023	Eduin Martínez Pereira	Medicina General	**I024:** absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de miembro	X	5		Ayudante de Obra


Tabla 7. Análisis de ausentismo

De acuerdo con la tabla anterior el personal vinculado a esta empresa y su relación al ausentismo reflejado en el periodo comprendido del 25 de diciembre al 24 de enero / 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023, se detalla a continuación

TIPO DE AUSENTISMO	%
AUSENTISMO MEDICO	100
AUSENTISMO NO MEDICO	0

Tabla 8. Tipo de ausentismo y su porcentaje

En el grafico se observa el diagrama sectorial con la representación de los porcentajes y proporciones de los tipos de ausentismo presentes en este periodo.

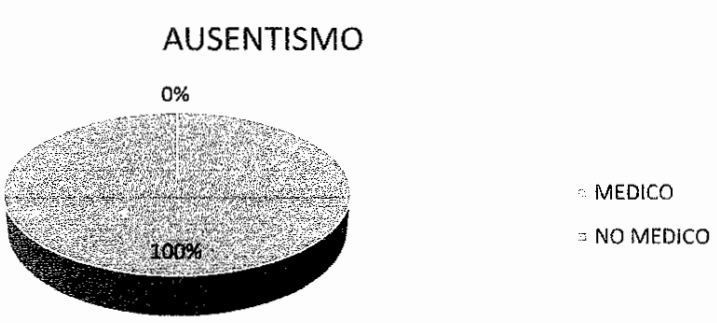

Gráfica 1. Ausentismo médico vs ausentismo no médico

El tipo de ausentismo en el periodo del 25 de diciembre al 24 de enero / 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023, corresponde a ausentismo medico en un 100% (Ver gráfica 1), el ausentismo no medico no se presentó en el periodo antes citado.


En la tabla 9 se compara el comportamiento del ausentismo en el periodo de desarrollo del proyecto, es decir, del 25 de diciembre de 2022 al 24 de enero de 2023 y del 11 de abril al 10 de mayo del presente año. Durante el periodo antes mencionado el total de personas ausentadas fue de 8. Si esto se compara con el periodo anterior donde el total de personas ausentes fue de 1; se tiene que el total de ausencias por persona aumentó en 7 con respecto al periodo pasado. Por otra parte, el porcentaje de HHA pasó de 0,07% a un 1,56% respecto al total de HHT por lo que hubo un incremento significativo en las horas hombres de ausentismo entre los dos periodos comparados.

Los días de ausentismo corresponden a incapacidades que suman un total de 30 días. Por otro lado, no hay reporte de ausentismo no médico. Al comparar el periodo del 25 de noviembre de 2022 al 24 de diciembre de 2022 con el actual, se reportan 29 días de ausentismo médico adicionales y 0 días de ausentismo no médico.

MES	25 nov al 24 dic	25 de diciembre al 24 de enero	11 abril de 2023 al 10 mayo de 2023
HHA	8	0	240
HHT	12032	15040	15414
%HHA	0,07	0	1,56
TOTAL PERSONAS	64	80	80

Tabla 9. Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

En la gráfica 2 se muestra el resumen y la comparación presentadas en la tabla 9.

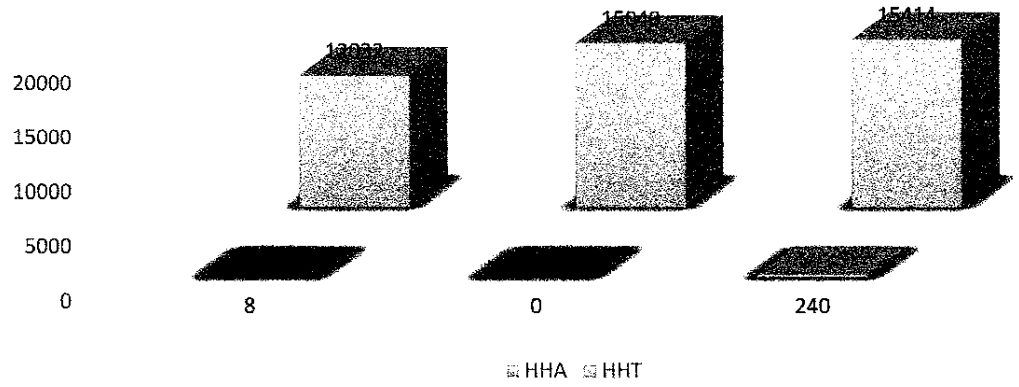

Gráfica 2. Horas Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

5.4. Análisis de accidentalidad

Durante este periodo no se presentó accidentalidad alguna, se seguirá reforzando a través de charlas de SST al personal activo, la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal, la realización de pausas activas y reporte de actos y condiciones inseguras.

6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. Se adjunta planilla de pago de seguridad social y parafiscal correspondiente al periodo del 25 de diciembre 2022 al 24 de enero 2023 y del 11 de abril al 10 de mayo de 2023.

7. CONCLUSIONES

Después de haber superado una suspensión en las actividades de obra se tuvo un retorno con fecha del 11 de abril de 2023. A partir de este día, se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la Interventoría para dar instrucciones, recomendaciones y realizar observaciones respecto a la implementación del sistema de seguridad en el trabajo.

Se continúa el seguimiento y control al personal de obra para garantizar las medidas de protección personal y el buen eso de los EPP. Además, dado que hubo incremento de personal respecto al periodo anterior. Se realizaron con una mayor frecuencia las charlas y capacitaciones relacionadas con los temas de salud y seguridad en el trabajo.

En el presente periodo las horas hombre de ausentismo fueron un total de 240 horas sufriendo un incremento en horas de 232 respecto al periodo anterior. Así mismo, todas las ausencias presentadas estuvieron respaldadas por justificaciones médicas.

Por otra parte, en relación con el personal de obra vinculado, se tiene que se produjo un aumento de 16 trabajadores. Los cuales fueron capacitados junto con el personal antiguamente existente en todos los temas referentes a salud y seguridad en las actividades que realizan durante su jornada laboral. La formación del personal antiguo se dio debido a que hubo una suspensión temporal de las actividades y por ende al retornar se hacía necesario una reinducción a todo el personal de obra.

El contratista realiza seguimiento a las actividades diarias de obra para identificar cualquier riesgo o peligro y evitar que se produzcan. Es por esto por lo que en el actual periodo no se presentaron incidentes, ni accidentes durante la jornada laboral.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades propias del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista: charlas y capacitaciones, pausas activas, inspección preoperacional, lista de chequeo rutinaria, orden y aseo, importancia de la hidratación del personal, señalizaciones de área.

Actualmente en la ejecución del contrato de obra No. 029 de 2022, cumpliendo las condiciones del Decreto No. 0723 DE 2013 Afiliación al Sistema General de Riesgos laborales donde se realizaron las respectivas afiliaciones a seguridad social y parafiscales, Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Cajas de Compensación Familiar (C.C.F) del personal de la interventoría.

Igualmente, en el ANEXO SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATISTA, del presente contrato de obra para el presente periodo.

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE:	3	FECHA:	17-4-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Ana María Pedroza			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)	Ana María Pedroza			

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.40[illegible]N LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE:	3	FECHA: (DD - MM - AA)	8-05-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 a.m	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 p.m

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Ana Maria Pedroza			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)	Ana Maria Pedroza			

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 3		25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 3 frente a terpel



Descripción: cerramiento de pozo de inspección eje 3 - frente a oficinas pavimentos del bagre



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 3 - S.C electrificadora



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 3

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 401		FECHA: DD - MM - AA	28-12-2022
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido) Ayra Maria Pedroza				
3.3	Cargo SST				
3.4	Revisó (Firma) Ayra Maria Pedroza				

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.4[illegible]N LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 401		FECHA: DD - MM - AA	26-12-2022
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Aura Maria Pedroza			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)	Aura Maria Pedroza			

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


EJE:	401	FECHA: (DD - MM - AA)	19-01-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido) Ana María Pedroza				
3.3	Cargo SST				
3.4	Revisó (Firma) Ana María Pedroza				


	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No.401 tramo K0+070 a K0+169.2		25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		

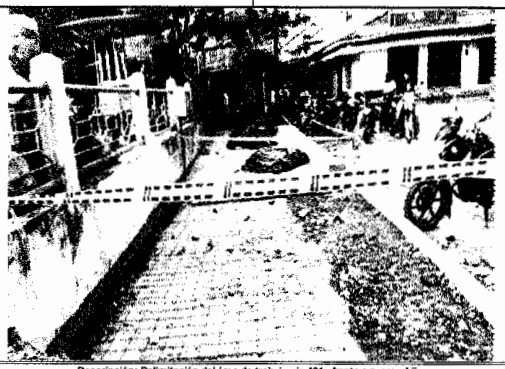

Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 401 - frente a parque bijao

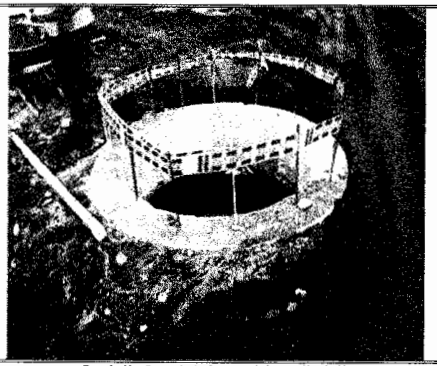

Descripción: Cerramiento de pozos de inspección eje 401

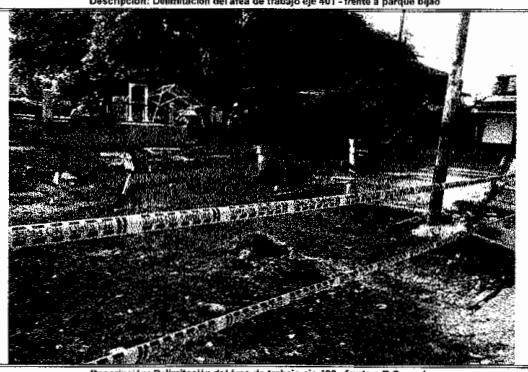

Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 402 - frente a B.C paraiso



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 402 - frente a B.C paraiso

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y (EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


EJE: 402		FECHA: DD - MM - AA	09-05-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	¿stán señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Aura Marco Pedroza			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)	Aura Marco Pedroza			

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
Eje N0.402		25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		

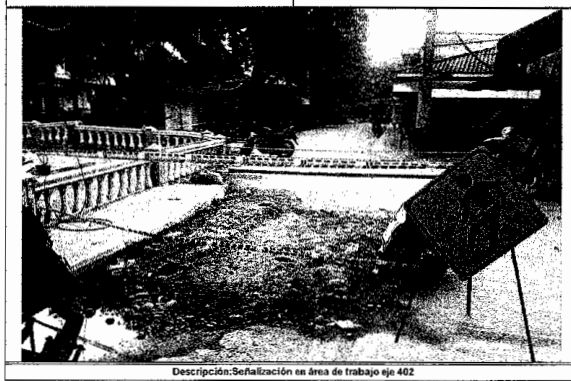

Descripción:Señalización en área de trabajo eje 402



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 402

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 5	FECHA: DD - MM - AA 20-4-2023
HORA INICIO DE LA TAREA: 07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA: 05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido) Ana María Pedroza				
3.3	Cargo SST				
3.4	Revisó (Firma) Ana María Pedroza				

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y (. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE:	5	FECHA: DD - MM - AA	30-12-2022
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Aura Maria Pedroza			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)	Aura Maria Pedroza			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y (. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE:	5	FECHA: DD - MM - AA	09-05-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido) Ana Maria Pedroza				
3.3	Cargo SST				
3.4	Revisó (Firma) Ana Maria Pedroza				

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No.5 tramo K0+341.51 a K0+420.7		25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	19 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		






Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 5 - frente a baratón



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 5 - frente a panadería

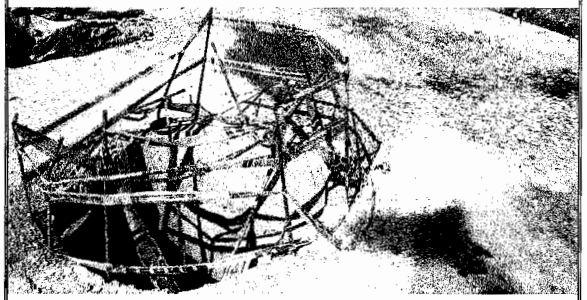

Descripción: Delimitación de pozo de inspección eje 5

297

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 2. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Líder SST	Aura María Pedrozo	Aprobación: Gerente General	
FECHA	11 Abril 2023	LUGAR	Frente de obra
CAPACITACIÓN N°	01	CARGO	
RESPONSABLE	Aura María Pedrozo		
TEMA CAPACITACIÓN	Convivencia laboral-Ambiente positivo		
ASPECTOS TRATADOS	Tolerancia-Respeto-Muestra de apoyo		
OBSERVACIONES	Duración de 15 minutos		


LISTADO PERSONAL


NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	-Luis Felipe Jurriba escobar	- Palero	Luis.
	-Edwin sanchez rivas	tanador	
	-Alex yesid zuleta de avila	palero	
	-DANIEL ANDRES MOUSCHUEZ	Ayudante	ANDRES.
	-Javier Miguel Vergara	Ayudante Ente.	-Javier V.
	-Yaizuri Blanco. R.	Paletero	Yaizuri. BR
	Bernardo Mejia	Obrero	Bernardo
	Marlon Ballesteros	Obrero	Marlon B.
	Eduardo Ramos	Maestro	
	Jessica-Alvarez Solorzano	Aux Topografia	
	Esteramy Mareo Rs	Aux Topografia	Esteramy M.
	Jorge Marquez	Oficial	Jorge Marquez
	Luis Andres	Oficial	Luis Andres
	Jaider Cervera	Oficial	Jaider Cervera
	William Martinez	Oficio	
	Jose Herrera	Oficio V	Jose Herrera

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		25 (Dia)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Dia)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTO URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		

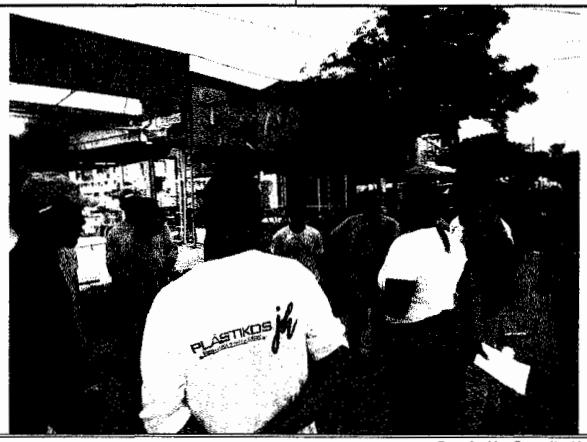

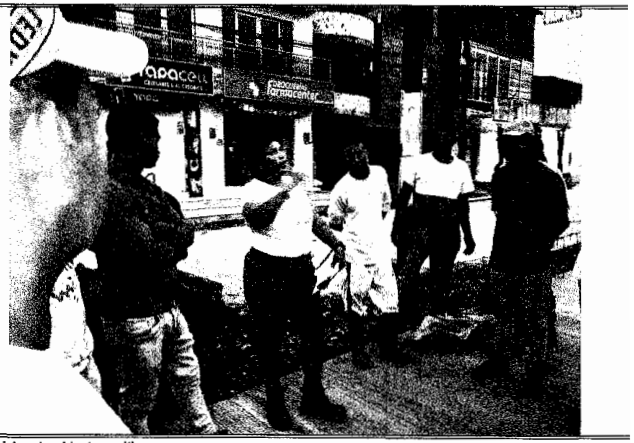

Descripción: Capacitación sobre convivencia laboral ambiente positivo.

364

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Lider SST	Aura Maria Pedroza	Aprobación: Gerente General	
FECHA	20 abril 2023	LUGAR	Frente de Obra
CAPACITACIÓN N°	02	CARGO	
RESPONSABLE	Aura Maria Pedroza		
TEMA CAPACITACIÓN	Actividades Preventivas y tecnicas de autocuidado.		
ASPECTOS TRATADOS	Buena hidratación Alimentación saludable, uso de los EPP.		
OBSERVACIONES	Duracion 15 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	-Luis DAVID HERNANDEZ		Luis
	-Eleazar aguilera		Eleazar
	andres arruta Cano		andres arruta C.
	-Cristian Ramirez		-Cristian
	-Mateo Ballestero		-Mateo
	-Jaider Cuaran		-Jaider
	Bernardo Pinzon		Bernardo
	Carlos Cardozo		Carlos Cardozo
	JOSE Herrera		JOSE Herrera
	Alvaro Herrera		Alvaro
	-Guerson Daniel suarez		Guerson suarez
	Luis Manuel Ramos		Luis manuel
	Jose daniel solano Arcila		Jose Solano
	Eder Luis Borrero Pastrana		Eder
	camilo echeverria		camilo
	DAVID MONSALVE		
	SAMUEL MANJARRES		MONSALVE SAMUEL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		25 (Dia)	12 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Dia)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		





Descripción: Capacitación sobre actividades preventivas y tónicas de autocuidado.

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Lider SST	Aura Maria Pedroza	Aprobación: Gerente General	
FECHA	1 Mayo -2023.	LUGAR	Frente de Obra.
CAPACITACIÓN N°	03	CARGO	
RESPONSABLE	Aura Maria Pedroza		
TEMA CAPACITACIÓN	Riesgos ciencios y enfermedades laborales		
ASPECTOS TRATADOS	Riesgos de impactos de cabeza. Riesgos Para la Visión - Riesgos para la audición		
OBSERVACIONES	Duración de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Luis Andres Mass		Mass Martinez
	Dairo Arrieta		Dairo A.
	Javier Vergara		Javier Vergara
	Erik Bergano Rincon		Erik Bergano
	Nelvis Contreras		Nelvis Contreras
	Reinaldo Munoz		Reinaldo M
	Yuanys Bastidas Barba		Yuanys Bastidas
	Jader Cuevas		Jader Cuevas
	Medardo Arrieta		
	Alexis Santiago		Alexis Santiago
	David Martinez.		Luis David.
	Jose Daniel Solano Arrieta		Jose Solano
	Yeiner Hernandez		
	Guerman Daniel Suarez		Guerman Suarez
	Ruben Mazo		Ruben Mazo
	Adalberto Tuiran		Adalberto T
	Luis Miguel Navarro		
	Andres Gallares		Andres Gallares
	Nelvis Contreras		Nelvis Contreras
	Francisco		
	Estefany Movero Rea		Estefany M
	Yeison		Yeison

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		25 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		





Descripción: Capacitación sobre riesgos silenciosos y enfermedades laborales.

ANEXO 3. FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

370

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completo	Javier Miguel Vergara				
Número de cédula	1140.827.240	**Cargo**	oficial		
Fecha	13-Abril-23	**Inducción**	X	**Reinducción**	

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera segura,responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos oAuxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.
* COPASST.
* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador	Javier Vergara


CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

371


INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación de conocimiento de inducción y/o reinducción

1. Seleccione con una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

X Casco de seguridad	 Overol en tela drill	 Mascarilla para humos metalicos y gases		 Pantaloneta
 Botas plasticas con puntera	 Guantes de carnaza	 Tapabocas	 Camiseta tipo polo	 Monogafas antiempañantes
 Careta	 Arnés y eslingas certificados	 Dotación en Denim	 Botas para trabajos en caliente	 Gorra
X Guantes plasticos	 Protector auditivo	Monja para soldadura	 Zapatos cubiertos	 Tenis

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

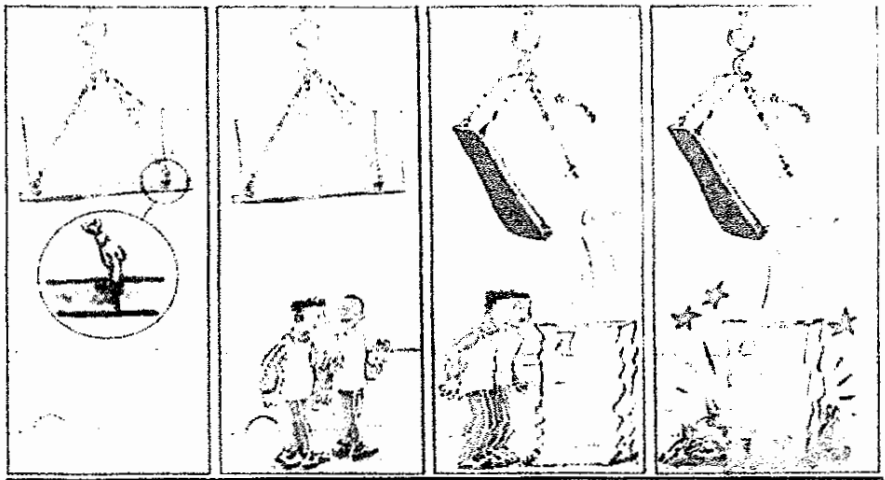

Condicion insegura	ACTO inseguro	incidente de Trabajo	accidente de Trabajo

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

b. Uso permanente y correcto de los EPP.


c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.

X e. Todas las anteriores.

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
	312 **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

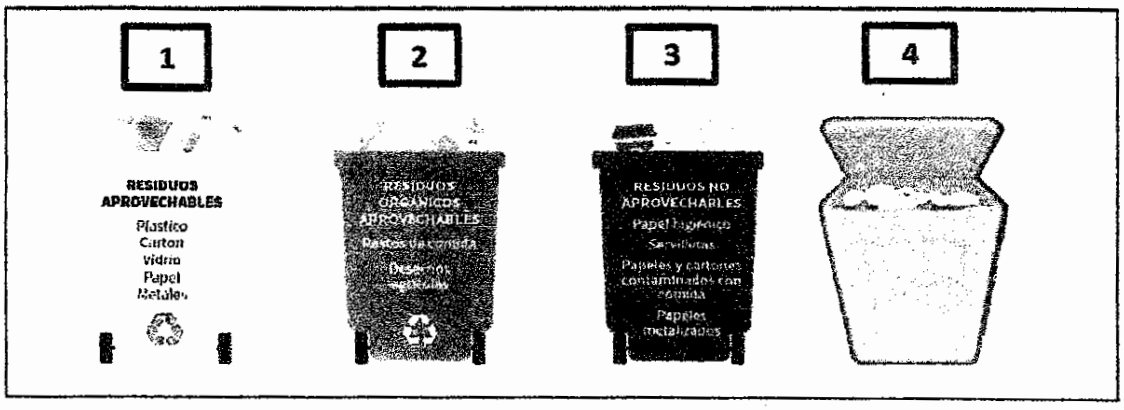

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

d. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Dora María Pedroza

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

373

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completo	Karen Margarita Diaz Perez				
Número de cédula	1102.815.297	**Cargo**	Secretaria		
Fecha	13-Abr.1-2023	**Inducción**	X	**Reinducción**	

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera segura,responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos oAuxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.


COPASST.

* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador	Karen Diaz P.

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
	374 **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

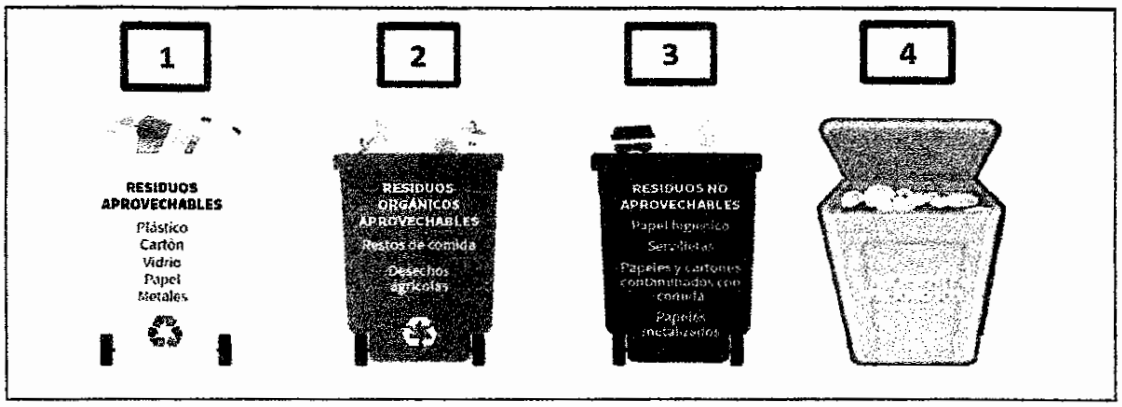

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

e. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Ana María Pedroza

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

375

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completo	Dairo Antonio Arrieta Polo				
Número de cédula	8.203.795	**Cargo**	Oficial		
Fecha	13-Abril-23	**Inducción**	X	**Reinducción**	

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera segura,responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos oAuxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.
* COPASST.
* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador	Dairo Arrieta

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

376


INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación de conocimiento de inducción y/o reinducción

1. Seleccione con una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

X Casco de seguridad	Overol en tela drill	Mascarilla para humos metalicos y gases	Delantal de carnaza	Pantaloneta
Botas plasticas con puntera	X Guantes de carnaza	X Tapabocas	Camiseta tipo polo	X Monogafas antiempañantes
Careta	Arnés y eslingas certificados	Dotación en Denim	Botas para trabajos en caliente	Gorra
X Guantes plasticos	X Protector auditivo	Monja para soldadura	Zapatos cubiertos	Tenis

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

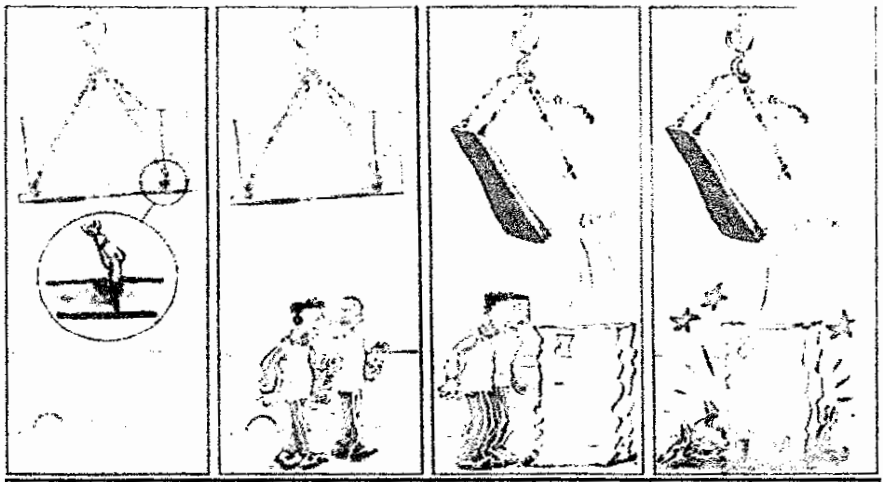

condición insegura	acto inseguro	incidente de trabajo	accidente de trabajo

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

b. Uso permanente y correcto de los EPP.

c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.


X Todas las anteriores.

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

317

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

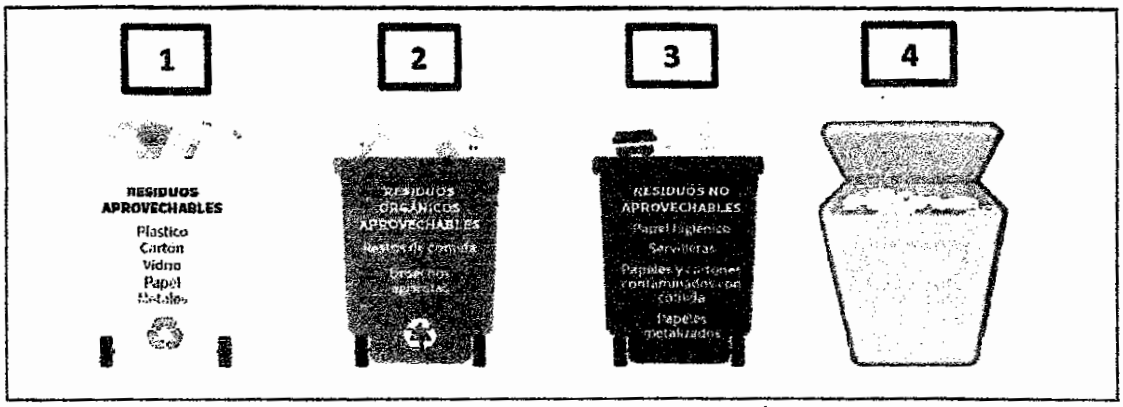

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

X d. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Dura María Pedroza

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
	378 **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Nombre completo	Eduardo Enrique Romero Guerra					
Número de cédula	15.679.208	**Cargo**	Maestro			
Fecha	13-abril-23	**Inducción**	X	**Reinducción**		

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera *segura,responsable* y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos oAuxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.

COPASST.

* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones deseguridad y fenómenos naturales.


Firma del trabajador	x Eduardo Romero

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

379

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

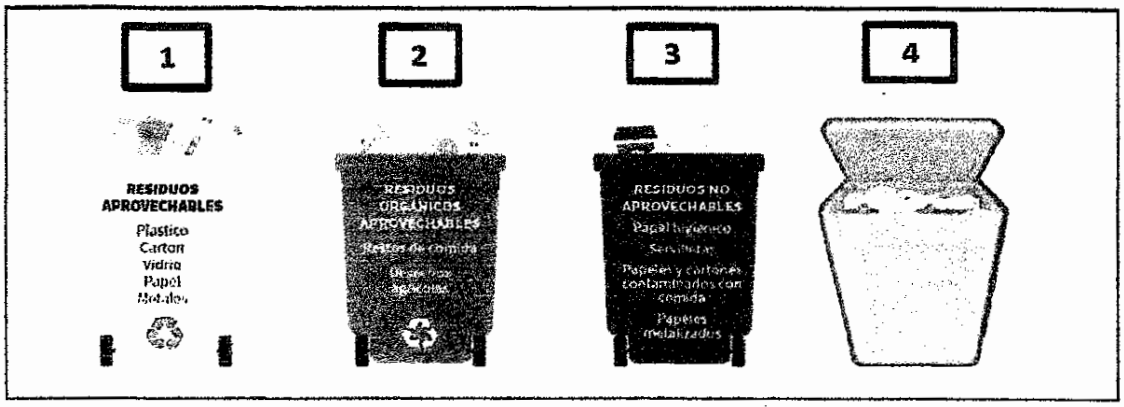

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

e. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Dra Maria Pedroza

ANEXO 4. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Milton Marzola.		14-04-2023	X	X	X	X	X		X	X			Milton Marzola
2	Juan daniel Martinez	1007489844	14-04-203	X	X	X	X	X			X			Juan M
3	Willam Darrios.		14.04.2023	X	X	X	X	X		X	X			Willam D
4	alvaro Hernandez	92027436	14-04-2023	X	X	X	X	X		X	X	1		Alvaro Hernández
5	edilberto Mendoza	909.4067	14-04-2023	X	X	X	X	X		X	X			
6	yesica Alvarez.	1007467179	14-04-2023	X		X					X			Yesica Alvarez
7	Alejandro jose	1040504252	15-04-2023	X	X	X	X	X			X			no firma.
8	estefany Moreno	1040514628	15-04-2023	X	X	X					X			Estefany Moreno
9	Jeison Ospino		15.04.2023	X	X	X					X			Jeison
10	Gerson Sanchez	1045145164	15.04.2023	X	X	X	X	.		X	X			Gerson Sanchez
11	Francisco Causil	8203622	15-04-2023	X	X	X	X	X	X		X			
12	carolina quintero	1017262885	15-04-203	X				X			X			Carolina Q.
13	Jairo Herazo	15077614	15-04-2023	X	X	X					X			
14	Camila Ramos	1007444743	15-04-2023	X				X			X	X	Refractor	Mª Camila Ramos
15	Ruben dario Mozo	1007351250	15-04-2023	X	X						X			Ruben Mozo

ACTA DE COMPROMISO

El trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Aura María Pedroza

381

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Alvaro Requena	6.797.073	24-5-23		X	X				X	X			Alvaro Requena
2	Cesar Gonzalez	1.062430355	24-5-23		X	X				X	X			Cesar Gonzalez
3	Luis Velazquez	8.049.275	24-5-23		X	X				X	X			Luis Velasquez
4	Carlos martinez	1040493.064	24-5-23		X	X				X	X			Carlos Martinez
5	Jose Medina	1040492417	24-5-23		X	X				X	X			Jose Medina
6	Miguel Marco	1019141877	24-5-23		X	X				X	X			Miguel Angel Marco
7	Jose Solano	1040492850	24-5-23		X	X					X			Jose Daniel Solano
8	Milton Mariola	78550812	24-5-23		X	X					X			Mariola
9	William Davis				X	X					X			William
10	Alexander Alvarado	92032924	24-5-23		X	X					X			Alvarado
11	Alfonso Sanchez	1040578173	24-5-23			X					X			Alfonso Sanchez
12	Fernan Zavala	78035578	24-5-23			X					X			Fernan Z
13														
14														
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados. Para constancia de ello se firma al docuemento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP. Cantidad recibida	¿CUAL?	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	William martinez	1040495512	12/05/23			X			X		X			William martinez
2	Juan Sebastian Gonzalez	1033770241	12/05/2023			X			X		X			
3	Wilman Barrios	76700166	12/05/2023			X					X			WILMAN
4	Jhon Rodriguez		12/05/2023			X					X			JOHN
5	Francisco Cousil	8283622	12/05/2023			X					X			
6	Alfonzo Zanchez	1040518773	12/05/2023			X					X			
7	ELIHARBETH [illegible]	22884526	12/05/2023			X					X			
8	Edwin Zanchez	1040501953	12/05/2023			X	X		X					
9	Alexander navarro	92082924	12/05/2023			X	X		X		X			
10	Cesar Gonzalez	1062430359	12/05/2023			X					X			
11	Dairon Arrieta	8203795	12/05/2023			X					X	X	Guantes nitrilo	
12	Jubier vergara	1140827240	12/05/2023			X					X	X	Guantes nitrilo	
13	Jader Cuadra	1066733666	12/05/2023			X					X	X	Guantes nitrilo	
14	Leiz Andres Mass	1003308444	12/05/2023			X					X	X	Guantes nitrilo	
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados. Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP. Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	William Barrios	76.700.166	24-5-23		X	X					X			William
2	Eliecer Vergara	98476.379	24-5-23								X			Eliecer
3	Andres Pallares	1040.498.414	30-5-23		X			X						Andres Pallares
4	Alexander Navarro	92032924	30-5-23			X								Alexander
5	Robinson Poqueme	1040 516 667	30-5-23			X		X			X			Robinson Po
6	Javier Vergara	1140827.240	30-5-23			X					X			Javier Vergara
7	Juan Suarez	1001.741.616	30-5-23								X			
8	Luis Talaigua	1007.338.757	30-5-23								X			Luis Talaigua
9	Jorge Marquez	70.512.353	30-5-23								X			Jorge Marquez
10	Dairo Arrieta	B 2037795	30-5-23			X								Dairo Arrieta
11	William Martinez	1040.495.511	30-5-23			X					X			William Martinez
12	Jader Cuaya	1066.733.666	30-5-23		X						X			Jader Cuaya
13	Jose Herrera	98472293	30-5-23		X	X					X			Jose Herrera
14	Juan Sebastian Cavadia	1033371021	30-5-23								X			
15	Carlos Cardoso	1040498234	30-5-23								X			Carlos Cardoso

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados. Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados si trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Jose Luis Bencomo	6352659	29-05-23		X	X	X				X			José Bencomo
2	JOSE INES ALVAREZ	CC 1.065.070.019	29-05-23		X	X	X	X			X			Jose Alvarez
3	Jader Emilio Gomez	CC 78.788.095	30-05-23			X								Jader Gómez
4	JAIRO JOSE HERNANDEZ	CC 1077 2690	29-05-23		X	X		X			X			Jairo Hernandez
5	Juan Sebastian Gonzalez	1033.371024	27-05-23							X				Juan Sebastian
6	Cristian Ramirez		27-05-23							X				Cristian
7	Jader Cuava	1066733.666	27-05-23							X				Jader Cuava
8	Cesar Gonzalez	1062 930359	29-05-23			X		X			X	X	corretje de semerlar	Cesar Gonzalez
9	Jose antonio Medina	1040492417	29-05-23			X	X	X						Jose Antonio
10	Sebastian lopez	1000.885.764	29-05-23		X			X			X			Juan Sebastian
11	Miguel Angel Mesa	1019181877	29.05.23					X			X			Miguel Angel Mesa Gonzalez
12	Alfonso Sanchez	1040.318.173	29.05.23		X						X			Alfonso Sanchez
13	Fernan Zabala	78035.378	29-05-23			X	X				X			Fernan Zabala
14	Mario Marzola	78.590.812	29-05-23		X						X			Marzola
15	Andres Montes	8373297	29-05-23		X	X								ANDRS

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el docuemento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)											FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?		
1	Luiz Andres Mass	1003308444	26/04/2023		X			X			X				-Luis Andres
2	Daniel Navarro	1101386927	26/04/2023		X			X							- Daniel Navarro
3	Medardo Arrieta	1007467308	26/04/2023		X			X							
4	Luiz Hernandez	1003717303	26/04/2023		X			X							Luis Hernandez
5	Carlos Egil Martinez	1040493069	26/04/2023			X		X			X				-Carlos Antonio
6	Jose Daniel Zolano	1040492890	26/04/2023			X		X	X						-Jose Zolano
7	[illegible]	[illegible]	26/04/2023			.									
8	Yerson Sanchez	1045145164	26/04/2023			X		X	X						-Cuerson sanchez
9	Francisco Causil	3203.622	26/04/2023			X		X				X			- Causil
10	Adrian Gutierrez	1045141287	26/04/2023		X										-Carlos G
11	Luiz Felipe Tarriba	1001741465	26/04/2023		X		X		X			X			- Luiz Felipe
12	Edwin Sanchez	1040501953	26/04/2023		X										- [illegible]
13	Daniel Monzalve		26/04/2023									X			-Andres
14	Samuel Edwardo Martinez	1193043571	26/04/2023				X					X			-Samuel Martinez
15	Jader Cuava	1067733666	26/04/2023					X							- Jader Cuava

ACTA DE COMPROMISO

El trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.
Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Jabier Vergara	1140827240	11-04-2023		X						X			- Jabier Vergara
2	Juan Sebastian Gonzalez	1033371024	11-04-2023		X						X			Juan Sebastian
3	Francisco Cousil	8203622	11-04-2023		X						X			- Cousil
4	Leonardo Montiel	1040977335	11-04-2023		X						X			- Leonardo
5	Adalberto Tuiran	1040506832	12-04-2023		X	X					X			- Adalberto Tuiran H.
6	Yonfer Jose Herrera	1007634969	12-04-2023			X					X			- Yonfer
7	EDwin Zanches	1040561953	12-04-2023		X	X	X				X			Edwin
8	Samuel Martinez		12-04-2023			X					X			- Samuel Martinez
9	EDwin Martinez	11032952	12-04-2023			X					X			- Edwin Martinez
10	Carlos Lastra	01405	12-04-2023											
11	Carlos lastra	1040501899	12-04-2023		X	X	X				X			
12	Milton Marzola	78590812	13-04-2023	X	X	X					X			Marzola
13	JHan Carlos Duque	1007351279	13-04-23		X	X					X			- Jhan Carlos
14	Luis Miguel Velasquez	8049257	17-04-23			X	X		X		X	X		- Luis Velasquez
15	Alvaro Hernandez	92027436	19-04-23			X							Guantes Carnaza Trabajo Pesado	- Alvaro J Hernandez

ACTA DE COMPROMISO

El trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.
Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Aura Maria Pedroza

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Albaro Hernandez	92074436	20-04-2023	X	X	X	X	X		X	X			Alvaro Hernandez
2	yader cuava	1066733666	20-04-203	X	X			X			X			Yader Cuava
3	Edilberto perez	836 2294	21-04-2023		X	X					X			Edilberto Perez
4	Daniel Navarro	1101386927	21-04-2023		X	X	X	X			X			Daniel Navarro
5	Cristian Ramirez	1064187334	22-04-2023			X					X			Cristian Ramirez
6	Luiz Mario espeñal	1040497100	24-04-2023	X	X	X		X			X			Luiz Mario
7	Medardo Arrieta	1007467308	24-04-2023		X			X			X	1x	Faja cargue	
8	Brayan Pineda	1001741207	24-04-2023		X	X					X			-Brayan Pineda
9	Elias contreras	1007533682	25-04-2023		X						X			-Elias. Elias Contreras
10	Dairo Arrieta.	8203795.	25-04-2023			X					X			x Dairo R.
11	Jose David Hernandez	1001741346	25-04-2023			X	X				X			Jose David H.
12	Luiz Miguel Narvaez	1040499766	25-04-2023			X	X				X			-Luis
13	Andres Pallares	1040498414	26-04-2023		X		X	X			X			-Andres pallares
14	Adalberto tuiran	1040506832	27-04-2023		X	X		X			X			- Adalberto tuiran
15	Dani Jolorzano lopez	1137195045	27.04.2023		X	X					X			Danis

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajador recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion personal.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Aura Maria Pedroza

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Daniel Navarro	1101386927	28-04-2023		X	X	X		X		X			Daniel Navarro
2	Mederdes Arrieta	1087467308	28-04-2023		X		X		X		X			
3	Luiz Andres Mass	1003-308444	28-04-2023		X	X	X				X			Luis Andres
4	Jabier vergara	1140827240	28-04-2023	X		X	X		X		X	x1	Faja	Jabier Vergara
5	Bernardo Muñoz	3673018	28-04-2023	X	X	X	X		X		X			Bernardo Muñoz
6	Luiz miguel navarz	1040499766	28-04-2023		X		X	X	X		X			x Luis
7	Daivo Arrieta	8203795	28-04-2023	X	X	X	X		X		X			Daivo Arrieta
8	Jose David Hernandez	1001741343	29-04-2023		X	X	X		X	X	X			Jose DAVID
9	Eduardo Romero	15679208	29-04-2023		X		X		X		X			Eduardo Romero
10	Erica berdugo	43895894	29-04-2023	X	X	X		X			X			Erika Berdugo
11	Jefferson Rodriguez	1040498289	30-04-2023	X							X			Jefferson
12	Alexis Santiago	8364017	30-04-2023	X	X						X			Alexis Santiago
13	Osmar Hernandez	1040492937	01-04-2023	X	X						X			Osmar Hernandez
14	Jose Daniel Zolano	1040492890	01-04-2023	X	X	X	X	X			X			Jose Solano
15	David Martinez	1063276324	01-04-2023	X	X	X					X			DAVID MARTINEZ

ACTA DE COMPROMISO

El trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indiatrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.
Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Aura Maria Pedroza

3 de 9
