REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S,

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

OBJETO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

INTERVENTORÍA:
EDUBAR S.A.

CONTRATISTA:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DOCUMENTO:
INFORME MENSUAL DE OBRA DE CONTRATISTA No. 05
(PERIODO DEL (24) DE (08) AL (23) DE (09) DE (2024)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....3

CARACTERISTICAS DEL PROYECT 4

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4

LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
.

OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 6

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 6

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 9

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 16

ANEXOS BITACORAS DE PARQUES 17

INTRODUCCION

Este informe detalla el progreso técnico, administrativo, ambiental y financiero de la empresa Occidental de Colombia S.A.S. en el marco del Contrato de Obra LP-001-2024, celebrado con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y bajo la supervisión de la interventoría de EDUBAR. El propósito de este informe es proporcionar una actualización sobre el cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato, así como sobre las eventualidades surgidas durante el desarrollo del proyecto, que tiene como objetivo el **mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y bulevares en distintos sectores del Distrito de Barranquilla**. El contrato se inició el 22 de abril de 2024 y está previsto que finalice el 31 de diciembre de 2024.

Características Técnicas del Proyecto

Mejoramiento y Construcción de Parques Públicos, Canchas Deportivas, Zonas Verdes, Malecones y Bulevares en Diferentes Sectores del Distrito de Barranquilla

A. **Descripción de los Componentes**:

- **Parques Públicos**: Construcción y mejoramiento de parques con áreas de juegos infantiles, zonas de picnic, y áreas de descanso.
- **Canchas Deportivas**: Instalación de canchas multifuncionales para fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros.
- **Zonas Verdes**: Plantación de árboles y plantas nativas, creación de jardines y áreas verdes.
- **Malecones y Bulevares**: Construcción de paseos peatonales y ciclovías, mejoramiento de las vías existentes y mobiliario urbano.

B. **Especificaciones de Materiales**:

- **Parques**: Uso de materiales resistentes y de alta durabilidad para juegos infantiles y mobiliario.
- **Canchas**: Superficies deportivas de alta calidad, sistemas de drenaje eficientes y cercas perimetrales.
- **Zonas Verdes**: Plantas autóctonas, césped resistente, y sistemas de riego automatizados.
- **Malecones y Bulevares**: Pavimentos de concreto, adoquines, luminarias LED y bancos de descanso.

C. **Diseño y Planificación**:

- Elaboración de planos arquitectónicos y de ingeniería detallados.
- Distribución estratégica de áreas para maximizar el uso y disfrute de los espacios.

- Integración de elementos de accesibilidad para personas con discapacidades.

D. **Métodos de Construcción**:

- Implementación de técnicas modernas y sostenibles.
- Uso de maquinaria especializada y mano de obra calificada.
- Supervisión continua para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

E. **Cronograma**:

- Fases de construcción claramente definidas con tiempos estimados para cada etapa.
- Inicio del proyecto en 22 de Abril del 2024 y finalización prevista para 31 de Diciembre del 2024.
-

F. **Costos**:

- Presupuesto total estimado de $7.646.889.263,78

- Desglose de costos por componente del proyecto (materiales, mano de obra, equipos, etc.).

G. **Estándares de Calidad**:

- Cumplimiento de normas nacionales e internacionales de construcción.
- Inspecciones regulares para garantizar la calidad y seguridad de las obras.

H. **Mantenimiento**:

- Planes de mantenimiento a corto y largo plazo.
- Estrategias para el cuidado de las instalaciones y la gestión de residuos.

Localización del Proyecto

Este proyecto se encuentra localizado en todo el perímetro y a lo largo y ancho de la ciudad de Barranquilla.



Obras Contempladas en el Proyecto

OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA – ESTRUCTURA

Excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta (zonas duras en general).

Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta.

EDU. Relleno en material seleccionado, compactado.

Solado en concreto 2500 psi, e=0,05.

Acero de refuerzo figurado.

Concreto de 4000 psi para muros, zapatas y placas, no incluye acero, incluye formaletería.

Placa en concreto de 3000 psi e = 0.10 metros, incluye malla electrosoldada

Demolicion y retiro de estructura en concreto reforzada.

Pilote preexcavado y fundido en el sitio f'c=4000 psi - d=0,2 mts, longitud entre 1 - 4 mts, no incluye acero.

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

El estado del contrato actual se encuentra **ACTIVO**

Información General del Contrato de Obra

CONTRATO No:	LP-001-2024
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARRNQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
NIT	829000075-1
SUPERVISOR:	EDUBAR
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 7.646.889.263,78**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

POLIZA SEGÚN CONTRATO	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	76117
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	22092
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024

RIESGO	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2024	02/05/2024	$764.688.926,38
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/04/2024	31/12/2024	$1.529.377.853,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS	31/12/2024	31/12/2024	$2.294.066.779,13


Actividades Desarrolladas por el Contratista

Excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta (zonas duras en general).





Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta

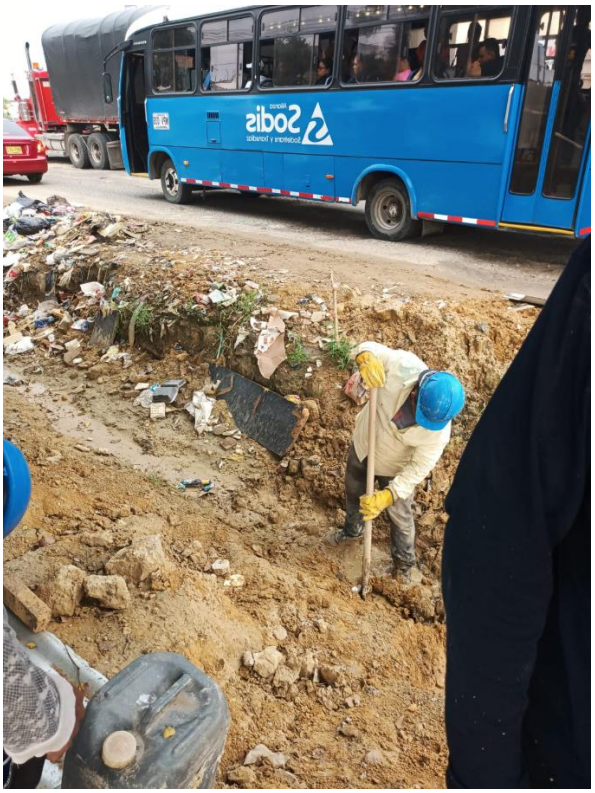

EDU. Relleno en material seleccionado, compactado.





Solado en concreto 2500 psi, e=0,05



Acero de refuerzo figurado



Concreto de 4000 psi para muros, zapatas y placas, no incluye acero, incluye formaletería





Placa en concreto de 3000 psi e = 0.10 metros, incluye malla electrosoldada





Demolicion y retiro de estructura en concreto reforzada



Pilote preexcavado y fundido en el sitio f'c=4000 psi - d=0,2 mts, longitud entre 1 - 4 mts, no incluye acero





Avance y Estado de las Obras Contrato de Obra.

Avance de obra de presupuesto se encuentra en un 35%

Personal del Contratista en la Obra.

Personal del Contratista en la Obra.

El Contratista mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

3 Residentes

3 Profesionales SST

5 Operadores

4 Conductores

3 Maestros de obras

15 Ayudantes de albañileria

Equipos del Contratista en la Obra

Durante los primeros 30 dias de ejcucion de obras se mantuvo en las respectivas obras intervenidas los siguientes equipos:

Estacion topografica completa

Nivel topografico completo

Buldoser D6H caterpillar

Retrocargador 416D caterpillar

Minicargador terex

Vibrocompactador Inger Soll-Rand

Volqueta doble troque kodiac

Volqueta un troque volskwagen


Tractocamion mitsubishi canter

Comentarios y Conclusiones

Es importante destacar el inicio de estas obras que abarcan un porcentaje significativo de sectores de esta ciudad que no contaban con la ejecución de estos proyectos en administraciones pasadas. Esta iniciativa ha permitido un mejoramiento notable del ambiente social en estos barrios, promoviendo la integración y la participación activa de la comunidad.

Hasta la fecha, hemos llevado dos meses de obra, enfocándonos principalmente en las actividades preliminares. A continuación, se presentan algunos puntos clave de los logros y beneficios observados hasta ahora:

ANEXO 1
BITACORA PARQUE VILLA SAN PEDRO

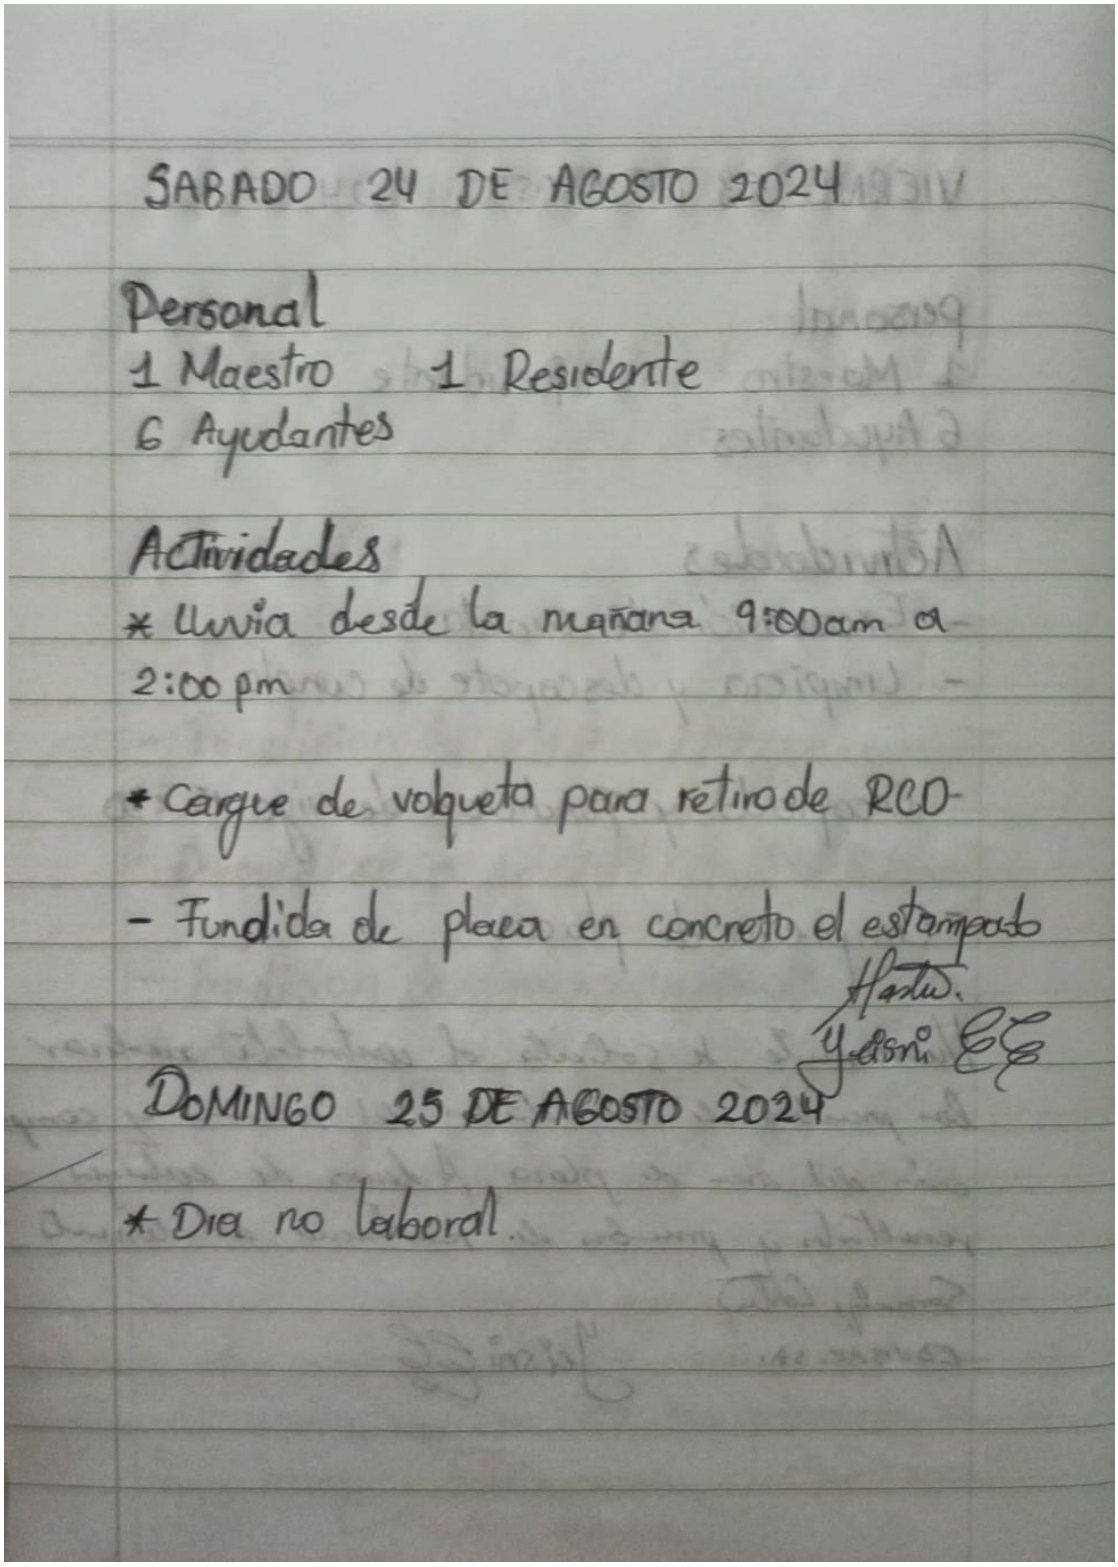

SABADO 24 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
6 Ayudantes

Actividades
* Lluvia desde la mañana 9:00am a 2:00 pm

* Cargue de volqueta para retiro de RCD

- Fundida de placa en concreto el estampado

Hasta.
Yeison EE

DOMINGO 25 DE AGOSTO 2024

* Dia no laboral.

LUNES 26 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
5 Ayudantes

Actividades
* lluvia intermitente durante toda la mañana hasta las 12:30.

- Cargue de RCD en volqueta

- Demolicion de paredes de cuneta.

- Achique de aguas lluvias.

El contratista realiza las limpieza y retiro de RCD del parque.
Se solicita entrega de los resultados de las pruebas de densidad.

Yeison C.C

Jornada finalizada.
EDUBAN. SAS

MARTES 27 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

6 Ayudantes

Actividades

- Adecuacion de modulacion de plazoleta

-Fundición de placa en concreto estampado.

- Demolicion de muros de cuneta

yeisni C C

MIERCOLES 28 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
5 Ayudantes

Actividades
- Adecuacion de anden.

- Fundicion de anden

- Demolicion de muros de cuneta.

Y así ℓℓ

Jueves 29 de AGOSTO 2024

personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes

Actividades
- Limpieza DE plazoleta

- Retiro de RCD en cuneta

- Demolición de cuneta

Yeisni EG

VIERNES 30 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente.
1 Ayudante

Actividades
- Limpieza general de obra

SABADO 31 DE AGOSTO

Personal
1 Maestro 1 Residente
2 Ayudantes

Actividades
- Cargue de volqueta con escombro

Yesni

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE 2024

* Dia no laboral

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

3 Ayudantes

Actividades

- Demolicion de cuneta

- Limpieza de cuneta

Yelsin CC

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

3 Ayudantes 1 Aux. SST

Actividades

- Demolicion de cuneta

- Excavacion y retiro de tuberia electrica

- se baja la tuberia electrica y se rellena nuevamente.

Yesni

MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes

Actividades
- Demolicion de cuneta -
- Retiro de tuberia electrica -
- Reinstalacion de tuberia electrica -
- Cargue de volqueta con RCD de cuneta
- Levante de muro en bloque abozardado.

Yeisni

Jueves 5 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
3 Ayudantes

Actividades
- Conformacion de talud.
- Demolicion de cuneta
- Excavacion y retiro de tuberia electrica
- Instalacion de tuberia electrica

Yelsni EE

Viernes 6 DE SEPTLEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
2 Ayudantes

Actividades
- Demolicion de cuneta

- Acopio de escombros

* lluvia toda la tarde a partir de la 1 pm

Yeisni

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
3 Ayudantes

Actividades
- Demolicion de cuneta
- Acopio de (escombros) RCD
- instalacion de loseta de guia.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 2024

* Dia no laboral

Yesni EE

Lunes 9 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente.
3 Ayudantes.

Actividades
- Limpieza general de obra.
- instalación de logetas guias.
- Cargue de volquetas
- Organización de almacen.

Yeisni GG

Martes 10 DE SEPTIEMBRE 2024

personal

1 Maestro 1 Residente

3 Ayudantes 1 Aux. SST

Actividades

- Demolicion de cuneta

- Construccion de alfajia en jardinera

- Aplicación de pintura en cerramiento

Yeisni CC

Miercoles 11 SEPTIEMBRE 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

3 Ayudantes 1 Aux. SST

Actividades

- Demolicion de cuneta
- Pañete de jardinera
- Impermeabilizante de jardinera

Yeisni EE

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
1 Ayudantes

Actividades
- Relleno de jardinera
- ingreso de relleno para conformacion de talud

Yeisni EE

VIERNE 13 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
3 Ayudantes.

Actividades
- Desinstalacion de cerramiento lotera via circunvalar para conformacion de talud

- Relleno y conformacion de talud para cuneta

- instalacion de cerramiento y perdon informativo.

Yeisni EE

SABADO 14 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
3 Ayudantes

Actividades
- Desinstalacion de cerramiento via circunvalar.

- Conformacion de talud para cuneta

- instalacion de cerramiento

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024

- Dia no laboral.

Yeisni

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
3 Ayudantes

Actividades
- Retiro de escombro de la cuneta para sitio de acopio

- Demolicion de cuneta

Yeisni

Martes 17 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
2 Ayudantes

Actividades
- Arreglo de caseta de obra dañada por fuertes lluvias y brisas.

- se recoge pendon y se lava (se cayo por fuerte lluvias y estaba lleno de barro)

MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente.

* No se laboro debido a las fuertes lluvias la cuneta estaba inundada.

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 2024

∴ Personal

1 Maestro 1 Residente

1 Topografo

Actividades

- se marcan las cotas de nivelacion para la construccion de la cuneta.

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente.

- Limpieza de baterias portatiles por parte de MaKeN

Yesni EE

SABADO 21 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
2 Ayudantes 1 Trabajadora social.

Actividades.
- Limpieza y retiro de arbol que se cayo por lluvia en cuneta.

- retiro de basura de cuneta.

* Se realizo una socializacion con la comunidad y la junta de accion comunal del barrio villa san pedro, debido a las basuras que arrojan a la cuneta, afectan al contratista ya que retrasan las labores debido a la limpieza que se debe realizar nuevamente y a los trabajadores por los malos olores.

Yeisni

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 2024

- Dia no laboral.

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
2 Ayudantes

Actividades
- Aseo general de obra.

Yeisi GG


MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente

Actividades
- instalacion de pendon perimetral.
- Limpieza de bateria sanitaria (MAKEN)

ANEXO 2

BITACORA PARQUE VILLA CORDIALIDAD

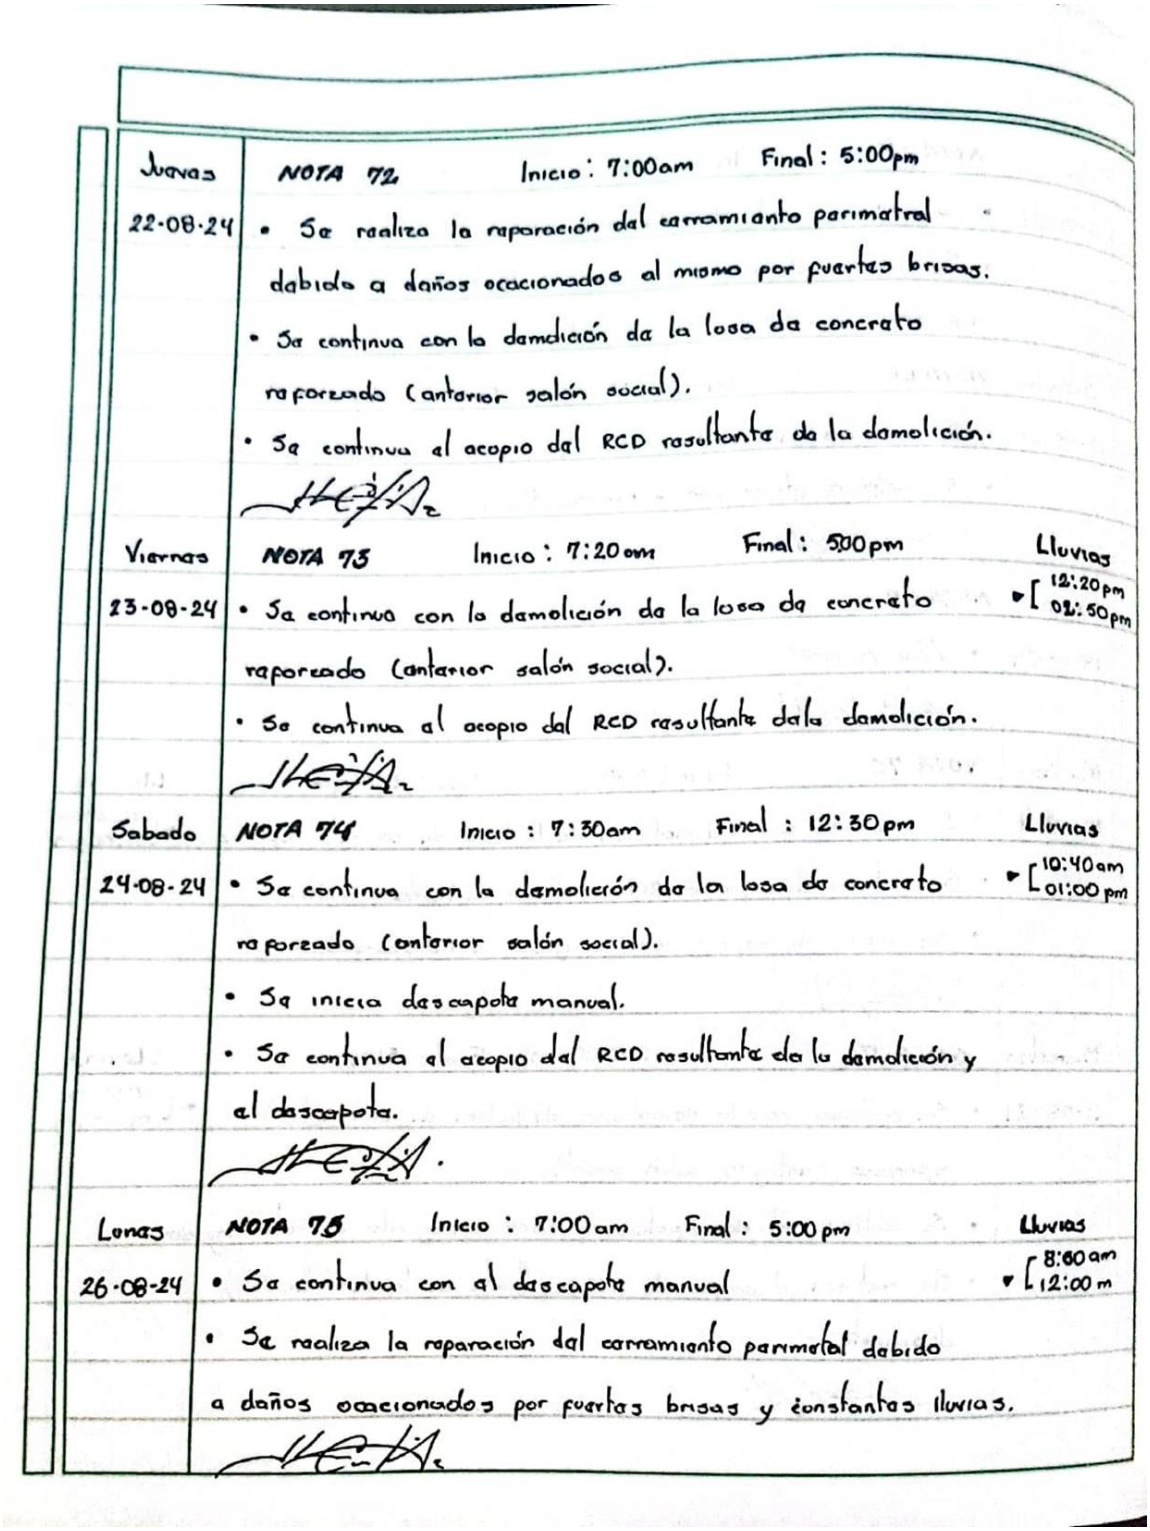

Jueves	**NOTA 72**	Inicio: 7:00am	Final: 5:00pm	
22-08-24	• Se realiza la reparación del carramiento perimetral dabido a daños ocacionados al mismo por fuertes brisas. • Se continua con la damdición da la losa de concreto raforzado (anterior salón social). • Se continua el acopio del RCD resultante de la damolición.			
Viernes	**NOTA 73**	Inicio: 7:20 am	Final: 5:00pm	Lluvias
23-08-24	• Se continua con la damolición de la losa de concreto raporzado (anterior salón social). • Se continua el acopio del RCD resultante dala damolición.			• [12:20pm 02:50pm
Sabado	**NOTA 74**	Inicio: 7:30am	Final: 12:30pm	Lluvias
24-08-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto raforzado (anterior salón social). • Se inicia descapote manual. • Se continua el acopio del RCD resultante de la damolición y el descapote.			• [10:40am 01:00pm
Lunes	**NOTA 75**	Inicio: 7:00 am	Final: 5:00 pm	Lluvias
26-08-24	• Se continua con el descapote manual • Se realiza la reparación del carramiento perimetal dabido a daños ocacionados por fuertes brisas y constantes lluvias.			• [8:60 am 12:00 m

Martes 27-08-24

NOTA 76 Inicio: 7:00 am Final: 5:00 pm

- Se continua con el descapote manual.
- Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salon social).
- Se continua el acopio del RCD resultante de la demolicion y el descapote.
- Se inicia el retiro de material RCD.

Miercoles 28-08-24



NOTA 77

- Se continua con el descapote manual.
- Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salón social).
- Se continua el acopio del RCD resultante de la demolición y el descapote.


Jueves 29-08-24

NOTA 78

- Se continuo el descapote con ayuda del minicargador.
- Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salon social).
- Se continua el acopio del RCD resultante de la demolición y el descapote.

Viernes	**NOTA 79**	
30-08-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salón social). • Se continua al acopio del RCD resultante de la demolición. 	
Sabado	**NOTA 80**	
31-08-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salon social). 	
Lunes	**NOTA 81**	
02-09-24	• Se inicia a extender material de relleno seleccionado. • Se inicia la compactación del material de relleno extendido. 	
Martes	**NOTA 82**	**Lluvias**
03-09-24	• Se continua extendiendo el material de relleno seleccionado. • Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salón social). 	▶ [01:13 pm 02:00 pm ▶ [02:14 pm 03:00 pm
Miercoles	**NOTA 83**	
04-09-24	• Se continua extendiendo el material de relleno seleccionado • Se continua con la demolicion de la losa de concreto reforzado (anterior salón social).	**Lluvias** ▶ [03:35 pm 04:40 pm


- Se continua con la compactación del material de relleno seleccionado.



05-09-24 Jueves

NOTA 84

- Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salón social).
- Se recibe la visita de representantes de la empresa Triple A E.S.P. con objeto de verificación de contador para suministro de agua al frente. Se les sugiere el cambio de diametro de la acometido existente por una tubería mayor 1" pulgada.




06-09-24 Viernes

NOTA 85

Lluvias [02:00 pm 05:20 pm

- Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salón social).
- Se continua extendiendo el material de relleno seleccionado.
- Se continua la compactación del material de relleno seleccionado.




07-09-24 Sabado



NOTA 86

Lluvias [08:45 am 09:20 am

- Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salón social).
- Se continua extendiendo el material de relleno seleccionado.



Lunes	**NOTA 87**	
09-09-24	• Se continua con la demolición manual de la losa de concreto reforzado (anterior salon social). • Se inicia la excavación para la cimentación de los muros perimetrales. • Se inicia la demolición del puente peatonal.	
Martes	**NOTA 88**	
10-09-24	• Se realiza la perfilamiento y relleno y compactación del material de relleno base para cimentación (solado) muros perimetrales.	
Miercoles	**NOTA 89**	
11-09-24	• Se continua con la compactación del material de relleno (base) para cimentación muro perimetrales. • Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salon social). • Se recibe la visita de personal administrativo y tecnico representante de la interventoria.	
Jueves	**NOTA 90**	Lluvias
12-09-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salon social). • Se continua con la excavación del material para la cimentación del muro perimetral.	02:45 pm 05:20 pm

	• Se inicia el vaciado del solado para la cimentación del muro perimetral. 
Viernes	**NOTA 91**
13-09-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado (anterior salon social). • Se continua con la excavación correspondiente para la cimentación del muro perimetral. • Se continua con el perfilamiento, relleno y compactación del material de relleno (base), previo vaciado del solado. • Se continua con el vaciado del solado para la cimentación del muro perimetral. • Se continua con el retiro del material RCD 
Sabado	**NOTA 92**
14-09-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado. (anterior salon social). • Se continua con el vaciado del solado para la cimentación del muro perimetral. 
Lunes	**NOTA 93** — Lluvias
16-09-24	• Se continua con el perfilamiento, relleno y compactación del material de rallano (base), previo vaciado del solado. ▸ [06:00 pm 07:00 pm ▸ [12:23 pm 01:00 pm • Se continua con el vaciado del solado para la cimentación

del muro perimetral.

- Se inicia con el figurado del acero para el muro perimetral.
- Se presentan fuertes lluvias acompañadas de brisas a gran velocidad (vendaval) sobre el frente de trabajo, causando graves afectaciones sobre las instalaciones temporales construidas y el cerramiento perimetral del frente.

Martes 17-09-24

NOTA 94

- Se realiza la revisión de los daños ocacionados sobre el frente de trabajo ocacionados por el vendaval.
- Se inicia la restauración del cerramiento perimetraly ~~accesos~~ accesos del frente de trabajo.
- Se encuentra que uno de los arboles fuera del area de trabajo fue victima delos fuertes brisas y cayo sobre la carretera y andenes peatonales de la periferia.
-

MIERCOLES
18-9-24

NOTA 95

- CONTINUAMOS CON LA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE VÍA ACCESO ARCO 90. CON MAQUINARIA AMARILLA (RETRO CARGADOR)
- FIGURADO DE ACERO PARA MURO PERIMETRAL
- INICIAMOS REPARACIÓN DE EL CERRAMIENTO AFECTADO POR VENDAVAL.
- SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE 2.30 pm A. 3:30 pm.


ef — Tef.

JUEVES 19-9-24

NOTA 96

- CONTINUAMOS CON FIGURADO DE ACERO PARA MURO PERIMETRAL
- REPARACIÓN DE CERRAMIENTO
- EXCAVACIÓN PARA MURO PERIMETRAL
- CONSTRUCCION DE SOLADO PARA MURO

NOTA: SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DE 2:30pm A 5:00pm.




VIERNES 20-9-24

NOTA 97.

- FIGURACIÓN DE ACERO MURO PERIMETRAL
- RETIRO DE MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIONES MURO PERIMETRAL.
- REPARACIÓN DE CERRAMIENTO

NOTA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS DESDE LAS 11:00 AM.



LUNES 23-9-24

NOTA 98

- SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA LO CUAL DEJAN MUY SATORADO EL TERRENO.
- SE REALIZA LIMPIEZA DE VIA DE ARROYO
- CONTINUAMOS CON FIGURACIÓN DE ACERO


MARTES 24-9-24

NOTA 99

- CONFORMACIÓN DE ACERO
- CONTINUAMOS CON LA LIMPIEZA DE CANAL ARROYO.
- SE PRESENTAS FUERTES LLUVIAS EN SITIO POR CERCA DE 1 HORA. 2:10 pm - 3:10 pm

ANEXO 3

BITACORA PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ

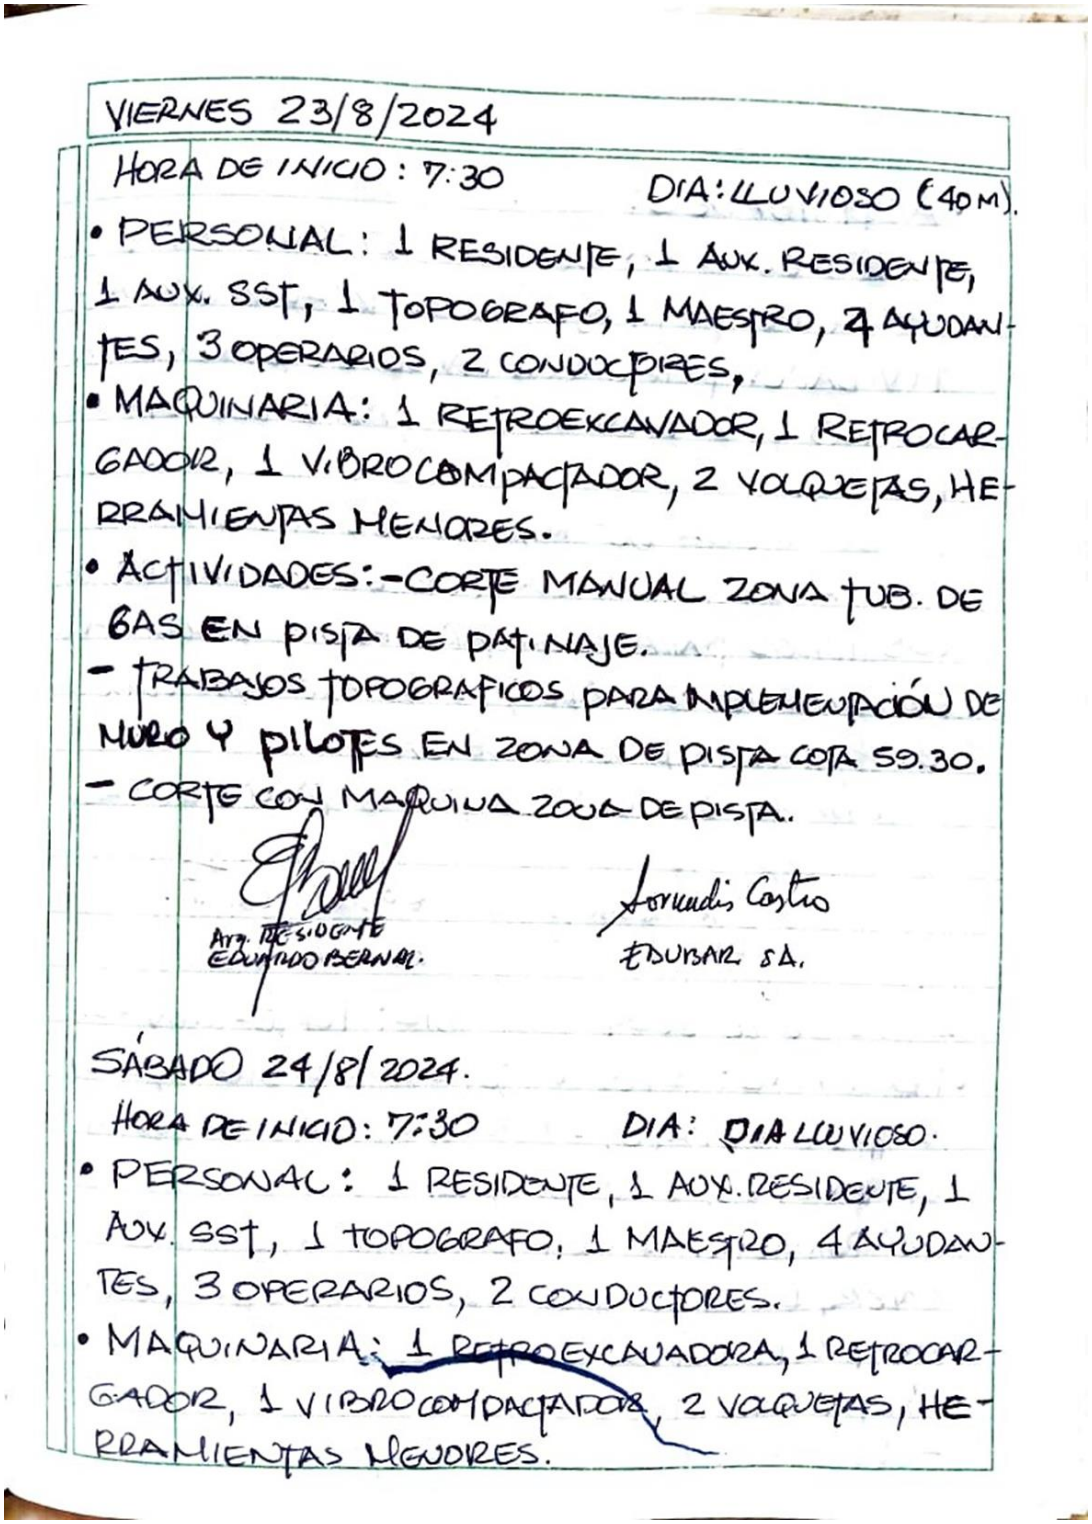

VIERNES 23/8/2024

HORA DE INICIO: 7:30 DIA: LLUVIOSO (40 M).

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 3 OPERARIOS, 2 CONDUCTORES,
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES: -CORTE MANUAL ZONA TUB. DE GAS EN PISTA DE PATINAJE.
- TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE MURO Y PILOTES EN ZONA DE PISTA COTA 59.30.
- CORTE CON MAQUINA ZONA DE PISTA.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

Jorneidis Castro
EDUBAR SA.

SÁBADO 24/8/2024.

HORA DE INICIO: 7:30 DIA: DIA LLUVIOSO.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 3 OPERARIOS, 2 CONDUCTORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
  - EN EL AREA DE TRABAJO CANCHA Y PISTA DE PATINAJE NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR ENCONTRARSE EL TERRENO SATURADO POR LLUVIA EN LA TARDE DEL DIA ANTERIOR.
  - BUSQUEDA DE MANHOLES SOBRE LA CARRERA 13 SUR Y CONOCER EL RECORRIDO DE LOS TUBOS PARA ALCANTARILLADO Y PODER HACER EXCAVACIONES SIN AFECTAR EL ALCANTARILLADO, E INSTALAR LA TUBERIA DE GAS.

DURANTE EL DIA SE PRESENTARON LLUVIAS.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

Jornadis Castro.
EDUBAR. S.A

LUNES 26 DE 2024 DIA: FUERTES LLUVIAS.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 4 OPERADORES, 1 CONDUCTOR.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:
  - REPARACION DE CERRAMIENTO, POR FUERTES

LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL FIN DE SEMANA/
LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS POR SATURACIÓN DE AGUA EN EL TERRENO.

Ing. Residente
Eduardo Bernal.

Jorwadis Castro.
EDUBAR. SA.

MARTES 27 DE 2024 DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 4 OPERADORES
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 VOLQUETA, 1 CONDUCTOR.
- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES PARA UBICAR MANHOLES SOBRE LA CRA 13 SUR Y CONOCER LA ORIENTACIÓN DE LAS TUBERIAS CON RESPECTO A LA VIA, Y ASI PODER PROCEDER A REALIZAR LAS EXCAVACIONES A MAQUINA PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUB PARA GAS NATURAL.
- LAS DEMAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS POR SATURACIÓN DE AGUA EN EL TERRENO.

Ing. Residente
Eduardo Bernal.

Jorwadis Castro.
EDUBAR. SA.

MIERCOLES 28 DE 2024 DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 3 OPERADORES, 1 CONDUCTOR.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADORA 2 VOLQUETAS, 1 BULDOZER, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:

- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- TABAJO DE TOPOGRAFIA. (ZONA DE PISTA Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES).
- POR MOTIVO DE SATURACION DE AGUA EN EL TERRENO NOSE TRABAJO EN EL AREA.

Arq. RESIDENTE
EDUBAR S.A.

Arq. Fernando Castro.
EDUBAR. S.A.

JUEVES 29 DE 2024 DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE 1 AUX. SST. 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTE. 4 OPERADORES, 1 CONDUCTOR.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADORA, 1 VOLQUETA, 1 BULDOZER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- REPLANTO Y NIVELACION ZONA DE CANCHA, Y PISTA DE PATINAJE.
- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CON RETROEXCAVADORA
- EL TERRENO SIGUE SATURADO DE AGUA.

Aux. Residente
Edubar S.A.

Hernando Partida
EDUBAR SA.

VIERNES 30 DE AGO 2024. DIA SOLEADO:

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 3 OPERADORES, 2 CONDUCTORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADOR, 1 VOLQUETA 1 BULLDOZER, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:
- TENDIDO DE PIEDRA CIMIENTO PARA CONFORMACIÓN DE FILTRO EN OJO DE AGUA.
- TRAZADO Y REPLANTO ZONA DE PISTA Y CANCHA PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN.
- RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE Y CANCHA
- Hoyada PARA PILOTES, (EXCAVACIONES).

- FUNDIDA PILOTE.

EDURSAN SA.

SÁBADO 31/8/2024 DIA: LLUVIOSO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 3 OPERADORES, 1 VOLQUETERO,

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADOR, 1 VOLQUETA, 1 BOLDOZER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES CON MINIRETROEXCAVADOR EN ZONA DE CRA 73 SUR PARA INSTALACIÓN DE TUBS PARA GAS NATURAL
- EXCAVACIONES CON HOYADORA PARA PILOTES MUROS DE CONTENCIÓN
- MOLIDA DE PIEDRA PARA TERMINAR VIA INTERNA
- FUNDIDA PILOTES ZONA PISTA DE PATINAJE.

AUX. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

EDURSAN SA

LUNES 2/09/2024

NOTA: La interventoría suspende la actividad de la construcción de los pilotes, teniendo en cuenta que el diseño de mezclas no se encuentran aprobados por la interventoría, se reinician la actividad hasta tanto no sea aprobada. El proceso de excavación puede continuar teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y diseño aprobado por interventoría.

INT. EDUBAR S.A.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 3 OPERADORES 1 CONDUCTOR.
- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADORA, 1 VOLQUETA, 1 BULDOZER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES CON HOYADORA PARA PILOTES EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE.

EDUBAR S.A.

RESIDENTE EDUBAR

MARTES 3/9/2024 DIA: LLUVIA

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 5 AYUDANTES, 3 OPERADORES, 2 VOLQUETEROS.

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBRO-COMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADOR, 2 VOLQUETAS, 1 BULDOZER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES PILOTES ZONA DE PISTA DE PATINAJE
- FUNDACIÓN DE PILOTES, PISTA DE PATINAJE.

RESIDENTE EDUARDO BERNAL

Jorman Andrés Cortés
CONSTRUCTOR

MIERCOLES 4/9/2024 DIA: LLUVIA.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 2 CONDUCTORES. 1 VOLQUETERO,

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADOR, 2 VOLQUETAS, 1 BULDOZER. HERRAMIGTAS MENORES.

• ACTIVIDADES:

- EXCAVACIÓN PILOTES ZONA DE PISTA DE PATINAJE, Y FUNDIDA DE PILOTES.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

EDUBAK. SA

JUEVES 5/9/2024 DIA: SOLEADO

• PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 3 AYUDANTES, 1 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 1 VOLQUETERO.

• MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.

• ACTIVIDADES:

- EXCAVACION PILOTES ZONA PISTA DE PATINAJE.
- FUNDIDA DE SOLADO 2.500 PSI. ZONA DE PISTA.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

EDUBAK SA.

VIERNES 6/9/24 DIA: LLUVIOSO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 VOLQUETERO.

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINIRETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 2 VOLQUETAS, 1 MINICARGADOR, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIÓN DE PILOTES EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- FUNDIDA DE PILOTES Y SOLADO EN ZONA DE PISTA.

RESIDENTE
EDUARDO BORNAL

EDUSAK SA

SÁBADO 7/9/2024 DIA: NUBLADO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYDANTES, 1 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 1 VOLQUETERO.

- MAQUINARIA:

1, RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 MINICARGADOR, 1 BOLDOZER, 2 VOLQUETAS, 1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENORES.

- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIÓN DE PILOTES EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- FUNDIDA DE PILOTES Y SOLADO EN ZONA DE PISTA.

RESIDENTE EQUIPO BOLIVAR.

EDUSHIR. SN.

LUNES 9/9/24 DIA: LLUVIOSO.

- PERSONAL: 7:30.

1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 5 AYUDANTES, 1 OPERADOR 2 CONDUCTORES, 1 VOLQUETERO, 2

- MAQUINARIA:

1 RETROESCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR, 1 BOLDOZER 1 MINIRETROEXCAVADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- EXCAVACIÓN DE PILOTES EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE
- FUNDACIÓN DE PILOTES Y SOLADO.

RESIDENTE EDUARDO BERNAL.

EDUBAR SA.

MARTES 10/9/2024

- PERSONAL: 7:00 DIA: LLUVIOSO

1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 5 AYDANTES, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 VOLQUETERO.

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROEXCAVADOR, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, MINICARGADOR, MINI-RETROEXCAVADORA. 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- EXCAVACION DE PILOTES EN PISTA DE PATINAJE.
- FONDIDA DE SOLADO Y PILOTES.

SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA Y MEDIO DIA.

RESIDENTE EDUARDO BERNAL

• 42.5

MIERCOLES: 11/9/2024. DIA: SOLEADO

• PERSONAL: 7:00

1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 VOLQUETERO.

• MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.

• ACTIVIDADES:

- RETIRO MATERIAL RCD
- EXCAVACION PARA PILOTES ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- FUNDACIÓN DE PILOTES Y SOLADO EN ZONA DE PISTA.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

NOTA: SE RECIBE VISITA DE INTERVENTORIA PARA REVISAR AVANCE DE OBRA.

JUEVES 12/9/2024 DIA: LLUVIA.

- PERSONAL: 7:00

1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST., 1 TOPOGRAFO, 1, MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 CONDUCTOR, 1 OPERADOR, 2 VOLQUETEROS.

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR, 1 MINI RETROEXCAVADOR 2 VOLQUETA, 1 CANTER.

- ACTIVIDADES.

- EXCAVACION DE PILOTES EN ZONA PISTA.
- FUNDIDA DE PILOTES ZONA PISTA DE PATINAJE
- FUNDIDA SOLADO DE LIMPIEZA.
- RELLENO OJO DE AGUA CON 14 M3 DE PIEDRA DE CIMENTACION.
- RETIRO MATERIAL RCD.

RESIDENTE
EDUARDO PERUCH

VIERNES 13/9/2024 DIA: SOLEADO

- PERSONAL:

1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST. 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTE, 2 VOLQUETEROS, 2 OPERARIOS.

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADOR, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, MINIRETRO, MINICARGADOR.

- ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES DE PILOTES
- FUNDIDA PILOTES DE PISTA.
- FUNDIDA SOLADO.
- RETIRO MATERIAL RCD.

EDUARDO BORNAL RESIDENTE

SÁBADO: 14/9/2024 DIA LLUVIA.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 RESIDENTE AUX. 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES. 2 VOLQUETEROS, 1 CONDUCTOR

- INSTALACIÓN ACEROS ZAPATA. ZONA PISTA DE PATINAJE.
- FUNDACIÓN DE ZAPATA EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- MOVIMIENTO MATERIAL RCD.

EDUARDO BORNAL RESIDENTE

LUNES 16/9/2024 DIA: LLUVIA.

- PERSONAL 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST. 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 VOLQUETEROS, 1 CONDUCTOR, 2 OPERADORES..

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 DOLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINI RETRO, 1 MINI RARGADOR, 2 VOLQUETAS 1 CAMTER.

- ACTIVIDADES:

- LEVANTE MAMPOSTERIA MURO DE CONTENCION.
- PERFILADA TALUD ZONA DES PISTA HACIA LA CANCHA Y ZONA DE ANDEN COLEGIO.
- MOVIMIENTO DE MATERIAL RCD, INTERNO.
- SE HACE ENTREGA DE FORMATO PARA LIBERACIÓN DE CONCRETOS. A LA VEZ. SE HACE OBSERVACIÓN DE QUE EL ACERO DE LOS PILOTES DEBE HALLAR TRASLAPO CON LOS TECHOS CON UN ANGULO 90°.

ALEJANDRO R.
FISCALIZADORES HERGUIA D
EQUIPO

Norte 17 de septiembre de 2024, DIA: SOLEADO
Se solicito los planillas de Seguridad Social para verificación en obra del personal, se les recuerda que todo el personal debe estar en cobertura y los pagos deben ser de manera oportuna.
De no cumplir con este aspecto no se autoriza el personal o ejecutar actividades. Es responsable el contratista de lo que ocurra en caso de omitir lo sugerido por la interventoria.
INTERVENTORIA NO AVALA LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN SOBRE LA CALLE 74 PARA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE GAS, HASTA TANTO NO SE ESTABILICE EL TALUD. Y ESTE CONTINUE EROSIONADO. SE RECOMIENDA SEÑALIZAR EL TALUD CON AFECTACION EN EL TALUD Y EVITAR TRANSITO DE PERSONAS CERCA A LA AFECCIÓN.

Sandra Martinez.
SST EDUBARSA

Eduardo Rincon
EDUBAR

RESIDENTE
EDUBAR

• PERSONAL: 7:30
1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST., 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 VOLQUETEROS,

1 CONDUCTOR, 2 OPERADORES.

- MAQUINARIA:

1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR, 1 MINI RETRO, 2 VOLQUETAS, 1 CANTER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- REPARACIÓN DE CERRAMIENTO ZONA DE COLEGIO
- PERFILACIÓN DE TALUD EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE,
- NIVELACIÓN DE TERRENO EN ZONA DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CONSTRUCIÓN DE ZAPATA. PISTA DE PATINAJE.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

MIERCOLES 18/9/2024 DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 7:30

1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX SST. 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 2 CONDUCTORES,

- MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBRO-COMPACTADOR, 1 MINIRETRO, 1 MINICARGADOR.

2 VOLQUETAS, 1 CANTER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- INSTALACION DE BLOQUES EN MURO DE CONTENCION
- EXCAVACIONES PILOTES EN ZONA PISTA DE PATINAJE MURO LADO CIRCUNVALAR.
- MOVIMIENTO DE MATERIAL RCD INTERNO.

RESIDENTE EDUARDO BERNAL.

JUEVES 19/9/2024 DIA: LLUVIOSO

- PERSONAL 7:30

1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 MECANICO, 1 OFICIAL.

MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBRO-COMPACTADOR, 1 MINI RETRO, MINICARGADOR, 2 VOLQUETAS, 1 CANTER, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES.

- EXCAVACIÓN PILOTES ZONA PISTA PATINAJE
- LIMPIEZA ZONA COMEDOR Y ENTORNO
- MOVIMIENTO MATERIAL RCD INTERNAMENTE.

RESIDENTE EDUARDO BERNAL

VIERNES 20/9/2024. DIA: SOLEADO.

PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE DE OBRA, 1 AUX. SST. 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 MECANICO.

MAQUINARIA:

1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 MINICARGADOR, 1 MINIRETRO, 1 VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTAS MENORES.

ACTIVIDADES:

- EXCAVACION DE PILOTES EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE HACIA LA CIRCUNVALAR.
- FUNDACIÓN DE PILOTES EN ZONA DE PISTA, HACIA LA CIRCUNVALAR.
- MOVIMIENTO DE TIERRA PARA AMPLIACION DE CARRETERA INTERNO.

RESIDENTE
EDGARDO BERNAL

SÁBADO 21/9/2024 DIA: LLUVIA.

- PERSONAL: 7:30

1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 AUX SST. 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR.

•MAQUINARIA:
1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINI RETRO, 1 MINICARGADOR, 1 CANTER, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.
•ACTIVIDADES:
- EXCAVACION DE PILOTES EN ZONA PISTA DE PATINAJE, MURO HACIA LA CIRCUNVALAR
- AMPLIACIÓN DE VIA INTERNA.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

DOMINGO 22/9/2024 DIA: LLUVIOSO
DURANTE TODA LA MAÑANA Y PARTE DE LA TARDE SE PRESENTARON LLUVIAS.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

LUNES 23/9/2024 DIA: SOLEADO
•PERSONAL: 7:30
1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 3 AYUDANTES, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR.
•MAQUINARIA:
1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR, 1 MINIRETRO, 2 VOLQUETAS.
