DISICO S.A. INGENIERIA CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	**CONTRATO 205 DE 2023** **CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA**	



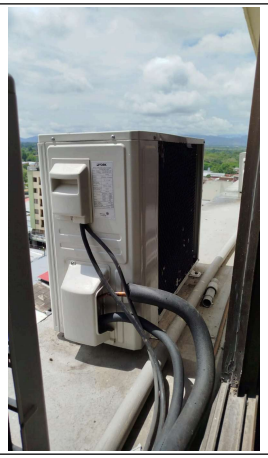
COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	9/10/2024	**CIUDAD**	**NEIVA**	
SECCIONAL	**NEIVA**			
SERVICIO	**INSTALACIÓN**	**X**	**DESINTALACIÓN**	**MANTENIMIENTO**

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**			
Instalación de evaporadora, condensadora, tuberia de cobre cable de fuerza y comunicación, braker, bomba de condensado, recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex, pruebas de funcionalidad.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA			Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.		
	BTU	12000	18000 X	24000
	SERIE CONDENSADORA	000002225230300169		
	SERIE MANEJADORA	000001225230300148		

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO				Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**				N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**				N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**				N/A

TECNICO	Alex Chicue	ENCARGADO	Miller Muñoz
FIRMA		FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. NEIVA PISO 8	IMAGEN 2. NEIVA PISO 8	IMAGEN 3. NEIVA PISO 8
		
IMAGEN 4. NEIVA PISO 8		
