INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 12 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "***CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander."	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	$11.999.999.870,13
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$11.999.999.870,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental	

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/06/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$11.214.953.149,65	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$785.046.720,48
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	57,76 %	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	57,88%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532798-2	11/01/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	23/12/2022	23/01/2023
Actualización de Póliza 3532798-2	28/03/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	20/01/2023	20/02/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$1.980.000.000
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$1.980.000.000**
SEGUNDO DESEMBOLSO			
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.980.000.000**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**		**0**
03/2023	$ 9.780.012,07	0		0
04/2023		$ 9.780.012,07		20/04/2023
04/2023	$ 18.434.727.88			
05/2023		$ 18.434.727.88		19/05/2023
05/2023	$19.095.522.88			
06/2023		$19.095.522.88		28906/2023
06/2023	$18,536,724.81			30/06/2023

07/2023		$18,536,724.81		25/07/2023
07/2023	$19,130,448.41			31/07/2023
08/2023		$19,130,448.41		28/08/2023
08/2023	$19,152,566.04			31/08/2023
09/2023		$19,152,566.04		07/09/2023
09/2023	$18,412,825.57			30/09/2023
10/2023		$18,412,825.57		09/10/2023
10/2023	$19,038,382.17			31/10/2023
11/2023		$19,038,382.17		07/11/2023
11/2023	$18,412.612.81			30/11/2023
12/2023		$18,412.612.81		07/12/2023
12/2023	16.129.700,90			12/31/2023
01/2024		16.129.700,90		07/01/2024
01/2024	$ 3,877,190.14			31/01/2024
02/2024		$ 3,877,190.14		06/02/2024

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➢ ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 00675-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	$ 784.924.000
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL	
Representante legal	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	
Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE	

	OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%)
Fecha Firma del contrato	(29/05/2023)
Plazo contrato	(10 meses)
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)
fecha de Terminación del contrato	(19/04/2024)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	0%	0%	0$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS :

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181710	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato	$156.984.800	20/06/2023	20/08/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$156.984.800	20/06/2023	20/04/2027

		Calidad del servicio	$156.984.800	19/04/2024	19/04/2029
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de obra No. 00667-2023	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander		$ 11.214.844.432,69
Nombre contratista	UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL		
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL		
Identificación	CC- 91.227.926		
	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	90%	C.C. No. 91.227.926
	MACAM SAS	10%	NIT 900878133-4
Fecha Firma del contrato	(16/05/2023)		
Plazo contrato	(10 meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(19/04/2024)		
Valor acumulado de recursos ejecutados	$6.491.094.310,02		
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	57,88%		
Porcentaje avance físico programado acumulado	57,76%		
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	12,45%		

Porcentaje avance físico programado en el periodo	27,66%

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
MODIFICATORIA N°1 AL CONTRATO DEOBRA N° 00667-2023	Debido a ajuste de los diseños iniciales revisados y aprobados por la interventoría fue necesario suscribir acta modificatoria al contrato N° 00667-2023	10/11/2023

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15	15	1.682.226.664,90	Acta parcial 01	26/12/2023
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				(1.682.226.664,90)	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				(15%)	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	26/05/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/07/2024

B-100036402 de cumplimiento		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	26/05/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	16/03/2024
		Patronal			
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

POLIZAS ACTUALIZADAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	27/07/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/08/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/04/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	19/04/2024	19/04/2029
B-100009196 de	25/07/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Patronal	$ 174.000.000	16/05/2023	19/04/2024

responsabilidad civil extracontractual		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:


COMPONENTE TÉCNICO:

- **Avance de la meta establecida:**

Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

	META	% EJECUCION MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 228 und de anclajes activos	18,09%	72,34%
2	MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO LANZADO: Se proyecta recubrir 4840.39 m2 aproximadamente de superficie del terreno con concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada	% 0	% 0
3	CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 515 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón.	% 0	% 0
4	DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 231 unidades de drenes de penetración horizontal.	0%	23,81%
5	CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado	% 0	% 0
6	PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas.	% 0	% 0

En el periodo de ejecución del 01 al 31 de Enero de 2024 se presentó el siguiente avance de ejecución:

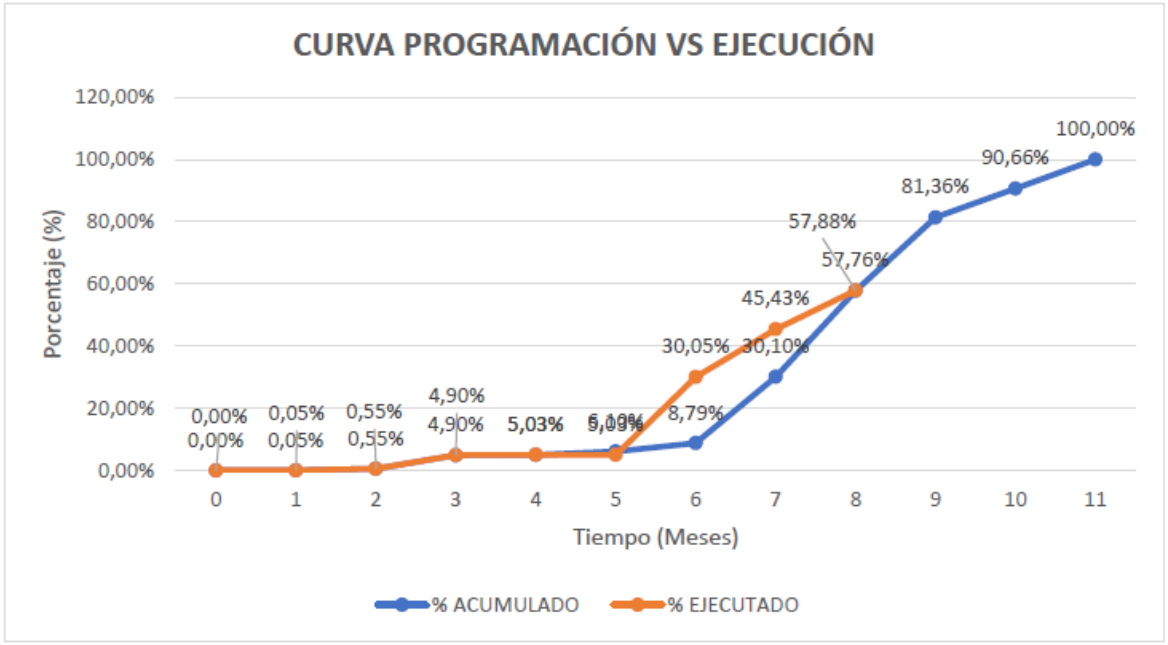

Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 04. Flujo de inversión

2. Actividades desarrolladas en el periodo:

Según los informes presentados por la interventoría, se realizaron las siguientes actividades en el periodo de ejecución del 01 de Enero al 31 de enero de 2024:

Ítem 3.3 inyección de lechada para anclajes:

Para el periodo se tiene programado un porcentaje de avance del 38.75% y se ejecutó un 18.09%, que sumado al porcentaje anterior nos da un porcentaje de avance acumulado del 72.34% reportando un adelanto del 19.84% con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 52.50%. El ítem presenta un adelanto con respecto a lo programado el cual es importante destacar cuando se analicen las otras actividades.

Ítem 4.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2:

Para el periodo analizado se tiene programado un porcentaje de avance del 38.07% del cual se ha ejecutado un 11.32% reportando un atraso en el periodo de 26.75% en

esta actividad. Por otra parte, el porcentaje programado acumulado es de 100% lo que nos indica que esta actividad debió terminar en este periodo, pero se tiene un porcentaje ejecutado acumulado del 11.32% reportando un atraso acumulado del 88,68% por lo que se hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas.

Ítem 4.2 suministro y colocación de anclajes 3 cables D=5/8:
Para el periodo se tiene programado un avance de 41.33% y se ejecutó un 18.09%. Esta actividad reporta un atraso en este periodo del 23.24%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 72.34%. De acuerdo con lo anterior se reporta un atraso del 3.66% en esta actividad con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 76.00% lo que hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas.
Ítem 5.1 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración de 0.00 a 15 mts:

En este ítem se tiene programado un avance del 2.67% del cual en este periodo no se ejecutaron actividades relacionadas a este ítem. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 23.81% que, comparándolo con el porcentaje programado acumulado, el cual es de 2.67%, reporta un avance del 21.14% el cual ayuda a otras actividades que reportan un atraso en este periodo.
Ítem 5.2 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración mayor a 15 mts:

En este ítem se tiene programado un avance del 2.67% del cual en este periodo no se ejecutaron actividades relacionadas a este ítem. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 23.81% que, comparándolo con el porcentaje programado acumulado, el cual es de 2.67%, reporta un avance del 21.14% el cual ayuda a otras actividades que reportan un atraso en este periodo.
Ítem 6.1 Perforaciones horizontales para anclajes de 0.00 a 15.00 m:

Para el periodo se tiene programado un avance de 41.33% y se ejecutó un 18.09%. Esta actividad reporta un atraso en este periodo del 23.24%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 72.34%. De acuerdo con lo anterior se reporta un atraso del 3.66% en esta actividad con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 76.00% lo que hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas.
Ítem 6.2 Perforaciones horizontales para anclajes mayores a 15 m:

Ítem 6.3 Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal:
Para el periodo se tiene programado un avance de 23.85% y se ejecutó un 12.70%

reportando un atraso en el periodo de 11.15%. por otra parte, esta actividad reporta un porcentaje de avance acumulado de 57.88% que comparado con el porcentaje

programado acumulado que es de 43.85%, reporta un adelanto de 14.03% en general lo que ayuda a otras actividades que no reportan avance en el mes de enero y están programadas.

Ítem NP1 Micropilotes diámetro 0.25 m incluye refuerzo:

Para el periodo se tiene programado un avance de 34.44% y se ejecutó un 15.87%. Esta actividad tiene un porcentaje acumulado ejecutado de 70.37% que comparado con el porcentaje programado acumulado a la fecha el cual es de 56.67% se presenta un adelanto acumulado de 13.70%. De acuerdo con lo anterior esta actividad ayuda a otras actividades que no reportan avance en el mes de diciembre y están programadas.

- **Ítem NP2 Concreto de 3000 psi:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 24.85% y se ejecutó un 10.46%. Esta actividad tiene un porcentaje acumulado ejecutado de 10.46% que comparado con el porcentaje programado acumulado a la fecha el cual es de 37.68% se presenta un retraso acumulado de 27.22 lo que hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas.

- **ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO**

En el período reportado del 01 al 31 de Enero de 2024, no se realizó actualización del plan de trabajo.

- **ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS**

Dentro del mes de enero, no se dio tramite a actas parciales.

Registro fotográfico

Fotografía aérea estado actual de la obra

Registro Fotográfico 1. Fotografia Area Obra	Registro Fotográfico 2. Fundida de Micropilotes
	

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

Registro Fotográfico 3. Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo



Registro Fotográfico 4. Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo



Registro Fotográfico 5. Perforaciones horizontales para anclajes



Registro Fotográfico 6. Perforaciones horizontales para anclajes



Registro Fotográfico 7. Suministro y colocación Acero de refuerzo



Registro Fotográfico 8. Inyección de lechada para anclajes



COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo con el seguimiento y control de las cantidades de obra ejecutadas en el presente periodo se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 57.88% que equivale a $6.491.094.310,02, comparado con el programado del 57.76% que equivale a $6.477.462.393,49, se presenta un adelanto con respecto a la programación de obra presentada por el contratista.

Referente al contrato de interventoría No.00675-2023, se encuentra en trámite la cuenta parcial No. 01 por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 117.738.600,00), la cual contablemente se

encuentra en cuenta por pagar, por lo cual, no se ha generado erogaciones presupuestales, y se presentarán los respectivos soportes una vez se haga efectivo los pagos, retenciones y aplicación de descuentos.

En cuanto al informe financiero y reintegro de rendimientos financieros, se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

COMPONENTE JURÍDICO

- Supervisión de la correcta ejecución de las actividades de obra cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- Se realiza el control de la documentación de interventoría y su archivo.
- Se participa en los comités y reuniones entre contratista e interventoría.
- Se hace seguimiento de la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad presentado por el contratista
- Se presentó por parte de los contratistas, los documentos para el pago parcial No.2. En proceso de revisión documental.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se realizan visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para supervisar la ejecución de las actividades, determinar la proyectadas.
- Se realiza control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las actividades cumpliendo con los lineamientos descritos en los planos y especificaciones técnicas de la modificatoria realizada al contrato y acatando las indicaciones dadas por la interventoría.

- En el presente periodo se tiene un porcentaje acumulado del 57.88% del valor del contrato lo que equivale a **SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($6.491.094.310,02)**, lo cual corresponde a un adelanto del 0.12% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 57.76% según la documentación de la modificación presentada y aprobada.

- Se verificó que el personal del contratista se encontrara afiliado a la seguridad social y contara con los elementos de protección personal y dotación indicados para la actividad a ejecutar.

- Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.

- Se verifica el cumplimiento por parte del contratista de los planes de gestión ambiental, plan de calidad, y seguridad y salud en el trabajo.

- Se verifica que el contratista cumpla con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se desarrollaron actividades tales como inducciones al personal, entrega de dotaciones, charlas y capacitaciones, además, se verifica el desarrollo seguro y las medidas de intervención adoptadas por el contratista.

- Como se puede evidenciar en el informe general del estado del tiempo no se presentaron lluvias que afectaran el desarrollo de las actividades en este mes dando así cumplimiento al cronograma estipulado.

- Se viene dando cumplimiento a la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo realizando las actividades correspondientes a salvaguardar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, evaluando los riesgos y tomando las medidas de prevención necesarias para mitigar y controlar los riesgos y peligros a los que están expuestos los colaboradores en la ejecución del contrato de Interventoría.

- Durante el tiempo transcurrido en el desarrollo de las actividades se ha evidenciado el cumplimiento de las normas de seguridad implementado por la organización y el compromiso por parte de los trabajadores de acuerdo con lo indicado en las charlas de seguridad, tomando conciencia de la importancia del uso de los Elementos de Protección Personal y las medidas de promoción y prevención de enfermedades laborales.

- Se evidencia el compromiso por parte de todo el personal de interventoría al cumplir con los requerimientos de seguridad tomando conciencia de la importancia del autocuidado, uso de los Elementos de Protección Personal y las medidas de prevención de accidentes y enfermedades laborales.

- Se realizan las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo al contratista de obra, pudiendo verificar que sus actividades se encuentran bajo la normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evidenciando el cumplimento de los procedimientos correspondientes a este periodo.
-

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:
1. componente técnico
• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances
2. componente financiero
• Extracto bancario correspondiente al mes de enero del año 2024.
• Informe financiero mes de enero de 2024
• Rendimientos financieros mes de enero de 2024
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1dQJZ1Xq80nxy__aSa1nWC-28wM18LMAX?usp=sharing

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

ROCIO AYALA MORENO
SUPERVISORA

	Nombre	Firma
Proyectó	Leonardo A. Pacheco	

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co
